CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. CO1.PCCNTR.4155718

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08).

PERIODO: DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.10

PERIODO: DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4155718
CONSORCIO TIG

"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08)."

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645

CONSORCIO MIA GP

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

VERSIÓN	CONTROL DE CAMBIOS
1	Documento Inicial

PRESENTÓ	APROBÓ
	
ING. JOHN ROCHA RESIDENTE DE OBRA	ING. EDISON RICARDO DUARTE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CODIGO	FECHA
TIG-FO-001	19-11-2023

1. Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6
1.1.1. Localización y ubicación de territorios 6
1.1.2. Asignación de sedes 7
2. DESCRIPCION PRIMERA ETAPA, VISITA DIAGNÓSTICO 8
2.1. Información sedes primera etapa 8
3. INFORMACION ADMINISTRATIVA LEGAL 10
3.1. Información del contrato de interventoría 11
3.2. Información del contrato de obra 11
3.3 Relación de Correspondencia 12
3.4 Actividades de reunión 12
3.5 Informes Semanales 13
4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 14
4.1 Avance físico 14
4.2 Estado de ejecución de los frentes 14
4.3 Control de hitos 16
4.4 Avance financiero 17
5. INFORMACIÓN LEGAL Y PRESUPUESTAL 18
5.1 Contrato de obra – Control actas parciales de obra 18
5.2 Contrato de interventoría – Control actas parciales de interventoría 18
5. CONCLUSIONES 19
2. ANEXOS 20
ANEXO 1. INFORME BÁSICO 20
ANEXO 1.1. INFORME ADMINISTRATIVO 20
Anexo 1.1.1. Control de personal contratista 20
Anexo 1.1.2. Relación de correspondencia 20
Anexo 1.1.3. Actas de reunión 20
Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría 20
ANEXO 1.2. INFORME TÉCNICO 20

ANEXO 1.3. INFORME SST 20
ANEXO 1.4. INFORME AMBIENTAL 20

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de las metas definidas en el plan de desarrollo **"UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C"**, programa línea estratégica: 4 -inclusión educativa para la equidad, proyecto estratégico: ambientes de aprendizaje para la Vida, se incluyó oportunamente la intervención de obras menores y adecuaciones del cien por ciento de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos, buscando conservar y mejorar los espacios de los colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad, para las cuales también se hace necesario contratar el seguimiento, vigilancia y control de las actividades de obra por parte, de un tercero con las calidades técnicas, jurídicas y financieras del caso.

Teniendo en cuenta que, el proyecto anteriormente descrito, trata de la intervención de obra pública mediante actividades de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y la ejecución de obras menores, se hace necesario contratar una interventoría especializada dada la diversidad de actividades, frentes de trabajo y áreas técnicas involucradas en el desarrollo del mismo, situación para las que la SED no cuenta con el personal suficiente para realizar el respectivo seguimiento al proyecto en mención.

Para el grupo No. 8 se asignan 17 sedes a intervenir en mejoramientos que se encuentran en la localidad de Rafael Uribe Uribe, de los cuales, se tiene un diagnóstico inicial por parte de la secretaría de educación y a medida que se realicen las visitas con los contratistas de obra e interventoría, se va a hacer la priorización respectiva de las actividades para cada sede. Posterior a la delimitación de este alcance, se suscribió una adición de recursos para el contrato de obra, donde el mismo se amplió a 8 sedes más, completando así un total de 25 unidades.

El presente informe mensual No.10, comprende la recopilación de la información correspondiente al desarrollo del contrato de obra CO1.PCCNTR.4077645 durante el periodo del 20 de octubre de 2023 al 19 de noviembre de 2023.

1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El presente contrato de interventoría No. C01.PCCNTR.2749287 tiene por objeto: ***"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08)."***

Para el reconocimiento total del proyecto, se ha realizado en conjunto de todas las partes interesadas (SED, contratista, interventoría y personal administrativo de las sedes escolares), una serie de recorridos para identificación de necesidades prioritarias en atenciones integrales de adecuaciones y mejoramientos en: cubiertas, batería de baños, carpintería metálica, acabados generales, canchas deportivas y zonas exteriores.

1.1.1. Localización y ubicación de territorios

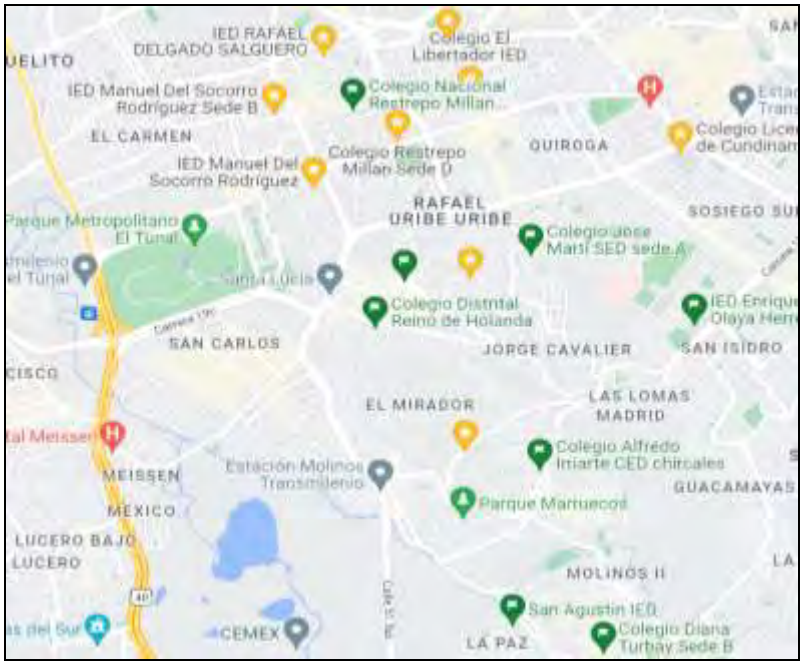


Imagen 1. Localización de las 17 sedes del grupo 8.
Fuente. Google Maps

Las 17 sedes del grupo 8 se encuentran ubicadas dentro de la localidad de Rafael Uribe Uribe; esto, conforme al alcance inicial del contrato de obra, así como las 8 adicionales asignadas a través de la suscripción del otrosí No.1.

1.1.2. Asignación de sedes

Adjudicación de contrato de interventoría No C01.PCCNTR.2749287 y adjudicación de contrato de obra No. No. CO1.PCCNTR.4077645 de territorio oriente ubicados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, del Grupo No 8. Se hará intervención a 17 sedes que serán abarcadas inicialmente por etapas, según la programación de obra.

Grupo	Sedes	Localidad
8	17	Rafael Uribe Uribe

Por otra parte, y con base en la adición No.1 de recursos realizada al contrato de obra, se incluyeron 8 sedes adicionales, así:

Grupo	Sedes adicionales	Localidad
8	8	Rafael Uribe Uribe

2. DESCRIPCION PRIMERA ETAPA, VISITA DIAGNÓSTICO

En la etapa preliminar se realizó la visita de los primeros ocho (8) colegios asignados. Seguidamente y a medida que se coordinó entre la SED y los rectores, se fueron visitando las demás sedes, permitiendo que a hoy se tengan en ejecución veinte (20) de las veinticinco (25) sedes, de donde se han podido entregar seis (6) intervenciones.

2.1. Información sedes primera etapa

En relación al primer alcance de ejecución, tenemos las siguientes sedes dentro del grupo 8, a saber:

COLEGIO	SEDE
COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	B
COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	A
COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	B
COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	B
COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	B
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	A
COLEGIO JOSE MARTI (IED)	A
COLEGIO JOSE MARTI (IED)	C
COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)	A
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	A
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	B
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	A
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	A
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	B
COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	d
COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	A
COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	C

Ahora y con ocasión de la adición No.1 de recursos al contrato de obra, se incluyeron las siguientes sedes, a saber:

COLEGIO	SEDE
COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	A
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	A
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	B
COLEGIO FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR (IED)	A
COLEGIO FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS (IED)	A
COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	B
COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	A
COLEGIO SANTA LUCÍA CAMFAM (IED)	A

La programación general del contrato de obra que incluye el valor actualizado con la adición de recursos, fue suministrada en una segunda reprogramación por parte del CONSORCIO MIA GP. No obstante, para el presente periodo se evidencia un atraso sumamente elevado y el cual no va respaldado por llamados de atención desde esta interventoría, pero es precisamente porque se está coordinando la gestión para un a prórroga al contrato de obra e interventoría, debido a múltiples razones que serán descritas en los oficios de solicitud.

3. INFORMACION ADMINISTRATIVA LEGAL

Territorio oriente: Grupo No. 8

Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4155718 – Consorcio TIG

El presupuesto para la presente contratación de interventoría asciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 878.587.938) incluidos el I.V.A., y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Adicional a lo anterior, se suscribió una modificación No.1 al contrato, con lo cual se incluyó dentro del alcance 8 sedes, arrojando como valor complementario a la inicial, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 371.557.799).

Con esto, el valor total de interventoría asciende a MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 1.250.145.727).

Territorio oriente: Grupo No 8

Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 - CONSORCIO MIA GP

En contrato de obra se asigna una suma de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 11.941.262.150) incluido A.I.U. y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

Adicional a lo anterior, se suscribió una modificación No.1 al contrato, con lo cual se incluyó dentro del alcance 8 sedes, arrojando como valor complementario a la inicial, la suma de CINCO MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.050.000.000).

Con esto, el valor total de interventoría asciende a DIECISÉISMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 16.991.262.150).

3.1. Información del contrato de interventoría

CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.:	No. CO1.PCCNTR.4155718
CONTRATISTA:	CONSORCIO TIG
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE ENERO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	DOCE (12) MESES
VALOR INICIAL:	$ 878.587.938
VALOR ADICIONES:	$ 371.557.799
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	$ 1.250.145.727
PLAZO TRANSCURRIDO:	DIEZ (10) MESES + DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO

3.2. Información del contrato de obra

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	ONCE (11) MESES
VALOR INICIAL:	$11.941.262.150

CONTRATO DE:	OBRA
VALOR ADICIONES:	$ 5.050.000.000
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	$ 16.991.262.150
PLAZO TRANSCURRIDO:	DIEZ (10) MESES CALENDARIO

3.3 Relación de Correspondencia

Para el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077645 se presenta en el Anexo 1.1.2. El listado relacionando la correspondencia entre contratista e interventoría.

3.4 Actividades de reunión

A la fecha se han ejecutado actas de reunión como soporte del control realizado por esta interventoría para lo cual se adjuntan copia de estos documentos en el Anexo 1.1.3

ACTAS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO		
FECHA	**ELABORADO POR**	**DESCRIPCIÓN**
23/10/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Entrega y recibo de espacios en la IED Liceo Femenino
23/10/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Definición de la ubicación de los tanques IED Fe y Alegría
25/10/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Solicitud de retiro de cerramiento IED Liceo Femenino
25/10/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Comité de seguimiento técnico
26/10/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Entrega de espejos en el salón de danzas IED Liceo Femenino
26/10/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Entrega de espacios en la IED Restrepo Millán sede D
27/10/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de ajuste de propuesta de la cubierta IED Marruecos y Molinos
30/10/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Exposición de alternativa de cubierta al rector IED Marruecos y Molinos
30/10/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Evaluación de muro divisorio IED Reino de Holanda sede A
02/11/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Comité de seguimiento técnico
03/11/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de alcance de emergencia IED Clemencia de Caycedo
08/11/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Nueva inspección por taponamiento de redes IED Gustavo Restrepo sede A
08/11/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Entrega parcial de espacios IED Diana

ACTAS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO		
FECHA	**ELABORADO POR**	**DESCRIPCIÓN**
		Turbay sede B
09/11/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Verificación del alcance general en la IED Fe y Alegría
09/11/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de redes hidrosanitarias IED Alfredo Iriarte sede A y B
15/11/2023	Interventoría – CONSORCIO TIG	Revisión de alcance del frente IED Jose Martí sede C

3.5 Informes Semanales

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el momento de corte del presente informe mensual, los cuales se adjuntan en el anexo 1.1.5.

Is No.	Fecha de inicio	Fecha de corte
40	16/10/2023	22/10/2023
41	23/10/2023	29/10/2023
42	30/10/2022	05/11/2023
43	06/11/2023	12/11/2023
44	13/11/2023	19/11/2023

4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

4.1 Avance físico

Durante el presente periodo se presenta un avance físico programado de 93,08% (según reprogramación No.2) y ejecutado de 81,78% del valor total del contrato, dando con ello una variación negativa de 11,30%. Cabe resaltar que estos porcentajes son generados sobre el valor total del contrato, incluyendo la respectiva adición No.1 de recursos y partiendo del análisis realizado sobre la reprogramación allegada por parte del contratista de obra y avalada por esta interventoría y que fue producto de la reunión llevada a cabo el 17 de julio de 2023, donde se expuso ante la SED la causa del atraso, concluyendo en que la programación se debe actualizar, descartando los rubros que no se van a ejecutar y que ya están causados a la fecha. Aunado a esto, es importante destacar que la mayoría de las causas que dan origen a ese atraso tan representativo, no son imputables al contratista de obra, por lo tanto, se prevé el trámite de una prórroga a los contratos de obra e interventoría por un término no mayor a cuatro (4) meses calendario, donde se ejecute la mayor parte del recurso que se adicionó mediante la modificación No.1 y de paso se intervengan las sedes que no han podido iniciar, dado los mayores alcances físicos a ejecutar en los frentes que actualmente están en ejecución.

4.2 Estado de ejecución de los frentes

Los frentes en los que se ejecutaron actividades durante el presente periodo mensual, se relacionan a continuación, así como un recuento de las obras llevadas a cabo:

Colegio José Martí: En vista que la cubierta no está trabajando adecuadamente sin canales y bajantes, durante el presente periodo se ve la necesidad de instalar estos elementos, para garantizar la recolección de las aguas lluvias.

Colegio Restrepo Millán sede C: Se está a la espera de la definición del procedimiento a seguir por parte de la Entidad Contratante, teniendo en cuenta que esa inestabilidad del talud no puede ser catalogada como una emergencia y su intervención debe involucrar unos estudios y diseños previos y de paso se debe evaluar la disponibilidad del recurso, lo cual no haría parte de este alcance contractual.

Colegio Diana Turbay: Se termina la intervención en el área de los salones y baterías y se procede a realizar la entrega a la IED. Seguidamente se inicia con la intervención en el patio central de la sede, donde se retira el adoquín existente, la capa de material de relleno y finalmente se reemplaza por tipo subbase, fundiendo finalmente la placa de contrapiso.

Colegio Enrique Olaya Herrera: Se realiza el proceso de la pulida del mesón con acabado en granito que se construyó en las baterías de los docentes, se realizar la reparación de una fuga

en uno de los baños de niñas, el destaponamiento de un sifón, entre otros, quedando pendiente solo algunos ajustes para realizar la entrega definitiva al colegio.

Colegio Reino de Holanda sede A: Se continúa con la intervención de los salones del primer nivel incluyendo la biblioteca y la sala de profesores. Se continúa con las actividades en las baterías del segundo nivel, siguiendo las directrices impartidas por parte de la SED en las visitas de campo. También se avanza con la aplicación de la pintura sobre los muros de la fachada y de cuenta en campo con las ventanas de la zona del auditorio.

Colegio Liceo Femenino: Se está a la espera de la habilitación de la cancha de voleybol para iniciar esa intervención.

Colegio Restrepo Millán sede B: Durante el periodo se finaliza la intervención en la zona administrativa, con la pulida del piso, terminación de cielo raso, entre otros. También se aplica la pintura para exteriores según las indicaciones impartidas desde la SED.

Colegio Fe y Alegría Palermo Sur: Se continúan con las actividades definidas en el alcance para los bloques de primaria, donde se pulen los pisos instalados, se construyen los andenes de las zonas de circulación, pintura en elementos estructurales, instalación de puertas, ventanas, entre otros. Se continua con la intervención del bloque de bachillerato, con el desmonte de la totalidad de la cubierta, instalación de estructura metálica y posteriormente la teja UPVC. También se continúa con el mantenimiento de las puertas, puntos eléctricos, entre otros. Se destaca que para ambos bloques se realizaron maniobras de rocería.

Colegio Manuel del Socorro sede A: Se finaliza con la intervención de la totalidad de las placas, incluyendo las que van en concreto estampado. Se inicia con la intervención de la pergola según diseño suministrado desde la SED y con la fabricación de la tienda escolar, también siguiendo las instrucciones desde el contratante. Adicionalmente, se instalan los postes metálicos con sus luminarias y de paso se empieza con el proceso que da como resultado la pintura en el área de las canchas.

Colegio Rafael Delgado Salguero sede A: Se realiza la intervención en el área administrativa, con previo retiro del mobiliario existente en la zona. Esto involucra el cambio de la cubierta, la instalación de la estructura metálica, cielo raso, redes eléctricas, entre otros.

Colegio Gustavo Restrepo sede B: Se continua con la intervención en este frente con la reposición de la teja de los bloques antiguos con previa aplicación de la pintura sobre la estructura metálica. Durante el presente periodo se finaliza con esta intervención. El otro bloque no se tiene contemplado intervenir, ya que el mismo está cubierto por una póliza de estabilidad y calidad de obra de otro contrato.

Colegio Marruecos y Molinos sede A: Durante el presente periodo mensual se logran reanudar actividades en este frente, llegando a la construcción de la placa de contrapiso y al

avance en taller de prácticamente toda la estructura metálica, incluyendo la compra de la cubierta.

Colegio Quiroga Alianza sede B: Se continua con la intervención la zona de la maloka, donde se construye la cimentación y se avanza en taller en la estructura metálica propuesta.

Colegio Gustavo Restrepo sede A: Se continuan labores de fabricación de módulos de cerramiento in situ y se avanza con el desmonte y reposición de los existentes. Estas labores se llevan a cabo sin mayores contratiempos.

Colegio el Libertador sede B: Se finaliza con el vaciado de la totalidad de las placas de concreto, se construye la cuneta perimetral para el manejo de las aguas lluvias y se instalan las canchas.

Colegio el Libertador sede C: Se realiza el desmonte de la cubierta de la zona del patio y se avanza en la estructura metálica propuesta y acordada con la SED.

Taller de la bicicleta: Se continúa con la construcción de la placa sobre la cual se fijará el cerramiento perimetral, dejando la misma culminada durante el presente periodo mensual.

4.3 Control de hitos

Con base en la programación presentada por parte del contratista de obra y verificando el estado de los frentes en obra, se cuenta con la siguiente información al respecto:


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR	29/07/2023		No iniciado
10	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO	29/07/2023	26/06/2023	33
11	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	29/07/2023		No iniciado
12	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	27/02/2023	27/02/2023	0
13	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	29/07/2023	12/06/2023	47
14	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL	29/07/2023		No iniciado
15	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	29/07/2023	22/05/2023	68
16	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	29/07/2023	13/10/2023	-76
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	29/07/2023		No iniciado
18	COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR	28/04/2023	28/04/2023	0
19	COLEGIO FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS	29/07/2023		No iniciado
20	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	29/07/2023	25/05/2023	65
22	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	3/04/2023	3/04/2023	0
23	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	29/07/2023		No iniciado
24	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	29/07/2023	4/10/2023	-67
25	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	29/07/2023		No iniciado
29	TALLER BICICLETERO		9/10/2023	
30	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

Cabe resaltar que estas fechas de inicio fueron tomadas de la reprogramación No.2 enviada por parte del contratista de obra y avalada por parte de la interventoría.

4.4 Avance financiero

Durante el presente periodo se presenta un avance financiero programado de $ 15.815.283.272,16 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 0.16 M/CTE) y ejecutado de $ 13.895.935.544,35 (TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 0.35 M/CTE).

Periodo	Acumulado Mensual	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
MES 10	$ 15.815.283.272,16	$ 13.895.935.544,35

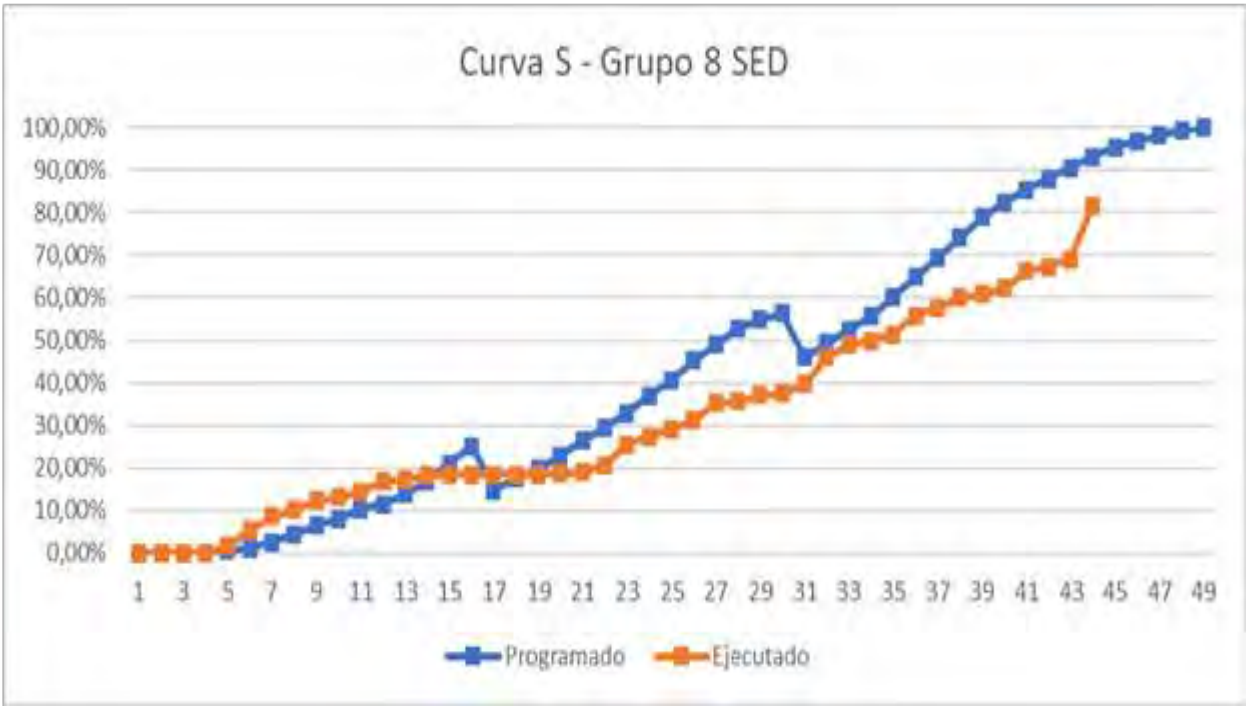

Fuente. Informe semanal de interventoría

5. INFORMACIÓN LEGAL Y PRESUPUESTAL

5.1 Contrato de obra – Control actas parciales de obra

En cuanto al comportamiento financiero del contrato de obra con corte en el periodo actual, el mismo se relaciona a continuación:

CONTROL DE PAGOS DE ACTAS PARCIALES DE OBRA					
Acta No	Fecha	Valor Total	Amortización anticipo	Valor pagado	% pagado acumulado
No.1	19/02/2023	$ 203.058.871	$ 0.00	$ 203.058.871	1,61%
No.2	19/03/2023	$ 1.278.337.626	$ 0.00	$ 1.278.337.626	10,71%
No.3	19/04/2023	$ 704.473.264	$ 0.00	$ 704.473.264	12,86%
No.4	19/05/2023	$ 810.966.333	$ 0.00	$ 810.966.333	17,63%
No.5	19/06/2023	$ 1.256.728.708	$ 0.00	$ 1.256.728.708	25,03%
No.6	19/07/2023	$ 1.921.711.106	$ 0.00	$ 1.921.711.106	36,34%
No.7	19/08/2023	$ 1.639.064.784	$ 0.00	$ 1.639.064.784	45,99%
No.8	19/09/2023	$ 1.795.741.475	$ 0.00	$ 1.795.741.475	56,56%
No.9	19/10/2023	$ 1.732.243.654	$ 0.00	$ 1.732.243.654	66,27%
No.10	19/11/2023	$ 2 .611.817.048,00	$ 0.00	En proceso	81,67%

5.2 Contrato de interventoría – Control actas parciales de interventoría

En cuanto al comportamiento financiero del contrato de interventoría con corte en el periodo actual, el mismo se relaciona a continuación:

CONTROL DE PAGOS DE ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA				
Acta No	Fecha	Valor Total	% pagado acumulado	Concepto
No.1	19/02/2023	$ 14.189.195	1,61%	Avance contrato de obra - pagado
No.2	19/03/2023	$ 89.351.980	10,71%	Avance contrato de obra - pagado
No.3	19/04/2023	$ 57.187.615	12,86%	Avance contrato de obra - pagado
No.4	19/05/2023	$ 59.667.498	17,63%	Avance contrato de obra - pagado
No.5	19/06/2023	$ 92.385.769	25,03%	Avance contrato de obra - pagado
No.6	19/07/2023	$ 141.391.481	36,34%	Avance contrato de obra - pagado
No.7	19/08/2023	$ 120.639.063	45,99%	Avance contrato de obra –pagado
No.8	19/09/2023	$ 132.140.403	56,56%	Avance contrato de obra –pagado
No.9	19/10/2023	$ 127.514.864	66,27%	Avance contrato de obra –pagado
No.10	19/11/2023	$ 192.147.398	81,67%	En proceso

5. CONCLUSIONES

- Se continúa llevando a cabo en campo la toma de medidas para la actualización constante de los presupuestos, lo cual permita realizar una delimitación adecuada de los alcances, conforme a los montos agotables que están asignados de manera estimativa para cada frente y bajo las indicaciones de la SED. Esta labor se ha venido exponiendo con la SED, buscando dirimir las dualidades que puedan existir. Generalmente se realiza en los comités de seguimiento técnico.

- El contratista de obra continúa sin venir correspondiendo de manera diligente con la gestión administrativa que le corresponde, ya que presenta demoras en la entrega de fichas, presupuestos, cronogramas e informes mensuales. Esto ha traído consigo una serie de llamados de atención en comités de seguimiento y mediante comunicados, los cuales tampoco han causado el efecto esperado.

- Han venido surgiendo unas nuevas actividades no previstas, de las cuales se han venido proponiendo los APU's no previstos con sus debidos soportes y se han enviado a la Entidad Contratante. También se ha hecho uso del precio de las actividades que hacen parte del listado de referencia de la SED.

- Por parte de la SED se continúa estimando una posible adición de recursos No.2 y una ampliación en el plazo de ejecución, teniendo en cuenta que en primera instancia se adicionó al contrato de obra pero no se prorrogó.

- La prórroga mencionada en el punto anterior, se estima que sea por cuatro (4) meses y con ese plazo adicional se redistribuirá el recurso en el tiempo, aliviando el atraso causado a la fecha, el cual no es imputable a la firma contratista de obra.

2. ANEXOS

ANEXO 1. INFORME BÁSICO
ANEXO 1.1. INFORME ADMINISTRATIVO
Anexo 1.1.1. Control de personal contratista
Anexo 1.1.2. Relación de correspondencia
Anexo 1.1.3. Actas de reunión
Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría
Anexo 1.1.5. Informes semanales
Anexo 1.1.6. Pólizas Contrato de obra
Anexo 1.1.7. Pólizas Contrato de interventoría

ANEXO 1.2. INFORME TÉCNICO
Anexo 1.2.1. Soportes control de calidad
Anexo 1.2.2 Bitácora de obra
Anexo 1.2.3 Registro fotográfico

ANEXO 1.3. INFORME SST

ANEXO 1.4. INFORME AMBIENTAL

ANEXO 1. INFORME BASICO

ANEXO 1.1 INFORME ADMINISTRATIVO

Anexo 1.1.1. Control de personal de contratista

CONSORCIO TIG	**CONTROL DE PERSONAL**				ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS				
TIPO DE CONTRATO	OBRA				
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645				
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"				
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP				
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG				
INFORME MENSUAL	**10**	**Periodo**	20/10/2023	**al**	19/11/2023

FECHA 19 | 11 | 2023

DÍA DOMINGOS Y FESTIVOS	
PERSONAL QUE ASISTE	**X**
PERSONAL QUE NO ASISTE	**N**
PERSONAL RETIRADO	**R**
PERSONAL INGRESADO	**IN**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESDE		**20-oct-23**									**HASTA**											**19-nov-23**										
DIA		**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**28**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
PERFIL		**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**
Director de obra		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Residentes de obra		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Asesor Estructural		X	X																												
Asesor Ambiental		X						X		X					X		X					X		X					X		
Técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo		X	X				X			X				X	X		X				X	X		X				X	X		X
Asesor en Redes Eléctricas			X						X							X						X								X		
Asesor Hidrosanitario		X					X							X							X							X				
Profesional de costos			X					X							X		X							X						X		
Inspectores de obra		X	X				X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X		X
Maestro de obra		X	X				X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	X		X

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DÍAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1 PCCNTR 4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Octubre al 19 de Noviembre
FRENTE DE OBRA	IED EL LIBERTADOR SEDE B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra	1																														
Oficial de obra	1	1		1							1	1		1	1				1	1							1				
Ayudante de obra	1	1									1	1	1						1	1							1				
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															

FIRMA: Jhon R

NOMBRE: Jhon Rocha

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR 4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Octubre al 19 de noviembre
FRENTE DE OBRA:	IED MARRUECOS Y MOLINOS

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra																															
Oficial de obra	1													1	1	1				1	1	1	1		1	2	2	2	2	2	
Ayudante de obra	1													2	2	1				2	2		2		1	1	1	1	1	1	
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															

FIRMA: Jhon R

NOMBRE: Jhon Rocha

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1 PCCNTR 4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 a Octubre al 19 de Noviembre
FRENTE DE OBRA	IED RAFAEL DELGADO SALGUERO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra																															
Oficial de obra																													1	1	
Ayudante de obra																											1	1	1	1	
Electricista																2										1	1	1			
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes electricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Instaladores de Cubierta											3	3				5	4		4												

FIRMA: Jhon R

NOMBRE: Jhon Rocha

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDGAR RICARDO [illegible] DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1 PCCNTR 4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Octubre al 19 de Noviembre
FRENTE DE OBRA:	TALLER BICICLETERO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL / DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra																															
Oficial de obra																					1	1	1			1	1	1	1	1	
Ayudante de obra							1	1	2	2	1	2	1						2	2	1	1	1			1	1	1	1	2	
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)						1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	-	
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															

FIRMA: Jhon R
NOMBRE: Jhon Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCONTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	10 — Periodo: 20 de octubre de 2023 — al — 19 de noviembre 2023
FRENTE DE OBRA:	Colegio Gustavo Restrepo - Sede A

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	LF	M	Mi	J	V	S	D	LF	M	Mi	J	V	S	D
Maestro de obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Oficial de obra	0	0	0	1	1	1	1	1	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	1	1	1	0	/
Ayudante de obra	0	0	0	1	1	1	1	1	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	1	1	1	1	/	/	2	2	1	1	1	/
Electricista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Pionero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Operador de maquinaria (constante)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Soldador	2	2	2	0	1	2	2	2	0	/	2	2	2	2	2	2	/	/	2	2	2	2	2	/	/	2	2	2	2	2	/
Carpinteros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Especialista en redes eléctricas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Especialista en estructuras	1	1	0	1	1	1	0	1	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	1	0	0	0	/
Especialista en redes hidrosanitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Asesor ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/

FIRMA: _____

NOMBRE: María A. Angarita

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA: _____

NOMBRE: GESTION RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1 PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de octubre 2023 al 19 de noviembre 2023
FRENTE DE OBRA:	Colegio Quiroga Alianza.

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra			/							/			0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Oficial de obra			/		\					/			1	1	1	1	/	/	1	1	1	1	1	/	/	1	1	1	1	1	/
Ayudante de obra			/		\					/			1	1	1	1	/	/	1	1	1	3	3	/	/	3	3	2	2	2	/
Electricista			/		\					/			0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Plomero			/		\					/			0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Operador de maquinaria (constante)			/		\					/			0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Soldador			/		\					/			0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Cargadores			/		\					/			0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Especialista en redes eléctricas			/		\					/			0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Especialista en estructuras			/		\					/			0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Especialista en redes hidrosanitarias			/		\					/			0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Asesor ambiental			/		\					/			0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/

FIRMA: Marta Alejandra Angarita C.

NOMBRE: Marta Alejandra Angarita C.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUANTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1 PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	10 — Periodo: 20 de Octubre de 2023 — al — 19 de noviembre 2023
FRENTE DE OBRA:	Colegio Fe y Alegría

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	Mi	J	V	S	D	LF	M	Mi	J	V	S	D
Maestro de obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Oficial de obra	2	2	1	2	2	3	3	4	4	/	5	3	3	3	1	1	/	1	1	3	3	3	3	/	2	3	3	3	3	2	/
Ayudante de obra	6	6	3	6	6	6	5	4	4	/	6	6	5	5	5	4	/	4	4	5	8	9	8	/	4	8	9	9	9	9	/
Electricista	3	3	0	3	3	3	3	3	3	/	2	2	1	1	1	4	/	4	4	4	4	4	4	/	0	4	4	4	4	3	/
Pionero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Operador de maquinaria (constante)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Soldador	0	1	0	0	1	0	0	0	0	/	0	0	0	2	1	2	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	1	1	1	1	/
Carpinteros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Especialista en redes eléctricas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Especialista en estructuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Especialista en redes hidrosanitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Asesor ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Residente de obra	0	0	0	0	1	0	0	1	1	/	0	1	1	1	1	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/

FIRMA:
NOMBRE: María Alejandra Angarita
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCONTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS, Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	10 — Periodo: 20 de octubre de 2023 — al: 19 de noviembre 2023
FRENTE DE OBRA:	Colegio Restrepo Millán Sede D

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	LF	M	Mi	J	V	S	D	LF	M	Mi	J	V	S	D
Maestro de obra	0	0	0	0	0	0	1	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Oficial de obra	1	1	0	1	1	0	1	0	0	/	1	1	1	1	1	1	/	/	1	0	1	0	0	/	0	0	1	1	1	1	/
Ayudante de obra	0	0	0	0	0	1	0	0	0	/	0	0	1	1	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	2	0	1	0	/
Electricista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Plomero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Operador de maquinaria (constante)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Soldador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Cerrajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Especialista en redes eléctricas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Especialista en estructuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Especialista en redes hidrosanitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/
Asesor ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/	/	0	0	0	0	0	/

FIRMA

NOMBRE: Maira Alejandra angarita

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: EDISON RICARDO [illegible]

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCONTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	10 — Periodo: 20 de Octubre de 2023 — al — 19 de Noviembre 2023
FRENTE DE OBRA:	Colegio Diana Turbay - Sede B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Oficial de obra	9	9	5	11	5	7	7	6	6	5	5	1	1	1	1	1	/	2	2	1	1	0	1	/	1	1	1	0	1	1	/
Ayudante de obra	1	1	1	2	2	2	2	8	8	2	2	1	1	1	1	1	/	4	4	0	0	0	1	/	1	1	1	0	1	1	/
Electricista	3	3	3	4	3	3	3	0	0	—	2	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Plomero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Operador de maquinaria (constante)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Soldador	6	6	2	7	2	2	6	6	6	2	2	2	0	0	0	0	/	0	0	1	1	1	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Carpintero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Especialista en redes eléctricas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Especialista en estructuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Especialista en redes hidrosanitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Asesor ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0	0	0	/
Inspector	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	1	1	1	0	/	0	0	1	0	1	0	/

FIRMA

NOMBRE: María Alejandra Angarita G.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: EDISON RICARDO CUATIN

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Octubre al 19 de Noviembre
FRENTE DE OBRA:	Gustavo Restrepo Sede B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L.F	M	M	J	V	S	D	L.F	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra																															
Oficial de obra																															
Ayudante de obra																															
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Cubierta					4	4	3			2	2	4	4	4					2	4	4	4			4	4	4	4			

FIRMA: Yovany T.

NOMBRE: Yovany Tarazona

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Octubre al 19 de Noviembre
FRENTE DE OBRA:	Manuel de Socorro Sede A

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra																															
Oficial de obra	1	1		1	1	1	1				1	1		1																	
Ayudante de obra	1	1		1							1																				
Electricista	1	1		1		1																									
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																										4	4	3	3	3	
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Aseo																			2												
Pintura Cenchas																				2	2	2	2			2	2	2	3	3	

FIRMA: Yovany T.

NOMBRE: Yovany Torozong

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Octubre al 19 de Noviembre
FRENTE DE OBRA:	Reina de Holanda Sede A

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	LA	M	M	J	V	S	D	LA	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra											1	1	1																		
Oficial de obra	2	2		2	2	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
Ayudante de obra	4	4		4	4	4	4	4			3	3	3	3	3	3			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
Electricista						1	1	1			2	2	1	2	2	2				1											
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador								1																							
Carpinteros																											3				
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Pulida de Piso																				1	1										
Pintora fachada																										4	4	4	4	4	

FIRMA: Yorany T.

NOMBRE: Yorany Torazona

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Octubre al 19 de Noviembre
FRENTE DE OBRA:	Reno de Holanda Sede B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra																															
Oficial de obra					1	1													1												
Ayudante de obra																															
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															

FIRMA: Yovany T.

NOMBRE: Yovany Tarazona

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Octubre al 19 de Noviembre
FRENTE DE OBRA:	Restrepo Millan Sede B

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL \ DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M.	J.	V	S	D	L.F	M	M	J	V	S	D	LF	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra																										1	1				
Oficial de obra	2	2		2	2	2	2	2			1	1	2	3	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
Ayudante de obra	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	2	2	2	2			1	1	2	2	1	
Electricista	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental							1																								
Cubierta																															

FIRMA: Yovany T.

NOMBRE: Yovany Tarazona

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG
INFORME MENSUAL	Periodo: 20 de Octubre al 19 de Noviembre
FRENTE DE OBRA:	Liceo Femenino Mercedes Nariño

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERSONAL	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	Lf	M	M	J	V	S	D	Lf	M	M	J	V	S	D
Maestro de obra																															
Oficial de obra																															
Ayudante de obra						2																									
Electricista																															
Plomero																															
Operador de maquinaria (constante)																															
Soldador																															
Carpinteros																															
Especialista en redes eléctricas																															
Especialista en estructuras																															
Especialista en redes hidrosanitarias																															
Asesor ambiental																															
Instalador de Espejos						3																									

FIRMA: Yovany T.
NOMBRE: Yovany Torazona
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Anexo 1.1.2. Relación Correspondencia

Relación Salidas

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO	NÚMERO DE RADICADO	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
19/10/2023	TIG-MEM-373	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 DIANA TURBAY Y FE Y ALEGRIA	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	N/A	N/A
20/10/2023	TIG-MEM-374	Respuesta a correo electrónico del 19 de octubre de 2023 - APU's no previstos NP-25, NP-26, NP-27, NP-33, NP-34, NP-36 y NP-40.	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
23/10/2023	TIG-MEM-375	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.40	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
25/10/2023	TIG-MEM-376	Solicitud de adición No.2 y prórroga No.1 correspondiente al contrato de obra No.CO1.PCCNTR.4077645	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
25/10/2023	TIG-MEM-377	Solicitud de adición No.2 y prórroga No.1 correspondiente al contrato de interventoría No.CO1.PCCNTR.4155718	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
24/10/2023	TIG-MEM-378	Remisión de APU's no previstos NP41, NP42, NP43, NP46, NP48 y NP50 para revisión	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
25/10/2023	TIG-MEM-379	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 GUSTAVO RESTREPO	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	N/A	N/A

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO	NÚMERO DE RADICADO	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
25/10/2023	TIG-MEM-380	SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No.9	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
25/10/2023	TIG-MEM-381	SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.9	Atentamente, Edgar Alfredo Salazar Bernal Representante legal CONSORCIO TIG Nit: 90164989-03	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
30/10/2023	TIG-MEM-382	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.41	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
31/10/2023	TIG-MEM-383	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.9	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
1/11/2023	TIG-MEM-384	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 FE COLEGIOS FE Y ALEGRIA, RESTREPO MILLAN	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	N/A	N/A
1/11/2023	TIG-MEM-385	Actualización de pólizas según modificación No.1 al contrato de interventoría	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: NANCY GUAYABO RODRÍGUEZ Profesional Universitario – Oficina de contratos	N/A	N/A
7/11/2023	TIG-MEM-386	Remisión de APU's no previstos NP29, NP45 y NP49 para revisión	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO	NÚMERO DE RADICADO	CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13/11/2023	TIG-MEM-387	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.43	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A
14/11/2023	TIG-MEM-388	Primer llamado de atención por incumplimiento a entrega de informe mensual de obra No.9	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	N/A	N/A
16/11/2023	TIG-MEM-389	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 FE COLEGIOS FE Y ALEGRIA, DIANA TURBAY, GUSTAVO RESTREPO	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	CONSORCIO MIA GP Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR Representante legal	N/A	N/A
19/11/2023	TIG-MEM-390	RADICACION DE INFORME SEMANAL No.44	EDISON RICARDO DUARTE Director de interventoría CONSORCIO TIG	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente	N/A	N/A

Nombre: *EDISON RICARDO DUARTE DÍAZ*
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-373

Bogotá, D.C, octubre 19 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 DIANA TURBAY Y FE Y ALEGRIA

Respetados señores:


En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Johan Andrés Gómez	1.023.971.131	Ayudante	Diana Turbay
2	Benedicto Olaya Quimbaya	19.254.441	Ayudante	Fé y Alegría
3	Edgar Alfonso Orozco Cuellar	1.007.356.243	Ayudante	Diana Turbay

CONSORCIO TIG

Sin otro particular,

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe
Anexo. Documentación del personal


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.023.971.131
GOMEZ BARBOSA
JOHAN ANDRES
Johan Gomez B


FECHA DE NACIMIENTO 13-SEP-1998
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
21-SEP-2016 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 17/10/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	313	18/10/2023	CC 1023971131	GOMEZ BARBOSA JOHAN	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

1462458AB6FBC5AEF6C619D5F3CF00A3 Certificado impreso el día 10/17/2023 10:06:07 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

JOHAN ANDRES
GOMEZ BARBOSA
1023971131

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JOHAN ANDRES GOMEZ BARBOSA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.023.971.131**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 17 de Octubre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

El aportante JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR identificado con CC 13240346 inscribio al señor JOHAN ANDRES GOMEZ BARBOSA identificado con CC 1002136783 con fecha de ingreso 17 octubre de 2023.

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 17 días del mes de octubre de 2023.

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención Servicios de Salud (601) 4441234.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO COMPENSAR

CER-CAR 12786260

VIGILADO Supersalud
VIGILADO SuperSubsidio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **19.254.441**

OLAYA QUIMBAYA

APELLIDOS

BENEDICTO

NOMBRES

Benedicto Olaya

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-SEP-1954**

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

13-ENE-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-8881515-00649609-M-0019254441-20160917 0051276809A 1 45482417

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 17/10/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	314	18/10/2023	CC 19254441	OLAYA QUIMBAYA BENEDICTO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

1462458AB6FBC5AEF6C619D5F3CF00A3 Certificado impreso el día 10/17/2023 11:10:08 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

BENEDICTO
OLAYA QUIMBAYA
19254441
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
7825004-17102023	17 10 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
OLAYA (Primer apellido)	QUIMBAYA (Segundo apellido)	BENEDICTO (Primer nombre)	(Segundo nombre)

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	19254441	Femenino [ ] Masculino [X]	2 2 0 9 1 9 5 4

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	COLFONDOS	1.160.000

18. Residencia			
CALLE 34 N 32 89 (Dirección)	67986854 (Teléfono)	3223045698 (Teléfono celular)	benedictoolaya@gmail.com (Correo electrónico)

BOGOTA D.C. (Municipio/Distrito)	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	SUBA (Localidad/Comuna)	BOGOTA D.C. (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
CALLE 3A 7B 149 (Dirección)	5801473 (Teléfono)	obras.jovavi@gmail.com (Correo electrónico)	LOS PATIOS (Municipio/Distrito)	NDS (Departamento)

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
OLAYA	QUIMBAYA	BENEDICTO	

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	19254441	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
BENEDICTO OLAYA QUIMBAYA CC 19254441	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
  Cantidad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) BENEDICTO OLAYA QUIBAYA identificado(a) con C.C No. 19254441, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 17 de octubre del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
1.007.356.243
CARDOZO CUELLAR


23-ENE-1997
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
1.65
A+
M

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 19/10/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	315	20/10/2023	CC 1007356243	OROSCO CUELLAR EDGAR	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

3C9106F594359902A1205DDA6B827575 Certificado impreso el día 10/19/2023 9:18:45 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EDGAR ALONSO
OROSCO CUELLAR
1007356243

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

No. de Radicación 28211929

Fecha de Radicación 19/02/2023

RADICADO

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de Trámite	2.Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A.Individual [ ] Cotizante o Cabeza Familia [X] Beneficiario o Familiar adicional [ ] B. Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5.Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
OROSCO	CUELLAR	EDGAR	ALONSO
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	1007356243	Femenino [ ] Masculino [X]	27/01/1997

III.DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
06	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]		00

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	006 / PORVENIR	1.160.000

18. Residencia			
AVENIDAD 34 B N 78 21	3133138066	3133138066	andersonjairandrade@hotmail.com
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico

54001 / CUCUTA	Zona Urbana [X] Rural [ ]		54 / NORTE DE SANTANDER
Municipio/Distrito		Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyugue o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR	SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R	30600433	30600437
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	0 1

39. Ubicación				
CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA	5801473	obras.joyavi@gmail.com	LOS PATIOS	NORTE DE SANTANDER
Dirección	Teléfono	Correo electronico	Municipio/Distrito	Departamento

Famisanar EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	1 9 1 0 2 0 2 3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **EDGAR ALFONSO OROSCO CUELLAR** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1007356243,** se encuentra afiliado/a desde **03/05/2018** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 19 de octubre de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-374

Bogotá, D.C, 20 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Respuesta a correo electrónico del 19 de octubre de 2023 - APU's no previstos NP-25, NP-26, NP-27, NP-33, NP-34, NP-36 y NP-40.

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite dar respuesta al correo electrónico allegado el 19 de octubre de 2023 por parte de la supervisión y relacionados con las siguientes actividades no previstas, a saber:

- NP-27 - Suministro e instalación de protección en malla expandida calibre 18, arco en ángulo 1 x 1/8, incluye pintura.

- NP-33 - Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largo (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cm de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cm de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

- NP-34 - Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

- NP-36 - Suministro e instalación de conexión sanitaria para sanitario fluxómetro.

Teniendo en cuenta las observaciones identificadas por parte del área de estudios previos de la Entidad, se remite los archivos debidamente ajustados para su nueva revisión.

Por otra parte y en relación al memorando I-2023-101567 del mes de septiembre de 2023, nos permitimos remitir los APU's relacionados con la atención de la emergencia del Liceo Femenino que presentaron duplicidad en el consecutivo, ya que por error de edición se tomaron indebidamente los numerales 23 y 24, cuando realmente correspondían los numerales 25 y 26. Se anexan los APU's nuevamente con los ajustes de forma, a fin de que la Entidad Contratante proceda con la aclaración y con ello la autorización para el pago de estas actividades. En resumen, las actividades que merecen tal ajuste se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO APROBADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO APROBADO INCLUIDO AIU (28.19%) DEL CONTRATISTA
NP-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL A SEIS (6) AGUAS CON CORTES TRANSVERSALES SIGNIFICATIVOS POR DESPIECE, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES	M2	$ 194.509,00	$ 249.341,00
NP-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES	M2	$ 149.282,00	$ 191.365,00

Adicional a todo lo anterior, adjuntamos el APU NP-40 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, SECCION INTERNA 30 cm x 50 cm (altura); e= 10 cm (no incluye acero), le cual ya fue revisado de manera extraoficial y cuenta con un preacuerdo entre las partes, con el fin de que se expida un ultimátum sobre el mismo.

CONSORCIO TIG

Quedamos atentos a sus comentarios a que haya lugar, propendiendo por su aval definitivo y posterior materialización en obra.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Cincuenta y siete (57) folios

APUS 25, 26, 27, 33, 34, 36 Y 40

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, ARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	113.355,90	5.667,8
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	0,60	2.700,0
				SUBTOTAL	8.367,8

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Ángulo G50 1/8" x 1" x 6m	und	0,95	44818	$ 42.577,10
Soldadura 6013 1/8west arco	kg	0,3	21105	$ 6.331,50
Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	m2	1,05	51894	$ 54.488,70
pintura en aceite	gl	0,07	112000	$ 7.466,67
Disolvente o Diluyente thiner	litro	0,1	32000	$ 3.200,00
			SUBTOTAL	114.064

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)	1		m3/km	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	1.500

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Soldador	94.279	52,13%	143.427	0,4500	64.542,2
Ayudante soldadura	71.304	52,13%	108.475	0,4500	48.813,8
				SUBTOTAL	113.356
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 237.288,00
AIU CONTRACTUAL 28,19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 66.891,49
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 304.179,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) dias del mes de agosto del año 2023
,

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: Edisson Ricardo Duarte
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-27 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

El SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA, se requiere para proteger vidrios y ventanas y también impedir el ingreso de elementos que puedan golpear o lastimar a los estudiantes en el interior de las aulas y espacios de los colegios.



Hola

Imagen modelo de malla de protección a instalar.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-27- SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA

UNIDAD:m2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1X 1/8, INCLUYE PINTURA

EJECUCIÓN:

- Establecer la ubicación del marco
- Rectificar medidas del elemento
- Verificar puntos de anclaje
- Ensamblar el elemento de acuerdo con el área de la ventana interna a proteger
- Verificar niveles, plomos y escuadras de elemento a instalar
- Realizar fijación con tornillo en cuatro aristas de la ventana
-

MATERIALES:

- Ángulo G50 1/8" x 1"x 6m (10.98kg)
- Soldadura 6013 1/8west arco
- Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18
- pintura en aceite
- Disolvente o Diluyente thiner

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en altura

TRANSPORTE:

- Furgón.
-

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, MARCO EN ANGULO 1 X 1/8, INCLUYE PINTURA ,recibidos a satisfacción por la interventoría.

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para Bogota D.C.

Mi Cuenta

Home > Construcción y Ferretería > Materiales de Construcción > Tubos y Perfiles Metálicos > Ángulos, Platinas, Cuadrados y Redondos > Angulo 6m x 1 x 1/8 pulg



Multimarcas

Código 103061

Angulo 6m x 1 x 1/8 pulg

5.0 (2)

$45.350 und

$7.558,33 METRO

− 1 + Agregar al carro

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C. | Compra con un Experto

Danos tu opinión

metropoliscenter.com.co/p/angulo-hierro-1-x-1-8-leg/

Hacemos Tu Vida Más Facil | Oferta del día | Productos Nuevos | Outlet | Historial | Comprar de Nuevo | Eventos

INICIO > FERRETERÍA > FERRETERÍA EN GENERAL > Angulo Hierro 1 X 1/8 Leg



Angulo Hierro 1 X 1/8 Leg

SKU: 0979

EAN: 0979

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

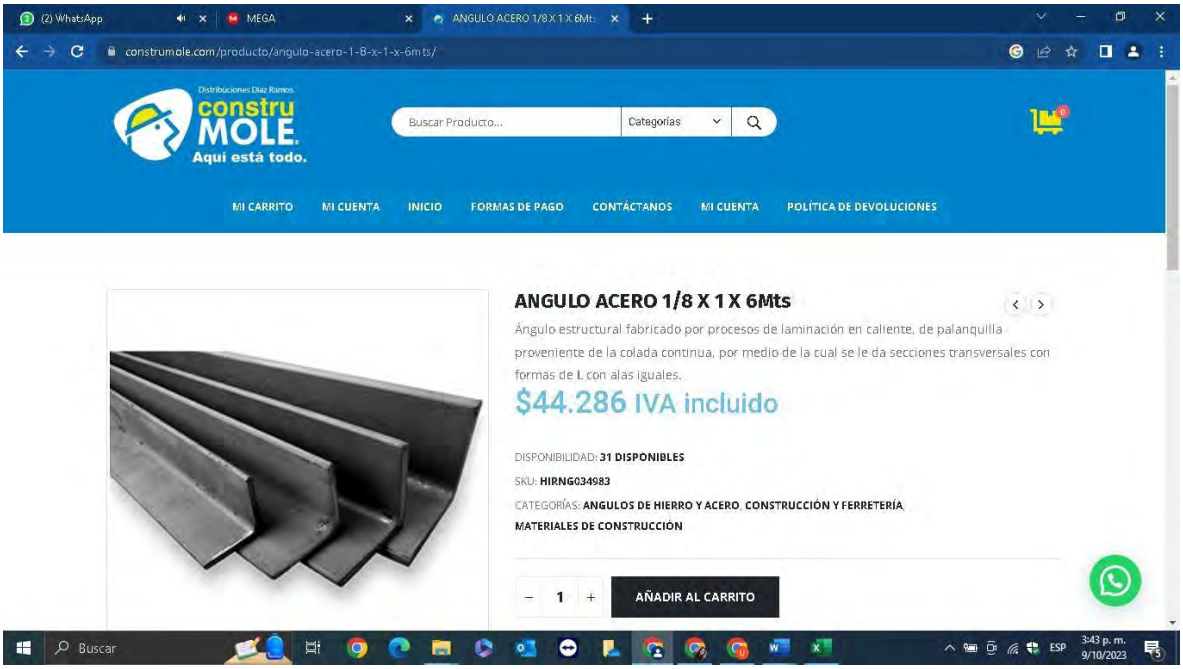
Precio por unidad: **$55,600**

Disponible

Cantidad: − 1 +

Agregar al Carro

Costo del envío: A calcular


(2) WhatsApp
MEGA
ANGULO ACERO 1/8 X 1 X 6Mts
construmole.com/producto/angulo-acero-1-8-x-1-x-6mts/
Distribuciones Diaz Ramos
construMOLE
Aquí está todo.
Buscar Producto...
Categorías
MI CARRITO
MI CUENTA
INICIO
FORMAS DE PAGO
CONTÁCTANOS
MI CUENTA
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
ANGULO ACERO 1/8 X 1 X 6Mts
Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales.
$44.286 IVA incluido
DISPONIBILIDAD: 31 DISPONIBLES
SKU: HIRNG034983
CATEGORÍAS: ANGULOS DE HIERRO Y ACERO, CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1
AÑADIR AL CARRITO
Buscar
ESP
3:43 p. m.
9/10/2023

FERROPETROL

INICIO CONTACTO

Inicio / Perfiles, Mallas y Rejillas / Mallas Expandidas / Malla Expandida Cr IMT 30 X 1 Cal 18



Malla Expandida Cr IMT 30 X 1 Cal 18

30 disponibles

$44.000

SKU 18770 | Categoría Mallas Expandidas

Información adicional

Unidad	Metro
Subcategoria	Malla Expandida HR y CR

Cotización: OV143885

PROCASA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SAS NIT: 901531834

CR 18 60C 13
Colombia Bogotá
3143826320 - 3143826320
procasaconstrucción@gmail.com

Peso Total
490.44
Fecha
25-07-2023
Vigencia 1 día

Descripción	Cantidad	Medida	Peso	Precio Unitario	Precio Total
Tubo Cerramiento Galvanizado 1.1/2" (D.Ext. 48.3mm) (2.0mm) x 6m	17.00	Unidades	232.90	82,200.00	1,397,400.00
Soldadura West Arco ZIP10T (E6010) 1/8" (Ref.504195)	5.00	kg	5.00	19,756.80	98,784.00
Ángulo G50 1/8" x 1.1/2" x 6m (10.98kg)	15	Unidades	252.54	75,762.00	1,136,430.00
Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	56	M2		42,716.00	2,395.000

Base:	$ 5,027,614.00
Impuestos:	$ 955,246000
Total:	$ 5,982,860.66

Observaciones:
Validez oferta en precios 5 días
Inventario sujeto a disponibilidad al momento de la compra formal.
Forma de pago: Contado anticipado.
Disponibilidad del material: Inmediata.
Tiempo de entrega: De 2 a 3 dias sobre disponibilidad.
Sitio de entrega: El material se ofrece puesto sobre camión en su bodega en Bogotá y/o su perimetro urbano. (Material se ofrece libre de descargue).
Despacho minimo de nuestra cuenta: 1000 kilos en longitud. de 6 metros y/o 5.000 kilos en longitud de 12 metros.
Materiales certificados por el molino del país de origen.

¡APRECIADO CLIENTE!
ES OBLIGATORIO PRESENTAR PLANILLA DE ARL AL DÍA, PARA EL INGRESO A NUESTRAS INSTALACIONES AL MOMENTO DE RETIRAR CUALQUIER MATERIAL.

Estimado cliente Recuerde que también ofrecemos
productos suplementarios como soldadura West Arco o ESAB,
discos de corte Abracol,discos de pulir Abracol,
anticorrosivo y esmalte marca Bler y si es de su interes la plancha masterdeck, quedo atento a su requerimiento

NIT: 900 499 032 - 2

STECKERL ACEROS S.A.S.

Calle 7 # 27-79 Tel:(071) 7446262 - (071) 7434242

BOGOTA - CUNDINAMARCA (COLOMBIA)

COTIZACIÓN: 27COT2023001301

Cotizado a	Datos de la Transacción		Doc. Origen	
CONSORCIO MIA GP	**Orden de Compra:**	WHATSAPP	**Fecha**	**25/07/2023**
CR 18 No 60 C - 13 S	**Condición Pago:**	MOSTRADOR	**Fecha Venc.**	**25/07/2023**
BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C	**Id. vendedor:**	ADRIANAC	**Elaborado por**	**JENNYCH**
(314) 382-6320 Ext. 0000	**Modo de envío:**	CLIENTE RECOGE	**Enviar a:**	
	Fecha Entrega:	25/07/2023	PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS CR 18 No 60 C - 13 S BOGOTÁ	
	Moneda:	COP		

Cantidad	Peso	Peso Extendido	Descripción	UM	Bga	Precio m2	Precio Unidad	Valor Extendido
50	11.5	575	Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	m2	27	$44.500	$44,500.00	$2.225.000

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
EXISTENCIAS SUJETAS A VENTAS. Y DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS

Moneda: COP

Subtotal	$2.225.000.00
Dto. Comercial:	$ 0.00
Flete:	$ 0.00
IVA:	$422.750.00
Rete Iva :	$0.0000
Rete Fuente:	$0.00
Total a pagar:	$2.647.750.00
Peso Total	**575**

* Impuestos: Somos grandes contribuyentes segun resolucion No 012635 del 14 dic 2018.Somos AUTORETENEDORES Resl:4060 Mayo 26 2014. IVA Regimen común. Actividad economica principal 4663 tarifa CREE 0.40%.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA EL RICAURTE

UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 28 CENTAVOS

FERROPETROL

INICIO CONTACTO

Inicio / Soldadura / Electrodos / Soldadura 6010X 3/32 Zip 10T WEST ARCO



Soldadura 6010X 3/32 Zip 10T WEST ARCO

39 disponibles

$19.400

SKU 20876 | Categoría Electrodos Marca: West Arco

Información adicional

Unidad	Kilogramo

Buscar 11°C ESP 4:08 a. m. 3/08/2023

sent mauricio.fonse... Buscar con Google Recibidos (791) - di... RNP0026732F6E88... Sistema de Informa... New Tab Helado malo 2 - Ju... dFireboy and Water... Otros marcadores

¡La industria en un solo lugar!

TECTUL

¿Qué estás buscando?

CATEGORÍAS INICIO GUIA DE COMPRA NOSOTROS BLOG SERVICIOS CATÁLOGO CONTÁCTANOS

Inicio > Soldadura > West Arco

Soldadura E6010 Zip 10t

Se vende por **Paquetes (Paq.)**

Soldadura 6010, electrodo de muy buena penetración, con polvo de hierro (Comercial). Envíos toda Col. Whatsapp ☎ 3161111666.

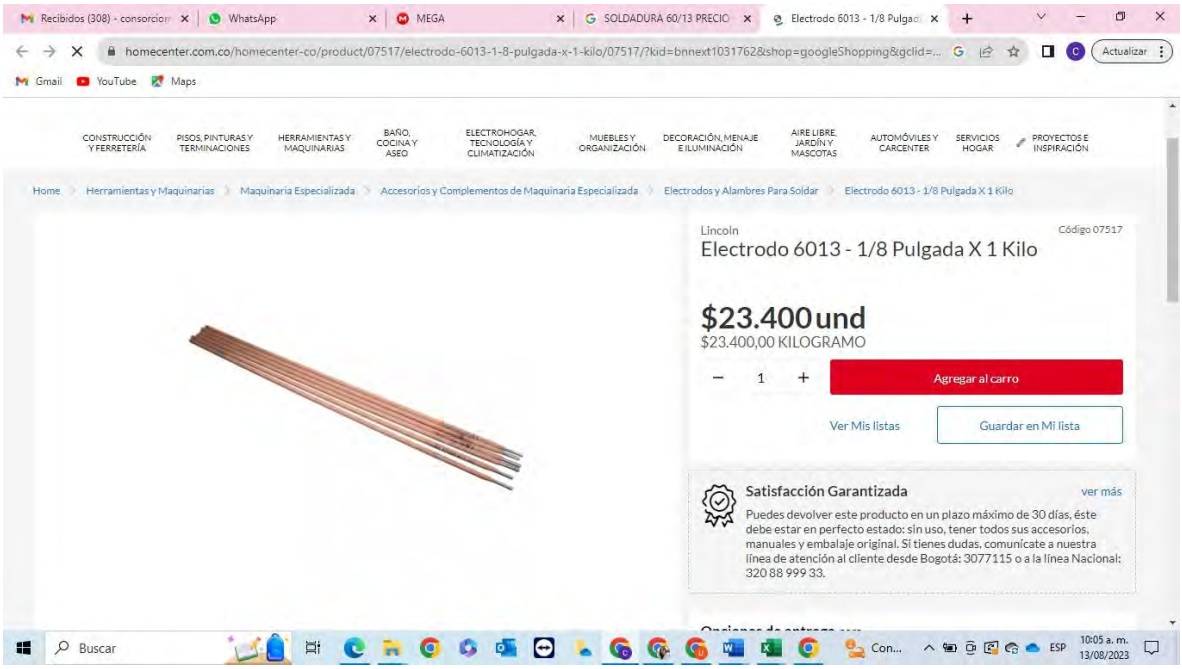
Precio **$32.088**


Opciones Selecciona


WhatsApp

AGREGAR AL CARRITO

perando a www.google.com...


Recibidos (308) - consorcion
WhatsApp
MEGA
SOLDADURA 60/13 PRECIO
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgad
homecenter.com.co/homecenter-co/product/07517/electrodo-6013-1-8-pulgada-x-1-kilo/07517/?kid=bnnext1031762&shop=googleShopping&gclid=...
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
BAÑO, COCINA Y ASEO
ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN
MUEBLES Y ORGANIZACIÓN
DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN
AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS
AUTOMÓVILES Y CARCENTER
SERVICIOS HOGAR
PROYECTOS E INSPIRACIÓN
Home
Herramientas y Maquinarias
Maquinaria Especializada
Accesorios y Complementos de Maquinaria Especializada
Electrodos y Alambres Para Soldar
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgada X 1 Kilo
Lincoln
Código 07517
Electrodo 6013 - 1/8 Pulgada X 1 Kilo
$23.400 und
$23.400,00 KILOGRAMO
1
Agregar al carro
Ver Mis listas
Guardar en Mi lista
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Buscar
Con...
ESP
10:05 a. m.
13/08/2023

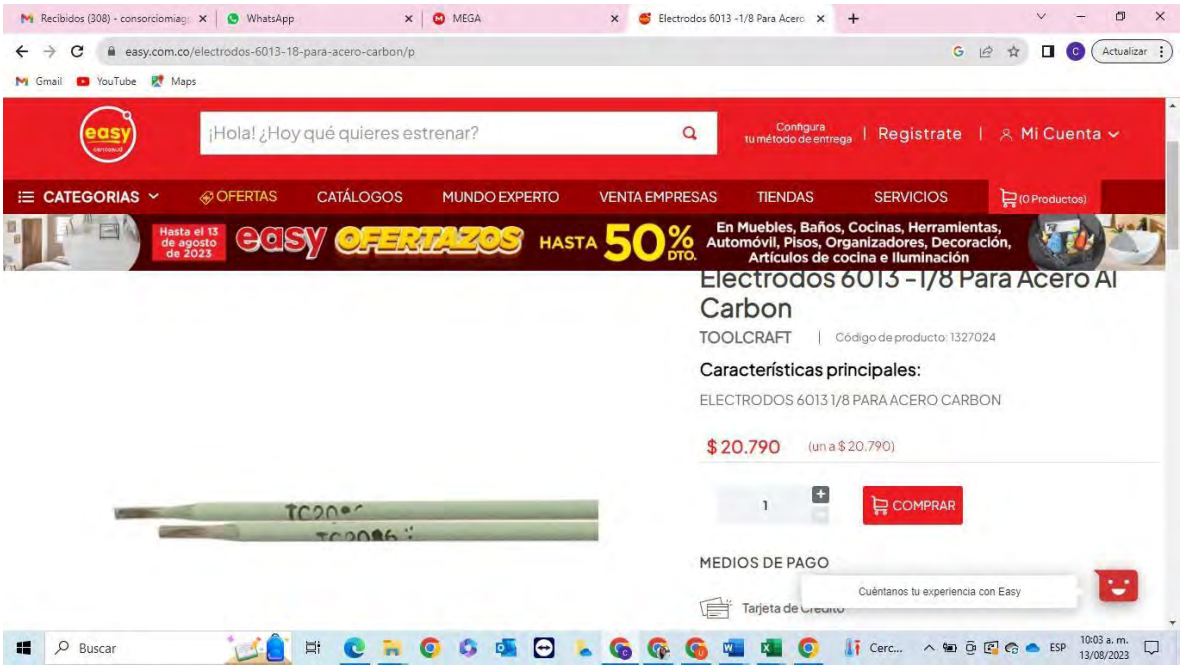
Recibidos (308) - consorciomiag
WhatsApp
MEGA
Electrodos 6013 -1/8 Para Acero
easy.com.co/electrodos-6013-18-para-acero-carbon/p
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
¡Hola! ¿Hoy qué quieres estrenar?
Configura tu método de entrega
Registrate
Mi Cuenta
CATEGORIAS
OFERTAS
CATÁLOGOS
MUNDO EXPERTO
VENTA EMPRESAS
TIENDAS
SERVICIOS
(0 Productos)
Hasta el 13 de agosto de 2023
easy OFERTAZOS
HASTA 50% DTO.
En Muebles, Baños, Cocinas, Herramientas, Automóvil, Pisos, Organizadores, Decoración, Artículos de cocina e Iluminación
Electrodos 6013 -1/8 Para Acero Al Carbon
TOOLCRAFT
Código de producto: 1327024
Características principales:
ELECTRODOS 6013 1/8 PARA ACERO CARBON
$ 20.790
(un a $ 20.790)
1
COMPRAR
MEDIOS DE PAGO
Tarjeta de Crédito
Cuéntanos tu experiencia con Easy
Buscar
Cerc...
ESP
10:03 a. m.
13/08/2023

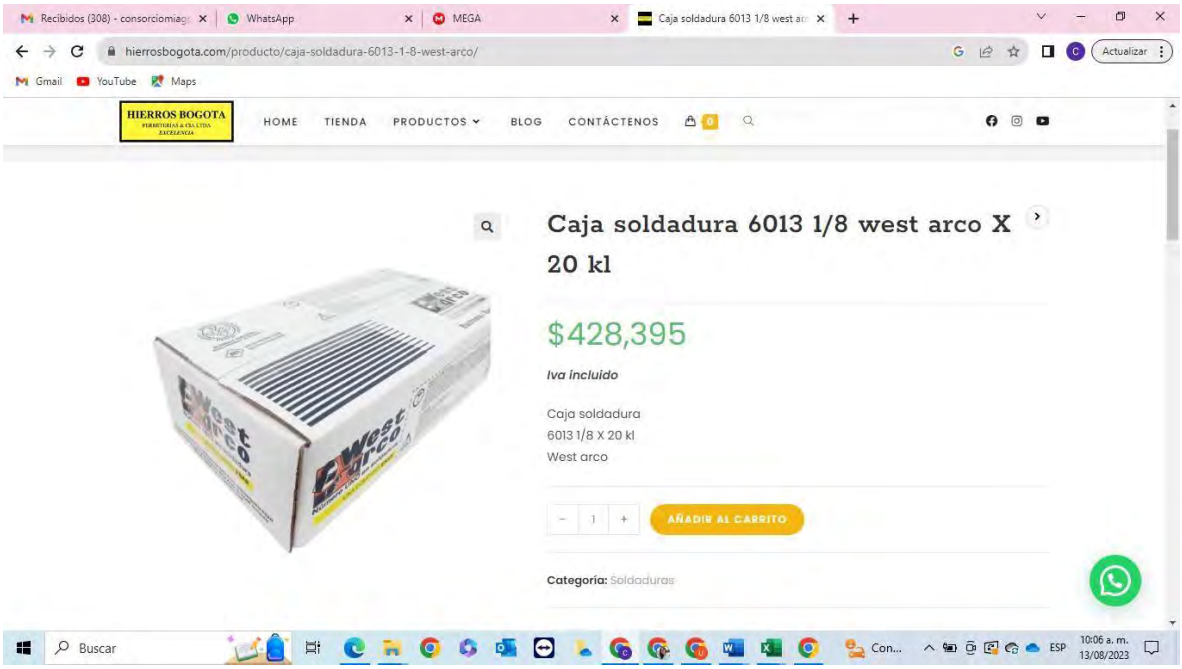
Recibidos (308) - consorciomiag
WhatsApp
MEGA
Caja soldadura 6013 1/8 west arc
hierrosbogota.com/producto/caja-soldadura-6013-1-8-west-arco/
Actualizar
Gmail
YouTube
Maps
HIERROS BOGOTA
HOME
TIENDA
PRODUCTOS
BLOG
CONTÁCTENOS
Caja soldadura 6013 1/8 west arco X 20 kl
$428,395
Iva incluido
Caja soldadura
6013 1/8 X 20 kl
West arco
AÑADIR AL CARRITO
Categoría: Soldaduras
Buscar
ESP
10:06 a. m.
13/08/2023

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	Malla Expandida CR IMT 30 X 1 CAL 18	M2	$ 50.832	PROCASA	44.000,000	FERROPETROL	$ 52.955	steckrel aceros	$ 49.262	$ 4.679	$53.942	$44.583	$ 50.832		$ 52.955	$ 51.894
	Angulo G50 1/8" x 1" x 6m	UN	$ 45.350,00	HOMECENTER	$ 55.600,00	METROPOLICENTER	44286	CONSTRUMOLE	$ 48.412	$ 6.248	$54.660	$42.164	$ 45.350		$ 44.286	$ 44.818
	Soldadura 6013 1/8west arco	UN	$ 25.400,00	HOMECENTER	$ 20.790,00	EASY	21419,75	HERREROS BOGOTA	$ 21.870	$ 1.362	$23.232	$20.508		20790,00	$ 21.420	$ 21.100

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-33	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	68.750,00	3.437,50
				SUBTOTAL	**3.437,50**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	und	1,00	$ 9.086.600,00	$ 9.086.600,00
			SUBTOTAL	**9.086.600**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	**-**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,50	68.750,00
				SUBTOTAL	**68.750,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 9.158.788,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 2.581.862,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 11.740.650,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-33- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los requerimientos específicos de los laboratorios de Química, Física y Biología, se requiere la instalación de pocetas en materiales durables, con facilidad de limpieza y lavado adaptados a los espacios existentes.

Atendiendo a estas necesidades se instalarán pocetas en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-33- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la **Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80)de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.**

EJECUCIÓN:

- Verificar medidas en sitio
- Verificar puntos de conexión y tamaños de pocetas

MATERIALES:

- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa,** recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-34	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	68.750,00	3.437,50
				SUBTOTAL	**3.437,50**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	und	1,00	$ 3.513.950,00	$ 3.513.950,00
			SUBTOTAL	**3.513.950**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	**-**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,50	68.750,00
				SUBTOTAL	**68.750,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 3.586.138,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 1.010.932,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 4.597.070,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-34- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los requerimientos específicos de los laboratorios de Química, Física y Biología, se requiere la instalación de pocetas en materiales durables, con facilidad de limpieza y lavado adaptados a los espacios existentes.

Atendiendo a estas necesidades se instalarán pocetas en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-34- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.**

EJECUCIÓN:

- Verificar medidas en sitio
- Verificar ubicación de puntos hidráulicos y eléctricos

MATERIALES:

- Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) de Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa,** recibidos a satisfacción por la interventoría.

HACER ACEROS LG

MANUFACTURAS EN ACERO INOXIDABLE

BOGOTA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Señores.

CONSORCIO MIA GP

Consultorio / espacio	Medidas	Observación	Valor
LABORATORIOS LICEO FEMENINO	LARGO (Entre 3.25 y 3.80) ANCHO (Entre 0.60 y 0.65) ALTURA (0.90)	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	$8.965.000
LABORATORIOS LICEO FEMENINO	LARGO (Entre 3.25 y 3.80) ANCHO (1.20) ALTURA (0.90)	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	$3.400.000

NO ASUMIMOS RETENCIONES NI IVA YAQUE SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO, EN CASO DESER NECESARIO SE AUMENTARIA AL TOTAL.

Garantía de un año por defectos de fabricación

Cra. 27 No. 8-80 telefax: 5601389
- E-mail: haceraceroSlg@hotmail.com - Bogotá D.C. Colombia

HACER ACEROS LG

MANUFACTURAS EN ACERO INOXIDABLE

La fecha de entrega está sujeta a lo pactado con el cliente al momento de llegar a un acuerdo de trabajo.

Los precios son netos pues HACER ACEROS LG es régimen simplificado, para el pago se envía cuenta de cobro y se adjunta RUT y cámara de comercio de ser necesario.

El trabajo se inicia con un abono del 60% y el otro 40% se cancela al momento de la entrega.

Cra. 27 No. 8-80 telefax: 5601389
- E-mail: haceraceroSlg@hotmail.com - Bogotá D.C. Colombia

Bogotá, 25 de septiembre de 2023

Señores:

CONSORCIO MIA GP

REF. COTIZACION MESONES ACERO INOXIDABLE LICEO FEMENINO

M	DESCRIPCIÓN	CAN	VALOR UNITARIO	valor TOTAL
P-01	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	1	$7.640.000	$7.640.000
P-02	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	1	$ 2.950.378	$ 2.950.378
			Subtotal	10.590.378
			19%	2.012.172
			total	12.602.550

Forma de pago: 60% al iniciar y 40% contra entrega

Tiempo de entrega: 8 días hábiles

De ante mano agradezco su pronta y favorable respuesta.

Atentamente

Luis Omar Zamudio

CC. 11.524.197

Cel. 3202458501

320 245 8501 omarsamudio_09@hotmail.com

Calle 28 #4-94 Barrio el vergel, Fusagasugá

IGT S.A.S

LINEA INSTITUCIONAL PARA AREAS PUBLICAS
PRODUCTOS ANTIVANDALICOS PARA PENITENCIARIAS
PRESTACION DE SERVICIOS METALMECANICOS

Bogotá 25 SEPTIEMBRE 2023 Cotización No. 10085

Señores (as):
CONSORCIO MIA GP

Atn. Sr(a).ING.SANDRA PINZON
CR 18 60 C 13 S

Bogota D.C. TEL. 3143826320
HOSPITAL TUNAL

Validez de la Oferta:
15 DÍAS ACORDE A TRM DÓLAR

Garantía:
1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA
Tiempo de Entrega:20 DÍAS HÁBILES

Forma de Pago: CONTADO
Anticipo: 50%
Saldo: CONTRA ENTREGA

En atención a su solicitud y de la manera más cordial nos dirigimos a ustedes con el objeto de hacerle llegar la siguiente cotización:

Referencia	Descripción	Cant.	Uni	Vlr Unit.	IVA	Total
	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 3000mm X 600mm X 900mmh AISI SAE 304CALIBRE 16 EN CUBIERTA, POCETA DE 500mm X 400 X 300mmP EN CALIBRE 18,OMEGAS Y ENTREPAÑO EN CALIBRE 20, PATAS EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 TUBERÍA DE 1 1/2" SALPICADERO DE100mm (FRENTE CAMILLAS TERAPIA)	1	U	$ 7.631.596	19%	$9.081.600
	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 860mm X 600mm X 900mmh AISI SAE 304CALIBRE 16 EN CUBIERTA, POCETA DE 500mm X 400 X 300mmP EN CAIBRE 18,OMEGAS Y ENTREPAÑO EN CALIBRE 20, PATAS EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 TUBERÍA DE 1 1/2" SALPICADERO DE100mm (ENTREVISTA)	1	U	$ 2.955.420	19%	$3.516.950

Valor en Letras
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.587.016,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.011.533,19**
TOTAL DOCUMENTO	**12.598.550,00**

Esperamos satisfacer sus expectativas y quedamos atentos a una pronta y positiva respuesta.
Cordialmente,

GUSTAVO ALEJANDRO RODRIGUEZ DIAZ
Asesor Comercial
gustavo.rodriguez@igtsas.co
3713566-3008633269

WILLIAM J. GONZALEZ TORRES
Gerente General

servicioalcliente@igtsas.com

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largox (entre 0.60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad, (son 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UND	$ 8.965.000	HACER ACEROS LG	$ 9.091.600	ALUVIDRIOS	$ 9.081.600	IGT SAS	$ 9.046.067	$ 70.384	$9.116.450	$8.975.683		9091600,00	$ 9.081.600	$ 9.086.600
	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,60) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,00 x 0,40 x 0,30 profundidad, (es 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UND	$ 3.400.000	HACER ACEROS LG	$ 3.510.950	ALUVIDRIOS	$ 3.516.950	IGT SAS	$ 3.475.967	$ 65.857	$3.541.824	$3.410.109		3510949,82	$ 3.516.950	$ 3.513.950

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SANITARIO FLUXOMETRO	U	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	72.916,67	3.645,83
				SUBTOTAL	3.645,83

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
CONEXIÓN SUPERIOR SANITARIA	Un	1,00	$ 94.597,00	$ 94.597,00
CEMENTO SOLVENTE PARA PVC 1/4 GL	Un	0,10	$ 124.250,00	$ 12.425,00
Cinta teflon 1/2" x 10m	Un	0,05	$ 16.200,00	$ 810,00
			SUBTOTAL	107.832

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla HH instalaciones hidraulicas (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	145.833	0,50	72.916,67
				SUBTOTAL	72.916,67
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 184.395,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 51.981,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 236.376,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-36- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SANITARIO FLUXOMETRO

UNIDAD:U

JUSTIFICACIÓN:

Se han identificado daños en los accesorios que conectan los sanitarios de fluxómetro con la tubería de suministro, por lo cual se evidencian fugas de agua y perdida de presión en las descargas de los sanitarios.

Se requiere realizar el reemplazo de este accesorio a fin de corregir las fugas de agua y garantizar la presión en cada descarga.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-36- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SANITARIO FLUXOMETRO

UNIDAD: U

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SANITARIO FLUXOMETRO**

EJECUCIÓN:

- Desmontar accesorio existente
- Verificar medidas de acoples y accesorios de conexión
- Verificar altura de sanitario a conectar
- Instalar conexión sanitaria
- Verificar hermeticidad de la instalación

MATERIALES:

- CONEXIÓN SUPERIOR SANITARIA
- CEMENTO SOLVENTE PARA PVC 1/4 GL
- Cinta teflon 1/2" x 10m

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (U) de SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SANITARIO FLUXOMETRO,** recibidos a satisfacción por la interventoría.

SOELCO

Busca tu producto

Categorías

Inicio Ofertas Tiendas Soelco Blog Contáctenos

Iniciar Sesión

Inicio / Hogar Y Muebles / Baños / Grifería para Baño / Conexión Superior Sanitario Gricol Is-Co02-211

No puedes añadir «Conexión Superior Sanitario Gricol Is-Co02-211» al carrito porque el producto está agotado.



Conexión Superior Sanitario Gricol Is-Co02-211

Referencia / Modelo: IS-CO02-211

Tiempo de Garantía: 2 años

$84.966

Medios de Pago:

Tarjeta de Crédito

Billetera Digital

Transferencia

Sefecty

Formas de Envío:

Más información sobre envíos

AGOTADO

Añadir a la Lista de deseos

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?

Entregar en el barrio para Bogotá D.C.

¡Hola Luis M

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURA Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTRO HOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARPENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS DE INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Plomería > Repuestos y Accesorios para Sanitario, Ducha y Lavamanos > Conexión Superior Sanitario



Gricol

Código 460859

Conexión Superior Sanitario

0.0 (0)

$94.900

− 1 + Agregar al carro Comprar ahora

Ver Mis Listas Guardar en Mi Lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogotá D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

Ficha técnica >

Opiniones de clientes

Aún no tenemos comentarios de otros clientes, ¡Sé el primero!

Escribir opinión


GRICOL
Productos
Profesionales
Blog
¿Cómo comprar?
Conexión superior sanitario
$94.294 COP
SKU IS-CO02-211
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
1
Agregar al carrito
Compartir
Tuitear
Hacer pin
Bienvenido a Gricol, si necesita ayuda simplemente responda a este mensaje, estamos en línea y listos para ayudarlo.
Escribenos
5 minutos atrás

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	CONEXIÓN SUPERIOR SANITARIA	UND	$ 84.966	SOELCO	94.900,000	HOMECENTER	$ 94.294	GRICOL	$ 91.387	$ 5.569	$96.955	$85.818		94900,00	$ 94.294	$ 94.597

CONSORCIO TIG

APU'S AJUSTADOS SEGÚN MEMORANDO I-2023-101567 del mes de septiembre de 2023

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP

INTERVENTOR: CONSORCIO TIC

SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL A SEIS (6) AGUAS CON CORTES TRANSVERSALES SIGNIFICATIVOS POR DESPIESE, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	79.488,02	3.974,4
Pulidora manual con disco (alquiler)	UN		20.000,00	0,05	1.000,0
Seccion andamio certificado (alquiler)	UN		$ 4.500,00	4,00	18.000,00
				SUBTOTAL	22.974,4

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Teja en fibrocemento tipo colonial 160 x 106	UND	0,85	$ 85.900,00	$ 73.015,00
Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12	un	6,00	$ 720,00	$ 4.320,00
Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8	un	6,00	$ 830,00	$ 4.980,00
DESPERDICIO	%	10%		$ 8.231,50
			SUBTOTAL	90.547

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)			1,0000	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	1.500

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,38	79.488,0
					-
				SUBTOTAL	79.488
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 194.509,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 54.832,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 249.341,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, con presencia de estudiantes y con el riesgo de generar afectaciones en las cubiertas aledañas. Adicionalmente hay que realizar varios cortes por la cantidad de aguas que posee la cubierta y las tejas se deben trasegar aproximadamente 150m en distancia horizontal + vertical.

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-25- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL A SEIS (6) AGUAS CON CORTES TRANSVERSALES SIGNIFICATIVOS POR DESPIESE, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES

UNIDAD: M2

JUSTIFICACIÓN:

Existen cubiertas antiguas que presentan fisuras y deterioro que han generado o filtraciones hacia la parte interna de la edificación, lo cual ha generado deterioros sobre los acabados internos e inmuebles, por lo cual es necesario realizar el reemplazo total de la cubierta existente.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-25- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL A SEIS (6) AGUAS CON CORTES TRANSVERSALES SIGNIFICATIVOS POR DESPIESE, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL A SEIS (6) AGUAS CON CORTES TRANSVERSALES SIGNIFICATIVOS POR DESPIESE, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES

EJECUCIÓN:

- Verificar dimensiones de cerchas y correas existentes
- Verificar modulación de teja a instalar
- Verificar en ficha técnica de teja arquitectónica tipo colonial, elementos de fijación, translapos, longitues
- Verificar escuadras, voladizos y dirección de armado de teja
- Suministrar teja en parte superior e iniciar armado garantizando traslapos, fijaciones y voladizos adecuados sobre la estructura existente.

MATERIALES:

- Teja en fibrocemento tipo colonial 160 x 106
- Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12
- Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en altura

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por METRO CUADRADO (M2) de SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL A SEIS (6) AGUAS CON CORTES TRANSVERSALES SIGNIFICATIVOS POR DESPIESE, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES recibidos a satisfacción por la interventoría.

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES	M	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	79.488,02	3.974,4
Pulidora manual con disco (alquiler)	UN		$ 20.000,00	0,05	1.000,0
Seccion andamio certificado (alquiler)	UN		$ 4.500,00	4,00	18.000,0
				SUBTOTAL	22.974,4

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
CABALLETE UNIVERSAL TIPO COLONIAL 106 CM	UND	1,00	$ 31.900,00	$ 31.900,00
Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12	un	6,00	$ 720,00	$ 4.320,00
Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8	un	6,00	$ 830,00	$ 4.980,00
DESPERDICIO	%	10%		$ 4.120,00
			SUBTOTAL	45.320

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)			1,0000	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	1.500

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	137.500	52,13%	209.179	0,38	79.488,0
				SUBTOTAL	79.488
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 149.282,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 42.083,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 191.365,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

El trabajo se realiza a doble altura, con presencia de estudiantes y con el riesgo de generar afectaciones en las cubiertas aledañas. Adicionalmente las tejas tipo caballete se deben trasegar aproximadamente 150m en distancia horizontal + vertical.

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-26- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES

UNIDAD:ML

JUSTIFICACIÓN:

Existen cubiertas antiguas que presentan fisuras y deterioro que han generado o filtraciones hacia la parte interna de la edificación, lo cual ha generado deterioros sobre los acabados internos e inmuebles, por lo cual es necesario realizar el reemplazo total de la cubierta existente.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-26- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES**

EJECUCIÓN:

- Verificar dimensiones de cerchas y correas existentes
- Verificar modulación de caballete a instalar
- Verificar en ficha técnica de caballete tipo colonial, elementos de fijación, translapos, longitues
- Verificar escuadras, voladizos y dirección de armado del cabalete
- Suministrar caballete en parte superior e iniciar armado garantizando traslapos, fijaciones y voladizos adecuados sobre la estructura existente.

MATERIALES:

- CABALLETE UNIVERSAL TIPO COLONIAL 106 CM
- Gancho Teja Estr Metal 14cm Cal 12
- Tornillo Cubierta Fijador Ala1/4X7/8

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Andamios
- Equipo de trabajo en altura

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por METRO LINEAL (ML) de SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYETRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 150M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES recibidos a satisfacción por la interventoría.

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para Bogota D.C.

0

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Tejas y Drywall > Tejas Fibrocemento > Teja Colonial 160X106 cm Fibrocemento











Ficha técnica

Tipo	Teja Fibrocemento

Proteja

Código 41463

Teja Colonial 160X106 cm Fibrocemento

4.6 (5)

$85.900 und

$50.648,58 METRO CUADRADO.

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Buscar en falabella

Hola, Inicia sesión Mis comp

ENVÍO GRATIS en miles de productos desde $99.000*

ngresa tu ubicación Ver

Home > Ferretería y construcción-Techos y Aislantes > Techumbre



Devolver es fácil y gratis
Conoce nuestras garantías y derechos >

PROTEJA

Código: 118853122 Cod. tienda: 41463

Teja Colonial 160X106 cm Fibrocemento

4.6 (5) Escribir comentario

Vendido por Homecenter

$ 85.900

Acumula hasta 85 pts. Ver opciones >

Despacho a domicilio

Retira tu compra

Stock en tienda
Revisar >

1 + Máximo 999 unidades.

Agregar al Carro

¿AÚN NO TIENES TU CMR?
Ábrela ahora y obtén $45.000 de descuento.

Del 13 al 16 de julio de 2023 | 20% DTO. En Herramientas Eléctricas y Manuales
Referencias seleccionadas. Aplican condiciones y restricciones.
Pagando con

10 %



Teja Colonial Proteja

PROTEJA | Código de producto: 1306951

Características principales:

TEJA PROTEJA COLONIAL PINTADA 160CM

Precio Regular ~~$ 99.900~~ (un a $ 89.910)

Precio Ahora **$ 89.910**

$ 79.920

$ 79.920

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

Envío a

Del 13 al 16 de julio de 2023 | 20% DTO. En Herramientas Eléctricas y Manuales
Referencias seleccionadas. Aplican condiciones y restricciones.
Pagando con

10 %



Caballete Colonial Universal Proteja

PROTEJA | Código de producto: 1306956

Características principales:

CABALLETE UNIVERSAL PROTEJACOLONIAL 46CM

Precio Regular ~~$ 35.900~~ (un a $ 32.310)

Precio Ahora **$ 32.310**

$ 28.720

$ 28.720

1 COMPRAR

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta de Crédito

MEDIOS DE ENVÍO

falabella.com ☰ Menú Buscar en falabella.com Hola, Inicia sesión Mis compras

ENVÍO GRATIS en miles de productos desde $99.000* *Aplican T&C. Ver falabella.com.co/legales

Ingresa tu ubicación falabella. HOMECENTER.CO INIO Vende en falabella.com Tarjetas y cuentas Venta telefónica Novios

Home > Ferretería y construcción-Techos y Aislantes > Techumbre



PROTEJA

Código: 118864485 Cód. tienda: 267491

Caballete universal Colonial

(0) Escribir comentario

Vendido por Homecenter

Despacho a domicilio

Retira tu compra

Stock en tienda
Revisar

$ 31.900 -25%
~~$ 42.700~~

Acumula hasta 31 puntos Ver opciones

1 + Máximo 999 unidades.

Agregar al Carro

¿AÚN NO TIENES TU CMR?
Ábrela ahora y obtén $45.000 de descuento.

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Estás comprando para Bogota D.C.

0

Mi Cuent

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Tejas y Drywall > Tejas Fibrocemento > Caballete universal Colonial





Proteja

Código 267491

Caballete Universal Colonial

0.0 (0)

PRECIO INTERNET -25%

$31.900 und

Ahorra $10.800

~~$42.700 und~~

− 1 +

Agregar al carro

Ver Mis listas

Guardar en Mi lista

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TÚNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	TEJA COLONIAL 160 X 106 FIBROCEMENTO	UND	$ 85.900	HOMECENTER	$ 79.920	EASY	$ 85.900	FALLABELA	$ 83.907	$ 3.453	$87.359	$80.454	$ 85.900		$ 85.900	$ 85.900
	CABALLETE UNIVERSAL COLONIAL FIBROCEMENTO	UND	$ 31.900	HOMECENTER	$ 32.320	EASY	$ 31.900	FALLABELA	$ 32.040	$ 242	$32.282	$31.798	$ 31.900		$ 31.900	$ 31.900
										$ -						
										$ -						
										$ -						
										$ -						
										$ -						
										$ -						

CONSORCIO TIG

NP-40 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, SECCION INTERNA 30 cm x 50 cm (altura); e= 10 cm (no incluye acero)

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-40	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, SECCION INTERNA 30 cm x 50 cm (altura); e= 10 cm (no inlcuye acero)	ML	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	109.290,60	5.464,53
Vibrador de concreto		hora	5.000,00	0,50	2.500,0
Formaleta para columnas y vigas		m2/sem	$ 4.200,00	2,00	8.400,0
				SUBTOTAL	16.364,53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 PSI-21 Mpa	M3	0,16	$ 440.210,00	$ 69.333,08
			SUBTOTAL	69.333

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,56	76.312,50
Ayudante albañilería	JORNAL	52,13%	59.420	0,555	32.978,10
				SUBTOTAL	109.290,60
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 194.988,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 54.967,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 249.955,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los DIECIOCHO (18) días, del mes de SEPTIEMBRE del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-40- CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, SECCION INTERNA 30 cm x 50 cm; e= 10 cm (no inlcuye acero)

UNIDAD:ML

JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con los diseños sanitarios de algunas superficies, se requieren drenajes de áreas extensas mediante secciones amplias de estructuras de desagüe en cárcamo. Las secciones de los cárcamos diseñados no se encuentran dentro de los ítems contractuales por lo cual se requiere incorporarlo dentro del contrato.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-40- CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, SECCION INTERNA 30 cm x 50 cm; e= 10 cm (no inlcuye acero)

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, SECCION INTERNA 30 cm x 50 cm; e= 10 cm (no inlcuye acero)**

EJECUCIÓN:

- Verificar ejes
- Cimbrar ejes y contorno de cárcamo
- Verificar armado de acero
- Encofrar
- Verificar plomos, niveles y escuadras de encofrado y rigidez de elemento
- Colocar parales en cada cara de encofrado
- Fundir elemento
- Vibrar adecuadamente el concreto
- Desencofrar cuando se cuente con fraguado
- Hidratar la estructura

MATERIALES:

- Concreto 3000 PSI-21 Mpa
- Vibrador de concreto
- Formaleta para columnas y vigas

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (ML) de CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, SECCION INTERNA 30 cm x 50 cm; e= 10 cm (no inlcuye acero),** recibidos a satisfacción por la interventoría.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-375

Bogotá, D.C, 23 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.40

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.40, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.40:** 16/10/2023 al 22/10/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Ocho (8) folios

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	N/A	PRORROGA 1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	292 EQUIVALE AL 80,22%	PLAZO TRANSCURRIDO:	275 EQUIVALE AL 82,58%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICION(ES):	$ 371.557.789,00	VALOR ADICION(ES):	$ 5.050.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.250.145.727,00	VALOR POR PAGAR:	$ 16.991.262.150,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023	13/10/2023	-76
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023	4/10/2023	-67
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
29	**TALLER BICICLETERO**		9/10/2023	
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**275**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 217.989.209,00	$ 217.989.209,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 210.052.966,00	$ 194.803.615,36	92,74%	30/08/2023	EN EJECUCIÓN
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	PERIODO No.	40	DEL	16/10/2023	AL	22/10/2023

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.010.000.000,00	$ 817.388.746,34	80,93%	23/10/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 485.207.002,00	$ 348.098.166,00	71,74%	20/10/2023	EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 841.548.020,00	$ 615.268.092,54	73,11%	31/08/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.169.838.192,85	$ 1.169.838.192,85	100,00%	28/08/2023	FINALIZADO
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 283.433.330,00	$ 283.433.330,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 827.987.076,00	$ 529.502.814,00	63,95%	30/10/2023	EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 762.681.025,00	$ 507.059.140,00	66,48%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.228.838.776,00	$ 1.035.740.092,69	84,29%	30/11/2023	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.206.469.428,00	$ 914.669.320,70	75,81%	14/10/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ 8.348.023,00	1,68%	19/12/2023	NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.193.215.393,25	$ 1.193.215.393,25	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ 79.169.655,00	12,06%	19/12/2023	NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.027.739.816,00	$ 1.237.613.824,58	61,03%	28/11/2023	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ 181.696.446,54	54,10%	19/12/2023	NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 702.836.423,00	$ 347.876.572,00	49,50%	31/10/2023	EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
29	TALLER BICICLETERO	$ 250.000.000,00	$ 87.484.487,00	34,99%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
27	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 532.852.321,00	61,78%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intercenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	No se realizan actividades	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: 1 (una).personas Equipo: Herramienta menor.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua finalizando actividades referente a detalles de acabados, posible entrega para el dia lunes 23/10/2023.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: 12 (Doce). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Continua actividad fundida de placa para cancha de 3000 PSI, Continuactivida de intalacion malla de refuerzo para placa.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Herramienta menor, vibro compactador
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	finaliza remboquillado en la bateria sanitaria de niños primer piso, se hacen mantenimiento a las puertas y se comienza con el aseo, se realiza fundida de meson granito baño profesores	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	Se finalizan actividades, en comité la SED Autorizo la no instalción de bajantes y canales, se entrego el frente a la IED a entera satisfacción el dia jueves 19 de octubre de 2023.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo: frente finalizado Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se instala uminarias en el cielo raso en pvc en el hall del segundo piso, y se realiza la instalacion en drywall del primer piso, se entregan los espacios a la institucion areas biblioteca, hall segundo piso y hall primer piso.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: cinco (4) personas Equipo: Herramienta menor
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se continua con la fundida de los paños y se hace el estampado del concreto.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de cambio de cubierta en el ala central, continua actividad de instalación de luminarias, continua actividad de pintura en esmalte sobre muro.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Se inicia la intervencion de las baterias sanitarias del segundo piso, se demule el enchape, el desmonte de baterias etc, se hace entrega a la institucion de los espacios correspondientes a salon 101,102,103 y 104 y se inicia con la intervencion de biblioteca.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se continua la actividad de pintura en los muros de las aulas y del pasillo, se hacen los filos en los marcos de las puertas de los salones y se hace la instalacion de las puertas de las aulas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, IGABRIELA MISTRAL**	Se realizó enchape en áreas Vae y Embera, con guardaescoba y emboquillado, se requiere mejorar orden y aseo en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: 1 (1) persona. Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	Frente finalizado el dia 18 de septiembre de 2023	Frente finalizado y entregado a satisfacción por la institución.
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se realiza el armado de acero para la construcción del muro contención, se continua con la fabricación de ventanas en aluminio e instalación de redes eléctricas y excavación y aplicación en zona de cafeteria existente para la instalación de redes hidrosanoitarias de los baños a construir, se requiere mejorar el rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Once (11) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	No se realizan actividades	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) personas Equipo: Andamios, herramienta menor y rotomartillo
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	Se realiza el proceso de instalación de las puertas faltantes y con ello se da por cerrada la intervención en este frente.	FRENTE TERMINADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se finaliza la instalacion de la teja tipo sandwich y pintura de estructura metalica, se realiza la instalacion de la teja traslucida ubicada en el pasillo .	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	Se continua con la fabricación en sitio, los módulos para el cerramiento de la IED,se requiere mejorar rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor


CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
29	**TALLER BICICLETERO**	Continua actividad de excavación. Continua traslado y disposición final de material de excavación, Se realiza levantamiento topográfico verificando volúmenes de excavación y niveles.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora
28	**EMERGENCIAS**	Se continúa con la ejecución de la emergencia del cambio de la cubierta en la IED Liceo Femenino.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 14.019.097.889,49	82,51%	-20,24%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 10.580.467.739,38	62,27%	

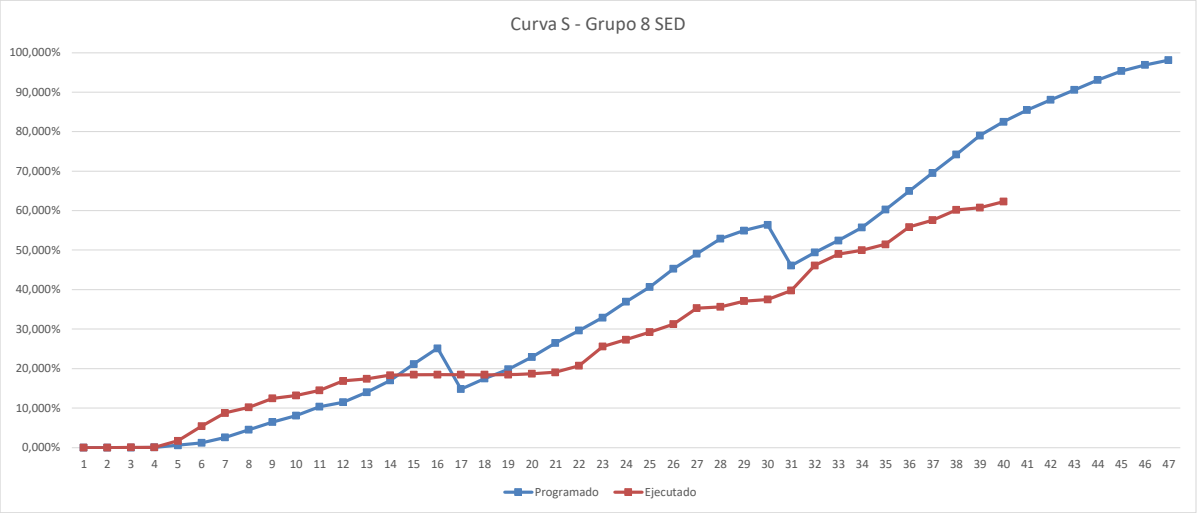

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 20,24%. No obstante, es importante acotar que ya existe lineamiento oficial desde la SED de realizar la solicitud de prórroga No.1 y adición No.2 del contrato de obra, con ocasión a la ampliación del alcance, lo cual ha representando un aumento del 50% del valor inicial, necesitandose con ello una ampliación en el plazo no menor a cuatro (4) meses calendario.

Por consoguiente, este atraso cuantificado al día de hoy no representa un dato certero, ya que la siguiente semana el contratista de obra entregará una reprogramación, por medio de la cual extenderá los tiempos de ejecución de los frentes que apliquen, permitiendo con ello una distribución adecuada recurso y reduciendo a gran escala el atraso materializado a hoy. La reprogramación entrará en vigencia en el siguiente periodo semanal y es precisamente por ello que esta interventoría no ha realizado llamados de atención al contratista de obra, a pesar de que el atraso en las últimas semanas ha sido representativo, dado el preacuerdo de la prórroga y con ello la reorganización de los recursos a invertir en cada frente.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Manuel del Socorro sede B - Entrega de presupuesto actualizado Inicio de actividades en obra	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido) En proceso
Taller de la bicibleta - Envío del presupuesto	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 20 de octubre de 2023 se atendieron las observaciones relacionadas con los APU's no previstos NP25, NP26, NP27, NP33, NP34, NP36 y NP40.
* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR


Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:

Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y no realizó la entrega de su concepto técnico.
Colegio Restrepo Millán sede D: El riesgo existente con las redes eléctricas será intervenido a través del alcance del frente.
Colegio Liceo Femenino: Se finaliza con la intervención en la cubierta y que fue considerada bajo este rubro de emergencia.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública


FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES		
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA		





CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

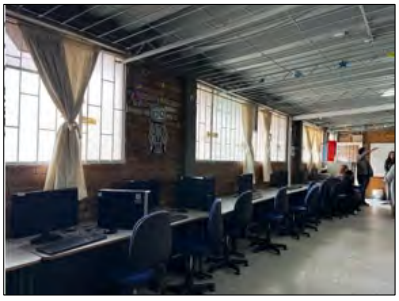No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**		
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**		
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		






CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D,GABRIELA MISTRAL**		  
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**		  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		No hubo avance por suspensión forzada del frente

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  
25	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		  
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		  
29	**TALLER BICICLETERO**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-376

Bogotá, D.C, 25 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Solicitud de adición No.2 y prórroga No.1 correspondiente al contrato de obra No.CO1.PCCNTR.4077645

Respetados señores:

Con base en el comunicado 2023_RUU_MGP_256 allegado por parte del CONSORCIO MIA GP y con base a la asignación de recursos adicionales por parte de la Secretaría de Educación Distrital al contrato de obra objeto de vigilancia, elevamos la presente solicitud de adición de recursos No.2 y prórroga No.1 al contrato de obra No.CO1.PCCNTR.4077645, partiendo de las siguientes consideraciones, a saber:

1. Mediante licitación pública de infraestructura social No. SED-LP-DCCEE-039-2022 publicada en la plataforma SECOP II, se adelantó el proceso de selección que tenía por objeto “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS

PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

2. Una vez surtido el proceso de selección, se adjudicó el **GRUPO 8** al proponente CONSORCIO MIA GP, identificado con N.I.T: 901634703-9, representado legalmente por MATEO LUZARDO VILLAMIZAR, cuya adjudicación comprende un plazo inicial de ejecución de once (11) MESES, y un valor inicial de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE ($11.941.262.150,00) incluido A.I.U. y el **GRUPO 8** al proponente de interventoría CONSORCIO TIG, identificado con N.I.T: 901649890-3, representado legalmente por EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL, cuya adjudicación comprende un plazo inicial de ejecución de doce (12) MESES, y un valor inicial de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($878.587.938) incluido A.I.U.

3. El día 03 de enero de 2023, una vez cumplidos los requisitos legales para el perfeccionamiento de los contratos No. CO1.PCCNTR.4155718 (Grupo 8) de interventoría y el día 20 de enero de 2023 No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) de obra, se procedió a la suscripción de las actas de inicio de los mismos.

4. El alcance inicial abarcaba la intervención de diecisiete (17) frentes de obra para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8).

5. En el mes de marzo de 2023, una vez analizadas las circunstancias del caso, las partes, de mutuo acuerdo, y a solicitud de la necesidad de la Secretaria de Educación del Distrito (SED) de mejorar la infraestructura educativa de acuerdo a los recursos que serán invertidos en mantenimientos programados a los ocho (8) colegios adicionales. Surge la necesidad del Modificatorio adición No. 1 bajo el entendido que el alcance del objeto del Contrato de Obra, conlleva acometer actividades de ADECUACIÓN, y atención de REQUERIMIENTOS y NECESIDADES para la prestación del servicio educativo y ante la necesidad de intervención de las obras requeridas en las I.E.D., así como la ejecución eficiente y los recursos propios de la entidad para el cumplimiento de los propósitos para los que fueron gestionados; y en acatamiento de los principios de planeación, eficiencia, economía, responsabilidad habida consideración que se cuenta con la oportunidad necesaria para la ejecución de los mismos.

6. Dicho lo anterior, el Modificatorio adición No. 01 del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) de 2022, consideró una adición de CINCO MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C ($ 5.050.000.000) la cual no generó solicitud prorroga y se mantuvo bajo los plazos contractuales.

7. En el mes de octubre de 2023, una vez analizadas las circunstancias del caso, las partes, de mutuo acuerdo, y a solicitud de la necesidad de la Secretaria de Educación del Distrito (SED) de mejorar la infraestructura educativa con la ampliación del alcance fisico de tres (3) instituciones de las que actualmente están en ejecución, surge la necesidad del Modificatorio No.2 por adición No.2 y prórroga No.1 bajo el entendido que el alcance del objeto del Contrato de Obra, conlleva acometer actividades de ADECUACIÓN, y atención de REQUERIMIENTOS y NECESIDADES para la prestación del servicio educativo y ante la necesidad de intervención de las obras requeridas en las I.E.D., así como la ejecución eficiente y los recursos propios de la entidad para el cumplimiento de los propósitos para los que fueron gestionados; y en acatamiento de los principios de planeación, eficiencia, economía, responsabilidad habida consideración que se cuenta con la oportunidad necesaria para la ejecución de los mismos.

8. Dicho lo anterior, el Modificatorio No.2 por adición No.2 y prórroga No.1 del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) de 2022, considera una adición de MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/C ($ 1.870.000.000) la cual va acompañada de una solicitud prorroga por un plazo de cuatro (4) meses calendario.

9. En tal sentido, el plazo contractual actualizado para el contrato de obra objeto de vigilancia, será de QUINCE (15) MESES, es decir la nueva fecha de terminación será el 19 de abril de 2024.

10. El alcance actualizado según modificación adición No.02 comprenderá la intervención de mayor alcance en tres (3) frentes de obra para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) conservando el número actual de 25 de frentes.

De acuerdo con lo anterior y, considerando que el contrato de referencia no ha surtido proceso de modificación No.02 y, bajo la consideración que entre el Contrato de Interventoría y el Contrato de Obra objeto de vigilancia se configura una coligación negocial que implica que las modificaciones realizadas sobre las condiciones de ejecución del contrato supervisado impacten de manera sustancial el alcance y condiciones del contrato de interventoría, de tal forma que deban ser ajustados de manera homogénea garantizando el equilibrio contractual y cumplimiento de la finalidad del contrato en óptimas condiciones, ajustándose el contrato de interventoria a las nuevas necesidades del contrato que le da origen, y de acuerdo a la solicitud realizada por la entidad, nos permitimos dar algunas claridades relacionadas con el alcance dado a la Modificación No.2 por adición No.2 y prórroga No.1.

1. ALCANCE MODIFICACIÓN No.2 – GRUPO DE OBRA No. 8

El contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 correspondiente al grupo No. 8, dentro del alcance actual abarca la ejecución de veinticinco (25) frentes de obra, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

GRUPO 8 RAFAEL URIBE URIBE				
No	**LOCALIDAD**	**COLEGIO**	**SEDE**	**NOMBRE DE SEDE**
1	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALEXANDER FLEMING	B	ANTONIO RICAURTE
2	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A	A	LOS CHIRCALES
3	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALFREDO IRIARTE	B	EL MIRADOR
4	RAFAEL URIBE	COLEGIO DIANA TURBAY	B	DIANA TURBAY II
5	RAFAEL URIBE	COLEGIO EL LIBERTADOR	B	MANUEL MURILLO TORO
6	RAFAEL URIBE	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA	A	ENRIQUE OLAYA HERRERA
7	RAFAEL URIBE	COLEGIO JOSE MARTI	A	LUIS LOPEZ DE MESA
8	RAFAEL URIBE	COLEGIO JOSE MARTI	C	GRANJAS DE SAN PABLO
9	RAFAEL URIBE	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	A	LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO
10	RAFAEL URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A	A	MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ
11	RAFAEL URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B	B	REPUBLICA DE ISRAEL
12	RAFAEL URIBE	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO	A	GENERAL PAEZ
13	RAFAEL URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA	A	REINO DE HOLANDA
14	RAFAEL URIBE	COLEGIO RESTREPO MILLÁN	B	ISABEL II DE INGLATERRA
15	RAFAEL URIBE	COLEGIO RESTREPO MILLÁN	D	GABRIELA MISTRAL
16	RAFAEL URIBE	COLEGIO SAN AGUSTÍN	A	SAN AGUSTÍN

GRUPO 8 RAFAEL URIBE URIBE				
No	**LOCALIDAD**	**COLEGIO**	**SEDE**	**NOMBRE DE SEDE**
17	RAFAEL URIBE	COLEGIO EL LIBERTADOR	C	JUAN DEL RIZO
18	RAFAEL URIBE	COLEGIO QUIROGA ALIANZA	B	
19	RAFAEL URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	A	
20	RAFAEL URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	B	
21	RAFAEL URIBE	FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		
22	RAFAEL URIBE	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA		
23	RAFAEL URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA	B	
24	RAFAEL URIBE	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS	A	
25	RAFAEL URIBE	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		

Es importante precisar, que el presupuesto de las actividades de obra puede variar según el alcance que se defina en campo, que se utilizará para temas relacionados con los colegios expuestos anteriormente, tal y como se establece en el contrato inicial.

Por otra parte, se hace la salvedad que la IED FE Y ALEGRÍA SEDE LOS NARANJOS, fue incluida para su intervención dentro de la modificación contractual No.1 con un rubro de $ 455.893.410. Esta sede no podrá intervenirse, en vista que la misma presenta una serie de limitaciones de índole estructural, por lo cual, el recurso que se invierta bajo el concepto de mejoramientos no podrá garantizar la estabilidad de la infraestructura. Ahora y al tomarse la decisión de desistir de esta intervención de manera conjunta entre las partes intervinientes, desde la SED se otorga el lineamiento de reemplazar esta sede por la IED CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA, donde se invertirá este mismo rubro, principalmente en el cambio de cubiertas existentes, estructura para su soporte y ventanería.

Dado lo anterior, desde la firma contratista de obra e interventoría se sugiere realizar la aclaración sobre esta novedad, para evitar cualquier tipo de inconveniente a futuro.


La adición de recursos se solicita con base en los términos establecido en la LEY 80 DE 1993, parágrafo del artículo 40, el cual reza:

> *En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.*
>
> *Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. (Cursiva fuera de texto)*

Para este caso en particular, la relación se realiza sobre SMMLV, donde se está cumpliendo con la condición del 50% permitido.

	PRESUPUESTO	INICIO	FIN	No. FRENTES
INICIAL	$11,941,262,150.00	20-ene-23	19-dic-23	17
MODIFICACIÓN No. 1	$ 5,050,000,000.00	15-abr-23	19-dic-23	8
MODIFICACIÓN No.2	$ 1,870,000,000.00	19-dic-23	19-abr-24	0
TOTAL	$18,861,262,150.00	20-ene-23	19-abr-24	25

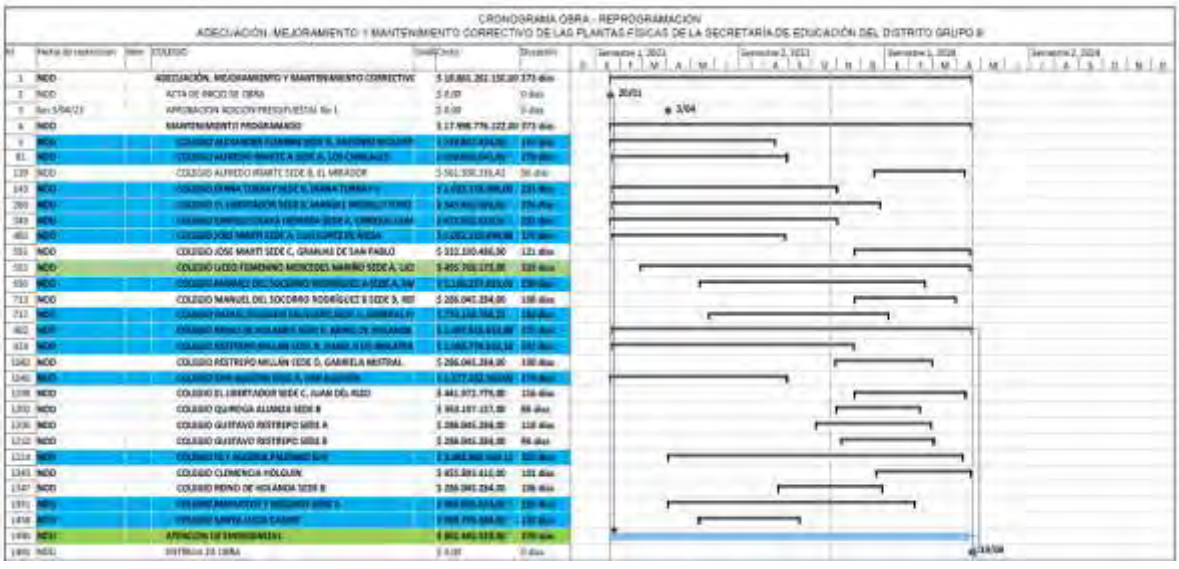A continuación, se muestra el cronograma de ejecución de los diferentes frentes de obra, donde se involucra la totalidad de los colegios previstos en la modificación No.1 y lo estimado para la modificación No.2, donde se evidencian los distintos tiempos de ejecución y con ello la necesidad del tiempo adicional requerido a través de la presente solicitud, el cual asciende a cuatro (4) meses calendario.



1.1. Alcance previsto para el frente adicional y mayores alcances en frentes existentes – Modificación No.2 Grupo 8

Las instituciones educativas por intervenir dentro del alcance de la modificación No.2 para el grupo de obra No. 8, involucra tres (3) con mayores alcances físicos, las cuales se relacionan a continuación:

COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO	CONDICIÓN
FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$ 1.497.953.458,00	FRENTE EXISTENTE
REINO DE HOLANDA	A	$ 222.046.542,00	FRENTE EXISTENTE
LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		$ 150.000.000,00	FRENTE EXISTENTE
TOTAL		$ 1.870.000.000,00	

Los alcances definidos para cada una de las instituciones a intervenirse se describen a continuación:

1. Fe y alegría Palermo sur

La institución requiere una intervención del componente eléctrico, con suministro e instalación de tableros y acometidas, cabe aclar que los permisos ante la entidad competente están a cargo de la SED.

Adicionalmente, se debe contemplar la instalación de tanques para el suministro de agua ubicados en la parte superior de la institución, de igual manera los permisos requeridos para el correcto funcionamiento de la institución ante la entidad competente deben ser tramitados por la SED.

Se contempla el mantenimiento especifico según la disponibilidad presupuestal asignada y a las actividades requeridas en actas de comité.

2. Reino de Holanda sede A

La intervención adicional presupuestada para la institución contempla la pintura de fachada del bloque A, junto con la instalación de mallas de protección en áreas de ventana y cambio de cubierta en policarbonato del patio 1.

3. Liceo Femenino Mercedes Nariño

La institución requiere una intervención en el área de canchas de voleibol, ya que presentan cierre permanente por el estado actual de las mismas. Se evidencia desprendimiento de material, desniveles y fisuras evidentes que han ocasionado accidentes. Presupuestalmente se contempla el mejoramiento del terreno para evitar a futuro los asentamientos diferenciales que se presentan actualmente.

Por último, se anexa copia de la programación estimada para la intervención de las 26 instituciones que hacen parte del proyecto, para que la misma sea analizada de manera integral por la Entidad Contratante.

De acuerdo a este contexto, esta Interventoría manifiesta su aprobación y recomienda a la Secretaría de Educación del Distrito la solicitud de adición presupuestal No.2 realizada por el contratista de obra Consorcio MIA GP a través del contrato No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022, por valor de MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/C ($1.870.000.00) y la prórroga por un plazo adicional de cuatro (4) meses calendario. El alcance de cada una de las obras a realizar en dichos colegios ha sido definido mediante visitas a campo realizadas por personal de la interventoría y de la Secretaría de Educación del Distrito, por lo que se cuenta con la debida justificación y memorias de cálculo respectivas, cabe resaltar que el presupuesto de las actividades de obra puede variar según el mejoramiento en intervenciones de cada frente tal y como se establece en el contrato inicial. Por otra parte y acorde a la necesidad dado estos mayores alcances, el plazo contractual actualizado para el contrato de obra objeto de vigilancia, será de QUINCE (15) MESES, es decir la nueva fecha de terminación será el 19 de abril de 2024.

Cordialmente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal
CONSORCIO TIG
Nit: 90164989-03

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
Anexos:
Comunicado de obra 2023_RUU_MGP_256
Presupuesto preliminar general de las sedes educativas adicionales
Cronograma de actividades de las obras a ejecutar

CONSORCIO TIG

COPIA COMUNICADO DE OBRA 2023_RUU_MGP_256

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2023

2023_RUU_MGP_256

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal Consorcio TIG
Carrera 47A No 93-41 Barrio La
CastellanaBogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Solicitud adición presupuestal No. 2 y prorroga No. 1 al contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645

Cordial saludo,

Yo MATEO LUZARDO VILLAMIZAR, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de representante legal de la figura plural, CONSORCIO MIA GP distinguida con NIT. 901.634.703-9, por medio del presente escrito y teniendo en cuenta el asunto de la referencia, me permito esgrimir para su conocimiento, los motivos técnicos y razones que redondean la solicitud adición No 2 por un valor de mil ochocientos setenta millones con cero pesos m/cte ($1,870,000,000) y prorroga No. 1 de cuatro (4) meses posteriores a la fecha de finalización del contrato estipulada para el 19 de diciembre de 2023, en ese orden de ideas, le manifestamos:

Primero: Se han presentado modificaciones y/o ampliaciones de los alcances de las intervenciones generando mayores tiempos en los frentes a intervenir.

Una vez iniciadas las intervenciones en las Instituciones educativas, en el desarrollo de las obras, surgió la necesidad de ejecutar obras adicionales, lo que genero el impedimento de cierre de los frentes de trabajo y la apertura de otros, llevando a una mayor permanencia en obra y tiempos de ejecución no contemplados inicialmente, el cual deberá ser tenido en cuenta dentro de la programación general, estas actividades adicionales son:

- **COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**

Una vez iniciadas las actividades para el mantenimiento de las nueve (09) aulas mediante los cuales se habilitarían los cuatro bloques inferiores del COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR, se estableció por parte de la SED la necesidad ampliar la cobertura del colegio.

El cumplimiento de este objetivo se logra mediante la adecuación de aulas adicionales para lo cual se requiere identificar las necesidades técnicas que deben atenderse en estos espacios, esto mediante el cálculo y propuesta técnica de redes eléctricas, sanitarias e hidráulicas, habilitación de cubiertas y rocería, para de esta manera proceder con la actualización del presupuesto en torno al nuevo alcance y su posterior ejecución. Ver actas de comité 10 de mayo de 2023, 11 de julio de 2023, 03 de agosto de 2023 y finalmente aval de actividades mediante comité conjunto del día 20 de septiembre en las instalaciones de la secretaria de educación.

Este proceso de evaluación de diagnósticos que inicio en el mes de mayo de 2023, donde se realizó estudio técnico de redes existentes, propuesta técnica de instalaciones para habilitación de áreas existentes y ejecución de obras requirió de un tiempo para su análisis y presupuesto, tiempo que deberá ser adicionado al plazo actual del contrato a fin de que puedan ser ejecutadas por el contratista.

- **COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**

El alcance en este colegio obedece principalmente al cambio de cubiertas, por lo cual la institución educativa requirió evacuar los espacios para que se pudieran intervenir de manera paulatina. Esta situación requirió de una logística interna dentro del Colegio para el retiro de mobiliario y entrega de los espacios por lo cual los trabajos se han ejecutado en la medida que la Institución Educativa coordina la entrega de espacios.

Es de resaltar los planteamientos del comedor ya que requería inicialmente conceso entre las partes (institución educativa y compensar) para la entrega de alimentos la intervención contemplaba realizar un mantenimiento a piso existente en tablón de gres, mediante el llenado de juntas, sin embargo, se determinó que el piso existente presentaba deterioros significativos (golpes, destornillamientos, levantamiento de piezas) lo cual impedía que el Contratista garantizara un adecuado mantenimiento, además de presentarse esta condición en aproximadamente el 60% de la superficie. Por lo anterior se decidió realizar el reemplazo total del piso existente, con lo cual se incurrió en tiempos adicionales de demolición de piso completo, retiro de escombros con trasiego significativo teniendo en cuenta la ubicación del comedor en relación con los centros de acopio e instalación de piso en granito pulido alrededor de 300mts de recorrido.

- **COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**

Debido a vetustez de la estructura se generó un desplome de la cubierta lo cual llevo a una emergencia dentro de la biblioteca. Se requirió entonces realizar cambio de cubierta tipo colonial, un encorozado entre la cubierta y ajuste a la estructura existente. En recorrido de obra de 02 de octubre de 2023 dentro de las instalaciones se avaluó la condición de los cielos falsos en PVC del área de biblioteca pasillo y oficinas aledañas, encontrando que las mismas se encontraban deterioradas y presentaban exceso de residuos generados por el polvo que se genera entre la cumbrera y el cielo falso, los excrementos de las palomas que viven en la cumbrera y los desprendimientos de esterilla, barro y madera que se generan de la estructura de la cubierta.

Debido a que estas actividades no se encontraban incluidas dentro del alcance inicial se requirió un periodo de tiempo que afecto el cronograma inicial de obra.

- **COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**

El frente de obra inicialmente contemplaba en su alcance la impermeabilización parcial de piso 3 del área administrativa, junto con la demolición y construcción de tarima del patio central. El alcance de la impermeabilización fue ejecutado en un 100% a la fecha, sin embargo, lo que compete a la ejecución de tarima se han tenido diferentes versiones de arquitectura y estructura, lo que ha llevado a una mayor permanencia en obra por parte del consorcio MIA GP, así las cosas, a la fecha se encuentra suspendido el frente de obra hasta que se cuente con un diseño aprobado por las partes (Interventoría, SED y el representante de la IED). Por lo tanto, una vez sea reactivada su ejecución se debe considerar la reposición del tiempo perdido por condiciones no imputables al contratista.

Segundo: Se han generado ampliaciones sobre los alcances de las intervenciones como se evidencia en los distintos comités de obra.

Tercero: Se han presentado afectaciones en la ejecución de la obra a causa de las lluvias presentadas y es de resaltar que la mayoría de las intervenciones son en áreas de cubiertas lo cual ha generado atrasos en el desarrollo del proyecto.

Existen actividades que requieren de tiempo seco para ser ejecutadas y que son de alto impacto dentro de los alcances de las intervenciones, a saber, el cambio de cubiertas, excavaciones, instalación de estructura para canchas, obras de urbanismo como andenes.

Cuarto: Se ha requerido atender a requerimientos logísticos y evacuación de espacios para la habilitación de espacios. Así mismo, se ha visto afectado el tiempo en el

suministro de materiales debido a la escasez que se presentó al inicio del presente año.

Quinto: No se han iniciado la ejecución a la fecha los siguientes frentes debido a que se deben replantear las fechas del cronograma paralelamente lo cual incurre en mayores esfuerzos y personal mínimo no contemplado dentro del contrato inicial. Por lo cual se requiere un tiempo adicional para su ejecución.

COLEGIO	SEDE
COLEGIO ALFREDO IRIARTE	B
COLEGIO JOSE MARTI	C
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	B
COLEGIO QUIROGA ALIANZA	B
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	A

Ilustración 1 Frente pendientes por inicio de actividades.

Sexto: De acuerdo con la necesidad por parte de la SED se ampliarán los mejoramientos en mantenimientos programados y se generan nuevos alcances y por consiguiente una necesidad de adición de recursos representado en los colegios FE Y ALEGRIA PALERMO SUR, REINO DE HOLANDA SEDE A y LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, con una distribución de recursos de la siguiente manera:

COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO
FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$ 1.497.953.458,00
REINO DE HOLANDA	A	$ 222.046.542,00
LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		$ 150.000.000,00
TOTAL ADICIÓN No.2		**$ 1.870.000.000,00**

Ilustración 2 >Inclusión y adición presupuestal de frentes de obra.

Los alcances definidos para cada una de las instituciones se describen a continuación:

1. **FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR**

La institución requiere una intervención del componente eléctrico, con suministro e instalación de tableros y acometidas. Cabe aclar que los permisos ante la entidad competente están a cargo de la SED.

Adicionalmente, se debe contemplar la instalación de tanques para el suministro de agua ubicados en la parte superior de la institución, de igual manera los permisos requeridos para el correcto funcionamiento de la institución ante la entidad competente deben ser tramitados por la SED.

se contempla el mantenimiento especifico según la disponibilidad presupuestal asignada y a las actividades requeridas en actas de comité.

2. REINO DE HOLANDA SEDE A

La intervención adicional presupuestada para la institución contempla la pintura de fachada del bloque A, junto con la instalación de mallas de protección en áreas de ventana y cambio de cubierta en policarbonato del patio 1.

3. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO

La institución requiere una intervención en el área de canchas de voleibol, ya que presentan cierre permanente por el estado actual de las mismas. Se evidencia desprendimiento de material, desniveles y fisuras evidentes que han ocasionado accidentes. Presupuestalmente se contempla el mejoramiento del terreno para evitar a futuro los asentamientos diferenciales que se presentan actualmente.


Por otra parte, se hace la salvedad que la IED FE Y ALEGRÍA SEDE LOS NARANJOS, fue incluida para su intervención dentro de la modificación contractual No.1 con un rubro de $ 455.893.410. Esta sede no podrá intervenirse, en vista que la misma presenta una serie de limitaciones de índole estructural, por lo cual, el recurso que se invierta bajo el concepto de mejoramientos no podrá garantizar la estabilidad de la infraestructura. Ahora y al tomarse la decisión de desistir de esta intervención de manera conjunta entre las partes intervinientes, desde la SED se otorga el lineamiento de reemplazar esta sede por la IED CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA, donde se invertirá este mismo rubro, principalmente en el cambio de cubiertas existentes, estructura para su soporte y ventanería.

Dado lo anterior, desde la firma contratista de obra se sugiere realizar la aclaración sobre esta novedad, para evitar cualquier tipo de inconveniente a futuro.

Por último, presentamos la programación estimada para la intervención de las 25 instituciones que hacen parte del proyecto:

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Fecha de restricción	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración
1	NOD		ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVC		$ 18.861.262.150,00	373 días
2	NOD		ACTA DE INICIO DE OBRA		$ 0,00	0 días
3	lun 3/04/23		APROBACION ADICION PRESUPUESTAL No 1		$ 0,00	0 días
4	NOD		MANTENIMIENTO PROGRAMADO		$ 17.998.776.222,00	373 días
5	NOD		COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTI		$ 219.837.434,00	167 días
81	NOD		COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHICALES		$ 198.655.641,00	178 días
139	NOD		COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR		$ 561.308.316,42	96 días
143	NOD		COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		$ 1.023.176.986,00	231 días
266	NOD		COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		$ 545.402.098,00	274 días
349	NOD		COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAY		$ 872.012.618,16	233 días
460	NOD		COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA		$ 1.052.310.944,86	176 días
551	NOD		COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO		$ 332.100.486,00	121 días
555	NOD		COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICI		$ 495.768.173,00	339 días
650	NOD		COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MA		$ 1.138.257.853,00	230 días
713	NOD		COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REI		$ 286.045.284,00	106 días
717	NOD		COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PA		$ 770.138.768,23	183 días
802	NOD		COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA		$ 1.407.815.813,89	372 días
924	NOD		COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATER		$ 1.003.774.832,33	247 días
1042	NOD		COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL		$ 286.045.284,00	100 días
1046	NOD		COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN		$ 1.277.252.363,00	179 días
1198	NOD		COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO		$ 441.972.779,00	116 días
1202	NOD		COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B		$ 363.197.157,00	86 días
1206	NOD		COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A		$ 286.045.284,00	118 días
1210	NOD		COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B		$ 286.045.284,00	96 días
1214	NOD		COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$ 3.865.940.160,12	302 días
1343	NOD		COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN		$ 455.893.410,00	101 días
1347	NOD		COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B		$ 286.045.284,00	106 días
1351	NOD		COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A		$ 665.005.624,00	250 días
1458	NOD		COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		$ 268.726.344,00	102 días
1490	NOD		ATENCION DE EMERGENCIAS		$ 862.485.928,00	370 días
1491	NOD		ENTREGA DE OBRA		$ 0,00	0 días

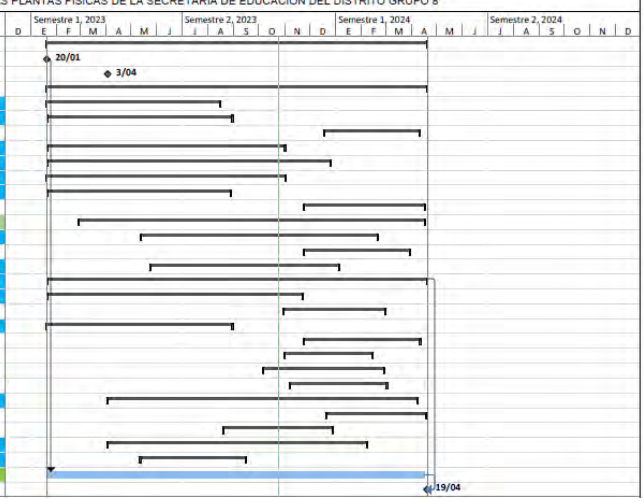

lustración 3 Programación de obra.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El Estatuto de la Contratación Estatal consagró la posibilidad de realizar modificaciones a las condiciones contractuales, con fundamento en la necesidad de salvaguardar el interés general y los fines del estado. Fines e intereses que se encuentran inmersos en toda obra pública. En relación con este punto la Corte Constitucional ha señalado: "Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato"[1].

En efecto, el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 estableció la posibilidad de suscribir modificaciones al contrato con la finalidad de evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con el proyecto. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las circunstancias establecidas en el primer acápite del presente documento, que afectan el cumplimiento a cabalidad del cronograma de obra y constituyen el fundamento de la necesidad de prórroga del contrato.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado sobre el plazo contractual lo siguiente:

> *"Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él,*

[1] Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él"[2]

De lo anterior se desprende que, la suscripción de un acuerdo modificatorio del plazo contractual constituye una prerrogativa en cabeza de las partes contractuales que no desnaturaliza el contrato ni su objeto, por lo tanto, se basa solamente en la necesidad del proyecto.

En ese orden de ideas, tal como se ha manifestado en un principio, los cambios del alcance y adición de frentes que presenta el contrato, generan la necesidad de ampliar en plazo contractual y así asegurar el cabal cumplimiento de la obra y los fines del estado inherentes al proyecto contratado.

En relación con la posibilidad de ampliación del plazo contractual la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa ha señalado:

"La prórroga constituye un valioso instrumento para la administración, por cuanto pueden existir eventos en los que la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público hagan aconsejable la extensión del plazo inicial del respectivo contrato.

"no puede desconocerse que la prórroga de los contratos…puede ser aconsejable para la administración desde el punto de vista técnico y financiero. Por ello, la entidad competente debe contar la posibilidad de evaluar los beneficios que produciría para el Estado y para el interés público la ampliación del término inicial del contrato"[3]

En ese entendido, la suscripción de una prórroga al plazo contractual del contrato de la referencia constituye una necesidad teniendo en cuenta el estado actual del proyecto, la falta de concreción de diferentes de los alcances en los frentes de obra han afectado notoriamente en el cronograma de obra.

SOLICITUD

Por los argumentos expuestos, solicitamos:

1. Prorrogar el contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 por un término de cuatro (4) meses calendario, es decir hasta el 19 de abril del 2023 por los motivos expuestos anteriormente.

[2] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171)A, C.P. Darío Quiñones Pinilla.
[3] Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012. C.P. OLGA MÈLIDA VALLE DE LA HOZ.

2. Adicionar el contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645, por un valor de MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES CON CERO PESOS M/CTE ($1,870,000,000).

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Presupuesto general adición (4 colegios) Programación de obra (25 colegios)
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

CONSORCIO TIG

PRESUPUESTO FE Y ALEGRÍA

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR:

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	50,00	$ 66.944,00	$ 3.347.200,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.008,00	$ 0,00
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	200,00	$ 16.887,00	$ 3.377.400,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1926,00	$ 29.215,00	$ 56.268.090,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	292,00	$ 8.634,00	$ 2.521.128,00
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	6,00	$ 140.804,00	$ 844.824,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	292,00	$ 5.062,00	$ 1.478.104,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	1000,00	$ 6.882,00	$ 6.882.000,00
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	175,00	$ 20.991,00	$ 3.673.425,00
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	104,28	$ 137.004,00	$ 14.286.777,00
1,4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	500,00	$ 23.023,00	$ 11.511.500,00
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	72,00	$ 45.418,00	$ 3.270.096,00
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	72,00	$ 174.350,00	$ 12.553.200,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 120.013.744,00**

4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	200,00	$ 68.798	$ 13.759.600,00
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	25,00	$ 99.155	$ 2.478.875,00
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	200,00	$ 12.174	$ 2.434.800,00
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.6	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	10,00	$ 1.161.502	$ 11.615.020,00
SUBTOTAL	**4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 30.288.295,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	8,00	$ 761.265	$ 6.090.120,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	800,00	$ 42.467	$ 33.973.600,00
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	5800,00	$ 18.061	$ 104.753.800,00
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	M	250,00	$ 49.930	$ 12.482.500,00
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 494.028	$ 1.976.112,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	486,00	$ 266.905,00	$ 129.715.830,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	486,00	$ 194.999	$ 94.769.514,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	216,00	$ 225.499	$ 48.707.784,00
SUBTOTAL	**5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 432.469.260,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INVLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2	35,00	$ 178.306	$ 6.240.710,00
SUBTOTAL	**5 INSTALACIONES PISOS**		**137**		**$ 6.240.710,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2	682,00	$ 319.902,00	$ 218.173.164,00
SUBTOTAL	**5 INSTALACIONES PISOS**				**$ 218.173.164,00**

11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	0,00	$ 693.298,00	$ 0,00
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	0,00	$ 898.607,00	$ 0,00
11.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (P R F V) 30.000 LT	UN	1,00	$ 61.868.044,00	$ 61.868.044,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 61.868.044,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	400,00	$ 20.163,00	$ 8.065.200,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1200,00	$ 23.886,00	$ 28.663.200,00
SUBTOTAL	**13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 36.728.400,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	85,00	$ 48.967,00	$ 4.162.195,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1926,00	$ 181.562,00	$ 349.688.412,00
17.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	M2	175,00	$ 52.208,00	$ 9.136.400,00
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	175,00	$ 12.701,00	$ 2.222.675,00
17.1.44	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	100,00	$ 117.105,00	$ 11.710.500,00
17.1.47	AFINADO PARA CUBIERTA CON MORTERO CON ADICIÓN DE MICROFIBRA, ENDURECIDO CON ROCKTOP, ACABADO CON LLANA METÁLICA.	M2	175,00	$ 145.324,00	$ 25.431.700,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 402.351.882,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	2500,00	$ 7.708,00	$ 19.270.000,00
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	9248,24	$ 1.898,00	$ 17.553.160,00
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	9248,24	$ 2.272,00	$ 21.012.001,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 57.835.161,00**
NP	**NO PREVISTOS**				
NP-13	INSPECCION Y DESTAPONAMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS (INCLUYE ALQUILER DE GEOFONO, SONDA METALICA, MICROCAMARA, EXCAVASION MANUAL) APLICA TANTO PARA AGUA POTABLE COMO PARA AGUAS NEGRAS EVIDENCIANDO LA FUGA Y DESTAPONAMIENTO DE LA TUBERÍA SEGÚN SEA EL CASO	M	65,00	$ 270.149,00	$ 17.559.685,00

NP-20	RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS CARAS)	M	1300,00	$ 15.960,00	$ 20.748.000,00
NP	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS SEGÚN DISEÑO Y DIAGRAMA DE CARGAS	UND	1,00	$ 18.800.000,00	$ 18.800.000,00
NP	ACOMETIDA PRINCIPAL DE TRANSFORMADOR A TGA 3X4/0+1X4/0+1No2 según diagrama unifiar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegria Palermo sur	ML	25,00	$ 654.097,00	$ 16.352.425,00
PRECIO SED 2023	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA H=15 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5113,21	$ 8.422,00	$ 43.063.458,00
	ACOMETIDA HIDRAULICA NUEVA				
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2-1/2"	UN	6,00	$ 38.436,00	$ 230.616,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,00	$ 34.706,00	$ 416.472,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UN	6,00	$ 16.899,00	$ 101.394,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS	M	350,00	$ 24.349,00	$ 8.522.150,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	58,32	$ 13.288,00	$ 774.939,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	150,00	$ 16.425,00	$ 2.463.750,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 "	UN	24,00	$ 9.590,00	$ 230.160,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	156,02	$ 14.694,00	$ 2.292.537,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	32,00	$ 6.474,00	$ 207.168,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	16,00	$ 10.601,00	$ 169.616,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	12,00	$ 4.369,00	$ 52.428,00
SUBTOTAL	**NO PREVISTOS**				**$ 131.984.798,00**

VALOR TOTAL	**$ 1.497.953.458,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 1.497.953.458,00**

CONSORCIO TIG

PRESUPUESTO REINO DE HOLANDA A

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PROPUESTA ECONÓMICA PROCESO DE SELECCIÓN SED-LP-DCCEE-039-2022

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

PRESUPUESTO REINO DE HOLANDA SEDE A

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	30,00	$ 35.570,00	$ 1.067.100,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	532,77	$ 14.094,00	$ 7.508.860,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	20,18	$ 23.023,00	$ 464.604,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 9.040.564,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	532,77	$ 9.784	$ 5.212.622,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.212.622,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M	2964,60	$ 5.481,00	$ 16.248.973,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1355,94	$ 29.105,00	$ 39.464.634,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1214,78	$ 12.080,00	$ 14.674.542,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 70.388.149,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	482,33	$ 7.708,00	$ 3.717.800,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	323,76	$ 6.049,00	$ 1.958.424,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.676.224,00**
22	**NO PREVISTOS**				

NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, ACERO EN ANGULO 1 1/2 X 1/8, INCLUYE PINTURA	M2	290,40	$	453.612,00	$ 131.728.925,00
22	**22. NO PREVISTOS**					**$ 131.728.925,00**

VALOR TOTAL	**$**	**222.046.484,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)		
VALOR TOTAL	**$**	**222.046.484,00**

CONSORCIO TIG

PRESUPUESTO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO CANCHA - LICEO FEMENINO

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	200,00	$ 35.570,00	$ 7.114.000,00
1.1.4	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	100,00	$ 120.021,00	$ 12.002.100,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145,07	$ 66.944,00	$ 9.711.329,00
SUBTOTAL	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 28.827.429,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	96,43	$ 75.296,00	$ 7.260.417,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	96,43	$ 95.957,00	$ 9.252.654,00
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	275,50	$ 123.376,00	$ 33.990.088,00
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.6	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM)	M	29,00	$ 230.086,00	$ 6.672.494,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1100,00	$ 8.711,00	$ 9.582.100,00
SUBTOTAL	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 66.757.753,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	14,70	$ 124.059	$ 1.823.667,00
4.8.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UND.	1,00	$ 733.283	$ 733.283,00
SUBTOTAL	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.556.950,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	20,10	$ 15.621,00	$ 313.982,00
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	M	34,75	$ 21.890,00	$ 760.678,00
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC CONDUIT 2" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	$ 13,40	$ 148.566,00	$ 1.990.784,00
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED STREET PARA ALUMBRADO RECREATIVO DE CANCHA DEPORTIVA TIPO EXTERIOR DE 60W, 100V A 277V. INCLUYE ESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO, ESTRUCTURA CIVIL, CABLE DE PUESTA A TIERRA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND.	2,00	$ 5.571.063,00	$ 11.142.126,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 14.207.570,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	275,50	$ 91.866,00	$ 25.309.083,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**0**		**$ 25.309.083,00**

16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UND.	1,00	$ 10.217.661,00	$ 10.217.661,00
SUBTOTAL	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**0**		**$ 10.217.661,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	275,50	$ 7.708,00	$ 2.123.554,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.123.554,00**

VALOR TOTAL	**$ 150.000.000,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 150.000.000,00**


CONSORCIO TIG

PROGRAMACIÓN DE OBRA

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Fecha de restricción	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración
1	**NOD**		**ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO**		**$ 18.861.262.150,00**	**373 días**
2	NOD		ACTA DE INICIO DE OBRA		$ 0,00	0 días
3	lun 3/04/23		APROBACION ADICION PRESUPUESTAL No 1		$ 0,00	0 días
4	**NOD**		**MANTENIMIENTO PROGRAMADO**		**$ 17.998.776.222,00**	**373 días**
5	**NOD**		**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTI**		**$ 229.837.434,00**	**167 días**
81	**NOD**		**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		**$ 198.655.641,00**	**178 días**
139	NOD		COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR		$ 561.308.316,42	96 días
143	**NOD**		**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		**$ 1.023.178.986,00**	**231 días**
266	**NOD**		**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		**$ 545.402.098,00**	**274 días**
349	**NOD**		**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAY**		**$ 672.012.618,16**	**233 días**
460	**NOD**		**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		**$ 1.052.310.944,86**	**176 días**
551	**NOD**		**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**		**$ 332.100.486,00**	**121 días**
555	**NOD**		**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICE**		**$ 495.768.173,00**	**339 días**
650	**NOD**		**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MA**		**$ 1.138.257.853,00**	**230 días**
713	**NOD**		**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REF**		**$ 286.045.284,00**	**106 días**
717	**NOD**		**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PA**		**$ 770.138.768,23**	**183 días**
802	**NOD**		**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		**$ 1.407.815.813,89**	**372 días**
924	**NOD**		**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATER**		**$ 1.003.774.832,32**	**247 días**
1042	**NOD**		**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**		**$ 286.045.284,00**	**100 días**
1046	**NOD**		**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		**$ 1.277.252.363,00**	**179 días**
1198	**NOD**		**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**		**$ 441.972.779,00**	**116 días**
1202	**NOD**		**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**		**$ 363.197.157,00**	**86 días**
1206	**NOD**		**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		**$ 286.045.284,00**	**118 días**
1210	**NOD**		**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**		**$ 286.045.284,00**	**96 días**
1214	**NOD**		**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**		**$ 3.665.940.160,12**	**302 días**
1343	**NOD**		**COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN**		**$ 455.893.410,00**	**101 días**
1347	**NOD**		**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		**$ 286.045.284,00**	**106 días**
1351	**NOD**		**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		**$ 665.005.624,00**	**250 días**
1458	**NOD**		**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		**$ 268.726.344,00**	**102 días**
1490	**NOD**		**ATENCION DE EMERGENCIAS**		**$ 862.485.928,00**	**370 días**
1491	NOD		ENTREGA DE OBRA		$ 0,00	0 días

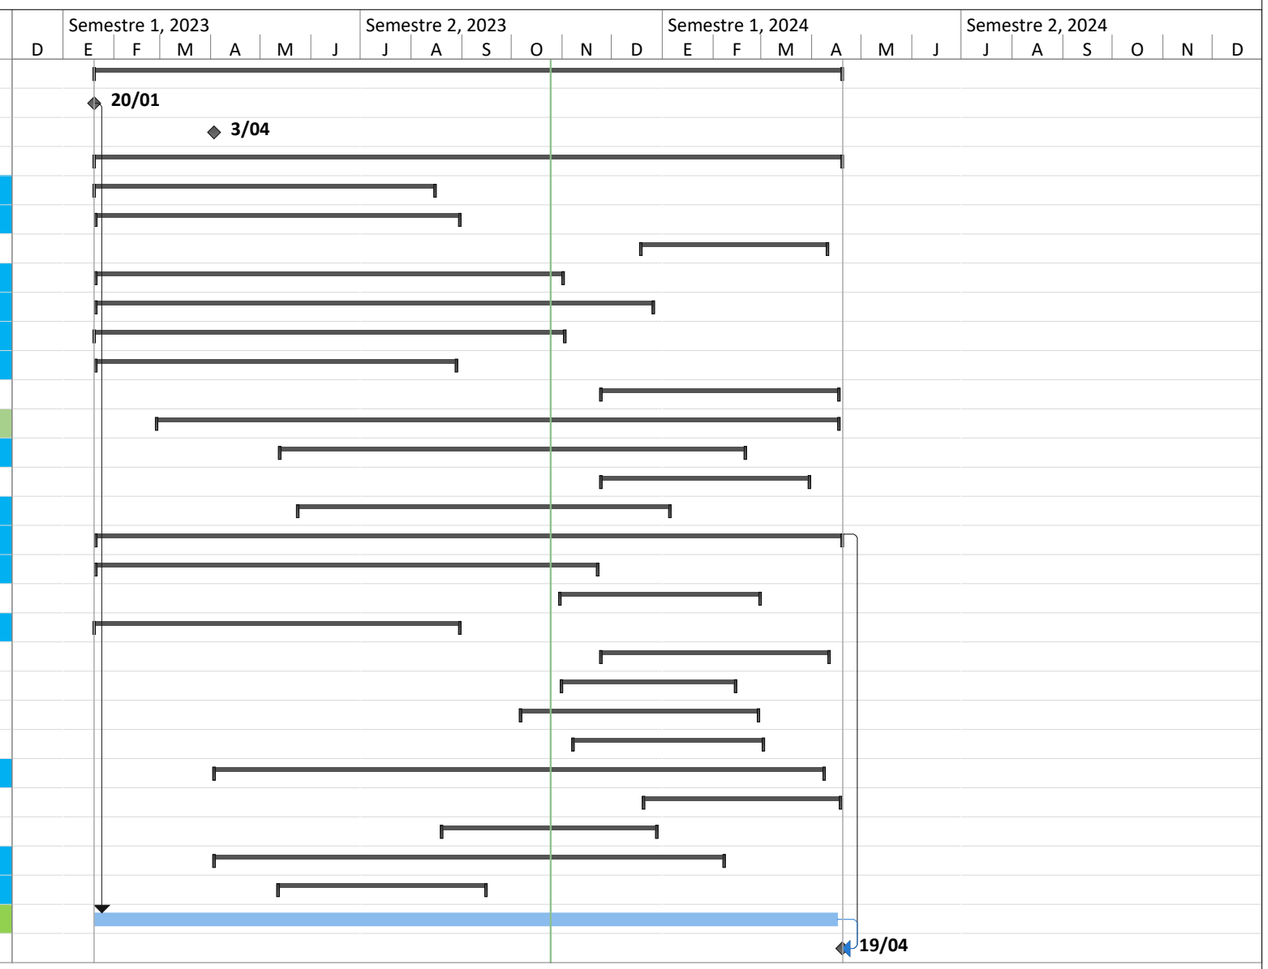

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-377

Bogotá, D.C, 25 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO No. No.CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Solicitud de adición No.2 y prórroga No.1 correspondiente al contrato de interventoría No.CO1.PCCNTR.4155718

Con base en la comunicación oficial enviada por parte del contratista de obra por medio del oficio 2023_RUU_MGP_256 y de acuerdo con la asignación de recursos adicionales por parte de la Secretaría de Educación Distrital enviamos solicitud de adición de recursos No.2 y prórroga No.1 al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4155718, partiendo de las siguientes consideraciones, a saber:

1. Mediante licitación pública No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022, publicada en la plataforma SECOP II, se adelantó el proceso de selección que tenía por objeto “INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE

INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".

2. Una vez surtido el proceso de selección, se adjudicó el GRUPO 8 al proponente CONSORCIO TIG con NIT 901649890-3 representado legalmente por EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL, cuya adjudicación comprende un plazo inicial de ejecución de DOCE (12) MESES, y un valor inicial de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($878.587.938) incluido A.I.U.

3. El día 03 de enero de 2023, una vez cumplidos los requisitos legales para el perfeccionamiento de los contratos No. CO1.PCCNTR.4155718 (Grupo 8) de interventoría y el día 20 de enero de 2023 No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) de obra, se procedió a la suscripción de las actas de inicio de los mismos.

4. El alcance inicial abarcaba la intervención de diecisiete (17) frentes de obra para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8).

5. En el mes de marzo de 2023, una vez analizadas las circunstancias del caso, las partes, de mutuo acuerdo, y a solicitud de la necesidad de la Secretaria de Educación del Distrito (SED) de mejorar la infraestructura educativa de acuerdo a los recursos que serán invertidos en mantenimientos programados a los ocho (8) colegios adicionales. Surge la necesidad del Modificatorio adición No. 1 bajo el entendido que el alcance del objeto del Contrato de Obra, conlleva acometer actividades de ADECUACIÓN, y atención de REQUERIMIENTOS y NECESIDADES para la prestación del servicio educativo y ante la necesidad de intervención de las obras requeridas en las I.E.D., así como la ejecución eficiente y los recursos propios de la entidad para el cumplimiento de los propósitos para los que fueron gestionados; y en acatamiento de los principios de planeación, eficiencia, economía, responsabilidad habida consideración que se cuenta con la oportunidad necesaria para la ejecución de los mismos.

6. Dicho lo anterior, el Modificatorio adición No. 01 del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4155718 (Grupo 8) de 2022, consideró una adición de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($371,557,789.00) la cual no generó solicitud prorroga y se mantiene bajo los plazos contractuales.

7. En tal sentido, el plazo contractual actualizado para el contrato de interventoría objeto de vigilancia, fue de DOCE (12) MESES, es decir que el plazo se mantuvo de acuerdo a lo establecido y la finalización del contrato será para el 02 de enero de 2024.

8. El alcance actualizado según modificación adición No.01 comprendió la intervención adicional de ocho (08) frentes de obra para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) para un total de 25 de frentes a ejecutar.

9. En el mes de octubre de 2023, una vez analizadas las circunstancias del caso, las partes, de mutuo acuerdo, y a solicitud de la necesidad de la Secretaria de Educación del Distrito (SED) de mejorar la infraestructura educativa con la ampliación del alcance físico de tres (3) instituciones de las que actualmente están en ejecución, surge la necesidad del Modificatorio No.2 por adición No.2 y prórroga No.1 bajo el entendido que el alcance del objeto del Contrato de Obra, conlleva acometer actividades de ADECUACIÓN, y atención de REQUERIMIENTOS y NECESIDADES para la prestación del servicio educativo y ante la necesidad de intervención de las obras requeridas en las I.E.D., así como la ejecución eficiente y los recursos propios de la entidad para el cumplimiento de los propósitos para los que fueron gestionados; y en acatamiento de los principios de planeación, eficiencia, economía, responsabilidad habida consideración que se cuenta con la oportunidad necesaria para la ejecución de los mismos.

10. Dicho lo anterior, el Modificatorio No.2 por adición No.2 y prórroga No.1 del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4155718 (Grupo 8) de 2022, considera una adición de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/C ($ 187.000.000) la cual va acompañada de una solicitud prorroga por un plazo de cuatro (4) meses calendario.

11. En tal sentido, el plazo contractual actualizado para el contrato de interventoría objeto de vigilancia, será de DIECISEIS (16) MESES, es decir la nueva fecha de terminación será el 02 de mayo de 2024.

12. El alcance actualizado según modificación adición No.02 y prórroga No.1 comprenderá la intervención de mayor alcance en tres (3) frentes de obra para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) conservando el número actual de 25 de frentes.

1. ALCANCE MODIFICACIÓN NO. 1 – GRUPO DE OBRA No. 8

Las instituciones educativas por intervenir dentro del alcance de la modificación No.2 para el grupo de obra No. 8, involucra tres (3) con mayores alcances físicos, las cuales se relacionan a continuación:

COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO	CONDICIÓN
FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$ 1.497.953.458,00	FRENTE EXISTENTE
REINO DE HOLANDA	A	$ 222.046.542,00	FRENTE EXISTENTE
LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		$ 150.000.000,00	FRENTE EXISTENTE
TOTAL		$ 1.870.000.000,00	

Los alcances definidos para cada una de las instituciones a intervenirse se describen a continuación:

1. Fe y alegría Palermo sur

La institución requiere una intervención del componente eléctrico, con suministro e instalación de tableros y acometidas, cabe aclar que los permisos ante la entidad competente están a cargo de la SED.

Adicionalmente, se debe contemplar la instalación de tanques para el suministro de agua ubicados en la parte superior de la institución, de igual manera los permisos requeridos para el correcto funcionamiento de la institución ante la entidad competente deben ser tramitados por la SED.

Se contempla el mantenimiento especifico según la disponibilidad presupuestal asignada y a las actividades requeridas en actas de comité.

2. Reino de Holanda sede A

La intervención adicional presupuestada para la institución contempla la pintura de fachada del bloque A, junto con la instalación de mallas de protección en áreas de ventana y cambio de cubierta en policarbonato del patio 1.

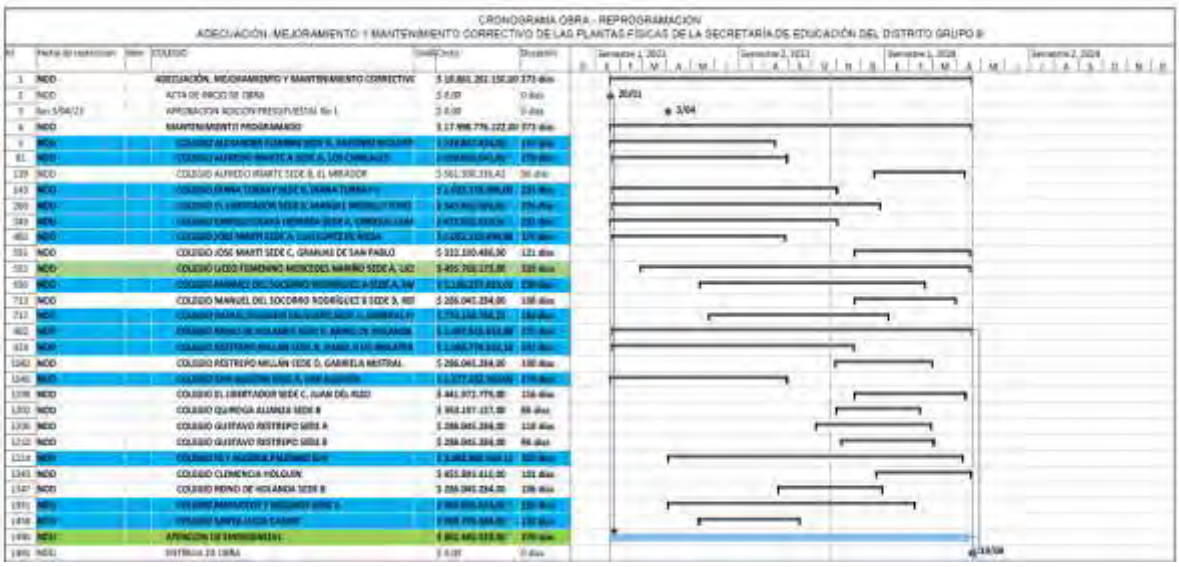
3. Liceo femenino mercedes Nariño

La institución requiere una intervención en el área de canchas de voleibol, ya que presentan cierre permanente por el estado actual de las mismas. Se evidencia desprendimiento de material, desniveles y fisuras evidentes que han ocasionado accidentes. Presupuestalmente se contempla el mejoramiento del terreno para evitar a futuro los asentamientos diferenciales que se presentan actualmente.

Por otra parte, se hace la salvedad que la IED FE Y ALEGRÍA SEDE LOS NARANJOS, fue incluida para su intervención dentro de la modificación contractual No.1 con un rubro de $ 455.893.410. Esta sede no podrá intervenirse, en vista que la misma presenta una serie de limitaciones de índole estructural, por lo cual, el recurso que se invierta bajo el concepto de mejoramientos no podrá garantizar la estabilidad de la infraestructura. Ahora y al tomarse la decisión de desistir de esta intervención de manera conjunta entre las partes intervinientes, desde la SED se otorga el lineamiento de reemplazar esta sede por la IED CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA, donde se invertirá este mismo rubro, principalmente en el cambio de cubiertas existentes, estructura para su soporte y ventanería.

Dado lo anterior, desde la firma contratista de obra e interventoría se sugiere realizar la aclaración sobre esta novedad, para evitar cualquier tipo de inconveniente a futuro.

Por último, se anexa copia de la programación estimada para la intervención de las 25 instituciones que hacen parte del proyecto, para que la misma sea analizada de manera integral por la Entidad Contratante.



2. ALCANCE MODIFICACIÓN No.2 – INTERVENTORÍA

Bajo la consideración que el contrato de Interventoría y los contratos de obra objeto de vigilancia, deban ser ajustados de manera homogénea, ajustándose el contrato de interventoría a las nuevas necesidades del contrato que le da origen, garantizando el equilibrio contractual y cumplimiento de la finalidad del contrato en óptimas condiciones, enfocado en correcta vigilancia de las actividades adicionales a ejecutar por los contratistas de obra, nos permitimos dar algunas claridades:

1. La interventoría garantiza a la entidad contratante, la correcta vigilancia y seguimiento de las actividades y recursos invertidos en cada una de las instituciones educativas a cargo de los contratistas de obra objeto de supervisión, vigilancia que se logra a través de la participación de cada uno de los profesionales destinados dentro de los recursos asignados al contrato de interventoría.

2. De acuerdo al objeto contractual de referencia, el contrato de interventoría además de vigilar integralmente las obras de adecuación y mantenimiento, debe garantizar el correcto seguimiento a la atención de emergencias que se presenten durante todo el transcurso del contrato, y considerando que dichas actividades están enmarcadas dentro de un tiempo “imprevisto” y su atención debe darse de forma “urgente”, es necesario destinar recursos humanos que garanticen la correcta vigilancia y atención oportuna, de acuerdo con las necesidades de cada uno de las instituciones educativas.

3. De igual manera es importante precisar que, ante la necesidad de respuesta oportuna a una queja, PQR, derecho de petición o solicitud de post venta, efectuada por las instituciones educativas intervenidas, es necesario la destinación de personal de interventoría que garantice la oportuna respuesta al caso, certificando la correcta inversión de los recursos destinados por la Entidad a cada una de las instituciones. Es importante aclarar que esta actividad no exime al contratista del cumplimiento de sus obligaciones y garantía de calidad sobre las actividades ejecutadas.

4. De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se presenta la dedicación y cantidad de profesionales propuestos para el seguimiento de las actividades dentro del plazo contractual del Modificatorio No.2:

ITEM	CARGO Y/O DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACIÓN MES
				A	C
1.1.1 PERSONAL PROFESIONAL					
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA - CANTIDAD 1 CON DEDICACIÓN DE 0%	4	MES	1	50%
2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - CANTIDAD 1 CON DEDICACIÓN DE 100%	4	MES	2	100%
3	ASESOR ESTRUCTURAL - CANTIDAD 1 CON DEDICACIÓN DEL 5%	4	MES	1	5%
4	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS 5%	4	MES	1	5%
5	ASESOR AMBIENTAL - CANTIDAD 1 CON DEICACIÓN DEL 50%	4	MES	1	50%
6	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA - CANTIDAD 1 CON DEDICACIÓN DEL 10%	4	MES	1	10%
7	ASESOR HIDROSANITARIO RCI	4	MES	1	5%
8	ASESOR JURÍDICO - CANTIDAD 1 CON DEDICACIÓN DEL 5%	4	MES	1	5%
1.1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
9	INSPECTOR 1 - CANTIDAD 2 CON DEDICACIÓN DEL 100%	4	MES	2	100%
10	MAESTRO DE OBRA	4	MES	1	5%
11	TÉCNICO O TECNÓLOGO SST - CANTIDAD 2 CON DEDICACIÓN DEL 100%	4	MES	1	100%

Tabla No. 1 *Personal profesional y técnico para solicitud de modificación No. 2*

Los profesionales como director, residentes e inspectores, participan en la vigilancia de cada uno de los frentes de obra activos, garantizando la correcta vigilancia de las actividades ejecutadas por cada uno de los contratistas de obra, así como las actividades administrativas, comprendidas dentro de las obligaciones contractuales del contrato de referencia.

Los profesionales especialistas y asesores participan de manera transversal en cada uno de los frentes de obra, realizando las revisiones necesarias de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista de obra, verificando el cumplimiento técnico de acuerdo con la normatividad vigente.

Los profesionales SST tienen presencia permanente en todos los frentes de obra abiertos, garantizando la verificación al correcto cumplimento de normatividad vigente.


Es importante precisar, que el presupuesto de las actividades de obra puede variar según el alcance que se defina, que se utilizará para temas relacionados con los colegios expuestos anteriormente, tal y como se establece en el contrato inicial.

	PRESUPUESTO	INICIO	FIN	No. FRENTES
INICIAL	$11,941,262,150.00	20-ene-23	19-dic-23	17
MODIFICACIÓN No. 1	$ 5,050,000,000.00	15-abr-23	19-dic-23	8

	PRESUPUESTO	INICIO	FIN	No. FRENTES
MODIFICACIÓN No.2	$ 1,870,000,000.00	19-dic-23	19-may-24	0
TOTAL	$18,861,262,150.00	20-ene-23	19-may-24	25

	PRESUPUESTO	INICIO	FIN	No. FRENTES
INICIAL	$878,587,938.00	03ene-23	02-ene-24	17
MODIFICACIÓN NO. 1	$371,557,789.00	15-abr-23	02-ene-24	8
MODIFICACIÓN NO. 1	$187,000,000.00	02-ene-24	02-may-24	0
TOTAL	$1,437.145.727.00	03 ene-23	02-ene-24	25

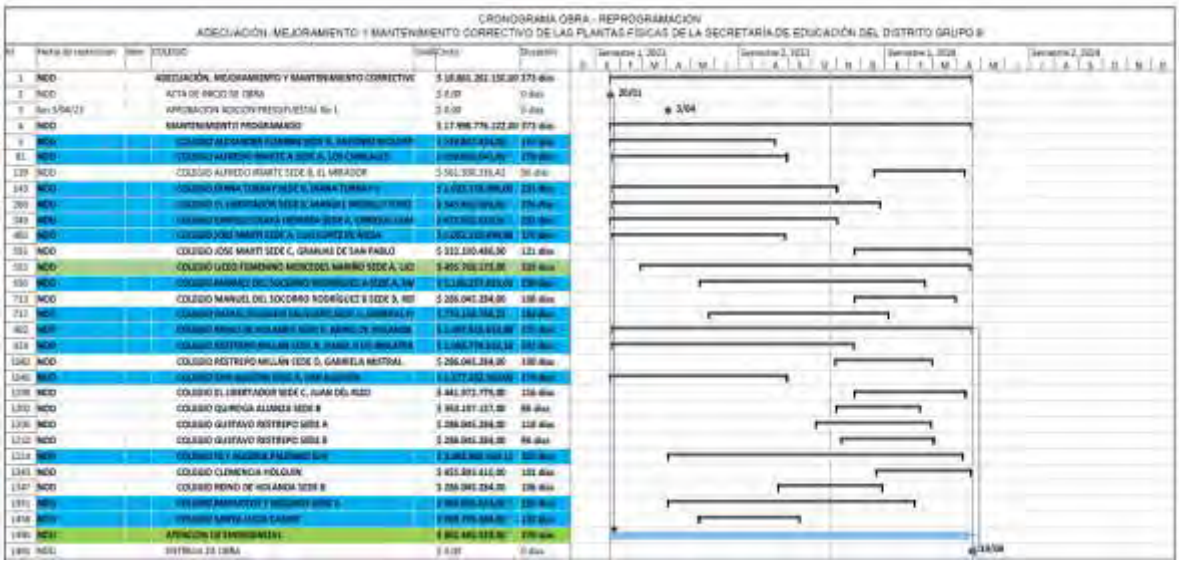A continuación, se muestra el cronograma de ejecución de los diferentes frentes de obra, donde se involucra la totalidad de los colegios previstos en la modificación No.1 y lo estimado para la modificación No.2, donde se evidencian los distintos tiempos de ejecución y con ello la necesidad del tiempo adicional requerido a través de la presente solicitud, el cual asciende a cuatro (4) meses calendario.




De acuerdo a este contexto, esta Interventoría manifiesta la solicitud de adición presupuestal a la Secretaría de Educación del Distrito, por valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($187,000,00.00). El alcance de cada una de las obras a realizar en dichos colegios ha sido definido mediante visitas a campo realizadas por personal de la interventoría y de la Secretaría de Educación del Distrito, por lo que se cuenta con la debida justificación y memorias de cálculo respectivas, cabe resaltar que el presupuesto de las actividades de obra puede variar según el mejoramiento en intervenciones de cada frente tal y como se establece en el contrato inicial. Por otra parte y acorde a la necesidad dado estos mayores alcances, el plazo contractual actualizado para el contrato de obra objeto

CONSORCIO TIG

de vigilancia, será de QUINCE (15) MESES, es decir la nueva fecha de terminación será el 19 de abril de 2024.

Sin otro particular.

Cordialmente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal
CONSORCIO TIG
Nit: 90164989-03

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo comunicado:
Propuesta económica de interventoría para solicitud de modificación No.2
Comunicado de obra 2023_RUU_MGP_256
Presupuesto preliminar general de las sedes educativas adicionales
Cronograma de actividades de las obras a ejecutar

CONSORCIO TIG

COPIA COMUNICADO TIG-MEM-376

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-376

Bogotá, D.C, 25 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Solicitud de adición No.2 y prórroga No.1 correspondiente al contrato de obra No.CO1.PCCNTR.4077645

Respetados señores:

Con base en el comunicado 2023_RUU_MGP_256 allegado por parte del CONSORCIO MIA GP y con base a la asignación de recursos adicionales por parte de la Secretaría de Educación Distrital al contrato de obra objeto de vigilancia, elevamos la presente solicitud de adición de recursos No.2 y prórroga No.1 al contrato de obra No.CO1.PCCNTR.4077645, partiendo de las siguientes consideraciones, a saber:

1. Mediante licitación pública de infraestructura social No. SED-LP-DCCEE-039-2022 publicada en la plataforma SECOP II, se adelantó el proceso de selección que tenía por objeto “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS

PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

2. Una vez surtido el proceso de selección, se adjudicó el **GRUPO 8** al proponente CONSORCIO MIA GP, identificado con N.I.T: 901634703-9, representado legalmente por MATEO LUZARDO VILLAMIZAR, cuya adjudicación comprende un plazo inicial de ejecución de once (11) MESES, y un valor inicial de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE ($11.941.262.150,00) incluido A.I.U. y el **GRUPO 8** al proponente de interventoría CONSORCIO TIG, identificado con N.I.T: 901649890-3, representado legalmente por EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL, cuya adjudicación comprende un plazo inicial de ejecución de doce (12) MESES, y un valor inicial de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($878.587.938) incluido A.I.U.

3. El día 03 de enero de 2023, una vez cumplidos los requisitos legales para el perfeccionamiento de los contratos No. CO1.PCCNTR.4155718 (Grupo 8) de interventoría y el día 20 de enero de 2023 No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) de obra, se procedió a la suscripción de las actas de inicio de los mismos.

4. El alcance inicial abarcaba la intervención de diecisiete (17) frentes de obra para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8).

5. En el mes de marzo de 2023, una vez analizadas las circunstancias del caso, las partes, de mutuo acuerdo, y a solicitud de la necesidad de la Secretaria de Educación del Distrito (SED) de mejorar la infraestructura educativa de acuerdo a los recursos que serán invertidos en mantenimientos programados a los ocho (8) colegios adicionales. Surge la necesidad del Modificatorio adición No. 1 bajo el entendido que el alcance del objeto del Contrato de Obra, conlleva acometer actividades de ADECUACIÓN, y atención de REQUERIMIENTOS y NECESIDADES para la prestación del servicio educativo y ante la necesidad de intervención de las obras requeridas en las I.E.D., así como la ejecución eficiente y los recursos propios de la entidad para el cumplimiento de los propósitos para los que fueron gestionados; y en acatamiento de los principios de planeación, eficiencia, economía, responsabilidad habida consideración que se cuenta con la oportunidad necesaria para la ejecución de los mismos.

6. Dicho lo anterior, el Modificatorio adición No. 01 del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) de 2022, consideró una adición de CINCO MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C ($ 5.050.000.000) la cual no generó solicitud prorroga y se mantuvo bajo los plazos contractuales.

7. En el mes de octubre de 2023, una vez analizadas las circunstancias del caso, las partes, de mutuo acuerdo, y a solicitud de la necesidad de la Secretaria de Educación del Distrito (SED) de mejorar la infraestructura educativa con la ampliación del alcance fisico de tres (3) instituciones de las que actualmente están en ejecución, surge la necesidad del Modificatorio No.2 por adición No.2 y prórroga No.1 bajo el entendido que el alcance del objeto del Contrato de Obra, conlleva acometer actividades de ADECUACIÓN, y atención de REQUERIMIENTOS y NECESIDADES para la prestación del servicio educativo y ante la necesidad de intervención de las obras requeridas en las I.E.D., así como la ejecución eficiente y los recursos propios de la entidad para el cumplimiento de los propósitos para los que fueron gestionados; y en acatamiento de los principios de planeación, eficiencia, economía, responsabilidad habida consideración que se cuenta con la oportunidad necesaria para la ejecución de los mismos.

8. Dicho lo anterior, el Modificatorio No.2 por adición No.2 y prórroga No.1 del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) de 2022, considera una adición de MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/C ($ 1.870.000.000) la cual va acompañada de una solicitud prorroga por un plazo de cuatro (4) meses calendario.

9. En tal sentido, el plazo contractual actualizado para el contrato de obra objeto de vigilancia, será de QUINCE (15) MESES, es decir la nueva fecha de terminación será el 19 de abril de 2024.

10. El alcance actualizado según modificación adición No.02 comprenderá la intervención de mayor alcance en tres (3) frentes de obra para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) conservando el número actual de 25 de frentes.

De acuerdo con lo anterior y, considerando que el contrato de referencia no ha surtido proceso de modificación No.02 y, bajo la consideración que entre el Contrato de Interventoría y el Contrato de Obra objeto de vigilancia se configura una coligación negocial que implica que las modificaciones realizadas sobre las condiciones de ejecución del contrato supervisado impacten de manera sustancial el alcance y condiciones del contrato de interventoría, de tal forma que deban ser ajustados de manera homogénea garantizando el equilibrio contractual y cumplimiento de la finalidad del contrato en óptimas condiciones, ajustándose el contrato de interventoria a las nuevas necesidades del contrato que le da origen, y de acuerdo a la solicitud realizada por la entidad, nos permitimos dar algunas claridades relacionadas con el alcance dado a la Modificación No.2 por adición No.2 y prórroga No.1.

1. ALCANCE MODIFICACIÓN No.2 – GRUPO DE OBRA No. 8

El contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 correspondiente al grupo No. 8, dentro del alcance actual abarca la ejecución de veinticinco (25) frentes de obra, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

GRUPO 8 RAFAEL URIBE URIBE				
No	**LOCALIDAD**	**COLEGIO**	**SEDE**	**NOMBRE DE SEDE**
1	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALEXANDER FLEMING	B	ANTONIO RICAURTE
2	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A	A	LOS CHIRCALES
3	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALFREDO IRIARTE	B	EL MIRADOR
4	RAFAEL URIBE	COLEGIO DIANA TURBAY	B	DIANA TURBAY II
5	RAFAEL URIBE	COLEGIO EL LIBERTADOR	B	MANUEL MURILLO TORO
6	RAFAEL URIBE	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA	A	ENRIQUE OLAYA HERRERA
7	RAFAEL URIBE	COLEGIO JOSE MARTI	A	LUIS LOPEZ DE MESA
8	RAFAEL URIBE	COLEGIO JOSE MARTI	C	GRANJAS DE SAN PABLO
9	RAFAEL URIBE	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	A	LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO
10	RAFAEL URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A	A	MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ
11	RAFAEL URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B	B	REPUBLICA DE ISRAEL
12	RAFAEL URIBE	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO	A	GENERAL PAEZ
13	RAFAEL URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA	A	REINO DE HOLANDA
14	RAFAEL URIBE	COLEGIO RESTREPO MILLÁN	B	ISABEL II DE INGLATERRA
15	RAFAEL URIBE	COLEGIO RESTREPO MILLÁN	D	GABRIELA MISTRAL
16	RAFAEL URIBE	COLEGIO SAN AGUSTÍN	A	SAN AGUSTÍN

GRUPO 8 RAFAEL URIBE URIBE				
No	**LOCALIDAD**	**COLEGIO**	**SEDE**	**NOMBRE DE SEDE**
17	RAFAEL URIBE	COLEGIO EL LIBERTADOR	C	JUAN DEL RIZO
18	RAFAEL URIBE	COLEGIO QUIROGA ALIANZA	B	
19	RAFAEL URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	A	
20	RAFAEL URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	B	
21	RAFAEL URIBE	FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		
22	RAFAEL URIBE	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA		
23	RAFAEL URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA	B	
24	RAFAEL URIBE	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS	A	
25	RAFAEL URIBE	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		

Es importante precisar, que el presupuesto de las actividades de obra puede variar según el alcance que se defina en campo, que se utilizará para temas relacionados con los colegios expuestos anteriormente, tal y como se establece en el contrato inicial.

Por otra parte, se hace la salvedad que la IED FE Y ALEGRÍA SEDE LOS NARANJOS, fue incluida para su intervención dentro de la modificación contractual No.1 con un rubro de $ 455.893.410. Esta sede no podrá intervenirse, en vista que la misma presenta una serie de limitaciones de índole estructural, por lo cual, el recurso que se invierta bajo el concepto de mejoramientos no podrá garantizar la estabilidad de la infraestructura. Ahora y al tomarse la decisión de desistir de esta intervención de manera conjunta entre las partes intervinientes, desde la SED se otorga el lineamiento de reemplazar esta sede por la IED CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA, donde se invertirá este mismo rubro, principalmente en el cambio de cubiertas existentes, estructura para su soporte y ventanería.

Dado lo anterior, desde la firma contratista de obra e interventoría se sugiere realizar la aclaración sobre esta novedad, para evitar cualquier tipo de inconveniente a futuro.


La adición de recursos se solicita con base en los términos establecido en la LEY 80 DE 1993, parágrafo del artículo 40, el cual reza:

> *En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.*
>
> *Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. (Cursiva fuera de texto)*

Para este caso en particular, la relación se realiza sobre SMMLV, donde se está cumpliendo con la condición del 50% permitido.

	PRESUPUESTO	INICIO	FIN	No. FRENTES
INICIAL	$11,941,262,150.00	20-ene-23	19-dic-23	17
MODIFICACIÓN No. 1	$ 5,050,000,000.00	15-abr-23	19-dic-23	8
MODIFICACIÓN No.2	$ 1,870,000,000.00	19-dic-23	19-abr-24	0
TOTAL	$18,861,262,150.00	20-ene-23	19-abr-24	25

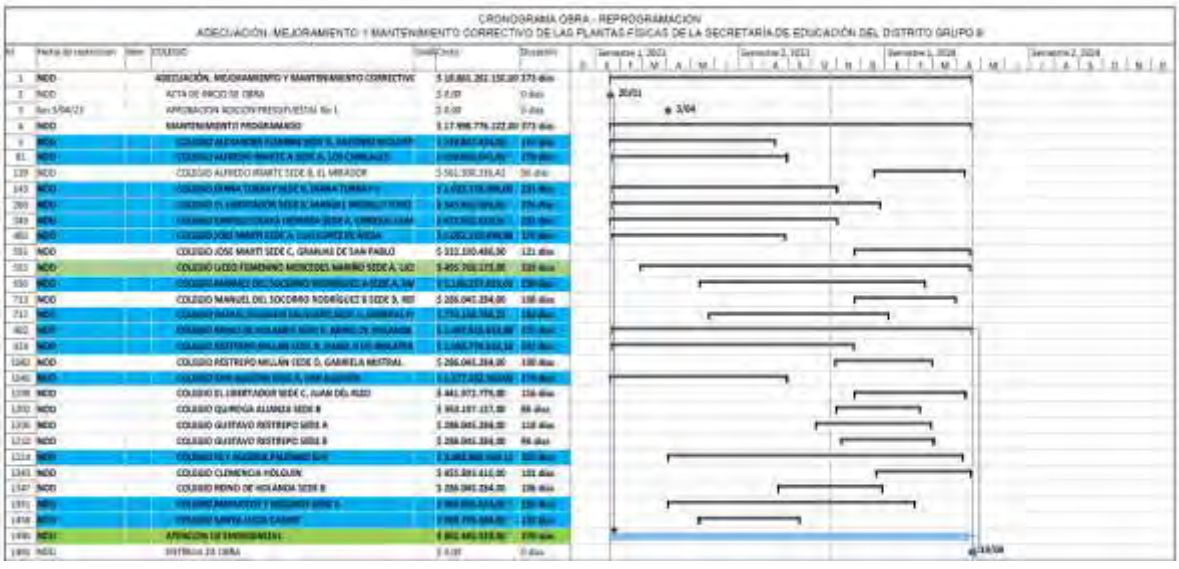A continuación, se muestra el cronograma de ejecución de los diferentes frentes de obra, donde se involucra la totalidad de los colegios previstos en la modificación No.1 y lo estimado para la modificación No.2, donde se evidencian los distintos tiempos de ejecución y con ello la necesidad del tiempo adicional requerido a través de la presente solicitud, el cual asciende a cuatro (4) meses calendario.



1.1. Alcance previsto para el frente adicional y mayores alcances en frentes existentes – Modificación No.2 Grupo 8

Las instituciones educativas por intervenir dentro del alcance de la modificación No.2 para el grupo de obra No. 8, involucra tres (3) con mayores alcances físicos, las cuales se relacionan a continuación:

COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO	CONDICIÓN
FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$ 1.497.953.458,00	FRENTE EXISTENTE
REINO DE HOLANDA	A	$ 222.046.542,00	FRENTE EXISTENTE
LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		$ 150.000.000,00	FRENTE EXISTENTE
TOTAL		$ 1.870.000.000,00	

Los alcances definidos para cada una de las instituciones a intervenirse se describen a continuación:

1. Fe y alegría Palermo sur

La institución requiere una intervención del componente eléctrico, con suministro e instalación de tableros y acometidas, cabe aclar que los permisos ante la entidad competente están a cargo de la SED.

Adicionalmente, se debe contemplar la instalación de tanques para el suministro de agua ubicados en la parte superior de la institución, de igual manera los permisos requeridos para el correcto funcionamiento de la institución ante la entidad competente deben ser tramitados por la SED.

Se contempla el mantenimiento especifico según la disponibilidad presupuestal asignada y a las actividades requeridas en actas de comité.

2. Reino de Holanda sede A

La intervención adicional presupuestada para la institución contempla la pintura de fachada del bloque A, junto con la instalación de mallas de protección en áreas de ventana y cambio de cubierta en policarbonato del patio 1.

3. Liceo Femenino Mercedes Nariño

La institución requiere una intervención en el área de canchas de voleibol, ya que presentan cierre permanente por el estado actual de las mismas. Se evidencia desprendimiento de material, desniveles y fisuras evidentes que han ocasionado accidentes. Presupuestalmente se contempla el mejoramiento del terreno para evitar a futuro los asentamientos diferenciales que se presentan actualmente.

Por último, se anexa copia de la programación estimada para la intervención de las 26 instituciones que hacen parte del proyecto, para que la misma sea analizada de manera integral por la Entidad Contratante.

De acuerdo a este contexto, esta Interventoría manifiesta su aprobación y recomienda a la Secretaría de Educación del Distrito la solicitud de adición presupuestal No.2 realizada por el contratista de obra Consorcio MIA GP a través del contrato No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022, por valor de MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/C ($1.870.000.00) y la prórroga por un plazo adicional de cuatro (4) meses calendario. El alcance de cada una de las obras a realizar en dichos colegios ha sido definido mediante visitas a campo realizadas por personal de la interventoría y de la Secretaría de Educación del Distrito, por lo que se cuenta con la debida justificación y memorias de cálculo respectivas, cabe resaltar que el presupuesto de las actividades de obra puede variar según el mejoramiento en intervenciones de cada frente tal y como se establece en el contrato inicial. Por otra parte y acorde a la necesidad dado estos mayores alcances, el plazo contractual actualizado para el contrato de obra objeto de vigilancia, será de QUINCE (15) MESES, es decir la nueva fecha de terminación será el 19 de abril de 2024.

Cordialmente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal
CONSORCIO TIG
Nit: 90164989-03

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
Anexos:
Comunicado de obra 2023_RUU_MGP_256
Presupuesto preliminar general de las sedes educativas adicionales
Cronograma de actividades de las obras a ejecutar

CONSORCIO TIG

COPIA COMUNICADO DE OBRA 2023_RUU_MGP_256

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2023

2023_RUU_MGP_256

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal Consorcio TIG
Carrera 47A No 93-41 Barrio La
CastellanaBogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Solicitud adición presupuestal No. 2 y prorroga No. 1 al contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645

Cordial saludo,

Yo MATEO LUZARDO VILLAMIZAR, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de representante legal de la figura plural, CONSORCIO MIA GP distinguida con NIT. 901.634.703-9, por medio del presente escrito y teniendo en cuenta el asunto de la referencia, me permito esgrimir para su conocimiento, los motivos técnicos y razones que redondean la solicitud adición No 2 por un valor de mil ochocientos setenta millones con cero pesos m/cte ($1,870,000,000) y prorroga No. 1 de cuatro (4) meses posteriores a la fecha de finalización del contrato estipulada para el 19 de diciembre de 2023, en ese orden de ideas, le manifestamos:

Primero: Se han presentado modificaciones y/o ampliaciones de los alcances de las intervenciones generando mayores tiempos en los frentes a intervenir.

Una vez iniciadas las intervenciones en las Instituciones educativas, en el desarrollo de las obras, surgió la necesidad de ejecutar obras adicionales, lo que genero el impedimento de cierre de los frentes de trabajo y la apertura de otros, llevando a una mayor permanencia en obra y tiempos de ejecución no contemplados inicialmente, el cual deberá ser tenido en cuenta dentro de la programación general, estas actividades adicionales son:

- **COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**

Una vez iniciadas las actividades para el mantenimiento de las nueve (09) aulas mediante los cuales se habilitarían los cuatro bloques inferiores del COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR, se estableció por parte de la SED la necesidad ampliar la cobertura del colegio.

El cumplimiento de este objetivo se logra mediante la adecuación de aulas adicionales para lo cual se requiere identificar las necesidades técnicas que deben atenderse en estos espacios, esto mediante el cálculo y propuesta técnica de redes eléctricas, sanitarias e hidráulicas, habilitación de cubiertas y rocería, para de esta manera proceder con la actualización del presupuesto en torno al nuevo alcance y su posterior ejecución. Ver actas de comité 10 de mayo de 2023, 11 de julio de 2023, 03 de agosto de 2023 y finalmente aval de actividades mediante comité conjunto del día 20 de septiembre en las instalaciones de la secretaria de educación.

Este proceso de evaluación de diagnósticos que inicio en el mes de mayo de 2023, donde se realizó estudio técnico de redes existentes, propuesta técnica de instalaciones para habilitación de áreas existentes y ejecución de obras requirió de un tiempo para su análisis y presupuesto, tiempo que deberá ser adicionado al plazo actual del contrato a fin de que puedan ser ejecutadas por el contratista.

- **COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**

El alcance en este colegio obedece principalmente al cambio de cubiertas, por lo cual la institución educativa requirió evacuar los espacios para que se pudieran intervenir de manera paulatina. Esta situación requirió de una logística interna dentro del Colegio para el retiro de mobiliario y entrega de los espacios por lo cual los trabajos se han ejecutado en la medida que la Institución Educativa coordina la entrega de espacios.

Es de resaltar los planteamientos del comedor ya que requería inicialmente conceso entre las partes (institución educativa y compensar) para la entrega de alimentos la intervención contemplaba realizar un mantenimiento a piso existente en tablón de gres, mediante el llenado de juntas, sin embargo, se determinó que el piso existente presentaba deterioros significativos (golpes, destornillamientos, levantamiento de piezas) lo cual impedía que el Contratista garantizara un adecuado mantenimiento, además de presentarse esta condición en aproximadamente el 60% de la superficie. Por lo anterior se decidió realizar el reemplazo total del piso existente, con lo cual se incurrió en tiempos adicionales de demolición de piso completo, retiro de escombros con trasiego significativo teniendo en cuenta la ubicación del comedor en relación con los centros de acopio e instalación de piso en granito pulido alrededor de 300mts de recorrido.

- **COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**

Debido a vetustez de la estructura se generó un desplome de la cubierta lo cual llevo a una emergencia dentro de la biblioteca. Se requirió entonces realizar cambio de cubierta tipo colonial, un encorozado entre la cubierta y ajuste a la estructura existente. En recorrido de obra de 02 de octubre de 2023 dentro de las instalaciones se avaluó la condición de los cielos falsos en PVC del área de biblioteca pasillo y oficinas aledañas, encontrando que las mismas se encontraban deterioradas y presentaban exceso de residuos generados por el polvo que se genera entre la cumbrera y el cielo falso, los excrementos de las palomas que viven en la cumbrera y los desprendimientos de esterilla, barro y madera que se generan de la estructura de la cubierta.

Debido a que estas actividades no se encontraban incluidas dentro del alcance inicial se requirió un periodo de tiempo que afecto el cronograma inicial de obra.

- **COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**

El frente de obra inicialmente contemplaba en su alcance la impermeabilización parcial de piso 3 del área administrativa, junto con la demolición y construcción de tarima del patio central. El alcance de la impermeabilización fue ejecutado en un 100% a la fecha, sin embargo, lo que compete a la ejecución de tarima se han tenido diferentes versiones de arquitectura y estructura, lo que ha llevado a una mayor permanencia en obra por parte del consorcio MIA GP, así las cosas, a la fecha se encuentra suspendido el frente de obra hasta que se cuente con un diseño aprobado por las partes (Interventoría, SED y el representante de la IED). Por lo tanto, una vez sea reactivada su ejecución se debe considerar la reposición del tiempo perdido por condiciones no imputables al contratista.

Segundo: Se han generado ampliaciones sobre los alcances de las intervenciones como se evidencia en los distintos comités de obra.

Tercero: Se han presentado afectaciones en la ejecución de la obra a causa de las lluvias presentadas y es de resaltar que la mayoría de las intervenciones son en áreas de cubiertas lo cual ha generado atrasos en el desarrollo del proyecto.

Existen actividades que requieren de tiempo seco para ser ejecutadas y que son de alto impacto dentro de los alcances de las intervenciones, a saber, el cambio de cubiertas, excavaciones, instalación de estructura para canchas, obras de urbanismo como andenes.

Cuarto: Se ha requerido atender a requerimientos logísticos y evacuación de espacios para la habilitación de espacios. Así mismo, se ha visto afectado el tiempo en el

suministro de materiales debido a la escasez que se presentó al inicio del presente año.

Quinto: No se han iniciado la ejecución a la fecha los siguientes frentes debido a que se deben replantear las fechas del cronograma paralelamente lo cual incurre en mayores esfuerzos y personal mínimo no contemplado dentro del contrato inicial. Por lo cual se requiere un tiempo adicional para su ejecución.

COLEGIO	SEDE
COLEGIO ALFREDO IRIARTE	B
COLEGIO JOSE MARTI	C
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	B
COLEGIO QUIROGA ALIANZA	B
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	A

Ilustración 1 Frente pendientes por inicio de actividades.

Sexto: De acuerdo con la necesidad por parte de la SED se ampliarán los mejoramientos en mantenimientos programados y se generan nuevos alcances y por consiguiente una necesidad de adición de recursos representado en los colegios FE Y ALEGRIA PALERMO SUR, REINO DE HOLANDA SEDE A y LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, con una distribución de recursos de la siguiente manera:

COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO
FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$ 1.497.953.458,00
REINO DE HOLANDA	A	$ 222.046.542,00
LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		$ 150.000.000,00
TOTAL ADICIÓN No.2		**$ 1.870.000.000,00**

Ilustración 2 >Inclusión y adición presupuestal de frentes de obra.

Los alcances definidos para cada una de las instituciones se describen a continuación:

1. **FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR**

La institución requiere una intervención del componente eléctrico, con suministro e instalación de tableros y acometidas. Cabe aclar que los permisos ante la entidad competente están a cargo de la SED.

Adicionalmente, se debe contemplar la instalación de tanques para el suministro de agua ubicados en la parte superior de la institución, de igual manera los permisos requeridos para el correcto funcionamiento de la institución ante la entidad competente deben ser tramitados por la SED.

se contempla el mantenimiento especifico según la disponibilidad presupuestal asignada y a las actividades requeridas en actas de comité.

2. REINO DE HOLANDA SEDE A

La intervención adicional presupuestada para la institución contempla la pintura de fachada del bloque A, junto con la instalación de mallas de protección en áreas de ventana y cambio de cubierta en policarbonato del patio 1.

3. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO

La institución requiere una intervención en el área de canchas de voleibol, ya que presentan cierre permanente por el estado actual de las mismas. Se evidencia desprendimiento de material, desniveles y fisuras evidentes que han ocasionado accidentes. Presupuestalmente se contempla el mejoramiento del terreno para evitar a futuro los asentamientos diferenciales que se presentan actualmente.


Por otra parte, se hace la salvedad que la IED FE Y ALEGRÍA SEDE LOS NARANJOS, fue incluida para su intervención dentro de la modificación contractual No.1 con un rubro de $ 455.893.410. Esta sede no podrá intervenirse, en vista que la misma presenta una serie de limitaciones de índole estructural, por lo cual, el recurso que se invierta bajo el concepto de mejoramientos no podrá garantizar la estabilidad de la infraestructura. Ahora y al tomarse la decisión de desistir de esta intervención de manera conjunta entre las partes intervinientes, desde la SED se otorga el lineamiento de reemplazar esta sede por la IED CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA, donde se invertirá este mismo rubro, principalmente en el cambio de cubiertas existentes, estructura para su soporte y ventanería.

Dado lo anterior, desde la firma contratista de obra se sugiere realizar la aclaración sobre esta novedad, para evitar cualquier tipo de inconveniente a futuro.

Por último, presentamos la programación estimada para la intervención de las 25 instituciones que hacen parte del proyecto:

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Fecha de restricción	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración
1	NOD		ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVC		$ 18.861.262.150,00	373 días
2	NOD		ACTA DE INICIO DE OBRA		$ 0,00	0 días
3	lun 3/04/23		APROBACION ADICION PRESUPUESTAL No 1		$ 0,00	0 días
4	NOD		MANTENIMIENTO PROGRAMADO		$ 17.998.776.222,00	373 días
5	NOD		COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTI		$ 219.837.434,00	167 días
81	NOD		COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHICALES		$ 198.655.641,00	178 días
139	NOD		COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR		$ 561.308.316,42	96 días
143	NOD		COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		$ 1.023.176.986,00	231 días
266	NOD		COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		$ 545.402.098,00	274 días
349	NOD		COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAY		$ 872.012.618,16	233 días
460	NOD		COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA		$ 1.052.310.944,86	176 días
551	NOD		COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO		$ 332.100.486,00	121 días
555	NOD		COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICI		$ 495.768.173,00	339 días
650	NOD		COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MA		$ 1.138.257.853,00	230 días
713	NOD		COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REI		$ 286.045.284,00	106 días
717	NOD		COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PA		$ 770.138.768,23	183 días
802	NOD		COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA		$ 1.407.815.813,89	372 días
924	NOD		COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATER		$ 1.003.774.832,33	247 días
1042	NOD		COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL		$ 286.045.284,00	100 días
1046	NOD		COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN		$ 1.277.252.363,00	179 días
1198	NOD		COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO		$ 441.972.779,00	116 días
1202	NOD		COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B		$ 363.197.157,00	86 días
1206	NOD		COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A		$ 286.045.284,00	118 días
1210	NOD		COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B		$ 286.045.284,00	96 días
1214	NOD		COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$ 3.865.940.160,12	302 días
1343	NOD		COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN		$ 455.893.410,00	101 días
1347	NOD		COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B		$ 286.045.284,00	106 días
1351	NOD		COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A		$ 665.005.624,00	250 días
1458	NOD		COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		$ 268.726.344,00	102 días
1490	NOD		ATENCION DE EMERGENCIAS		$ 862.485.928,00	370 días
1491	NOD		ENTREGA DE OBRA		$ 0,00	0 días

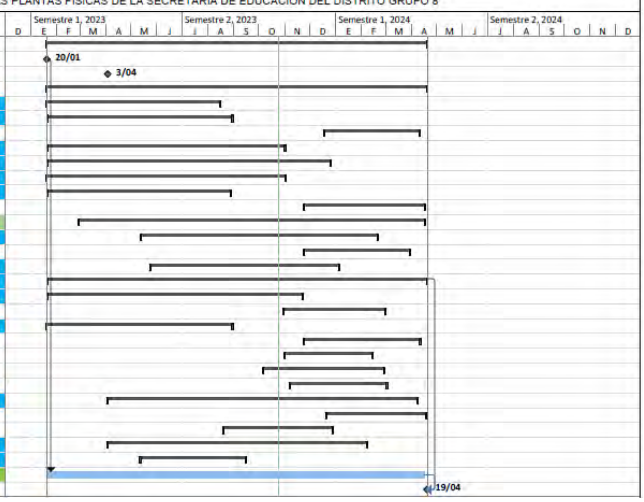

lustración 3 Programación de obra.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El Estatuto de la Contratación Estatal consagró la posibilidad de realizar modificaciones a las condiciones contractuales, con fundamento en la necesidad de salvaguardar el interés general y los fines del estado. Fines e intereses que se encuentran inmersos en toda obra pública. En relación con este punto la Corte Constitucional ha señalado: "Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato"[1].

En efecto, el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 estableció la posibilidad de suscribir modificaciones al contrato con la finalidad de evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con el proyecto. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las circunstancias establecidas en el primer acápite del presente documento, que afectan el cumplimiento a cabalidad del cronograma de obra y constituyen el fundamento de la necesidad de prórroga del contrato.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado sobre el plazo contractual lo siguiente:

> *"Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él,*

[1] Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él"[2]

De lo anterior se desprende que, la suscripción de un acuerdo modificatorio del plazo contractual constituye una prerrogativa en cabeza de las partes contractuales que no desnaturaliza el contrato ni su objeto, por lo tanto, se basa solamente en la necesidad del proyecto.

En ese orden de ideas, tal como se ha manifestado en un principio, los cambios del alcance y adición de frentes que presenta el contrato, generan la necesidad de ampliar en plazo contractual y así asegurar el cabal cumplimiento de la obra y los fines del estado inherentes al proyecto contratado.

En relación con la posibilidad de ampliación del plazo contractual la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa ha señalado:

"La prórroga constituye un valioso instrumento para la administración, por cuanto pueden existir eventos en los que la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público hagan aconsejable la extensión del plazo inicial del respectivo contrato.

"no puede desconocerse que la prórroga de los contratos…puede ser aconsejable para la administración desde el punto de vista técnico y financiero. Por ello, la entidad competente debe contar la posibilidad de evaluar los beneficios que produciría para el Estado y para el interés público la ampliación del término inicial del contrato"[3]

En ese entendido, la suscripción de una prórroga al plazo contractual del contrato de la referencia constituye una necesidad teniendo en cuenta el estado actual del proyecto, la falta de concreción de diferentes de los alcances en los frentes de obra han afectado notoriamente en el cronograma de obra.

SOLICITUD

Por los argumentos expuestos, solicitamos:

1. Prorrogar el contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 por un término de cuatro (4) meses calendario, es decir hasta el 19 de abril del 2023 por los motivos expuestos anteriormente.

[2] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171)A, C.P. Darío Quiñones Pinilla.
[3] Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012. C.P. OLGA MÈLIDA VALLE DE LA HOZ.

2. Adicionar el contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645, por un valor de MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES CON CERO PESOS M/CTE ($1,870,000,000).

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Presupuesto general adición (4 colegios) Programación de obra (25 colegios)
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

CONSORCIO TIG

PRESUPUESTO FE Y ALEGRÍA

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR:

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	50,00	$ 66.944,00	$ 3.347.200,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.008,00	$ 0,00
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	ML	200,00	$ 16.887,00	$ 3.377.400,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1926,00	$ 29.215,00	$ 56.268.090,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	292,00	$ 8.634,00	$ 2.521.128,00
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	6,00	$ 140.804,00	$ 844.824,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	292,00	$ 5.062,00	$ 1.478.104,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	1000,00	$ 6.882,00	$ 6.882.000,00
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	175,00	$ 20.991,00	$ 3.673.425,00
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	104,28	$ 137.004,00	$ 14.286.777,00
1,4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	500,00	$ 23.023,00	$ 11.511.500,00
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	72,00	$ 45.418,00	$ 3.270.096,00
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	72,00	$ 174.350,00	$ 12.553.200,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 120.013.744,00**

4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	200,00	$ 68.798	$ 13.759.600,00
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	25,00	$ 99.155	$ 2.478.875,00
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	200,00	$ 12.174	$ 2.434.800,00
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.6	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UND	10,00	$ 1.161.502	$ 11.615.020,00
SUBTOTAL	**4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 30.288.295,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	8,00	$ 761.265	$ 6.090.120,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	800,00	$ 42.467	$ 33.973.600,00
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	5800,00	$ 18.061	$ 104.753.800,00
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	M	250,00	$ 49.930	$ 12.482.500,00
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 494.028	$ 1.976.112,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	486,00	$ 266.905,00	$ 129.715.830,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	486,00	$ 194.999	$ 94.769.514,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	216,00	$ 225.499	$ 48.707.784,00
SUBTOTAL	**5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 432.469.260,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INVLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2	35,00	$ 178.306	$ 6.240.710,00
SUBTOTAL	**5 INSTALACIONES PISOS**		**137**		**$ 6.240.710,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2	682,00	$ 319.902,00	$ 218.173.164,00
SUBTOTAL	**5 INSTALACIONES PISOS**				**$ 218.173.164,00**

11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	0,00	$ 693.298,00	$ 0,00
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	0,00	$ 898.607,00	$ 0,00
11.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (P R F V) 30.000 LT	UN	1,00	$ 61.868.044,00	$ 61.868.044,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 61.868.044,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	400,00	$ 20.163,00	$ 8.065.200,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1200,00	$ 23.886,00	$ 28.663.200,00
SUBTOTAL	**13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 36.728.400,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	85,00	$ 48.967,00	$ 4.162.195,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1926,00	$ 181.562,00	$ 349.688.412,00
17.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	M2	175,00	$ 52.208,00	$ 9.136.400,00
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	175,00	$ 12.701,00	$ 2.222.675,00
17.1.44	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	100,00	$ 117.105,00	$ 11.710.500,00
17.1.47	AFINADO PARA CUBIERTA CON MORTERO CON ADICIÓN DE MICROFIBRA, ENDURECIDO CON ROCKTOP, ACABADO CON LLANA METÁLICA.	M2	175,00	$ 145.324,00	$ 25.431.700,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 402.351.882,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	2500,00	$ 7.708,00	$ 19.270.000,00
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	9248,24	$ 1.898,00	$ 17.553.160,00
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	9248,24	$ 2.272,00	$ 21.012.001,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 57.835.161,00**
NP	**NO PREVISTOS**				
NP-13	INSPECCION Y DESTAPONAMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS (INCLUYE ALQUILER DE GEOFONO, SONDA METALICA, MICROCAMARA, EXCAVASION MANUAL) APLICA TANTO PARA AGUA POTABLE COMO PARA AGUAS NEGRAS EVIDENCIANDO LA FUGA Y DESTAPONAMIENTO DE LA TUBERÍA SEGÚN SEA EL CASO	M	65,00	$ 270.149,00	$ 17.559.685,00

NP-20	RETIRO DE PINTURA SUELTA EN ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS CARAS)	M	1300,00	$ 15.960,00	$ 20.748.000,00
NP	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS SEGÚN DISEÑO Y DIAGRAMA DE CARGAS	UND	1,00	$ 18.800.000,00	$ 18.800.000,00
NP	ACOMETIDA PRINCIPAL DE TRANSFORMADOR A TGA 3X4/0+1X4/0+1No2 según diagrama unifiar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegria Palermo sur	ML	25,00	$ 654.097,00	$ 16.352.425,00
PRECIO SED 2023	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA H=15 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5113,21	$ 8.422,00	$ 43.063.458,00
	ACOMETIDA HIDRAULICA NUEVA				
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2-1/2"	UN	6,00	$ 38.436,00	$ 230.616,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,00	$ 34.706,00	$ 416.472,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UN	6,00	$ 16.899,00	$ 101.394,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS	M	350,00	$ 24.349,00	$ 8.522.150,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	58,32	$ 13.288,00	$ 774.939,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	150,00	$ 16.425,00	$ 2.463.750,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 "	UN	24,00	$ 9.590,00	$ 230.160,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	156,02	$ 14.694,00	$ 2.292.537,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	32,00	$ 6.474,00	$ 207.168,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	16,00	$ 10.601,00	$ 169.616,00
PRECIO SED 2023	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	12,00	$ 4.369,00	$ 52.428,00
SUBTOTAL	**NO PREVISTOS**				**$ 131.984.798,00**

VALOR TOTAL	**$ 1.497.953.458,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 1.497.953.458,00**

CONSORCIO TIG

PRESUPUESTO REINO DE HOLANDA A

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PROPUESTA ECONÓMICA PROCESO DE SELECCIÓN SED-LP-DCCEE-039-2022

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

PRESUPUESTO REINO DE HOLANDA SEDE A

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	30,00	$ 35.570,00	$ 1.067.100,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	532,77	$ 14.094,00	$ 7.508.860,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	20,18	$ 23.023,00	$ 464.604,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 9.040.564,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	532,77	$ 9.784	$ 5.212.622,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.212.622,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M	2964,60	$ 5.481,00	$ 16.248.973,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1355,94	$ 29.105,00	$ 39.464.634,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1214,78	$ 12.080,00	$ 14.674.542,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 70.388.149,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	482,33	$ 7.708,00	$ 3.717.800,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	323,76	$ 6.049,00	$ 1.958.424,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.676.224,00**
22	**NO PREVISTOS**				

NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 18, ACERO EN ANGULO 1 1/2 X 1/8, INCLUYE PINTURA	M2	290,40	$	453.612,00	$ 131.728.925,00
22	**22. NO PREVISTOS**					**$ 131.728.925,00**

VALOR TOTAL	**$**	**222.046.484,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)		
VALOR TOTAL	**$**	**222.046.484,00**

CONSORCIO TIG

PRESUPUESTO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO CANCHA - LICEO FEMENINO

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	200,00	$ 35.570,00	$ 7.114.000,00
1.1.4	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	100,00	$ 120.021,00	$ 12.002.100,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145,07	$ 66.944,00	$ 9.711.329,00
SUBTOTAL	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 28.827.429,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	96,43	$ 75.296,00	$ 7.260.417,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	96,43	$ 95.957,00	$ 9.252.654,00
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	275,50	$ 123.376,00	$ 33.990.088,00
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.6	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM)	M	29,00	$ 230.086,00	$ 6.672.494,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	1100,00	$ 8.711,00	$ 9.582.100,00
SUBTOTAL	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 66.757.753,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	14,70	$ 124.059	$ 1.823.667,00
4.8.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UND.	1,00	$ 733.283	$ 733.283,00
SUBTOTAL	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.556.950,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	20,10	$ 15.621,00	$ 313.982,00
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	M	34,75	$ 21.890,00	$ 760.678,00
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC CONDUIT 2" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	$ 13,40	$ 148.566,00	$ 1.990.784,00
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED STREET PARA ALUMBRADO RECREATIVO DE CANCHA DEPORTIVA TIPO EXTERIOR DE 60W, 100V A 277V. INCLUYE ESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO, ESTRUCTURA CIVIL, CABLE DE PUESTA A TIERRA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND.	2,00	$ 5.571.063,00	$ 11.142.126,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 14.207.570,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	275,50	$ 91.866,00	$ 25.309.083,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**0**		**$ 25.309.083,00**

16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UND.	1,00	$ 10.217.661,00	$ 10.217.661,00
SUBTOTAL	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**0**		**$ 10.217.661,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	275,50	$ 7.708,00	$ 2.123.554,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.123.554,00**

VALOR TOTAL	**$ 150.000.000,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 150.000.000,00**


CONSORCIO TIG

PROGRAMACIÓN DE OBRA

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Fecha de restricción	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración
1	**NOD**		**ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO**		**$ 18.861.262.150,00**	**373 días**
2	NOD		ACTA DE INICIO DE OBRA		$ 0,00	0 días
3	lun 3/04/23		APROBACION ADICION PRESUPUESTAL No 1		$ 0,00	0 días
4	**NOD**		**MANTENIMIENTO PROGRAMADO**		**$ 17.998.776.222,00**	**373 días**
5	**NOD**		**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTI**		**$ 229.837.434,00**	**167 días**
81	**NOD**		**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		**$ 198.655.641,00**	**178 días**
139	NOD		COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR		$ 561.308.316,42	96 días
143	**NOD**		**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		**$ 1.023.178.986,00**	**231 días**
266	**NOD**		**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		**$ 545.402.098,00**	**274 días**
349	**NOD**		**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAY**		**$ 672.012.618,16**	**233 días**
460	**NOD**		**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		**$ 1.052.310.944,86**	**176 días**
551	**NOD**		**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**		**$ 332.100.486,00**	**121 días**
555	**NOD**		**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICE**		**$ 495.768.173,00**	**339 días**
650	**NOD**		**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MA**		**$ 1.138.257.853,00**	**230 días**
713	**NOD**		**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REF**		**$ 286.045.284,00**	**106 días**
717	**NOD**		**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PA**		**$ 770.138.768,23**	**183 días**
802	**NOD**		**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		**$ 1.407.815.813,89**	**372 días**
924	**NOD**		**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATER**		**$ 1.003.774.832,32**	**247 días**
1042	**NOD**		**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**		**$ 286.045.284,00**	**100 días**
1046	**NOD**		**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		**$ 1.277.252.363,00**	**179 días**
1198	**NOD**		**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**		**$ 441.972.779,00**	**116 días**
1202	**NOD**		**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**		**$ 363.197.157,00**	**86 días**
1206	**NOD**		**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		**$ 286.045.284,00**	**118 días**
1210	**NOD**		**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**		**$ 286.045.284,00**	**96 días**
1214	**NOD**		**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**		**$ 3.665.940.160,12**	**302 días**
1343	**NOD**		**COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN**		**$ 455.893.410,00**	**101 días**
1347	**NOD**		**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		**$ 286.045.284,00**	**106 días**
1351	**NOD**		**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		**$ 665.005.624,00**	**250 días**
1458	**NOD**		**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		**$ 268.726.344,00**	**102 días**
1490	**NOD**		**ATENCION DE EMERGENCIAS**		**$ 862.485.928,00**	**370 días**
1491	NOD		ENTREGA DE OBRA		$ 0,00	0 días

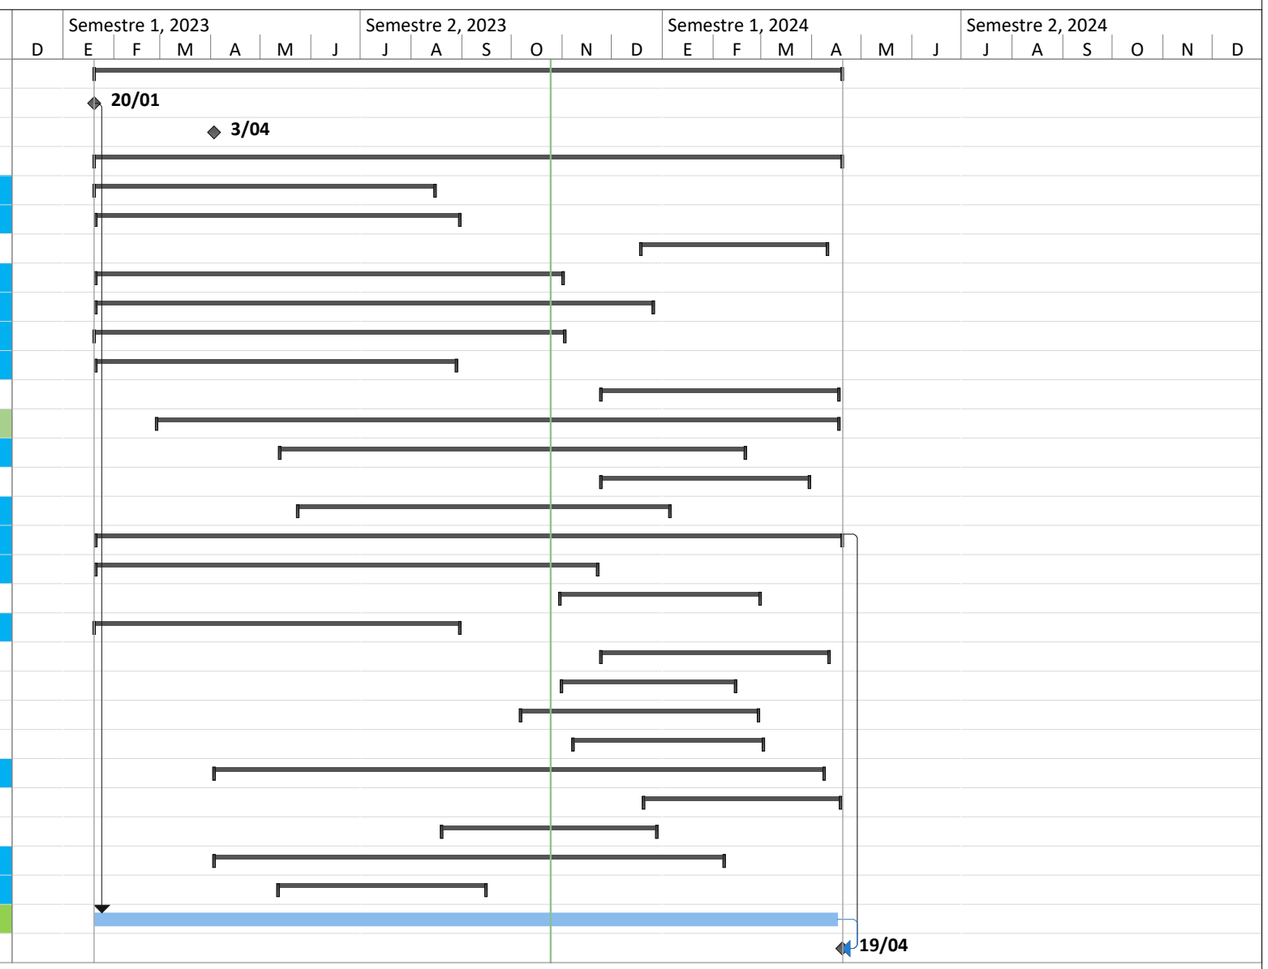

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-378

Bogotá, D.C, 24 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Remisión de APU's no previstos NP41, NP42, NP43, NP46, NP48 y NP50 para revisión

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite remitir para revisión por parte de la supervisión, los APU’s no previstos NP41, NP42, NP43, NP46, NP48 y NP50 y que cuentan con la siguiente descripción, a saber:

- NP-41 - Suministro e instalación de duchas de emergencia.
- NP-42 - Suministro e instalación de extractor de aire 12" industrial.
- NP-43 - PLACA EN CONCRETO ESTAMPADO E=12 CM M2.
- NP-46 - DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA H=15 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)

- NP-48 - ACOMETIDA PRINCIPAL DE TRANSFORMADOR A TGA 3X4/0+1X4/0+1X2/0 según diagrama unifiar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegria Palermo sur.

- NP-49 - ACOMETIDA TABLERO DE TOMAS 3No6+1No6+1No10 según diagrama unifiar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegria Palermo sur.

Dichas actividades no previstas están previamente aprobadas por parte de interventoría y cuentan con los respectivos soportes requeridos para su revisión.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Cincuenta y dos (52) folios

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	20/01/2023	**FECHA TERMINACIÓN**	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÀEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP 41	Suministro e instalacion de duchas de emergencia	UN	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	133.113,60	6.655,00
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	0,20	900,0
				SUBTOTAL	**7.555,00**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable cl001i	UN	1	$ 4.527.915,00	$ 4.527.915,00
Cinta teflon 1/2" x 10m	un	0,3	$ 16.200,00	$ 4.860,00
Acople flexible	un	1	$ 12.500,00	$ 12.500,00
REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	un	1	$ 23.000,00	$ 23.000,00
			SUBTOTAL	**4.568.275**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)	1		m3/km	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	**1.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla HH instalaciones hidraulicas (ofc+ayud)	145.833	52,13%	221.856	0,6000	133.114
				SUBTOTAL	**133.114**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 4.710.444,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 1.327.874,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 6.038.318,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los catorce (14) días, del mes de marzo del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: EDISON RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-41 Suministro e instalación de duchas de emergencia

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la instalación de duchas de emergencia, ya que este es un equipo de seguridad fundamental en ambientes donde se trabaje o haya uso de sustancias peligrosas o agentes contaminantes, ya que en caso de salpicaduras o contacto accidental se garantiza una descontaminación de cuerpo completo.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-41- Suministro e instalación de duchas de emergencia

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:
Suministro e instalación de duchas de emergencia, en acero inoxidable en los lugares requeridos.

EJECUCIÓN:

- Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
- Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
- Nivelación, aplomado y colocación del aparato.
- Conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación.

MATERIALES:

- Ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable cl001i
- Acople flexible
- Registro válvula de bola 1"

EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Seccion de andamio certificado (alquiler)

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS DE EMERGENCIA recibidos a satisfacción por la interventoría.

Modelo AXION-001i-CL

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

FILTRO REGULADOR DEL FLUJO
Único en el mercado con regulador de flujo inteligente y filtro de macropartículas, importante para evitar que las impurezas en el agua pasen a los ojos de los heridos. Se puede mantener y limpiar.

LAVAOJOS/CARA AXION
La tecnología AXION es una patente de Haws, la única con el flujo invertido para lavar el ojo afectado desde el rincón interno (junto a la nariz) para fuera, evitando así que contaminantes entren el ducto lacrimal. El flujo del agua es suave, con velocidad Zero al top, ofreciendo máximo conforto al usuario.

VÁLVULAS
La válvula de la ducha y lavaojos es en acero inoxidable con esfera inoxidable de 1" que se abre en menos de 1 segundo, solo con 1 movimiento del accidentado y se quedan abiertas sin el uso de las manos.

PRESIÓN Y FLUJO
La presión mínima de agua es 2.1Kgf/cm², siendo recomendada por nosotros la presión de 3.0Kgf/cm² para un mejor desempeño del equipo.
Este modelo provee flujo mínimo 1,5 l/min en el lavaojos.

CONTROL DE CALIDAD
Todas las válvulas son 100% testadas, antes y después del montaje de los equipos.

NORMAS
Modelo cumple con la Norma Americana ANSI Z358. 1 y la Norma Brasileña (ABNT – NBR16291) para Duchas y lavaojos de emergencia.

OPCIONALES

- Alarma de Emergencia.
- Válvula anti-calentamiento
- Conexión de entrada y / o salida "1. ½, 1 ¼ o ¾" en BSP o NPT
- Kit de Prueba de flujo
- Accionamiento de pie

Mire mas opciones para su modelo en nuestro sitio www.hawsavlis.com.br



ESPECIFICACION

Modelo CL-001i H AXION es ducha lavaojos de emergencia para fijación en el piso.

- Tubería en acero inoxidable Ø1";
- Tazón y en acero inoxidable y aspersores en Plástico ABS;
- accionamiento manual atreves de la palanca "empuje" en acero inoxidable;
- conexión de entrada en Ø 1" BSP y salida de 1" BSP;
- señalización en Polietileno;

APLICACION

Deberá ser instalado a 10 segundos del riesgo de la contaminación a las personas que puedan estar cerca a los materiales químicos o que sean prejudiciales a la salud. Hay que tener acceso libre al equipo y debe estar ubicado al mismo nivel de donde está el peligro.
Indicado para laboratorios de las empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacéuticas, papel y celulosa, mineras, bebidas, alimenticia, escuelas y universidades, entre otras.

>>> PROSINFER | RUC: 20603671261 | WWW.PROSINFER.COM | DISTRIBUIDOR AUTORIZADO <<<

Manual de Instalación y Montaje

ABNT - NBR - 16291

Norma ANSI/ISEA Z358.1

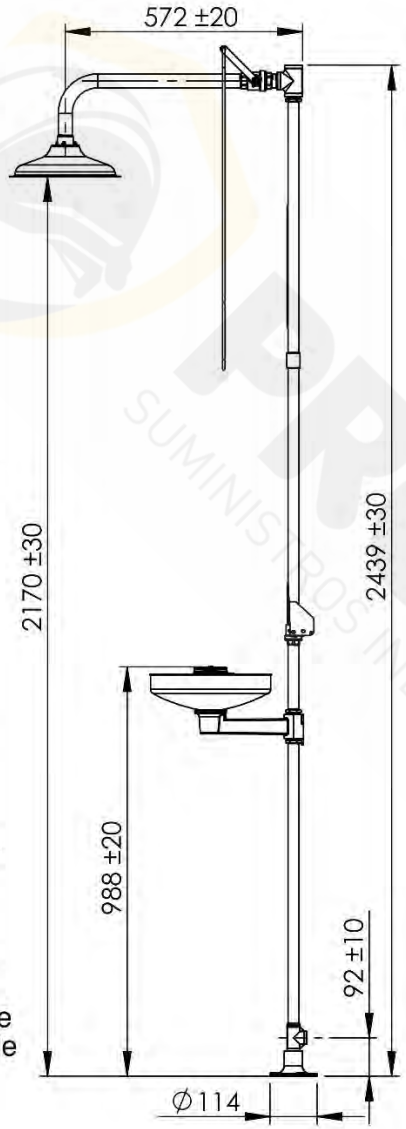
Modelo:
AXION.001i-CL

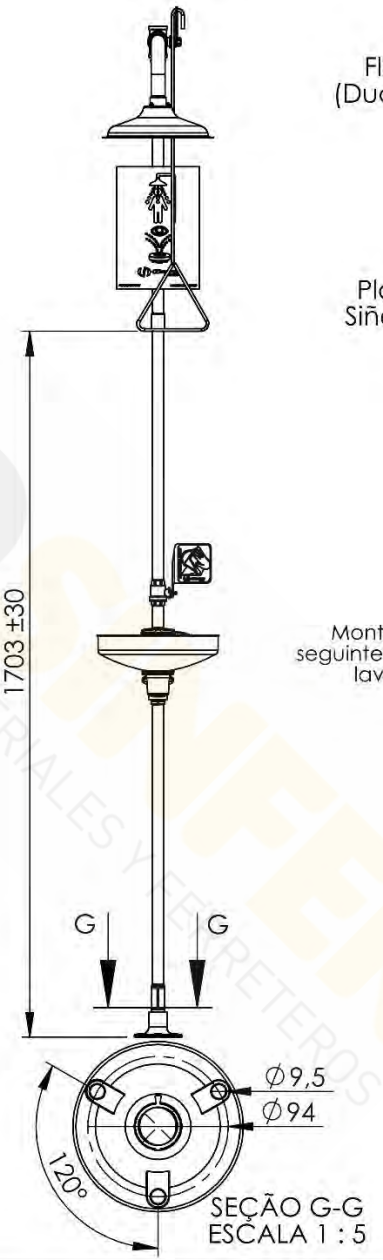
En las condiciones de presón adecuadas, el equipo tendrá un flujo mínimo de:
Ducha: 75,7 L/min.
Lavaojos: 11L/min.

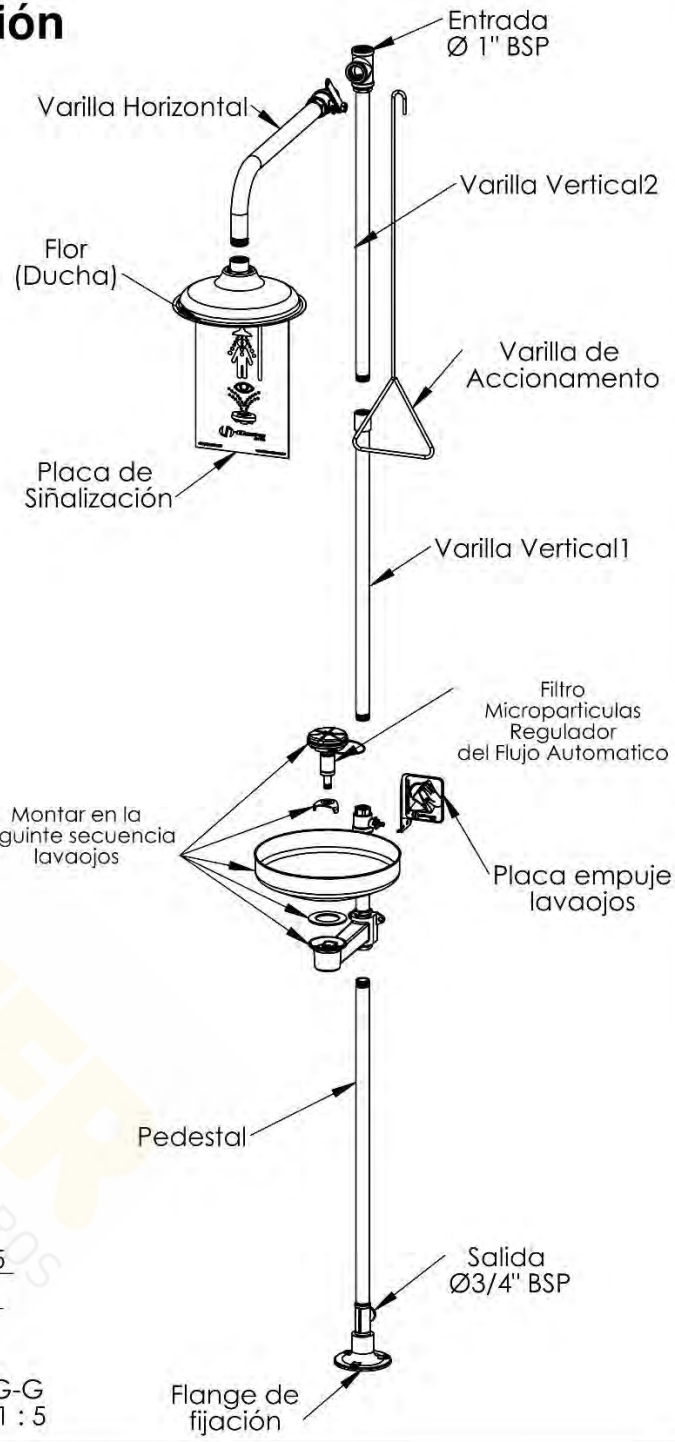
Atención:

Montar el equipo de acuerdo con el dibujo ilustrativo.Utilice sellador de roscas en las conexiones de las partes de la montaje.
Fijar el equipo en el suelo con tornillos tipo prisioneiros de 5/16" x 2.1/2".
Accionar el equipo una vez en la semana para análisis general de funcionamiento.

La presión recomendada por la norma ANSI Z358.1 e ABNT - NBR - 16291 para un bueno rendimento del equipo es de 2,1Kgf/cm².
La Haws Avlis recomienda a presión minima de 3Kgf/cm² (43.5 psi.) para un bon rendimiento de ambos (ducha y lavaojos).
En caso de duda entacténos por el teléfono **(11)4813-9977.**







>>> PROSINFER | RUC: 20603671261 | WWW.PROSINFER.COM | DISTRIBUIDOR AUTORIZADO <<<

WhatsApp | ducha de emergencia - Buscar | Ducha y lavaojos de emergencia

ferrelam.com/products/cl-001i?variant=12940961087587&currency=COP&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_o...

YouTube | WhatsApp | ¡Bienvenido a Faceb... | Aulas Virtuales Fun... | Iniciar sesión en la... | Netflix | Disney+ | Películas... | Prime Video | HBO GO - Home | Todos los favoritos

FERRELAM

¿Qué está buscando?

Brady | Pelican | OilSafe | Checkfluid | Karcher | Haws | Loctite | Bison | Otras Marcas | Aprende con Ferrelam | Descuentos | Háblanos por WhatsApp



Ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable cl001i

por Ferrelam

$4.604.200,00

El modelo Cl-001i es un equipamiento de ducha y lavaojos con flor y pileta, en acero inoxidable. Las boquillas rociadoras lavaojos / rostro son en plástico abs, con tapas de protección de abertura hacia arriba, contra pequeños residuos, insectos y productos químicos. Los tubos y conexiones son en acero inoxidable. La ducha es de accionamiento manual, a través de una manija triangular en acero inoxidable, el funciona con una placa de empuje en acero inoxidable. Para ello, el accidentado tendrá que tirar de la "manija triangular" hacia abajo, y ponerse bajo la flor de la ducha, presionar la "placa de empuje" hacia atrás, colocando sus ojos frente a las boquillas rociadoras del lavaojos. La fijación del equipamiento es en el disco de la base, al piso del local elegido, con tornillos o pernos. Las conexiones de entrada y salida de agua del equipamiento forman parte de la fijación. La unión de los conjuntos del equipamiento es roscada y pegada. Al montar la instalación se puede utilizar cinta selladora para impermeabilizar las roscas. El suministro de agua del equipamiento es con rosca 1in bsp (British Standard Pipe – Rosca estándar para tubería británica) y la salida para desagüe es con rosca 3/4in npt(Rosca americana cónica para tubos). Junto con el equipamiento enviamos un manual de instalación y montaje. La pileta lavaojos tiene un diámetro de 290mm, y la flor de la ducha un diámetro de 270mm. El modelo CL-001i cumple con las especificaciones de la norma americana Ansi/Isea z358. 1-2009 sobre Duchas y Lavaojos de Emergencia.

SKU CL-001i

Buscar | ESP | 08:47 a. m. 14/10/2023

soloepis

Tienda online de ropa de trabajo y EPIs

Carrito

≡ PRODUCTOS | PERSONALIZACIÓN | LÍNEAS DE VIDA | REVISIONES | OUTLET | BLOG | MARCAS

Inicio > Lugar de Trabajo > Duchas y Lavaojos > Duchas lavaojos > Ducha lavaojos de acero inoxidable



DUCHA LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia: DLINOX

995,00 € Impuestos excluidos

1.203,95 € IVA incl.

Ducha lavaojos inoxidable

Descuentos por volumen

Cantidad	Descuento unitario	Precio
2	10%	895,50 €

Cantidad

1

+ AÑADIR AL CARRITO

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

ENVÍO GRATUITO

Opiniones Verificadas

OPINIONES DE CLIENTES 4.8/5

ropias y de terceros para personalizar el contenido, ofrecer funciones de medios sociales y analizar el tráfico. Compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de medios sociales, publicidad y análisis web. Política de cookies

ACEPTAR

Buscar | ESP LAA | 9:13 p. m. 16/10/2023



Impleseg

DUCHA LAVAOJOS DE EMERGENCIAS - MIXTA*

$2.896.698 COP

SKU: 01062001

Descripción

Ducha torrencial integrada con lavaojos tipo pedestal con doble accionamiento manual. Diseñados y fabricados por Impleseg bajo normas técnicas. Fabricados en acero inoxidable. Todos los modelos de duchas y lavaojos reúnen las especificaciones de ANSI Y OSHA

* PRODUCTO DISPONIBLE BAJO PEDIDO.

Cantidad

- 1 + AÑADIR AL CARRO

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	LAVAOJOS DE EMERGENCIA	UND	$ 4.604.200	FERRELAM	$ 4.451.630	SOLOEPIS	$ 2.896.698	IMPLESEG	$ 3.984.176	$ 944.868	$4.929.044	$3.039.308	$ 4.604.200	4451630,00		$ 4.527.915

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	CONSORCIO MIA GP		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	20/01/2023	**FECHA TERMINACIÓN**	19/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIG
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÀEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP 42	Suministro e instalacion de extractor de aire 12" industrial	UN	0,00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	45.639,00	2.282,0
Seccion andamio certificado (alquiler)			4.500,00	0,20	900,0
				SUBTOTAL	**3.182,0**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Extractor De Aire 12 Pulgadas Industrial Con Rejilla	UN	1	$ 676.201,00	$ 676.201,00
TUBO CONDUIT 3/4 X3M	UND	0,3	$ 8.300,00	$ 2.490,00
CABLE No. 12	M	1	$ 2.649,00	$ 2.649,00
			SUBTOTAL	**681.340**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de Material (Volqueta acarreo)	1		m3/km	1.500	1.500,0
				SUBTOTAL	**1.500**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (TECNICO+AYUD)	150.000	52,13%	228.195	0,2000	45.639,0
		52,13%			
				SUBTOTAL	**45.639**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 731.661,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 206.255,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 937.916,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los trece (13) días, del mes de octubre del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: EDISON RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-42 Suministro e instalación de extractor de aire 12” industrial

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la instalación de extractores de aire con el fin de mantener la circulación de aire dentro de la zona o espacio, con el fin de regular la temperatura, extraer vapores, partículas o cualquier agente que pueda ocasionar algún inconveniete para la salud de los ocupantes del recinto.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-42- Suministro e instalación de extractor de aire 12" industrial
UNIDAD: UN
DESCRIPCIÓN:
Suministro e instalación de extractor de aire de 12" con rejilla para ventilación de las zonas requeridas

EJECUCIÓN:

- Replanteo.
- Colocación y fijación.
- Conexionado
- comprobación de su correcto funcionamiento.

MATERIALES:

- Extractor De Aire 12 Pulgadas Industrial Con Rejilla
- Acople flexible
- Tubo conduit 3/4 x3m
- Cable no. 12

EQUIPOS:

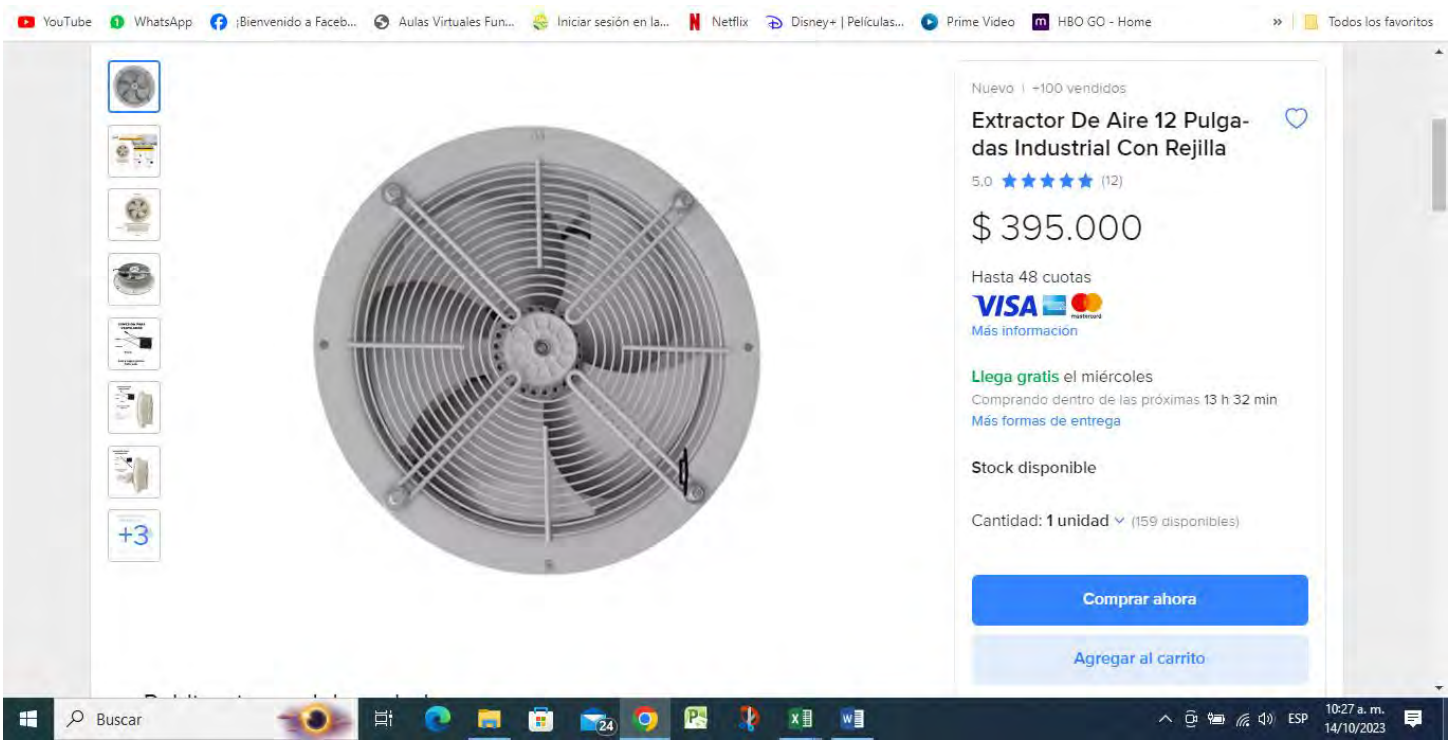
- Herramienta menor
- Sección de andamio certificado (alquiler)


TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE 12" recibidos a satisfacción por la interventoría.


YouTube
WhatsApp
¡Bienvenido a Faceb...
Aulas Virtuales Fun...
Iniciar sesión en la...
Netflix
Disney+ | Películas...
Prime Video
HBO GO - Home
Todos los favoritos
+3
Nuevo | +100 vendidos
Extractor De Aire 12 Pulgadas Industrial Con Rejilla
5,0 (12)
$ 395.000
Hasta 48 cuotas
Más información
Llega gratis el miércoles
Comprando dentro de las próximas 13 h 32 min
Más formas de entrega
Stock disponible
Cantidad: 1 unidad (159 disponibles)
Comprar ahora
Agregar al carrito
Buscar
ESP
10:27 a. m.
14/10/2023

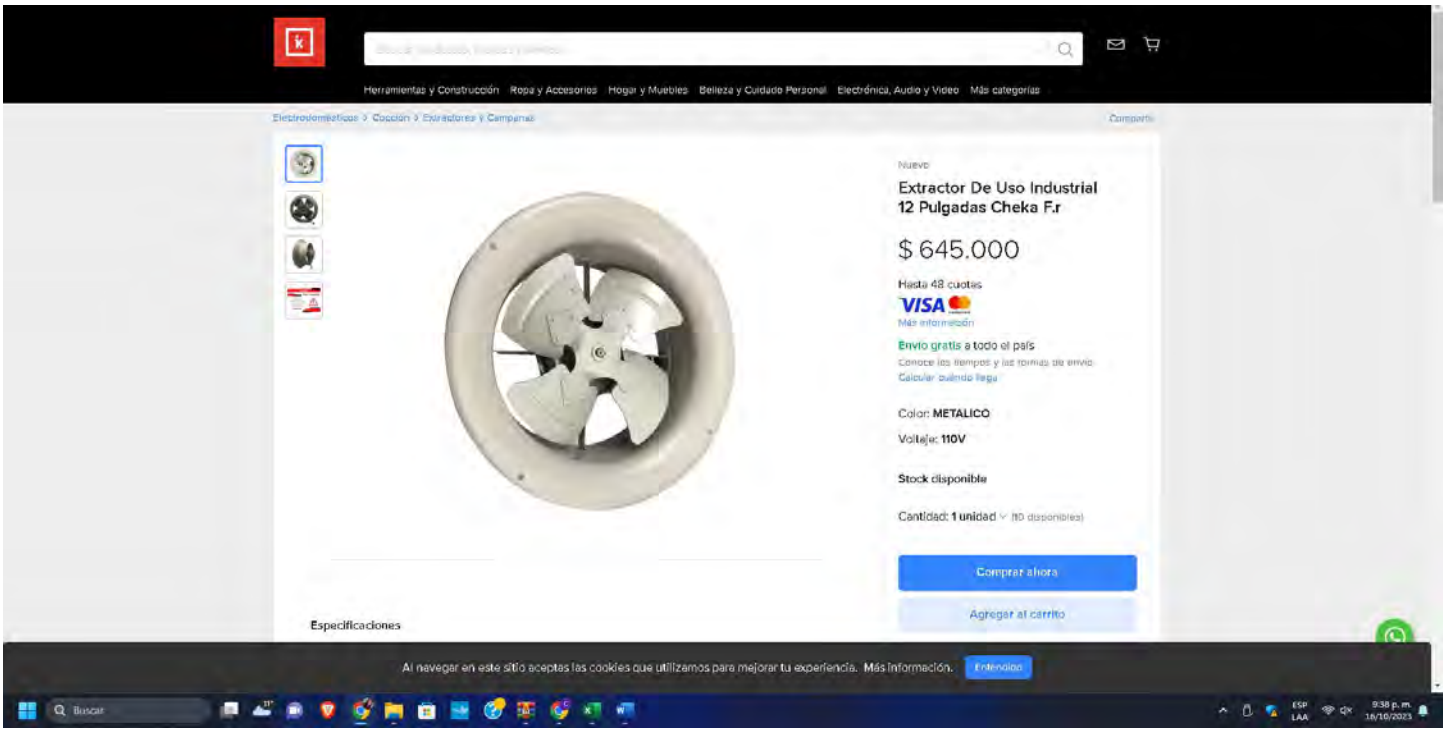
Herramientas y Construcción
Ropa y Accesorios
Hogar y Muebles
Belleza y Cuidado Personal
Electrónica, Audio y Video
Más categorías
Nuevo
Extractor De Uso Industrial 12 Pulgadas Cheka F.r
$ 645.000
Hasta 48 cuotas
Más información
Envío gratis a todo el país
Color: METALICO
Voltaje: 110V
Stock disponible
Cantidad: 1 unidad
Comprar ahora
Agregar al carrito
Especificaciones
Al navegar en este sitio aceptas las cookies que utilizamos para mejorar tu experiencia. Más información.
Entendido

YouTube Traducir Roblox Nueva pestaña

IR A TIENDA | MAIL | LUNES A VIERNES 8AM – 5PM | MÓVIL (+57) 301 2183485 - (+57) 3054887396 | Fijo: (604) 640 2054 | Boletín

ELECTROVIENTO
climatizamos espacios

Precio del dólar hoy
Lunes 16 de Octubre de 2023
T.R.M.: $ 4,249.00
dolar-colombia.com

INICIO | EXTRACTORES DE AIRE | VENTILADORES | CORTINAS DE AIRE | ACCESORIOS | DUCTOS FLEXIBLES | SOLICITUDES Y DOCUMENTOS

También te recomendamos...

Extractor de Aire Energinn 2CC2504-1F 20 Pulgadas 110v 1800RPM
$1.367.472 + IVA

Extractor de Aire Energinn 2CC2254-1F 10 Pulgadas 110v 1800RPM
$552.792 + IVA

Extractor de Aire Energinn 2CC2404-1F 16 Pulgadas 110v 1800RPM
$941.160 + IVA

Extractor de Aire Energinn 2CC2354-1F 14 Pulgadas 110v 1800RPM
$688.944 + IVA

Extractor de Aire Energinn 2CC2204-1F 8 Pulgadas 110v 1800RPM
$470.208 + IVA

VISTAZO



INICIO | EXTRACTORES DE AIRE | ENERGINN

Extractor de Aire Energinn 2CC2314-1F 12 Pulgadas 110v 1800RPM

$594.456 + IVA

VENTILACIÓN INDUSTRIAL ENERGINN

Los ventiladores axiales Energinn acabados en pintura electrostática en polvo dan a los equipos mayor protección contra la humedad y la corrosión. Los motores cuentan con protección IP54, lo que permite contar con un motor totalmente hermético y sellados contra polvo y salpicaduras de agua en todas las direcciones.

Ventilador 12" – 2CC2314-1F

Diámetro: 310mm / 12"
Caudal: 2844m3/h
Potencia: 108w
Nivel de ruido: 65 db (A)
Voltaje: 110V – 1800RPM
Corriente Nominal: 1,15 (A)
Aspa plástica

Extractor de Aire Energinn 2CC2314-1F 12 Pulgadas 110v 1800RPM

Hay existencias (puede reservarse)

Necesitas ayuda? Habla con nosotros

FICHA TÉCNICA


EXTRACTOR VENTILADOR ASPA METALICA 12”






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA	DB	PESO	AMPERIOS
EXT-VEN12”	80W	42	3,8 Kg	0,70




CONEXIÓN PARA EXTRACTOR



Negro y negro: juntos
Café: solo

CONEXIÓN PARA VENTILADOR



Azul y negro: juntos
Café: solo

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	EXTRACTOR DE AIRE ELECTRICO 12 PULGADAS	UND	$ 395.000	MERCADOLIGRE	$ 645.000	K	$ 707.403	ELECTROVIENTO	$ 582.468	$ 165.323	$747.790	$417.145		645000.00	$ 707.403	$ 676.201

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-43	PLACA EN CONCRETO ESTAMPADO E=12 CM	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	139.067,40	6.953,37
MOLDE PARA PISO ESTAMPADO		KG	$ 403.492,00	0,0133	5.379,9
PISON PARA MOLDE CONCRETO		UND	$ 347.074,00	0,0033	1.156,91
Vibrador		Hora	$ 5.000,00	0,5000	2.500,00
Formaleta losa maciza cimentación		m2/sem	$ 5.304,00	0,5000	2.652,00
				SUBTOTAL	18.642,18

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 PSI-21 Mpa	M3	0,13	$ 440.210,00	$ 55.466,46
COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO	BULTO	0,21	$ 76.577,00	$ 16.081,17
DESMOLDANTE EN POLVO	KG	0,26	$ 9.365,00	$ 2.458,31
SELLADOR	LITRO	0,26	$ 30.014,00	$ 7.878,68
Desmoldante DMA 1000 CO	Kg	0,40	$ 21.000,00	$ 8.400,00
			SUBTOTAL	90.285

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,60	82.500,00
Ayudante albañilería	JORNAL	52,13%	94.279	0,60	56.567,40
				SUBTOTAL	139.067,40
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 247.994,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 69.910,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 317.904,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-43- PLACA MACIZA EN CONTREO ESTAMPADO E=12 CM

UNIDAD:M2

JUSTIFICACIÓN:

Las intervenciones en plazoletas, áreas comunes, canchas, andenes, accesos a bloques, presenta diseños arquitectónicos con acabados en texturas y colores específicos para aportar acabados estéticos, agradables y confortables a los espacios además de garantizar larga duración y bajos mantenimientos, siendo el concreto estampado un elemento que atiende estas necesidades constructivas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-43- PLACA MACIZA EN CONTREO ESTAMPADO E=12 CM

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la construcción de **PLACA MACIZA EN CONTREO ESTAMPADO E=12 CM** de acuerdo con los colores diseñados por parte de la SED en las distintas plazoletas, andenes y otras áreas de urbanismo.

EJECUCIÓN:

- Se vierte la losa de hormigón: Tras la compactación del suelo, se coloca el encofrado y se realizan los niveles. Sigue los procedimientos tradicionales, como el grosor y el espesor. Nivela la superficie de hormigón con una llana o espátula para que quede lisa.

- No se recomienda el uso de aceleradores para el fraguado del hormigón, ya que pueden no dar tiempo a que se complete el proceso del hormigón estampado.

- Color del endurecedor: Deje que el hormigón transpire. Cuando el agua haya desaparecido de la superficie, el hormigón ya sea plástico es momento de aplicar la primera capa a mano de endurecedor.

- Se necesitan dos capas para conseguir un color uniforme, aunque algunos colores más claros pueden requerir hasta una tercera capa. Mezcle la pintura en la superficie con una espátula de acero. Debe cubrir toda la superficie y tener un color uniforme.

- Agente desmoldante: Aplique el desencofrante a la losa de hormigón a mano, vertiendo y cubriendo el color del endurecedor. Antes de utilizarlo, se recomienda abrir el sobre que contiene el desmoldeante y mezclarlo a mano para que entre en contacto con el aire.

- Molde de hormigón estampado: Espere hasta que el hormigón haya alcanzado su punto de estampado. Este es el momento en que se puede levantar sin hundirse, pero dejando una marca bien marcada.

- Coloque siempre los moldes en horizontal, procurando que estén lo más juntos posible para evitar una doble raya en la superficie.

- Lavar el hormigón estampado: Al menos 24 horas después del estampado, se barre el hormigón en seco y se lava a presión para eliminar el exceso de desmoldeante.

- -Sellador: El sellador se aplica cuando esté libre de humedad. Para la aplicación se puede utilizar un rodillo, una brocha o un pulverizador.

MATERIALES:

- **Concreto 3000 PSI-21 Mpa**
- **COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO**
- **DESMOLDANTE EN POLVO**
- **SELLADOR**
- **Desmoldante DMA 1000 CO**

EQUIPOS:

- **Herramienta Menor (% M.O)**
- **MOLDE PARA PISO ESTAMPADO**
- **PISON PARA MOLDE CONCRETO**
- **Vibrador**
- **Formaleta losa maciza cimentación**

TRANSPORTE:

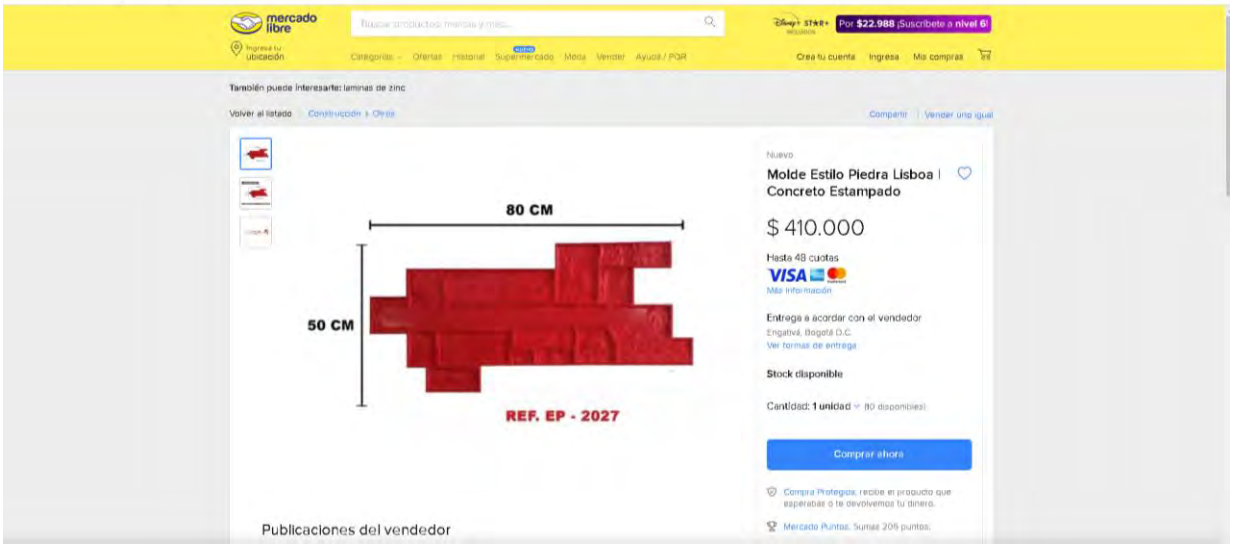
- Furgón.

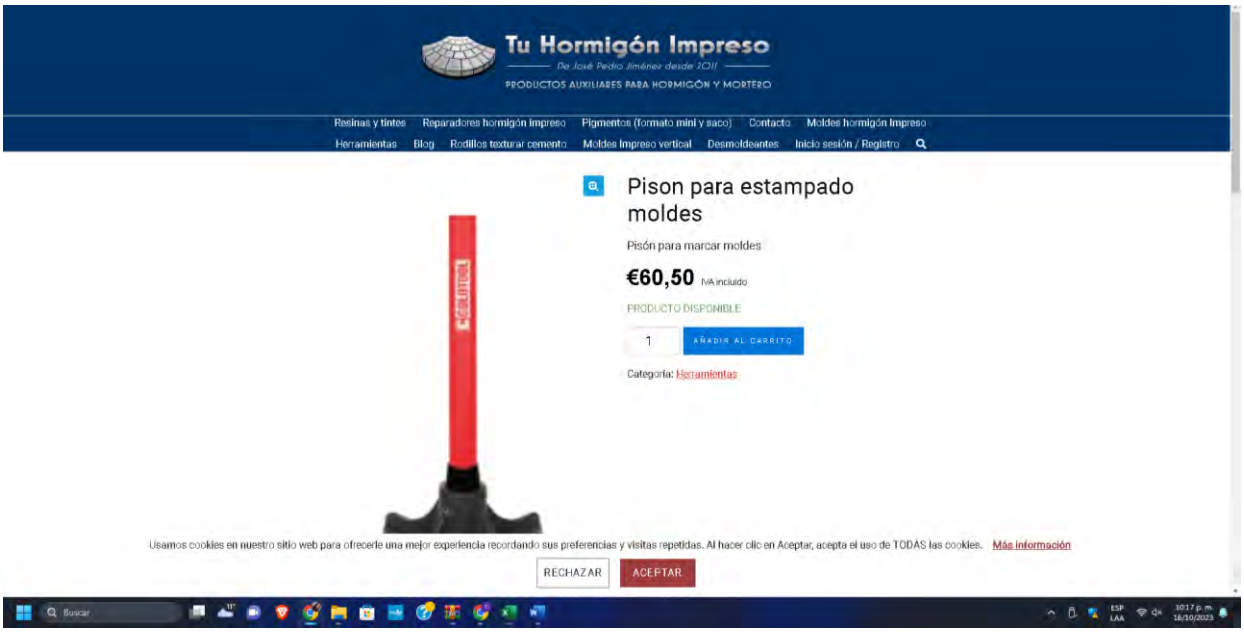
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **METRO CUADRADO (M2) de PLACA MACIZA EN CONTREO ESTAMPADO E=12 CM,** recibidos a satisfacción por la interventoría.

Consorcio Mia GP

Rafael Uribe Uribe





Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ALGUNAS IMÁGENES DE PROYECTOS REALIZADOS CON NUESTROS PRODUCTOS.







www.casaconcretoestampado.com.co
cel.: 313 4454202 - 320 4396229
Bogotá, Colombia

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cotizacion

No. C-23-37026

CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.440.077-9
KM 1 7 AUT MEDELLIN ENTRADA PARQUE LA FLORIDA 1 1 KM PAR INDUSTRIAL TERRAPUERTO BG 34
Tel: (8766121) undefined - Ext. undefined
Cota - Colombia

Para	PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS
Nit	901.531.834-2
Fecha	2023-09-20

- **Cordial saludo,**

A continuación encontrará el detalle de los productos requeridos para su obra. Si tiene consultas, preguntas o inquietudes no dude en contactarnos a las líneas celulares disponibles (Cel. 3142190393 - 3123758389) o al PBX 8766121.

Esperamos que esta oferta sea de su agrado y nos permita hacer parte de su obra.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Fotos	Videos	Vr. Bruto
1	CONCRETE COLOR (Color endurecedor de cuarzo) AMARILLO GOLD C-113 - PRESENTACIÓN BULTO DE 25KG - DOSIFICACIÓN DE 5 KG POR M2 - DEPENDIENDO DE LA TONALIDAD Y EL TRÁFICO AL CUAL ESTÉ DIRIGIDO - PARA INCORPORAR MANUALMENTE CON LLANA O FLOTA SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. PARA 150M2	30.00	BULTO	73,700.00	Ver	Ver	2,211,000.00
2	DESMOL CONCRETE - AMARILLO GOLD C-113 (Desmoldante en polvo) - PREST. CUÑETE DE 20KG - DOSIFICACIÓN: 0.20KG POR M2 - PARA EL SISTEMA DE CONCRETO ESTAMPADO. PARA 300.2	1.50	CUÑETE	182,000.00	Ver	Ver	273,000.00
3	CONCRETE COLOR (Color endurecedor de cuarzo) ROJO PARDO B C-136 - PRESENTACIÓN BULTO DE 25KG - DOSIFICACION: 4KG POR M2 - PARA INCORPORAR MANUALMENTE CON LLANA O FLOTA SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO. PARA 150M2	24.00	BULTO	81,400.00	Ver	Ver	1,953,600.00
4	DESMOL CONCRETE - ROJO PARDO B C-136 (Desmoldante en polvo) - PREST. CUÑETE DE 20KG - DOSIFICACIÓN: 0.20KG POR M2 - PARA EL SISTEMA DE CONCRETO ESTAMPADO. PARA 150M2	1.50	CUÑETE	182,000.00	Ver	Ver	273,000.00
5	SELLA CONCRETE - BRILLO MEDIO - PREST. CUÑETE DE 20LT - DOSIFICACIÓN: 0.25LT POR M2 - PARA PROTEGER Y EMBELLECER PISOS O PIEZAS EN CONCRETO Y PIEDRA NATURALES. PARA 300M2	4.00	CUÑETE	471,000.00	Ver	Ver	1,884,000.00
6	MOLDE MT-52 ADOQUÍN CORRIDO LISO 91CM X 43,2CM - MOLDE EN POLIURETANO PARA ESTAMPAR CONCRETO, MODULACION MINIMA PARA ESTAMPAR 4UND NOTA: Moldes 100% en poliuretano de alta resistencia al impacto - Shore A 80 +/- 2 - En flexibilidades rígidas o flexibles.	4.00	UND	333,600.00	Ver	Ver	1,334,400.00
7	PISON PARA ESTAMPADO MEDIDAS BASE 28 CM X 28 CM ALTURA 1.14 MTS	1.00	UND	289,200.00	Ver	Ver	289,200.00
8	OBSEQUIO TRANSPORTE DE SIBERIA A BOGOTA PARA 1517KG CON LAC ($257.890) CASCO URBANO	1.00		0.00	Ver	Ver	0.00

Total Bruto	8,218,200.00
Descuentos	1,527,678.00
Subtotal	6,690,522.00
IVA 19%	1,271,199.18

Total a Pagar	**7,961,721.18**

APRECIADO CLIENTE: IMPORTANTE TENER EN CUENTA:

De acuerdo con nuestra conversación adjuntamos cotización con las siguientes condiciones:

- **DESCUENTOS APLICADOS:**

Se aplicó descuento del 23% en Concrete Color y Sella Concrete. Se aplicó descuento del 25% en Desmol Concrete.

- **CONDICIONES DE DESPACHO Y TRASNPORTE DE LOS MATERIALES:**

1. **Tiempo de despacho: 24 a 48 horas.**
2. **Incluye transporte SIN COSTO de los materiales a la ciudad de Bogotá. (Transporte NO incluye descargue en obra)**

- **EL PAGO ES DE CONTADO:**

NOTA: El comprobante de pago de esta cotización agradecemos enviarlo al correo comercial@concretoestampadocolombia.com o via WhatsApp al asesor que le brindó la atención.

Los pagos los puede realizar en los siguientes bancos:

- **BANCOLOMBIA /CUENTA DE AHORROS No 67311758311 A NOMBRE DE: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S**
- **BANCO DE BOGOTA / CUENTA DE AHORROS No 016139560 A NOMBRE DE: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S**
- **BANCO DAVIVIENDA / CUENTA DE AHORROS No 463500026810 A NOMBRE DE: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S**
- **BANCO BBVA / CUENTA DE AHORROS No 021108469 A NOMBRE DE: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S**
- **EFECTY CÓDIGO 111475 / CONVENIO CONCRETCOL VENTAS (SI PAGA POR EFECTY NO TIENE QUE PAGAR COMISIÓN POR EL GIRO).**

- **OTRAS CONDICIONES:**

1. Esta oferta tiene validez de 15 días hábiles.

2. Sí es Retenedor, aplicar retención del 2.5% por compras, cuando el valor del subtotal sea igual o superior a $1.145.000. NO SOMOS AUTORRETENEDORES: Por favor SOLO APLIQUE RETEICA si su empresa está ubicada en el municipio de Cota. Si su empresa no se encuentra ubicada en el municipio de Cota, no nos debe practicar Retención de ICA o RETEICA.

3. Lo invitamos a revisar muy bien las cantidades y materiales descritos en la presente cotización, ya que una vez despachados éstos no tienen cambio.

4. Así mismo es IMPORTANTE que se revise con mucho detalle la ficha técnica de cada productos; las cuales están siempre disponibles nuestro portal web:

https://concretoestampadocolombia.com/ - Sección: Materiales

CONCRETOL SAS no tiene responsabilidad en el manejo que se le dé a la aplicación y como se lleve a cabo la instalación de los materiales. La aplicación e instalación de estos es responsabilidad del personal en obra que realice el proceso.

Link de nuestro canal en YouTube:https://www.youtube.com/user/concretoestampadocol

MM

DPTO. COMERCIAL
comercial@concretoestampadocolombia.com

LA CASA DEL CONCRETO ESTAMPADO
PISOS Y PAREDES

NIT. 901.196.626-1 RÉGIMEN COMÚN

LA CASA DEL CONCRETO ESTAMPADO SAS.
AV. CALLE 72 # 84A-60
BOGOTÁ, COLOMBIA
313 4454202- 320 4396229

COTIZACIÓN
4147

NOMBRE EMPRESA	NIT / CC /CE	NOMBRE CLIENTE	CIUDAD
PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S	901.531.834-2	ING. SANDRA PINZON	BOGOTA D.C.
DIRECCION	**TELEFONO**	**E - MAIL**	**FECHA**
CR 18 # 60 C - 13 S	321 965 6222	procasaconstruccion@gmail.com	**20/09/2023**

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos para su proyecto, para nosotros es un placer poner nuestros productos a su disposición.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	MOLDES Y HERRAMIENTAS			
1	CASACRETO Color Endurecedor **(TC – AMARILLO TRAFICO)** presentación: Bulto x 25 Kg. dosificación: 4 kg X M2. **PARA 150 M2** 	24 BULTOS	$ 55.000	$ 1.320.000
2	CASACRETO Desmoldante en polvo **(TD - AMARILLO TRAFICO)** presentación: bulto X 10 Kg, dosificación: 0,25 kg X M2. **PARA 150 M2**	4 BULTOS	$ 66.387	$ 265.548
3	CASACRETO Color Endurecedor **(TC – ROJO OSCURO)** presentación: Bulto x 25 Kg. dosificación: 4 kg X M2. **PARA 150 M2** 	24 BULTOS	$ 51.261	$ 1.230.264
4	CASACRETO Desmoldante en polvo **(TD - ROJO)** presentación: bulto X 10 Kg, dosificación: 0,25 kg X M2. **PARA 150 M2**	4 BULTOS	$ 66.387	$ 265.548
5	CASACRETO Sellador acrílico **(TS - BRILLANTE)** presentación: galón X 1 L, dosificación: 0,25 L X M2. **PARA 300 M2**	75 LITROS	$ 26.891	$ 2.016.806
	MOLDES Y HERRAMIENTAS			
6	REF. EP-2001 **ADOQUÍN ESPIGADO** (90 CM X 66 CM) 	4 UNIDADES	$ 361.345	$ 1.445.380
7	CASACRETO **PISON** (120 CM X 30 CM)	1 UNIDAD	$ 294.118	$ 294.118
	OTROS CONCEPTOS			
8	TRANSPORTE DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA POR FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE TRANSPORTE; NO SOMOS PRESTADORES DIRECTOS DEL SERVICIO. SE ENTREGA EN NUESTRAS OFICINAS	1.383 kg	$ -	$ -

ELABORADO POR: ANGELA GARCIA

EJECUTIVO COMERCIAL: JHON EDISSON CARDENAS

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO: CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA: 24 A 48 HORAS APROXIMADAMENTE UNA VEZ CONFIRMADO EL PAGO (ADICIONAL TENER ENCUENTA LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO DE LAS TRANSPORTADORAS) .

Apreciado cliente con el fin de evitar contratiempos en el desarrollo de sus proyectos, le recomendamos tener encuenta los tiempos y los desplazamientos de las transportadoras ya que son terceros con los cuales trabajamos de forma conjunta y son ellos quienes manejan su propia losgistica y programación.

ESTA COTIZACIÓN ES VALIDA POR 20 DIAS

Cuenta Bancaria a nombre de La casa del concreto estampado sas:

Cuenta de ahorros Bancolombia: 049-000135-53

Enviar soporte de pago a : ventas@casaconcretoestampado.com.co

TOTAL BRUTO	$ 6.837.664
DESCTO 10% EN MATERIALES Y MOLDES	$ 654.355
SUBTOTAL	$ 6.183.310
IVA	$ 1.174.829
TOTAL	$ 7.358.138

Bogotá, Agosto 03de 2023 **YG -5724- 2022**

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Obra: COLEGIOS RAFAEL URIBE URIBE
Direccion: LOCALIAD RAFAEL URIBE URIBE
Ciudad

Ref.: Suministro Concreto y transporte -

Cordial Saludo

Sigue nuestra oferta de precios y condiciones para la obra referenciada:

PRECIOS:

Especificación del Producto	Unidad	Cant	Valor Unitario	IVA	Total Unitario
Bombeable | Normal | 2000 | 28 Dias | Grava Comun | 6 plg	m^3	1	$ 292.270	$ 55.531	$ 347.801
Bombeable | Normal | 2000 | 28 Dias | Grava Fina | 6 plg	m^3	1	$ 294.270	$ 55.911	$ 350.181
Bombeable | Normal | 3000 | 28 Dias | Grava Comun | 6 plg	m^3	1	$ 308.720	$ 58.657	$ 367.377
Bombeable | Normal | 3000 | 28 Dias | Grava Fina | 6 plg	m^3	1	$ 310.980	$ 59.086	$ 370.066
Bombeable | Normal | 3500 | 28 Dias | Grava Comun | 6 plg	m^3	1	$ 314.600	$ 59.774	$ 374.374
Bombeable | Normal | 3500 | 28 Dias | Grava Fina I 6 plg.	m^3	1	$ 317.100	$ 60.249	$ 377.349
Bombeable | Normal | 4000 | 28 Dias | Grava Comun | 6 plg	m^3	1	$ 321.420	$ 61.070	$ 382.490
Bombeable | Normal | 4000 | 28 Dias | Grava Fina | 6 plg	m^3	1	$ 324.300	$ 61.617	$ 385.917
Bombeable | Normal | 5000 | 28 Dias | Grava Comun | 6 plg	m^3	1	$ 341.900	$ 64.961	$ 406.861
Bombeable | Normal | 5000 | 28 Dias | Grava Fina | 6 plg	m^3	1	$ 345.500	$ 65.645	$ 411.145
Tremie | Normal | 3500 | 28 Dias | Grava Comun | 8 plg	m^3	1	$ 328.400	$ 62.396	$ 390.796
Tremie | Normal | 3500 | 28 Dias | Grava Fina | 8 plg	m^3	1	$ 331.400	$ 62.966	$ 394.366
Tremie | Tornillo | 3500 | 28 Dias | Grava Comun | 10 plg	m^3	1	$ 333.800	$ 63.422	$ 397.222
Concreto 3000 psi de color (incluye color endurecedor, desmoldante y sellador)	m^3	1	$725.000	$ 137.750	$ 862.750
Especificación del Servicio	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Total**
Servicio de Bomba Estacionaria	m^3	1	$ 32.000	$ 6.080	$ 38.080
Servicio de Bomba Autobomba	m^3	1	$ 34.000	$ 6.460	$ 40.460
TOTAL		**1**			

ADICIONALES:

B) Recargo adicional nocturno después de 20:00 h, 20%/m3.

C) Recargo adicional por domingo/festivos, 30%/m3

D) m^3 no trasportado: **$ 50.000** para cargues menores a **6,0 m^3** exceptuando los ajustes a los cuales se tendrá derecho a 1 (uno) diario por obra.

E) Se despachará como mínimo 2 m3 en función de garantizar la calidad del producto.

G) Bombeo: valor **$ 34.000 mas IVA**

H) Mínimo bombeo: Auto bomba 4**0 mt^3** Estacionaria 3**0 mt^3**

I) Cancelaciones de equipos de bombeo y suministro de concreto consecutivas (3) veces en la misma semana se cobrará un valor de **$200.000 (doscientos mil pesos) +IVA**

J) No se asumirá los costos que se puedan generar por dificultades en el suministro tales como horas extras, alquiler de formaletas, entre otros.

K) Cobro por reubicación **$75.000 + IVA** por viaje.

L) Tarifa Ambiental - Devolución de concreto: se cobrará una tarifa de **$200.000 + IVA** por disposición final en el caso en que no se pueda entregar el producto por cualquier motivo atribuible al cliente.

M) Desplazamiento de equipos y/o armado y desarmado de la tubería dentro de la obra, que no esté contemplado en la oferta comercial tendrá un costo adicional de **3%** sobre el valor por metro cubico (m3) de concreto bombeado con el equipo desplazado.

N) Tubería no confirmada en programación superior a 40 ML tendrá un costo de **$ 10.000 + IVA** por tubo (3ML) adicional.

O) Concretos que lleven Fibra $28.000 +IVA Microfibra

P) Concreto de baja permeabilidad (impermeabilizante) tendrá un costo adicional de **$12.000 más** IVA por m3.

CONDICIONES:

FORMA DE PAGO Y GARANTÍA DE PRECIOS:
Pago anticipado conservando la cuenta en negro sobre proyeccion de consumo . Ofrecemos credito acorde al analisis crediticio de la documentacion requerida por parte de nuestra area financiera.

VALIDEZ DE LA OFERTA:
Esta oferta tiene una validez de 15 días a partir de la fecha. A la solictud del pedido se daran por aceptadas las condiciones comerciales

Cordialmente;

YADER ENRIQUE GOMEZ CASAS
Analista Comercial
CONCRETERA TREMIX S.A.S / POLIMIX
Teléfono Oficina: 6260860 EXT
Celular: 317 4362919

Copia: Comercial.

Acuerdo de Confidencialidad:

Esta propuesta ha sido preparada para uso exclusivo de las partes u organizaciones a las cuales está dirigida, por lo tanto constituye propiedad intelectual de CONCRETERA TREMIX S.A.S. El cliente se compromete a no divulgarla a ninguna persona excepto a los empleados que necesariamente deban conocer el contenido de esta propuesta y demás documentos con ella relacionada.

PARA CONSIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS:

- ITAU (código 14) 008-35853-3 Cuenta Corriente
- BANCO BOGOTA 025-18739-4 Cuenta Corriente (Efectivo y Trasferencias) formato de recaudo nacional en la referencia colocar el Nit de quien paga
- BANCO DAVIVIENDA 0087 0040 2574 Cuenta de ahorros (Efectivo y Trasferencias) formato de recaudo nacional – en la referencia colocar le nit de quien paga
- BANCO BBVA Cuenta de ahorros
9 digitos 833003973 10 digitos 0833003973 16 digitos 0833000200003973

- **TAMBIEN TENEMOS PAGOS CON TARJETA DE CREDITO POR EL PORTAL DEL ITAU INGRESANDO DESDE NUESTRA PAGINA WEB** **www.tremix.com.co -> Colombia -> Pagos en linea -> Zona de pagos Tremix**

NINGUN FUNCIONARIO DE TREMIX ESTA AUTORIZADO PARA RECIBIR EFECTIVO POR LO CUAL EL CLIENTE LO DEBE CONSIGNAR DIRECTAMENTE EN NUESTRAS CUENTAS Y ENVIAR LA CONSIGNACION

Cuando realicen la consignación o transferencia por favor enviar el soporte al correo electrónico tesoreria@tremix.com.co y natalia@tremix.com.co, y los cheques deben ser girados a nombre de CONCRETERA TREMIX S.A.S. NIT 830,106,474-5 con sellos del primer beneficiario y de cruce sencillo.

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO	BULTO	$ 65.450	LA CASA DEL CONCRETO ESTAMPADO	$ 87.703,	CONCRETCOL	$ 172.550	TREMIX	$ 108.568	$ 56.516	$165.084	$52.051	$ 65.450	87703,00	$ 172.550	$ 76.577
	DESMOLDANTE EN POLVO	KG	$ 7.900	LA CASA DEL CONCRETO ESTAMPADO	$ 10.829	CONCRETCOL	$ 25.883	TREMIX	$ 14.871	$ 9.648	$24.519	$5.222	$ 7.900	10829,00	$ 25.883	$ 9.365
	SELLADOR	LITRO	$ 32.004	LA CASA DEL CONCRETO ESTAMPADO	$ 28.025	CONCRETCOL	$ 77.648	TREMIX	$ 45.892	$ 27.573	$73.465	$18.319	$ 32.004	28024,50	$ 77.648	$ 30.014
	MOLDE PARA PISO ESTAMPADO	KG	$ 430.00	LA CASA DEL CONCRETO ESTAMPADO	$ 396.984	CONCRETCOL	$ 410.000	MERCADO LIBRE	$ 412.328	$ 16.631	$428.959	$395.697	$ 430.001	396984,00	$ 410.000	$ 403.492
	PISON PARA MOLDE CONCRETO	UND	$ 350.000	LA CASA DEL CONCRETO ESTAMPADO	$ 344.148	CONCRETCOL	$ 270.677	TU HORMIGON IMPRESO	$ 321.608	$ 44.205	$365.813	$277.404	$ 350.000	344148,00	$ 270.677	$ 347.074

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-46	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA H=15 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	6.257,36	312,87
				SUBTOTAL	312,87

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	-

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,05	6.257,36
				SUBTOTAL	6.257,36
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.570,00
AIU CONTRACTUAL 28,19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 1.852,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 8.422,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los un (03) días, del mes de agosto del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	2220554	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	17/03/2022	**FECHA TERMINACIÓN**	16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-48	ACOMETIDA PRINCIPAL DE TRANSFORMADOR A TGA 3X4/0+1X4/0+1X2/0 según diagrama unifiar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegria Palermo sur	ml	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	6.875,00	343,75
Equipo de trabajo en alturas certificado (alquiler)		dia	17.000,00	0,05	850
				SUBTOTAL	1.193,75

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cable 4/0 AWG aislado THHN/THWN-2 90°C 600V color negro	ml	4,20	$ 107.633,00	$ 452.058,60
Cable THHN/THWN 2/0 AWG	ml	1,05	$ 47.742,00	$ 50.129,10
			SUBTOTAL	502.188

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					-
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,05	6.875,00
				SUBTOTAL	6.875,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 510.256,00
AIU CONTRACTUAL	28,19%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 143.841,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 654.097,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los VEINTE (20) dias del mes de octubre del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-48- ACOMETIDA PRINCIPAL DE TRANSFORMADOR A TGA 3X4/0+1X4/0+1X2/0 según diagrama unifilar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegría Palermo sur

UNIDAD: ML

JUSTIFICACIÓN:

La habilitación de 49 aulas adicionales en el IED FE Y ALEGRIA, requiere de adecuaciones eléctricas los cuales una vez realizados los cálculos eléctricos generaron como resultado la necesidad realizar acometidas principales desde transformador hacia TGA 3X4/0+1X4/0+1X2/0, en cumplimiento de los lineamientos normativos, técnicos y constructivos soportados en lo exigido por el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, además de las diferentes normas exigidas por el operador de red local Codensa; el proyecto busca establecer los parámetros de diseño para circuitos de tomacorrientes e iluminación en baja tensión y la inclusión del análisis necesario para la acometida principal en baja tensión.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-48- ACOMETIDA PRINCIPAL DE TRANSFORMADOR A TGA 3X4/0+1X4/0+1X2/0 según diagrama unifilar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegría Palermo sur

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la ACOMETIDA PRINCIPAL DE TRANSFORMADOR A TGA 3X4/0+1X4/0+1X2/0 según diagrama unifilar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegría Palermo sur

EJECUCIÓN:

- Verificar planos eléctricos
- Verificar diámetros y materialidad de tubería
- Realizar el tendido de los conductores dentro de la tubería, cuidando la integralidad de los conductores evitando peladuras en los mismos
- Realizar las protecciones en cada extremo descubierto del cable instalado.

MATERIALES:

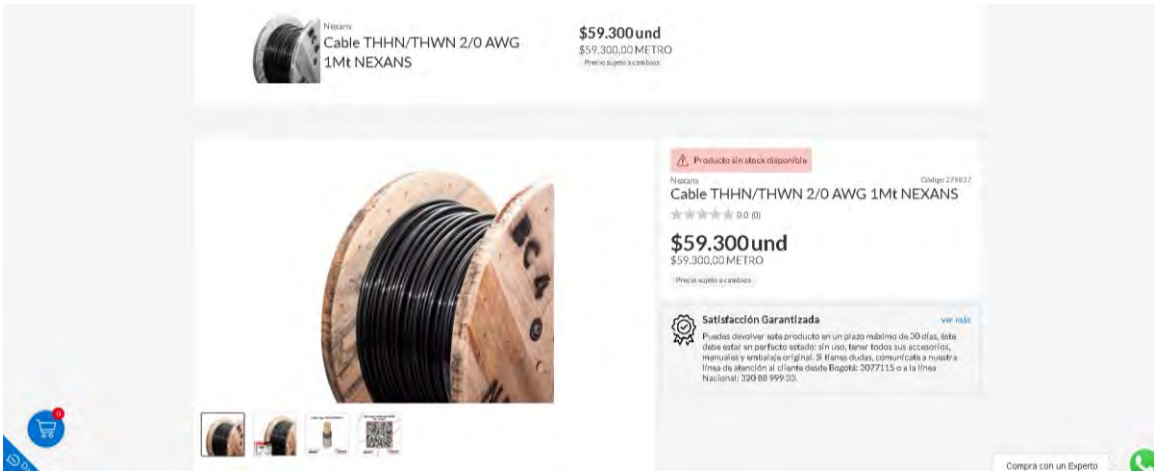
- **Cable 4/0 AWG aislado THHN/THWN-2 90°C 600V color negro**
- **Cable THHN/THWN 2/0 AWG**


EQUIPOS:


- **Herramienta Menor (% M.O)**
- **Equipo de trabajo en alturas certificado (alquiler)**

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **METRO LINEAL (ML) DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE TRANSFORMADOR A TGA 3X4/0+1X4/0+1X2/0 según diagrama unifilar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegría Palermo sur,** recibidos a satisfacción por la interventoría.


Nexans
Cable THHN/THWN 2/0 AWG 1Mt NEXANS
$59.300 und
$59,300,00 METRO
Precio sujeto a cambios
Producto sin stock disponible
Nexans
Cable THHN/THWN 2/0 AWG 1Mt NEXANS
$59.300 und
$59,300,00 METRO
Precio sujeto a cambios
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Compra con un Experto

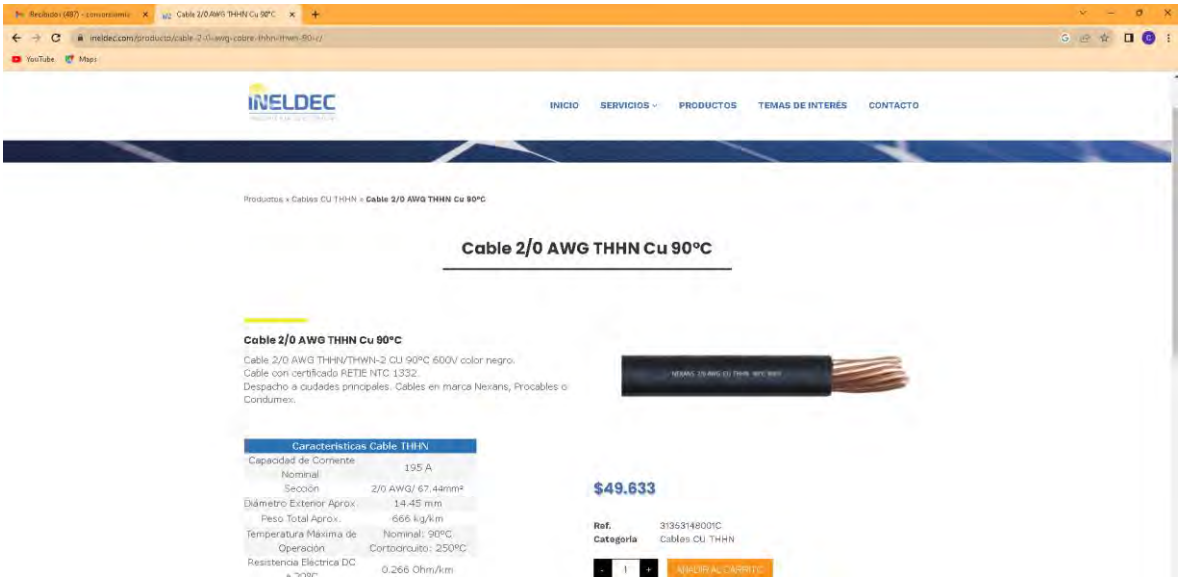
INELDEC
INICIO
SERVICIOS
PRODUCTOS
TEMAS DE INTERÉS
CONTACTO
Productos » Cables CU THHN » Cable 2/0 AWG THHN Cu 90°C
Cable 2/0 AWG THHN Cu 90°C
Cable 2/0 AWG THHN Cu 90°C
Cable 2/0 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color negro.
Cable con certificado RETIE NTC 1332.
Despacho a ciudades principales. Cables en marca Nexans, Procables o Condumex.
Características Cable THHN
Capacidad de Corriente Nominal 195 A
Sección 2/0 AWG/ 67.44mm²
Diámetro Exterior Aprox. 14.45 mm
Peso Total Aprox. 666 kg/km
Temperatura Máxima de Operación Nominal: 90°C Cortocircuito: 250°C
Resistencia Eléctrica DC 0.266 Ohm/km
$49.633
Ref. 3135314800IC
Categoría Cables CU THHN
AÑADIR AL CARRITO

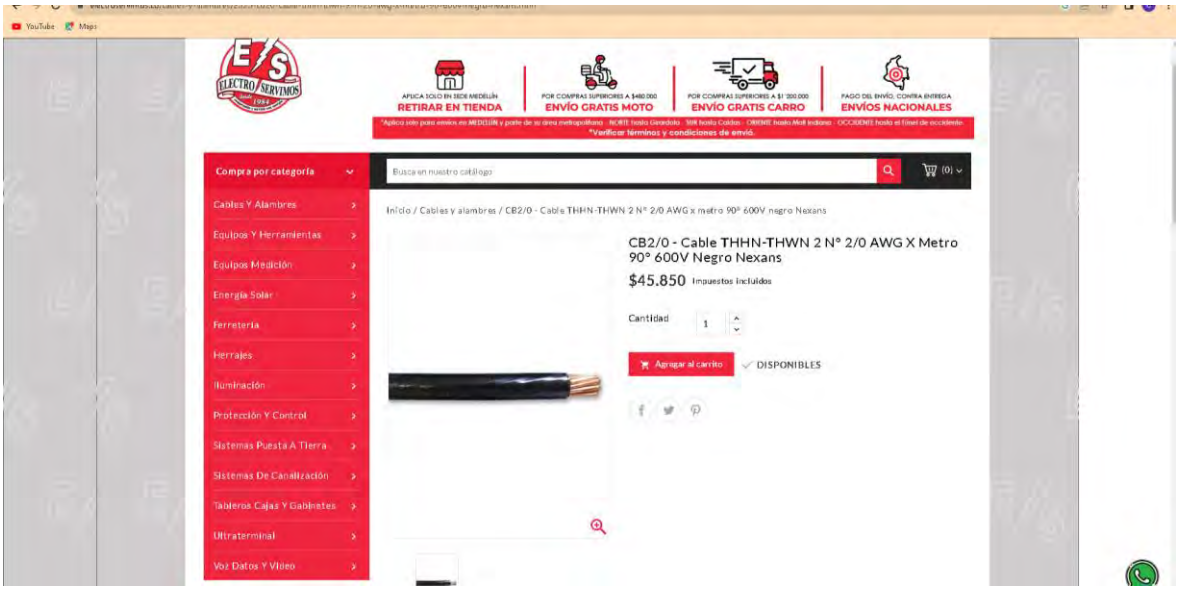
RETIRAR EN TIENDA
ENVÍO GRATIS MOTO
ENVÍO GRATIS CARRO
ENVÍOS NACIONALES
Compra por categoría
Cables Y Alambres
Equipos Y Herramientas
Equipos Medición
Energía Solar
Ferretería
Herrajes
Iluminación
Protección Y Control
Sistemas Puesta A Tierra
Sistemas De Canalización
Tableros Cajas Y Gabinetes
Ultraterminal
Voz Datos Y Video
Busca en nuestro catálogo
Inicio / Cables y alambres / CB2/0 - Cable THHN-THWN 2 N° 2/0 AWG x metro 90° 600V negro Nexans
CB2/0 - Cable THHN-THWN 2 N° 2/0 AWG X Metro 90° 600V Negro Nexans
$45.850 Impuestos incluidos
Cantidad
Agregar al carrito
DISPONIBLES

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 02652

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCAS CONDUMEX Y LATINCASA	**ALAMBRES Y CABLES DE COBRE, ALUMINIO Y ALUMINIO SERIE 8000, AISLADOS EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO, 600V, TIPOS TW, THW, THHW, THHN/THWN, THWN-2, CABLES TIPO THHN/THWN, THWN-2, THW-LS, THHW-LS APTOS PARA USO EN CT, PARA CALIBRES MAYORES O IGUALES AL 12 AWG. RESISTENTE A LA INTEMPERIE (SR), RESISTENTE AL ACEITE Y LA GASOLINA (OIL & GASOLINE RESISTANT)**	**CALIBRES 14 AWG AL 2000 kcmil**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

CONDUMEX S.A. DE C.V.

Poniente 140 720 Col. Industrial Vallejo, México D.F, México

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2011, UL 83/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 27 / 04 / 2007
Fecha de Renovación: 11 / 01 / 2020
Fecha de Vencimiento: 11 / 01 / 2023

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 11 / 01 / 2021 y 11 / 01 / 2022

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2020.01.20 15:44:33 -05'00'

#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02652

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 27 / 04 / 2007
FECHA DE RENOVACIÓN: 11 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 11 / 01 / 2023

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCAS CONDUMEX Y LATINCASA

FABRICADOS POR CONDUMEX S.A. DE C.V., UBICADA EN PONIENTE 140 720 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, MÉXICO D.F, MÉXICO

Tipo	Alambres y cables de cobre, aluminio y aluminio serie 8000, aislados en material termoplástico, 600V, tipos TW, THW, THHW, THHN/THWN, THWN-2, Cables tipo THHN/THWN, THW-LS, THHW-LS, THWN-2 apto para uso en bandeja porta cable (Use CT) para calibres mayores o iguales al 12 AWG, resistente a la intemperie (SR), resistente al aceite y la gasolina (Oil & Gasoline Resistant)						
Referencia	Calibres 14 AWG al 2000 kcmil						
Designación	TW	THW	THHW	THHN o THWN	THWN-2	THHN/THWN	THW-LS/ THHW-LS
Aislamientos	PVC 60ºC	PVC 75°C	PVC 90ºC	PVC 90ºC	PVC 90ºC	PVC/NYLON 90ºC	PVC/NYLON 90 ºC
Máxima temperatura	60ºC seco o húmedo	75 ºC seco o húmedo	90 ºC seco o húmedo	90 ºC seco 75ºC húmedo	90 ºC seco 9 ºC húmedo	90 ºC seco 75ºC húmedo	90ºC seco 90ºC húmedo
Conductor	Alambres o conductores cableado concéntrico de cobre suave o aluminio						
Cubierta	No Aplica			Nylon			
Aplicación	Cables para instalaciones y construcciones residenciales, industriales y comerciales de baja tensión (600 V)						
Referencial	NTC 1332/2011 y UL 83/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)						

Nota: Este Certificado unifica los Certificados 01070, 01416, 02651 y 02652.

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager
VSUAREZ

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 01864

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA NEXANS COLOMBIA	**VER ANEXO**	**VER ANEXO**

CÓDIGO IAF:	**19**	**CÓDIGO NACE:**	**27.32**	**CÓDIGO ICS:**	**29.060.010 29.060.020**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

NEXANS COLOMBIA S.A.

Parque Industrial de Bucaramanga Manzana B, Bucaramanga, Santander, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2011, UL 83/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2005 / 09 / 02
Fecha de Renovación: 2019 / 10 / 15
Fecha de Actualización: 2020 / 12 / 11
Fecha de Vencimiento: 2022 / 10 / 14

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2021 / 10 / 14

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2020.12.19 10:04:09 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01864

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005 / 09 / 02
FECHA DE RENOVACIÓN: 2019 / 10 / 15
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2020 / 12 / 11
FECHA DE VENCIMIENTO: 2022 / 10 / 14

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA NEXANS COLOMBIA

Tipo / Type	Alambres y cables aislados en material termoplástico para baja tensión (600 V); Monoconductores y multiconductores para aplicaciones de fuerza tipo TW, THW, THHW, THHN/THWN, THHN/THWN-2, THHW-LS. Aptos para Uso en CT **/** Wires and cables insulated in thermoplastic material for low voltage (600 V); Single and multi-conductor for power type applications TW, THW, THHW, THHN / THWN, THHN / THWN-2, THHW-LS. Suitable for Use in CT					
Referencia / Reference	Monoconductores: Desde 14 AWG (Cobre) o 12 AWG (Aluminio) hasta 2000 kcmil / Single-conductor: From 14 AWG (Copper) or 12 AWG (Aluminum) up to 2000 kcmil Multiconductores: Desde 14 AWG (Cobre) o 12 AWG (Aluminio) hasta 500 kcmil / Multiconductors: From 14 AWG (Copper) or 12 AWG (Aluminum) up to 500 kcmil					
Voltaje máximo / Max voltage	600 V					
Tipos de cable / Cable types	TW	THW	THHW (Easyfil®3en1) / THHW (Easyfil®3in1)	THHN/THWN	THHN/THWN - 2	THHW-LS
Aislamientos / Isolations	PVC	PVC	PVC	PVC/NYLON	PVC	PVC
Máxima temperatura / Maximum temperature	60 °C seco o húmedo / 60 °C dry or damp	75 °C seco o húmedo / 75 °C dry or damp	90 °C seco 75ºC húmedo / 90 °C dry 75 °C damp	90 °C seco 75 °C húmedo / 90 °C dry 75 °C damp	90 °C seco 90 °C húmedo / 90 °C dry 90 °C damp	90 °C seco 75 °C húmedo / 90 °C dry 75 °C damp
Cubierta / Cover	No aplica / Does not apply			Nylon		No aplica / Does not apply
Conductor / Driver	Cobre suave cableado concéntrico, clases B, C, D, UNILAY. Clase J (Easyfil®3en1) **/** Concentric wired soft copper, class B, C, D, UNILAY. Class J (Easyfil®3in1) Aluminio serie 8000, cableado concéntrico, clases B, C, o D **/** 8000 series aluminum, concentric wiring, class B, C, or D Aluminio recubierto de cobre (CCA), cableado concéntrico, clase 15A y 10ª **/** Copper Clad Aluminum (CCA), Concentric Wiring, Class 15A and 10th Conductor de cobre suave flexible según normas NTC 1865 (ASTM B172) y ASTM B173 **/** Flexible soft copper conductor according to NTC 1865 (ASTM B172) and ASTM B173 standards					
Aislamientos / Isolations	PVC					
Formación (opcional) / Training (optional)	Triplex (sin cubierta) / Triplex (without cover)					
Aplicación / Application	De conformidad con lo establecido en el código eléctrico colombiano (NTC 2050) y el NEC (NFPA 70 – 2014) / In accordance with the provisions of the Colombian electrical code (NTC 2050) and the NEC (NFPA 70 - 2014)					

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01864

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005 / 09 / 02
FECHA DE RENOVACIÓN: 2019 / 10 / 15
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2020 / 12 / 11
FECHA DE VENCIMIENTO: 2022 / 10 / 14

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA NEXANS COLOMBIA

<table>
<tr><td>Tipo / Type</td><td colspan="4">Alambres y cables aislados en material termoplástico para baja tensión (600 V); Monoconductores y multiconductores para aplicaciones de fuerza tipo TW, THW, THHW, THHN/THWN, THHN/THWN-2, THHW-LS. Aptos para Uso en CT / Wires and cables insulated in thermoplastic material for low voltage (600 V); Single and multi-conductor for power type applications TW, THW, THHW, THHN / THWN, THHN / THWN-2, THHW-LS. Suitable for Use in CT</td></tr>
<tr><td>Referencia / Reference</td><td colspan="4">Monoconductores: Desde 14 AWG (Cobre) o 12 AWG (Aluminio) hasta 2000 kcmil / Single-conductor: From 14 AWG (Copper) or 12 AWG (Aluminum) up to 2000 kcmil
Multiconductores: Desde 14 AWG (Cobre) o 12 AWG (Aluminio) hasta 500 kcmil / Multiconductors: From 14 AWG (Copper) or 12 AWG (Aluminum) up to 500 kcmil</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Marcaciones autorizadas / Authorized markings</td><td>No aplica / Does not apply</td><td>LS (retardante a la llama, bajo en humos y libre de halógenos) / LS (flame retardant, low smoke and halogen free)</td><td>No aplica / Does not apply</td><td>LS (retardante a la llama, bajo en humos y libre de halógenos) / LS (flame retardant, low smoke and halogen free)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Use TC (Cable para uso en bandejas portacables) / Use TC (Cable for use in cable trays)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Opcional para cubierta en PVC: Leyenda “SR” o “UV” / Optional for PVC cover: Legend "SR" or "UV"</td></tr>
<tr><td colspan="4">VW-1; Resistente al aceite y a la gasolina / VW-1; Oil and gasoline resistant</td></tr>
<tr><td colspan="4">Easyfil®3en1 / Easyfil®3in1</td></tr>
<tr><td>Referencial / Referential</td><td colspan="4">NTC 1332/2011, UL 83/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) / NTC 1332/2011, UL 83/2017 and RESOLUTION 90708 OF 2013 of the MINISTRY OF MINES AND ENERGY - RETIE (Numeral 20.2)</td></tr>
</table>

Nota:

- Alcance Reglamentario y Alcance Voluntario y/o Normativo UL 83/2017 con sello ONAC.
- Alcance Voluntario y/o Normativo NTC 1332/2011 con sello ANAB.

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
VSUAREZ

Cable 4/0 AWG Cobre THHN 90°C

Cable 4/0 AWG aislado THHN/THWN-2 90°C 600V color negro.
Pueden ser instalados en ductos, cárcamos y bandejas portacables.
Chaqueta de nylon resistente a agentes químicos y gasolina
Cable 4/0 AWG con certificado RETIE NTC 1332.
Despacho a ciudades principales. Cables en marca Nexans o Condumex.



Características Cable THHN	
Capacidad de Corriente Nominal	260 A
Sección	4/0 AWG/ 107.22² mm
Diámetro Exterior Aprox.	15.39 mm
Peso Total Aprox.	1031 kg/km
Temperatura Máxima de Operación	Nominal: 90°C Cortocircuito: 250°C
Resistencia Eléctrica DC a 20°C	0.167 Ohm/km

$76.596

Ref. 31353150001C
Categoría Cables CU THHN

- 1 + AÑADIR AL CARRITO

PlanillaExcel.com Formato Cotizador | AYUDA →



ELECTRICOS CAMELO S.A.S
900716916-1
CALLE 14 No. 12 - 65 LOCAL M11 - M13 C.C
electricoscamelosas@gmail.com
3213393450

COTIZACIÓN No. 001

Fecha de Emision
22-sep-58

NIT O C.C:	CLIENTE:	PROCASA CONSTRUCCION
DIRECCION:	TELEFONO:	
CONCEPTO: COTIZACION		

DESCRIPCIÓN	UDS	PRECIO	TOTAL
CABLE TRENZADO #4 LIBRE HALOGENO	1	$ 108.000,00	$108.000,00

		SUB-TOTAL	$108.000,00
Bancolombia: Cta ahorros No. 05300002433 ELECTRICC	IVA %	19%	$ 20.520,00
		TOTAL	$128.520,00

LISTA DE PRECIOS MTS - IE Interelectricas

CT	NX	Familia	Calibre	Material	PRECIOS ANTES DE IVA
200300	10011483	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.14 AWG Cu THWN-2 600V	CU	$ 1.650
200303	10011477	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.12 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 2.464
200305	10011471	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.10 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 3.960
200307	10011808	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.8 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 6.483
200310	10033935	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	3x12 AWG Cu THHN/THWN-2 TPX 600V 90C	CU	$ 9.188
200351	10011771	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.14 AWG Cu THWN-2 600V	CU	$ 2.003
200354	10011763	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.12 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 2.860
200354C3NG		Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.12AWG Cu THWN-2 CT600V NG C500 MOBIWAY	CU	$ 2.978
200359	10011756	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.10 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 4.494
200363	10024751	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.8 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 7.036
200369	10011405	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.6 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 10.465
200373	10011394	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.4 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 16.758
200383	10011383	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.2 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 25.980
200390	10011381	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.1/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 41.852
200394	10011391	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.2/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 52.766
200398	10012629	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.3/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 66.452
200402	10011403	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.4/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 81.436
200406	10011445	C 250 - 1000 KCMIL Cu	C.250 kcmil Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 99.292
200410	10011449	C 250 - 1000 KCMIL Cu	C.350 kcmil Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 138.896
200416	10011452	C 250 - 1000 KCMIL Cu	C.500 kcmil Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 196.047
213581	10047972	Cables 14 – 8 SINTOX	3x12AWG Cu SINTOX TPX600V 75C HF FRLS CT	CU	$ 9.867
213554	10036058	Cables 14 – 8 SINTOX	C.14AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 2.205
213555	10034156	Cables 14 – 8 SINTOX	C.12AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 3.087
213555C3NG		Cables 14 – 8 SINTOX	C.12AWG CU SINTOX 600V 75C NG C300 MOBIWAY	CU	$ 3.214
213556	10036055	Cables 14 – 8 SINTOX	C.10AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 4.718
213557	10033629	Cables 14 – 8 SINTOX	C.8AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 7.346
213558	10034358	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.6AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 11.824
213559	10034359	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.4AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 18.568
213560	10034360	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.2AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 28.644
213561	10033628	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.1/0AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 45.629
213562	10034361	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.2/0AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 56.771
213563	10034393	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.4/0AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 90.140
213617	10034398	Cables 250 – 1000Kcmil SINTOX	C.250AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 105.245
200878	10048879	C Desnudo Cu	C.8AWG(B) Cu DESNUDO SUAVE	CU	$ 6.446
200879	10012018	C Desnudo Cu	C.6AWG(B) NOR Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 9.926
200881	10012794	C Desnudo Cu	C.4AWG(B) NOR Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 15.678
200883	10012772	C Desnudo Cu	C.2AWG(B) NOR Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 24.642
200887	10027929	C Desnudo Cu	C.1/0AWG(B) UNC Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 40.754
200891	10012793	C Desnudo Cu	C.2/0AWG(B) UNC Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 50.537
200895	10012795	C Desnudo Cu	C.4/0AWG(B) UNC Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 79.803
204628	10011461	A Desnudo Cu	A.14AWG Cu DESNUDO SUAVE (M)	CU	$ 1.600
204629	10011460	A Desnudo Cu	A.12AWG Cu DESNUDO SUAVE (M)	CU	$ 2.379
204632	10011459	A Desnudo Cu	A.10AWG Cu DESNUDO SUAVE (M)	CU	$ 3.845
201527		FLEX. Duplex	2x20AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 1.367
201528	10011056	FLEX. Duplex	2x18AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 1.641
201529	10011054	FLEX. Duplex	2x16AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 2.506
201530	10011041	FLEX. Duplex	2x14 AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 3.725
201532	10011038	FLEX. Duplex	2x12 AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 5.789
201525	10011036	FLEX. Duplex	2x10 AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 9.098
201635		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 20 AWG (J) 600V	CU	$ 759
201636		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 18 AWG 600V	CU	$ 936

201638		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 16 AWG 600V	CU	$	1.346
201639		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 14 AWG 600V	CU	$	2.192
201640		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 12 AWG 600V	CU	$	3.331
201641		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 10 AWG (J) 600V	CU	$	5.029
201622		FLEX. Monopolar	C TWK Cu 60°C 8 AWG (J) 600V	CU	$	8.479
201623		FLEX. Monopolar	C TWK Cu 60°C 6 AWG (J) 600V	CU	$	13.392
204497		FLEX. Monopolar	AWM-SIS Cu 125°C 16AWG 600V XLPE	CU	$	2.422
204499		FLEX. Monopolar	AWM-SIS Cu 125°C 12AWG 600V XLPE	CU	$	5.537
209388	10034964	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x18AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	4.709
209393	10034797	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x16AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	6.491
209397	10035425	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x14AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	9.774
209387	10034963	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x18AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	3.787
209401	10051998	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x12AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	14.277
209392	10034796	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x16AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	5.202
209396	10034801	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x14AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	7.558
209405	10052000	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x10AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	22.695
209400	10051997	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x12AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	11.083
209386	10034942	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x18AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	2.767
209391	10034965	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x16AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	3.861
209410	10052020	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x8AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	37.060
209404	10051945	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x10AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	17.653
209395	10034951	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x14AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	5.699
209399	10051996	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x12AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	8.322
209414	10052023	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x6AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	58.813
209409	10052017	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x8AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	28.225
209403	10051999	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x10AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	12.130
209413	10052022	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x6AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	44.154
209417	10052024	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x4AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	90.241
209408	10052001	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x8AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	19.996
209420	10051972	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x2AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	144.319
213671		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu 2AWG 0.6/1kV XLPE/PVC	CU	$	34.948
213670		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu1/0AWG 0.6/1kVXLPE/PVC	CU	$	51.865
213669		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu2/0AWG 0.6/1kVXLPE/PVC	CU	$	64.804
213667		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu4/0AWG 0.6/1kVXLPE/PVC	CU	$	101.243
213666		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu250kcmil0.6/1kV XL/PVC	CU	$	119.148
213665		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu350kcmil0.6/1kV XL/PVC	CU	$	165.944
213664		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu500kcmil0.6/1kV XL/PVC	CU	$	240.699
201505		Cable Soldador-Batería	6AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	16.102
201506		Cable Soldador-Batería	4AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	22.191
201507		Cable Soldador-Batería	2AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	32.908
201508		Cable Soldador-Batería	1/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	51.981
201509		Cable Soldador-Batería	2/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	64.596
201510		Cable Soldador-Batería	3/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	80.629
201511		Cable Soldador-Batería	4/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	102.868
201335		FLEX. Siliconados	CABLE SILICONADO Cu 200ºC 14 AWG 600V	CU	$	4.552
201336		FLEX. Siliconados	CABLE SILICONADO Cu 200ºC 12 AWG 600V	CU	$	5.815
201337		FLEX. Siliconados	CABLE SILICONADO Cu 200°C 10 AWG 600V	CU	$	9.059
205399		Acometida Antifraude	2x8+8AWG Cu ACOM.CONC.XL/PVC 600V 90C	CU	$	29.234
201957	10012108	Acometida Antifraude	1x8+8AWG Cu ACOM.CONC.XL/PVC 600V 90C	CU	$	16.620
202038	10013378	Acometida Antifraude	2x8+8AWG Cu ACOM.PLANA.XL/PVC 600V 90C	CU	$	26.752
202073	10012289	Acometidas Trebol	TREBOL Cu3x8+10(S)AWG600VPE/PVC ENEL/COL	CU	$	33.136
209492	10011187	Acometidas Trebol	TREBOL Cu 75°C 3x2+4AWG (C) 600V PVC/PE	CU	$	123.530
202080	10011189	Acometidas Trebol	TREBOL Cu3x6+8AWG(B)600V PE/PVC ENEL/COL	CU	$	48.137
213576	10038999	Cable Tipo Fuerza	3x14AWG SINTOXFLEX CT 600V 75C	CU	$	9.806
213577	10035183	Cable Tipo Fuerza	3x12AWG SINTOXFLEX CT 600V 75C	CU	$	14.996
207973	10025077	Cable Tipo Fuerza	C.12 AWG Cu XHHW-2 600V 90C CT SR	CU	$	4.025
208168		Cable Tipo Fuerza	C.1/0 AWG Cu XHHW-2 600V 90C CT SR	CU	$	63.998
208167		Cable Tipo Fuerza	C.2/0 AWG Cu XHHW-2 600V 90C CT SR	CU	$	81.474

211541	10046010	Cables Fotovoltaicos	C.6mm2 CuSn H1Z2Z2K 1/1kV120	CU	$	7.320
211539	10046009	Cables Fotovoltaicos	C.4mm2 CuSn H1Z2Z2K 1/1kV120	CU	$	5.385
201728		Media tensión CU	XLPE Cu 90°C 2AWG 15kV 133% PC PVC SR	CU	$	67.108
201748		Media tensión CU	XLPE Cu 90°C 1/0 AWG 15kV 133% PC PVC SR	CU	$	84.538
201759		Media tensión CU	XLPE Cu 90°C 2/0AWG 15kV 133% PC PVC SR	CU	$	104.679
207357		Media tensión AL	XLPE Al 90°C 1/0 AWG 15kV 133% PC PVC SR	AL	$	102.547
201224		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 4x18AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	9.500
201222		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 3x18AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	7.787
206537		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 3x16AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	9.745
201220		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 2x18AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	6.694
205665		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 2x16AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	7.678
204154	10044737	Cable S8000	C.6AWG AA-8000 RHH/RHW2/USE2 600V 90C	AL	$	3.811
213545	10039102	Cable S8000	C.6 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	3.362
213546	10039143	Cable S8000	C.4 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	4.463
213547	10039144	Cable S8000	C.2 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	6.481
213548	10039145	Cable S8000	C.1/0 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	10.637
213549	10039146	Cable S8000	C.2/0 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	12.722
213550	10039147	Cable S8000	C.4/0 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	17.929
213551	10039148	Cable S8000	C.250 kcmil AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	21.855
213552	10039149	Cable S8000	C.350 kcmil AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	28.426
213553	10039150	Cable S8000	C.500 kcmil AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	38.318
213564	10043892	Cables S8000 SINTOX	C.6AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	3.784
213566	10043934	Cables S8000 SINTOX	C.2AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	7.138
213567	10043936	Cables S8000 SINTOX	C.1/0AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	12.084
213570	10043940	Cables S8000 SINTOX	C.4/0AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	20.624
200002	10011900	C Desnudos ACSR	ACSR/GA RAVEN 1/0AWG (AA)(6/1)	CU	$	8.836
210587	10025594	Ecologicos ACSR / AAAC / AAC	1/0AWG ACSR CUBIERTO XLPE-TK 15kV 2C	AL	$	18.524

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	Cable 4/0 AWG aislado THHN/THWN-2 90°C 600V color negro	ML	$ 76.596	INELDEG	107.266,600	LISTA DE PRECIOS CENTELSA	$ 108.000	CAMELO SAS	$ 97.288	$ 17.923	$115.211	$79.364		107266,60	$ 108.000	$ 107.633
	Cable THHN/THWN C.10 AWG Cu -2 CT 600V	ML	$ 5.593	INTERELECTRICAS	$ 5.348	LISTA DE PRECIOS CENTELSA	$ 4.031	ELECTROVERA	$ 4.990	$ 840	$5.831	$4.150	$ 5.593	5347,86		$ 5.470
	Cable THHN/THWN 2/0 AWG	ML	$ 59.300	HOMECENTER	$ 49.633	INDELEC	$ 45.850	ELECTROSERVICIOS	$ 51.594	$ 6.936	$58.531	$44.658		49633,00	$ 45.850	$ 47.742

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 DE 2022 FECHA INICIO 17/03/2022 FECHA TERMINACIÓN 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-50	ACOMETIDA TABLERO DE TOMAS 3No6+1No6+1No10 según diagrama unifiar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegria Palermo sur	ml	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	4.125,00	206,25
Equipo de trabajo en alturas certificado (alquiler)		dia	17.000,00	0,05	850
				SUBTOTAL	1.056,25

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cable Número 6 AWG Cu THHN 90°C	ml	4,20	$ 11.651,00	$ 48.934,20
Cable THHN/THWN C.10 AWG Cu -2 CT 600V	ml	1,05	$ 5.470,00	$ 5.743,50
			SUBTOTAL	54.678

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					-
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,03	4.125,00
				SUBTOTAL	4.125,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 59.859,00
AIU CONTRACTUAL 28,19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 16.874,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 76.733,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a losVEINTE (20) dias del mes de octubre de 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-50- ACOMETIDA TABLERO DE TOMAS 3No6+1No6+1No10 según diagrama unifilar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegría Palermo sur

UNIDAD: ML

JUSTIFICACIÓN:

La habilitación de 49 aulas adicionales en el IED FE Y ALEGRIA, requiere de adecuaciones eléctricas los cuales una vez realizados los cálculos eléctricos generaron como resultado la necesidad realizar ACOMETIDA TABLERO DE TOMAS 3No6+1No6+1No10, en cumplimiento de los lineamientos normativos, técnicos y constructivos soportados en lo exigido por el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, además de las diferentes normas exigidas por el operador de red local Codensa; el proyecto busca establecer los parámetros de diseño para circuitos de tomacorrientes e iluminación en baja tensión y la inclusión del análisis necesario para la acometida principal en baja tensión.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-50- ACOMETIDA TABLERO DE TOMAS 3No6+1No6+1No10 según diagrama unifilar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegría Palermo sur

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la ACOMETIDA TABLERO DE TOMAS 3No6+1No6+1No10 según diagrama unifilar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegría Palermo sur

EJECUCIÓN:

- Verificar planos eléctricos
- Verificar diámetros y materialidad de tubería
- Realizar el tendido de los conductores dentro de la tubería, cuidando la integralidad de los conductores evitando peladuras en los mismos
- Realizar las protecciones en cada extremo descubierto del cable instalado.

MATERIALES:

- **Cable Número 6 AWG Cu THHN 90°C**
- **Cable THHN/THWN C.10 AWG Cu -2 CT 600V**

EQUIPOS:

- **Herramienta Menor (% M.O)**
- **Equipo de trabajo en alturas certificado (alquiler)**

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

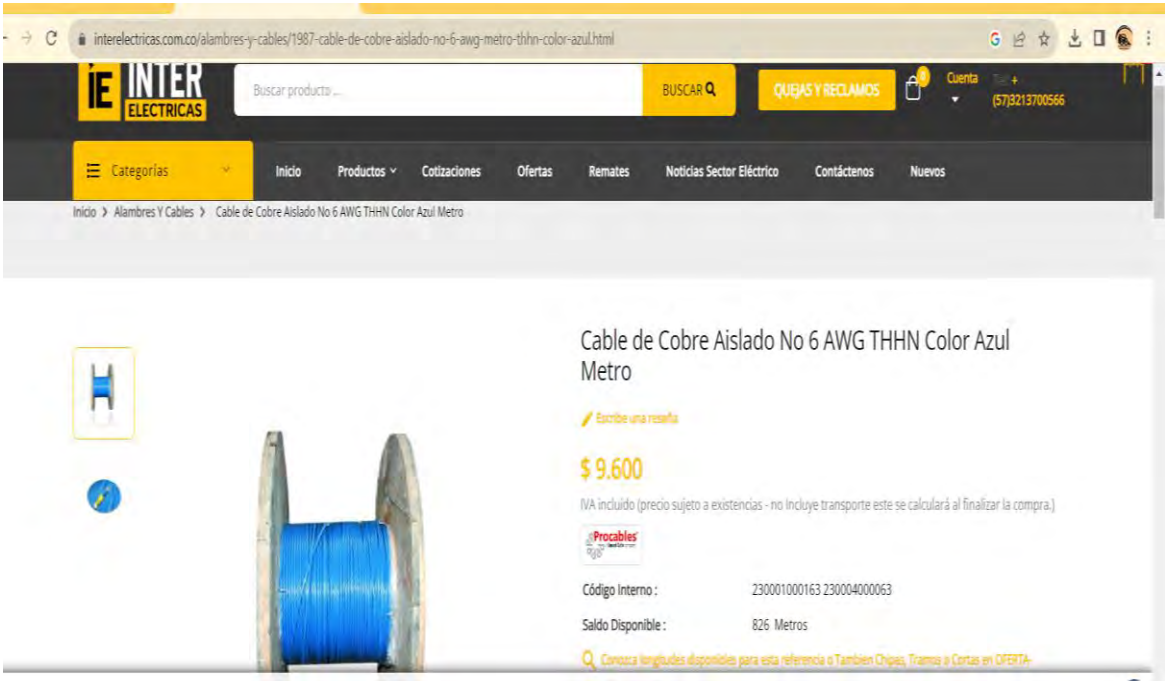
La unidad de medida de pago será por **METRO LINEAL (ML) DE ACOMETIDA TABLERO DE TOMAS 3No6+1No6+1No10 según diagrama unifilar aulas de bachillerato colegio Fe y Alegría Palermo sur,** recibidos a satisfacción por la interventoría.


LISTA DE PRECIOS MTS - IE Interelectricas

CT	NX	Familia	Calibre	Material	PRECIOS ANTES DE IVA
200300	10011483	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.14 AWG Cu THWN-2 600V	CU	$ 1.650
200303	10011477	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.12 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 2.464
200305	10011471	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.10 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 3.960
200307	10011808	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.8 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 6.483
200310	10033935	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	3x12 AWG Cu THHN/THWN-2 TPX 600V 90C	CU	$ 9.188
200351	10011771	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.14 AWG Cu THWN-2 600V	CU	$ 2.003
200354	10011763	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.12 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 2.860
200354C3NG		Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.12AWG Cu THWN-2 CT600V NG C500 MOBIWAY	CU	$ 2.978
200359	10011756	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.10 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 4.494
200363	10024751	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.8 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 7.036
200369	10011405	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.6 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 10.465
200373	10011394	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.4 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 16.758
200383	10011383	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.2 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 25.980
200390	10011381	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.1/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 41.852
200394	10011391	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.2/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 52.766
200398	10012629	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.3/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 66.452
200402	10011403	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.4/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 81.436
200406	10011445	C 250 - 1000 KCMIL Cu	C.250 kcmil Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 99.292
200410	10011449	C 250 - 1000 KCMIL Cu	C.350 kcmil Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 138.896
200416	10011452	C 250 - 1000 KCMIL Cu	C.500 kcmil Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 196.047
213581	10047972	Cables 14 – 8 SINTOX	3x12AWG Cu SINTOX TPX600V 75C HF FRLS CT	CU	$ 9.867
213554	10036058	Cables 14 – 8 SINTOX	C.14AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 2.205
213555	10034156	Cables 14 – 8 SINTOX	C.12AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 3.087
213555C3NG		Cables 14 – 8 SINTOX	C.12AWG CU SINTOX 600V 75C NG C300 MOBIWAY	CU	$ 3.214
213556	10036055	Cables 14 – 8 SINTOX	C.10AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 4.718
213557	10033629	Cables 14 – 8 SINTOX	C.8AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 7.346
213558	10034358	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.6AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 11.824
213559	10034359	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.4AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 18.568
213560	10034360	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.2AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 28.644
213561	10033628	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.1/0AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 45.629
213562	10034361	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.2/0AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 56.771
213563	10034393	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.4/0AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 90.140
213617	10034398	Cables 250 – 1000Kcmil SINTOX	C.250AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 105.245
200878	10048879	C Desnudo Cu	C.8AWG(B) Cu DESNUDO SUAVE	CU	$ 6.446
200879	10012018	C Desnudo Cu	C.6AWG(B) NOR Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 9.926
200881	10012794	C Desnudo Cu	C.4AWG(B) NOR Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 15.678
200883	10012772	C Desnudo Cu	C.2AWG(B) NOR Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 24.642
200887	10027929	C Desnudo Cu	C.1/0AWG(B) UNC Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 40.754
200891	10012793	C Desnudo Cu	C.2/0AWG(B) UNC Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 50.537
200895	10012795	C Desnudo Cu	C.4/0AWG(B) UNC Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 79.803
204628	10011461	A Desnudo Cu	A.14AWG Cu DESNUDO SUAVE (M)	CU	$ 1.600
204629	10011460	A Desnudo Cu	A.12AWG Cu DESNUDO SUAVE (M)	CU	$ 2.379
204632	10011459	A Desnudo Cu	A.10AWG Cu DESNUDO SUAVE (M)	CU	$ 3.845
201527		FLEX. Duplex	2x20AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 1.367
201528	10011056	FLEX. Duplex	2x18AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 1.641
201529	10011054	FLEX. Duplex	2x16AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 2.506
201530	10011041	FLEX. Duplex	2x14 AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 3.725
201532	10011038	FLEX. Duplex	2x12 AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 5.789
201525	10011036	FLEX. Duplex	2x10 AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 9.098
201635		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 20 AWG (J) 600V	CU	$ 759
201636		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 18 AWG 600V	CU	$ 936

201638		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 16 AWG 600V	CU	$	1.346
201639		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 14 AWG 600V	CU	$	2.192
201640		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 12 AWG 600V	CU	$	3.331
201641		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 10 AWG (J) 600V	CU	$	5.029
201622		FLEX. Monopolar	C TWK Cu 60°C 8 AWG (J) 600V	CU	$	8.479
201623		FLEX. Monopolar	C TWK Cu 60°C 6 AWG (J) 600V	CU	$	13.392
204497		FLEX. Monopolar	AWM-SIS Cu 125°C 16AWG 600V XLPE	CU	$	2.422
204499		FLEX. Monopolar	AWM-SIS Cu 125°C 12AWG 600V XLPE	CU	$	5.537
209388	10034964	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x18AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	4.709
209393	10034797	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x16AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	6.491
209397	10035425	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x14AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	9.774
209387	10034963	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x18AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	3.787
209401	10051998	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x12AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	14.277
209392	10034796	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x16AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	5.202
209396	10034801	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x14AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	7.558
209405	10052000	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x10AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	22.695
209400	10051997	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x12AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	11.083
209386	10034942	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x18AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	2.767
209391	10034965	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x16AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	3.861
209410	10052020	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x8AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	37.060
209404	10051945	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x10AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	17.653
209395	10034951	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x14AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	5.699
209399	10051996	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x12AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	8.322
209414	10052023	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x6AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	58.813
209409	10052017	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x8AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	28.225
209403	10051999	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x10AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	12.130
209413	10052022	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x6AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	44.154
209417	10052024	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x4AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	90.241
209408	10052001	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x8AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	19.996
209420	10051972	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x2AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	144.319
213671		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu 2AWG 0.6/1kV XLPE/PVC	CU	$	34.948
213670		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu1/0AWG 0.6/1kVXLPE/PVC	CU	$	51.865
213669		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu2/0AWG 0.6/1kVXLPE/PVC	CU	$	64.804
213667		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu4/0AWG 0.6/1kVXLPE/PVC	CU	$	101.243
213666		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu250kcmil0.6/1kV XL/PVC	CU	$	119.148
213665		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu350kcmil0.6/1kV XL/PVC	CU	$	165.944
213664		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu500kcmil0.6/1kV XL/PVC	CU	$	240.699
201505		Cable Soldador-Batería	6AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	16.102
201506		Cable Soldador-Batería	4AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	22.191
201507		Cable Soldador-Batería	2AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	32.908
201508		Cable Soldador-Batería	1/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	51.981
201509		Cable Soldador-Batería	2/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	64.596
201510		Cable Soldador-Batería	3/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	80.629
201511		Cable Soldador-Batería	4/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	102.868
201335		FLEX. Siliconados	CABLE SILICONADO Cu 200ºC 14 AWG 600V	CU	$	4.552
201336		FLEX. Siliconados	CABLE SILICONADO Cu 200ºC 12 AWG 600V	CU	$	5.815
201337		FLEX. Siliconados	CABLE SILICONADO Cu 200°C 10 AWG 600V	CU	$	9.059
205399		Acometida Antifraude	2x8+8AWG Cu ACOM.CONC.XL/PVC 600V 90C	CU	$	29.234
201957	10012108	Acometida Antifraude	1x8+8AWG Cu ACOM.CONC.XL/PVC 600V 90C	CU	$	16.620
202038	10013378	Acometida Antifraude	2x8+8AWG Cu ACOM.PLANA.XL/PVC 600V 90C	CU	$	26.752
202073	10012289	Acometidas Trebol	TREBOL Cu3x8+10(S)AWG600VPE/PVC ENEL/COL	CU	$	33.136
209492	10011187	Acometidas Trebol	TREBOL Cu 75°C 3x2+4AWG (C) 600V PVC/PE	CU	$	123.530
202080	10011189	Acometidas Trebol	TREBOL Cu3x6+8AWG(B)600V PE/PVC ENEL/COL	CU	$	48.137
213576	10038999	Cable Tipo Fuerza	3x14AWG SINTOXFLEX CT 600V 75C	CU	$	9.806
213577	10035183	Cable Tipo Fuerza	3x12AWG SINTOXFLEX CT 600V 75C	CU	$	14.996
207973	10025077	Cable Tipo Fuerza	C.12 AWG Cu XHHW-2 600V 90C CT SR	CU	$	4.025
208168		Cable Tipo Fuerza	C.1/0 AWG Cu XHHW-2 600V 90C CT SR	CU	$	63.998
208167		Cable Tipo Fuerza	C.2/0 AWG Cu XHHW-2 600V 90C CT SR	CU	$	81.474

211541	10046010	Cables Fotovoltaicos	C.6mm2 CuSn H1Z2Z2K 1/1kV120	CU	$	7.320
211539	10046009	Cables Fotovoltaicos	C.4mm2 CuSn H1Z2Z2K 1/1kV120	CU	$	5.385
201728		Media tensión CU	XLPE Cu 90°C 2AWG 15kV 133% PC PVC SR	CU	$	67.108
201748		Media tensión CU	XLPE Cu 90°C 1/0 AWG 15kV 133% PC PVC SR	CU	$	84.538
201759		Media tensión CU	XLPE Cu 90°C 2/0AWG 15kV 133% PC PVC SR	CU	$	104.679
207357		Media tensión AL	XLPE Al 90°C 1/0 AWG 15kV 133% PC PVC SR	AL	$	102.547
201224		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 4x18AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	9.500
201222		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 3x18AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	7.787
206537		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 3x16AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	9.745
201220		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 2x18AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	6.694
205665		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 2x16AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	7.678
204154	10044737	Cable S8000	C.6AWG AA-8000 RHH/RHW2/USE2 600V 90C	AL	$	3.811
213545	10039102	Cable S8000	C.6 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	3.362
213546	10039143	Cable S8000	C.4 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	4.463
213547	10039144	Cable S8000	C.2 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	6.481
213548	10039145	Cable S8000	C.1/0 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	10.637
213549	10039146	Cable S8000	C.2/0 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	12.722
213550	10039147	Cable S8000	C.4/0 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	17.929
213551	10039148	Cable S8000	C.250 kcmil AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	21.855
213552	10039149	Cable S8000	C.350 kcmil AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	28.426
213553	10039150	Cable S8000	C.500 kcmil AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	38.318
213564	10043892	Cables S8000 SINTOX	C.6AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	3.784
213566	10043934	Cables S8000 SINTOX	C.2AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	7.138
213567	10043936	Cables S8000 SINTOX	C.1/0AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	12.084
213570	10043940	Cables S8000 SINTOX	C.4/0AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	20.624
200002	10011900	C Desnudos ACSR	ACSR/GA RAVEN 1/0AWG (AA)(6/1)	CU	$	8.836
210587	10025594	Ecologicos ACSR / AAAC / AAC	1/0AWG ACSR CUBIERTO XLPE-TK 15kV 2C	AL	$	18.524


interelectricas.com.co/alambres-y-cables/1987-cable-de-cobre-aislado-no-6-awg-metro-thhn-color-azul.html
INTER ELECTRICAS
Buscar producto...
BUSCAR
QUEJAS Y RECLAMOS
Cuenta
(57)3213700566
Categorías
Inicio
Productos
Cotizaciones
Ofertas
Remates
Noticias Sector Eléctrico
Contáctenos
Nuevos
Inicio > Alambres Y Cables > Cable de Cobre Aislado No 6 AWG THHN Color Azul Metro
Cable de Cobre Aislado No 6 AWG THHN Color Azul Metro
Escribe una reseña
$ 9.600
IVA incluido (precio sujeto a existencias - no Incluye transporte este se calculará al finalizar la compra.)
Procables
Código Interno :
230001000163 230004000063
Saldo Disponible :
826 Metros
Conozca longitudes disponibles para esta referencia o Tambien Chipas, Tramos o Cortas en OFERTA

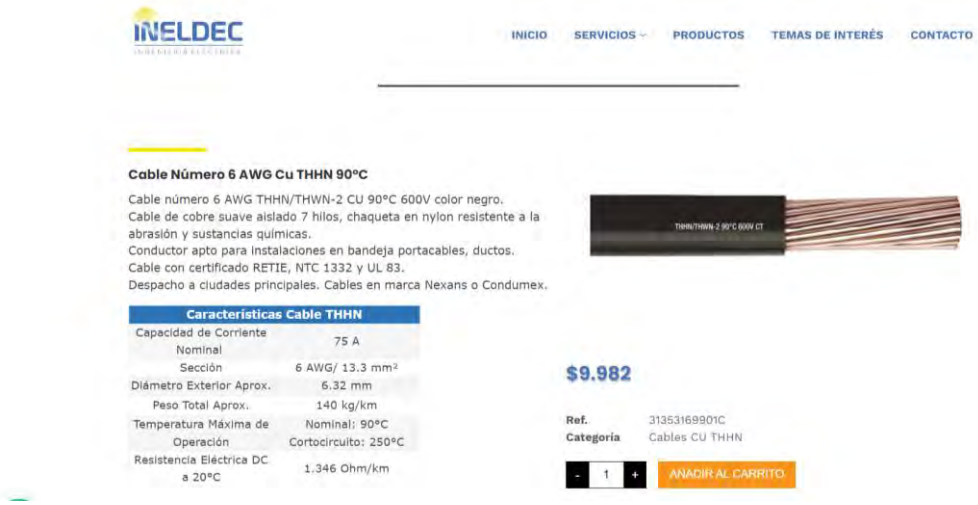
INELDEC
INICIO
SERVICIOS
PRODUCTOS
TEMAS DE INTERÉS
CONTACTO
Cable Número 6 AWG Cu THHN 90°C
Cable número 6 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color negro.
Cable de cobre suave aislado 7 hilos, chaqueta en nylon resistente a la abrasión y sustancias químicas.
Conductor apto para instalaciones en bandeja portacables, ductos.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83.
Despacho a ciudades principales. Cables en marca Nexans o Condumex.
Características Cable THHN
Capacidad de Corriente Nominal
75 A
Sección
6 AWG/ 13.3 mm²
Diámetro Exterior Aprox.
6.32 mm
Peso Total Aprox.
140 kg/km
Temperatura Máxima de Operación
Nominal: 90°C
Cortocircuito: 250°C
Resistencia Eléctrica DC a 20°C
1.346 Ohm/km
$9.982
Ref.
31353169901C
Categoría
Cables CU THHN
-
1
+
AÑADIR AL CARRITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.	SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL												BOGOTÁ		
	LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	Cable THHN/THWN C.6 AWG Cu -2 CT 600V	ML	$ 11.424	INTERELECTRICAS	$ 12.453	LISTA DE PRECIOS CENTELSA	$ 11.879	ENELDEC	$ 11.919	$ 516	$12.434	$11.403	$ 11.424		$ 11.879	$ 11.651

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-379

Bogotá, D.C, octubre 25 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 GUSTAVO RESTREPO

Respetados señores:


En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Cristian Duvan Jiménez Otero	1.024.569.991	Instalador	Gustavo Restrepo

CONSORCIO TIG

Sin otro particular,

Atentamente,



~~EDISON RICARDO~~ DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe
Anexo. Documentación del personal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.024.569.991**

JIMENEZ OTERO

APELLIDOS

CRISTIAN DUVAN

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **17-ABR-1996**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

22-ABR-2014 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00573053-M-1024569991-20140514 0038594390A 2 40175579

Medellín, 06 de October de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ESTRUKTEC SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1024569991	JIMENEZ OTERO CRISTIAN DUVAN	07/10/2023		T2069135	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/10/2023 18:39:16 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.90.14, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo
NIT. 800.251.440-6

No. de Radicación	Fecha de Radicación
	D D M M A A A A

176706044

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación B. Reporte de Novedades X	A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia X; - Beneficiario o Afiliado adicional; B. Colectiva; C. Institucional; D. De Oficio	A. Contributivo X; B. Subsidiado

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de Cotizante	Código
A. Cotizante X B. Cabeza de Familia C. Beneficiario	A. Dependiente X B. Independiente C. Pensionado	(a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Jimenez	Otero	Cristian	Duvan

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CN TI CE CD RC CC X PA SC	1024569991	Femenino Masculino X	D D M M A A A A 17 04 1996

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo F (X) M Condición T P		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
Sura	Porvenir	$ 1.160.000

18. Residencia

Dirección	Teléfono Fijo
Carrera 10 50 07	2994212

Teléfono Celular	Correo Electrónico
3024570766	duvanjimenez.996@gmail.com.

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
Bogota	Urbana X Rural	Kennedy	Dlc

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
CN TI CE CD RC CC PA SC		Femenino Masculino	D D M M A A A A

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos Complementarios

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco
B1			Femenino Masculino	D D M M A A A A	
B2			Femenino Masculino	D D M M A A A A	
B3			Femenino Masculino	D D M M A A A A	
B4			Femenino Masculino	D D M M A A A A	
B5			Femenino Masculino	D D M M A A A A	

	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo	31. Discapacidad Condición	32. Datos de Residencia Municipio/Distrito	Zona	Departamento	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS)
B1		F N M	T P		Urbana Rural			
B2		F N M	T P		Urbana Rural			
B3		F N M	T P		Urbana Rural			
B4		F N M	T P		Urbana Rural			
B5		F N M	T P		Urbana Rural			

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo documento de Identificación	37. Número del documento de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)
Estruktec S.A.S	NIT X CC TI PA CE CD	901614035	

39. Ubicación

Dirección: Carrera 1 # 10 02 | Teléfono Fijo: 6021302

Correo Electrónico: yolandubitray@hotmail.com | Municipio / Distrito: Bogota | Departamento: DC

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [X] 14. Traslado: [X] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CN RC TI CC CE PA CD SC		Femenino Masculino	D D M M A A A A	06 10 2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones
	Código	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC — Cantidad: 1 X — TOTAL 1
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
					D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento	Número de documento de identidad	71. Firma del Funcionario

Observaciones:

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CRISTIAN DUVAN JIMENEZ OTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.024.569.991**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 24 de Octubre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-380

Bogotá, D.C, 25 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No.9

Respetados señores:

Por medio de la presente, nos permitimos remitir el Acta de Pago Parcial de obra No.9, allegado por parte del contratista de obra CONSORCIO MIA GP y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos el correspondiente aval con soporte en los documentos anexos para el trámite del acta parcial de obra No.7:


1. Oficio de solicitud de aprobación de obra a interventoría
2. Oficio de solicitud de aprobación de interventoría a la SED
3. Acta parcial en Excel y PDF
4. Memorias de Calculo
5. Aportes parafiscales
6. FURC - hoja información de pagos
7. RUT CONSORCIO
8. Pre Factura No. MGP-11
9. Resolución de facturación DIAN
10. Certificación Bancaria
11. Acta de autorización de pagos

CONSORCIO TIG

12. Anexos

Esta documentación esta con sus respectivos soportes debidamente revisados, avalados y aprobados por esta Interventoría y por ello recomienda a la secretaria de Educación tramitar el pago No.9 correspondiente al periodo del 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 con un porcentaje total de avance del contrato a la fecha de 66,27%.

Atentamente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal
CONSORCIO TIG
Nit: 90164989-03

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-381

Bogotá, D.C, 25 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.9

Respetados señores:


Por medio de la presente, y en cumplimiento a las obligaciones contractuales esta interventoría realiza la entrega del Acta de cobro Parcial No.9 correspondiente al periodo del 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023, para su correspondiente revisión y aprobación. Dentro de este contexto se anexa los documentos soporte para el trámite del acta parcial:

1. Oficio de solicitud de aprobación de acta interventoría
2. Acta parcial en Excel y PDF
3. Aportes parafiscales
4. FURC - hoja información de pagos
5. RUT CONSORCIO
6. RIT CONSORCIO
7. Pre Factura
8. Resolución de facturación DIAN
9. Certificación Bancaria

CONSORCIO TIG

10. Acta de autorización de pagos

Atentamente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal
CONSORCIO TIG
Nit: 90164989-03

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-382

Bogotá, D.C, 30 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.41

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.41, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.41:** 23/10/2023 al 29/10/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Nueve (9) folios

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022		CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645	
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES		PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	
PRÓRROGA :	CUATRO (4) MESES		PRORROGA 1:	122,00	
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de mayo de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de abril de 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	485		PLAZO ACTUALIZADO:	455	
PLAZO TRANSCURRIDO:	299 EQUIVALE AL	61,65%	PLAZO TRANSCURRIDO:	282 EQUIVALE AL	61,98%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00		VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00	
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 371.557.789,00		VALOR ADICIÓN No.1:	$ 5.050.000.000,00	
VALOR ADICIÓN No.2:	$ 187.000.000,00		VALOR ADICIÓN No.2:	$ 1.870.000.000,00	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.437.145.727,00		VALOR ACTUALIZADO:	$ 18.861.262.150,00	
VALOR PAGADO:	$ 700.956.706,00		VALOR PAGADO:	$ 9.527.028.090,00	
VALOR POR PAGAR:	$ 736.189.021,00		VALOR POR PAGAR:	$ 9.334.234.060,00	
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ		INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	19/12/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	24/11/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	30/10/2023	13/10/2023	17
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	24/11/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA**	20/12/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	31/10/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023	4/10/2023	-67
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	7/11/2023	16/10/2023	22
29	**TALLER BICICLETERO**		9/10/2023	
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**282**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 231.906.572,00	$ 231.906.572,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 224.744.000,00	$ 224.744.000,00	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	10/04/2024	NO HA INICIADO

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	$ 1.010.000.000,00	$ 824.070.607,84	81,59%	1/11/2023	EN EJECUCIÓN
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	$ 485.207.002,00	$ 369.418.421,00	76,14%	26/12/2023	EN EJECUCIÓN
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	$ 841.548.020,00	$ 661.825.935,54	78,64%	2/11/2023	EN EJECUCIÓN
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	$ 1.169.838.192,85	$ 1.169.838.192,85	100,00%	28/08/2023	FINALIZADO
8	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	17/04/2024	NO HA INICIADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	$ 350.997.438,48	$ 350.997.438,48	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	$ 827.987.076,00	$ 529.502.814,00	63,95%	20/02/2024	EN EJECUCIÓN
11	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL**	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	30/03/2024	NO HA INICIADO
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	$ 762.681.025,00	$ 507.059.140,00	66,48%	5/01/2024	EN EJECUCIÓN
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	$ 1.228.838.776,00	$ 1.035.740.092,69	84,29%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	$ 1.206.469.428,00	$ 944.061.003,70	78,25%	22/11/2023	EN EJECUCIÓN
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	$ 498.001.754,00	$ 20.124.423,96	4,04%	29/02/2024	NO HA INICIADO
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	$ 1.193.215.393,25	$ 1.193.215.393,25	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	11/04/2024	NO HA INICIADO
18	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%	14/02/2024	NO HA INICIADO
19	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	$ 656.544.890,00	$ 214.257.543,00	32,63%	28/02/2024	NO HA INICIADO
20	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	$ 339.352.709,00	$ 184.268.678,00	54,30%	2/03/2024	NO HA INICIADO
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	$ 2.027.739.816,00	$ 1.336.602.857,58	65,92%	8/04/2024	EN EJECUCIÓN
22	**COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA**	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	18/04/2024	NO HA INICIADO
23	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	$ 335.852.053,00	$ 181.696.446,54	54,10%	28/12/2023	NO HA INICIADO
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	$ 702.836.423,00	$ 347.876.572,00	49,50%	7/02/2024	EN EJECUCIÓN
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
29	**TALLER BICICLETERO**	$ 250.000.000,00	$ 101.227.603,00	40,49%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
27	**EMERGENCIAS**	$ 862.485.928,00	$ 532.852.321,00	61,78%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intervenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	No se realizan actividades	FRENTE TERMINADO Y EN OBSERVACIÓN

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua finalizando actividades referente a detalles de acabados, pendiente realizar la intervención de patio en adoquin y ventanas perimetrales.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: 16 (Dieciseis). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	No se realizan actividades	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) personas Equipo: Herramienta menor, vibro compactador
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se instala la griferia de los lavamanos de los baños de sala de profesores, y la grifefria de los orinales de niños primer piso.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se instala los espejos en el salon de danza, y se le entrega a la institucion los espacios de biblioteca.	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se instalan los postes metalicos y las luminarias, se le aplica el color al concreto estampado.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	No se realizan actividades, en espera de que el colegio libere nuevos espacios a intervenir}	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	se realizan los puntos hidraulicos y sanitarios en los baños del segundo piso, y se comienza con la instalacion del enchape, se realiza la aplicación de estuco en el area de biblioteca y sala de profesores.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se inicia con la actividad de instalacion del cielo raso en el area administrativa, se instalan las luminarias y los puntos electricos	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, IGABRIELA MISTRAL**	Se realizó enchape en áreas Vae y Embera, con guardaescoba y emboquillado, se requiere intervenir el área de danzas y componente eléctrico	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: 1 (1) persona. Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se realiza el armado de acero para la construcción del muro contención, se continua con la fabricación de ventanas en aluminio e instalación de redes eléctricas y excavación y aplicación en zona de cafeteria existente para la instalación de redes hidrosanoitarias de los baños a construir, se requiere mejorar el rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Once (11) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	No se realizan actividades , Se realiza reunión donde se evalúa el nuevo diseño de la tarima.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) personas Equipo: Andamios, herramienta menor y rotomartillo
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se inicia con la actividad del retiro del manto asfaltico en el area del pasillo.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	Se continua con la fabricación en sitio, los módulos para el cerramiento de la IED,se requiere mejorar rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor


CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	Se inica con la aplicación de pintura en la estructura metalica en las aulas, se realiza el desmonte de luminarias y la proteccion de la tuberia EMT	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
29	**TALLER BICICLETERO**	Inicias extendido y compactación de material de sub base, continua traslado y disposición final de material de excavación, Se realiza levantamiento topográfico verificando volúmenes de excavación y niveles.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora
28	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera de que el contratista inicie con la ejecución del resto de la emergencias que están pendientes a la fecha.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 5.580.338.197,26	59,78%	0,07%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 5.586.938.137,41	59,85%	

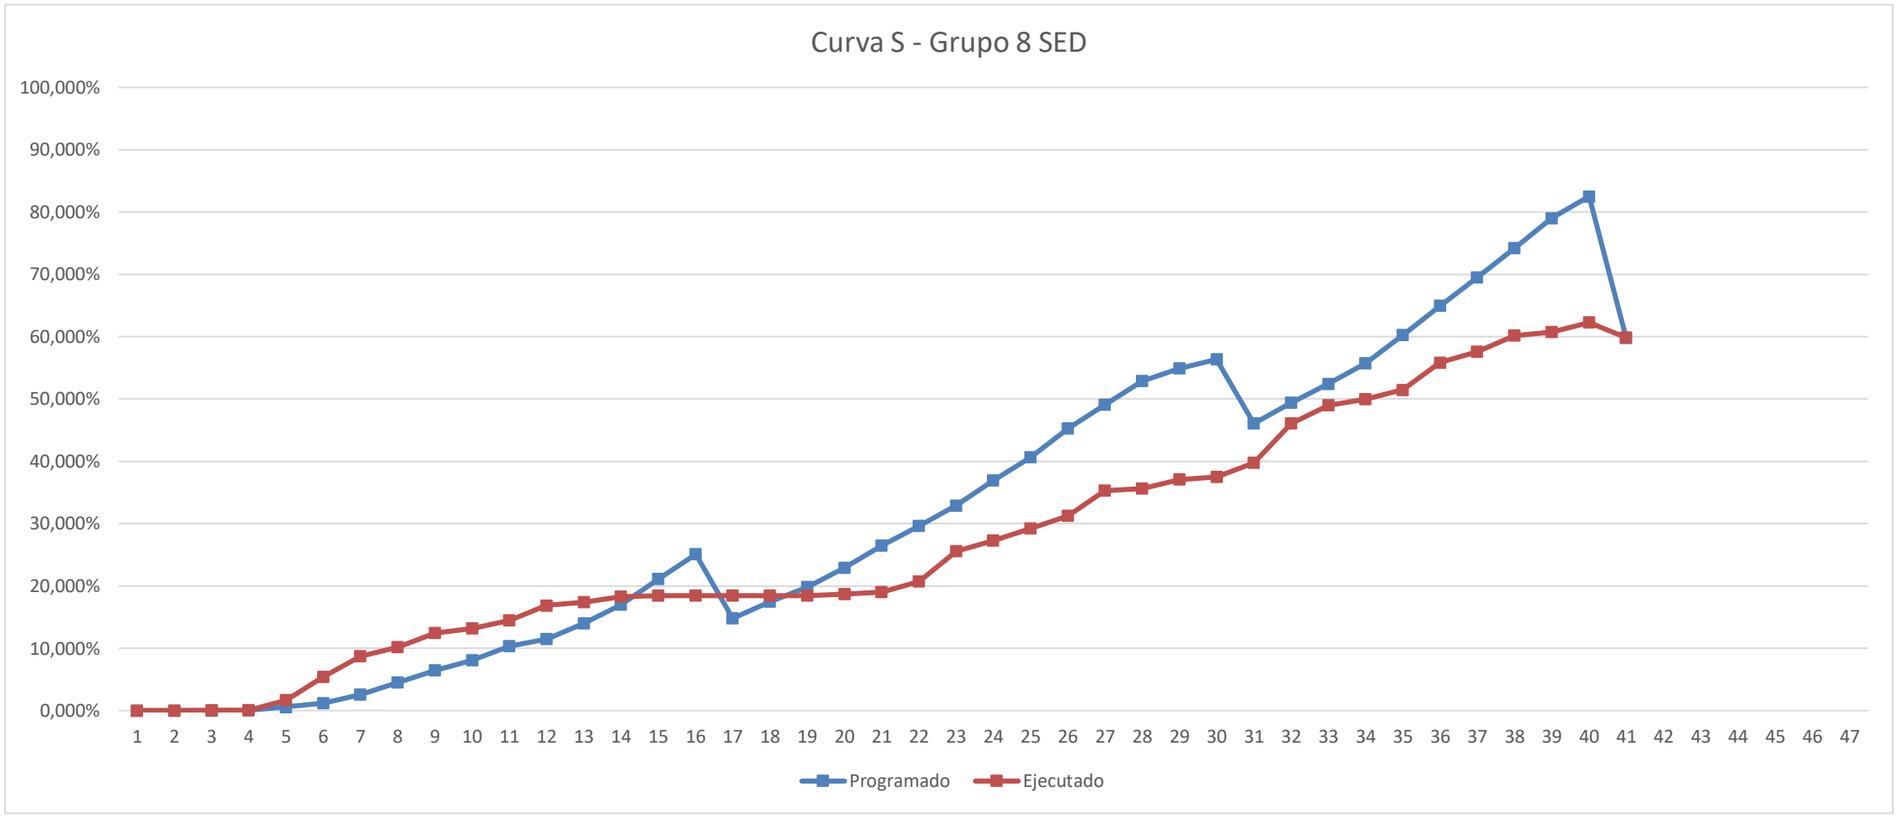

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Con ocasión a la oficialización de la solicitud de adición No.2 al contrato de obra por un valor de $ 1,870,000,000 y una prórroga por un término de cuatro (4) meses calendario, la cual fue extendida a la SED durante el periodo semanal y que contaba con previo aval de la Entidad Contratante, para el presente periodo semanal entra en vigencia la nueva programación, la cual extiende el plazo contractual hasta el 19 de abril de 2024 y permite la reorganización del inicio de varios frentes, que no han podido iniciar por la extensión de los alcances de otros que están en ejecución y por la condición administrativa y profesional del equipo que está a cargo del proyecto.

En estos momentos el proyecto se encuentra al día en términos de ejecución y se propenderá porque continúe en esas condiciones en lo que resta del plazo contractual.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Manuel del Socorro sede B - Entrega de presupuesto actualizado Inicio de actividades en obra	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido) En proceso
Taller de la bicibleta - Envío del presupuesto	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 20 de octubre de 2023 se atendieron las observaciones relacionadas con los APU's no previstos NP25, NP26, NP27, NP33, NP34, NP36 y NP40.
* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:



Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y no realizó la entrega de su concepto técnico.
Colegio Restrepo Millán sede D: El riesgo existente con las redes eléctricas será intervenido a través del alcance del frente.

Pendiente la atención de varias emergencias a la fecha que ya fueron notificadas de manera oficial al contratista de obra.

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública






FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

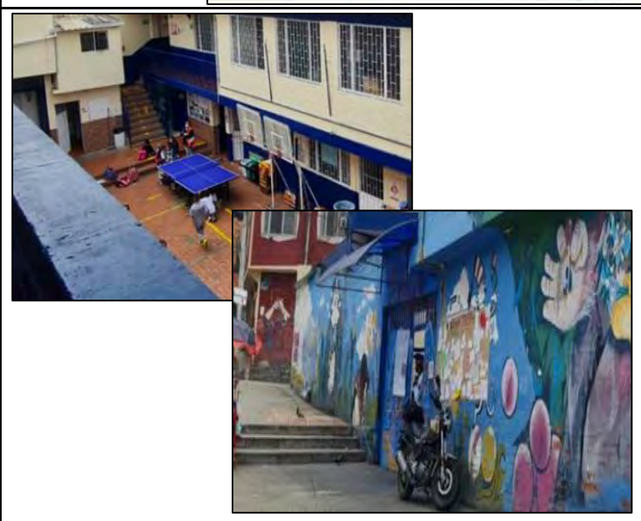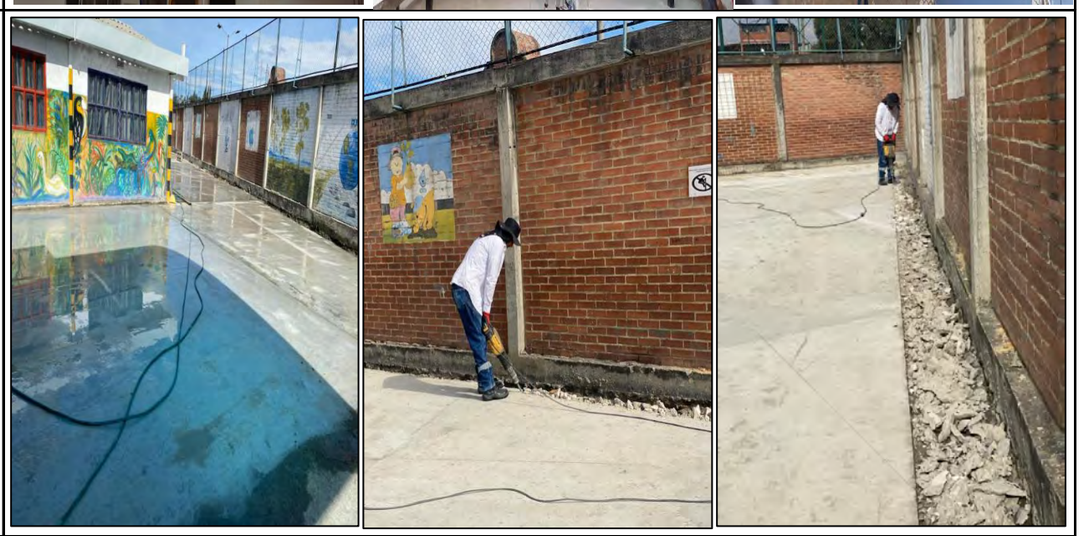10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**		
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		





CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

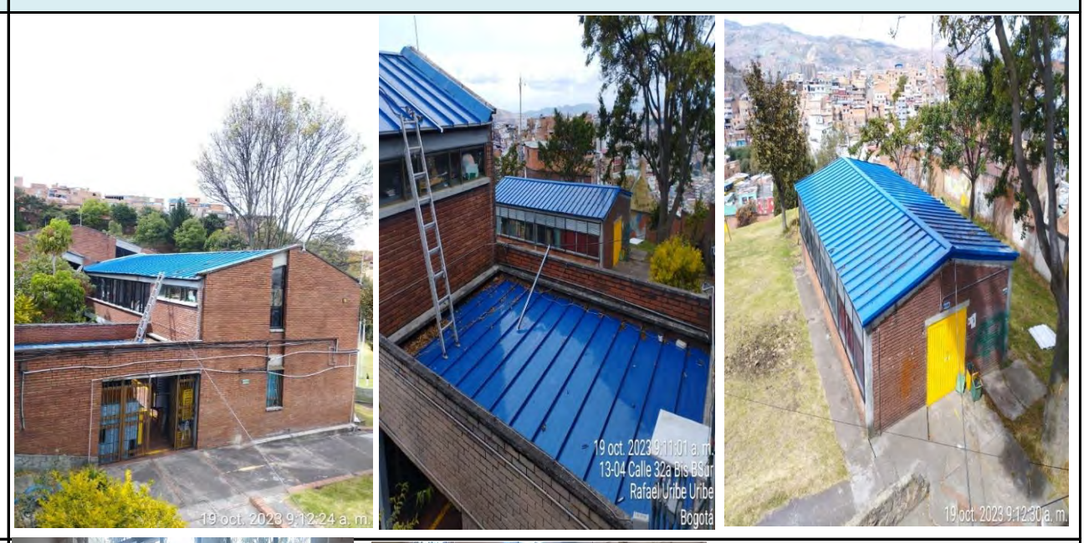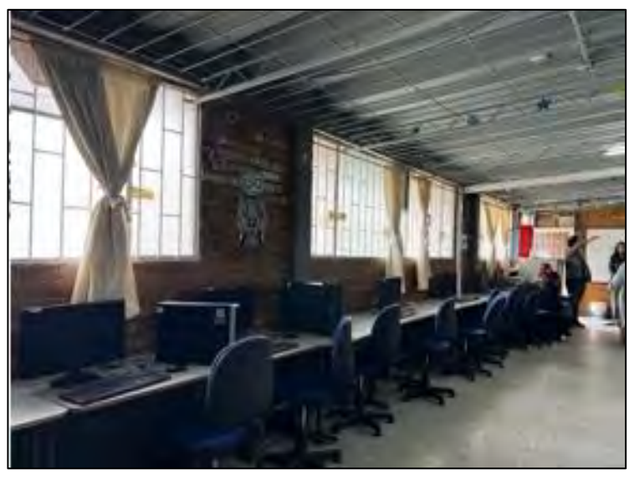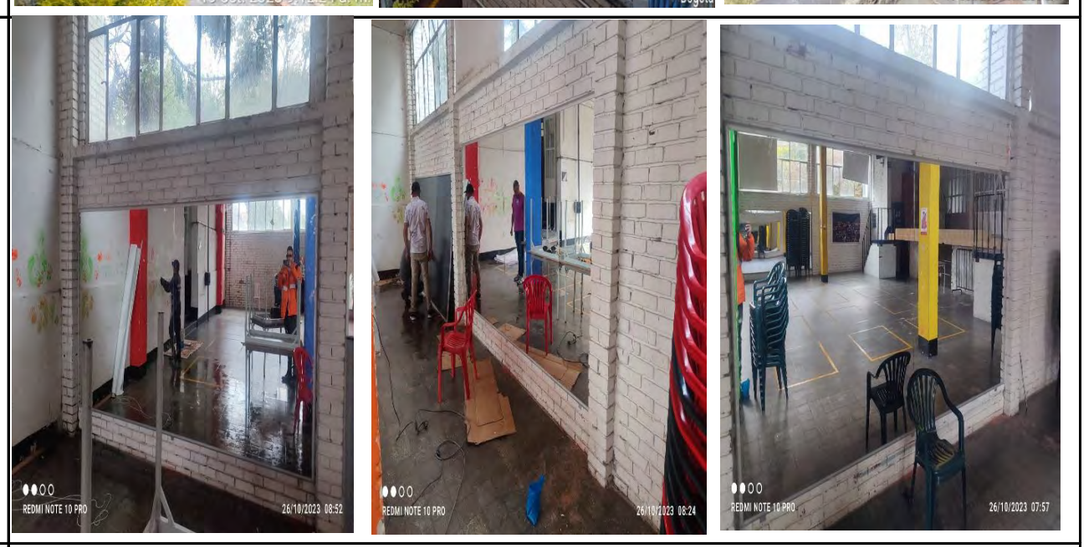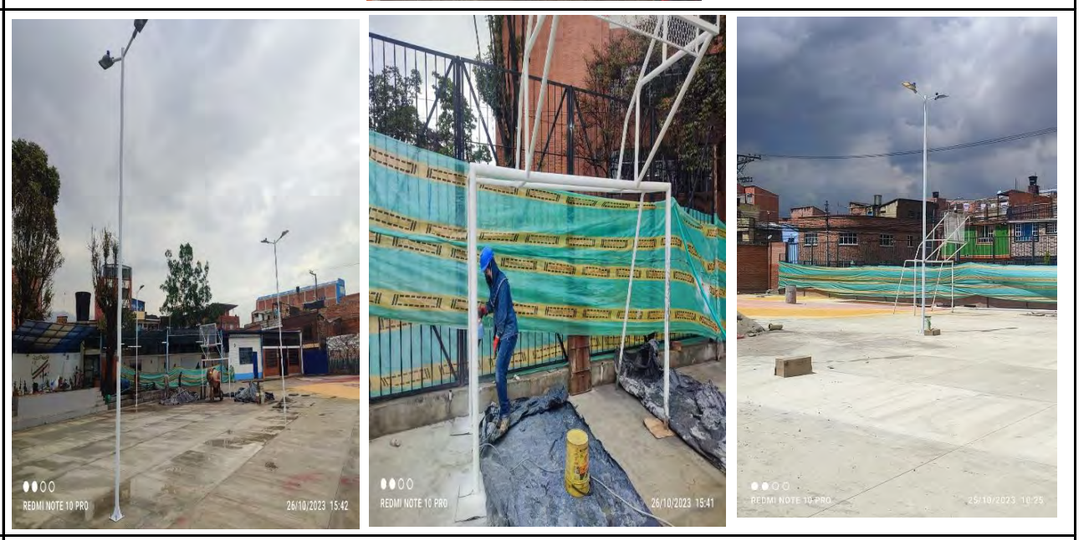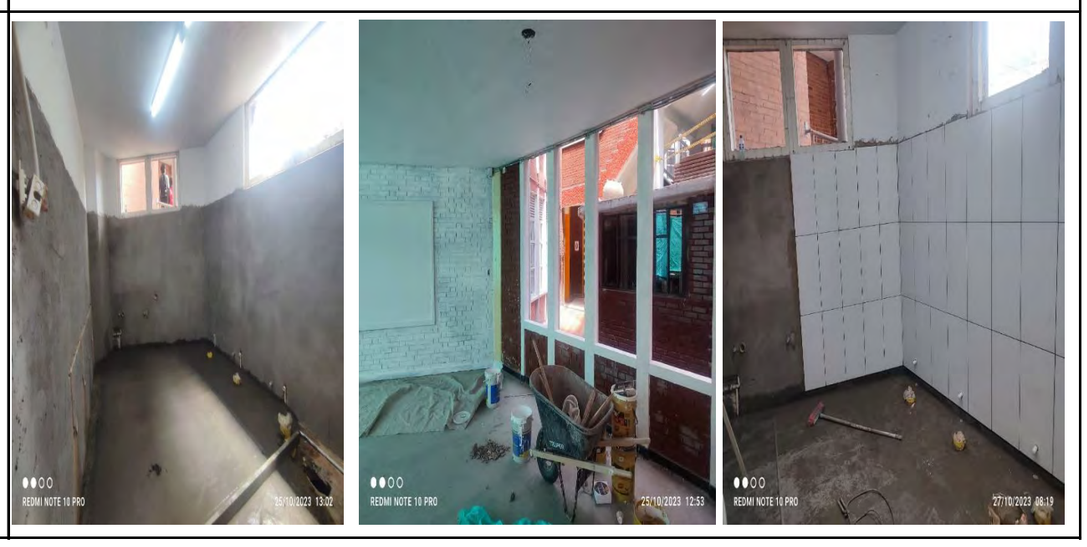No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**		
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**		No hubo avance en espera de liberación de nuevos espacios a intervenir.
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		



CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

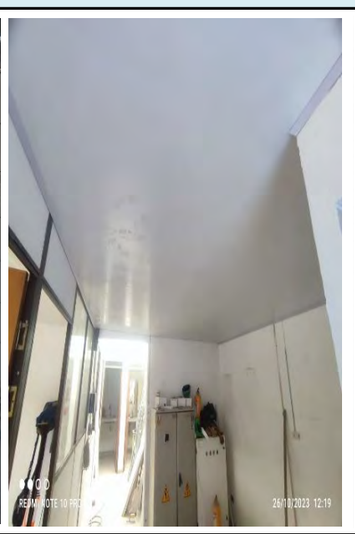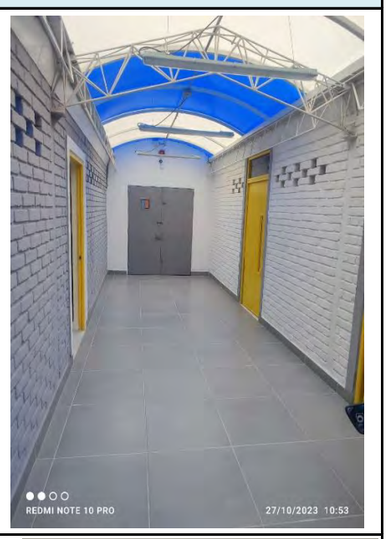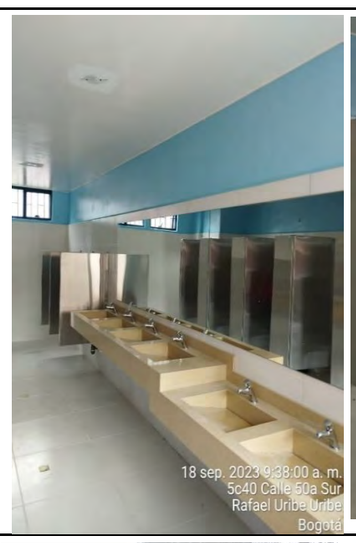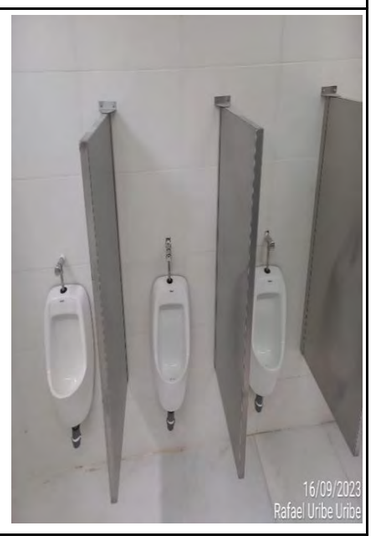No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D,GABRIELA MISTRAL**		  
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**		  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		No hubo avance por suspensión forzada del frente



CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

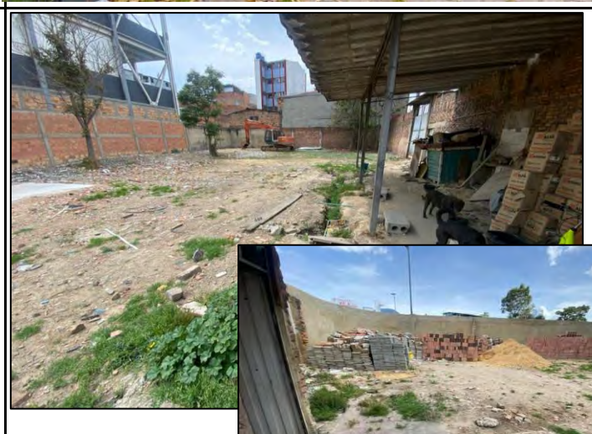No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  
25	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		  
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		  
29	**TALLER BICICLETERO**		  

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

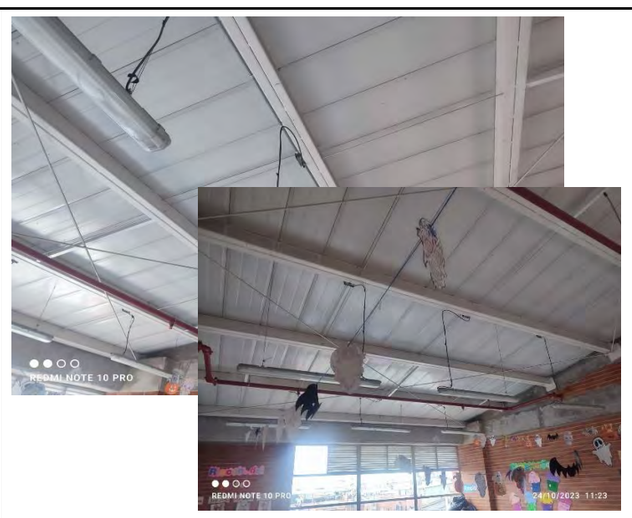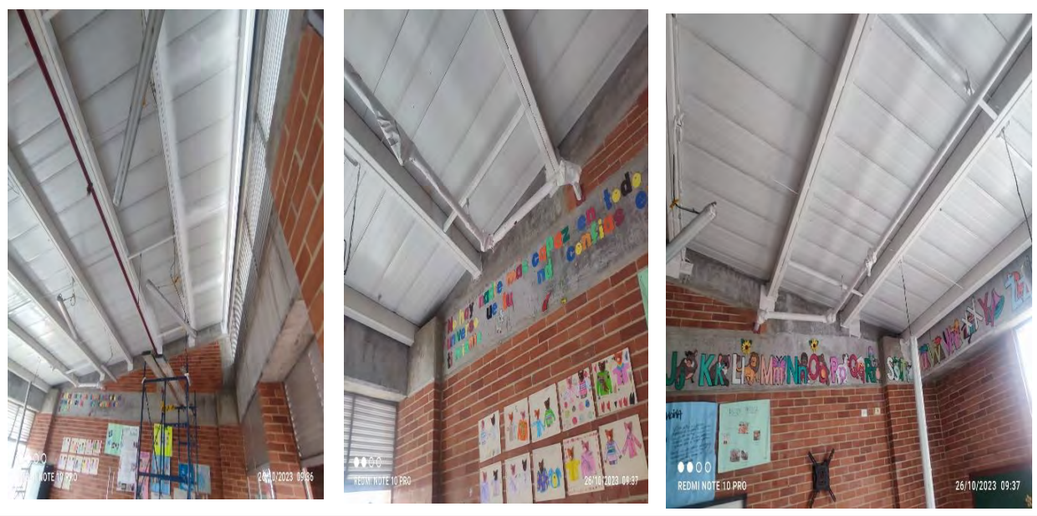29	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B**		

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-383

Bogotá, D.C, 31 de octubre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.9

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado y dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, se presenta informe mensual de interventoría No.9 correspondiente al periodo SEPTIEMBRE 20 DE 2023 A OCTUBRE 19 DE 2023. El cual contiene sus respectivos aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales establecidos en los pliegos de condiciones y establecido en el Manual Integrado de Contratación de la SED.

Sin otro particular.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Un (1) archivo PDF de 763 folios + dos (2) archivos comprimidos en WinRAR de 578 MB

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-384

Bogotá, D.C, noviembre 01 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 FE COLEGIOS FE Y ALEGRIA, RESTREPO MILLAN

Respetados señores:


En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Vladimiro Vasquez Arce	10.185.609	Ayudante	Fe y alegría
2	Dilan Esneider González Pinto	1.000.065.396	Ayudante	Fe y alegría
3	Jose Emilio Acevedo Gómez	457900	Ayudante	Restrepo Millán

CONSORCIO TIG

Sin otro particular,

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe
Anexo. Documentación del personal

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/10/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	331	31/10/2023	CC 10185609	VASQUEZ ARCE VLADIMIRO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

9F3CDF6F6EDBE30EE68E2DA419D2F81E Certificado impreso el día 10/30/2023 08:38:42 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VLADIMIRO
VASQUEZ ARCE
10185609
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 30/10/2023, el empleador JOSE JOAQUIN YANEZ VILLAMIZAR identificado con NIT número 13240346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5874915	30/10/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	10185609	VLADIMIRO VASQUEZ ARCE	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-10-30

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes de octubre del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

VLADIMIRO VASQUEZ ARCE, identificado(a) con cédula de ciudadanía **10.185.609**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 30 de Octubre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.065.396**

GONZALEZ PINTO

APELLIDOS

DILAN ESNEIDER

NOMBRES

Dilan Gonzalez

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-SEP-2002**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

25-SEP-2020 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1500150-01165092-M-1000065396-20200928 **00718**73977A 1 8500691698

Medellín, 29 de Octubre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de SINERGIA ELECTRO CIVIL SAS, en el centro de trabajo 0000000006 - PROYECTO , Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1000065396	GONZALEZ ESNEIDER DILAN PINTO	30/10/2023		59BD2197	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C633558942330285657

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/10/2023 23:47:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.238.182.103, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4011190783	2|9|1|0|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
B. Colectiva ☐
A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
B. Institucional ☐ B. De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
GONZALEZ (Primer apellido)	PINTO (Segundo apellido)	DILAN (Primer nombre)	ESNEIDER (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1000065396	Femenino ☐ Masculino ☒	1|9|0|9|2|0|0|2

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M — Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CR 4 A 53 53 SUR	3125902	3125902718	DILANGONZALEZ599@GMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana ☒ Rural ☐	57	BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo Femenino	27.Sexo Masculino	28.Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS SANTA LUCIA - UOD CPO SANTA LUCIA	VSLUCIA - UODCPOSLUC
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
SINERGIA ELECTRO CIVIL SAS	NIT	901323341	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CR 1 A 12 C 74 AP 202	7221411	SINERGIAELECTROCIVIL@GMAIL.COM	BOGOTA	BOGOTA

No de Radicacion
4011190783

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.**Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.**Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		3|0|1|0|2|0|2|3

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

☐ **56.**Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.**Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.**Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.**Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.**Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.**Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DILAN ESNEIDER GONZALEZ PINTO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.000.065.396**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 29 de Octubre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Cima IPS OCUPACIONAL
Celular. 301 547 3361
KR 77 # 33 A 06 SUR - KENEDY
Arptempor@gmal.com

MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL S.A.S
NIT 900889250



CERTIFICADO APTITUD LABORAL

Datos Generales **Historia No.** 2.045.842 **Fecha**: 2023-08-03 07:15

Documento: CC **1000065396** **Fecha Nacimiento: 19/09/2002** **Genero:** M **Edad:** 20 Años 10 Meses 14 Dias
Nombres: **DILAN ESNEIDER GONZALEZ PINTO**
Telefono: 3125902718 **Regimen:** Particular
Direccion: CRA 4 A 53 53 SUR **Ciudad:** BOGOTA D.C
Entidad: **SINERGIA ELECTRO CIVIL SAS**

Servicio: EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

Concepto

---- APTO ---- PARA REALIZAR EL CARGO.
----APTO----- PARA REALIZAR EL TRABAJO EN ALTURAS.

EL CONCEPTO DE APTITUD SE DEFINIÓ A PARTIR DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

* EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL.
* OSTEOMUSCULAR: CONSERVADO 5/5
  FUERZA MUSCULAR: CONSERVADA
  EQUILIBRIO: CONSERVADO
* GLICEMIA, PERFIL LIPIDICO.
* AUDIOMETRIA: CONSERVADA
* VISIOMETRIA: CONSERVADA 20/20 CARGO: AUXILIAR ELECTRICO

Recomendacion

1. CAPACITACION EN EJECUCION SEGURA DE SUS TAREAS.
2. HABITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES.
3. AUTOCUIDADO.
4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMIA).
5. PAUSAS ACTIVAS.
6. USAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP).
7. CUIDADO, HIGIENE, PROTECCION AMBENTAL Y RESPIRATORIA.
8. LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, ASI COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDEMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE.
9. HACER DIETA

Observaciones

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

FIRMA PACIENTE: _____

.



Profesional OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETE
Registro Lic. SST 2552 **Especialidad** .Otro MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA LABORAL

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-12, 06:36:09 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66328002

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 12/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	LOMBARDIA	**Código Sucursal**	MIAGP
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	28
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 457900	ACEVEDO GAMEZ JOSE EMILIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 3199270	GONZALEZ GIRAL HECTOR ORLANDO	01	00	X															0	12	12	12	12	PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	EPS SANITAS	$ 464.000	$ 18.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 464.000	$ 32.300	COMPENSAR CCF	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 9528919	RODRIGUEZ JOSE OLIVERIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 12401837	ELLES CENTENO DELKINSON	01	00	X															0	2	2	2	2	PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	SALUD TOTAL EPS	$ 77.334	$ 3.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 77.334	$ 5.400	COMPENSAR CCF	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 41710581	GARZON BEJARANO MARIA CECILIA	01	04																0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.600
CC 71240447	ORTEGA BERMEJO PABLO ANDRES	01	00	X															0	25	25	25	25	COLFONDOS	$ 966.667	$ 154.700	NUEVA EPS	$ 966.667	$ 38.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 966.667	$ 67.300	COMPENSAR CCF	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400
CC 79526595	MARTINEZ ARENAS HONORIO	01	00	X															0	20	20	20	20	PROTECCION	$ 773.334	$ 123.800	FAMISANAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 79650369	PEREZ AVILA ALBINO	01	00	X															0	2	2	2	2	COLFONDOS	$ 77.334	$ 12.400	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 77.334	$ 3.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 77.334	$ 5.400	COMPENSAR CCF	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 79809666	HUIZA GUATAVITA JOSE YESID	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79909768	GUTIERREZ LOPEZ FRANCHESCO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1007848544	GAMARRA CASSIANI JUAN DAVID	01	00	X															0	9	9	9	9	PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	FAMISANAR EPS	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 1019020468	ALVARADO HERNANDEZ CARLOS ANDRES	01	00	X															0	26	26	26	26	PROTECCION	$ 1.005.334	$ 160.900	COMPENSAR EPS	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1020716312	ESTRADA GONZALEZ JULIAN ORLANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023950419	GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023967457	GOMEZ MOYANO JUAN SEBASTIAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1027521715	QUIROGA GOMEZ JORGE STIVEN	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1042423098	SIERRA OLIVERA CARLOS JULIO	01	00	X															0	2	2	2	2	PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	FAMISANAR EPS	$ 77.334	$ 3.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 77.334	$ 5.400	COMPENSAR CCF	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1047373973	PACHECO BERMUDEZ ARQUIMEDES JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1052996403	DIAZ SAMPAYO JOSE EVARISTO	01	00	X															0	25	25	25	25	PORVENIR	$ 966.667	$ 154.700	FAMISANAR EPS	$ 966.667	$ 38.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 966.667	$ 67.300	COMPENSAR CCF	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400
CC 1068663318	ARGUMEDO ORTEGA JUAN JAVIER	01	00	X															0	9	9	9	9	PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	FAMISANAR EPS	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 1079655911	LOBO CERPA FEDERICO ANTONIO	01	00	X															0	9	9	9	9	PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	FAMISANAR EPS	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1129805469	ESTRADA ORTIZ RONALDO DE JESUS	01	00	X															0	2	2	2	2	PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	SALUD TOTAL EPS	$ 77.334	$ 3.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 77.334	$ 5.400	COMPENSAR CCF	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 22.929.338	$ 24.089.338	$ 24.089.338	$ 24.089.338	$ 3.669.100	$ 0	$ 0	$ 964.100	$ 1.678.100	$ 964.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.275.400	$ 8.000	$ 7.283.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-385

Bogotá, D.C, 01 de noviembre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: NANCY GUAYABO RODRÍGUEZ
Profesional Universitario – Oficina de contratos
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Actualización de pólizas según modificación No.1 al contrato de interventoría

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado y dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, esta interventoría se permite remitir la actualización de la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, específicamente con el anexo 3, para su revisión y concepto.

Se anexa imagen que sustenta que dicha póliza fue subida al SECOP II y está a la espera de los comentarios.

Sin otro particular.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Cuatro (4) folios

CONSORCIO TIG



DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía	CO1 WRT 11661602
Referencia de la garantía	21-44-101402266 ANEXO 3
Estado	Pendiente
Justificación	Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Calidad del servicio
Tipo de garantía	Contrato de seguro Patrimonio autónomo Garantía bancaria
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S A
Número de póliza	21-44-101402266
Tomador	CONSORCIO TIG
Beneficiario	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Pago de salarios	62.507.298,35 COP	3/01/2027 11:59:00 PM
Cumplimiento - Calidad del servicio	250.029.145,40 COP	3/01/2029 11:59:00 PM

	Descripción	Nombre del documento	
☐	DLF052857C_POLIZA_21_44_101402266_20230508033609 anexo 3 (2).pdf	DLF052857C_POLIZA_21_44_101402266_20230508033609 anexo 3 (2).pdf	Descargar

Creado por: [redacted] 11/05/2023 4:52 PM

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101402266**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**05**	**2023**	**03**	**01**	**2023**	**00:00**	**03**	**01**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO TIG		**NIT: 901.649.890-3**
DIRECCIÓN: CR 47 A NRO. 93 - 41	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3112004626

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: AV DORADO NRO. 66 - 63	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**03/01/2023**	**04/07/2024**	**$250,029,145.40**	**$175,717,587.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**03/01/2023**	**03/01/2027**	**$62,507,286.35**	**$43,929,396.90**
CALIDAD DEL SERVICIO	**03/01/2024**	**03/01/2029**	**$250,029,145.40**	**$175,717,587.60**

ACLARACIONES

MEDIANTE ELPRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA SUMA ASEGURADA DE LOS AMPAROS SEGUN MODIFICACION CONTRACTUAL No. 1 EN EL CUAL SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO $ 371.557.789,00 QUEDANDO COMO NUEVO VALOR DEL CONTRATO $ 1.250.145.727.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS PERMANECEN EN LAS MISMAS CONDICIONES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,157,387.00	$ *******8,000.00	$ *****221,423.00	$ *********1,386,810.00	$ ******562,565,577.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101402266

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101402266	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	05	2023	03	01	2023	00:00	03	01	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO TIG		**NIT: 901.649.890-3**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 47 A NRO. 93 - 41		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3112004626

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV DORADO NRO. 66 - 63		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GES INVERSIONES S.A.S	901085973-4	30.00
INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S.	901158110-1	30.00
TOTALL SAS	901384670-0	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101402266

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101402266, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 08 días del mes de MAYO de 2023

21-44-101402266

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-386

Bogotá, D.C, 07 de noviembre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Remisión de APU's no previstos NP29, NP45 y NP49 para revisión

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite remitir para revisión por parte de la supervisión, los APU's no previstos NP41, NP45 y NP49 y que cuentan con la siguiente descripción, a saber:

- NP-29 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE: 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A; 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100A RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 400A CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA SU CONEXIÓN.

- NP-45 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO 1(209.5*101) ; (202*80.8) ; (201.5*99.9) EN TUBULAR 1102 ENCHAPE, PISA

VIDRIO PLANO Y CHAPA YALE, E25 BISAGRAS EN ALUMINIO CON MARCO EN CANAL DE 3 POR 1.

- NP-49 - ACOMETIDA PRINCIPAL DE TGA A TABLERO TOMAS 3No4+1No6+1No10 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR AULAS DE BACHILLERATO Y SISTEMAS - COLEGIO RESTREPO MILLÁN - SEDE D

Dichas actividades no previstas están previamente aprobadas por parte de interventoría y cuentan con los respectivos soportes requeridos para su revisión.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Anexo Treinta y siete (37) folios

CONSORCIO TIG

NP-29

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	2220554	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	17/03/2022	**FECHA TERMINACIÓN**	16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE: 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A; 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100A RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 400A CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA SU CONEXION	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	275.000,00	13.750,00
				SUBTOTAL	**13.750,00**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
TABLERO DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE: 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A; 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100A RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 400A CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA SU CONEXION	UN	1,00	$ 5.593.000,00	$ 5.593.000,00
			SUBTOTAL	**5.593.000**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					-
				SUBTOTAL	**-**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	2,00	275.000,00
				SUBTOTAL	**275.000,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 5.881.750,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 1.658.065,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 7.539.815,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los VEINTE (20) dias del mes de octubre del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.

Nombre: Mateo Luzardo Villamizar

REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: E. RICARDO DUARTE

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP 29- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE: 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A; 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100ª RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 400A CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA SU CONEXION

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

La habilitación de 49 aulas adicionales en el IED FE Y ALEGRIA, y de la sala de sistemas y áreas de profesores en el IED RESTREPO MILLAN SEDE D, requiere de adecuaciones eléctricas los cuales una vez realizados los cálculos eléctricos generaron como resultado la necesidad instalar tableros de distribución que contienen 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A; 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100ª RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 400A CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA CONEXIÓN , en cumplimiento de los lineamientos normativos, técnicos y constructivos soportados en lo exigido por el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, además de las diferentes normas exigidas por el operador de red local Codensa; el proyecto busca establecer los parámetros de diseño para circuitos de tomacorrientes e iluminación en baja tensión y la inclusión del análisis necesario para la acometida principal en baja tensión.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-29- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE: 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A; 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100A RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 400A CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA SU CONEXION

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE: 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A; 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100ª RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 400A CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA SU CONEXIÓN, de acuerdo con diagramas unifilares establecidos en los IED.

EJECUCIÓN:

- Verificar planos eléctricos
- Verificar diámetros y materialidad de tubería
- Realizar el tendido de los conductores dentro de la tubería, cuidando la integralidad de los conductores evitando peladuras en los mismos
- Verificar medidas de vanos o muros en donde serán empotrados o sobrepuestos los tableros
- Verificar el armado interno y ensamble de protecciones, barrajes etc.
- Empotrar o sobreponer el elemento verificando tubería de entrada y de salida.
- Realizar el ensamble de los elementos del tablero con las acometidas de ingreso y salida.
- Realizar las pruebas de conductividad y poner a prueba las protecciones.

MATERIALES:

- **TABLERO DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE: 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A; 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100ª RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 400A CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA SU CONEXION**

EQUIPOS:

- **Herramienta Menor (% M.O)**

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION QUE CONTIENE: 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A; 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100ª RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 400A CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA SU CONEXION,** recibidos a satisfacción por la interventoría.



Cotización

No. C-1-733

CONTROLES Y AUTOMATISMOS SL SAS
NIT 901.299.834-8
calle 17 # 12-64
Tel: (135204433228662620)
Bogotá - Colombia

Para	PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERA SAS
Nit	901.531.834-2
Contacto	. .
Dirección	CR 18 60C 13 SUR
Ciudad/Tel.	Bogotá / (000) 3143826320 - Ext. 000 - (00) 3143826320
Fecha	2023-10-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA STECK QUE CONTIENE: 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100A RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 400A CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA SU CONEXION	1.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0 %	5,712,000.00

Total Bruto	4,800,000.00
Subtotal	4,800,000.00
IVA 19%	912,000.00
Total a Pagar	5,712,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FERNANDO SUAZA
controlesyautomatismossl@gmail.com
(3112471468)
(3112471468)

PROYECTOS LÓGICOS INDUSTRIALES

COTIZACION PARA:

3208792092
ANDRESMURCIA092@GMAIL.COM
CALLE 14 #12-65 LOCAL 103 BOGOTA D.C

PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS

NIT 901531834-2

Fecha de la cotizacion: 31/10/2023

	Descripción	Precio por unidad	Total de línea
1	TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA QUE CONTIENE: 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100A RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 400A CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA SU CONEXION	$ 4.600.000	$ 4.600.000
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
		Subtotal	$ 4.600.000
		IVA	$ 874.000
			$ 5.474.000

Gracias por su confianza



AUTOMATIZACION INDUSTRIAL J.H. S.A.S.

J.H. S.A.S

MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL

900261594-7

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752-RESOLUCION DIAN No. 18763000638825-FECHA:24/09/2019 AL 24/09/2021-HABILITACION 1 HASTA 1.000

Telemecanique SIEMENS STECK legrand LG

Calle 17 No. 12 - 36 Tel: 283 0542 Cel: (311)5043391 Bogotá, D.C.

COTIZACION 000774

NIT	901531834-2
CLIENTE	PROCASA CONSTRUCCIO E INGENIERIA SAS
DIRECCION	CR 18 60 C 13 S
TELEFONO	3143826320
CIUDAD	DIRECCION DEL CLIENTE

FECHA EMISÍON			FECHA VENCE		
|31|10|2023|			|31|10|2023|		
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**

VENDEDOR

JUAN CARLOS LAGOS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
JHE-1083	COFRE 1200X800X300 FRENTE MUERTO CERTIFICADO	1,00	890.000,00	890.000,00
CTD04	BREAKER INDUSTRIAL SCHNEIDER DE 3 X 400 AMP CERTIFICADO	1,00	1.250.000,00	1.250.000,00
BG004	BREAKERS DE 3 X 80 A 100 AMP GRADUABLE SCHNEIDERS	4,00	355.000,00	1.420.000,00
2003	BARRAJE DE 400 AMP EN COBRE	1,00	398.000,00	398.000,00
2024	BARRAJE DE 125 AMP COBRE BREAKERS DE 100	1,00	290.000,00	290.000,00
2007	BARRAJE DE NEUTRO-TIERRA	1,00	150.000,00	150.000,00
2008	PLACA DE CERTIFICACION ,DOCUMENTOS DE PLACA	1,00	450.000,00	450.000,00
024	ARMADO DE TABLERO DE DISTRIBUCCION	1,00	350.000,00	350.000,00

FIRMA _____

Observaciones

DESCUENTO %	0,00	**FLETE**	0,00	**SUBTOTAL**	4.368.067,23
DESCUENTO $	0,00	**M. DE PAGO**	Contado	**IMPUESTO**	829.932,77

TOTAL A PAGAR

5.198.000,00

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA STECK QUE CONTIENE: 1. BREAKER TOTALIZADOR REGULABLE DE 320A 4. BREAKER REGULABLES DE 80 A 100A RESERVAS NO EQUIPADAS BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE 40DA CODIGO DE COLORES Y PROTECCION ACRILICA EN UN COFRE DE 90X90X25 CON FRENTE MUERTO EN LAMINA COLL ROLL PINTURA ELECTOSTATICA Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO CERTIFICADO LISTO PARA SU CONEXION	UN	$ 5.712.000	CONTROLES Y AUTOMATISMOS SAS	5.474.000,000	PROYECTOS LOGICOS INDUSTRIALES	$ 5.198.000	AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	$ 5.461.333	$ 257.234	$5.718.567	$5.204.099	$ 5.712.000	5474000,00		$ 5.593.000

CONSORCIO TIG

NP-45

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	2220554	**DE**	2022	**FECHA INICIO**	17/03/2022	**FECHA TERMINACIÓN**	16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO 1(209.5*101) ; (202*80.8) ; (201.5*99.9) EN TUBULAR 1102 ENCHAPE, PISA VIDRIO PLANO Y CHAPA YALE, E25 BISAGRAS EN ALUMINIO CON MARCO EN CANAL DE 3 POR 1.	UN	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	88.377,00	4.418,85
				SUBTOTAL	**4.419,00**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
PUERTA EN ALUMINIO 1,50 X 2,50 EN TUBULAR 1102 ENCHAPE, PISA VIDRIO PLANO Y CHAPA YALE, E25 BISAGRAS EN ALUMINIO CON MARCO EN CANAL DE 3 POR 1.	und	1,00	$ 1.590.000,00	$ 1.590.000,00
			SUBTOTAL	**1.590.000**

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	**-**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial carpinterías	JORNAL	52,13%	68.333	0,50	34.166,50
Oficial carpinterías	JORNAL	52,13%	108.421	0,50	54.210,43
				SUBTOTAL	**88.377,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.682.796,00**
AIU CONTRACTUAL	**28,19%**			**TOTAL COSTO INDIRECTO**	**$ 474.380,00**
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 2.157.176,00**
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**$ -**

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los cuatro dias (04) días, del mes de noviembre del año 2023

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-45- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO (209.5*101) ; (202*80.8) ; (201.5*99.9) EN TUBULAR 1102 ENCHAPE, PISA VIDRIO PLANO Y CHAPA YALE, E25 BISAGRAS EN ALUMINIO CON MARCO EN CANAL DE 3 POR 1.

UNIDAD: UN

JUSTIFICACIÓN:

En el área de laboratorios existen espacios internos dispuestos para almacenamiento de materiales que requieren ser cerrados, se asegurarán los espacios mediante instalación de puertas en aluminio de (209.5*101) ; (202*80.8) ; (201.5*99.9) *tubular 1102 enchape, pisa vidrio plano y chapa yale con bisagra en aluminio con marco en canal de 3 x 1.*

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-45- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO (209.5*101) ; (202*80.8) ; (201.5*99.9) EN TUBULAR 1102 ENCHAPE, PISA VIDRIO PLANO Y CHAPA YALE, E25 BISAGRAS EN ALUMINIO CON MARCO EN CANAL DE 3 POR 1.

UNIDAD: UN

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el **SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO (209.5*101) ; (202*80.8) ; (201.5*99.9) EN TUBULAR 1102 ENCHAPE, PISA VIDRIO PLANO Y CHAPA YALE, E25 BISAGRAS EN ALUMINIO CON MARCO EN CANAL DE 3 POR 1.**

EJECUCIÓN:

- Verificar plomos y niveles en vanos
- Verificar medidas de marcos de puerta
- Instalar marco verificando que quede completamente a plomo y a nivel, ajustarlo con chazo al muro del vano
- Instalar puerta verificando adecuado cierre, plomo y nivel de la misma
- Instalar chapas y cantoneras verificando adecuado cierre y funcionamiento de llaves.

MATERIALES:

- **PUERTA EN ALUMINIO (209.5*101) ; (202*80.8) ; (201.5*99.9) EN TUBULAR 1102 ENCHAPE, PISA VIDRIO PLANO Y CHAPA YALE, E25 BISAGRAS EN ALUMINIO CON MARCO EN CANAL DE 3 POR 1.**

EQUIPOS:

- PULIDORA
- HERRAMIENTA MENOR

TRANSPORTE:

- Furgón.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **UNIDAD (UN) DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO (209.5*101) ; (202*80.8) ; (201.5*99.9) EN TUBULAR 1102 ENCHAPE, PISA VIDRIO PLANO Y CHAPA YALE, E25 BISAGRAS EN ALUMINIO CON MARCO EN CANAL DE 3 POR 1,** recibidos a satisfacción por la interventoría.

VIDRIOS Y ALUMINIOS
LUIS FERLEY CRUZ REYES
C.C 1.121.846.956.

PROPUESTA COMERCIAL # 12

14 de Septiembre 2023

Señores:
CONSORCIO MÍA GP
Ciudad

Por medio de la presente, me permito enviar la propuesta comercial para los elementos relacionados.:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD
PUERTA EN ALUMINIO DIMENSIONES (209.5*101) ; (202*80.8) ; (201.5*99.9) EN TUBULAR 1102 ENCHAPE, PISA VIDRIO PLANO Y CHAPA YALE, E25 BISAGRAS EN ALUMINIO CON MARCO EN CANAL DE 3 POR 1.	**$ 1.580.000**

FORMA DE PAGO. 60% al inicio y 40% a la entrega.

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN. 15 días hábiles.

Cordialmente,

Luis Ferney Cruz Reyes
C.C. 1.121.846.956.
Cel. 305 925 9469

ALUVIDRIOS

Fusagasugá, 14 de septiembre de 2023

Señores
CONSORCIO MIA GP
Ciudad

REF. COTIZACIÓN A TODO COSTO

Con la presente me permito disponer a su atención cotización a todo costo de suministro de PUERTAS EN ALUMINIO DIMENSIONES (209.5*101) ;(202*80.8) ; (201.5*99.9) en tubular 1102 enchape, pisa vidrio plano y chapa YALE E25 bisagras en aluminio con marco en canal de 3 por 1.

VALOR X UNIDAD DE PUERTA= $1.600.000
VALOR TOTAL OFERTA = $ 4.800.000

Forma de Pago: 60% al Iniciar y 40% a contra entrega.

De antemano agradezco su pronta y favorable respuesta.

Atentamente,

Luis Omar Zamudio
C.C 11.524.197
Cel. 3202458501

HACER ACEROS LG

MANUFACTURAS EN ACERO INOXIDABLE

BOGOTA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Señores.

CONSORCIO MIA GP

Consultorio / espacio	Medidas	Observación	Valor
LABORATORIOS LICEO FEMENINO	209.5*101 202*80.8 201.5*99.9	**PUERTA EN ALUMINIO (209.5*101); (202*80.8) ; (201.5*99.9) EN TUBULAR 1102 ENCHAPE, INCLUYE PISA VIDRIO PLANO Y CHAPA YALE, E25 BISAGRAS EN ALUMINIO CON MARCO EN CANAL DE 3 POR 1**	$1.710.000

NO ASUMIMOS RETENCIONES NI IVA YAQUE SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO, EN CASO DESER NECESARIO SE AUMENTARIA AL TOTAL.

Garantía de un año por defectos de fabricación
La fecha de entrega está sujeta a lo pactado con el cliente al momento de llegar a un acuerdo de trabajo.

Los precios son netos pues HACER ACEROS LG es régimen simplificado, para el pago se envía cuenta de cobro y se adjunta RUT y cámara de comercio de ser necesario.

El trabajo se inicia con un abono del 60% y el otro 40% se cancela al momento de la entrega.

Cra. 27 No. 8-80 telefax: 5601389
- E-mail: haceraceroSlg@hotmail.com - Bogotá D.C. Colombia

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	PUERTA EN ALUMINIO (209.5*101); (202*80.8) ; (201.5*99.9) EN TUBULAR 1102 ENCHAPE, INCLUYE PISA VIDRIO PLANO Y CHAPA YALE, E25 BISAGRAS EN ALUMINIO CON MARCO EN CANAL DE 3 POR 1	UN	$ 1.580.000	LUIS FERLEY CRUZ	1.600.000,000	ALUVIDRIOS	$ 1.710.000	HACER ACEROS LG	$ 1.630.000	$ 70.000	$1.700.000	$1.560.000	$ 1.580.000	1600000,00		$ 1.590.000

CONSORCIO TIG

NP-49

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	FMI038
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-05-22

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220554 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 17/03/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 16/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR: CONSORCIO TIC
SUPERVISOR: ARQ. ALEXANDER OSORIO

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP 49	ACOMETIDA PRINCIPAL DE TGA A TABLERO TOMAS 3No4+1No6+1No10 según diagrama unifiar aulas de bachillerato y sistemas - Colegio Restrepo millan - Sede D	ml	

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor (% M.O)			5%	5.500,00	275,00
Equipo de trabajo en alturas certificado (alquiler)		dia	17.000,00	0,05	850
				SUBTOTAL	1.125,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cable THHN/THWN C.4 AWG Cu -2 CT 600V	ml	3,15	$ 19.872,00	$ 62.596,80
Cable THHN/THWN C.6 AWG Cu -2 CT 600V	ml	1,05	$ 9.791,00	$ 10.280,55
Cable THHN/THWN C.10 AWG Cu -2 CT 600V	ml	1,05	$ 5.024,00	$ 5.275,20
			SUBTOTAL	78.153

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					-
				SUBTOTAL	-

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla AA- Obra civil (ofc+ayud)	JORNAL	52,13%	137.500	0,04	5.500,00
				SUBTOTAL	5.500,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 84.778,00
AIU CONTRACTUAL 28,19%				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 23.899,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 108.677,00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, a los vente (20) dias del mes de octubre del año 2023.

Firma: Mateo Luzardo V.
Nombre: Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: E. RICARDO DUARTE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-49- ACOMETIDA PRINCIPAL DE TGA A TABLERO TOMAS 3No4+1No6+1No10 según diagrama unifilar aulas de bachillerato y sistemas - Colegio Restrepo Millán - Sede D

UNIDAD: ML

JUSTIFICACIÓN:

Las instalaciones actuales existentes en el IED RESTREPO MILLAN SEDE D, requieren de acondicionamiento eléctrico para dar cumplimiento a las solicitudes de carga actuales, por lo cual se requirió de un diseño eléctrico para dar cumplimiento de los lineamientos normativos, técnicos y constructivos soportados en lo exigido por el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, además de las diferentes normas exigidas por el operador de red local Codensa; el proyecto busca establecer los parámetros de diseño para circuitos de tomacorrientes e iluminación en baja tensión y la inclusión del análisis necesario para la acometida principal en baja tensión.

Este diseño contempla una ACOMETIDA PRINCIPAL DE TGA A TABLERO TOMAS 3No4+1No6+1No10 según diagrama unifilar aulas de bachillerato y sistemas, los cuales no se encuentran incluidos dentro del presupuesto contractual y deben ser incorporados dentro del mismo para su ejecución.

IED RESTREPO MILLAN
SEDE B

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:	IED RESTREPO MILLAN
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:	CALLE 41 SUR #26-20 SEDE B
MUNICIPIO/DEPARTAMENTO:	BOGOTA/CUNDINAMARCA
ESTRATO:	3
OBJETO DEL PROYECTO:	REMODELACION INSTALACIONES ELECTRICAS
TENSION:	208/120 V

1.2 OBJETO DEL PROYECTO

La información considerada en el presente proyecto, consta de los lineamientos normativos, técnicos y constructivos para la ejecución de la remodelación de la instalación eléctrica de la Institución Educativa Distrital Restrepo Millán, su estructura se basa en lo exigido por el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, además de las diferentes normas exigidas por el operador de red local Codensa; el proyecto busca establecer los parámetros de diseño para circuitos de tomacorrientes e iluminación en baja tensión y la inclusión del análisis necesario para la acometida principal en baja tensión.

1.3 ANTECEDENTES Y GENRALIDADES

El presente proyecto está ubicado en la ciudad de Bogotá DC, departamento de Cundinamarca - Colombia, en la calle 41 sur # 26-20. Aquí se encuentra la institución Restrepo Millán Sede A.

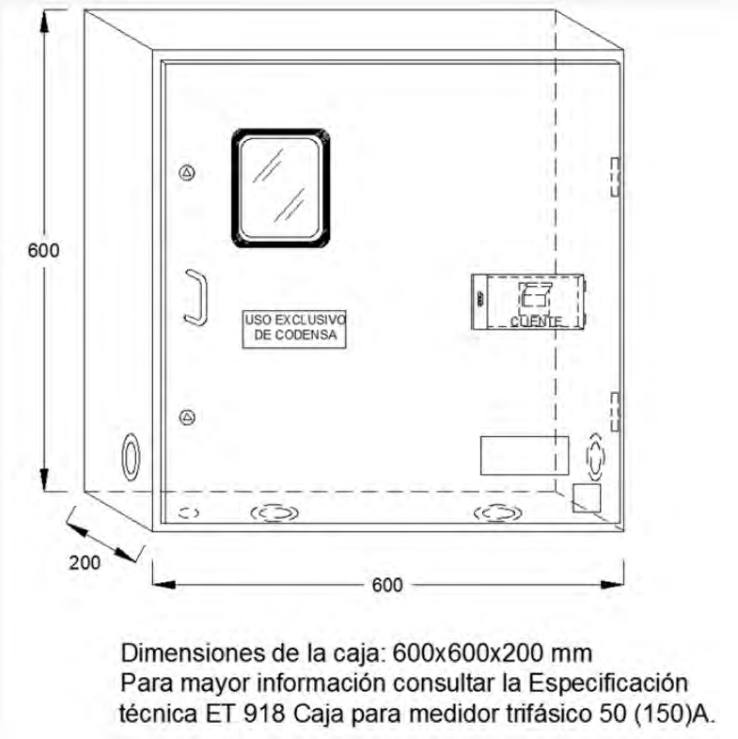
El presente proyecto comprende la remodelación de las acometidas de los tableros de la sede de primaria y bachillerato

1.4 CRITERIOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE

- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE resolución No. 9-0708 de agosto 30 de 2013
- Norma Técnica Colombiana NTC 2050 (CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO 25 de noviembre de 1998)
- Resolución 070 de la CREG
- Ley 142 de servicios públicos domiciliarios
- Criterios de diseño del ingeniero a cargo del proyecto
- Norma IEEE 80 (IEEE Guide For Safety In AC Substation Grounding)


2. CAMBIO DE ACOMETIDAS PRINCIPALES

Se contempla la remodelación de gabinete de medida existente por aumento de carga a 30 kW se contempla una acometida de 3x4+4+8T para esta carga. El gabinete utilizado es tipo AE305 de acuerdo a lo exigido por el operador de red para esta capacidad en la carga trifásica.




Dimensiones de la caja: 600x600x200 mm
Para mayor información consultar la Especificación técnica ET 918 Caja para medidor trifásico 50 (150)A.

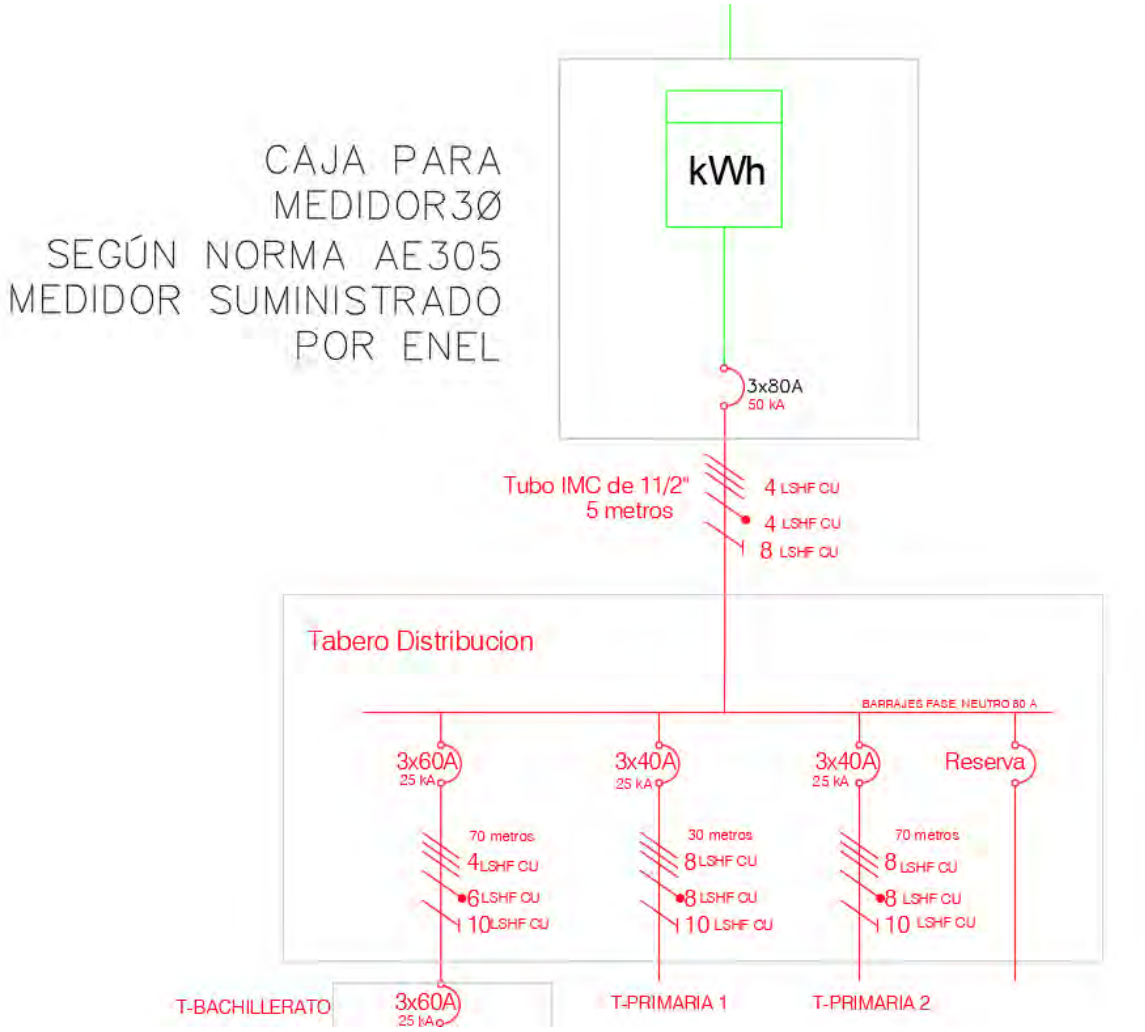Adicional se plantea instalar un gabinete principal para la distribución de las acometidas existentes dentro de esta sede, el cual se presenta a continuación. El gabinete se compone de dos interruptores termo magnéticos tripolares de 3x40 A y uno de 3x60 A, para el cable de la acometida para las cargas del bloque de bachillerato se tiene previsto cable tipo antifraude, y para las acometidas de primaria se contempla cable encauchetado.



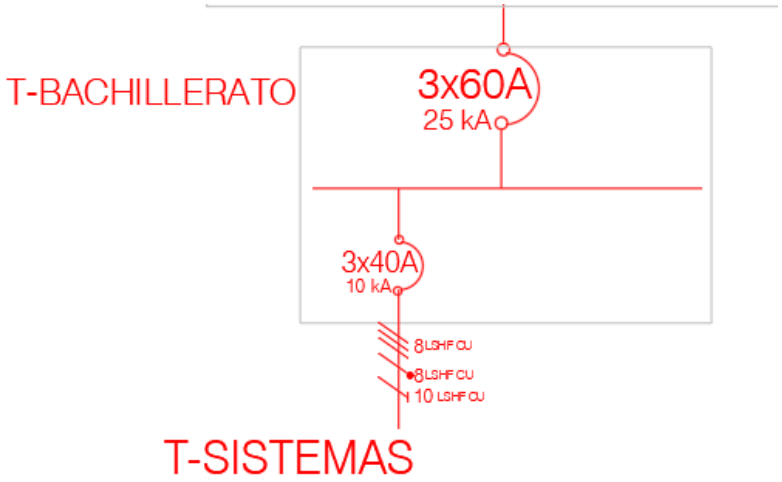Se plantea conectar y realizar modificación de las instalaciones eléctricas del aula de clase de sistemas el cual contempla la conexión de un alimentador desde el tablero del primer piso ubicado en la zona de bachillerato en cable No 8 como se muestra en el siguiente esquema.



A. ANALISIS DE RIESGO ELECTRICO Y MEDIDAS PARA MITIGARLO

En general la utilización tanto industrial como domestica de la energía eléctrica ha traído consigo la aparición de accidentes por contacto con elementos energizados o incendios, los cuales se han incrementado por el aumento del número de instalaciones, principalmente en la distribución y el uso final de la electricidad. El resultado final del paso de una corriente eléctrica por el cuerpo humano puede predecirse con un gran porcentaje de certeza, si se toman ciertas condiciones de riesgo conocidas y se evalúa en que medida influyen todos los factores que se conjugan en un accidente de tipo eléctrico. Por tal razón el personal que intervenga en una instalación, en función de las características de la actividad, proceso o situación, debe aplicar las medidas necesarias para que no se potencialice un riesgo de

En concordancia con el artículo 9.1 del RETIE se debe tener en cuenta que los umbrales de so portabilidad en los seres humanos, tales como el de paso de corriente (1,1mA), de reacción a soltarse (10mA) y de rigidez muscular o fibrilación (25mA) son valores muy bajos; la superación de dichos valores puede ocasionar accidentes como la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo humano. Se debe tener en cuenta criterios de so portabilidad eléctrica en seres humanos tomados de la norma NTC 4120 con referent0e IEC 60479-2 en el que se detallan los efectos de la corriente alterna de 15hZ a 100Hz.

El umbral de fibrilación ventricular depende de parámetros fisiológicos y eléctricos, por ello se ha tomado la curva C1 como límite de diseño para equipos de protección. Los valores umbrales de corriente en menos de 0,2 segundos se aplican sola mente durante el periodo vulnerable del ciclo cardiaco.

Nombre	Yanicio Ovalle Saavedra
MP	CN205-99358
Fecha	Junio de 2023

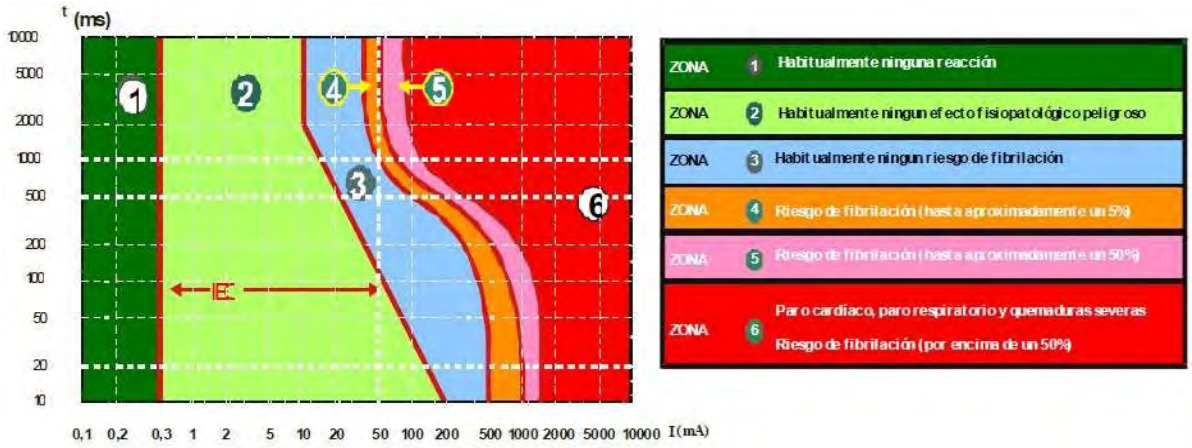


Figura 9.1 RETIE. Zonas de tiempo/corriente de los efectos de las corrientes alternas de 15Hz a 100Hz

En consideración al nivel de tensión asignado se determina que las protecciones y aislamiento se encuentran operando en la zona 6 (paro cardiaco, paro respiratorio y quemaduras severas, riesgo de fibrilación por encima

del 50%) en virtud de esto se determina que los tableros a instalar en las sedes de uso particular pertenecientes a la institución tienen contempladas las medidas apropiadas para minimizar el riesgo de uso de la electricidad.

Los espacios destinados a albergar los tableros de distribución contemplan las distancias de seguridad y señalización exigidas restringiendo el acceso a personas no autorizadas o no capacitadas.

De acuerdo con el artículo 9.2 del RETIE , se aplica la matriz de riesgos propuesta en la tabla 9.3 y tabla 9.4 siguiendo la metodología propuesta para cada tipo de riesgo en el artículo 9.2.1

RIESGO A EVALUAR:		por		(al) o (en)					
		EVENTO O EFECTO (Ej: Quemaduras)		FACTOR DE RIESGO (CAUSA) (Ej: Arco eléctrico)		FUENTE (Ej: Celda de 13,8 kV)			
POTENCIAL ☐			REAL ☐			FRECUENCIA			
						E	D	C	B	A
	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la Empresa	Sucede varias veces al año en la Empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
CONSECUENCIAS	Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional.	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, Salida de Subestación	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	Incapacidad temporal (>1 día)	Daños severos. Interrupción temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños Importantes. Interrupción breve	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral)	Daños leves, No interrupción	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO
Evaluador: _____				MP: _____		Fecha: _____				

Tabla 9.3 Matriz para análisis de riesgos




De acuerdo al artículo 9.2.1 con el fin de evaluar el nivel de riesgo de tipo eléctrico, se puede aplicar la matriz de la tabla 9.3, siguiendo la siguiente metodología:

Definir el factor de riesgo que se quiere evaluar o categorizar.

COLOR	NIVEL DE RIESGO	DECISIONES A TOMAR Y CONTROL	PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
	Muy alto	***Inadmisible para trabajar.*** Hay que eliminar fuentes potenciales, hacer reingeniería o minimizarlo y volver a valorarlo en grupo, hasta reducirlo. Requiere permiso especial de trabajo.	Buscar procedimientos alternativos si se decide hacer el trabajo. La alta dirección participa y aprueba el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y autoriza su realización, mediante un Permiso Especial de Trabajo (PES).
	Alto	***Minimizarlo.*** Buscar alternativas que presenten menor riesgo. Demostrar cómo se va a controlar el riesgo, aislar con barreras o distancia, usar EPP. Requiere permiso especial de trabajo.	El jefe o supervisor del área involucrada, aprueba el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el Permiso de Trabajo (PT) presentados por el líder a cargo del trabajo.
	Medio	***Aceptarlo.*** Aplicar los sistemas de control (minimizar, aislar, suministrar EPP, procedimientos, protocolos, lista de verificación, usar EPP). Requiere permiso de trabajo.	El líder del grupo de trabajo diligencia el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el jefe de área aprueba el Permiso de Trabajo (PT) según procedimiento establecido.
	Bajo	***Asumirlo.*** Hacer control administrativo rutinario. Seguir los procedimientos establecidos. Utilizar EPP. No requiere permiso especial de trabajo.	El líder del trabajo debe verificar: • ¿Qué puede salir mal o fallar? • ¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? • ¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle?
	Muy bajo	Vigilar posibles cambios	No afecta la secuencia de las actividades.

Tabla 9.4 Decisiones y acciones para controlar el riesgo

Definir si el riesgo es potencial o real.

	**ARCOS ELÉCTRICOS.** **POSIBLES CAUSAS:** Malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores. **MEDIDAS DE PROTECCIÓN:** Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar gafas de protección contra rayos ultravioleta.
	**AUSENCIA DE ELECTRICIDAD.** **POSIBLES CAUSAS:** Apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia - UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. **MEDIDAS DE PROTECCIÓN:** Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática.
	**CONTACTO DIRECTO** **POSIBLES CAUSAS:** Negligencia de técnicos o impericia de no técnicos. **MEDIDAS DE PROTECCIÓN:** Distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión.
	**CONTACTO INDIRECTO** **POSIBLES CAUSAS:** Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra. **MEDIDAS DE PROTECCIÓN:** Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.
	**CORTOCIRCUITO** **POSIBLES CAUSAS:** Fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades. **MEDIDAS DE PROTECCIÓN:** Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles.
	**ELECTRICIDAD ESTÁTICA** **POSIBLES CAUSAS:** Unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante. **MEDIDAS DE PROTECCIÓN**: Sistemas de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos conductivos.
	**EQUIPO DEFECTUOSO** **POSIBLES CAUSAS:** Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado. **MEDIDAS DE PROTECCIÓN:** Mantenimiento predictivo y preventivo, construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno electromagnético.
	**RAYOS** **POSIBLES CAUSAS:** Fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección. **MEDIDAS DE PROTECCIÓN:** Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además suspender actividades de alto riesgo, cuando se tenga personal al aire libre.
	**SOBRECARGA** **POSIBLES CAUSAS:** Superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplen las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos. **MEDIDAS DE PROTECCIÓN**: Interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, fusibles, dimensionamiento adecuado de conductores y equipos.
	**TENSIÓN DE CONTACTO** **POSIBLES CAUSAS:** Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de distancias de seguridad. **MEDIDAS DE PROTECCIÓN:** Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.
	**TENSIÓN DE PASO** **POSIBLES CAUSAS:** Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla, **MEDIDAS DE PROTECCIÓN:** Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.

Riesgo a Evaluar:	Quemaduras y/o lesiones causadas por Arcos Eléctricos FACTOR DE **eléctricos,** **Conexión de tableros**

		exposición directa al calor intenso RIESGO ELECTRICO								
CONSECUENCIAS	**En Personas**	**Económicas**	**Ambientales**	**En la Imagen de la Empresa**		E **No ha ocurrido en el sector**	D **Ha ocurrido en el sector**	C **Ha ocurrido en la empresa**	B **sucede varias veces al año en la empresa**	A **sucede varias veces al mes en la empresa**
	una o mas muertes	Daño grave en la infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	incapacidad parcial o permanente	Daños mayores. Salida de cuarto técnico	contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	incapacidad temporal (> 1dia) **C**	Daños severos. Interrupción temporal	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes. Interrupción breve **c**	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (afecta rendimiento laboral	Daños leves, No interrupción	Sin efecto **E**	Interna **C**	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO
			Evaluador: Mauricio Urueña S MT: CN205-99358							
Nivel de Riesgo	MEDIO	Instalación realizada únicamente por personal calificado. Ubicar en todos los equipos señalización para evitar el uso inapropiado por personas no calificadas Uso de herramientas adecuadas y elementos de seguridad.								

ANALISIS DE RIESGOS Y MEMDIDAS PARA MITIGARLOS

RIESGO DE MUERTE POR ARCO ELECTRICO

Ante riesgo de muerte por arco eléctrico en cuartos técnicos con tableros de distribución en baja tensión el cual se pueden aplicar sistemas de control (minimizar, aislar, suministrar EPP, procedimientos, protocolos, lista de verificación, usar EPP). Se debe contar con permiso de trabajo. Estas medidas deben ser aplicadas, manteniendo y respetando distancias de seguridad, restringiendo el acceso a personal no capacitado y dando cabal cumplimiento a las exigencias del RETIE. El personal que intervenga las equipos y redes eléctricas debe contar con capacitación y EPP para realizar su labor.

RIESGO DE MUERTE POR CONTACTO DIRECTO

Ante riesgo de muerte por contacto directo se buscan alternativas que presenten menor riesgo. Demostrar cómo se va a controlar el riesgo, aislar con barreras o distancia, usar EPP. Requiere permiso especial de trabajo. Estas medidas se implementan en el momento que se implementan distancias de seguridad, señalización, puesta a tierra, se debe contar con elementos de protección personal EPP y verificar ausencia de tensión. restringiendo el acceso a personal no capacitado y dando cabal cumplimiento a las exigencias del RETIE. El personal que intervenga los equipos y redes eléctricas debe contar con capacitación y EPP para realizar su labor

RIESGO DE MUERTE POR CONTACTO INDIRECTO

Ante riesgo de muerte por contacto indirecto, aplicar los sistemas de control (minimizar, aislar, suministrar EPP, procedimientos, protocolos, lista de verificación, usar EPP). Requiere permiso de trabajo. Estas medidas se implementan en el momento en que el proyecto cuenta con el uso de puestas a tierra y conexiones equipotenciales.

RIESGO DE MUERTE POR CORTOCIRCUITO

Ante riesgo de muerte por corto circuito, aplicar los sistemas de control (minimizar, aislar, suministrar EPP, procedimientos, protocolos, lista de verificación, usar EPP). Requiere permiso de trabajo. Estas medidas se implementan en el momento en que el proyecto cuente con el uso de interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente, manteniendo y respetando distancias de seguridad, restringiendo el acceso a personal no capacitado y dando cabal cumplimiento a las exigencias del RETIE. El personal que intervenga los equipos y redes eléctricas debe contar con capacitación y EPP para realizar su labor.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4077645

NP-49- ACOMETIDA PRINCIPAL DE TGA A TABLERO TOMAS 3No4+1No6+1No10 según diagrama unifilar aulas de bachillerato y sistemas - Colegio Restrepo Millán - Sede D

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la **ACOMETIDA PRINCIPAL DE TGA A TABLERO TOMAS 3No4+1No6+1No10 según diagrama unifilar aulas de bachillerato y sistemas - Colegio Restrepo millan - Sede D**

EJECUCIÓN:

- Verificar planos eléctricos
- Verificar diámetros y materialidad de tubería
- Realizar el tendido de los conductores dentro de la tubería, cuidando la integralidad de los conductores evitando peladuras en los mismos
- Realizar las protecciones en cada extremo descubierto del cable instalado.

MATERIALES:

- **Cable THHN/THWN C.4 AWG Cu -2 CT 600V**
- **Cable THHN/THWN C.6 AWG Cu -2 CT 600V**
- **Cable THHN/THWN C.10 AWG Cu -2 CT 600V**

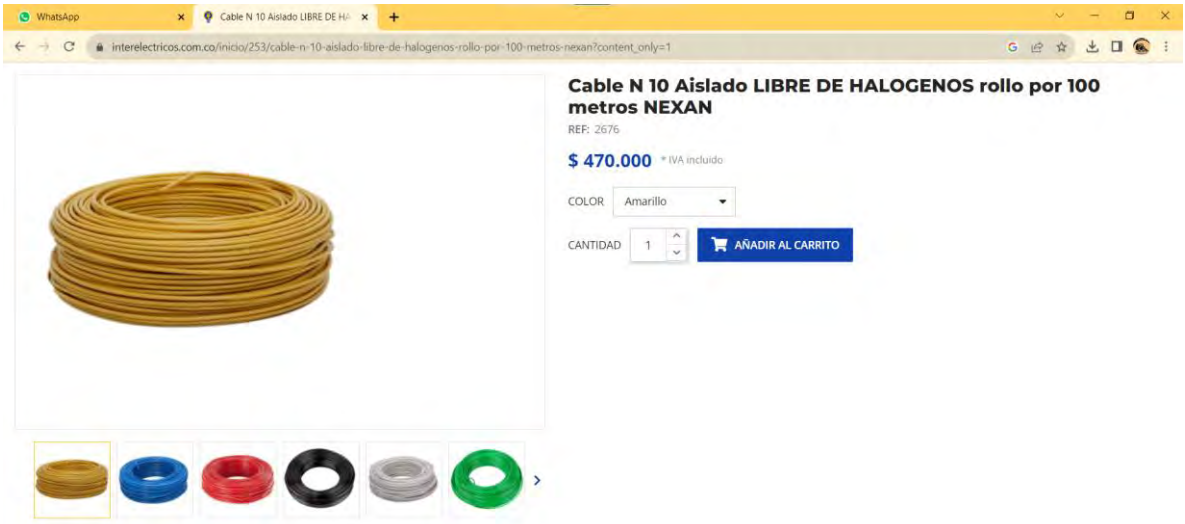
EQUIPOS:

- **Herramienta Menor (% M.O)**
- **Equipo de trabajo en alturas certificado (alquiler)**


MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por **METRO LINEAL (ML) DE ACOMETIDA PRINCIPAL DE TGA A TABLERO TOMAS 3No4+1No6+1No10 según diagrama unifilar aulas de bachillerato y sistemas - Colegio Restrepo millan - Sede D,** recibidos a satisfacción por la interventoría.

COTIZACION INTERELECTRICA



COTIZACION ELECTROVERA

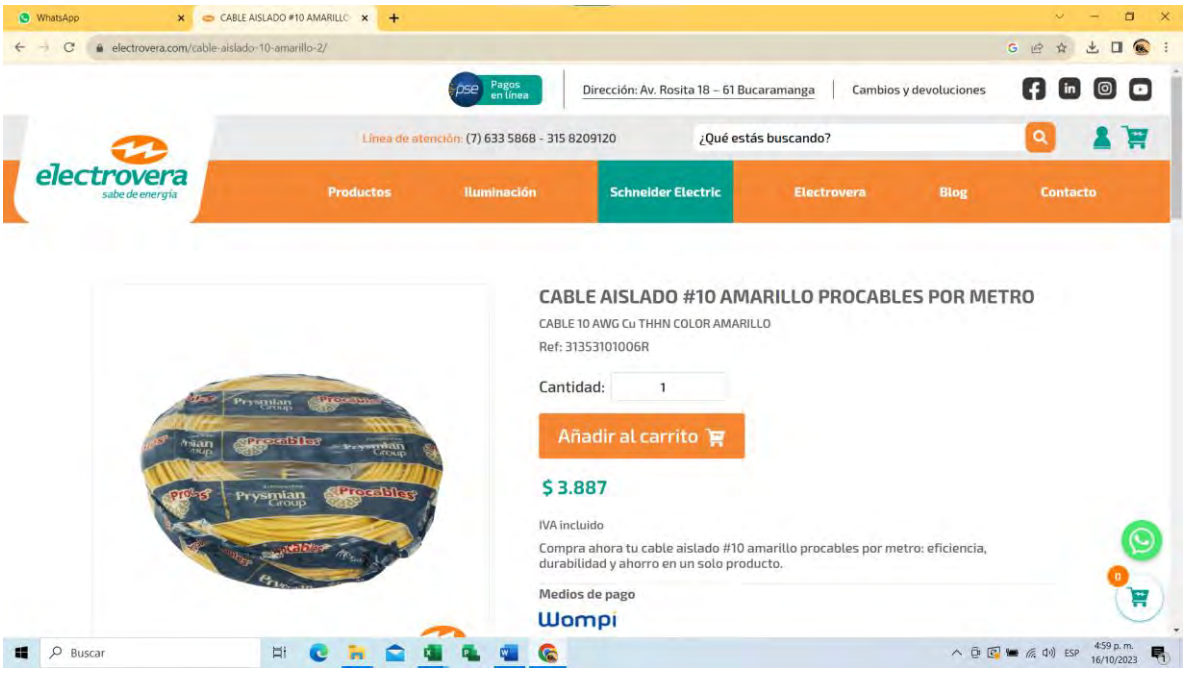



LISTA DE PRECIOS MTS - IE Interelectricas

CT	NX	Familia	Calibre	Material	PRECIOS ANTES DE IVA
200300	10011483	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.14 AWG Cu THWN-2 600V	CU	$ 1.650
200303	10011477	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.12 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 2.464
200305	10011471	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.10 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 3.960
200307	10011808	Alambre de Cobre THHN/THWN	A.8 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 6.483
200310	10033935	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	3x12 AWG Cu THHN/THWN-2 TPX 600V 90C	CU	$ 9.188
200351	10011771	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.14 AWG Cu THWN-2 600V	CU	$ 2.003
200354	10011763	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.12 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 2.860
200354C3NG		Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.12AWG Cu THWN-2 CT600V NG C500 MOBIWAY	CU	$ 2.978
200359	10011756	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.10 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 4.494
200363	10024751	Cable THHN/THWN -2 14 AL 8 AWG	C.8 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 7.036
200369	10011405	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.6 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 10.465
200373	10011394	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.4 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 16.758
200383	10011383	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.2 AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 25.980
200390	10011381	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.1/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 41.852
200394	10011391	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.2/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 52.766
200398	10012629	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.3/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 66.452
200402	10011403	Cable THHN/THWN -2 6 AL 4/0AWG	C.4/0AWG Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 81.436
200406	10011445	C 250 - 1000 KCMIL Cu	C.250 kcmil Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 99.292
200410	10011449	C 250 - 1000 KCMIL Cu	C.350 kcmil Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 138.896
200416	10011452	C 250 - 1000 KCMIL Cu	C.500 kcmil Cu THWN-2 CT 600V	CU	$ 196.047
213581	10047972	Cables 14 – 8 SINTOX	3x12AWG Cu SINTOX TPX600V 75C HF FRLS CT	CU	$ 9.867
213554	10036058	Cables 14 – 8 SINTOX	C.14AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 2.205
213555	10034156	Cables 14 – 8 SINTOX	C.12AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 3.087
213555C3NG		Cables 14 – 8 SINTOX	C.12AWG CU SINTOX 600V 75C NG C300 MOBIWAY	CU	$ 3.214
213556	10036055	Cables 14 – 8 SINTOX	C.10AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 4.718
213557	10033629	Cables 14 – 8 SINTOX	C.8AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 7.346
213558	10034358	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.6AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 11.824
213559	10034359	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.4AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 18.568
213560	10034360	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.2AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 28.644
213561	10033628	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.1/0AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 45.629
213562	10034361	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.2/0AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 56.771
213563	10034393	Cables 6 – 4/0 SINTOX	C.4/0AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 90.140
213617	10034398	Cables 250 – 1000Kcmil SINTOX	C.250AWG Cu SINTOX 600V 75C	CU	$ 105.245
200878	10048879	C Desnudo Cu	C.8AWG(B) Cu DESNUDO SUAVE	CU	$ 6.446
200879	10012018	C Desnudo Cu	C.6AWG(B) NOR Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 9.926
200881	10012794	C Desnudo Cu	C.4AWG(B) NOR Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 15.678
200883	10012772	C Desnudo Cu	C.2AWG(B) NOR Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 24.642
200887	10027929	C Desnudo Cu	C.1/0AWG(B) UNC Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 40.754
200891	10012793	C Desnudo Cu	C.2/0AWG(B) UNC Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 50.537
200895	10012795	C Desnudo Cu	C.4/0AWG(B) UNC Cu DESNUDO SUAVE IZQ	CU	$ 79.803
204628	10011461	A Desnudo Cu	A.14AWG Cu DESNUDO SUAVE (M)	CU	$ 1.600
204629	10011460	A Desnudo Cu	A.12AWG Cu DESNUDO SUAVE (M)	CU	$ 2.379
204632	10011459	A Desnudo Cu	A.10AWG Cu DESNUDO SUAVE (M)	CU	$ 3.845
201527		FLEX. Duplex	2x20AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 1.367
201528	10011056	FLEX. Duplex	2x18AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 1.641
201529	10011054	FLEX. Duplex	2x16AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 2.506
201530	10011041	FLEX. Duplex	2x14 AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 3.725
201532	10011038	FLEX. Duplex	2x12 AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 5.789
201525	10011036	FLEX. Duplex	2x10 AWG Cu DUPLEX SPT-C 300V60C	CU	$ 9.098
201635		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 20 AWG (J) 600V	CU	$ 759
201636		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 18 AWG 600V	CU	$ 936

201638		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 16 AWG 600V	CU	$	1.346
201639		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 14 AWG 600V	CU	$	2.192
201640		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 12 AWG 600V	CU	$	3.331
201641		FLEX. Monopolar	FLEXIPLUS AWM 105°C Cu 10 AWG (J) 600V	CU	$	5.029
201622		FLEX. Monopolar	C TWK Cu 60°C 8 AWG (J) 600V	CU	$	8.479
201623		FLEX. Monopolar	C TWK Cu 60°C 6 AWG (J) 600V	CU	$	13.392
204497		FLEX. Monopolar	AWM-SIS Cu 125°C 16AWG 600V XLPE	CU	$	2.422
204499		FLEX. Monopolar	AWM-SIS Cu 125°C 12AWG 600V XLPE	CU	$	5.537
209388	10034964	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x18AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	4.709
209393	10034797	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x16AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	6.491
209397	10035425	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x14AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	9.774
209387	10034963	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x18AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	3.787
209401	10051998	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x12AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	14.277
209392	10034796	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x16AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	5.202
209396	10034801	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x14AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	7.558
209405	10052000	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x10AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	22.695
209400	10051997	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x12AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	11.083
209386	10034942	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x18AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	2.767
209391	10034965	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x16AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	3.861
209410	10052020	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x8AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	37.060
209404	10051945	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x10AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	17.653
209395	10034951	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x14AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	5.699
209399	10051996	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x12AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	8.322
209414	10052023	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x6AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	58.813
209409	10052017	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x8AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	28.225
209403	10051999	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x10AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	12.130
209413	10052022	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	3x6AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	44.154
209417	10052024	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x4AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	90.241
209408	10052001	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	2x8AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	19.996
209420	10051972	Cables Tipo Encauchetado - Multiflex	4x2AWG MULTIFLEX CT 600V 90C	CU	$	144.319
213671		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu 2AWG 0.6/1kV XLPE/PVC	CU	$	34.948
213670		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu1/0AWG 0.6/1kVXLPE/PVC	CU	$	51.865
213669		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu2/0AWG 0.6/1kVXLPE/PVC	CU	$	64.804
213667		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu4/0AWG 0.6/1kVXLPE/PVC	CU	$	101.243
213666		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu250kcmil0.6/1kV XL/PVC	CU	$	119.148
213665		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu350kcmil0.6/1kV XL/PVC	CU	$	165.944
213664		Extraflex Monopolares	CENTELFLEX Cu500kcmil0.6/1kV XL/PVC	CU	$	240.699
201505		Cable Soldador-Batería	6AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	16.102
201506		Cable Soldador-Batería	4AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	22.191
201507		Cable Soldador-Batería	2AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	32.908
201508		Cable Soldador-Batería	1/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	51.981
201509		Cable Soldador-Batería	2/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	64.596
201510		Cable Soldador-Batería	3/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	80.629
201511		Cable Soldador-Batería	4/0AWG Cu SOLDAFLEX TPE 600V 105C HF	CU	$	102.868
201335		FLEX. Siliconados	CABLE SILICONADO Cu 200ºC 14 AWG 600V	CU	$	4.552
201336		FLEX. Siliconados	CABLE SILICONADO Cu 200ºC 12 AWG 600V	CU	$	5.815
201337		FLEX. Siliconados	CABLE SILICONADO Cu 200°C 10 AWG 600V	CU	$	9.059
205399		Acometida Antifraude	2x8+8AWG Cu ACOM.CONC.XL/PVC 600V 90C	CU	$	29.234
201957	10012108	Acometida Antifraude	1x8+8AWG Cu ACOM.CONC.XL/PVC 600V 90C	CU	$	16.620
202038	10013378	Acometida Antifraude	2x8+8AWG Cu ACOM.PLANA.XL/PVC 600V 90C	CU	$	26.752
202073	10012289	Acometidas Trebol	TREBOL Cu3x8+10(S)AWG600VPE/PVC ENEL/COL	CU	$	33.136
209492	10011187	Acometidas Trebol	TREBOL Cu 75°C 3x2+4AWG (C) 600V PVC/PE	CU	$	123.530
202080	10011189	Acometidas Trebol	TREBOL Cu3x6+8AWG(B)600V PE/PVC ENEL/COL	CU	$	48.137
213576	10038999	Cable Tipo Fuerza	3x14AWG SINTOXFLEX CT 600V 75C	CU	$	9.806
213577	10035183	Cable Tipo Fuerza	3x12AWG SINTOXFLEX CT 600V 75C	CU	$	14.996
207973	10025077	Cable Tipo Fuerza	C.12 AWG Cu XHHW-2 600V 90C CT SR	CU	$	4.025
208168		Cable Tipo Fuerza	C.1/0 AWG Cu XHHW-2 600V 90C CT SR	CU	$	63.998
208167		Cable Tipo Fuerza	C.2/0 AWG Cu XHHW-2 600V 90C CT SR	CU	$	81.474

211541	10046010	Cables Fotovoltaicos	C.6mm2 CuSn H1Z2Z2K 1/1kV120	CU	$	7.320
211539	10046009	Cables Fotovoltaicos	C.4mm2 CuSn H1Z2Z2K 1/1kV120	CU	$	5.385
201728		Media tensión CU	XLPE Cu 90°C 2AWG 15kV 133% PC PVC SR	CU	$	67.108
201748		Media tensión CU	XLPE Cu 90°C 1/0 AWG 15kV 133% PC PVC SR	CU	$	84.538
201759		Media tensión CU	XLPE Cu 90°C 2/0AWG 15kV 133% PC PVC SR	CU	$	104.679
207357		Media tensión AL	XLPE Al 90°C 1/0 AWG 15kV 133% PC PVC SR	AL	$	102.547
201224		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 4x18AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	9.500
201222		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 3x18AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	7.787
206537		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 3x16AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	9.745
201220		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 2x18AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	6.694
205665		Cable Tipo Control E Instrumentación	INS.CuSn 105°C 2x16AWG OS 600V PF PVC TC	CU	$	7.678
204154	10044737	Cable S8000	C.6AWG AA-8000 RHH/RHW2/USE2 600V 90C	AL	$	3.811
213545	10039102	Cable S8000	C.6 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	3.362
213546	10039143	Cable S8000	C.4 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	4.463
213547	10039144	Cable S8000	C.2 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	6.481
213548	10039145	Cable S8000	C.1/0 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	10.637
213549	10039146	Cable S8000	C.2/0 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	12.722
213550	10039147	Cable S8000	C.4/0 AWG AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	17.929
213551	10039148	Cable S8000	C.250 kcmil AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	21.855
213552	10039149	Cable S8000	C.350 kcmil AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	28.426
213553	10039150	Cable S8000	C.500 kcmil AA-8000 THW-2 CT 600V	AL	$	38.318
213564	10043892	Cables S8000 SINTOX	C.6AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	3.784
213566	10043934	Cables S8000 SINTOX	C.2AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	7.138
213567	10043936	Cables S8000 SINTOX	C.1/0AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	12.084
213570	10043940	Cables S8000 SINTOX	C.4/0AWG AA-8000 SINTOX 600V 75C	AL	$	20.624
200002	10011900	C Desnudos ACSR	ACSR/GA RAVEN 1/0AWG (AA)(6/1)	CU	$	8.836
210587	10025594	Ecologicos ACSR / AAAC / AAC	1/0AWG ACSR CUBIERTO XLPE-TK 15kV 2C	AL	$	18.524

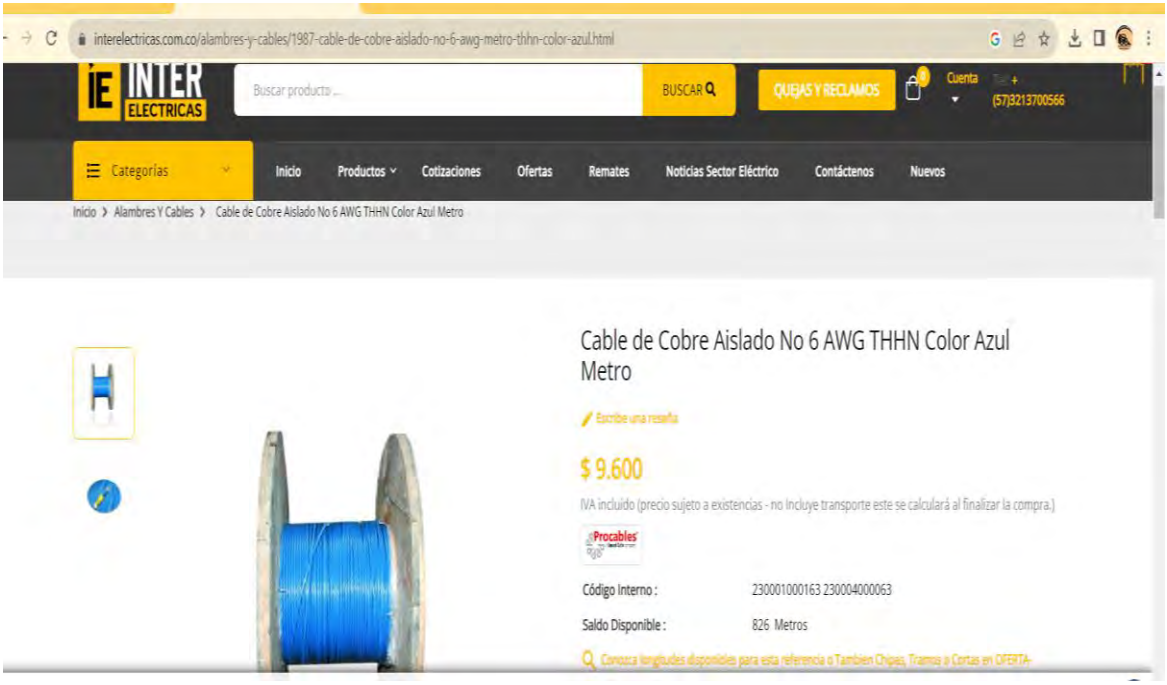
interelectricas.com.co/alambres-y-cables/1987-cable-de-cobre-aislado-no-6-awg-metro-thhn-color-azul.html
INTER ELECTRICAS
Buscar producto...
BUSCAR
QUEJAS Y RECLAMOS
Cuenta
(57)3213700566
Categorías
Inicio
Productos
Cotizaciones
Ofertas
Remates
Noticias Sector Eléctrico
Contáctenos
Nuevos
Inicio > Alambres Y Cables > Cable de Cobre Aislado No 6 AWG THHN Color Azul Metro
Cable de Cobre Aislado No 6 AWG THHN Color Azul Metro
Escribe una reseña
$ 9.600
IVA incluido (precio sujeto a existencias - no Incluye transporte este se calculará al finalizar la compra.)
Procables
Código Interno :
230001000163 230004000063
Saldo Disponible :
826 Metros
Conozca longitudes disponibles para esta referencia o Tambien Chipas, Tramos o Cortas en OFERTA

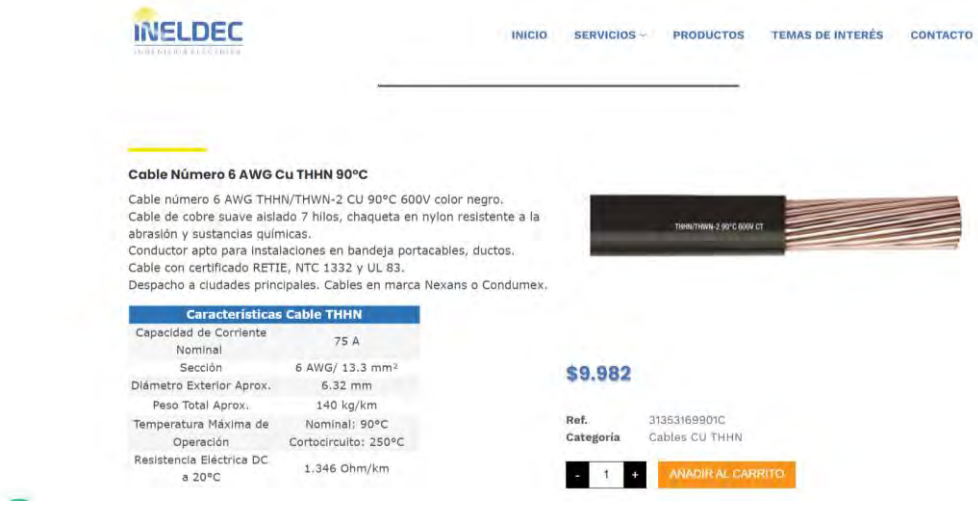
INELDEC
INICIO
SERVICIOS
PRODUCTOS
TEMAS DE INTERÉS
CONTACTO
Cable Número 6 AWG Cu THHN 90°C
Cable número 6 AWG THHN/THWN-2 CU 90°C 600V color negro.
Cable de cobre suave aislado 7 hilos, chaqueta en nylon resistente a la abrasión y sustancias químicas.
Conductor apto para instalaciones en bandeja portacables, ductos.
Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83.
Despacho a ciudades principales. Cables en marca Nexans o Condumex.
Características Cable THHN
Capacidad de Corriente Nominal
75 A
Sección
6 AWG/ 13.3 mm²
Diámetro Exterior Aprox.
6.32 mm
Peso Total Aprox.
140 kg/km
Temperatura Máxima de Operación
Nominal: 90°C
Cortocircuito: 250°C
Resistencia Eléctrica DC a 20°C
1.346 Ohm/km
$9.982
Ref.
31353169901C
Categoría
Cables CU THHN
-
1
+
AÑADIR AL CARRITO

SOLMATECH

(57)(5)342 7840 / 311-7205808

Ingresar | carrito

INICIO | PRODUCTOS | MARCAS | INTEGRADORES | CONTACTO



Inicio / Energía y Electricidad / Cables / Cable Soldador No.4 AWG Cobre Flexible

Cable Soldador No.4 AWG Cobre Flexible

$19,802

Categorías: Cables, Centelsa, Energía y Electricidad

Añadir al carrito

Descripción

CABLE SOLDADOR 4AWG NEGRO 600V 105 GRADOS 230A CICLO 130A CONTINUO CENTELSA

RESISTENTE AL CHOQUE TERMICO

AISLAMIENTO LIBRE DE ALOGENOS

YouTube | Traducir | Roblox | Nueva pestaña

INTER ELECTRICAS

BUSCAR | QUEJAS Y RECLAMOS | Cuenta

Categorías | Inicio | Productos | Cotizaciones | Ofertas | Remates | Noticias Sector Eléctrico | Contáctenos | Nuevos

Inicio > Alambres Y Cables > Cable de Cobre Aislado No 4 AWG THHN Color Negro Metro



Cable de Cobre Aislado No 4 AWG THHN Color Negro Metro

$ 14,450

(IVA incluido (precio sujeto a existencia) - no incluye transporte este se calculará al finalizar la compra.)

Procables

Código Interno :	230001000142 230004000041
Saldo Disponible :	4527 Metros
Peso :	0.2340 kg
Dimensiones :	Anchura 0.0800 Mts. - Altura 0.0800 Mts. - Profundidad 0.0000 Mts.

Cantidad: 1 | COMPRAR

COMPARTIR ESTE PRODUCTO A UN AMIGO

Características

El Cable de Energía THHN/THWN-2 TC USE/RoHS por sus características eléctricas, térmicas mecánicas y

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarte?

SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL

LISTADO DE INSUMOS UNIFICADO DE MATERIALES

ID	NOMBRE DEL INSUMO	UND	COTIZACIÓN 1	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 2	FUENTE DE INFORMACIÓN	COTIZACIÓN 3	FUENTE DE INFORMACIÓN	PROMEDIO	DESVIACIÓN TRES COTIZACIONES	TECHO TUNEL ALTO TRES COTIZACIONES	PISO TUNEL BAJO TRES COTIZACIONES	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3	PRECIO REFERENCIA
	Cable THHN/THWN C.4 AWG Cu -2 CT 600V	ML	$ 14.450	INTERELECTRICAS	$ 19.942	LISTA DE PRECIOS CENTELSA	$ 19.802	SOLMATECH	$ 18.065	$ 3.131	$21.196	$14.933		19942,02	$ 19.802	$ 19.872
	Cable THHN/THWN C.10 AWG Cu -2 CT 600V	ML	$ 4.700	INTERELECTRICAS	$ 5.348	LISTA DE PRECIOS CENTELSA	$ 3.887	ELECTROVERA	$ 4.645	$ 732	$5.377	$3.913	$ 4.700	5347,86		$ 5.024
	Cable THHN/THWN C.6 AWG Cu -2 CT 600V	ML	$ 9.600	INTERELECTRICAS	$ 12.453	LISTA DE PRECIOS CENTELSA	$ 9.982	ENELDEC	$ 10.678	$ 1.549	$12.227	$9.130	$ 9.600		$ 9.982	$ 9.791

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-387

Bogotá, D.C, 13 de noviembre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.43

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.43, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.43:** 06/11/2023 al 12/11/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Nueve (9) folios

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	CUATRO (4) MESES	PRORROGA 1:	122,00
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de mayo de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de abril de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	485	PLAZO ACTUALIZADO:	455
PLAZO TRANSCURRIDO:	313 EQUIVALE AL 64,54%	PLAZO TRANSCURRIDO:	296 EQUIVALE AL 65,05%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 371.557.789,00	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 5.050.000.000,00
VALOR ADICIÓN No.2:	$ 187.000.000,00	VALOR ADICIÓN No.2:	$ 1.870.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.437.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 18.861.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ 700.956.706,00	VALOR PAGADO:	$ 9.527.028.090,00
VALOR POR PAGAR:	$ 736.189.021,00	VALOR POR PAGAR:	$ 9.334.234.060,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	19/12/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	24/11/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	30/10/2023	13/10/2023	17
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	24/11/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA**	20/12/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	31/10/2023	1/11/2023	-1
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023	4/10/2023	-67
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	7/11/2023	16/10/2023	22
29	**TALLER BICICLETERO**		9/10/2023	
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**296**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 231.906.572,00	$ 231.906.572,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 225.628.807,36	$ 225.628.807,36	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	10/04/2024	NO HA INICIADO

FECHA	13/11/2023	PERIODO No.	43	DEL	6/11/2023	AL	12/11/2023

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.010.000.000,00	$ 905.903.486,84	89,69%	1/11/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 485.207.002,00	$ 357.426.535,00	73,66%	26/12/2023	EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 841.548.020,00	$ 669.576.491,54	79,56%	2/11/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.169.838.192,85	$ 1.169.838.192,85	100,00%	28/08/2023	FINALIZADO
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	17/04/2024	NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 350.997.438,48	$ 350.997.438,48	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 827.987.076,00	$ 536.065.942,00	64,74%	20/02/2024	EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	30/03/2024	NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 762.681.025,00	$ 552.574.250,00	72,45%	5/01/2024	EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.228.838.776,00	$ 1.068.719.914,69	86,97%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.206.469.428,00	$ 950.328.057,70	78,77%	22/11/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ 35.438.403,56	7,12%	29/02/2024	NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.221.970.692,20	$ 1.221.970.692,20	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	11/04/2024	NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ 1.437.271,00	0,47%	14/02/2024	NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ 214.257.543,00	32,63%	28/02/2024	NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ 208.494.194,00	61,44%	2/03/2024	NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.027.739.816,00	$ 1.475.491.516,58	72,77%	8/04/2024	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	18/04/2024	NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ 181.696.446,54	54,10%	28/12/2023	NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 702.836.423,00	$ 371.949.733,00	52,92%	7/02/2024	EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
29	TALLER BICICLETERO	$ 250.000.000,00	$ 101.665.828,00	40,67%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
27	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 532.852.321,00	61,78%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intervenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	No se realizan actividades	FRENTE TERMINADO Y EN OBSERVACIÓN

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua finalizando actividades referente a detalles de acabados, se continua con la demolición del adoquín en zona de patio principal.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: Dos (2). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Inicia actividad de aplicación de emulsión asfáltica, Continua actividad de instalación de manto asfaltico, finaliza fundida de dentellón en la entrada vehicular.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor, vibro compactador, andamios.
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se instala las luminarias del baño de niños primer piso la cual son de incrustar en el cielo raso.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se espera a la salida de los estudiantes para comenzar la intervencion de la cancha.	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se inicia con la actividad de limpieza de la superficie de la cancha y se continua con el lavado de acido en la cacncha multiple	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: dos(2) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de instalación de cubierta tipo sándwich, Continua actividad de instalación de estructura metálica de cubierta, Continua actividad de pintura de cerchas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Se continua con la pintura y acabados en la sala de profesores primer piso, se inicia con la actividad de instlacion de ventana en aluminio en el area de la biblioteca	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se continua con los acabados en el area administrativa y con el avance de la pintura de la fachada	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, IGABRIELA MISTRAL**	Se entrego las áreas Vae y Embera, con guardaescoba y emboquillado, se requiere intervenir componente eléctrico y finalizar la actividad de instalación de porcelanato en Área de danzas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: 1 (1) persona. Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Continua con la instaalción de pañete en bloque #12, e instalación de tubaria electrica en zona de bachillerato, mantenimiento de puertas y desmonte de cubierta en asbesto cemento en zona de bachillerato	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Doce (12) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua actividad de demolición de placa, Continua actividad de excavación de material común, Continua actividad de levantamiento de muro estructural.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Herramienta menor y rotomartillo
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se termina con la instalacion del manto asfaltico y se espera a la salida de los estudiantes para comenzar con la intervencion de pintura y de puertas	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
28	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	Se continua con la fabricación en sitio, los módulos para el cerramiento de la IED,se requiere mejorar rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
29	**COLEGIO ALIANZA QUIROGA**	Se realizo acondicionamiento de terreno para la intervención de maloka y aplicación de recebo común	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor


CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
30	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	Se inicia con la actividad de pintura de la estructura metalica del ala 2 y el cerramiento de dicho espacio	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
31	**TALLER BICICLETERO**	Continua extendido y compactación de material de sub base, continua actividad de desmonté de cubierta.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora
32	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera de que el contratista inicie con la ejecución del resto de la emergencias que están pendientes a la fecha.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 11.871.704.425,71	62,94%	-0,63%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 11.752.320.874,00	62,31%	

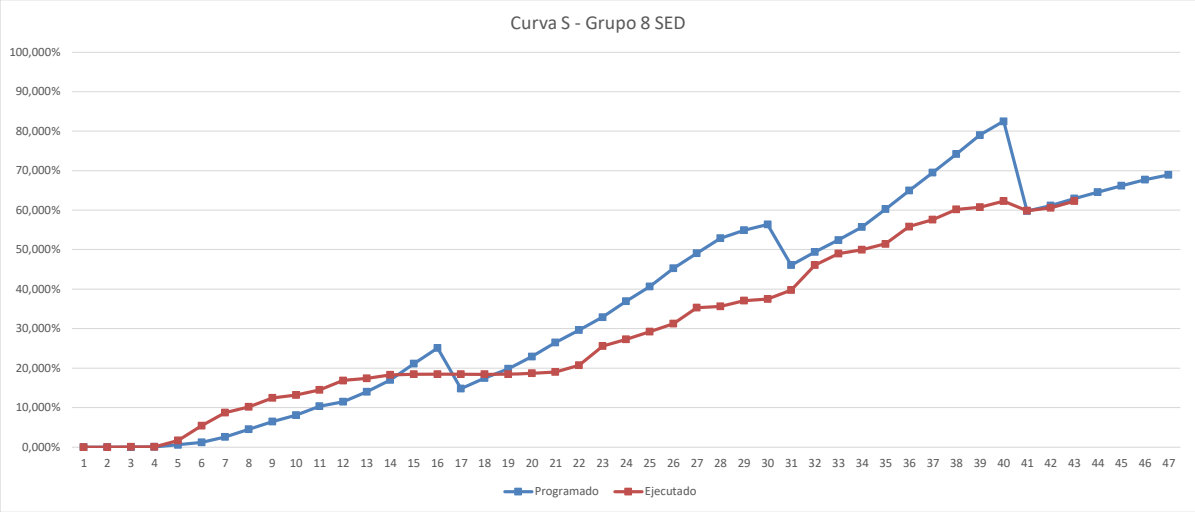

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Con ocasión a la oficialización de la solicitud de adición No.2 al contrato de obra por un valor de $ 1,870,000,000 y una prórroga por un término de cuatro (4) meses calendario, la cual fue extendida a la SED durante el periodo semanal anterior y que contaba con previo aval de la Entidad Contratante, para el presente periodo semanal continúa la vigencia la nueva programación, la cual extiende el plazo contractual hasta el 19 de abril de 2024 y permite la reorganización del inicio de varios frentes, que no han podido iniciar por la extensión de los alcances de otros que están en ejecución y por la condición administrativa y profesional del equipo que está a cargo del proyecto. Se hace la salvedad que varios frentes han variado en su valor de ejecución, dadas las necesidades que se van presentando a diario y las autorizaciones que se dan desde la SED.

En estos momentos el proyecto se encuentra al día en términos de ejecución y se propenderá porque continúe en esas condiciones en lo que resta del plazo contractual.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 07 de noviembre de 2023 se remitieron para revisión de la Entidad, los APU's no previstos NP29, NP45 y NP49.
* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:


Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y no realizó la entrega de su concepto técnico.
Colegio Restrepo Millán sede D: El riesgo existente con las redes eléctricas será intervenido a través del alcance del frente.

Pendiente la atención de varias emergencias a la fecha que ya fueron notificadas de manera oficial al contratista de obra.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública





FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

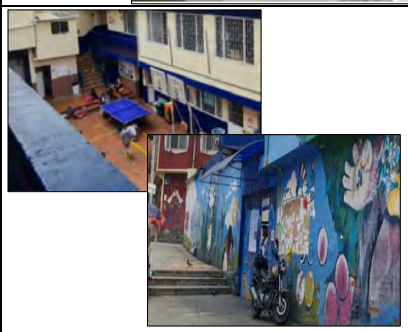10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES		
3	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		
4	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		
5	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA		





CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

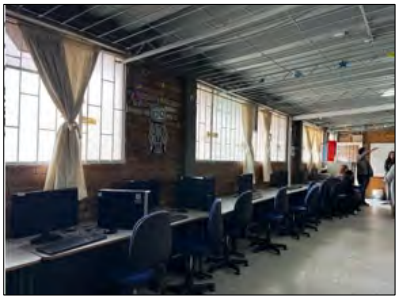	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
6	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		  
7	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		  
8	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	 	  
9	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	 	  
10	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		  




CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
11	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  
12	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D,GABRIELA MISTRAL**	  	  
13	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
14	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
15	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		  

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
16	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  
17	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		  
18	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**		  
19	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		  
20	**TALLER BICICLETERO**	 	  

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

21	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B**		

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-388

Bogotá, D.C, 14 de noviembre de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: Primer llamado de atención por incumplimiento a entrega de informe mensual de obra No.9

Respetados señores:

Por medio de la presente, esta interventoría se permite emitir el primer llamado de atención al CONSORCIO MIA GP, basado en el incumplimiento de entrega del informe mensual de obra No.9 contrato No. CO1.PCCNTR.4077645, el cual abarca el periodo del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2023.

Esta obligación contractual fue requerida a priori al corte de obra No.9 y hasta la fecha actual, la interventoría no ha recibido el informe solicitado. Por lo tanto, se hace necesario recordar al contratista que los informes mensuales deben ser entregados en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al vencimiento del término establecido para su presentación, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en lo que sería un presunto incumplimiento.

En consecuencia, requerimos de manera inmediata y perentoria que el CONSORCIO MIA GP cumpla con su obligación de remitir el informe mensual de obra No.9, respaldado por los correspondientes soportes, en un plazo no superior

a UN (1) día hábil a partir de la recepción de esta comunicación, so pena solicitar a la Entidad Contratante que inicie los procedimientos legales a que hay lugar.

Atentamente,



EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-389

Bogotá, D.C, noviembre 16 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8 FE COLEGIOS FE Y ALEGRIA, DIANA TURBAY, GUSTAVO RESTREPO

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Eduardo Aponte Zambrano	PT 7216256	Ayudante	Fe y alegría
2	Raúl Vásquez Henao	10.261.551	Ayudante	Fe y alegría
3	Roberto Sierra Maldonado	PT 7166646	Ayudante	Fe y alegría

CONSORCIO TIG

4	Alexandra Perdomo Quintero	52.210.303	Ayudante	Fe y alegría
5	Jaime Londoño Bustos	79.632.384	Ayudante	Fe y alegría
6	Alexander Delgado Escarraga	9.350.912	Ayudante	Diana Turbay
7	Raúl López Mendoza	1.090.526.545	Ayudante	Diana Turbay
8	Willton Garzón Leal	1.111.337.824	Ayudante	Diana Turbay
9	Fernando Galvis Bello	79.045.588	Ayudante	Diana Turbay
10	Jose Díaz Pachón	79.414.762	Ayudante	Diana Turbay
11	Victor León Requena	PT 6241695	Ayudante	Diana Turbay
12	Cristian Alexis Realpe Pulido	1.033.789.009	Instalador	Gustavo Restrepo
13	Franklin Perez	6.212.087	Hidráulico	Fe y Alegría
14	Juan José Sogamoso	5.969.876	Hidráulico	Fe y Alegría

Sin otro particular,

Atentamente,

~~EDISON RICARDO~~ DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST CONSORCIO TIG Vbo.
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
CC. Ing. Leonardo Contador Alonso Contratista – Gestor Territorial Localidad de Rafael Uribe Uribe
Anexo. Documentación del personal

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/11/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	367	09/11/2023	PT 7216256	APONTE ZAMBRANO EDUARDO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FE0FACC2A43FC3C3F42AF030E0BF3B25 Certificado impreso el día 11/8/2023 9:41:40 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EDUARDO JOSE
APONTE ZAMBRANO
7216256

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
7830520-08112023	08 (M) 11 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
APONTE (Primer apellido)	ZAMBRANO (Segundo apellido)	EDUARDO (Primer nombre)	JOSE (Segundo nombre)

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
PT	7216256	Femenino [ ] Masculino [X]	01 05 1995

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	COLFONDOS	1.160.000

18. Residencia			
CALLE 34 N 32 89 (Dirección)	67986854 (Teléfono)	3223045698 (Teléfono celular)	eduardoaponte@gmail.com (Correo electrónico)

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
BOGOTA D.C.	Urbana [X] Rural [ ]	SUBA	BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales
24. Apellidos y nombres completos

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria
34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

		Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
CALLE 3A 7B 149 (Dirección)	5801473 (Teléfono)	obras.joyavi@gmail.com (Correo electrónico)	LOS PATIOS (Municipio/Distrito)	NDS (Departamento)

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo; [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen; [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
APONTE	ZAMBRANO	EDUARDO	JOSE

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
PT	7216256	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

EDUARDO JOSE APONTE ZAMBRANO PT 7216256	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] — Cantidad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) EDUARDO JOSE APONTE ZAMBRANO identificado(a) con P.P.T. No. 7216256, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 08 de noviembre del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/11/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	369	09/11/2023	CC 10261551	VASQUEZ HENAO RAUL	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FE0FACC2A43FC3C3F42AF030E0BF3B25 Certificado impreso el día 11/8/2023 9:43:37 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

RAUL
VASQUEZ HENAO
10261551
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 08/11/2023, el empleador JOSE JOAQUIN YANEZ VILLAMIZAR identificado con NIT número 13240346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6373639	08/11/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	10261551	RAUL VASQUEZ HENAO	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-11-08

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 8 días del mes de Noviembre del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **VASQUEZ HENAO RAUL** identificado(a) con **CC** número **10.261.551** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de septiembre de 2000 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN CONSERVADOR**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 08 de noviembre de 2023.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023110813155

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/11/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	373	09/11/2023	PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FE0FACC2A43FC3C3F42AF030E0BF3B25 Certificado impreso el día 11/8/2023 1:11:28 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

ROBERTO ANTONIO
SIERRA MALDONADO
7166646

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
7830521-08112023	08 / 11 / 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo).*

1. Tipo de Trámite:	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: X - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	(a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
SIERRA	MALDONADO	ROBERTO	ANTONIO
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
PT	7166646	Femenino [ ] Masculino [X]	01 / 12 / 1990

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	COLFONDOS	1.160.000

18. Residencia			
CALLE 34 N 32 89	67986854	3223045698	eduardoaponte@gmail.com
Dirección	Teléfono	Teléfono celular	Correo electrónico

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
BOGOTA D.C.	Urbana [X] Rural [ ]	SUBA	BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13.240.346	

39. Ubicación				
CALLE 3A 7B 149	5801473	obras.jovavi@gmail.com	LOS PATIOS	NDS
Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento

VIGILADO Supersalud

capitalsalud eps-s
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de Identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
SIERRA	MALDONADO	ROBERTO	ANTONIO

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
PT	7166646	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva. Institucional o de Oficio
ROBERTO ANTONIO SIERRA MALDONADO PT 7166646	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] — Cantidad — Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) ROBERTO ANTONIO SIERRA MALDONADO identificado(a) con P.P.T. No 7166646, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 08 de noviembre del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-19, 02:52:23 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66473510

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 19/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	COLEGIOS RAFAEL URIBE	**Código Sucursal**	COLEGIOSLU
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	48
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8572099	JOSE LUIS BARRIOS CONRADO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 10185609	VASQUEZ ARCE VLADIMIRO	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 52210303	PERDOMO QUINTERO ALEXANDRA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 72097594	POLO GUETTE ANTONIO LUIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79040683	CORTES RUBIANO WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79451618	SANCHEZ BENAVIDES JAIRO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79482086	HINCAPIE JOHN JAIRO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79526595	MARTINEZ ARENAS HONORIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79566080	BERNAL VARGAS JOHN ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79632384	LONDOÑO BUSTOS JAIME	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79925721	ORTIZ JOSE AGUSTIN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79972033	ACOSTA DOMINGUEZ LUIS GABRIEL	01	00		X														0	21	21	21	21	COLFONDOS	$ 812.000	$ 130.000	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 80111297	LONDOÑO QUIÑONEZ JONATHAN	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80381325	ROSAS BARRERA PEDRO ANTONIO	01	00	X	X														0	27	27	27	27	COLPENSIONES	$ 1.044.000	$ 167.100	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.044.000	$ 41.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.044.000	$ 72.700	COMPENSAR CCF	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 80777530	BAYONA RODRIGUEZ DILMER JOVANNY	01	00		X														0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413312	CAICEDO ARDILA WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000224211	ACOSTA DOMINGUEZ KAREN ANDREA	01	00	X															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000971901	FLOREZ INFANTE MILLER ANDREW	01	00		X														0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023363554	PINILLA MOSQUERA JUAN ESTEBAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023903762	SILVA BONILLA JOHAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1024466590	PERDOMO GUERRERO JOHN ALBERT	01	00	X	X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1024497739	VALENCIA ROBAYO FERNEY ALEXANDER	01	00		X														0	26	26	26	26	PORVENIR	$ 1.005.334	$ 160.900	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1028184319	CANDELO RENTERIA SAMIR	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1033770247	GONZALEZ MURILLO KEVIN ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1094276006	BASTO MORA ERMIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1104544198	CAICEDO AVILA ANGEL DAVID	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 19/10/2023 | **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** | **Planilla Nro: 66473510** | **Periodo Cotización: septiembre de 2023** | **Periodo Servicio: octubre de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1115064017	PULGARIN CARDONA DIEGO FERNANDO	01	00	X															0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1123997352	MACIAS OLIVO MADELEINE	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
PT 4342875	CALDERON JAIMES JOSE ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 5881621	ORTEGA CHIRINOS OSCAR EDUARDO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6513909	CHAVERRA CASTRO PEDRO PASCUAL	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6563294	FIGUEROA LOPEZ KELLYS MARIANA	01	00	X															0	12	12	12	12	COLFONDOS	$ 464.000	$ 74.300	COMPENSAR EPS	$ 464.000	$ 18.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 464.000	$ 32.300	COMPENSAR CCF	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
PT 7353844	CASTRO SALDAÑA YORSUAN JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 53.321.335	$ 53.321.335	$ 53.321.335	$ 53.321.335	$ 8.531.800	$ 0	$ 0	$ 2.133.200	$ 3.714.100	$ 2.133.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.512.300	$ 137.100	$ 16.649.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-19, 02:52:23 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66473510

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 19/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	COLEGIOS RAFAEL URIBE	**Código Sucursal**	COLEGIOSLU
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	48
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8572099	JOSE LUIS BARRIOS CONRADO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 10185609	VASQUEZ ARCE VLADIMIRO	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 52210303	PERDOMO QUINTERO ALEXANDRA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 72097594	POLO GUETTE ANTONIO LUIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79040683	CORTES RUBIANO WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79451618	SANCHEZ BENAVIDES JAIRO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79482086	HINCAPIE JOHN JAIRO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79526595	MARTINEZ ARENAS HONORIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79566080	BERNAL VARGAS JOHN ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79632384	LONDOÑO BUSTOS JAIME	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79925721	ORTIZ JOSE AGUSTIN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79972033	ACOSTA DOMINGUEZ LUIS GABRIEL	01	00		X														0	21	21	21	21	COLFONDOS	$ 812.000	$ 130.000	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 80111297	LONDOÑO QUIÑONEZ JONATHAN	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80381325	ROSAS BARRERA PEDRO ANTONIO	01	00	X	X														0	27	27	27	27	COLPENSIONES	$ 1.044.000	$ 167.100	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.044.000	$ 41.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.044.000	$ 72.700	COMPENSAR CCF	$ 1.044.000	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 80777530	BAYONA RODRIGUEZ DILMER JOVANNY	01	00		X														0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413312	CAICEDO ARDILA WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000224211	ACOSTA DOMINGUEZ KAREN ANDREA	01	00	X															0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000971901	FLOREZ INFANTE MILLER ANDREW	01	00		X														0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023363554	PINILLA MOSQUERA JUAN ESTEBAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023903762	SILVA BONILLA JOHAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1024466590	PERDOMO GUERRERO JOHN ALBERT	01	00	X	X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1024497739	VALENCIA ROBAYO FERNEY ALEXANDER	01	00		X														0	26	26	26	26	PORVENIR	$ 1.005.334	$ 160.900	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1028184319	CANDELO RENTERIA SAMIR	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1033770247	GONZALEZ MURILLO KEVIN ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1094276006	BASTO MORA ERMIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1104544198	CAICEDO AVILA ANGEL DAVID	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 19/10/2023 | **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** | **Planilla Nro: 66473510** | **Periodo Cotización: septiembre de 2023** | **Periodo Servicio: octubre de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1115064017	PULGARIN CARDONA DIEGO FERNANDO	01	00	X															0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1123997352	MACIAS OLIVO MADELEINE	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
PT 4342875	CALDERON JAIMES JOSE ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 5881621	ORTEGA CHIRINOS OSCAR EDUARDO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6513909	CHAVERRA CASTRO PEDRO PASCUAL	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6563294	FIGUEROA LOPEZ KELLYS MARIANA	01	00	X															0	12	12	12	12	COLFONDOS	$ 464.000	$ 74.300	COMPENSAR EPS	$ 464.000	$ 18.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 464.000	$ 32.300	COMPENSAR CCF	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
PT 7353844	CASTRO SALDAÑA YORSUAN JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 53.321.335	$ 53.321.335	$ 53.321.335	$ 53.321.335	$ 8.531.800	$ 0	$ 0	$ 2.133.200	$ 3.714.100	$ 2.133.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.512.300	$ 137.100	$ 16.649.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/11/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	371	09/11/2023	CC 9350912	DELGADO ESCARRAGA ALEXANDER	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FE0FACC2A43FC3C3F42AF030E0BF3B25 Certificado impreso el día 11/8/2023 9:45:28 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

ALEXANDER
DELGADO ESCARRAGA
9350912

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 08/11/2023, el empleador JOSE JOAQUIN YANEZ VILLAMIZAR identificado con NIT número 13240346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6373626	08/11/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	9350912	ALEXANDER DELGADO ESCARRAGA	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-11-08

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 8 días del mes de Noviembre del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) ALEXANDER DELGADO ESCARRAGA identificado(a) con C.C. No. 9350912, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 08 de noviembre del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/11/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	370	09/11/2023	CC 1090526545	LOPEZ MENDOZA RAUL	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FE0FACC2A43FC3C3F42AF030E0BF3B25 Certificado impreso el día 11/8/2023 9:44:27 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

RAUL FERNANDO
LOPEZ MENDOZA
1090526545

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
40103402582	0|8|1|1|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
B. Colectiva ☐
A. Individual:
B. Institucional ☐
-Cotizante Cabeza de familia ☒
-Beneficiario afiliado adicional ☐
B. De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒
B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
LOPEZ Primer apellido	MENDOZA Segundo apellido	RAUL Primer nombre	FERNANDO Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1090526545	Femenino ☐ Masculino ☒	0|3|0|3|1|9|8|7

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	PROTECCION	1160000

18.Residencia

AVENIDA 11 N 89 21 **Dirección**	67928810 **Telefono fijo**	3054578748 **Telefono celular**	Obras.ard@hotmail.com **Correo electronico**
BARRANQUILLA **Municipio/Distrito**	**zona** Urbana ☒ Rural ☐	**Localidad / comuna**	ATLANTICO **Departamento**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
		Femenino	Masculino	
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos complementarios

29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
		Tipo			Condición	
		F	N	M	T	P
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

32. Datos de residencia

Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Urbana	Rural			
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA CAP	VSCENTRO - BOGOTA DC
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	01

39.Ubicación

CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO Dirección	5801473 Teleéfono	ALRODE73@HOTMAIL.COM Correo electrónico	ENVIGADO Municipio/distrito	ANTIOQUIA Departamento

No de Radicacion
40103402582

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.**Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.**Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		0|7|1|1|2|0|2|3

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

RAUL FERNANDO LOPEZ MENDOZA CC 1090526545	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	**55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio**

IX.ANEXOS

- ☐ **56.**Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.**Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.**Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.**Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.**Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.**Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) RAUL FERNANDO LOPEZ MENDOZA identificado(a) con C.C. No. 1090526545, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 08 de noviembre del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/11/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	372	09/11/2023	CC 1111337824	GARZON LEAL WILLTON	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

FE0FACC2A43FC3C3F42AF030E0BF3B25 Certificado impreso el día 11/8/2023 9:46:17 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

WILLTON
GARZON LEAL
1111337824

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.170.043-7

CERTIFICA QUE:

WILLTON GARZON LEAL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.111.337.824**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 8 de Noviembre del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 08/11/2023, el empleador JOSE JOAQUIN YANEZ VILLAMIZAR identificado con NIT número 13240346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6373634	08/11/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1111337824	WILLTON GARZON LEAL	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-11-08

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 8 días del mes de Noviembre del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/11/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	388	15/11/2023	CC 79414762	DIAZ PACHON JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

2F2ACEA5F0C119CB87D0408C7CB2C4B9 Certificado impreso el día 11/14/2023 7:09:49 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

JOSE FRANCISCO
DIAZ PACHON
79414762
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
40103402585	1|5|1|1|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
B. Colectiva ☐
A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
B. Institucional ☐ B. De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
DIAZ Primer apellido	PACHON Segundo apellido	JOSE Primer nombre	FRANCISCO Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	79414762	Femenino ☐ Masculino ☒	0|5|0|6|1|9|6|6

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	PORVENIR	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
AVENIDA 11 N 89 21	67928810	3054578748	Obras.ard@hotmail.com

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BARRANQUILLA	Urbana ☒ Rural ☐		ATLANTICO

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA CAP	VSCENTRO - BOGOTA DC
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO	5801473	ALRODE73@HOTMAIL.COM	ENVIGADO	ANTIOQUIA

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.** Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.** Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		1|5|1|1|2|0|2|3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

JOSE FRANCISCO DIAZ PACHON CC 79414762	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	**55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio**

IX. ANEXOS

- ☐ **56.** Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.** Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.** Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.** Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.** Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.** Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.170.043-7

CERTIFICA QUE:

JOSE FRANCISCO DIAZ PACHON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.414.762**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 15 de Noviembre del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 15/11/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	390	16/11/2023	PT 6241695	LEON REQUENA VICTOR	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

60FC70054454017E6BE9D71B3E947F2A Certificado impreso el día 11/15/2023 11:17:20 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VICTOR DANIEL
LEON REQUENA
6241695

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
40103402586	1|5|1|1|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
B. Colectiva ☐
A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
B. Institucional ☐ B. De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
LEON Primer apellido	REQUENA Segundo apellido	VICTOR Primer nombre	DANIEL Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
PT	6241695	Femenino ☐ Masculino ☒	2|4|1|0|1|9|8|6

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M — Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	PROTECCION	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CALLE 23 N 98 32	67928810	3054578748	Obras.ard@hotmail.com

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BARRANQUILLA	Urbana ☒ Rural ☐		ATLANTICO

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA CAP	VSCENTRO - BOGOTA DC
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO	5801473	ALRODE73@HOTMAIL.COM	ENVIGADO	ANTIOQUIA

No de Radicacion
40103402586

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.** Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.** Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		1|5|1|1|2|0|2|3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

VICTOR DANIEL LEON REQUENA PT 6241695	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	**55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio**

IX. ANEXOS

- ☐ **56.** Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.** Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.** Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.** Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.** Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.** Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **LEON REQUENA VICTOR DANIEL** identificado(a) con **PT** número **6.241.695** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 02 de abril de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 15 de noviembre de 2023.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

20231115112348

Medellín, 14 de November de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ESTRUKTEC SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1033789009	REALPE PULIDO CRISTIAN ALEXIS	15/11/2023		38K230l3	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/11/2023 17:45:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.90.14, 192.230.104.9, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo
NIT. 800.251.440-6

No. de Radicación	Fecha de Radicación
	D D M M A A A A

176422920

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación B. Reporte de Novedades X	A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia X B. Colectiva D. De Oficio - Beneficiario o Afiliado adicional C. Institucional	A. Contributivo X B. Subsidiado

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de Cotizante	Código
A. Cotizante X B. Cabeza de Familia C. Beneficiario	A. Dependiente X B. Independiente C. Pensionado	(a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
REALPE	PULIDO	CRISTIAN	ALEXIS

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CN TI CE CD RC CC X PA SC	1033789009	Femenino Masculino X	2 5 0 5 1 9 9 6

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo F N M Condición T P		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC
SURA	PORVENIR	1160000

18. Residencia Dirección	Teléfono Fijo
CL 67 #45-78	

Teléfono Celular	Correo Electrónico
3144924067	crisalexis1274@gmail.com

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana X Rural		CHARCA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
CN TI CE CD RC CC PA SC		Femenino Masculino	D D M M A A A A

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos Complementarios

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco
B1			Femenino Masculino	D D M M A A A A	
B2			Femenino Masculino	D D M M A A A A	
B3			Femenino Masculino	D D M M A A A A	
B4			Femenino Masculino	D D M M A A A A	
B5			Femenino Masculino	D D M M A A A A	

	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo	Condición	32. Datos de Residencia Municipio/Distrito	Zona	Departamento	Teléfono Fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS)
B1		F N M	T P		Urbana Rural			
B2		F N M	T P		Urbana Rural			
B3		F N M	T P		Urbana Rural			
B4		F N M	T P		Urbana Rural			
B5		F N M	T P		Urbana Rural			

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	Centro Medico Teusaquillo	
B		
B		
B		

KPRATA

- Original: EPS -1a Copia: EMPLEADOR -2 Copia: AFILIADO -

Powered by CamScanner

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo documento de Identificación	37. Número del documento de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)
ESTRUKTEC SAS	NIT X TI CE CC PA CD	901614035	

39. Ubicación
Dirección: TV 40 NO 72 D 30 — Teléfono Fijo:
Correo Electrónico: — Municipio / Distrito: BOGOTA — Departamento: CUNDINAMARCA

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CN TI CE CD RC CC PA SC		Femenino Masculino	D D M M A A A A	15/11/2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones
SANITAS	Código	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [X] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [X] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio
Cristian Realpe Patiño	Yolanda Buitrago

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC — Cantidad: X — TOTAL 1
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial (Código del Municipio / Código del Departamento)	67. Datos del SISBÉN (Número de ficha / Puntaje / Nivel)	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
		D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento	Número de documento de identidad	71. Firma del Funcionario

Observaciones:

E.P.S. Sanitas
Operador Sanitas Mamá y Más
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
POR LA EPS
15 NOV 2023

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial	Sello de Radicación	Sticker procesamiento
Rhuland Lopez 1058818852	Recibido por:	

Powered by CamScanner

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CRISTIAN ALEXIS REALPE PULIDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.033.789.009**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Noviembre del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN

No. 6212087

COL

PEREZ TAMBO
APELLIDOS
FRANKLIN EMILIO
NOMBRES
VEN
NACIONALIDAD
M
SEXO
14798515
DOC. DPTO.
23-09-1978
FECHA DE NACIMIENTO
19-04-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO

Franklin
FIRMA



E0581134

INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

MIGRACIÓN

www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL6212087<<0<<<<<<<<<<<<<<<
7809235M3105308VENE0581134<<<4
PEREZ<TAMBO<<FRANKLIN<EMILIO<<

Direccion Calle 76 b# 8B - 17
Telefono 3204857959
correo Ftambo44@gmail.com.

Powered by CamScanner

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/11/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900858870	**Cédula Usuario:**	CC 79127761
Nombre:	INSTALACIONES AG SAS				
Dirección:	TV 127A BIS N 137A 44				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	MARCE93_70@HOTMAIL.COM				
Teléfono:	6898588		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5432201 INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE LA INSTALACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CALEFACCION (ELECTRICOS, DE GAS Y DE GASOLEO), CALDERAS, TORRES DE REFRIGERACION, TUBERIAS DE VAPOR, SISTEMAS DE ASPERSORES CONTRA INCENDIOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79127761	ALBERTO GARCIA SERRATO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	189	04/11/2023	PT 6212087	PEREZ TAMBO FRANKLIN	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

2C52BB21A980CE94066DB67B134609C8 Certificado impreso el día 11/3/2023 3:38:33 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

FRANKLIN EMILIO
PEREZ TAMBO
6212087

INSTALACIONES AG SAS
900858870

Este carné es personal e intransferible.
