FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal EPS-S

NIT 800.130.907-4

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

CONSECUTIVO No.

No. de Radicación | Fecha de Radicación: 04 | 11 | 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: -Cotizante o Cabeza de Familia ☒ -Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐

3. Régimen: A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: PEREZ	Segundo apellido: TAMBO	Primer nombre: FRANKLIN	Segundo nombre: EMILIO
7. Tipo de documento de identidad: PPT	8. Número del documento de identidad: 6212047	9. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☒	10. Fecha de nacimiento: 23 | 9 | 1978

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo ☐ Condición ☐	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: POSITIVA	16. Administradora de Pensiones: Porvenir	17. Ingreso base de cotización -IBC: 1'160.000
18. Residencia: CL 76b 8B-17	Teléfono fijo: 3204857959	Correo electrónico:
Municipio/Distrito: Bta	Zona: Urbana ☒ Rural ☐	Localidad/Comuna: Departamento: Cund

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

SaludTotal RECIBIDO PARA ESTUDIO 04/NOV/2023 CORREDOR: GRUPO ALIANZA SOLUCIONES EMPRESARIALES NIT 830076[illegible]

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
Instalaciones A & S	NIT	900858870	Bogotá

39. Ubicación: Dirección: CL 175 15-20 | Teléfono: 5510828 | Correo electrónico: | Municipio/Distrito: Bogotá | Departamento: Cund

F385-RVA V.1.0-2016

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

NIT 800.130.907-4

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

CONSECUTIVO No.

No. de Radicación | Fecha de Radicación: 04 11 2023

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

Datos básicos de identificación

Tipo de documento de identidad [ ]		Sexo Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento	42. Fecha 04 11 2023
43. EPS anterior Salud Total.		44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

Franklin Perez Tambo	Pablo Simbaqueba
54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de Oficio

ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio [ ] Código del departamento [ ]	67. Datos del SISBÉN: Número de ficha [ ] Puntaje [ ] Nivel [ ]	68. Fecha de radicación 04 11 2023	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Tipo documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	65. Firma del funcionario Nicolas Pinzon

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

F385-RVA V.1.0-2016

VIGILADO Supersalud

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FRANKLIN EMILIO PEREZ TAMBO, identificado(a) con Permiso de Protección Temporal No. **6212087**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 3 de Noviembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: INSTALACIONES AG SAS
Identificación NI - 900858870
Sucursal 0
Período Pensión 2023-09
Período Salud 2023-10
Fecha Pago Planilla 2023-10-18

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	5969876
Nombre	JUAN DE JESUS SOGAMOSO QUESADA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar CAFAM
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	27979431
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-09
Periodo Salud	2023-10
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0696000	$ 80.800	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-390

Bogotá, D.C, 19 de noviembre de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RADICACION DE INFORME SEMANAL No.44

Respetados señores:

Por medio del presente, esta interventoría se permite remitir el informe semanal de interventoría No.44, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.4155718 garantizando el cumplimiento del componente contractual literal *G. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO*. El periodo del informe semanal se relaciona a continuación:

- **Informe semanal No.44:** 13/11/2023 al 19/11/2023

Sin otro particular.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexos. Nueve (9) folios

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	CUATRO (4) MESES	PRORROGA 1:	122,00
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de mayo de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de abril de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	485	PLAZO ACTUALIZADO:	455
PLAZO TRANSCURRIDO:	320 EQUIVALE AL 65,98%	PLAZO TRANSCURRIDO:	303 EQUIVALE AL 66,59%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 371.557.789,00	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 5.050.000.000,00
VALOR ADICIÓN No.2:	$ 187.000.000,00	VALOR ADICIÓN No.2:	$ 1.870.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.437.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 18.861.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ 700.956.706,00	VALOR PAGADO:	$ 9.527.028.090,00
VALOR POR PAGAR:	$ 736.189.021,00	VALOR POR PAGAR:	$ 9.334.234.060,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	19/12/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	24/11/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	30/10/2023	13/10/2023	17
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	24/11/2023	13/11/2023	11
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS**	20/12/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	31/10/2023	1/11/2023	-1
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023	4/10/2023	-67
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	7/11/2023	16/10/2023	22
29	**TALLER BICICLETERO**		9/10/2023	
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**303**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 231.906.572,00	$ 231.906.572,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 225.628.807,36	$ 225.628.807,36	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	10/04/2024	NO HA INICIADO

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.010.000.000,00	$ 965.903.486,84	95,63%	1/11/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 485.207.002,00	$ 387.426.535,00	79,85%	26/12/2023	EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 841.548.020,00	$ 679.576.491,54	80,75%	2/11/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.260.838.192,85	$ 1.260.838.192,85	100,00%	28/08/2023	FINALIZADO
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	17/04/2024	NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 350.997.438,48	$ 350.997.438,48	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 827.987.076,00	$ 556.065.942,00	67,16%	20/02/2024	EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	30/03/2024	NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 762.681.025,00	$ 612.574.250,00	80,32%	5/01/2024	EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.228.838.776,00	$ 1.228.838.776,00	100,00%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.206.469.428,00	$ 980.328.057,70	81,26%	22/11/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ 135.438.403,56	27,20%	29/02/2024	NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.221.970.692,20	$ 1.221.970.692,20	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	11/04/2024	NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ 5.437.271,00	1,78%	14/02/2024	NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ 414.257.543,00	63,10%	28/02/2024	NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ 288.494.194,00	85,01%	2/03/2024	NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.027.739.816,00	$ 1.875.491.516,58	92,49%	8/04/2024	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	18/04/2024	NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ 251.696.446,54	74,94%	28/12/2023	NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 702.836.423,00	$ 571.949.733,00	81,38%	7/02/2024	EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
29	TALLER BICICLETERO	$ 250.000.000,00	$ 201.665.828,00	80,67%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
27	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 532.852.321,00	61,78%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intervenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	Se realiza reunión con la SED, directivos de la institución, contratista e interventoría; donde el especialista de la sed emite recomendaciones para subsanar problema d3e las bombas y presión en las baterías sanitarias de la institución.	FRENTE TERMINADO Y EN OBSERVACIÓN

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

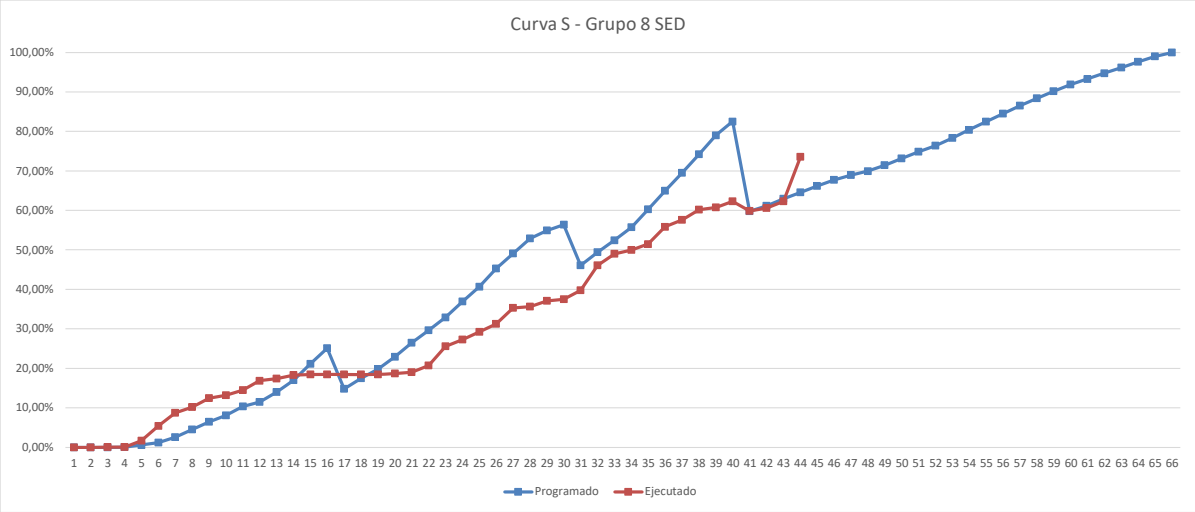
No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua finalizando actividades referente a detalles de acabados, se continua con la compactación del recebo para la intervención de la cancha, se requiere mejorar acabados en bordillo de escaleras.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: Dos (2). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Se realiza de implatacion de los arcos de las canchas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor.
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se termina con la instalacion de las luminarias y se realiza el aseo en las baterias sanitarias de profesores.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se espera a la salida de los estudiantes para comenzar la intervencion de la cancha.	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se continua con la instalacion de la estructura metalica de la pergola en el area de la plazoleta, se continua con el sellamiento de juntas y la aplicación del autonivelna	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: dos(2) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de instalación de red electrica y aparatos, continua actividad de ijstalacion de cielo raso en pvc. Continua actividad de encorozado.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Compresor y herramienta menor.
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Se continua con la pintura y acabados en la sala de profesores primer piso, se inicia con la actividad de instalacion de ventana en aluminio en el area de la biblioteca	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Sa continua con la pintura de fachada y la pintura de vigas y columnas, se realiza pintura de placa en los accesos del bloque, se isntalan las puertas de madera en el area administrativa	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, IGABRIELA MISTRAL**	Se continua con la instalación de piso en porcelanato en área de bodega 1, el cual se le realizó alistado impermeabilizado debido a la presencian de humedad, se requiere la intervención del componente eléctrico.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: 1 (1) persona. Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	Se realiza proceso de desmonte de cubierta existente e inmediatamente se inicia con la instalación de la estructura metálica para el manejo de las pendientes a dos (2) aguas.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Doce (12) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Continua con la instalación de pañete en bloque #12, e instalación de tubaria eléctrica, mantenimiento de puertas , desmonte de cubierta en asbesto cemento en zona de bachillerato, y compactación en zona de circulación acceso a aulas segundo piso enn zona de primaria.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Doce (12) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua actividad de demolición de placa, Continua actividad de excavación de material común, Continua actividad de levantamiento de muro estructural, Continua actividad de fundida de columnetas de confinamiento, Continua actividad de fundida de viga de cimentación.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Herramienta menor y rotomartillo
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se espera a la salida de los estudiantes para comenzar la intervención de fachadas	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
28	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	Se continua con la fabricación de paneles en sitio para la instalación del cerramiento, el cual lleva un avance de aproximadamengte 300 M2.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
29	**COLEGIO ALIANZA QUIROGA**	Se realizó acondicionamiento de terreno para la intervención de maloka y aplicación de recebo,se programa fundida de elementos estructurales (Viga de Cimentación) para el dia Jueves 23 de Noviembre 2023.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
30	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	Se inicia la actividad de desmonte de cubierta e instalacion de la misma en el ala 2	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
31	**TALLER BICICLETERO**	Continua extendido y compactación de material de sub base, continua actividad defundida de placa.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora
32	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera de que el contratista inicie con la ejecución del resto de la emergencias que están pendientes a la fecha.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 12.178.007.500,70	64,57%	9,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 13.875.935.545,17	73,57%	



6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Con ocasión a la oficialización de la solicitud de adición No.2 al contrato de obra por un valor de $ 1,870,000,000 y una prórroga por un término de cuatro (4) meses calendario, la cual fue extendida a la SED durante el periodo semanal anterior y que contaba con previo aval de la Entidad Contratante, para el presente periodo semanal continúa la vigencia la nueva programación, la cual extiende el plazo contractual hasta el 19 de abril de 2024 y permite la reorganización del inicio de varios frentes, que no han podido iniciar por la extensión de los alcances de otros que están en ejecución y por la condición administrativa y profesional del equipo que está a cargo del proyecto. Se hace la salvedad que varios frentes han variado en su valor de ejecución, dadas las necesidades que se van presentando a diario y las autorizaciones que se dan desde la SED.

Para el presente periodo semanal, el proyecto tiene un impacto positivo en su ejecución, en vista que el contratista adquiere prácticamente la totalidad de las cubiertas que son requeridas en los frentes de ejecución, así como la estructura metálica y demás insumos de gran relevancia. También se evidencia un incremento representativo en la ejecución, ya que trabajaron horarios extendidos y fines de semana, lo cual permite que el proyecto a hoy cuente con un avance positivo del 9,00%.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:



Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y no realizó la entrega de su concepto técnico.
Colegio Restrepo Millán sede D: El riesgo existente con las redes eléctricas será intervenido a través del alcance del frente.

Pendiente la atención de varias emergencias a la fecha que ya fueron notificadas de manera oficial al contratista de obra.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública








FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

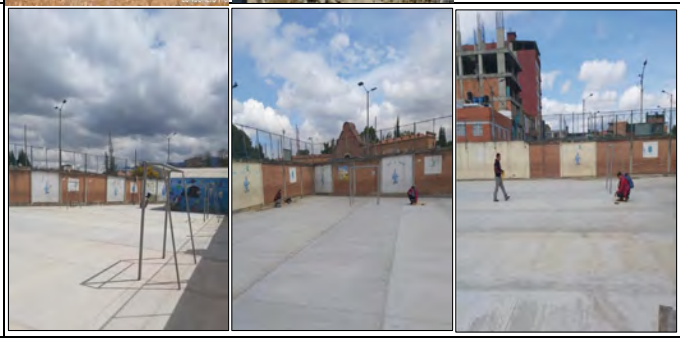10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**		
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		
4	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
5	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		




CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

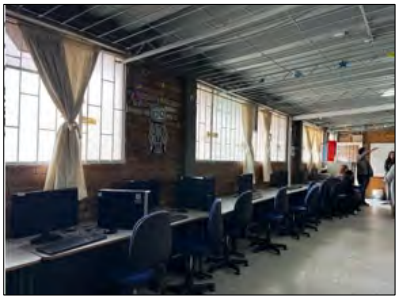	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
6	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA		  
7	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		  
8	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	 	  
9	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	 	  
10	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA		  



CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
11	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  
12	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D,GABRIELA MISTRAL**	  	  
13	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
14	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
15	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		  


CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
16	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  
17	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		  
18	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**		  
19	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		  
20	**TALLER BICICLETERO**		  

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

21	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

Relación Entradas

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADA POR	DIRGIDA A	REQUIERE RESPUESTA	DOCUMENTO DE RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
25/10/2023	2023_RUU_MGP_256	Solicitud adición presupuestal No. 2 y prorroga No. 1 al contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Atn: Edgar Alfredo Salazar Bernal Representante legal Consorcio TIG	SI	Este fue traslado a la SED Luego de que estubiese subsanado el documento, con copia al contratista	20/11/2023
25/10/2023	2023_RUU_MGP_257	Acta de Pago Parcial No 9.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Atn: Ing. Ing. Edison ricardo duarte Directora de interventoria	NO	N/A	N/A

Firma:

Nombre: EDISON RICARDO DUARTE DÍAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Código	Vigencia
FMI022-1	7/1/2021

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2023

2023_RUU_MGP_256

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Edgar Alfredo Salazar Bernal
Representante legal Consorcio TIG
Carrera 47A No 93-41 Barrio La
CastellanaBogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Solicitud adición presupuestal No. 2 y prorroga No. 1 al contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645

Cordial saludo,

Yo MATEO LUZARDO VILLAMIZAR, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de representante legal de la figura plural, CONSORCIO MIA GP distinguida con NIT. 901.634.703-9, por medio del presente escrito y teniendo en cuenta el asunto de la referencia, me permito esgrimir para su conocimiento, los motivos técnicos y razones que redondean la solicitud adición No 2 por un valor de mil ochocientos setenta millones con cero pesos m/cte ($1,870,000,000) y prorroga No. 1 de cuatro (4) meses posteriores a la fecha de finalización del contrato estipulada para el 19 de diciembre de 2023, en ese orden de ideas, le manifestamos:

Primero: Se han presentado modificaciones y/o ampliaciones de los alcances de las intervenciones generando mayores tiempos en los frentes a intervenir.

Una vez iniciadas las intervenciones en las Instituciones educativas, en el desarrollo de las obras, surgió la necesidad de ejecutar obras adicionales, lo que genero el impedimento de cierre de los frentes de trabajo y la apertura de otros, llevando a una mayor permanencia en obra y tiempos de ejecución no contemplados inicialmente, el cual deberá ser tenido en cuenta dentro de la programación general, estas actividades adicionales son:

- **COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**

Una vez iniciadas las actividades para el mantenimiento de las nueve (09) aulas mediante los cuales se habilitarían los cuatro bloques inferiores del COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR, se estableció por parte de la SED la necesidad ampliar la cobertura del colegio.

El cumplimiento de este objetivo se logra mediante la adecuación de aulas adicionales para lo cual se requiere identificar las necesidades técnicas que deben atenderse en estos espacios, esto mediante el cálculo y propuesta técnica de redes eléctricas, sanitarias e hidráulicas, habilitación de cubiertas y rocería, para de esta manera proceder con la actualización del presupuesto en torno al nuevo alcance y su posterior ejecución. Ver actas de comité 10 de mayo de 2023, 11 de julio de 2023, 03 de agosto de 2023 y finalmente aval de actividades mediante comité conjunto del día 20 de septiembre en las instalaciones de la secretaria de educación.

Este proceso de evaluación de diagnósticos que inicio en el mes de mayo de 2023, donde se realizó estudio técnico de redes existentes, propuesta técnica de instalaciones para habilitación de áreas existentes y ejecución de obras requirió de un tiempo para su análisis y presupuesto, tiempo que deberá ser adicionado al plazo actual del contrato a fin de que puedan ser ejecutadas por el contratista.

- **COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**

El alcance en este colegio obedece principalmente al cambio de cubiertas, por lo cual la institución educativa requirió evacuar los espacios para que se pudieran intervenir de manera paulatina. Esta situación requirió de una logística interna dentro del Colegio para el retiro de mobiliario y entrega de los espacios por lo cual los trabajos se han ejecutado en la medida que la Institución Educativa coordina la entrega de espacios.

Es de resaltar los planteamientos del comedor ya que requería inicialmente conceso entre las partes (institución educativa y compensar) para la entrega de alimentos la intervención contemplaba realizar un mantenimiento a piso existente en tablón de gres, mediante el llenado de juntas, sin embargo, se determinó que el piso existente presentaba deterioros significativos (golpes, destornillamientos, levantamiento de piezas) lo cual impedía que el Contratista garantizara un adecuado mantenimiento, además de presentarse esta condición en aproximadamente el 60% de la superficie. Por lo anterior se decidió realizar el reemplazo total del piso existente, con lo cual se incurrió en tiempos adicionales de demolición de piso completo, retiro de escombros con trasiego significativo teniendo en cuenta la ubicación del comedor en relación con los centros de acopio e instalación de piso en granito pulido alrededor de 300mts de recorrido.

- **COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**

Debido a vetustez de la estructura se generó un desplome de la cubierta lo cual llevo a una emergencia dentro de la biblioteca. Se requirió entonces realizar cambio de cubierta tipo colonial, un encorozado entre la cubierta y ajuste a la estructura existente. En recorrido de obra de 02 de octubre de 2023 dentro de las instalaciones se avaluó la condición de los cielos falsos en PVC del área de biblioteca pasillo y oficinas aledañas, encontrando que las mismas se encontraban deterioradas y presentaban exceso de residuos generados por el polvo que se genera entre la cumbrera y el cielo falso, los excrementos de las palomas que viven en la cumbrera y los desprendimientos de esterilla, barro y madera que se generan de la estructura de la cubierta.

Debido a que estas actividades no se encontraban incluidas dentro del alcance inicial se requirió un periodo de tiempo que afecto el cronograma inicial de obra.

- **COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**

El frente de obra inicialmente contemplaba en su alcance la impermeabilización parcial de piso 3 del área administrativa, junto con la demolición y construcción de tarima del patio central. El alcance de la impermeabilización fue ejecutado en un 100% a la fecha, sin embargo, lo que compete a la ejecución de tarima se han tenido diferentes versiones de arquitectura y estructura, lo que ha llevado a una mayor permanencia en obra por parte del consorcio MIA GP, así las cosas, a la fecha se encuentra suspendido el frente de obra hasta que se cuente con un diseño aprobado por las partes (Interventoría, SED y el representante de la IED). Por lo tanto, una vez sea reactivada su ejecución se debe considerar la reposición del tiempo perdido por condiciones no imputables al contratista.

Segundo: Se han generado ampliaciones sobre los alcances de las intervenciones como se evidencia en los distintos comités de obra.

Tercero: Se han presentado afectaciones en la ejecución de la obra a causa de las lluvias presentadas y es de resaltar que la mayoría de las intervenciones son en áreas de cubiertas lo cual ha generado atrasos en el desarrollo del proyecto.

Existen actividades que requieren de tiempo seco para ser ejecutadas y que son de alto impacto dentro de los alcances de las intervenciones, a saber, el cambio de cubiertas, excavaciones, instalación de estructura para canchas, obras de urbanismo como andenes.

Cuarto: Se ha requerido atender a requerimientos logísticos y evacuación de espacios para la habilitación de espacios. Así mismo, se ha visto afectado el tiempo en el

suministro de materiales debido a la escasez que se presentó al inicio del presente año.

Quinto: No se han iniciado la ejecución a la fecha los siguientes frentes debido a que se deben replantear las fechas del cronograma paralelamente lo cual incurre en mayores esfuerzos y personal mínimo no contemplado dentro del contrato inicial. Por lo cual se requiere un tiempo adicional para su ejecución.

COLEGIO	SEDE
COLEGIO ALFREDO IRIARTE	B
COLEGIO JOSE MARTI	C
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	B
COLEGIO QUIROGA ALIANZA	B
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	A

Ilustración 1 Frente pendientes por inicio de actividades.

Sexto: De acuerdo con la necesidad por parte de la SED se ampliarán los mejoramientos en mantenimientos programados y se generan nuevos alcances y por consiguiente una necesidad de adición de recursos representado en los colegios FE Y ALEGRIA PALERMO SUR, REINO DE HOLANDA SEDE A y LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, con una distribución de recursos de la siguiente manera:

COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO
FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$ 1.497.953.458,00
REINO DE HOLANDA	A	$ 222.046.542,00
LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO		$ 150.000.000,00
TOTAL ADICIÓN No.2		**$ 1.870.000.000,00**

Ilustración 2 >Inclusión y adición presupuestal de frentes de obra.

Los alcances definidos para cada una de las instituciones se describen a continuación:

1. **FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR**

La institución requiere una intervención del componente eléctrico, con suministro e instalación de tableros y acometidas. Cabe aclar que los permisos ante la entidad competente están a cargo de la SED.

Adicionalmente, se debe contemplar la instalación de tanques para el suministro de agua ubicados en la parte superior de la institución, de igual manera los permisos requeridos para el correcto funcionamiento de la institución ante la entidad competente deben ser tramitados por la SED.

se contempla el mantenimiento especifico según la disponibilidad presupuestal asignada y a las actividades requeridas en actas de comité.

2. REINO DE HOLANDA SEDE A

La intervención adicional presupuestada para la institución contempla la pintura de fachada del bloque A, junto con la instalación de mallas de protección en áreas de ventana y cambio de cubierta en policarbonato del patio 1.

3. LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO

La institución requiere una intervención en el área de canchas de voleibol, ya que presentan cierre permanente por el estado actual de las mismas. Se evidencia desprendimiento de material, desniveles y fisuras evidentes que han ocasionado accidentes. Presupuestalmente se contempla el mejoramiento del terreno para evitar a futuro los asentamientos diferenciales que se presentan actualmente.


Por otra parte, se hace la salvedad que la IED FE Y ALEGRÍA SEDE LOS NARANJOS, fue incluida para su intervención dentro de la modificación contractual No.1 con un rubro de $ 455.893.410. Esta sede no podrá intervenirse, en vista que la misma presenta una serie de limitaciones de índole estructural, por lo cual, el recurso que se invierta bajo el concepto de mejoramientos no podrá garantizar la estabilidad de la infraestructura. Ahora y al tomarse la decisión de desistir de esta intervención de manera conjunta entre las partes intervinientes, desde la SED se otorga el lineamiento de reemplazar esta sede por la IED CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA, donde se invertirá este mismo rubro, principalmente en el cambio de cubiertas existentes, estructura para su soporte y ventanería.

Dado lo anterior, desde la firma contratista de obra se sugiere realizar la aclaración sobre esta novedad, para evitar cualquier tipo de inconveniente a futuro.

Por último, presentamos la programación estimada para la intervención de las 25 instituciones que hacen parte del proyecto:

CRONOGRAMA OBRA - REPROGRAMACION
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8

Id	Fecha de restricción	Item	COLEGIO	Unid	Costo	Duración
1	NOD		ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVC		$ 18.861.262.150,00	373 días
2	NOD		ACTA DE INICIO DE OBRA		$ 0,00	0 días
3	lun 3/04/23		APROBACION ADICION PRESUPUESTAL No 1		$ 0,00	0 días
4	NOD		MANTENIMIENTO PROGRAMADO		$ 17.998.776.222,00	373 días
5	NOD		COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTI		$ 219.837.434,00	167 días
81	NOD		COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHICALES		$ 198.655.641,00	178 días
139	NOD		COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR		$ 561.308.316,42	96 días
143	NOD		COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		$ 1.023.176.986,00	231 días
266	NOD		COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		$ 545.402.098,00	274 días
349	NOD		COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAY		$ 872.012.618,16	233 días
460	NOD		COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA		$ 1.052.310.944,86	176 días
551	NOD		COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO		$ 332.100.486,00	121 días
555	NOD		COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICI		$ 495.768.173,00	339 días
650	NOD		COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MA		$ 1.138.257.853,00	230 días
713	NOD		COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REI		$ 286.045.284,00	106 días
717	NOD		COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PA		$ 770.138.768,23	183 días
802	NOD		COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA		$ 1.407.815.813,89	372 días
924	NOD		COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATER		$ 1.003.774.832,33	247 días
1042	NOD		COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL		$ 286.045.284,00	100 días
1046	NOD		COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN		$ 1.277.252.363,00	179 días
1198	NOD		COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO		$ 441.972.779,00	116 días
1202	NOD		COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B		$ 363.197.157,00	86 días
1206	NOD		COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A		$ 286.045.284,00	118 días
1210	NOD		COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B		$ 286.045.284,00	96 días
1214	NOD		COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$ 3.865.940.160,12	302 días
1343	NOD		COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN		$ 455.893.410,00	101 días
1347	NOD		COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B		$ 286.045.284,00	106 días
1351	NOD		COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A		$ 665.005.624,00	250 días
1458	NOD		COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		$ 268.726.344,00	102 días
1490	NOD		ATENCION DE EMERGENCIAS		$ 862.485.928,00	370 días
1491	NOD		ENTREGA DE OBRA		$ 0,00	0 días

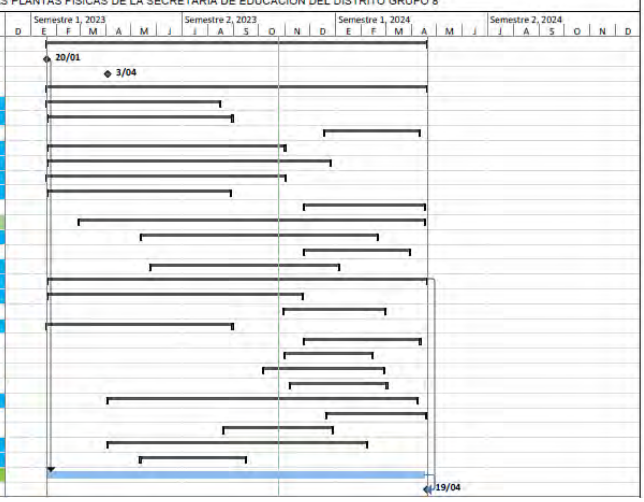

lustración 3 Programación de obra.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El Estatuto de la Contratación Estatal consagró la posibilidad de realizar modificaciones a las condiciones contractuales, con fundamento en la necesidad de salvaguardar el interés general y los fines del estado. Fines e intereses que se encuentran inmersos en toda obra pública. En relación con este punto la Corte Constitucional ha señalado: "Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato"[1].

En efecto, el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 estableció la posibilidad de suscribir modificaciones al contrato con la finalidad de evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con el proyecto. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las circunstancias establecidas en el primer acápite del presente documento, que afectan el cumplimiento a cabalidad del cronograma de obra y constituyen el fundamento de la necesidad de prórroga del contrato.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado sobre el plazo contractual lo siguiente:

> *"Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él,*

[1] Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él"[2]

De lo anterior se desprende que, la suscripción de un acuerdo modificatorio del plazo contractual constituye una prerrogativa en cabeza de las partes contractuales que no desnaturaliza el contrato ni su objeto, por lo tanto, se basa solamente en la necesidad del proyecto.

En ese orden de ideas, tal como se ha manifestado en un principio, los cambios del alcance y adición de frentes que presenta el contrato, generan la necesidad de ampliar en plazo contractual y así asegurar el cabal cumplimiento de la obra y los fines del estado inherentes al proyecto contratado.

En relación con la posibilidad de ampliación del plazo contractual la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa ha señalado:

"La prórroga constituye un valioso instrumento para la administración, por cuanto pueden existir eventos en los que la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público hagan aconsejable la extensión del plazo inicial del respectivo contrato.

"no puede desconocerse que la prórroga de los contratos…puede ser aconsejable para la administración desde el punto de vista técnico y financiero. Por ello, la entidad competente debe contar la posibilidad de evaluar los beneficios que produciría para el Estado y para el interés público la ampliación del término inicial del contrato"[3]

En ese entendido, la suscripción de una prórroga al plazo contractual del contrato de la referencia constituye una necesidad teniendo en cuenta el estado actual del proyecto, la falta de concreción de diferentes de los alcances en los frentes de obra han afectado notoriamente en el cronograma de obra.

SOLICITUD

Por los argumentos expuestos, solicitamos:

1. Prorrogar el contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 por un término de cuatro (4) meses calendario, es decir hasta el 19 de abril del 2023 por los motivos expuestos anteriormente.

[2] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171)A, C.P. Darío Quiñones Pinilla.
[3] Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012. C.P. OLGA MÈLIDA VALLE DE LA HOZ.

2. Adicionar el contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645, por un valor de MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES CON CERO PESOS M/CTE ($1,870,000,000).

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Presupuesto general adición (4 colegios) Programación de obra (25 colegios)
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2023

2023_RUU_MGP_257

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Ing. Edison ricardo duarte
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Acta de Pago Parcial No 9.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega del Acta de Pago Parcial No 9 correspondiente al periodo del 20 de septiembre de 2023 al 19 de octubre de 2023, esto para su revisión, aprobación y posterior gestión ante la entidad contratante.

Se adjunta:

- Acta parcial en Excel y PDF
- Memorias de Calculo Excel y PDF
- Aportes parafiscales
- FURC - Hoja información de pagos
- RUT y RIT CONSORCIO MIA GP
- Pre Factura No MGP-09
- Resolución de facturación DIAN
- Certificación Bancaria

Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Lo enunciado
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

Anexo 1.1.3. Actas de reunión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	23/10/23	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	IED Liceo femenino.
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes	SED, Rector, Contratista, Interventoria.					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	23/10/23.	**Elaborado por**	Interventoria					**Próxima Reunión**	

Se realiza recorrido con la SED, Obra, Interventoria y Representantes de la Institución Educativa donde se evidencia la terminación, recibo y uso de los espacios intervenidos en el alcance inicialmente acordado, el cual involucro los siguientes espacios:

- Laboratorio de Fisica
- Laboratorio de Biologia
- Laboratorio de Quimica
- Laboratoria tecnologia
- Salón de Música
- Salón de Danzas - Espejos
- Zona de biblioteca donde tambien se cambio de cobierta

NOTA: El Rector manifiesta que los requisitos en cuanto a infraestructura se encuentra cumplidos

Tambien se acuerda la intervención de la cancha de voleibol unicamente en el espacio actualmente demarcado, donde se demolerá la placa existente, se repondrá el material de la estructura, contrucción de placa nueva, demarcación y arcos, teniendo en cuenta que será una reparación con el fin de habilitar la cancha.

Rector

Interventoria

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8	

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO

ÍTEM - ESPACIO - ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	ÍTEM - ESPACIO - ELEMENTO
BIBLIOTECA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN PVC EN AREA DE BIBLIOTECA	1 GL
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 120*30CM PANEL LED Y SALIDAS PARA LUMINARIAS	12 UND
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA VINILO EN MUROS INTERNOS BIBLIOTECA	1 GL
HALL SEGUNDO PISO FRENTE A ESCALERAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO FALSO EN PVC	1 GL
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 120*30CM PANEL LED	8 UND
HALL PRIMER PISO FRENTE A ESCALERAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO FALSO EN DRYWALL	1 GL
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES LED CUADRADOS	10 UND
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EN CIELO FALSO INSTALADO EN DRYWALL	1 GL

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

En Bogotá D.C a los 20 días del mes de Octubre del 2023 se deja constancia de la entrega de Bloque biblioteca del colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño descrito, por las personas que firman a continuación:

FIRMAS

Patricia Jozano
COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO
Almacenista

Yovany T.
Residente Interventoria.
INTERVENTORIA CONSORCIO TIG

CONSORCIO MIA GP.
CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP

Rector

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha 23/10/2023	Inicio 9:30 am	Fin	10:54 am	Lugar	Localidad Rafael Uribe Uribe
Proyecto	Mejoramientos JEP GRUPO # 8			Asunto	Ubicación Tanques para abastecimiento		
Asistentes	SED, contratista de obra e interventoría			Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

NOS reunimos en IED Fe y Alegría Palermo Sur, SED, contratista de obra e interventoria con el propósito de realizar una propuesta referente al abastecimiento de agua para el bloque de bachillerato y bloque de primaria, por lo cual la SED recomienda instalar un tanque de 5000 litros con una bomba ubicado al acceso principal cerca al suministro de la red, y otros tanques ubicados zona alta cerca a la cancha con una capacidad de 15000 litros para un total de almacenamiento de agua de 20000 litros.
El ing hidrosanitario por parte del contratista manifiesta que enviará a la interventoria dos propuestas: en tanques plásticos y en fibra de vidrio con la capacidad para almacenamiento de 20000 litros para el día Viernes 27 de octubre de 2023.

Pablo Sinbaqueba
Especialista Hidráulico
consorcio
educación

Mario Quiroz P.
Ing. Hidrosanitario
SED-DCEE

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria CTIG.

SIG-IF-005
V.1

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	25/10/23.	Inicio		Fin :		Lugar	IED. Liceo Femenino
Proyecto						Asunto			
Asistentes	Rector, Interventoria					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	25/10/23.	Elaborado por	Interventoria					Próxima Reunión	

Se realiza reunión en la I.E.D Liceo Femenino con el Señor Rector de la institución, él cuál solicita el retiro del cerramiento ubicado en la cancha de voleibol y el espacio queda bajo responsabilidad de la institución.

Rector

Residente Interventoria.

CONSORCIO MIA GP.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	25-10-2023	**Inicio**	9:30am	**Fin :**		**Lugar**	Instalaciones de la SED
Proyecto	Mejoramientos SED - Grupo B					**Asunto**	Tarima Marruecos y Molinos		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	25-10-2023	**Elaborado por**	Interventoría - Consorcio TIC					**Próxima Reunión**	

Se lleva a cabo reunión en las instalaciones de la SED, donde se revisa lo siguiente:

Tarima IED Marruecos y Molinos:

- Se realiza trazabilidad de lo acontecido hasta la fecha en lo que tiene que ver con la tarima propuesta.
- Se acuerda ajustar la propuesta con una alternativa en estructura tensada con una teja liviana, propendiendo por retirar por completo los apoyos frontales de la tarima, partiendo del acuerdo concertado el pasado 17-10-2023. y garantizando condiciones de seguridad.
- La SED recomienda que la propuesta se visualice con estructura metálica tubular, tensores donde se requieran, buscando reducir al mínimo el peso de la estructura. Se anexa copia de esquema elaborado por la SED
- El viernes 27 de octubre de 2023 se llevará a cabo reunión entre la SED, obra e interventoría, para revisar el avance de la propuesta según los nuevos lineamientos. Se estima reunión con el rector el 30 de octubre de 2023 para exponerle lo acordado.

Fe y Alegría Palermo Sur:

- Se expone por parte del contratista de obra e interventoría lo que comprende el alcance cuantificado recientemente, el cual asciende a 1.900 millones aproximadamente; para el bloque de bachillerato, lo cual comprende:
  1. Cambio de la totalidad de la cubierta

2 de 3

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin :**		**Lugar**	
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

2. Redes electricas. e iluminacion.
3. Mantenimiento de puertas y ventanas. Estas ultimas se contemplaban como reemplazo.
4. Abastecimiento de agua potable con tanques de almacenamiento.
5. Cajas de recolección de aguas residuales.

Desde la SED se dan lineamientos de la siguiente manera:

1. Cambio de la cubierta - Siempre y cuando se garantice la funcionalidad del colegio al 100%.
2. Redes electricas e iluminacion.
3. Mantenimiento de puertas y ventanas.
4. Abastecimiento de agua potable con tanques de almacenamiento.
5. Cajas de recolección de aguas residuales.
6. Habilitar la L con iluminación, mantenimiento de carpintería metálica y habilitar baterias sanitarias.
7. En el comedor habilitar iluminación y mantenimiento en carpintería metálica.

Soporte. DGT

Ricardo Duarte
Director de Interventoría

Carlos Castro Ospina
SED.

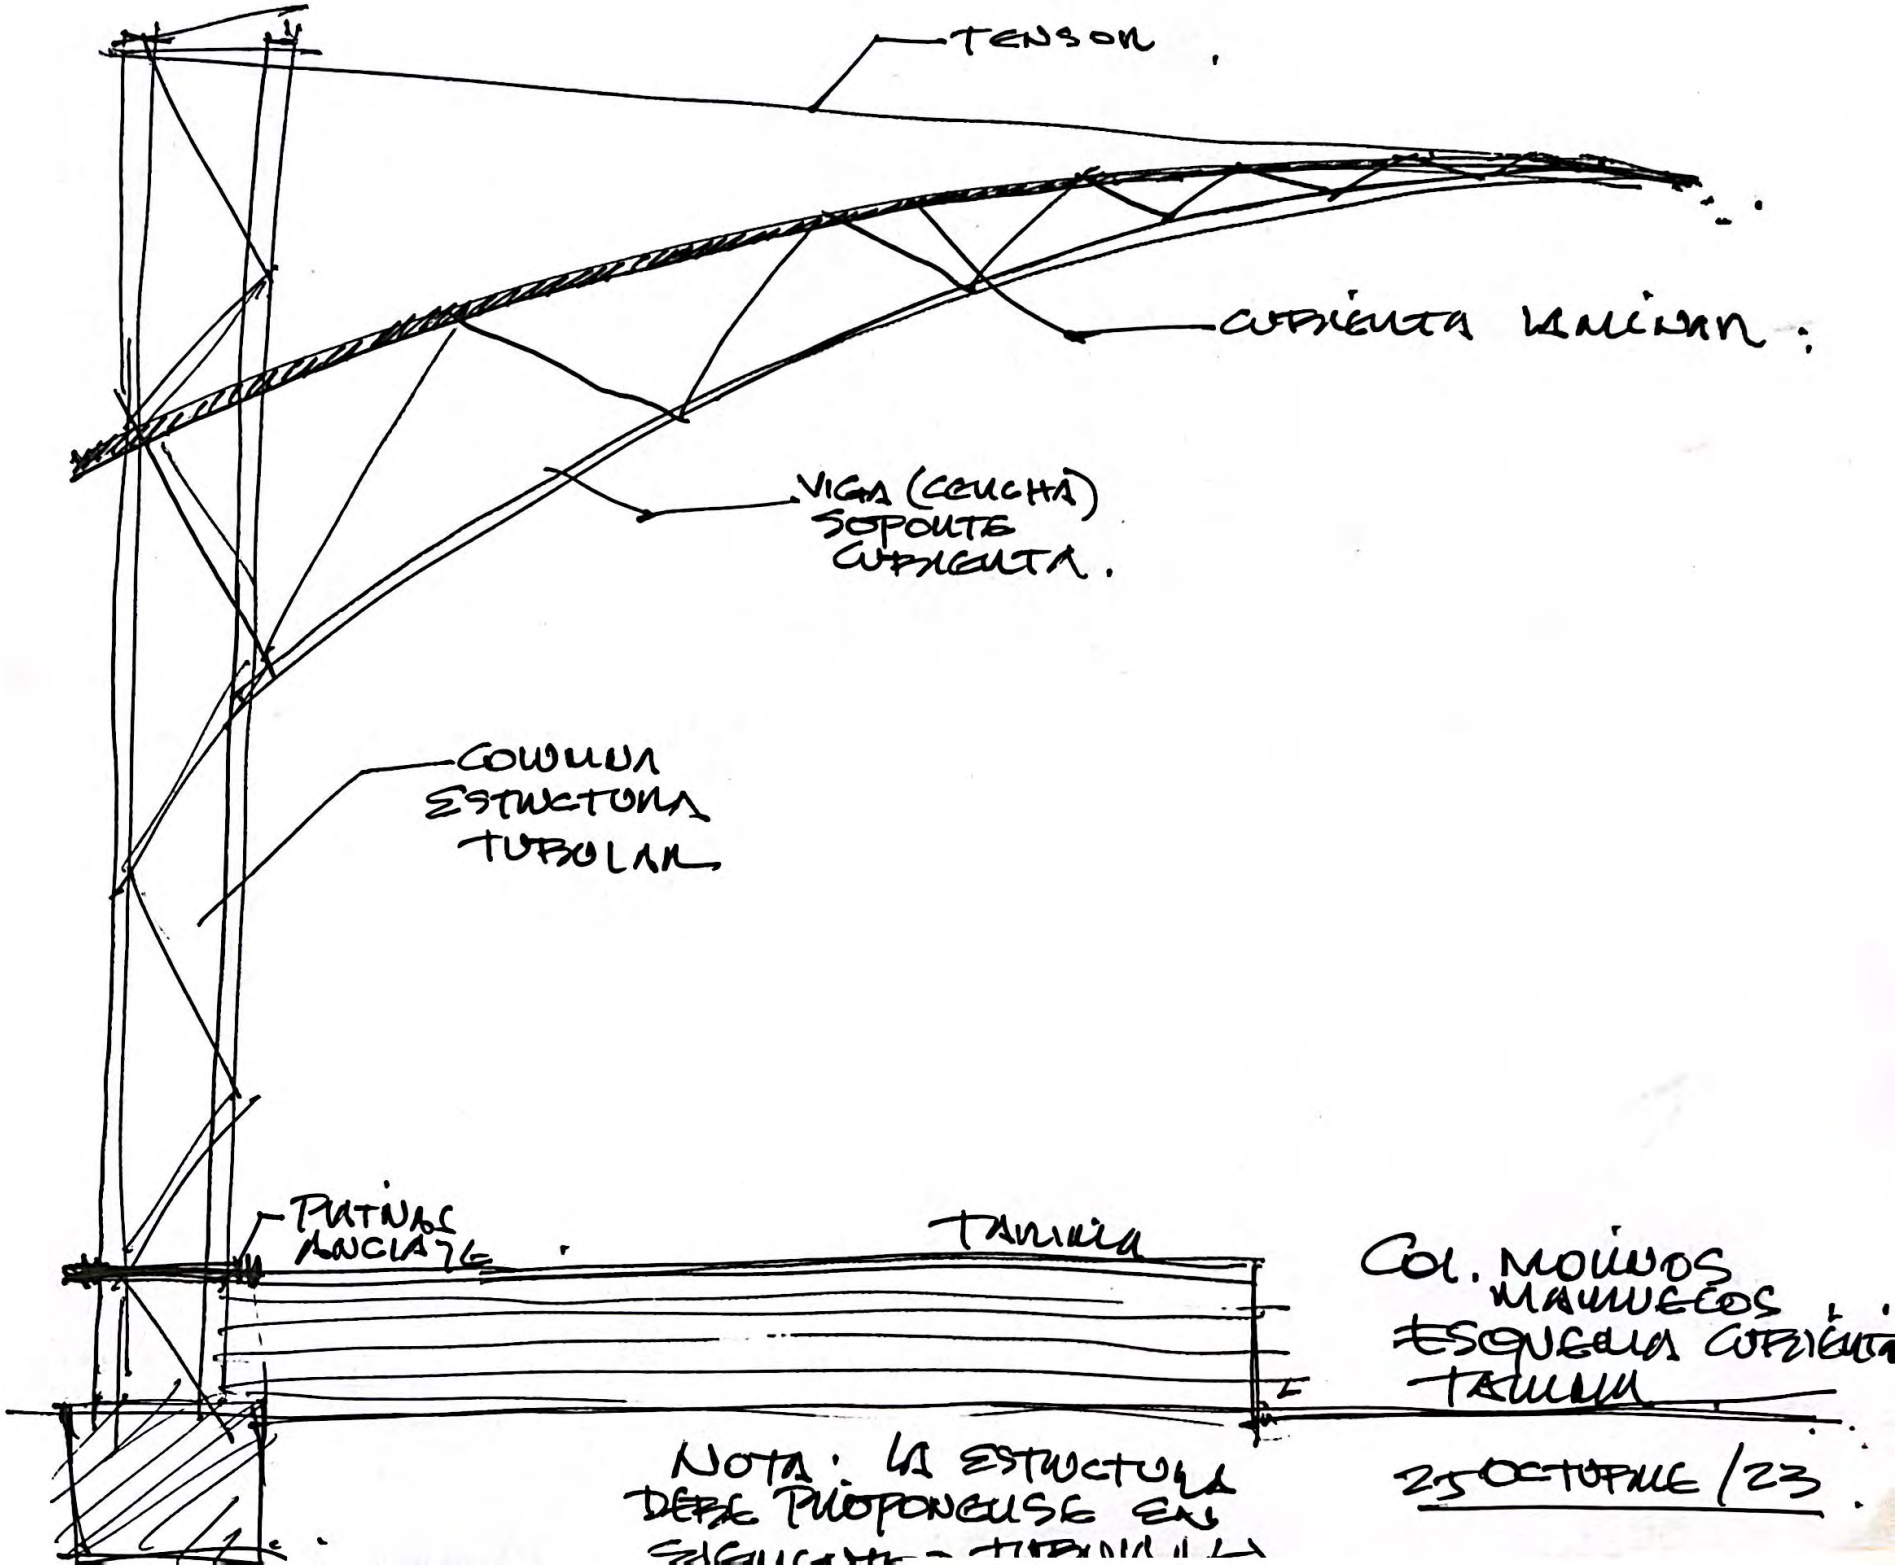
Calidad SED

Gestora Territorial

Interventoría
Consorcio HIA-SP

Directora por

Powered by CamScanner



COL. MOLINOS MANUFACTOS ESCUELA COCINERA TARIMA

NOTA: LA ESTRUCTURA DEBE PROPONERSE EN

25 OCTUBRE /23

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	26-10-2025	**Inicio**		**Fin :**		**Lugar**	IED Liceo Femenino
Proyecto	Mejoramiento 2022					**Asunto**	Entrega de espejos salon danza		
Asistentes	Rector, Interventoria, Contratista					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	26-10-2025	**Elaborado por**	Interventoria					**Próxima Reunión**	

Se realiza recorrido en la IED. Liceo Femenino con el señor rector, con el fin de hacerle la entrega de los espejos instalados en el salón de danza, se aclara que dichos espejos se encuentran en buenas condiciones en el momento de la entrega.

Yovanny T.
Residente Interventoria.

RECTOR

Consorcio MH GP.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha 20/10/2023	Inicio 10:30 Am	Fin 10:50 AM	Lugar Restrepo Millán Sede D
Proyecto	Mejoramientos SED Grupo 8			Asunto	Entrega de obra IED Restrepo Millán D
Asistentes				Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por			Próxima Reunión

Nos reunimos en IED Restrepo Millán Sede D. junto contratista de obra, coordinador de la institución e interventoria para realizar la entrega a entera satisfacción referente a la intervención de los espacios a saber:

- Orientación Vae
- Sala de profesores embera
- Sala de Profesores Vae.

Por lo anterior se realizó cambio de piso existente por porcelanato gris con guardaescoba y pintura en vinilo en muros internos, retiro de cubiculos existentes la interventoria solicita al coordinador el retiro de elementos en donzar para iniciar la intervención del cambio del piso existente

El contratista de obra manifiesta que iniciará la intervención para el día sábado 28/10/2023

Arq Alejandra Anganta
R Interventoria CIHO

Miguel Rincon
C.C. 1036611612
Consorcio MIAGP

Moliquisedec Montero
Aux. Administrativo

Powered by CamScanner


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8	Consorcio Mia Gp Rafael Uribe Uribe

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

COLEGIO RESTREPO MILLAN SEDE D

ÍTEM - ESPACIO - ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	ÍTEM - ESPACIO - ELEMENTO
SALON DE PROFESORES 1	Se realiza desmonte de piso en asbesto cemenleo, afinado de piso en mortero 1:4, espesor 4cm, desinstalacion de divisiones, demolicion de muro en drywall, desinstalacion y retiro de canaleta electrica, desmonte de puntos de datos y electricos. Instalacion de piso tipo porcelanato 60x60 gris, instalacion de guarda escoba 8cm gris, pintura blanca sobre muros de bloque, pintura blanca para techos, limpieza,	
SALON DE PROFESORES 2	Se realiza desmonte de piso en asbesto cemenleo, afinado de piso en mortero 1:4, espesor 4cm, Instalacion de piso tipo porcelanato 60x60 gris, instalacion de guarda escoba 8cm gris, pintura blanca sobre muros de bloque, pintura blanca para techos, limpieza,	
SALON DE PROFESORES 3	Se realiza desmonte de piso en asbesto cemenleo, afinado de piso en mortero 1:4, espesor 4cm, desinstalacion de divisiones. Instalacion de piso tipo porcelanato 60x60 gris, instalacion de guarda escoba 8cm gris, pintura blanca sobre muros de bloque, pintura blanca para techos, limpieza,	

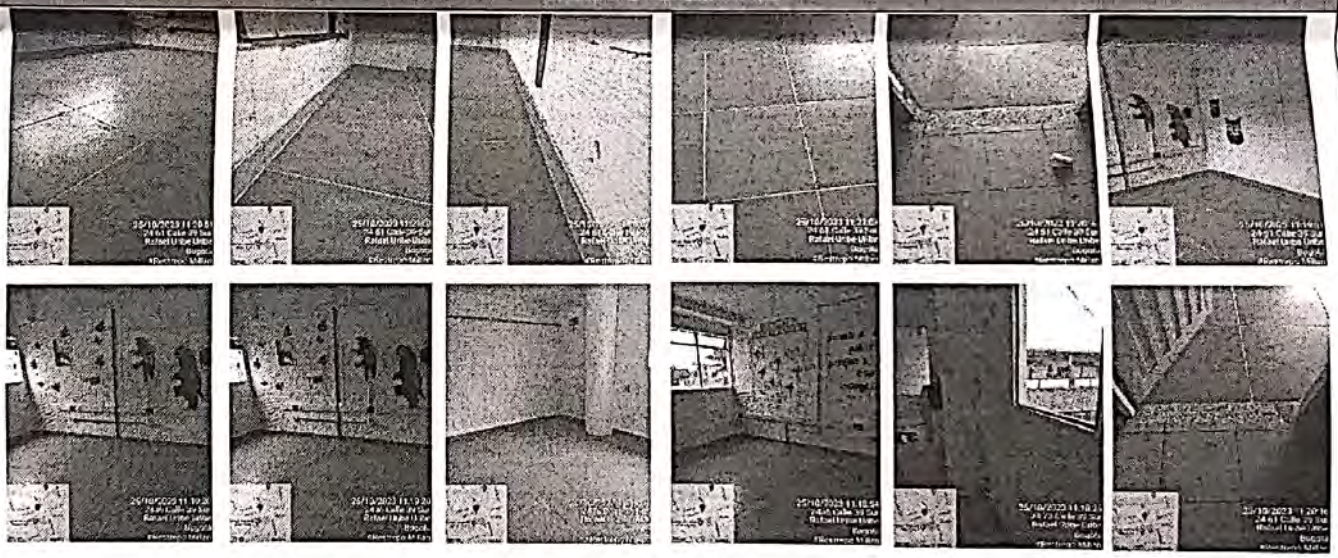REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

En Bogotá D.C a los 27 dias del mes de Octubre del 2023 se deja constancia de la entrega del espacio 3 aireas segun Actu. del colegio descrito, por las personas que firman a continuación:

FIRMAS

Melquisedec Montero Aux Admin

COLEGIO RESTREPO MILLAN SEDE D

INTERVENTORIA CONSORCIO TIG

CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	27/10/2023	**Inicio**	11:00am	**Fin :**	11:40am	**Lugar**	Instalaciones de la SED
Proyecto	Mejoramientos – Grupo 8					**Asunto**	Revisión y ajuste de propuesta cubierta Manueles		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**	Interventoría					**Próxima Reunión**	

Se realiza reunión en las instalaciones de la SED, con el fin de revisar la propuesta ajustada presentada por parte del contratista de obra, en relación a la cubierta de la tarima de la IED Manuelos y Molinos. Se recomienda unos ajustes de forma por parte de la supervisión donde se destaca:

1. Los apoyos de la cubierta deberán verse más robustos y se propone que sean en forma de cercha tubular
2. Se deberá alargar los tubos curvos que van en los extremos, con el fin de que rematen a la placa.
3. Se envía propuesta del ajuste de la supervisión para que sea dibujada por el proveedor y presentada en últimas el día lunes con el rector.
4. Se solicita incluir una cercha donde se pueda apoyar la iluminación y el sonido. Eso queda en revisión.

SUPERVISOR IDCBE
Gestión Territorial

CONTRATISTA

INTERV. SUPERV.

GESTOR

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	30/11/2023	**Inicio**	10:15am	**Fin :**		**Lugar**	Instalaciones de la SED
Proyecto	Mejoramiento 1 – Grupo 8					**Asunto**	Exposición de la alternativa a la IE Manueles		
Asistentes	SED, interventoría, obra, Rectoría de la IED.					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	30/11/2023	**Elaborado por**	Consorcio TIG – Interventoría					**Próxima Reunión**	

Se lleva a cabo reunión en las instalaciones de la SED, con el fin de exponerle a la IED Manueles y Molinos encabezada por su rector, donde se concluye lo siguiente:

- El rector manifiesta conformidad con la propuesta arquitectónica que se adjunta como imagen al acta.
- Bodega queda con piso en concreto, con puerta y sin acabados en el interior.
- Se dejaran tomacorrientes adosados en los apoyos de la cubierta (uno en cada extremo) y un tercero en la zona de la bodega.
- Se dejaran 2 reflectores para la iluminación del escenario de la tarima y 2 puntos de iluminación en la zona de la bodega.
- La altura de la tarima quedará en el punto más bajo aproximadamente en 3.00 metros.
- El piso de la tarima quedarán con acabado en porcelanato.
- La cubierta será en policarbonato alveolar, color gris humo.
- La estructura metálica es en cold rolled con acabado en color negro mate.

El rector solicita la fecha de entrega del proyecto, a lo que la SED manifiesta que será la primera

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

0 máximo segunda semana de enero de 2024.

El contratista informa que reanudará actividades en obra a partir del ~~6~~ 07 de noviembre de 2023, con la continuación de la estructura de cimentación. Se estima que la placa está vaciada al 30 de noviembre de 2023, donde empezarán a correr los tiempos de fraguado de la placa en concreto.

Se establece compromiso que para mediados de diciembre se mostrará avances en la fabricación de la estructura por medio de fotografías.

Se le explica al señor rector que la escalera irá por el costado izquierdo (viendola de frente) pero en dirección de atrás hacia adelante.

Rector

EDWARD VARGAS
REP. PADRES

Rogen Beltran
Personero

Dayron Beltrago
Contralor

Docente M y M

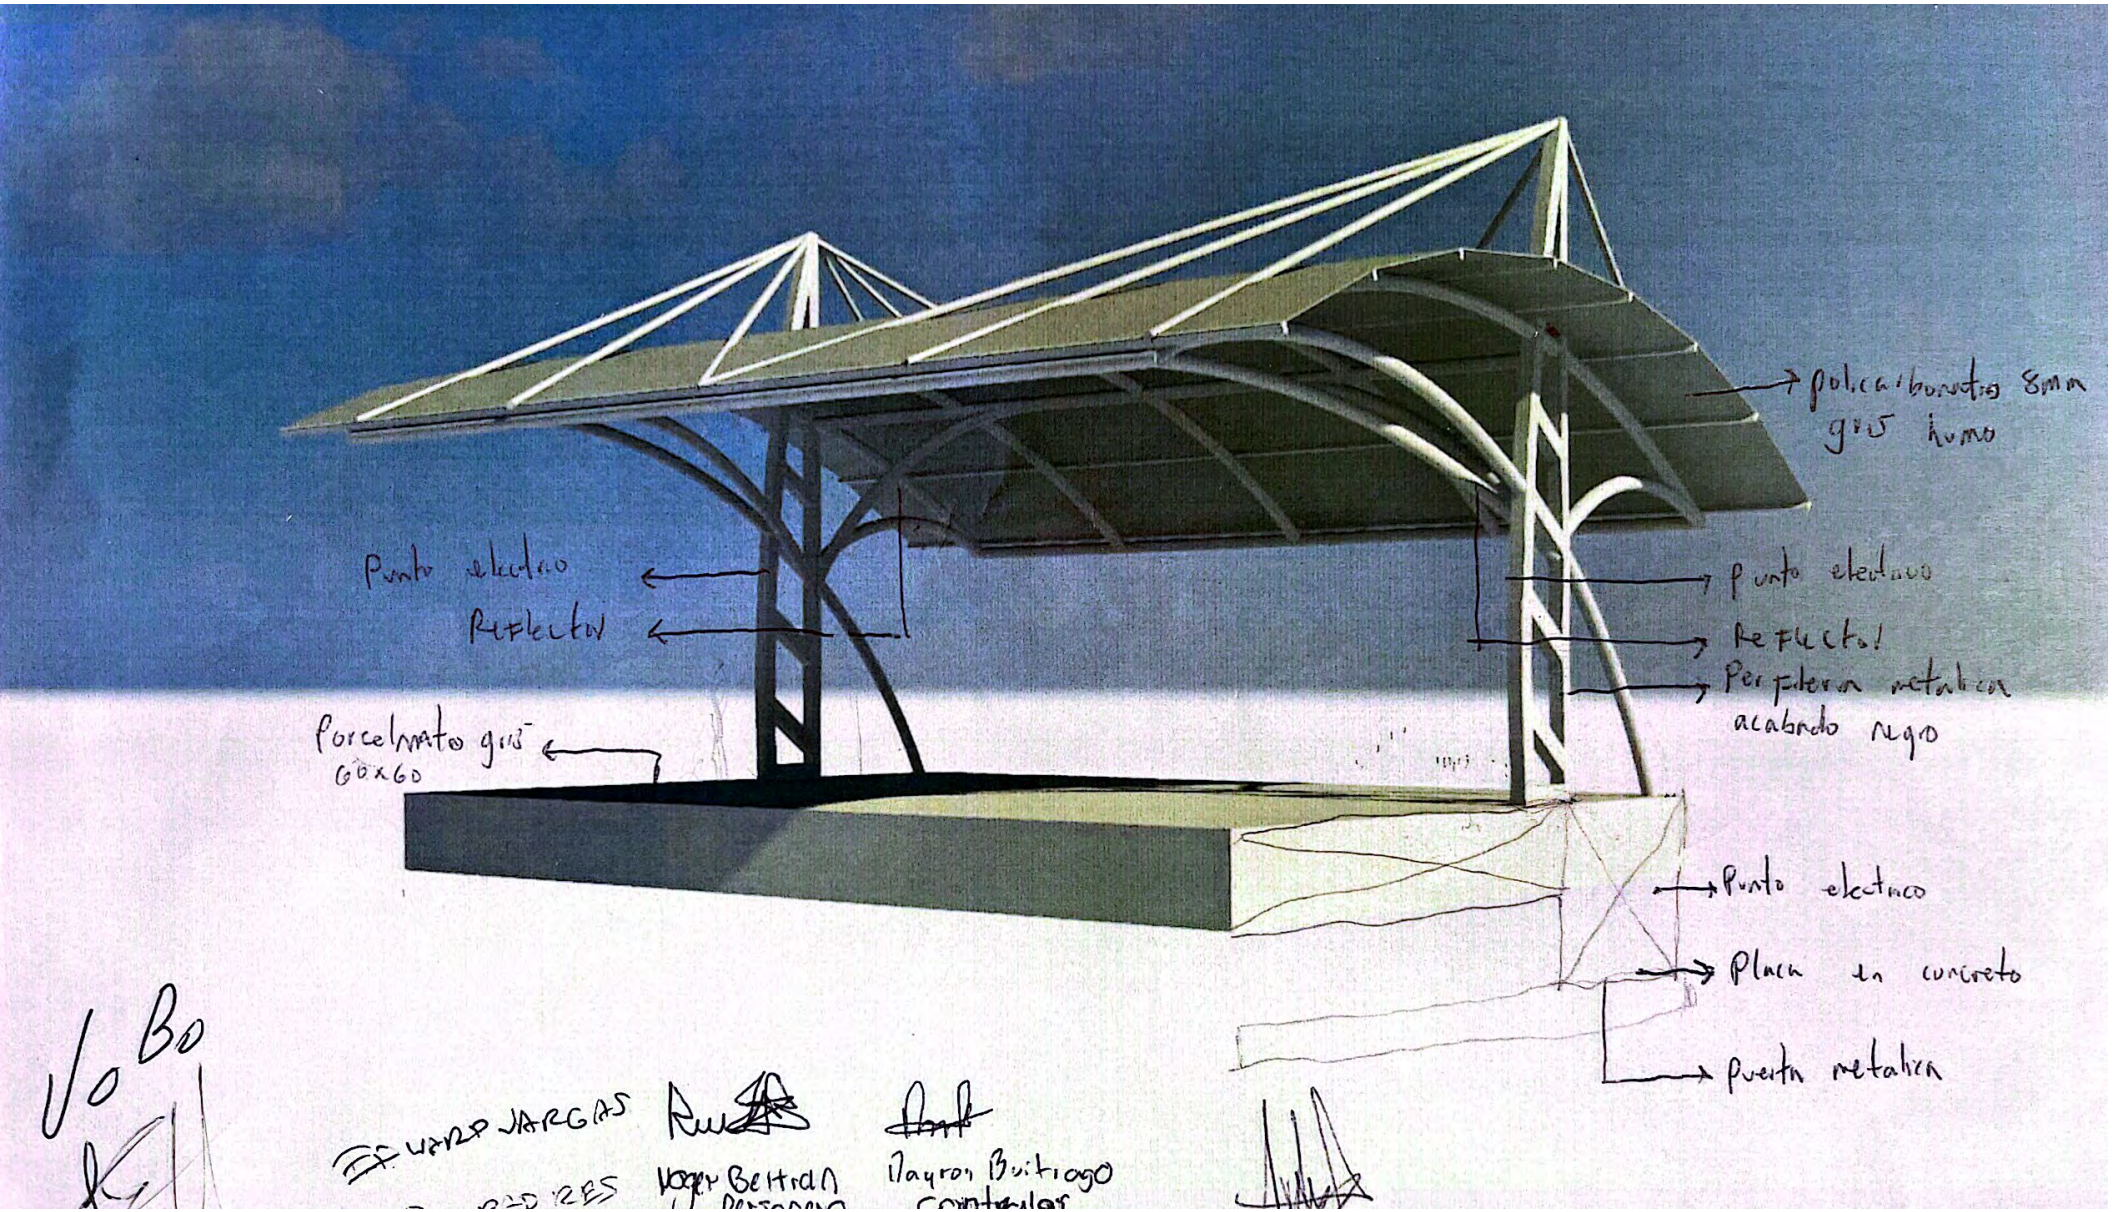
Oscar Gutierrez
Ing. DCCET

Andres Tolrel
Inspector de Obra.
Consorcio MIA GP

Ricardo Ducate

Consorcio MIA GP

Powered by CamScanner



Vo Bo

EDWARD VARGAS

Roger Beltran

Dayron Buitrago

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	30-10-2023	**Inicio**		**Fin :**		**Lugar**	Reino de Holanda Sede A
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes	Rectora, Interventoria, Contratista					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	30-10-2023	**Elaborado por**	Interventoria					**Próxima Reunión**	

Se realiza un recorrido en la IED. Reino de Holanda Sede A con la SED. y la señora rectora, la SED indica hace un estudio estructural deporte del especialista del contratista como el de interventoria al muro divisorio entre la sala de profesores y la biblioteca. Evaluar y enviar el concepto a la SED. Pintura de Cancha Multiple y mantenimiento de arcos, demarcación de Cancha Pequeña y baranda en el costado Posterior de la cancha. Se evaluara una sobre cubierta en la salida de sala de Profesores.

Reino de Holanda Sede B: La SED indica cambio de Puertas, Pintura de salones y fachada de los salones, se va a instalar piso en chip en el area indicada por la SED correspondiente al areá del asfalto. Color de Puertas Azul y Amarillo (anti machucón).

- Reino de Holanda Sede A: Se dejara reja solo en los lados que dan directamente a la cancha.

Rectora

Coordinador

Juan Carlos L.
Consorcio MIAGP

Sebastian K
Consorcio MIAGP

Arq Hilo Tibaquira
SED y SEEE

Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	02-NOV-2023	Inicio	8:30 am	Fin		Lugar	IED Diana Turbay sede B
Proyecto	Mejoramientos SED grupo # 8					Asunto	Seguimiento actividades ejecutadas		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

NOS reunimos en IED Diana Turbay sede B, contratista de obra, SED e interventoría en lo cual la SED manifiesto el cambio de 2 puertas y persiana y portón principal pintura gris de estructura existente y cambio de policarbonato transparente ubicado en la entrada principal. e instalar persiana en aluminio ubicado en área de cubierta en administración
La SED manifiesta que el diseño de las puertas en bloque 3, primer piso en área de aseo debe ser con rejilla en aluminio tipo shut, con respecto a la intervención del patio en adoquín existente debe ser escobiado, e instalar baranda en escalera bloque 3, acceso al segundo piso
Nota: NO se intervendrá las ventanas perimetrales, la preentrega a la rectora para el día martes 7 NOV 2023.

IED REINO DE Holanda SEDE A:
Se realizará una propuesta de diseño del acabado de la fachada, la SED manifiesta que los colores sean mate, nada brillante (colores: Amarillo, gris y blanco)

Restrepo Millán sede B: La SED aprueba diseño de fachada

IED Fe y Alegría: La SED manifiesta que se quite el enchape existente en bloque #12 y muros pintadas en blanco, e instalar pergola en circulación entre bloque #13 y 14. y realizar materas en cascada sobre la zarpa, la SED aprueba la intervención del acceso peatonal al bloque #12 en forma de rampa que conecte hacia el bloque #11 y #14, el bloque #12 Fachada en gris basalto, en área administrativa fachada amarilla y franjas en ventanas gris basalto.
En bloque de bachillerato las vigas de color gris basalto, mantenimiento de estructura metálica en forma en color amarillo.

Pág 1-5

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	02-NOV-2023	**Inicio**	8:30 am	**Fin :**		**Lugar**	Localidad Rafael Uribe Uribe
Proyecto	Mejoramientos SED Grupo #8					**Asunto**	Seguimiento de Frentes		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**					**Próxima Reunión**	

La SED manifiesta que los baranda en zona de bachiller en color negro, en cuanto a las ventanas no realizar mantenimiento solo lavarlas y colocar las vidrios que hagan falta
En cuanto al muro de contención ubicado en área de primaria la SED manifiesta que se le realice una gama de colores.
En zona de bachiller la SED aprueba el cambio TOTAL de la cubierta existente de asbesto cemento por ecoroof PVC.

Ricardo Duarte

Juan Camilo C.
Consorcio MIA GP

Alejandra Angarita
R- Interventoría

Luisa Prado
Consorcio MIA GP

Arq Sed DCIF


Arq Hugo Tilaguiz
SED Obras

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

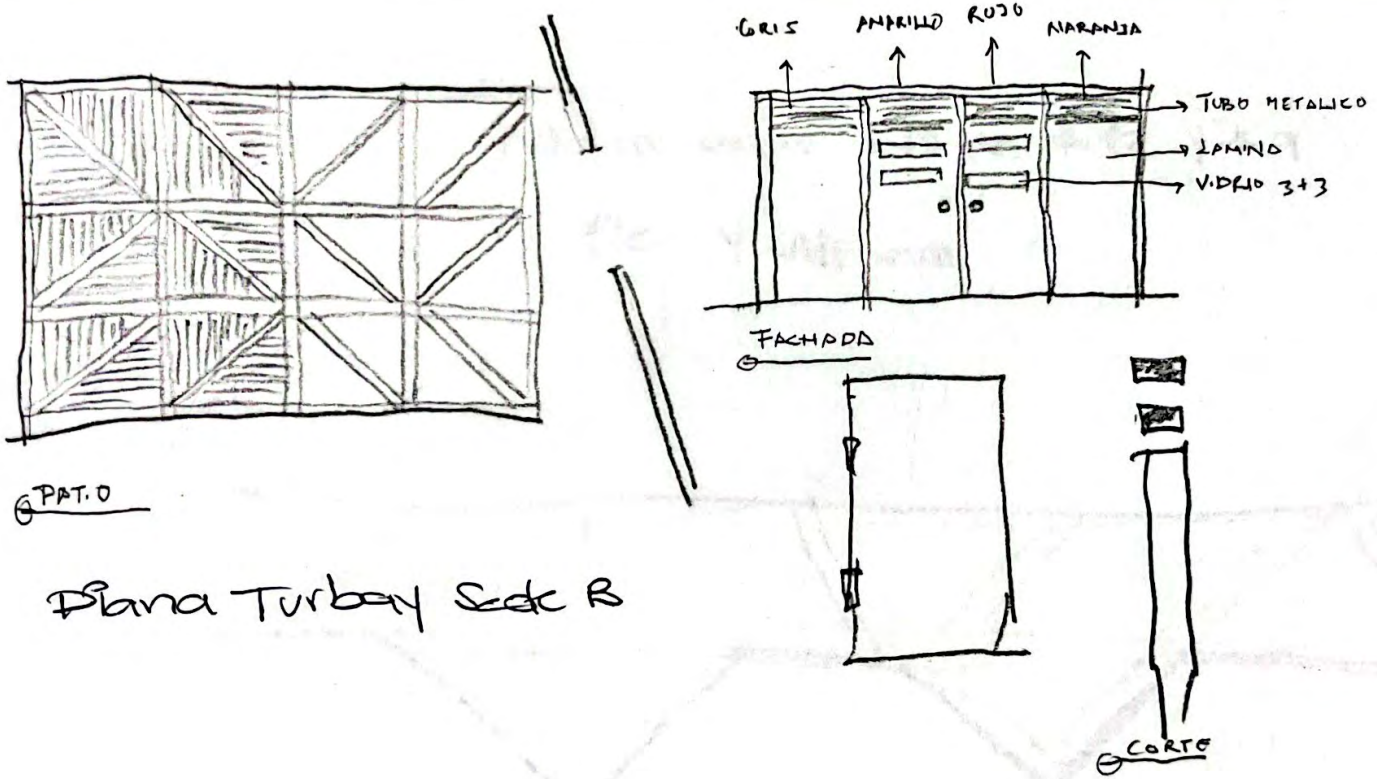

Diana Turbay Sede B

Powered by CamScanner


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación


ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin :		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

Anden entre bloque #12 y #9

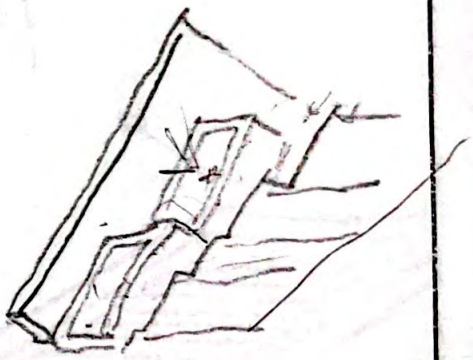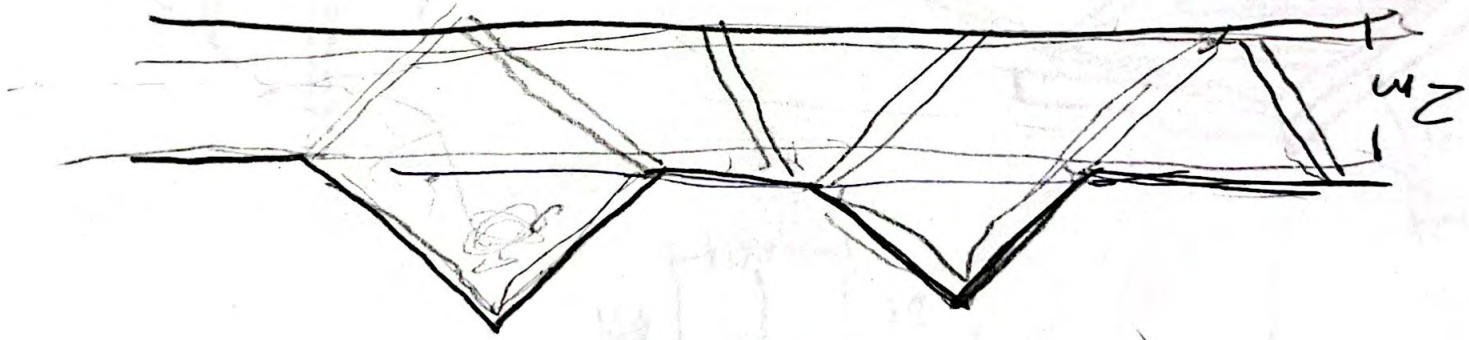Fc y Alegria






pag 4-5

Powered by CamScanner

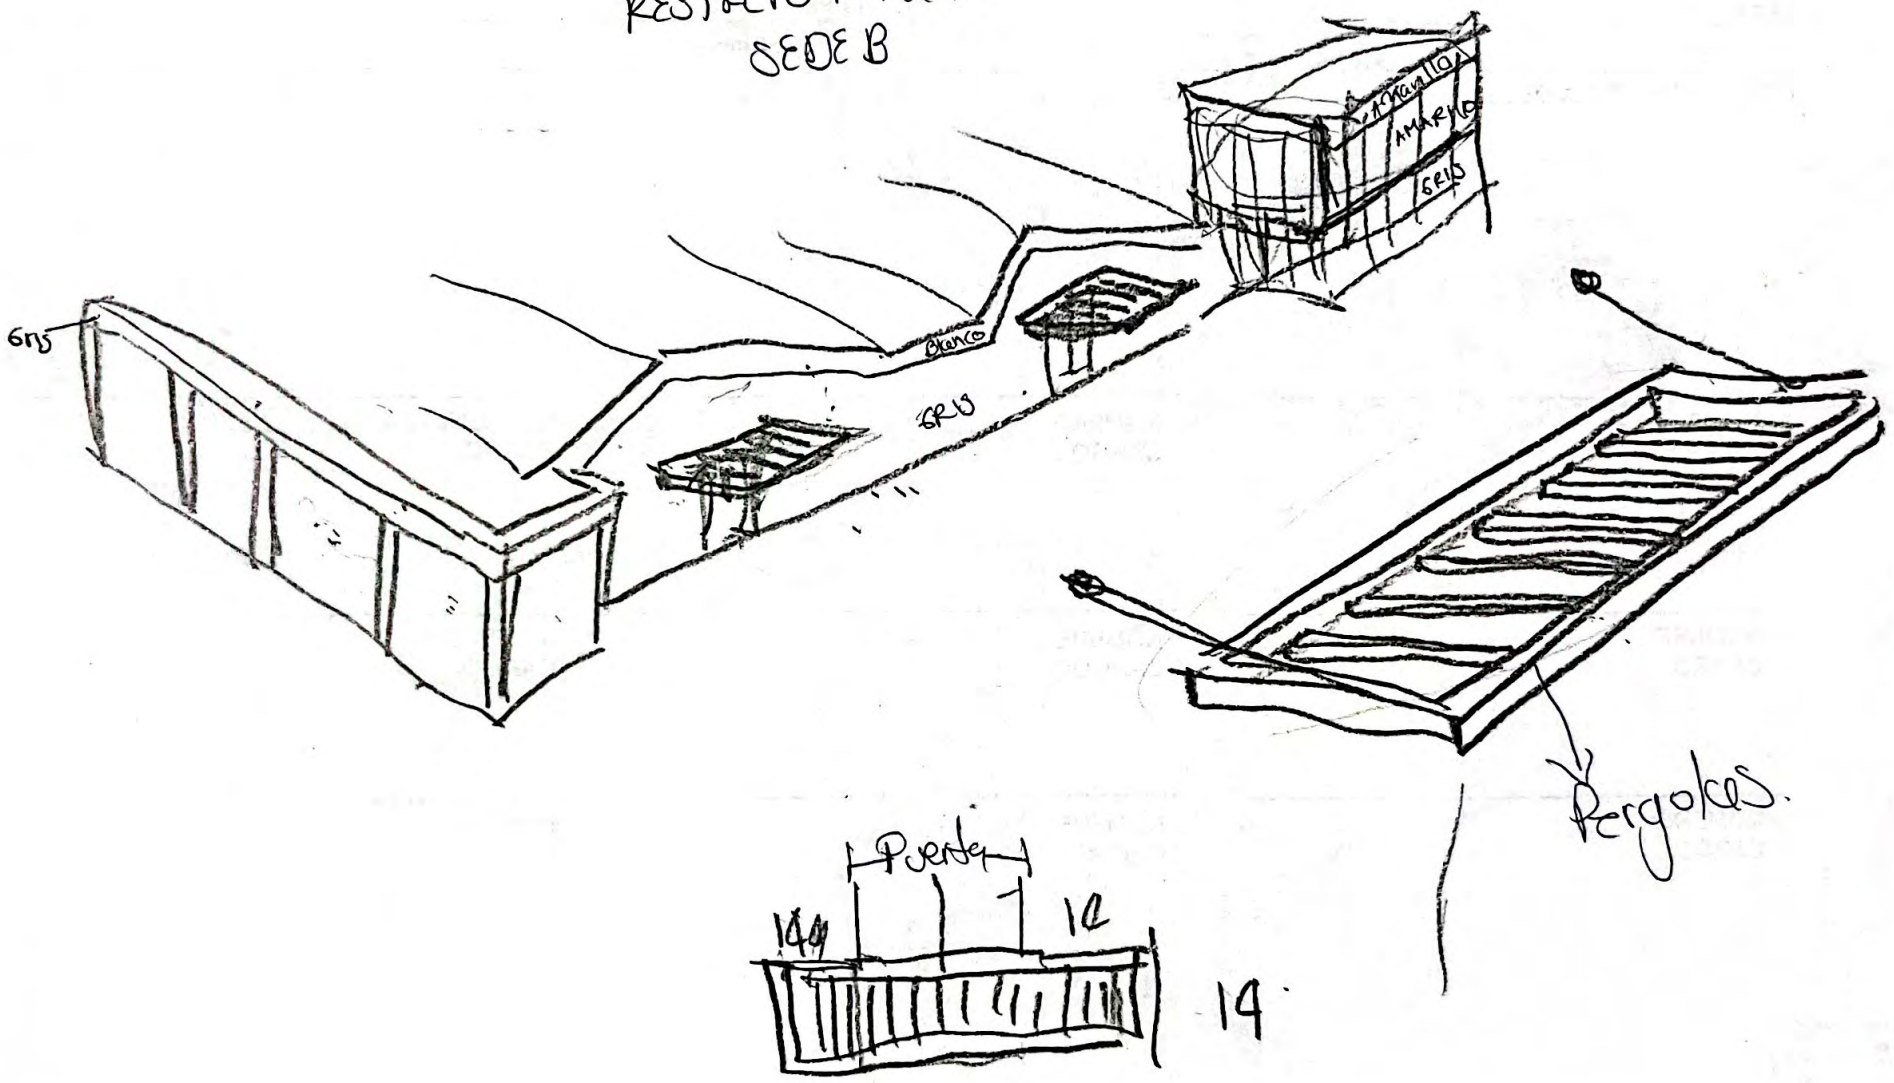RESTREPO MILLAN
SEDE B



Powered by CamScanner

Acta de Reunión

Código		Fecha	03/11/23	Inicio	8:30	FIN	9:30	Lugar	IED Clemencia de Caicedo
Proyecto						Asunto			
Asistentes	SED, Consorcio MIA GP, Interventoria					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	Interventoria	Elaborado por							

Se reune la SED, Directivos de la institucion, consorcio MIA GP e interventoria. se realizo recorrido

Se revisa la implantacion de la pergola sugerida por la SED, se revisa alturas y posibles afectaciones a la fachada. La cubierta sera en policarbonato y se revisaran dimensiones de canales y bajantes despues de construida.

Se analiza el tema del coreamo para ampliar el diametro, el cual se evaluara para iniciar actividades cuando comience las vacaciones de los estudiantes, apartir del 23 de noviembre

Andrei Torres
Inspector de Obra.

Ricardo Ducate

Nubia Cruz
Almacenista

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio	9:00 am	Fin	10:44am
Proyecto	Mejoramientos SED Grupo # B					Asunto	Inspección de cajas y Redes sanitarios
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración			Elaborado por				Próxima Reunión

Lugar: IED Gustavo Restrepo Sede A

Se realiza visita técnica en conjunto con la SED, contratista de obra e interventoría en IED Gustavo Restrepo Sede A, y9 que se presenta taponamiento nuevamente en redes sanitarias, por lo tanto se inicia la verificación del estado actual de las cajas, una de ellas se encuentra sellada, por tanto la SED solicita al contratista realice un estudio que independice los sistemas tanto sanitario como el de la cocina de Compensar, igualmente presente el presupuesto estimado para la ejecución de la obra para el día viernes 24 de Noviembre de 2023, dependiendo de la visita del especialista hidráulico por parte del contratista de obra quien requiere a la SED los planos hidrosanitarios de la institución para verificar las redes existentes, los cuales serán radicados por parte de la interventoría al contratista de obra,
El contratista de obra manifiesta que el día 15 de Noviembre 2023 a las 2 pm programa el servicio del vactor, una vez realizada la limpieza se realizara visita al día siguiente por el especialista hidráulico de parte del contratista para verificar el estado de las conexiones, diagnostico y presupuesto para intervención e independización de redes.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	08/11/2023	Inicio	9:00 am	Fin : 11:44		Lugar	IED Gustavo Restrepo Sede A
Proyecto	Mejoramientos SED Grupo # 8					Asunto	Inspección de cajas y redes sanitarias		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

NOMBRE: Sandra Ruzbal
CARGO: Directora Obra

NOMBRE: Miguel A. Turmequé
CARGO: Gestor SED.

NOMBRE: Maria A Angarita
CARGO: R Interventoria CTLC

NOMBRE: Humberto Cossio
CARGO: Almacenista

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	08/11/2023	Inicio	11:00 am	Fin	12:12 pm
Proyecto	Mejoramiento SED Grupo #8					Asunto	Entrega de aulas y batería Baños
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

Lugar: IED Diana Turbay Sede B

Se realiza la entrega de espacios internos de las aulas y batería de baños a la institución Diana Turbay Sede B, con el propósito de qe la Rectora realice el amoblamiento de las aulas para el día 15/11/2023 la interventoría reitera al contratista de obra subsanar a la brevedad posible las siguientes observaciones:

- Mejorar filo de muro en aula multiple.
- Limpieza de luminarias y tubería EMT.
- Instalar y arreglar 2 Tomas eléctricas y corregir 2 tramas de tubería inconclusas no conectadas.
- Pintar el guardaescoba existente en aulas del primer piso, bloque #1.
- Arreglar cisterna de baño profesores en segundo piso.

Maryory García R

Paola Montaño

Alejandra Angarita
R Interventoría C.T16.

Sebastian K
Ing Obra

SIG-IF-005
V.1

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	09/11/2023	Inicio	3:00 pm	Fin	5:15pm	Lugar	IED Fe y Alegría Paraíso Sur
Proyecto	Mejoramiento SED Grupo # 8					Asunto	Verificación		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

Se realiza visita técnica en IED Fe y Alegría Paraíso Sur en conjunto SED, Rectoras contratista de obra e interventoría con el propósito de Verificación de espacios y cobertura en donde la Sra Rectora manifiesta que en bloque de Primaria se Tendrán 35 estudiantes POR AULA y Para el bloque de bachiller 40 estudiantes se estima por parte de la SED ampliar el recurso para la intervención de la L, que constaría cambio de cubierta, Ventanería, componente eléctrico y aplicación de pintura. en zona de bachillerato se realizará actividades pintura en fachada. columnas y Vigas C1 piso: color amarillo, 2 piso naranja 3 piso: color azul, lavar la fachada con ácido y continuar con la instalación eléctrica y cubierta

. SE DEFINE: BLOQUES DE ABAJO SE HABILITAN:

- 8 AULAS PARTE SUPERIOR
- 2 AULAS PARTE INTERIOR
- 2 AULAS POLIVALENTES
- 2 OFICINAS EN LA ENTRADA
- 2 BODEGAS. - (LOCALIZADOS EN LA PARTE SUPERIOR).

Pag 1

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	09/11/2023	Inicio	3:00 pm	Fin	5:15 pm	Lugar	IED Fe y Alegría
Proyecto	Mejoramiento SED Grupo #8					Asunto	Verificación de espacios		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

BLOQUES DE ARRIBA Ó BACHILLERATO: SE HABILITAN INICIALMENTE LAS AULAS DEL BLOQUE DE 3 PISO. INCLUYENDO UN AULA PARA INFORMÁTICA.

SE PROCEDE CON CAMBIOS DE CUBIERTA, AJUSTES DE ESTRUCTURA, SE INSTALARÁN LAS ACOMETIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. POSTERIORMENTE CON MEJORAMIENTOS 2024 → REDISEÑO BAÑOS
SE REALIZARÁ CON MANTENIMIENTOS FUTUROS: → REMODELACIÓN DE BAÑOS.
→ URBANISMO.

SE AJUSTARÁ MODIFICATORIO PARA LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE.
Igualmente la SED manifiesta que se realizarán en bloque de primaria mejoras de los baños de forma combinada para estudiantes de primaria y bachillerato.

Pag 2

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	09/11/2023	Inicio	3:00 pm	Fin	5:15 pm	Lugar	IED Fe y Alegría
Proyecto	Mejoramiento SED Grupo # 8					Asunto	Verificación de espacios		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

NOMBRE: Alexander Rojas
CARGO: Supervisor DCCE

NOMBRE: Erika Gutierrez
CARGO: Gestora Territorial

NOMBRE:
CARGO: Director DCCE

NOMBRE: María Angarita
CARGO: R. Interventoría

NOMBRE: Blanca Emilce Cabrejo
CARGO: Gestora Territorial Cobertura

NOMBRE: Carlos Enrique Diaz
CARGO: Dirc. Ocoke

NOMBRE: Ricardo Duarte
CARGO:

NOMBRE: Hugo Tibaque
CARGO: SED DCCE

NOMBRE: Erica Johanna Sánchez
CARGO: Directora Cobertura

Sandra Tinjacá
Directora Obra

pdg 3

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	15-11-2023	**Inicio**	10:00am	**Fin :**	10:30am	**Lugar**	IED Alfredo Iriarte sede A-B
Proyecto	Mejoramientos SED - Grupo 8					**Asunto**	Revisión sistema de bombeo de la IED		
Asistentes	Obra, Interventoría SED e IED					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	15-11-2023	**Elaborado por**	Consorcio T16 - Interventoría					**Próxima Reunión**	

Se realiza visita y recorrido en el interior de la IED, donde el profesional especialista de la SED recomienda:

1. Una vez verificadas las baterías de baños, se observa que los registros de corte de los sanitarios por su edad ya cumplieron su vida útil, por lo cual se sugiere que sean reemplazados por unos del mismo diámetro.

2. Una vez se realice el cambio de los registros se realizará una prueba total de la red con el fin de determinar si dentro de las baterías existen fugas, las cuales en algún momento ocasionan funcionamiento continuo de los equipos de bombeo y posterior despresurización.

3. Se recomienda que el contratista cite al proveedor de los pulh con el fin de que realicen una visita técnica en campo para que emita un concepto al respecto.

4. Una vez verificados los equipos de bombeo se recomienda inicialmente realizar una inspección a las válvulas de pie y el estado de las tuberías en las succiones, como medida inicial para diagnosticar las despresurización de los equipos. Esta labor esta a cargo de la institución.

5. Se observa que el funcionamiento de los equipos en cuanto a la alternancia no es claro, ya que actualmente estos inician en operación a 40psi y el apagado está en 62psi, pero no existe respaldo de operación de una bomba a otra en caso de que el pedido de caudal sea alto.

Powered by CamScanner

Actualmente los equipos no poseen la alternancia anteriormente descrita, puesto que una vez apaga una motobomba, inmediatamente inicia la otra y así sucesivamente, por lo cual, no existe un respaldo que nos permita que el sistema funcione el menor tiempo posible.

Ricardo Ducuara
Interventoría

SED. DOCEE

Ing. Mateo Duque P.
SED. DOCEE

Juan Camilo C.
Consorcio MIA 6P

Sede B.

Desde la SED se solicita la inspección a través de CCTV de las cajas de aguas residuales y que hacen entrega a las redes públicas. Esta inspección debe ir soportada con un video donde se evidencie el estado de las redes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	15-11-2023	**Inicio**	11:00am	**Fin :**	12:00pm	**Lugar**	IED José Martí sede C
Proyecto	Mejoramiento SED - Grupo 8					**Asunto**	Revisión de alcance José Martí sede C		
Asistentes	obra, interventoría, SED, IED					**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	15-11-2023	**Elaborado por**	Consorcio TIG - Interventoría					**Próxima Reunión**	

Se realiza visita de inspección entre la SED, obra, interventoría y rector, con el fin de revisar el alcance de las obras a ejecutar en este frente, donde termina definiendo:

1. Sello del espacio entre la estructura del concreto del 3 piso y la cubierta en policarbonato del corredor.
2. Cambio de la totalidad de las rejillas en concreto de los carcamos por rejillas plásticas.
3. Demarcar la cancha existente.

Fabián Rodríguez
Rector(e)

Arq. Alvaro Tibaquira
SED - Obras

Ricardo Ducate
Interventoría

Jorge Camilo C.
Consorcio MIA 6P

SIG-IF-005
V.1

Powered by CamScanner

Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría

CONSORCIO TIG	**CONTROL DE PERSONAL**				ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS				
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA				
NUMERO DE CONTRATO	C01.PCCNTR.2749287				
OBJETO	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08)."				
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP				
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG				
INFORME MENSUAL	**10**	**Periodo**	20/10/2023	**al**	19/11/2023

FECHA 19 | 11 | 2023

DÍA DOMINGOS Y FESTIVOS	
PERSONAL QUE ASISTE	**X**
PERSONAL QUE NO ASISTE	**N**
PERSONAL RETIRADO	**R**
PERSONAL INGRESADO	**IN**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESDE		**20-oct-23**										**HASTA**										**19-nov-23**										
DIA		**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**28**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
PERFIL		**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
Director de interventoría	**1**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
Residente de interventoría	**4**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
Asesor Estructural	**1**									**X**						**X**	**X**												**X**		**X**	
Asesor Ambiental	**1**	**X**						**X**		**X**					**X**		**X**					**X**		**X**					**X**		**X**	
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo	**3**		**X**		**X**		**X**	**X**		**X**		**X**		**X**	**X**		**X**		**X**		**X**	**X**		**X**		**X**		**X**	**X**		**X**	
Asesor en Redes Eléctricas	**1**		**X**						**X**							**X**							**X**							**X**	**X**	
Asesor Hidrosanitario	**1**		**X**					**X**	**X**	**X**							**X**				**X**			**X**				**X**				**X**	
Profesional de costos	**1**						**X**	**X**						**X**			**X**							**X**						**X**		
Inspector de interventoría	**4**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
Maestro de obra	**2**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
Asesor Jurídico	**1**																**X**				**X**			**X**						**X**	**X**		

FIRMA: _____

NOMBRE: EDISON RICARDO DUARTE DÍAZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 1.1.5. Informes semanales

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
PRÓRROGA :	N/A	PRORROGA 1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	292 EQUIVALE AL 80,22%	PLAZO TRANSCURRIDO:	275 EQUIVALE AL 82,58%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICION(ES):	$ 371.557.789,00	VALOR ADICION(ES):	$ 5.050.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.250.145.727,00	VALOR POR PAGAR:	$ 16.991.262.150,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023	13/10/2023	-76
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023	4/10/2023	-67
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
29	**TALLER BICICLETERO**		9/10/2023	
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**275**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 217.989.209,00	$ 217.989.209,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 210.052.966,00	$ 194.803.615,36	92,74%	30/08/2023	EN EJECUCIÓN
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	PERIODO No.	40	DEL	16/10/2023	AL	22/10/2023

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.010.000.000,00	$ 817.388.746,34	80,93%	23/10/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 485.207.002,00	$ 348.098.166,00	71,74%	20/10/2023	EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 841.548.020,00	$ 615.268.092,54	73,11%	31/08/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.169.838.192,85	$ 1.169.838.192,85	100,00%	28/08/2023	FINALIZADO
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 283.433.330,00	$ 283.433.330,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 827.987.076,00	$ 529.502.814,00	63,95%	30/10/2023	EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 762.681.025,00	$ 507.059.140,00	66,48%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.228.838.776,00	$ 1.035.740.092,69	84,29%	30/11/2023	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.206.469.428,00	$ 914.669.320,70	75,81%	14/10/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ 8.348.023,00	1,68%	19/12/2023	NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.193.215.393,25	$ 1.193.215.393,25	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ 79.169.655,00	12,06%	19/12/2023	NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.027.739.816,00	$ 1.237.613.824,58	61,03%	28/11/2023	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	19/12/2023	NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ 181.696.446,54	54,10%	19/12/2023	NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 702.836.423,00	$ 347.876.572,00	49,50%	31/10/2023	EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
29	TALLER BICICLETERO	$ 250.000.000,00	$ 87.484.487,00	34,99%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
27	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 532.852.321,00	61,78%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intercenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	No se realizan actividades	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: 1 (una).personas Equipo: Herramienta menor.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua finalizando actividades referente a detalles de acabados, posible entrega para el dia lunes 23/10/2023.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: 12 (Doce). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Continua actividad fundida de placa para cancha de 3000 PSI, Continuactivida de intalacion malla de refuerzo para placa.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Herramienta menor, vibro compactador
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	finaliza remboquillado en la bateria sanitaria de niños primer piso, se hacen mantenimiento a las puertas y se comienza con el aseo, se realiza fundida de meson granito baño profesores	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	Se finalizan actividades, en comité la SED Autorizo la no instalción de bajantes y canales, se entrego el frente a la IED a entera satisfacción el dia jueves 19 de octubre de 2023.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo: frente finalizado Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se instala uminarias en el cielo raso en pvc en el hall del segundo piso, y se realiza la instalacion en drywall del primer piso, se entregan los espacios a la institucion areas biblioteca, hall segundo piso y hall primer piso.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: cinco (4) personas Equipo: Herramienta menor
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se continua con la fundida de los paños y se hace el estampado del concreto.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de cambio de cubierta en el ala central, continua actividad de instalación de luminarias, continua actividad de pintura en esmalte sobre muro.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Se inicia la intervencion de las baterias sanitarias del segundo piso, se demule el enchape, el desmonte de baterias etc, se hace entrega a la institucion de los espacios correspondientes a salon 101,102,103 y 104 y se inicia con la intervencion de biblioteca.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se continua la actividad de pintura en los muros de las aulas y del pasillo, se hacen los filos en los marcos de las puertas de los salones y se hace la instalacion de las puertas de las aulas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, IGABRIELA MISTRAL**	Se realizó enchape en áreas Vae y Embera, con guardaescoba y emboquillado, se requiere mejorar orden y aseo en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: 1 (1) persona. Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	Frente finalizado el dia 18 de septiembre de 2023	Frente finalizado y entregado a satisfacción por la institución.
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se realiza el armado de acero para la construcción del muro contención, se continua con la fabricación de ventanas en aluminio e instalación de redes eléctricas y excavación y aplicación en zona de cafeteria existente para la instalación de redes hidrosanoitarias de los baños a construir, se requiere mejorar el rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Once (11) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	No se realizan actividades	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) personas Equipo: Andamios, herramienta menor y rotomartillo
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	Se realiza el proceso de instalación de las puertas faltantes y con ello se da por cerrada la intervención en este frente.	FRENTE TERMINADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se finaliza la instalacion de la teja tipo sandwich y pintura de estructura metalica, se realiza la instalacion de la teja traslucida ubicada en el pasillo .	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	Se continua con la fabricación en sitio, los módulos para el cerramiento de la IED,se requiere mejorar rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor


CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
29	**TALLER BICICLETERO**	Continua actividad de excavación. Continua traslado y disposición final de material de excavación, Se realiza levantamiento topográfico verificando volúmenes de excavación y niveles.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora
28	**EMERGENCIAS**	Se continúa con la ejecución de la emergencia del cambio de la cubierta en la IED Liceo Femenino.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 14.019.097.889,49	82,51%	-20,24%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 10.580.467.739,38	62,27%	

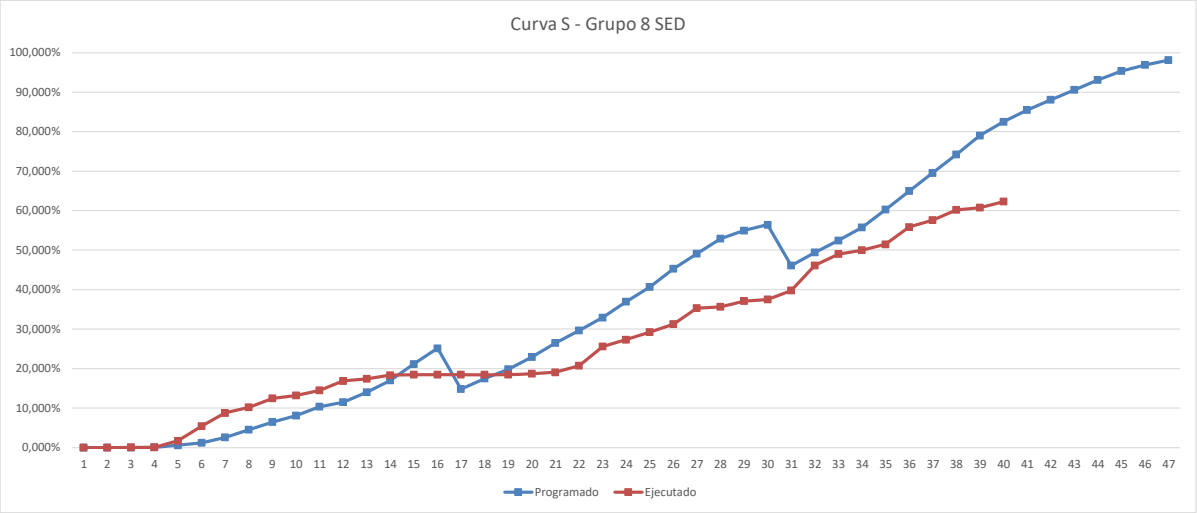

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 20,24%. No obstante, es importante acotar que ya existe lineamiento oficial desde la SED de realizar la solicitud de prórroga No.1 y adición No.2 del contrato de obra, con ocasión a la ampliación del alcance, lo cual ha representando un aumento del 50% del valor inicial, necesitandose con ello una ampliación en el plazo no menor a cuatro (4) meses calendario.

Por consoguiente, este atraso cuantificado al día de hoy no representa un dato certero, ya que la siguiente semana el contratista de obra entregará una reprogramación, por medio de la cual extenderá los tiempos de ejecución de los frentes que apliquen, permitiendo con ello una distribución adecuada recurso y reduciendo a gran escala el atraso materializado a hoy. La reprogramación entrará en vigencia en el siguiente periodo semanal y es precisamente por ello que esta interventoría no ha realizado llamados de atención al contratista de obra, a pesar de que el atraso en las últimas semanas ha sido representativo, dado el preacuerdo de la prórroga y con ello la reorganización de los recursos a invertir en cada frente.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Manuel del Socorro sede B - Entrega de presupuesto actualizado Inicio de actividades en obra	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido) En proceso
Taller de la bicibleta - Envío del presupuesto	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 20 de octubre de 2023 se atendieron las observaciones relacionadas con los APU's no previstos NP25, NP26, NP27, NP33, NP34, NP36 y NP40.
* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR


Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:

Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y no realizó la entrega de su concepto técnico.
Colegio Restrepo Millán sede D: El riesgo existente con las redes eléctricas será intervenido a través del alcance del frente.
Colegio Liceo Femenino: Se finaliza con la intervención en la cubierta y que fue considerada bajo este rubro de emergencia.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública


FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE		
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES		
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II		
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO		
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA		





CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

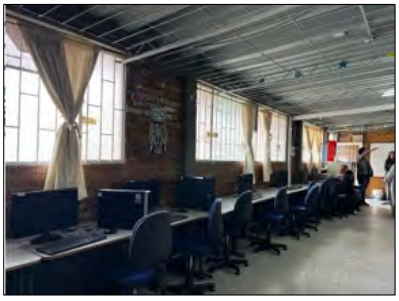No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**		
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**		
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		






CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D,GABRIELA MISTRAL**		  
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**		  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		No hubo avance por suspensión forzada del frente

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	23/10/2023	**PERIODO No.**	**40**	DEL	**16/10/2023**	AL	**22/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  
25	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		  
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		  
29	**TALLER BICICLETERO**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	299 EQUIVALE AL 82,14%	PLAZO TRANSCURRIDO:	282 EQUIVALE AL 84,68%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 371.557.789,00	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 5.050.000.000,00
VALOR ADICIÓN No.2:		VALOR ADICIÓN No.2:	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ 700.956.706,00	VALOR PAGADO:	$ 9.527.028.090,00
VALOR POR PAGAR:	$ 549.189.021,00	VALOR POR PAGAR:	$ 7.464.234.060,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023	13/10/2023	-76
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023	4/10/2023	-67
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
29	**TALLER BICICLETERO**		9/10/2023	
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**282**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 231.906.572,00	$ 231.906.572,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 224.744.000,00	$ 224.744.000,00	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	10/04/2024	NO HA INICIADO

FECHA	30/10/2023	PERIODO No.	41	DEL	23/10/2023	AL	29/10/2023

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.010.000.000,00	$ 824.070.607,84	81,59%	1/11/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 485.207.002,00	$ 369.418.421,00	76,14%	26/12/2023	EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 841.548.020,00	$ 661.825.935,54	78,64%	2/11/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.169.838.192,85	$ 1.169.838.192,85	100,00%	28/08/2023	FINALIZADO
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	17/04/2024	NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 350.997.438,48	$ 350.997.438,48	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 827.987.076,00	$ 529.502.814,00	63,95%	20/02/2024	EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	30/03/2024	NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 762.681.025,00	$ 507.059.140,00	66,48%	5/01/2024	EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.228.838.776,00	$ 1.035.740.092,69	84,29%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.206.469.428,00	$ 944.061.003,70	78,25%	22/11/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ 20.124.423,96	4,04%	29/02/2024	NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.193.215.393,25	$ 1.193.215.393,25	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	11/04/2024	NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%	14/02/2024	NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ 214.257.543,00	32,63%	28/02/2024	NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ 184.268.678,00	54,30%	2/03/2024	NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.027.739.816,00	$ 1.336.602.857,58	65,92%	8/04/2024	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	18/04/2024	NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ 181.696.446,54	54,10%	28/12/2023	NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 702.836.423,00	$ 347.876.572,00	49,50%	7/02/2024	EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
29	TALLER BICICLETERO	$ 250.000.000,00	$ 101.227.603,00	40,49%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
27	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 532.852.321,00	61,78%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intervenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	No se realizan actividades	FRENTE TERMINADO Y EN OBSERVACIÓN

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua finalizando actividades referente a detalles de acabados, pendiente realizar la intervención de patio en adoquin y ventanas perimetrales.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: 16 (Dieciseis). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	No se realizan actividades	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) personas Equipo: Herramienta menor, vibro compactador
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se instala la griferia de los lavamanos de los baños de sala de profesores, y la grifefria de los orinales de niños primer piso.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se instala los espejos en el salon de danza, y se le entrega a la institucion los espacios de biblioteca.	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se instalan los postes metalicos y las luminarias, se le aplica el color al concreto estampado.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	No se realizan actividades, en espera de que el colegio libere nuevos espacios a intervenir}	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	se realizan los puntos hidraulicos y sanitarios en los baños del segundo piso, y se comienza con la instalacion del enchape, se realiza la aplicación de estuco en el area de biblioteca y sala de profesores.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se inicia con la actividad de instalacion del cielo raso en el area administrativa, se instalan las luminarias y los puntos electricos	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, IGABRIELA MISTRAL**	Se realizó enchape en áreas Vae y Embera, con guardaescoba y emboquillado, se requiere intervenir el área de danzas y componente eléctrico	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: 1 (1) persona. Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se realiza el armado de acero para la construcción del muro contención, se continua con la fabricación de ventanas en aluminio e instalación de redes eléctricas y excavación y aplicación en zona de cafeteria existente para la instalación de redes hidrosanoitarias de los baños a construir, se requiere mejorar el rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Once (11) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	No se realizan actividades , Se realiza reunión donde se evalúa el nuevo diseño de la tarima.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cero (0) personas Equipo: Andamios, herramienta menor y rotomartillo
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se inicia con la actividad del retiro del manto asfaltico en el area del pasillo.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	Se continua con la fabricación en sitio, los módulos para el cerramiento de la IED,se requiere mejorar rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor


CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	Se inica con la aplicación de pintura en la estructura metalica en las aulas, se realiza el desmonte de luminarias y la proteccion de la tuberia EMT	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
29	**TALLER BICICLETERO**	Inicias extendido y compactación de material de sub base, continua traslado y disposición final de material de excavación, Se realiza levantamiento topográfico verificando volúmenes de excavación y niveles.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora
28	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera de que el contratista inicie con la ejecución del resto de la emergencias que están pendientes a la fecha.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 14.516.169.203,45	85,43%	-18,99%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 11.289.271.743,34	66,44%	

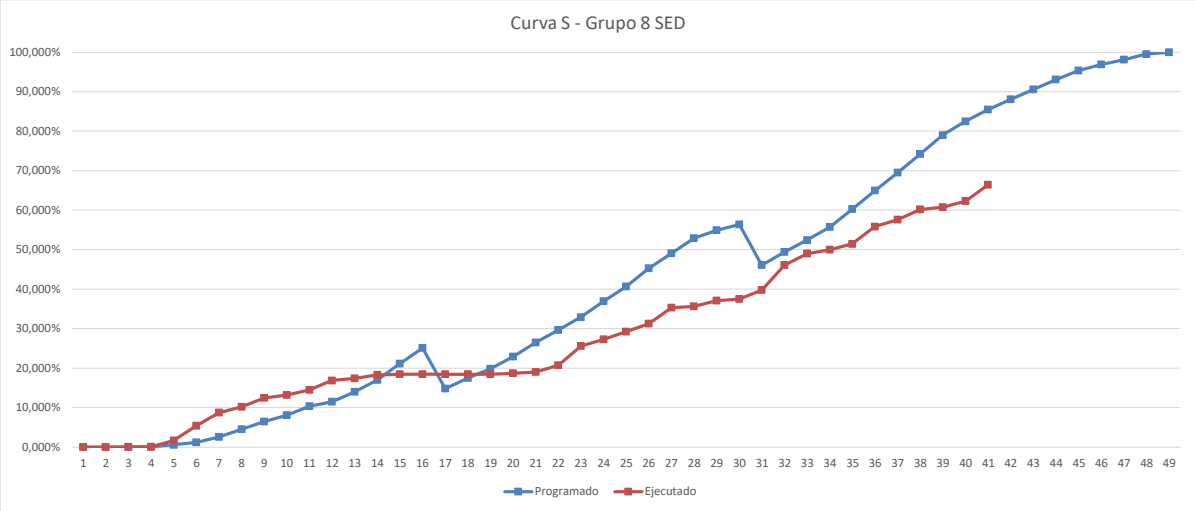

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 18,99%. No obstante, es importante acotar que ya existe lineamiento oficial desde la SED de realizar la solicitud de prórroga No.1 y adición No.2 del contrato de obra, con ocasión a la ampliación del alcance, lo cual ha representando un aumento del 50% del valor inicial, necesitandose con ello una ampliación en el plazo no menor a cuatro (4) meses calendario.

Por consoguiente, este atraso cuantificado al día de hoy no representa un dato certero, ya que la siguiente semana el contratista de obra entregará una reprogramación, por medio de la cual extenderá los tiempos de ejecución de los frentes que apliquen, permitiendo con ello una distribución adecuada recurso y reduciendo a gran escala el atraso materializado a hoy. La reprogramación entrará en vigencia en el siguiente periodo semanal y es precisamente por ello que esta interventoría no ha realizado llamados de atención al contratista de obra, a pesar de que el atraso en las últimas semanas ha sido representativo, dado el preacuerdo de la prórroga y con ello la reorganización de los recursos a invertir en cada frente.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Manuel del Socorro sede B - Entrega de presupuesto actualizado Inicio de actividades en obra	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido) En proceso
Taller de la bicibleta - Envío del presupuesto	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 20 de octubre de 2023 se atendieron las observaciones relacionadas con los APU's no previstos NP25, NP26, NP27, NP33, NP34, NP36 y NP40.
* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:



Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y no realizó la entrega de su concepto técnico.
Colegio Restrepo Millán sede D: El riesgo existente con las redes eléctricas será intervenido a través del alcance del frente.

Pendiente la atención de varias emergencias a la fecha que ya fueron notificadas de manera oficial al contratista de obra.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública








FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

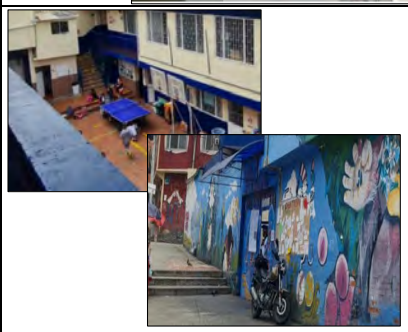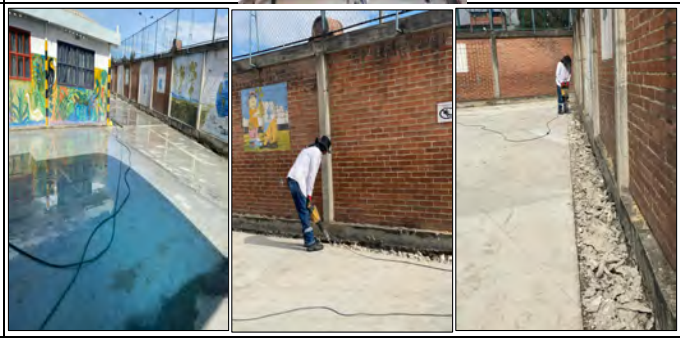10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**		
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		





CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

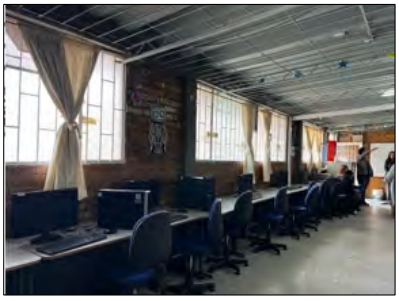No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		  
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		  
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	 	  
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	 	No hubo avance en espera de liberación de nuevos espacios a intervenir.
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		  




CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D,GABRIELA MISTRAL**		  
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**		  
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		No hubo avance por suspensión forzada del frente

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  
25	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		  
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		  
29	**TALLER BICICLETERO**		  

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	30/10/2023	**PERIODO No.**	**41**	DEL	**23/10/2023**	AL	**29/10/2023**

29	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B**		

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	6/11/2023	**PERIODO No.**	**42**	DEL	**30/10/2023**	AL	**5/11/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	306 EQUIVALE AL 84,07%	PLAZO TRANSCURRIDO:	289 EQUIVALE AL 86,79%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 371.557.789,00	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 5.050.000.000,00
VALOR ADICIÓN No.2:		VALOR ADICIÓN No.2:	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ 700.956.706,00	VALOR PAGADO:	$ 9.527.028.090,00
VALOR POR PAGAR:	$ 549.189.021,00	VALOR POR PAGAR:	$ 7.464.234.060,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023	13/10/2023	-76
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023	4/10/2023	-67
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
29	**TALLER BICICLETERO**		9/10/2023	
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**289**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 231.906.572,00	$ 231.906.572,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 224.744.000,00	$ 225.628.807,36	100,39%	30/08/2023	FINALIZADO
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	10/04/2024	NO HA INICIADO

FECHA	6/11/2023	PERIODO No.	42	DEL	30/10/2023	AL	5/11/2023

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	$ 1.010.000.000,00	$ 824.070.607,84	81,59%	1/11/2023	EN EJECUCIÓN
5	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	$ 485.207.002,00	$ 354.820.518,00	73,13%	26/12/2023	EN EJECUCIÓN
6	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 841.548.020,00	$ 661.825.935,54	78,64%	2/11/2023	EN EJECUCIÓN
7	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	$ 1.169.838.192,85	$ 1.169.838.192,85	100,00%	28/08/2023	FINALIZADO
8	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	17/04/2024	NO HA INICIADO
9	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	$ 350.997.438,48	$ 350.997.438,48	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
10	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	$ 827.987.076,00	$ 529.502.814,00	63,95%	20/02/2024	EN EJECUCIÓN
11	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	30/03/2024	NO HA INICIADO
12	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	$ 762.681.025,00	$ 535.143.250,00	70,17%	5/01/2024	EN EJECUCIÓN
13	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	$ 1.228.838.776,00	$ 1.035.740.092,69	84,29%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN
14	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	$ 1.206.469.428,00	$ 944.061.003,70	78,25%	22/11/2023	EN EJECUCIÓN
15	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL	$ 498.001.754,00	$ 20.124.423,96	4,04%	29/02/2024	NO HA INICIADO
16	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	$ 1.193.215.393,25	$ 1.193.215.393,25	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	11/04/2024	NO HA INICIADO
18	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	$ 304.703.052,00	$ -	0,00%	14/02/2024	NO HA INICIADO
19	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	$ 656.544.890,00	$ 214.257.543,00	32,63%	28/02/2024	NO HA INICIADO
20	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	$ 339.352.709,00	$ 184.268.678,00	54,30%	2/03/2024	NO HA INICIADO
21	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	$ 2.027.739.816,00	$ 1.336.602.857,58	65,92%	8/04/2024	EN EJECUCIÓN
22	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	18/04/2024	NO HA INICIADO
23	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	$ 335.852.053,00	$ 181.696.446,54	54,10%	28/12/2023	NO HA INICIADO
24	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A	$ 702.836.423,00	$ 371.163.703,00	52,81%	7/02/2024	EN EJECUCIÓN
25	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
29	TALLER BICICLETERO	$ 250.000.000,00	$ 101.227.603,00	40,49%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
27	EMERGENCIAS	$ 862.485.928,00	$ 532.852.321,00	61,78%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intervenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	No se realizan actividades	FRENTE TERMINADO Y EN OBSERVACIÓN

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	6/11/2023	**PERIODO No.**	**42**	DEL	**30/10/2023**	AL	**5/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua finalizando actividades referente a detalles de acabados, pendiente realizar la intervención de patio en adoquin.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: 16 (Dieciseis). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Continua actividad de construcción de cañuela, Inicia demolición de manto asfaltico, continua hilada perimetral de mampostería para cubierta de zona de prescolar	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Herramienta menor, vibro compactador
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se instala la luminaria hermetica en el baño de profesores	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se espera a la salida de los estudiantes para comenzar la intervencion de la cancha.	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se termina la actividad de pintar los arcos, y se espera a que el concreto cumpla el fraguado y llegue a su maxima resistencia para comenzar aplicar la pintura.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: dos(2) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Inicia demolición de cielo raso, Inicia desmonte de luminarias y red eléctrica sobre cielo raso.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Se instalan las puertas de los baños del segundo piso, se inicia la actividad de instalación del porcelanato se instalan las luminarias en la sala de profesores y en la biblioteca	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se realiza la pulida del granito en el area administrativa, se inicia la actividad de pintura en la fachada en vinilo	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, IGABRIELA MISTRAL**	Se entrego las áreas Vae y Embera, con guardaescoba y emboquillado, se requiere intervenir componente eléctrico y finalizar la actividad de instalación de porcelanato en Área de danzas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: 1 (1) persona. Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Se realizo la fundida del muro delcontención, el 2 de noviembre la SED realizo visita e indico parametros referente a diseño de matera en cascada, definición de acabados, propuesta de nueva rampa acceso posterior al bloque #12, se requiere realizar la intervención de la bateria de baños en primaria, se continua con la actividad de pintura en puertas en bloque de bachillerato.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Once (11) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua actividad de demolición de placa, Continua actividad de excavación de material común	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, herramienta menor y rotomartillo
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se continua con la instalacion del manto asfaltico y el retiro del mimos.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
28	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	Se continua con la fabricación en sitio, los módulos para el cerramiento de la IED,se requiere mejorar rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
29	**COLEGIO ALIANZA QUIROGA**	Se realizo acondicionamiento de terreno para la intervención de maloka	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor


CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	6/11/2023	**PERIODO No.**	**42**	DEL	**30/10/2023**	AL	**5/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
30	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	Se termina la intervencio del ala 1 y se espera a que el colegio habilite el ala 2 para comenzar con la intevencion	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
31	**TALLER BICICLETERO**	Continua extendido y compactación de material de sub base.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora
32	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera de que el contratista inicie con la ejecución del resto de la emergencias que están pendientes a la fecha.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 14.961.034.901,06	88,05%	-20,81%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 11.425.874.519,33	67,25%	

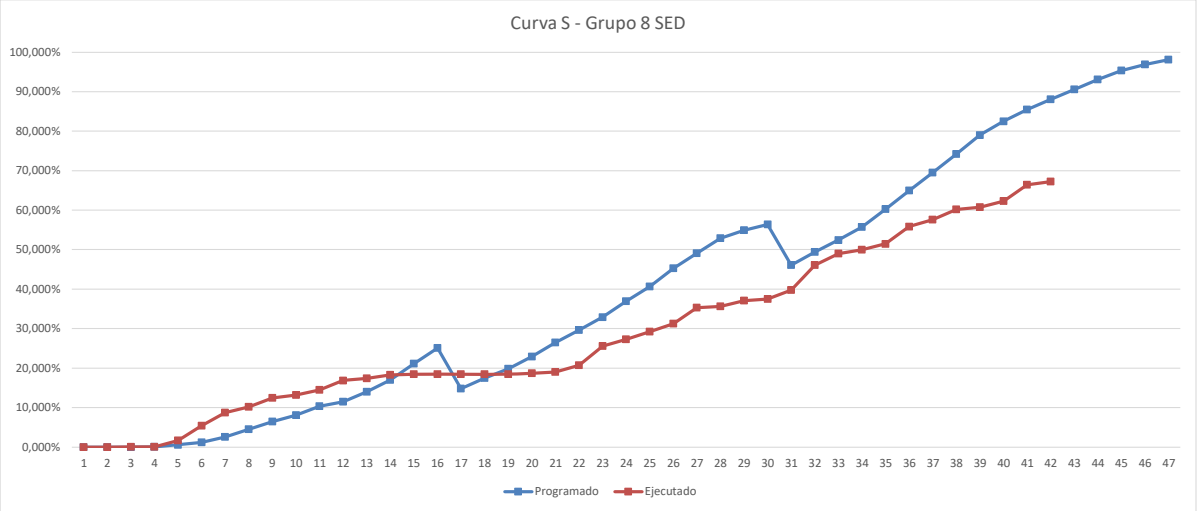

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 20,81%. No obstante, es importante acotar que ya existe lineamiento oficial desde la SED de realizar la solicitud de prórroga No.1 y adición No.2 del contrato de obra, con ocasión a la ampliación del alcance, lo cual ha representando un aumento del 50% del valor inicial, necesitandose con ello una ampliación en el plazo no menor a cuatro (4) meses calendario.

Por consoguiente, este atraso cuantificado al día de hoy no representa un dato certero, ya que la siguiente semana el contratista de obra entregará una reprogramación, por medio de la cual extenderá los tiempos de ejecución de los frentes que apliquen, permitiendo con ello una distribución adecuada recurso y reduciendo a gran escala el atraso materializado a hoy. La reprogramación entrará en vigencia en el siguiente periodo semanal y es precisamente por ello que esta interventoría no ha realizado llamados de atención al contratista de obra, a pesar de que el atraso en las últimas semanas ha sido representativo, dado el preacuerdo de la prórroga y con ello la reorganización de los recursos a invertir en cada frente.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
IED Manuel del Socorro sede B - Entrega de presupuesto actualizado Inicio de actividades en obra	Contratista de obra	06/10/2023 (Incumplido) En proceso
Taller de la bicibleta - Envío del presupuesto	Contratista de obra	06/10/2023 (Cumplido 02-11-2023)

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 03 de noviembre de 2023 se emitieron unas nuevas observaciones relacionadas con los APU's no previstos NP25, NP26, NP27, NP33, NP34, NP36 y NP40.
* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:


Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y no realizó la entrega de su concepto técnico.
Colegio Restrepo Millán sede D: El riesgo existente con las redes eléctricas será intervenido a través del alcance del frente.

Pendiente la atención de varias emergencias a la fecha que ya fueron notificadas de manera oficial al contratista de obra.

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública





FECHA	6/11/2023	**PERIODO No.**	**42**	DEL	**30/10/2023**	AL	**5/11/2023**

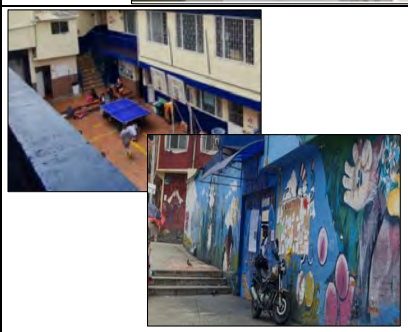10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**		
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		
4	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
5	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		







CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	6/11/2023	**PERIODO No.**	**42**	DEL	**30/10/2023**	AL	**5/11/2023**

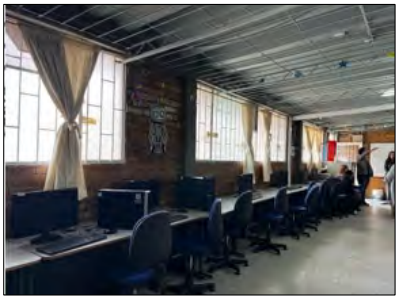	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
6	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		  
7	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		  
8	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	 	  
9	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	 	  
10	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		  




CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	6/11/2023	**PERIODO No.**	**42**	DEL	**30/10/2023**	AL	**5/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
11	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA		  
12	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D,GABRIELA MISTRAL	  	  
13	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN		  
14	COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	 	  
15	COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A		  

CONSORCIO TIG	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	6/11/2023	**PERIODO No.**	**42**	DEL	**30/10/2023**	AL	**5/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
16	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		  
17	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		  
18	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**		  
19	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		  
20	**TALLER BICICLETERO**		  

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	6/11/2023	**PERIODO No.**	**42**	DEL	**30/10/2023**	AL	**5/11/2023**

21	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B**		

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	364	PLAZO ACTUALIZADO:	333
PLAZO TRANSCURRIDO:	313 EQUIVALE AL 85,99%	PLAZO TRANSCURRIDO:	296 EQUIVALE AL 88,89%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00	VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 371.557.789,00	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 5.050.000.000,00
VALOR ADICIÓN No.2:		VALOR ADICIÓN No.2:	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00
VALOR PAGADO:	$ 700.956.706,00	VALOR PAGADO:	$ 9.527.028.090,00
VALOR POR PAGAR:	$ 549.189.021,00	VALOR POR PAGAR:	$ 7.464.234.060,00
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023	13/10/2023	-76
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023	4/10/2023	-67
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
29	**TALLER BICICLETERO**		9/10/2023	
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**296**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 231.906.572,00	$ 231.906.572,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 225.628.807,36	$ 225.628.807,36	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	10/04/2024	NO HA INICIADO

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	$ 1.010.000.000,00	$ 905.903.486,84	89,69%	1/11/2023	EN EJECUCIÓN
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	$ 485.207.002,00	$ 357.426.535,00	73,66%	26/12/2023	EN EJECUCIÓN
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	$ 841.548.020,00	$ 669.576.491,54	79,56%	2/11/2023	EN EJECUCIÓN
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	$ 1.169.838.192,85	$ 1.169.838.192,85	100,00%	28/08/2023	FINALIZADO
8	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	17/04/2024	NO HA INICIADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	$ 350.997.438,48	$ 350.997.438,48	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	$ 827.987.076,00	$ 536.065.942,00	64,74%	20/02/2024	EN EJECUCIÓN
11	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL**	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	30/03/2024	NO HA INICIADO
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	$ 762.681.025,00	$ 552.574.250,00	72,45%	5/01/2024	EN EJECUCIÓN
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	$ 1.228.838.776,00	$ 1.068.719.914,69	86,97%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	$ 1.206.469.428,00	$ 950.328.057,70	78,77%	22/11/2023	EN EJECUCIÓN
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	$ 498.001.754,00	$ 35.438.403,56	7,12%	29/02/2024	NO HA INICIADO
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	$ 1.221.970.692,20	$ 1.221.970.692,20	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	11/04/2024	NO HA INICIADO
18	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	$ 304.703.052,00	$ 1.437.271,00	0,47%	14/02/2024	NO HA INICIADO
19	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	$ 656.544.890,00	$ 214.257.543,00	32,63%	28/02/2024	NO HA INICIADO
20	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	$ 339.352.709,00	$ 208.494.194,00	61,44%	2/03/2024	NO HA INICIADO
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	$ 2.027.739.816,00	$ 1.475.491.516,58	72,77%	8/04/2024	EN EJECUCIÓN
22	**COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA**	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	18/04/2024	NO HA INICIADO
23	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	$ 335.852.053,00	$ 181.696.446,54	54,10%	28/12/2023	NO HA INICIADO
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	$ 702.836.423,00	$ 371.949.733,00	52,92%	7/02/2024	EN EJECUCIÓN
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
29	**TALLER BICICLETERO**	$ 250.000.000,00	$ 101.665.828,00	40,67%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
27	**EMERGENCIAS**	$ 862.485.928,00	$ 532.852.321,00	61,78%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intervenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	No se realizan actividades	FRENTE TERMINADO Y EN OBSERVACIÓN

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua finalizando actividades referente a detalles de acabados, se continua con la demolición del adoquín en zona de patio principal.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: Dos (2). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Inicia actividad de aplicación de emulsión asfáltica, Continua actividad de instalación de manto asfaltico, finaliza fundida de dentellón en la entrada vehicular.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor, vibro compactador, andamios.
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se instala las luminarias del baño de niños primer piso la cual son de incrustar en el cielo raso.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se espera a la salida de los estudiantes para comenzar la intervencion de la cancha.	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se inicia con la actividad de limpieza de la superficie de la cancha y se continua con el lavado de acido en la cacncha multiple	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: dos(2) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de instalación de cubierta tipo sándwich, Continua actividad de instalación de estructura metálica de cubierta, Continua actividad de pintura de cerchas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Andamios, compresor y herramienta menor
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Se continua con la pintura y acabados en la sala de profesores primer piso, se inicia con la actividad de instlacion de ventana en aluminio en el area de la biblioteca	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Se continua con los acabados en el area administrativa y con el avance de la pintura de la fachada	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, IGABRIELA MISTRAL**	Se entrego las áreas Vae y Embera, con guardaescoba y emboquillado, se requiere intervenir componente eléctrico y finalizar la actividad de instalación de porcelanato en Área de danzas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: 1 (1) persona. Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Continua con la instaalción de pañete en bloque #12, e instalación de tubaria electrica en zona de bachillerato, mantenimiento de puertas y desmonte de cubierta en asbesto cemento en zona de bachillerato	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Doce (12) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua actividad de demolición de placa, Continua actividad de excavación de material común, Continua actividad de levantamiento de muro estructural.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Herramienta menor y rotomartillo
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se termina con la instalacion del manto asfaltico y se espera a la salida de los estudiantes para comenzar con la intervencion de pintura y de puertas	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
28	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	Se continua con la fabricación en sitio, los módulos para el cerramiento de la IED,se requiere mejorar rendimiento en obra.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
29	**COLEGIO ALIANZA QUIROGA**	Se realizo acondicionamiento de terreno para la intervención de maloka y aplicación de recebo común	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor


CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
30	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	Se inicia con la actividad de pintura de la estructura metalica del ala 2 y el cerrameniento de dicho espacio	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
31	**TALLER BICICLETERO**	Continua extendido y compactación de material de sub base, continua actividad de desmonté de cubierta.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora
32	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera de que el contratista inicie con la ejecución del resto de la emergencias que están pendientes a la fecha.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 15.385.759.616,27	90,55%	-21,38%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 11.752.320.873,31	69,17%	

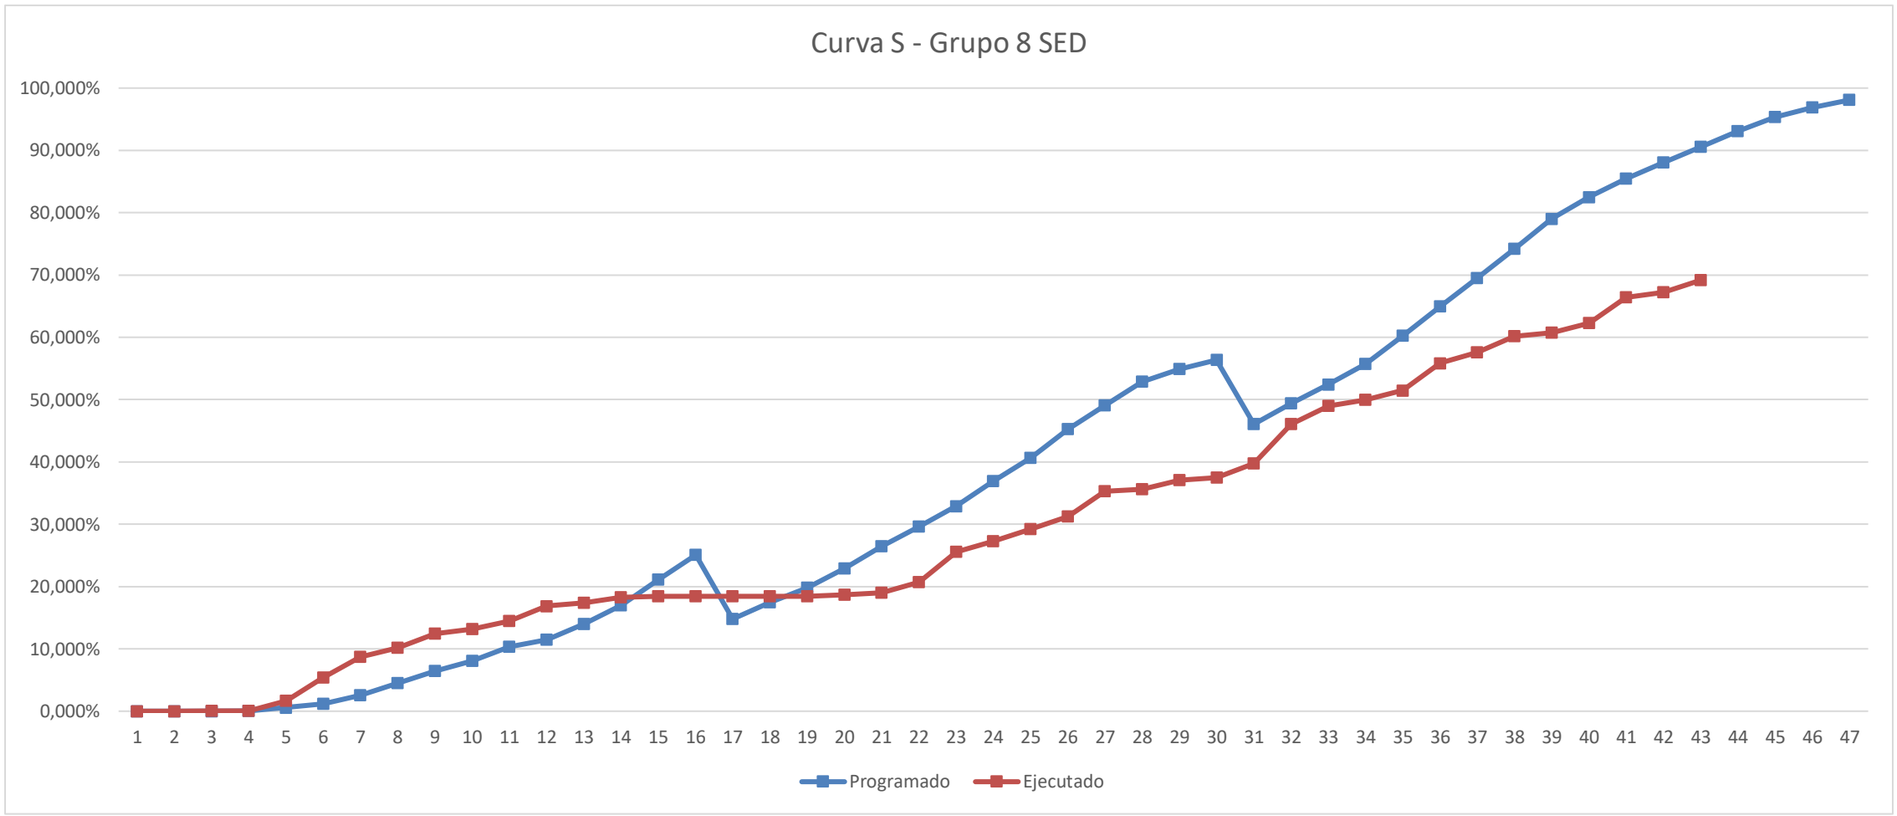

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 21,38%. No obstante, es importante acotar que ya existe lineamiento oficial desde la SED de realizar la solicitud de prórroga No.1 y adición No.2 del contrato de obra, con ocasión a la ampliación del alcance, lo cual ha representando un aumento del 50% del valor inicial, necesitandose con ello una ampliación en el plazo no menor a cuatro (4) meses calendario.

Por consoguiente, este atraso cuantificado al día de hoy no representa un dato certero, ya que la siguiente semana el contratista de obra entregará una reprogramación, por medio de la cual extenderá los tiempos de ejecución de los frentes que apliquen, permitiendo con ello una distribución adecuada recurso y reduciendo a gran escala el atraso materializado a hoy. La reprogramación entrará en vigencia en el siguiente periodo semanal y es precisamente por ello que esta interventoría no ha realizado llamados de atención al contratista de obra, a pesar de que el atraso en las últimas semanas ha sido representativo, dado el preacuerdo de la prórroga y con ello la reorganización de los recursos a invertir en cada frente.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El 07 de noviembre de 2023 se remitieron para revisión de la Entidad, los APU's no previstos NP29, NP45 y NP49.
* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:


Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y no realizó la entrega de su concepto técnico.
Colegio Restrepo Millán sede D: El riesgo existente con las redes eléctricas será intervenido a través del alcance del frente.

Pendiente la atención de varias emergencias a la fecha que ya fueron notificadas de manera oficial al contratista de obra.

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública






FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

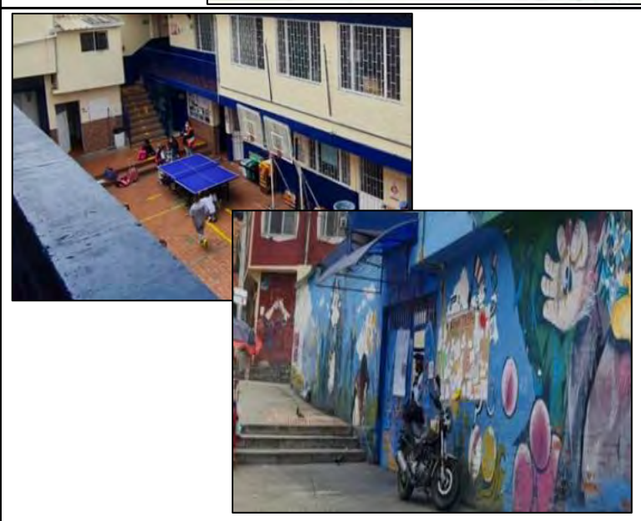10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**		
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		
4	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
5	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		








CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

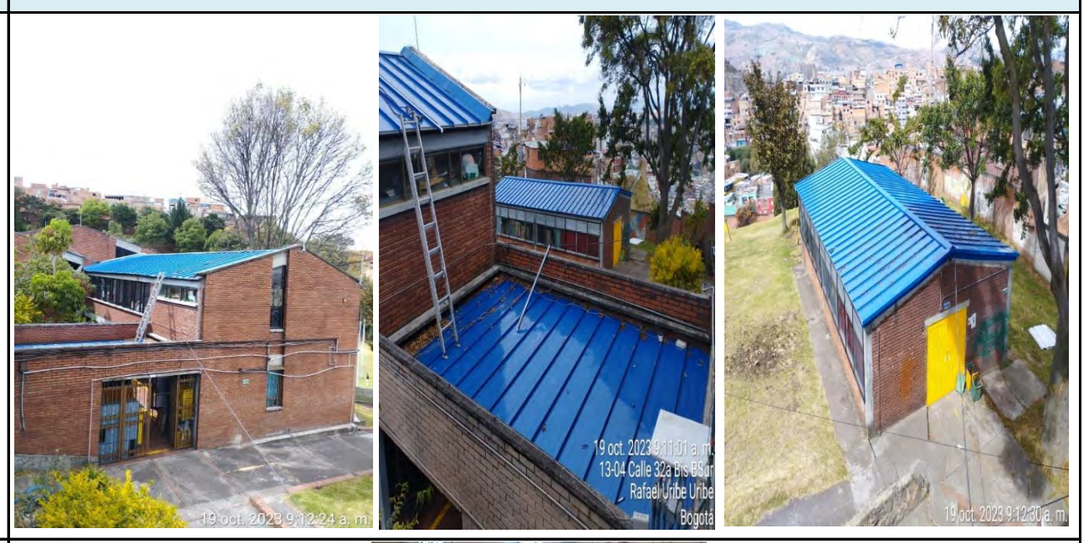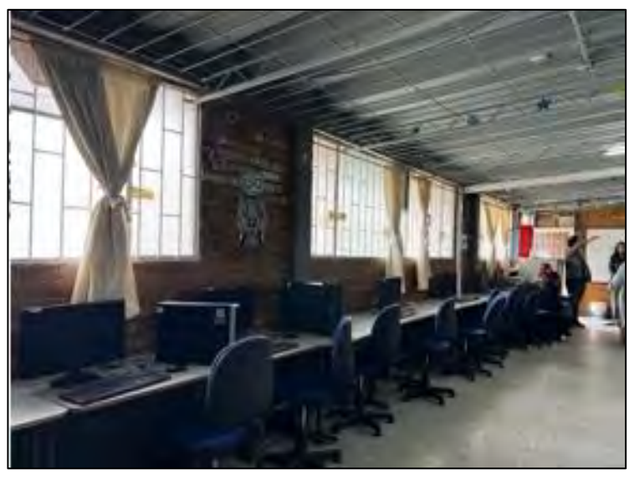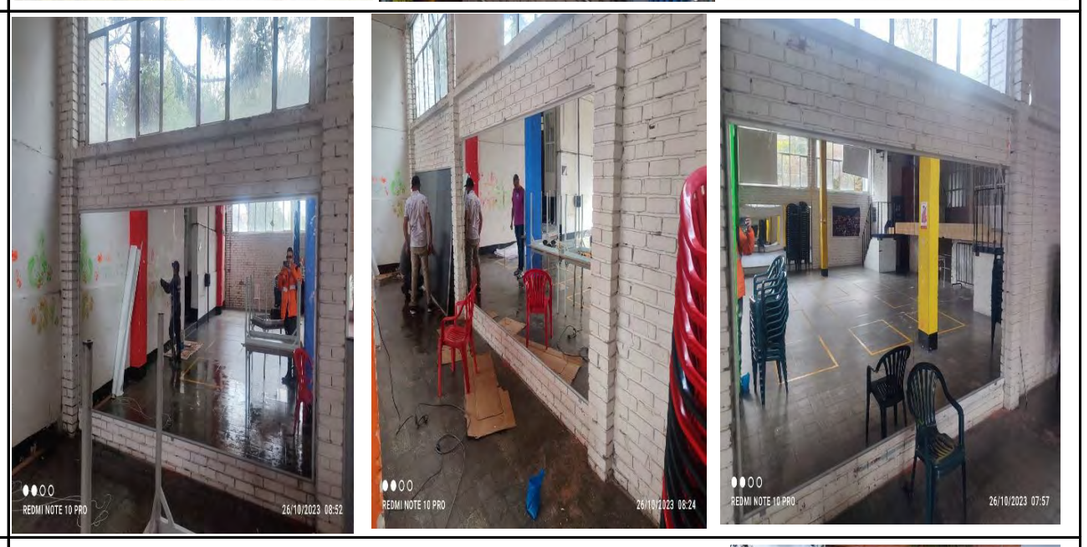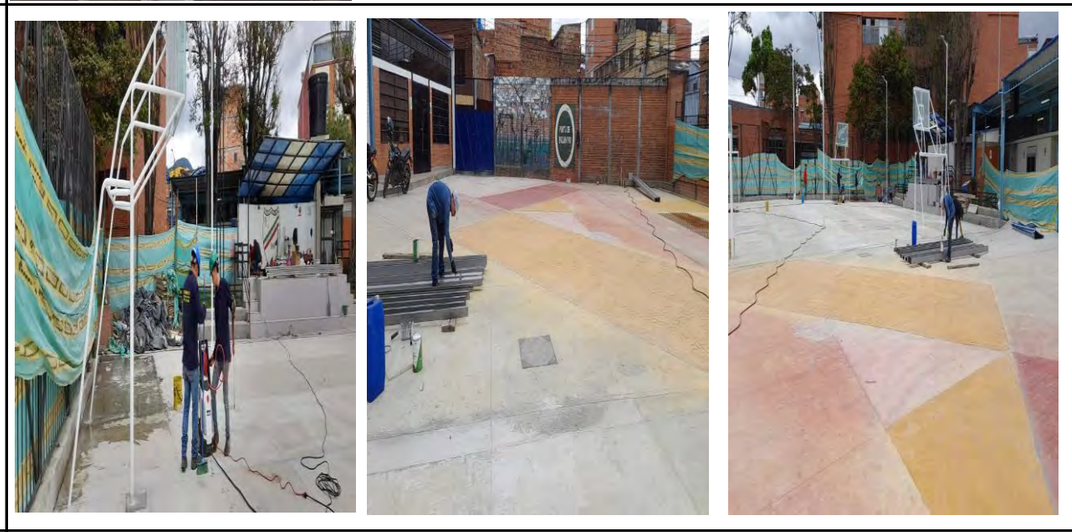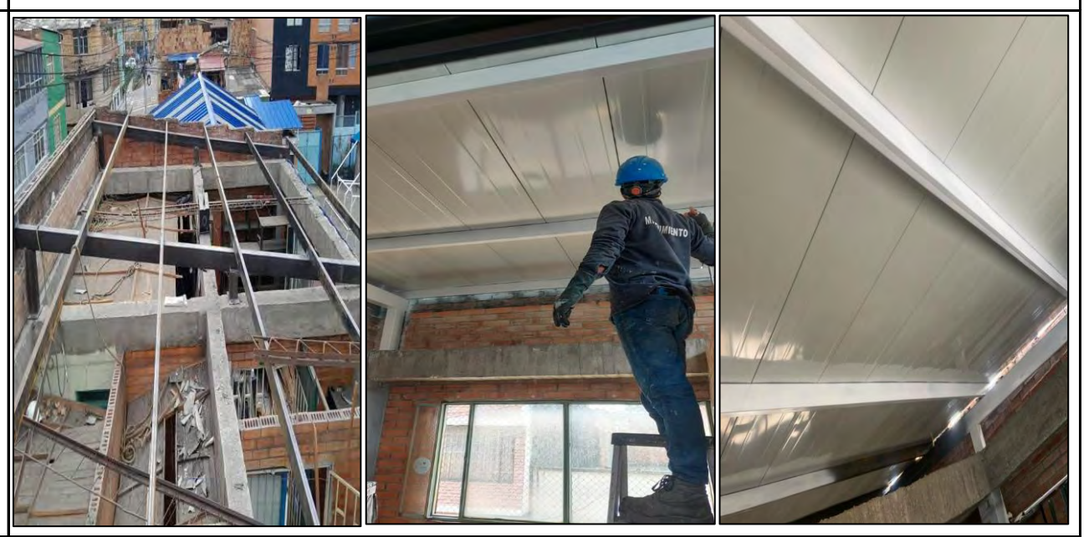	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
6	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		
7	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		
8	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**		
9	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**		
10	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		


CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

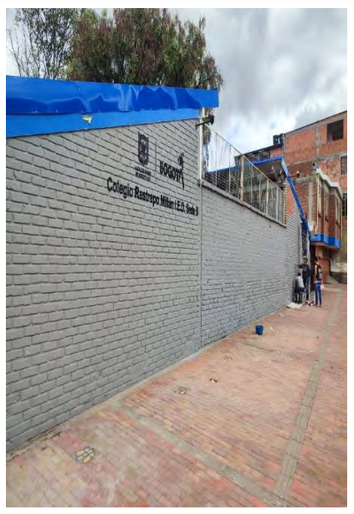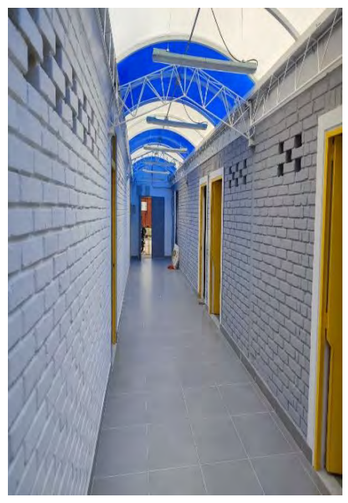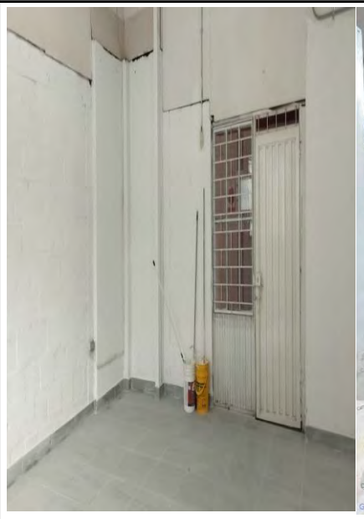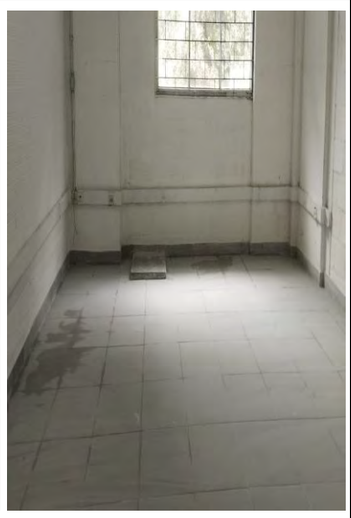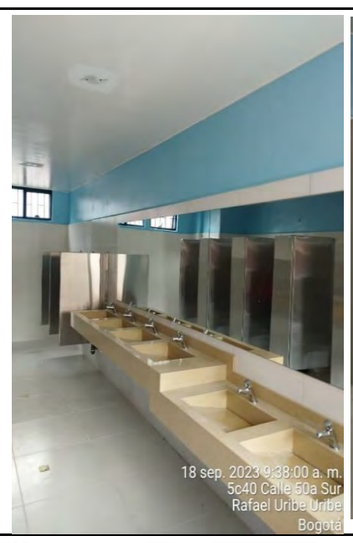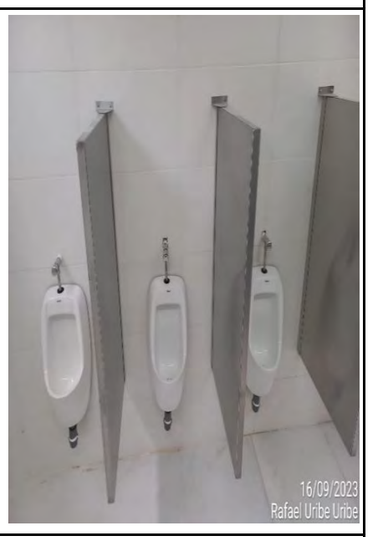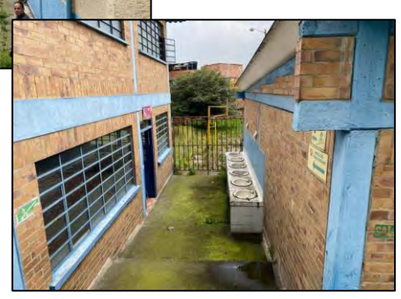No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
11	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		  
12	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D,GABRIELA MISTRAL**	  	  
13	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		  
14	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	 	  
15	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		  


CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

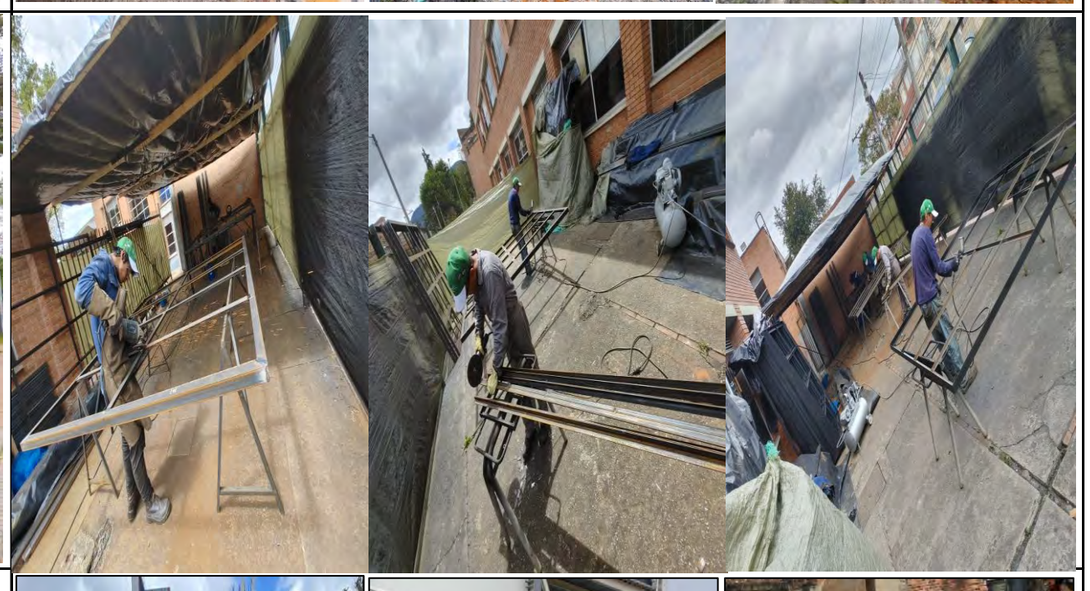No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
16	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		
17	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		
18	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**		
19	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		
20	**TALLER BICICLETERO**		

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	13/11/2023	**PERIODO No.**	**43**	DEL	**6/11/2023**	AL	**12/11/2023**

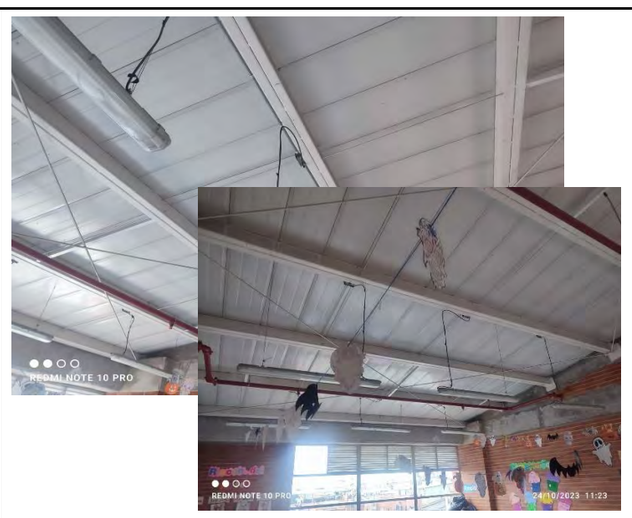21	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B**		

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**RAFAEL URIBE URIBE**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4155718 de 2022		CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645	
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES		PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de enero de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	20 de enero de 2023	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023	
PLAZO ACTUALIZADO:	364		PLAZO ACTUALIZADO:	333	
PLAZO TRANSCURRIDO:	320 EQUIVALE AL	87,91%	PLAZO TRANSCURRIDO:	303 EQUIVALE AL	90,99%
VALOR INICIAL :	$ 878.587.938,00		VALOR INICIAL :	$ 11.941.262.150,00	
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 371.557.789,00		VALOR ADICIÓN No.1:	$ 5.050.000.000,00	
VALOR ADICIÓN No.2:			VALOR ADICIÓN No.2:		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.250.145.727,00		VALOR ACTUALIZADO:	$ 16.991.262.150,00	
VALOR PAGADO:	$ 700.956.706,00		VALOR PAGADO:	$ 9.527.028.090,00	
VALOR POR PAGAR:	$ 549.189.021,00		VALOR POR PAGAR:	$ 7.464.234.060,00	
SUPERVISOR:	ARQ ALEXANDER OSORIO PAEZ		INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO DE INICIO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	21/01/2023	6/05/2023	-105
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES**	21/01/2023	3/03/2023	-41
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	21/01/2023	10/02/2023	-20
4	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
5	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
6	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	21/01/2023	21/02/2023	-31
7	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	21/01/2023	15/02/2023	-25
8	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	21/01/2023	10/02/2023	-20
9	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	29/07/2023		No iniciado
10	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO**	29/07/2023	26/06/2023	33
11	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	29/07/2023		No iniciado
12	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	27/02/2023	27/02/2023	0
13	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	29/07/2023	12/06/2023	47
14	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL**	29/07/2023		No iniciado
15	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	29/07/2023	22/05/2023	68
16	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	29/07/2023	13/10/2023	-76
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	29/07/2023		No iniciado
18	**COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA PALERMO SUR**	28/04/2023	28/04/2023	0
19	**COLEGIO FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS**	29/07/2023		No iniciado
20	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	29/07/2023	13/09/2023	-46
21	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	29/07/2023	25/05/2023	65
22	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	3/04/2023	3/04/2023	0
23	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
24	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	29/07/2023	4/10/2023	-67
25	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	29/07/2023		No iniciado
29	**TALLER BICICLETERO**		9/10/2023	
30	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**			
Plazo transcurrido del proyecto en días		**303**	DÍAS	

3. EJECUCIÓN POR FRENTES

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR ESTIMADO A EJECUTAR SEGÚN ACTUALIZACIÓN	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	$ 231.906.572,00	$ 231.906.572,00	100,00%	15/08/2023	FINALIZADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	$ 225.628.807,36	$ 225.628.807,36	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
3	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR**	$ 561.308.317,00	$ -	0,00%	10/04/2024	NO HA INICIADO

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	VALOR INICIAL PROYECTADO A EJECUTAR	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO DEL FRENTE	FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL FRENTE	ESTADO A LA FECHA DEL FRENTE
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	$ 1.010.000.000,00	$ 965.903.486,84	95,63%	1/11/2023	EN EJECUCIÓN
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	$ 485.207.002,00	$ 387.426.535,00	79,85%	26/12/2023	EN EJECUCIÓN
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	$ 841.548.020,00	$ 679.576.491,54	80,75%	2/11/2023	EN EJECUCIÓN
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**	$ 1.260.838.192,85	$ 1.260.838.192,85	100,00%	28/08/2023	FINALIZADO
8	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO**	$ 332.100.486,00	$ -	0,00%	17/04/2024	NO HA INICIADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	$ 350.997.438,48	$ 350.997.438,48	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	$ 827.987.076,00	$ 556.065.942,00	67,16%	20/02/2024	EN EJECUCIÓN
11	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL**	$ 100.000.000,00	$ -	0,00%	30/03/2024	NO HA INICIADO
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	$ 762.681.025,00	$ 612.574.250,00	80,32%	5/01/2024	EN EJECUCIÓN
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	$ 1.228.838.776,00	$ 1.228.838.776,00	100,00%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	$ 1.206.469.428,00	$ 980.328.057,70	81,26%	22/11/2023	EN EJECUCIÓN
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL**	$ 498.001.754,00	$ 135.438.403,56	27,20%	29/02/2024	NO HA INICIADO
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**	$ 1.221.970.692,20	$ 1.221.970.692,20	100,00%	30/08/2023	FINALIZADO
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	$ 457.831.172,00	$ -	0,00%	11/04/2024	NO HA INICIADO
18	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**	$ 304.703.052,00	$ 5.437.271,00	1,78%	14/02/2024	NO HA INICIADO
19	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	$ 656.544.890,00	$ 414.257.543,00	63,10%	28/02/2024	NO HA INICIADO
20	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	$ 339.352.709,00	$ 288.494.194,00	85,01%	2/03/2024	NO HA INICIADO
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	$ 2.027.739.816,00	$ 1.875.491.516,58	92,49%	8/04/2024	EN EJECUCIÓN
22	**COLEGIO FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS**	$ 455.893.410,00	$ -	0,00%	18/04/2024	NO HA INICIADO
23	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	$ 335.852.053,00	$ 251.696.446,54	74,94%	28/12/2023	NO HA INICIADO
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	$ 702.836.423,00	$ 571.949.733,00	81,38%	7/02/2024	EN EJECUCIÓN
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**	$ 256.734.268,00	$ 256.734.268,00	100,00%	15/09/2023	FINALIZADO
29	**TALLER BICICLETERO**	$ 250.000.000,00	$ 201.665.828,00	80,67%	19/12/2023	EN EJECUCIÓN
27	**EMERGENCIAS**	$ 862.485.928,00	$ 532.852.321,00	61,78%	19/04/2024	EN EJECUCIÓN

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO SEMANAL

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**	Se entrega a la institucion los alcalces realizados en los diferentes espacios intervenidos	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**	Se realiza reunión con la SED, directivos de la institución, contratista e interventoría; donde el especialista de la sed emite recomendaciones para subsanar problema d3e las bombas y presión en las baterías sanitarias de la institución.	FRENTE TERMINADO Y EN OBSERVACIÓN

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
4	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**	Se continua finalizando actividades referente a detalles de acabados, se continua con la compactación del recebo para la intervención de la cancha, se requiere mejorar acabados en bordillo de escaleras.	PERSONAL Técnico profesional (1) personas - Rotativo Operativo: Dos (2). Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor.
5	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**	Se realiza de implatacion de los arcos de las canchas.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Herramienta menor.
6	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**	Se termina con la instalacion de las luminarias y se realiza el aseo en las baterias sanitarias de profesores.	PERSONAL Profesional y técnico: Dos (2) personas - Rotativos Operativo: dos (2) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
7	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
9	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**	Se espera a la salida de los estudiantes para comenzar la intervencion de la cancha.	FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
10	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**	Se continua con la instalacion de la estructura metalica de la pergola en el area de la plazoleta, se continua con el sellamiento de juntas y la aplicación del autonivelna	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: dos(2) personas Equipo: Herramienta menor
12	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**	Continua actividad de instalación de red electrica y aparatos, continua actividad de ijstalacion de cielo raso en pvc. Continua actividad de encorozado.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Dos (2) personas Equipo: Compresor y herramienta menor.
13	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**	Se continua con la pintura y acabados en la sala de profesores primer piso, se inicia con la actividad de instalacion de ventana en aluminio en el area de la biblioteca	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cinco (5) personas Equipo: Andamios, compresor, herramienta menor.
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**	Sa continua con la pintura de fachada y la pintura de vigas y columnas, se realiza pintura de placa en los accesos del bloque, se isntalan las puertas de madera en el area administrativa	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
14	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: tres (3) personas Equipo: Andamios y equipos de soldadura
15	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, IGABRIELA MISTRAL**	Se continua con la instalación de piso en porcelanato en área de bodega 1, el cual se le realizó alistado impermeabilizado debido a la presencian de humedad, se requiere la intervención del componente eléctrico.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: 1 (1) persona. Equipo: Andamios y equipos de soldadura
16	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
17	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO**	Se realiza proceso de desmonte de cubierta existente e inmediatamente se inicia con la instalación de la estructura metálica para el manejo de las pendientes a dos (2) aguas.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Doce (12) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
21	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**	Continua con la instalación de pañete en bloque #12, e instalación de tubaria eléctrica, mantenimiento de puertas , desmonte de cubierta en asbesto cemento en zona de bachillerato, y compactación en zona de circulación acceso a aulas segundo piso enn zona de primaria.	PERSONAL Profesional y técnico: Uno (1) personas - Rotativos Operativo:Doce (12) personas Equipo: Andamios, equipos de soldadura y herramienta menor
24	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**	Continua actividad de demolición de placa, Continua actividad de excavación de material común, Continua actividad de levantamiento de muro estructural, Continua actividad de fundida de columnetas de confinamiento, Continua actividad de fundida de viga de cimentación.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Herramienta menor y rotomartillo
25	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		FRENTE TERMINADO Y ENTREGADO
27	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**	Se espera a la salida de los estudiantes para comenzar la intervención de fachadas	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Una (1) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
28	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**	Se continua con la fabricación de paneles en sitio para la instalación del cerramiento, el cual lleva un avance de aproximadamengte 300 M2.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
29	**COLEGIO ALIANZA QUIROGA**	Se realizó acondicionamiento de terreno para la intervención de maloka y aplicación de recebo,se programa fundida de elementos estructurales (Viga de Cimentación) para el dia Jueves 23 de Noviembre 2023.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor


CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS	PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA
30	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**	Se inicia la actividad de desmonte de cubierta e instalacion de la misma en el ala 2	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Cuatro (4) personas Equipo: Andamios, rotomartillo y herramienta menor
31	**TALLER BICICLETERO**	Continua extendido y compactación de material de sub base, continua actividad defundida de placa.	PERSONAL Profesional y técnico: Una (1) persona - Rotativa Operativo: Tres (3) personas Equipo: Herramienta menor y maquina excavadora
32	**EMERGENCIAS**	Se está a la espera de que el contratista inicie con la ejecución del resto de la emergencias que están pendientes a la fecha.	

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 15.815.283.272,16	93,08%	-11,30%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 13.895.935.544,35	81,78%	

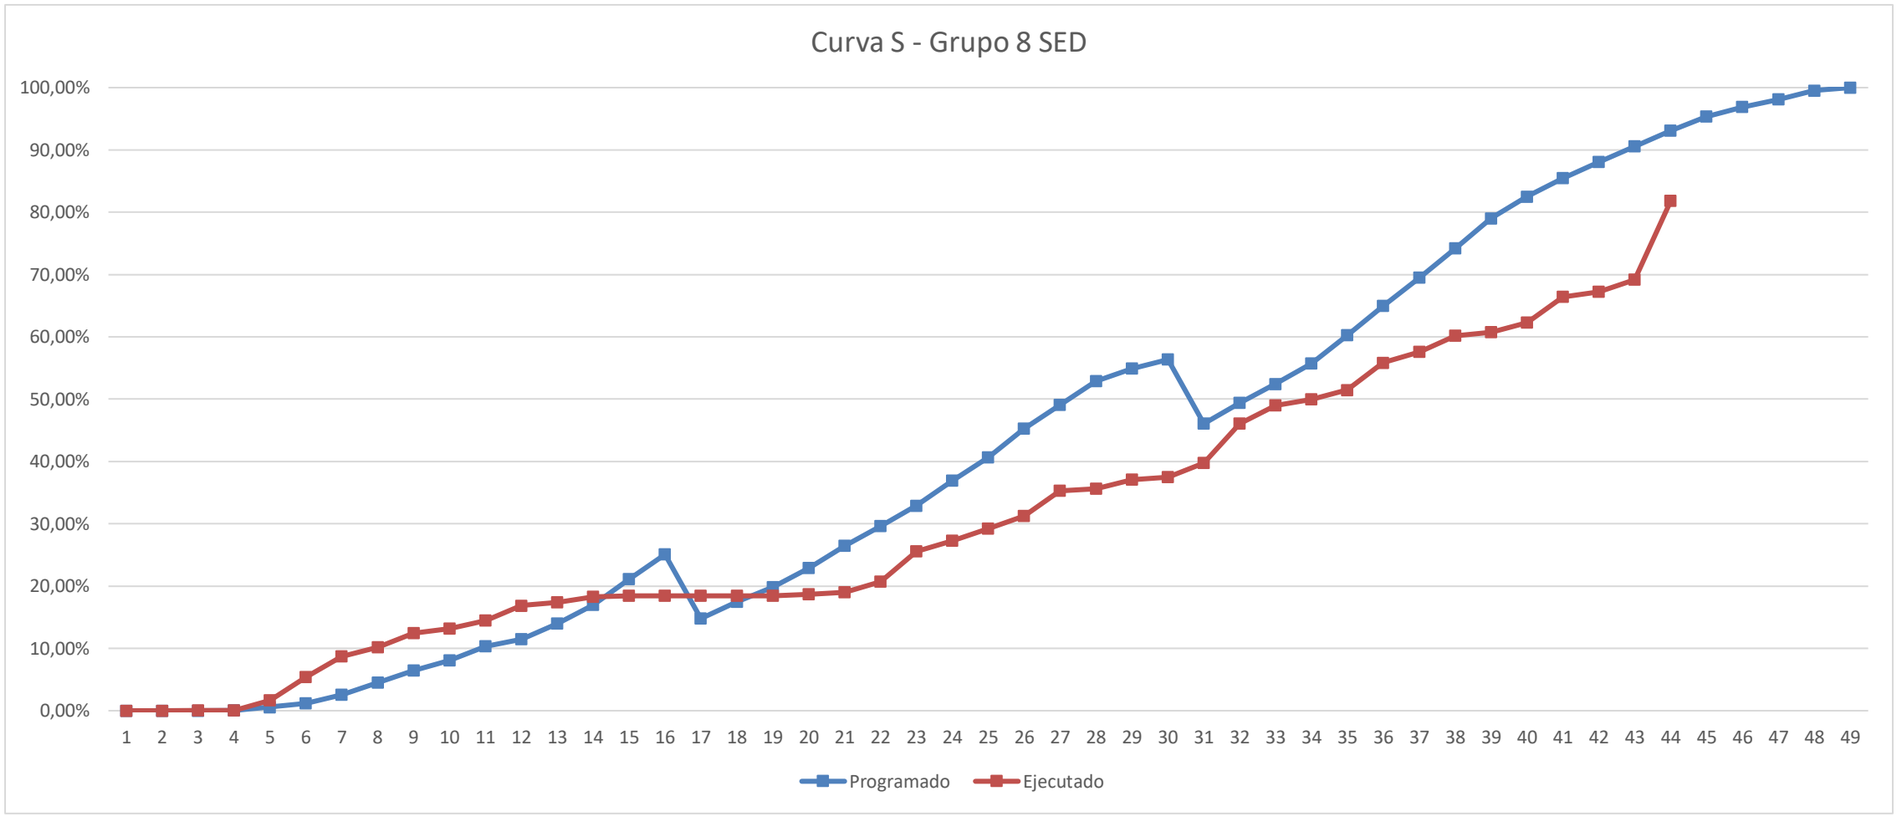

6. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Para el presente periodo, el atraso asciende al 11,30%. No obstante, es importante acotar que ya existe lineamiento oficial desde la SED de realizar la solicitud de prórroga No.1 y adición No.2 del contrato de obra, con ocasión a la ampliación del alcance, lo cual ha representando un aumento del 50% del valor inicial, necesitandose con ello una ampliación en el plazo no menor a cuatro (4) meses calendario.

Por consoguiente, este atraso cuantificado al día de hoy no representa un dato certero, ya que la siguiente semana el contratista de obra entregará una reprogramación, por medio de la cual extenderá los tiempos de ejecución de los frentes que apliquen, permitiendo con ello una distribución adecuada recurso y reduciendo a gran escala el atraso materializado a hoy. La reprogramación entrará en vigencia en el siguiente periodo semanal y es precisamente por ello que esta interventoría no ha realizado llamados de atención al contratista de obra, a pesar de que el atraso en las últimas semanas ha sido representativo, dado el preacuerdo de la prórroga y con ello la reorganización de los recursos a invertir en cada frente.

7. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

8. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

* El contratista de obra sigue sin atender las observaciones correspondientes al APU relacionado con la reparación de la red hidráulica de la IED Alexander Fleming.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con respecto al resto de frentes previstos para intervención o para emergencias, se informa lo siguiente:




Colegio María Cano: El contratista suministró las alternativas presupuestales de este frente y solicitó una evaluación estructural para garantizar que la intervención no presente riesgos.
Colegio Bravo Páez: El contratista de obra ya realizó la visita a la obra y no realizó la entrega de su concepto técnico.
Colegio Restrepo Millán sede D: El riesgo existente con las redes eléctricas será intervenido a través del alcance del frente.

Pendiente la atención de varias emergencias a la fecha que ya fueron notificadas de manera oficial al contratista de obra.

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública




FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

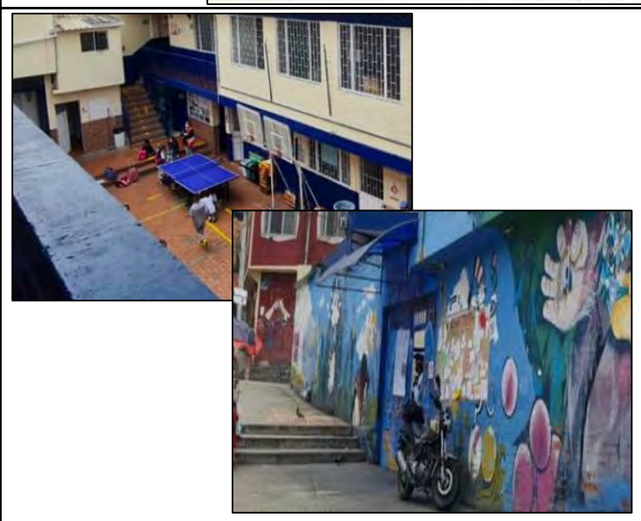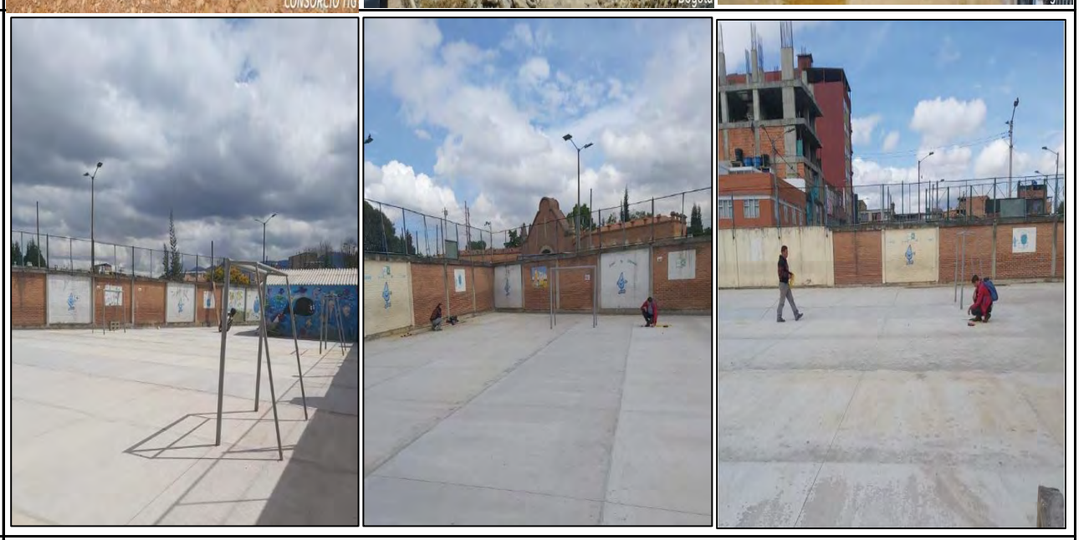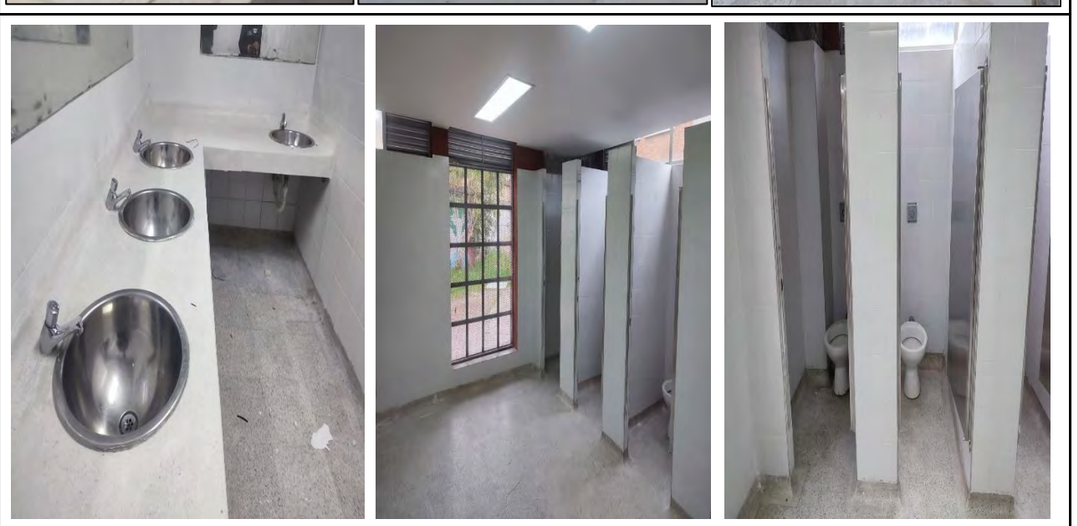10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
1	**COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE**		
2	**COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES**		
3	**COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II**		
4	**COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO**		
5	**COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA**		

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

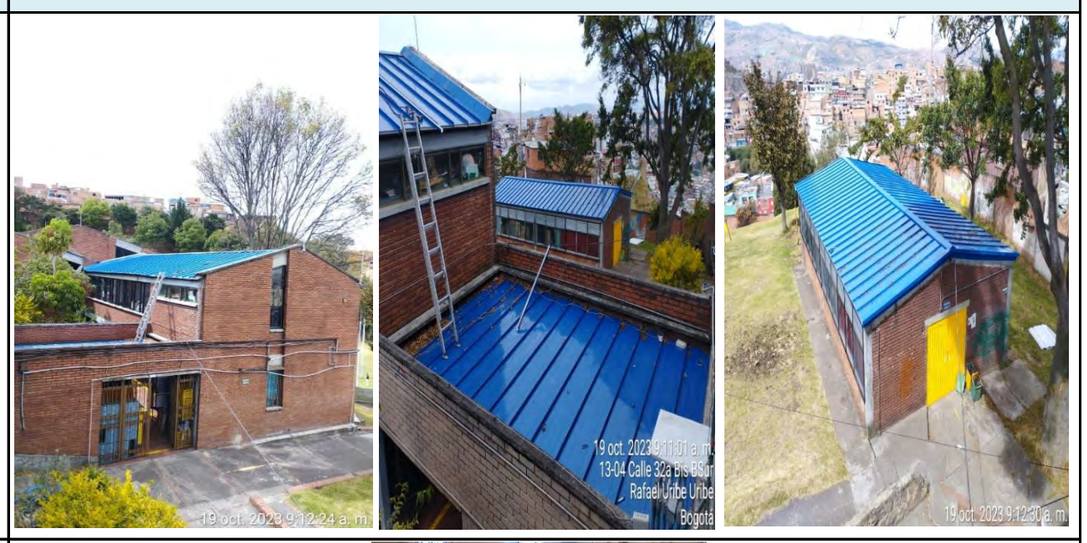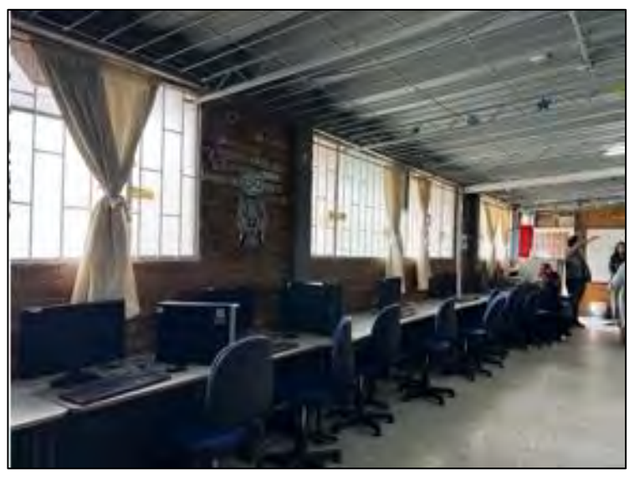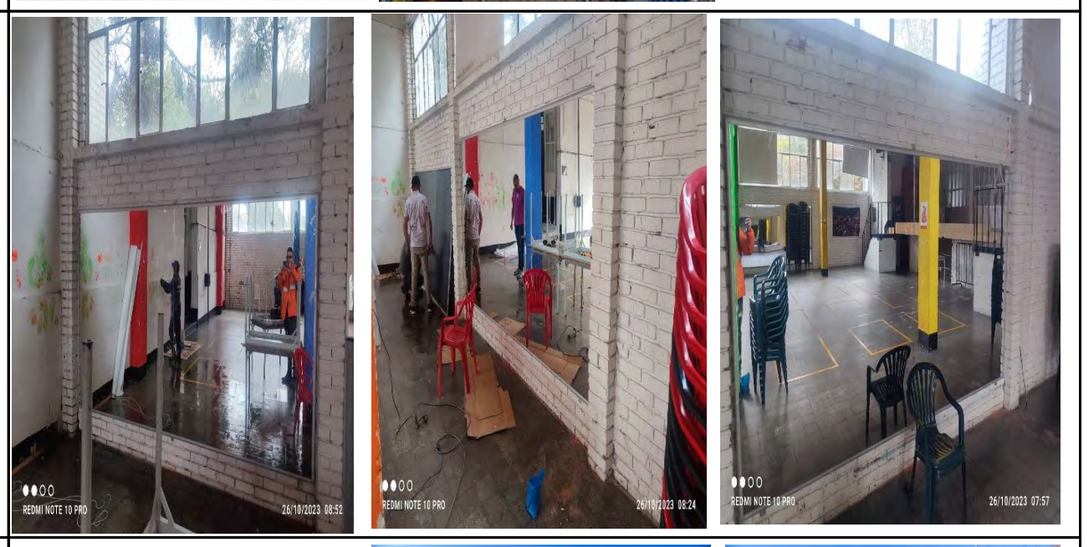	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
6	**COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		
7	**COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO**		
8	**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ**		
9	**COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ**		
10	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA**		

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
11	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA**		
12	**COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D,GABRIELA MISTRAL**		
13	**COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN**		
14	**COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**		
15	**COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS SEDE A**		



CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

No.	NOMBRE DE LA IED	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE
16	**COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**		
17	**COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**		
18	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**		
19	**COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**		
20	**TALLER BICICLETERO**		

CONSORCIO TIG	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** GES-FO-016 **Versión:** 2 **Fecha de Aprobación:** 22-Abr-2022 **Clasificación:** Pública

FECHA	20/11/2023	**PERIODO No.**	**44**	DEL	**13/11/2023**	AL	**19/11/2023**

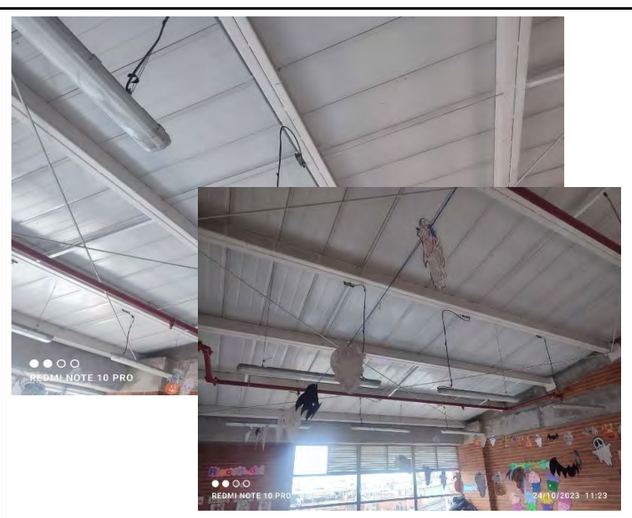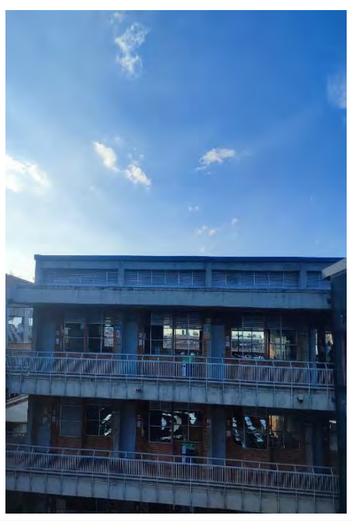21	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B**		  

FIRMA INTERVENTORÍA
ING. EDISON RICARDO DUARTE
Director de Interventoria
CONSORCIO TIG

VoBo SUPERVISOR
ARQ ALEXANDER OSORIO PEREZ
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIÒN

Anexo 1.1.6. Pólizas Contrato de obra

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
132672	BOGOTÁ D.C.	11		15	400044675	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
15 / 12 / 2022	18 / 10 / 2022	00:00	18 / 9 / 2023	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12-21 MEZANNINE, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3232090093

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9	TELÉFONO	3232090093
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	597.063.107,50	597,063,107.50	597.063.107,50	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	298.531.553,75	298,531,553.75	298.531.553,75	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	298.531.553,75	298,531,553.75	298.531.553,75	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	298.531.553,75	298,531,553.75	298.531.553,75	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	298.531.553,75	298,531,553.75	298.531.553,75	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 06/12/2022	9016347039

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 597.063.107,50	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
C & D SEGUROS LTDA	95166849	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

Mateo Lizardo V.

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LBASTO

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400044675	1	BOGOTÁ D.C.	Día - Mes - Año 15 12 2022	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
18 10 2022	00:00	18 9 2023	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12-21 MEZANNINE, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3232090093

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9	TELÉFONO	3232090093
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA SEGUN FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO INFORMADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CO 1.PCCN TR4077645 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

ZONA 8: EL CUAL ATENDERAN LAS INTERVENCIONES EN MODALIDAD PROGRAMADA Y EMERGENCIA EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE - ZONA ORIENTE.

COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRA¬TISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA
TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

NOTA ACLARATORIA
TOMADOR CONSORCIO MIA GP CONFORMADO POR
* GP CARIBE S.A.S. NIT.901415289-1 PARCIPACION 50%
* MIA GRUPO EMPRESIAL S.A.S. NIT.901110703–1 PARCIPACION 50%

ASEGURADOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9 y CONSORCIO MIA GP NIT. 901.634.703-9

BENEFICIARIOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9 y TERCEROS AFECTADOS

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400044675

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
06/12/2022	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 15 DE 2.022

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Mateo Uzardo V.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros
NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
132671	BOGOTÁ D.C.		11		30	400044676	1
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
15 / 12 / 2022	18 / 10 / 2022	00:00	18 / 9 / 2028	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12-21 MEZANNINE, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3232090093

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12-21 MEZANNINE, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3232090093

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	NIT	899.999.061 - 9	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	NIT	899.999.061 - 9	TELÉFONO	3241000

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 1:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/10/2022	18/03/2024	2.388.252.430.00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/10/2022	18/09/2026	1.194.126.215.00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/09/2023	18/09/2025	2.388.252.430.00	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 07/12/2022	9016347039

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 5.970.631.075,00	CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
C & D SEGUROS LTDA	9516684[illegible]	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

Mateo Lizardo V.
FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LBASTO
Scanned with CamScanner

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400044676	1	BOGOTÁ D.C.	15 /12 /2022	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 18 /10 /2022	00:00 Horas del 18 /9 /2028	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12-21 MEZANNINE, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3232090093
ASEGURADO	BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	NIT	899.999.061 - 9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO #66-63, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	NIT	899.999.061 - 9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO #66-63, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA SEGUN FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO INFORMADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CO 1.PCCN TR4077645 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

ZONA 8: EL CUAL ATENDERAN LAS INTERVENCIONES EN MODALIDAD PROGRAMADA Y EMERGENCIA EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE - ZONA ORIENTE

TOMADOR AFIANZADO
CONSORCIO MIA GP CONFORMADO POR
GP CARIBE S.A.S. NIT 901110703 PARTICIPACION DEL - 50%
MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS NIT 901415289 PARTICIPACION DEL 50%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.


VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
07/12/2022	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 15 DE 2022



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Mateo Uzardo V.

Scanned with CamScanner

NACIONAL DE SEGUROS S.A.


CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400044676, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO MIA GP
NIT : 901.634.703 - 9
Asegurado : BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
NIT : 899.999.061 - 9

Se expide la presente certificación a los 15 días del mes de Diciembre de 2022.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros
NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
135264	BOGOTÁ D.C.		11		30	400044676	2
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
31 / 1 / 2023	20 / 1 / 2023	00:00	20 / 12 / 2028	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12-21 MEZANNINE, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3232090093

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12-21 MEZANNINE, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3232090093

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	NIT	899.999.061 - 9	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	NIT	899.999.061 - 9	TELÉFONO	3241000

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 20 01 2023-
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CO 1.PCCN TR4077645 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2023	20/06/2024	2.388.252.430.00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/01/2023	20/12/2026	1.194.126.215.00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/12/2023	20/12/2025	2.388.252.430.00	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	01/02/2023	9016347039

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 5.970.631.075,00	CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
C & D SEGUROS LTDA	9516684	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LBASTO

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400044676	2	BOGOTÁ D.C.	31 /1 /2023	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 20 /1 /2023	00:00 Horas del 20 /12 /2028	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12-21 MEZANNINE, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3232090093
ASEGURADO	BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	NIT	899.999.061 - 9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO #66-63, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	NIT	899.999.061 - 9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO #66-63, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241000

Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

ZONA 8: EL CUAL ATENDERAN LAS INTERVENCIONES EN MODALIDAD PROGRAMADA Y EMERGENCIA EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE - ZONA ORIENTE

TOMADOR AFIANZADO
CONSORCIO MIA GP CONFORMADO POR
GP CARIBE S.A.S. NIT 901110703 PARTICIPACION DEL - 50%
MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS NIT 901415289 PARTICIPACION DEL 50%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
01/02/2023	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 31 DE 2023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Mateo Lizarazo V.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.


CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400044676, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO MIA GP
NIT : 901.634.703 - 9
Asegurado : BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
NIT : 899.999.061 - 9

Se expide la presente certificación a los 31 días del mes de Enero de 2023.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
135265	BOGOTÁ D.C.	11		15	400044675	2

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
31 / 1 / 2023	20 / 1 / 2023	00:00	20 / 12 / 2023	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12-21 MEZANNINE, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3232090093

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9	TELÉFONO	3232090093
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	597.063.107,50	597,063,107.50	597.063.107,50	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	298.531.553,75	298,531,553.75	298.531.553,75	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	298.531.553,75	298,531,553.75	298.531.553,75	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	298.531.553,75	298,531,553.75	298.531.553,75	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	298.531.553,75	298,531,553.75	298.531.553,75	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 01/02/2023	9016347039

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 597.063.107,50	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
C & D SEGUROS LTDA	95166849	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

Mateo Lizardo V.
FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4.
(057 1) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal: Liliana Otero
Defensor suplente: Iván Darío Amaya
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0801
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

LBASTO

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400044675	2	BOGOTÁ D.C.	Día - Mes - Año 31 1 2023	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
20 1 2023	00:00	20 12 2023	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12-21 MEZANNINE, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3232090093

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO MIA GP	NIT	901.634.703 - 9	TELÉFONO	3232090093
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 20 01 2023-
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CO 1.PCCN TR4077645 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

ZONA 8: EL CUAL ATENDERAN LAS INTERVENCIONES EN MODALIDAD PROGRAMADA Y EMERGENCIA EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE - ZONA ORIENTE.

COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRA¬TISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

NOTA ACLARATORIA
TOMADOR CONSORCIO MIA GP CONFORMADO POR
* GP CARIBE S.A.S. NIT.901415289-1 PARCIPACION 50%
* MIA GRUPO EMPRESIAL S.A.S. NIT.901110703–1 PARCIPACION 50%

ASEGURADOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9 y CONSORCIO MIA GP NIT. 901.634.703-9

BENEFICIARIOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9 y TERCEROS AFECTADOS

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400044675

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
01/02/2023	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 31 DE 2.023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Mateo Lizarda V.

Anexo 1.1.7. Pólizas Contrato de interventoría

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101402266**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	**12**	**2022**	**12**	**12**	**2022**	**00:00**	**12**	**12**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL **CONSORCIO TIG** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.649.890-3**

DIRECCIÓN: CR 47 A NRO. 93 - 41 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3112004626

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN: AV DORADO NRO. 66 - 63 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**12/12/2022**	**12/06/2024**	**$175,717,587.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**12/12/2022**	**12/12/2026**	**$43,929,396.90**
CALIDAD DEL SERVICIO	**12/12/2023**	**12/12/2028**	**$175,717,587.60**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GES INVERSIONES S.A.S	901085973-4	30.00
INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S.	901158110-1	30.00
TOTALL SAS	901384670-0	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,902,252.00	$ ******20,000.00	$ *****555,228.00	$ *********3,477,480.00	$ ******395,364,572.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101402266

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101402266**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	**12**	**2022**	**12**	**12**	**2022**	**00:00**	**12**	**12**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO TIG	**NIT: 901.649.890-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 47 A NRO. 93 - 41	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112004626

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,902,252.00	$ ******20,000.00	$ *****555,228.00	$ *********3,477,480.00	$ ******395,364,572.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005131445481(3900)000003477480(96)20231212

REFERENCIA PAGO:

1100513144548-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101402266, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 19 días del mes de DICIEMBRE de 2022

21-44-101402266

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101402266**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**01**	**2023**	**03**	**01**	**2023**	**00:00**	**03**	**01**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO TIG	**NIT: 901.649.890-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 47 A NRO. 93 - 41	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112004626

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**03/01/2023**	**04/07/2024**	**$175,717,587.60**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**03/01/2023**	**03/01/2027**	**$43,929,396.90**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**03/01/2024**	**03/01/2029**	**$175,717,587.60**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO CON FECHA DE 03/01/2023 SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,902,252.00	$ ******20,000.00	$ *****555,228.00	$ *********3,477,480.00	$ ******395,364,572.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101402266

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101402266**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**01**	**2023**	**03**	**01**	**2023**	**00:00**	**03**	**01**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO TIG	**NIT: 901.649.890-3**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CR 47 A NRO. 93 - 41		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3112004626

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
AV DORADO NRO. 66 - 63		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3241000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,902,252.00	$ ******20,000.00	$ *****555,228.00	$ *********3,477,480.00	$ ******395,364,572.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005131625868(3900)000003477480(96)20240103

REFERENCIA PAGO:

1100513162586-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101402266	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	01	2023	03	01	2023	00:00	03	01	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO TIG		**NIT: 901.649.890-3**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 47 A NRO. 93 - 41		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3112004626

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV DORADO NRO. 66 - 63		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GES INVERSIONES S.A.S	901085973-4	30.00
INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S.	901158110-1	30.00
TOTALL SAS	901384670-0	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101402266

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101402266, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de ENERO de 2023

21-44-101402266

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101402266**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**05**	**2023**	**03**	**01**	**2023**	**00:00**	**03**	**01**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO TIG	**NIT: 901.649.890-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 47 A NRO. 93 - 41	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112004626

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**03/01/2023**	**04/07/2024**	**$250,029,145.40**	**$175,717,587.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**03/01/2023**	**03/01/2027**	**$62,507,286.35**	**$43,929,396.90**
CALIDAD DEL SERVICIO	**03/01/2024**	**03/01/2029**	**$250,029,145.40**	**$175,717,587.60**

ACLARACIONES

MEDIANTE ELPRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA SUMA ASEGURADA DE LOS AMPAROS SEGUN MODIFICACION CONTRACTUAL No. 1 EN EL CUAL SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO $ 371.557.789,00 QUEDANDO COMO NUEVO VALOR DEL CONTRATO $ 1.250.145.727.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS PERMANECEN EN LAS MISMAS CONDICIONES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,157,387.00	$ *******8,000.00	$ *****221,423.00	$ *********1,386,810.00	$ ******562,565,577.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101402266

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101402266**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**05**	**2023**	**03**	**01**	**2023**	**00:00**	**03**	**01**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO TIG	**NIT: 901.649.890-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 47 A NRO. 93 - 41	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3112004626

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · Copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,157,387.00	$ *******8,000.00	$ *****221,423.00	$ *********1,386,810.00	$ ******562,565,577.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005132555313(3900)000001386810(96)20240507

REFERENCIA PAGO:

1100513255531-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101402266	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	05	2023	03	01	2023	00:00	03	01	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO TIG		**NIT: 901.649.890-3**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 47 A NRO. 93 - 41		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3112004626

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV DORADO NRO. 66 - 63		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GES INVERSIONES S.A.S	901085973-4	30.00
INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S.	901158110-1	30.00
TOTALL SAS	901384670-0	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101402266

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101402266, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 08 días del mes de MAYO de 2023

21-44-101402266

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

ANEXO 1.2 INFORME TÉCNICO

Anexo 1.2.1. Soportes control de calidad

CIDET

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme

No. 03331

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES DE COBRE, AISLADOS EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO, 600V, TIPO THHN/THWN.(CON PVC) APTOS PARA USO EN CT DESDE EL CALIBRE 12 AWG	CALIBRES 14 AWG AL 1000 kcmil

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and indentification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.I. planta de **BARRANQUILLA**
y comercializado por **PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.I.**

Calle 20 68B - 71, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE

Fecha de Certificación: 30 / 01 / 2009
Última actualización: 30 / 07 / 2015
Fecha de Vencimiento: 15 / 06 / 2018

Fecha máxima para las próximas auditorias de seguimiento: 16 / 06 / 2016 y 16 / 06 / 2017

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive Director

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.

ANSI Accredited Program PRODUCT CERTIFICATION ID # 0825

ONAC ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-004

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 **Tel:** (+574) 444 12 11 **Fax:** (+574) 444 0460

CIDET

ANSI Accredited Program
PRODUCT CERTIFICATION
ID # 0829

ONAC
ACREDITADO ISO/IEC
Guide 65:1996 09-CPR-004

ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 03331

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 30 / 01 / 2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 / 07 / 2015
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 / 06 / 2018

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS FABRICADOS POR PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.I., PLANTA DE BARRANQUILLA, Y COMERCIALIZADOS POR PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.I. UBICADA EN LA CALLE 20 68B - 71, BOGOTÁ, COLOMBIA

Tipo	Cables de cobre, aislados en material termoplástico, 600 V, tipo THHN/THWN. (con PVC marca ANDINA PLAST O GEON PLAST) Aptos para uso en CT (Cable Tray) desde el calibre 12 AWG
Referencia	Calibres 14 AWG al 1000 kcmil
Aislamientos	PVC 90 °C
Máxima temperatura	90 °C seco 75 °C húmedo
Conductor	Alambres o conductores cableado concéntrico de cobre suave
Cubierta	Nylon
Aplicación	Cables para instalaciones y construcciones residenciales, industriales y comerciales de baja tensión (600 V)
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE

Atentamente,

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo

DRIOS

Sello con Reglamento Técnico

icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

BARRAS CORRUGADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

Comercializado por **DIACO S.A.,** en la **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Trade by **DIACO S.A.,** in the **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:
"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:
"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia

Technical Regulations applicable to deformed bars for concrete reinforcement in earthquake resistant buildings that are manufactured, imported or marketed in Colombia

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado **CSR - CER269688**
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2013-09-27	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2018-03-09
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2016-08-17	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2022-09-26

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ANSI ANSI Accredited Program PRODUCT CERTIFICATION

DIACO S.A.

Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Anexo Certificado **CSR - CER269688**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** **2018-03-09**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** **2022-09-26**
Renewal Date: *Expiration Date:*

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Nombre de la Planta - Dicrección - País	Tipo de Planta
DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia	Fabricante Titular

DIACO S.A.

Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Anexo Certificado **CSR - CER269688**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** **2018-03-09**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** **2022-09-26**
Renewal Date: *Expiration Date:*

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	11.0 mm	11.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12.0 mm	12.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	1/4 Pulgada	1/4 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/4 Pulgadas	1/4 Pulgadas	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

DIACO S.A.

Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Anexo Certificado **CSR - CER269688**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** **2018-03-09**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** **2022-09-26**
Renewal Date: *Expiration Date:*

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12 mm	12 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADOS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 ¼ Pulgada	1 ¼ Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization´s Management System of:

DIACO S.A.

Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Fabricación y comercialización de productos de acero para la construcción y la industria. Desintegración vehicular recepción e industrialización de chatarra.
No aplica: 8.3

Manufacturing and commercialization of steel products for industrial and construction use. Vehicle dismantling process, reception and scrap industrialization

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC2392-1
Certificate

Fecha de Aprobación: 2004 08 11
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2019 07 05
Last Modification Date

Fecha de Vencimiento: 2022 11 14
Expiration Date

Fecha de Restauración:
Restoration Date

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-001

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado

DIACO S.A.

ANEXO CERTIFICADO SC2392-1 / CO- SC2392-1

Dirección de los sitios permanentes diferentes a la sede principal	Localización	Actividades del alcance o procesos desarrollados en este sitio
Autopista Sur Km 25, vía Sibaté	Sibaté - Colombia	Fabricación de productos de acero para la construcción y la industria
Carretera Central del Norte Km 27 vía Tunja-Paipa	Tuta - Colombia	Fabricación de productos de acero para la construcción y la industria
Km 2 vía Tocancipá - Zipaquirá, vereda Tibitó	Tocancipá - Colombia	Fabricación de productos de acero para la construcción y la industria. Desintegración vehicular
Calle 15F No. 112A - 91, Barrio Moravia	Bogotá - Colombia	Desintegración vehicular
Km 3 Vía Café Madrid Chimita	Girón - Colombia	Desintegración vehicular, recepción e industrialización de Chatarra
Autopista Medellín Bogotá Km 7 Vereda el Llano	Copacabana - Colombia	Desintegración vehicular recepción e industrialización de chatarra

Fecha de Aprobación: 2004 08 11
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2019 07 05
Last Modification Date

Fecha de Vencimiento: 2022 11 14
Expiration Date

Fecha de Restauración:
Restoration Date

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

DIACO S.A.

Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Fabricación y comercialización de productos de acero para la construcción y la industria. Desintegración vehicular recepción e industrialización de chatarra

Manufacturing and commercialization of steel products for industrial and construction use. Vehicle dismantling process, reception and scrap industrialization

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 2004 08 11
Expires on: 2022 11 14

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SC2392-1

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* AIB-Vinçotte International *Belgium* ANCE-SIGE *Mexico* APCER *Portugal* CCC *Cyprus* CISQ *Italy* CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* INTECO *Costa Rica* DQS Holding GmbH *Germany* FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* INNORPI *Tunisia* Inspecta Certification *Finland* IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland* PCBC Poland Quality Austria *Austria* RR *Russia* SII *Israel* SIQ *Slovenia* SIRIM QAS International *Malaysia* SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Sello con Reglamento Técnico

icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the ICONTEC certificate of conformity of product (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ALAMBRE DE ACERO GRAFILADO, MALLAS ELECTROSOLDADAS CON GRAFIL

Fabricado por **DIACO S.A.,** en la **Planta Muña:** Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia

Manufacturated by **DIACO S.A.,** in the **Planta Muña:** Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Reglamento técnico aplicable a alambre de acero liso y grafilado y mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia

Technical regulation applicable to steel wire plain and deformed and welded wire reinforcement for concrete that are manufactured, imported or marketed in Colombia

SECTOR ICS 77.140.15

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER416753
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-09-18
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2019-08-05
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-03-07
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANSI ACCREDITED
ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

DIACO S.A.

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Anexo Certificado **CSR -CER416753**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2015-09-18**
Approval Date:

Fecha Última Modificación: **2019-08-05**
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: **2021-03-07**
Expiration Date:

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GERDAU; DIACO	Alambre Grafilado	D 4,0	D 4,0	Diámetro: 4,0 mm Varilla y Rollos	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Alambre Grafilado	D 4,5	D 4,5	Diámetro: 4,5 mm Varilla y Rollos	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Alambre Grafilado	D 5,0	D 5,0	Diámetro: 5,0 mm Varilla y Rollos	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Alambre Grafilado	D 5,5	D 5,5	Diámetro: 5,5 mm Varilla y Rollos	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Alambre Grafilado	D 6,0	D 6,0	Diámetro: 6,0 mm Varilla y Rollos	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Alambre Grafilado	D 6,5	D 6,5	Diámetro: 6,5 mm Varilla y Rollos	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Alambre Grafilado	D 7,0	D 7,0	Diámetro: 7,0 mm Varilla y Rollos	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Alambre Grafilado	D 7,5	D 7,5	Diámetro: 7,5 mm Varilla y Rollos	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Alambre Grafilado	D 8,0	D 8,0	Diámetro: 8,0 mm Varilla y Rollos	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Alambre Grafilado	D 8.5	D 8.5	Diámetro: 8,5 mm Varilla y Rollos	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-050	XX-050	Estándar: Cuantía: 0.50; Diámetro Longitudinal: 4.0 mm,; Diámetro Transversal: 4.0 mm;; Separación Longitudinal: 250 mm,; Separación Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-063	XX-063	Estándar: Cuantía: 0.63; Diámetro Longitudinal: 4.0 mm,; Diámetro Transversal: 4.0 mm;; Separación Longitudinal: 200 mm,; Separación Transversa: 200 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-084	XX-084	Estándar: Cuantía: 0.84; Diámetro Longitudinal: 4.0 mm,; Diámetro Transversal: 4.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-106	XX-106	Estándar: Cuantía: 1.06; Diámetro Longitudinal: 4.5 mm,; Diámetro Transversal: 4.5 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-131	XX-131	Estándar: Cuantía: 1.31; Diámetro Longitudinal: 5.0 mm,; Diámetro Transversal: 5.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-159	XX-159	Estándar: Cuantía: 1.59; Diámetro Longitudinal: 5.5 mm,; Diámetro Transversal: 5.5 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia

Anexo Certificado **CSR -CER416753**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2015-09-18** **Fecha Última Modificación:** **2019-08-05**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2021-03-07**
Renewal Date: *Expiration Date:*

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-188	XX-188	Estándar: Cuantía: 1.88; Diámetro Longitudinal: 6.0 mm,; Diámetro Transversal: 6.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-221	XX-221	Estándar: Cuantía: 2.21; Diámetro Longitudinal: 6.5 mm,; Diámetro Transversal: 6.5 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-257	XX-257	Estándar: Cuantía: 2.57; Diámetro Longitudinal: 7.0 mm,; Diámetro Transversal: 7.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-295	XX-295	Estándar: Cuantía: 2.95; Diámetro Longitudinal: 7.5 mm,; Diámetro Transversal: 7.5 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-335	XX-335	Estándar: Cuantía: 3.35; Diámetro Longitudinal: 8.0 mm,; Diámetro Transversal: 8.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XX-378	XX-378	Estándar: Cuantía: 3.78; Diámetro Longitudinal: 8.5 mm,; Diámetro Transversal: 8.5 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XY-084	XY-084	Estándar: Cuantía: 0.84; Diámetro Longitudinal: 4.0 mm,; Diámetro Transversal: 4.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XY-106	XY-106	Estándar: Cuantía: 1.06; Diámetro Longitudinal: 4.5 mm,; Diámetro Transversal: 4.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XY-131	XY-131	Estándar: Cuantía: 1.31; Diámetro Longitudinal: 5.0 mm,; Diámetro Transversal: 4.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XY-158	XY-158	Estándar: Cuantía: 1.58 Diámetro Longitudinal: 5.5 mm, Diámetro Transversal: 4.0 mm; Separación Longitudinal: 150 mm, Separación Transversa: 250 mm Longitud: 6,00 m Ancho: 2,35 m Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente.	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XY-221	XY-221	Estándar: Cuantía: 2.21; Diámetro Longitudinal: 6.5 mm,; Diámetro Transversal: 4.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XY-257	XY-257	Estándar: Cuantía: 2.57; Diámetro Longitudinal: 7.0 mm,; Diámetro Transversal: 5.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XY-335	XY-335	Estándar: Cuantía: 3.35; Diámetro Longitudinal: 8.0 mm,; Diámetro Transversal: 5.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU; DIACO	Malla electrosoldada con; grafil	XY-378	XY-378	Estándar: Cuantía: 3.78; Diámetro Longitudinal: 8.5 mm,; Diámetro Transversal: 5.0 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 250 mm; Longitud: 6,00 m; Ancho: 2,35 m; Especial: Longitud, ancho y longitud de pelos de acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU DIACO	Malla electrosoldada con grafil	XX-159-B	XX-159-B	Estándar: Cuantía: 1.59; Diámetro Longitudinal: 5.5 mm,; Diámetro Transversal: 5.5 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Numero de grafiles transversales 28 Min; Numero de grafiles longitudinales 16; Longitud, ancho y longitud de pelos de; acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia

DIACO S.A. **Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**

Anexo Certificado **CSR -CER416753**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2015-09-18** **Fecha Última Modificación:** **2019-08-05**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2021-03-07**
Renewal Date: *Expiration Date:*

Nota: Los alambres grafilados para refuerzo de concreto de diámetros 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm solo pueden ser utilizados para la elaboración de mallas electrosoldadas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
GERDAU DIACO	Malla electrosoldada con grafil	XX-188-B	XX-188-B	Estándar: Cuantía: 3.78; Diámetro Longitudinal: 8.5 mm,; Diámetro Transversal: 8.5 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Numero de grafiles transversales 28 Min; Numero de grafiles longitudinales 16; Longitud, ancho y longitud de pelos de; acuerdo a solicitud del cliente.	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU DIACO	Malla electrosoldada con grafil	XX-221-B	XX-221-B	Estándar: Cuantía: 3.78; Diámetro Longitudinal: 8.5 mm,; Diámetro Transversal: 8.5 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Numero de grafiles transversales 28 Min; Numero de grafiles longitudinales 16; Longitud, ancho y longitud de pelos de; acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
GERDAU DIACO	Malla electrosoldada con grafil	XX-257-B	XX-257-B	Estándar: Cuantía: 3.78; Diámetro Longitudinal: 8.5 mm,; Diámetro Transversal: 8.5 mm;; Separación Longitudinal: 150 mm,; Separación Transversa: 150 mm; Numero de grafiles transversales 28 Min; Numero de grafiles longitudinales 16; Longitud, ancho y longitud de pelos de; acuerdo a solicitud del cliente	Planta Muña: Autopista Sur, Kilómetro 25 Vía Bogotá – Sibaté, Sibaté, Cundinamarca, Colombia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CUBIERTAS DESKA ® DSS

Deska
TECHOS CONTINUOS

LÍNEA DE CUBIERTAS SIN TRASLAPO DESKA®
DSS STANDING SEAM SENCILLA Y TIPO PANEL







VENTAJAS

- Interior plano con acabado en pintura poliéster sin espacio entre uniones, evita la acumulación de material particulado y contaminantes, ideal para zonas donde se requiere alta asepsia.
- Ideal para paneles termoacústicos con aislantes en poliuretano, poliestireno, fibra de vidrio o lana mineral de roca.
- Uniones grafadas que la hacen hermética y evitan desprendimiento en zonas de vientos fuertes.
- Se fabrican en la medida requerida en obra, evitando desperdicio y traslapos.
- Fabricadas en acero estructural, permite transitabilidad sobre la cubierta.
- Fijaciones ocultas que no perforan la cubierta, evitando el riesgo de goteras.
- Acabado interior con rigidizadores suaves, no requiere uso de cielo raso.
- Resistentes a la corrosión y decoloración, no requieren mantenimiento.
- Libre de asfalto, no es inflamable.
- Para todo tipo de pendientes.
- Permite techos curvos.

COLORES DISPONIBLES

B	R	A	G	V




PRADA ALVIAR


Cra. 18 # 46 - 103 **La Concordia**
Bucaramanga, Colombia
PBX: (57) 7 642 71 09
Móvil: (57) 310 680 7807
gerencia@pradaalviar.com
www.pradaalviar.com

ISO 9001 icontec internacional CO-SC-CER 272655
ISO 14001 icontec internacional CO-SA-CER 272656
OHSAS 18001 icontec internacional CO-SA-CER 272657
Norsok S-006 icontec internacional NK-223-1
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

DESKA® STANDING SEAM SENCILLO



DESKA® STANDING SEAM TIPO PANEL



CARACTERÍSTICAS

- Acero galvanizado prepintado, calidad estructural grado 40. G60 Z180 norma NTC 4011 - ASTM A 653 - ASTM A755M.
- Acero aluminizado prepintado, calidad estructural grado 37 AZ150 norma NTC 4011 - ASTM A 653 - ASTM A755M.
- Acero galvanizado crudo, calidad estructural grado 40. G60 Z180 norma NTC 4011 - ASTM A 653.
- Aluminio crudo, espesores desde 0,60 hasta 1,00 mm.

AISLANTE

- Láminas de fibra de vidrio ATAC, poliuretano PUR o poliisocianurato PIR, poliestireno y lana de roca con espesor según requerimiento, que actúan como aislante térmico y acústico moduladas según las dimensiones de la cubierta e instaladas en sitio.

ESPECIFICACIONES

Altura de panel	Espesor (mm)	Calibre	Peso kg/m2	Ancho útil mm	Rendimiento ml/m2
1,5"	0,46	26	4,67	300	3,33
	0,60	24	6,27		
	0,46	26	4,21	500	2,00
	0,60	24	5,63		

RECUBRIMIENTO DE PINTURA

Primer de poliuretano seguida por una capa de pintura poliéster líquida libre de aceites curada al horno.		
Cara superior (Exterior)	Capa primer	5 - 7 micras
	Capa acabado final	18 - 22 micras
Cara inferior (Interior)	Capa primer	5 - 7 micras
	Capa acabado final	8 - 12 micras

PROPIEDADES MECÁNICAS

Propiedades de la sección										
Referencia altura (Ancho)	Espesor (mm)	Calibre	Fy (ksi)	Peso (kgf/ml)	Flexión negativa			Flexión negativa		
					Ixe (mm^4)	Sxe (mm^3)	φMnxo (kgf-m)	Ixe (mm^4)	Sxe (mm^3)	φMnxo (kgf-m)
1,5 - 500 mm	0,60	24	40	2,82	30943	971	26	32931	993	26,5
	0,46	26	40	2,1	22322	712	19	23397	689	18,4
1,5 - 300 mm	0,60	24	40	1,88	29682	949	25,4	29682	949	25,4
	0,46	26	40	1,4	21676	704	18,8	21235	670	17,9

TABLA DE CARGAS


Panel sencillo		Luces mm	Luz simple		Luz continua	
			Carga (kgf/m²)		Carga (kgf/m²)	
Altura	Ancho		Cal 26	Cal 24	Cal 26	Cal 24
1,5"	500 mm	1,40	50	101	115	174
		1,50	40	82	100	152
		1,60	35	68	80	134
		1,70	30	56	66	118
		1,80	25	50	56	106

Panel con aislamiento en poliuretano 40 mm		Luces mm	Luz simple		Luz continua	
			Carga (kgf/m²)		Carga (kgf/m²)	
Altura	Ancho		Cal 26	Cal 24	Cal 26	Cal 24
1,5"	500 mm	1,40	95	205	225	340
		1,50	80	160	190	295
		1,60	65	130	155	260
		1,70	55	110	130	230
		1,80	45	90	110	205


INSTALACIÓN

- Tendido de paneles de cubierta interconectados sin traslapo transversal fijados a las correas mediante ganchos ocultos (CLIPS) tipo Z Cal 24 que no perforan la cubierta y garantizan absoluta estanqueidad. Fijación de clips con tornillo autoperforante tipo GX. Grafado manual o mecánico con Seamer eléctrico.


FIJACIÓN CON CLIP OCULTO



UNIÓN GRAFADA 90º



UNIÓN GRAFADA 180º



FICHA TÉCNICA Y MANUAL DE INSTALACIÓN LÁMINAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR


Ajover




LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR

La nueva Lámina de Policarbonato Alveolar Ajover es ideal en aplicaciones arquitectónicas para cubrir espacios que requieran iluminación natural, permitiendo ahorro en el consumo de energía y proporcionando una vista agradable a la construcción. Su flexibilidad permite crear estructuras curvas con radios de curvatura mínimos. Su alta resistencia al impacto y al deterioro generado por el medio ambiente, la convierte en la opción más eficiente frente al vidrio y al acrílico.

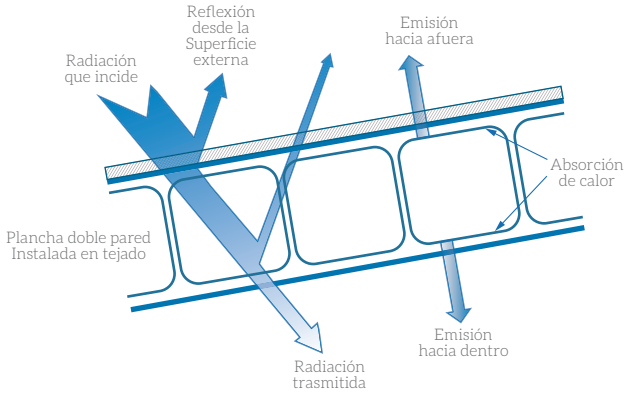MANEJO DE ILUMINACIÓN



COLORES DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS

Manejo de la Iluminación: Brinda una excelente iluminación natural. Sus paredes permiten una alta transmisión de luz con una difusión uniforme y evitan el paso de los rayos ultravioleta.

Aislamiento Térmico: Disminuye la transferencia de calor al interior de las edificaciones y ayuda a conservar la temperatura interna estable.

Economía: Su bajo peso permite la utilización de estructuras livianas y una fácil instalación en obra.

Versatilidad: Alcanza radios de curvatura pequeños lo que permite obtener diferentes diseños en la estructuras.

Seguridad: Tiene un bajo nivel de combustibilidad y no emite gases tóxicos.

Amigable con el Medio Ambiente: Material reciclable.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Láminas Ajover	Espesor (mm)	Peso x m² (Kg)	Conductancia Térmica W/m²°C
	6 mm	1.3 Kg	3.6
	8 mm	1.6 Kg	3.4

DISTANCIA ENTRE APOYOS

Ancho: Largo		1:1	1:1.5	1:>1.5	1:1	1:1.5	1:>1.5	1:1	1:1.5	1:>1.5	1:1	1:1.5	1:>1.5	1:1	1:1.5	1:>1.5	1:1	1:1.5	1:>1.5
Grosor Lámina (mm)	6 mm	1060	920	610	950	850	570	900	780	590									
	8 mm	1250	1100	720	1150	1020	655	1075	940	610	1020	900	570	970	830	535	930	780	510
Peso Máx. Kg/m²		60			80			100			120			140			180		

RADIO DE CURVATURA



Láminas en Espesor (mm)	Radio Mínimo de Curvatura en Frío (m)
6 mm	1.0 m
8 mm	1.4 m

DIMENSIONES

Largo (m)	Ancho (m)	Espesor A	Espesor B
2.95 m	2.10 m	6 mm	8 mm
5.90 m	2.10 m	6 mm	8 mm
11.80 m	2.10 m	6 mm	8 mm

PROPIEDADES

Características	Valor
Temperatura de deformación por calor	130°C máx.
Temperatura máxima por uso continuo	120°C
Transmisión de Luz	ALTA Hasta 80 % del vidrio
Conducción de calor	BAJA 1/4 de vidrio - 1/300 de acero - 1/12000 de bronce
Fragilización	BAJA Mín. -135°C y uso continuo -30°C
Combustión	BAJA Ante altas temperaturas de calor
Durabilidad	Protección Superior Anti-UV
Resistencia a la tracción	ALTA 350 Kgf/cm a 120°C
Resistencia de la curvatura	ALTA Aún en ángulos entre 80° y 90°
Resistencia al Impacto	ALTA 250 veces la del vidrio y 30 veces la de acrílico
Prueba de Sonido	BUENA Es superior al vidrio bajo la misma frecuencia alta de sonido
Peso	BAJO Es la mitad del vidrio con el mismo espesor y área de esfuerzo

DETALLES ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

PERFIL HCP:
Indicado para instalación sin perforar la plancha, para estructuras compuestas sólo de vigas.




PERFIL H:
Indicado para la unión de planchas en el ancho.



CUBREZÓCALO:
Indicado para sellado de alvéolos.



PERFIL SÚPER H:
Indicado para reforzar estructuralmente la unión entre las planchas



ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y PERFILES

Descripción	Medida	Color	Referencia
Tornillo Autoperforante para estructuras metálicas y láminas de 6 mm y 8 mm	1 ½"	Cristal	FTA 140141150
Perfil HCP para lámina en espesor de 6 mm y 8 mm, para instalación sin perforar la plancha	11.8 m	Cristal	LPTUAPS060400
Perfil H Normal para lámina en espesor de 6 mm	6 m	Cristal	LPTUAPH060400
Perfil H Normal para lámina en espesor de 8 mm	6 m	Cristal	LPTUAPH060800
Cubrezócalo para lámina en espesor de 6 mm	6 m	Cristal	LPTUAPU060300
Cubrezócalo para lámina en espesor de 8 mm	6 m	Cristal	LPTUAPU060400
Perfil Súper H para láminas de 6 mm y 8 mm, debido a su forma es un conector más estructural	11.8 m	Cristal	LPTUAPS060400

Nota: La cinta de aluminio impermeable es para sellar las celdas en la parte superior de la lámina.
La cinta de aluminio micro perforada es para sellar las celdas en la parte inferior de la lámina.

CORTE DE LA LÁMINA

- La herramienta ideal para cortar la lámina es el bisturí, que tiene la ventaja de no originar astillas difíciles de eliminar cuando penetran en los alvéolos.
- Las láminas se deben cortar antes de retirarles el film o foil protector.
- Apoye la lámina cerca del área de corte y sujétela firmemente para evitar tensiones y vibraciones.
- Mida, marque y corte evitando apoyar directamente las rodillas sobre la placa, pues podrían quedar marcadas.
- Use un aspirador o compresor de aire seco para eliminar los residuos de material o el polvo que pueda quedar dentro.


Procedimiento:
Use el bisturí con hoja bien afilada pasándola varias veces sobre la zona de corte.
Para separar las partes dé vuelta a la lámina, doble y vuelva a cortar a lo largo de la línea.

Nota: Utilizando otras herramientas la carga estática atrae a las finas astillas hacia el interior de las celdas, por lo tanto las sierras no son apropiadas para cortar láminas de 6 mm y 8 mm.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN


- Antes de iniciar cualquier trabajo en alturas debe tener todos los elementos de seguridad.
- La lámina no puede sufrir perforaciones.
- No colocar con accesorios de PVC.
- La lámina se debe instalar con cierta pendiente (mínimo ángulo 5°). Ésta debe tener en cuenta variableslcomo la longitud de la vertiente, las condiciones climáticas de la región, etc.

Importante: Para determinar la pendiente de instalación, consulte a su asesor experto en el tema, teniendo en cuenta las necesidades de su proyecto.




Las láminas deben quedar con la cara que tiene la protección UV hacia el exterior; la cara con la película de protección sin impresión es la cara que no tiene protección UV.

- Las láminas son flexibles en sentido longitudinal, lo que permite utilizarlas en techos curvos.




- Al ser instalada la lámina debe dejarse un espacio mínimo de 3 mm al conector o perfil para que las láminas dilaten y contraigan libremente.




- Las láminas deben instalarse con los nervios paralelos a la dirección de la pendiente. Deben quedar con la cara que tiene la protección UV (película con impresión) hacia el exterior.



- Una vez instaladas las láminas, se deben sellar las celdas con cintas de sellado y perfiles de remate, para evitar que se contamine al interior.




- Se debe retirar de inmediato la película plástica protectora de la cara expuesta al exterior para evitar que se adhiera a las láminas con el sol.



PASOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN


PASO 1:
Fije el perfil base a la estructura utilizando los tornillos recomendados, teniendo la precaución de que los tornillos no se doblen ni se rompan; verifique que éstos no ejerzan una presión excesiva sobre el perfil.

Importante: Las Láminas de Policarbonato Alveolar Ajover no se deben perforar.




PASO 2:
Coloque la lámina con la cara con protección UV hacia el exterior sobre los extremos del perfil base instalado.


Para realizar la instalación, es recomendable despegar la película unos 50 mm aproximadamente (tanto la película plástica protectora exterior, como la película interna sin impresión) con el fin de permitir una inserción limpia de la lámina en los perfiles y una aplicación exacta de las cintas de sellado.



PASO 3:
Coloque el segundo perfil base por debajo de la lámina dejando una distancia de 1,05 m y fíjelo a la estructura igual que en el paso 1.




PASO 4:
Conecte el perfil tapa al perfil base martillándolo con un mazo de goma y continúe agregando los perfiles y las láminas secuencialmente (paso 1 a paso 4), hasta llegar al final de la estructura.

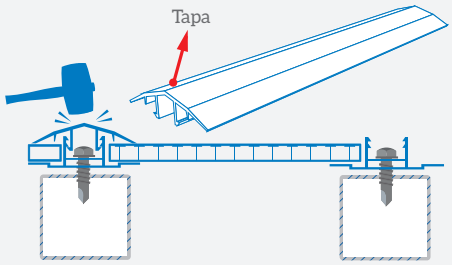


PASO 5:
Sellar la lámina en la parte superior con la cinta de aluminio impermeable (para prevenir la entrada de aire, polvo, suciedad y agua al interior); en la parte inferior, selle la lámina con la cinta de aluminio micro perforada, que además de proteger permite la salida de la condensación acumulada.

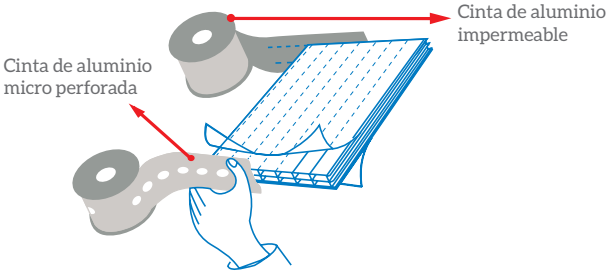Importante: No utilice silicona para sellar los alvéolos de la Lámina de Policarbonato Alveolar Ajover.




PASO 6:
Proteja el borde inicial y final de la lámina con perfiles de remate "U".
Perfore canales de drenaje en el perfil utilizado en la sección inferior del techo, con el fin de permitir el flujo del agua condensada a lo largo de la lámina.
Una el perfil de remate "U" a la plancha con el lado más corto encima de la lámina y el gotero hacia abajo.
Deje aproximadamente 6 mm de distancia entre el perfil "U" y la lámina para permitir que el agua escurra.

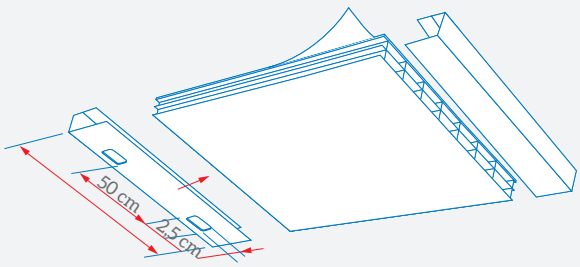


ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Almacenar sobre superficies planas bajo cubierta, en espacios secos y libres de polvo. Mantener fuera de contacto con la luz solar directa. No se puede exponer al sol hasta que se haya hecho la instalación y se haya retirado la película plástica protectora.

Apilar las láminas inclinadas, apoyadas unas contra otras contra la pared. Si el apilado es horizontal, tener en cuenta que la altura máxima de la pila no exceda de 1 metro y apoyarlas sobre una tarima o cartón de manera que no queden en contacto directo con el suelo para evitar la humedad.



Las láminas se deben almacenar con la cara que tiene la protección UV hacia el exterior, la cual se distingue por las indicaciones gráficas de la película plástica protectora.



Protección:

- Nunca pise o camine sobre las láminas, ni apoye codos o rodillas. Utilice siempre llltablones colocados en el mismo sentido que los soportes estructurales.
- Es importante mantener los alvéolos siempre sellados para prevenir la entrada de lllhumedad, polvo e insectos a través de los bordes de la lámina, especialmente en llllugares húmedos o de mucha contaminación.
- Las láminas de hasta 3 m de largo x 1 m de ancho pueden ser manejadas por una lllpersona. Las láminas más largas requieren de 2 o más personas. El manejo de las llláminas debe tener un cuidado especial en condiciones de viento constante.



LIMPIEZA Y MANTENIMINTO

Se recomienda realizar limpieza a las láminas mínimo dos veces al año para conservar su transparencia y apariencia agradable. Las láminas se pueden limpiar únicamente con agua y detergente neutro, utilizando un paño o esponja suave. Nunca debe utilizar limpiadores o solventes abrasivos, ni cepillos, estropajos o escobas. Seque inmediatamente con trapo o paño suave.

Nota: Las Láminas de Policarbonato Alveolar Ajover no deben exponerse al contacto con sustancias químicas como varsol, benceno, gasolina, thinner, acetonas, tetracloruro de carbono, ácido muriático, entre otros.

RECUERDE TENER EN CUENTA

No caminar directamente sobre la cubierta.
Las indicaciones técnicas de esta ficha son a manera de orientación general. Para el diseño e instalación de su cubierta, consulte con un profesional experto en el tema.

ADVERTENCIAS

Este producto debe ser instalado por personal profesional experto en el tema de acuerdo con las instrucciones técnicas correspondientes. AJOVER S.A. no presta el servicio de instalación por lo que los defectos por este concepto y/o mala manipulación no están cubiertos por la garantía. La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasen las resistencias del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.

Las especificaciones técnicas, características, materiales o diseños, indicadas en esta ficha técnica podrán ser modificadas en cualquier momento y sin previo aviso por el fabricante y sin que se genere ninguna responsabilidad a su cargo. La información de esta ficha técnica, incluyendo las instrucciones de instalación, son de carácter general por lo que no debe emplearse de ninguna forma, como sustituto de las necesidades y requisitos de cada proyecto, las cuales no son responsabilidad del fabricante ni de sus distribuidores. La instalación del producto debe hacerse por personal capacitado.

Al seleccionar la cubierta debe tenerse en cuenta el material y tipo de estructura de soporte de aquella, como también todas las cargas indicadas en la Norma Sismo resistente NSR 10, Título B, Cargas. Así mismo, deben tenerse en cuenta las variables o efectos no incluidos en dicha norma y los asentamientos, dilataciones térmicas u otras posibles condiciones.

AJOVER S.A. Tel: +57(1) 594 9999 • Calle 65 Bis No. 91 - 82 Bogotá, D.C. - Colombia
Línea gratuita de atención al cliente 01 8000 51 8800 • construccion@ajover.com

www.ajover.co Ajover

Nuestros productos cumplen con la legislación y requisitos aplicables.
MA:01-ES-PC-494 Rev.2 2016-07-01

METAL FL 103® PRO

Manto con refuerzo en Fibra de vidrio



Membrana impermeabilizante multicapa fabricada con base en asfaltos no oxidados modificados (fórmula Flextron®), con refuerzo central de fibra de vidrio y con acabado en foil de aluminio gofrado. El asfalto modificado con polímeros, copolímeros y elastómeros, proporciona un mejor desempeño en cuanto a la resistencia a la humedad, a su vez, mejora la elasticidad, plasticidad y flexibilidad permitiendo resistencia a los esfuerzos mecánicos.

Características

- El Manto METAL FL 103® PRO está recomendado para impermeabilización de cubiertas planas e inclinadas no transitables (solo tráfico de mantenimiento) y como aislante termo-acústico, cuya pendiente de aplicación debe ser de 1.5% mínimo y 15% máximo.
- El Manto METAL FL103® PRO está protegido con foil de aluminio, el cual refleja la luz solar y facilita el desplazamiento del agua.
- La línea METAL FL103 PRO, como todos los mantos impermeabilizantes Fiberglass Isover, ofrece aislamiento acústico a ruido de impacto por lluvia, así como a ruido aéreo en las cubiertas.
- El MANTO METAL FL-103® PRO está recomendado para ser instalado en clima cálido, se recomienda su instalación con temperatura ambiente entre 10°C y 60°C.
- La superficie de aplicación puede ser madera, concreto o metal, siguiendo las especificaciones y las instrucciones de aplicación.

Conformación del manto

1. Polietileno flameable
2. Asfalto modificado
3. Refuerzo en fibra de vidrio
4. Asfalto modificado
5. Acabado: Foil de aluminio





Detalle del acabado.

Propiedades Técnicas

PRODUCTO	LONGITUD (cm)	ANCHO (cm)	ESPESOR (mm)	TRASLAPO (cm)
MANTO METAL FL103 PRO 3.2	1000 ± 5	100 ± 1	3.2 ± 0.3	5
MANTO METAL FL103 PRO 3.6	1000 ± 5	100 ± 1	3.6 ± 0.3	5

Ficha técnica-P04_FT_106_MANTO METAL FL103 PRO_ES-23.05.2019

PROPIEDAD	NORMA	3.2 mm	3.6 mm
Flexibilidad en frio	ASTM D 5147	10 ° C (50° F)	10 ° C (50° F)
Resistencia a la tracción (Tolerancia: -100 N/50mm)	NTC 2436 (6.3)	580	600
Elongación	NTC 2436 (6.3)	4.5 % (-2)	4.5 % (-2)
Punzonamiento estático (Base concreto)	UNE-104-281-85 (6.5)	PS3 (1)	PS3 (1)
Absorción de agua	UNE-104-281-86 (6.11)	1% Max	1% Max
Perdidas por calentamiento	UNE 104 – 281-85 (6.3)	1% Max	1% Max

(1) PS3: Ninguna pérdida de impermeabilidad con carga >10 kg, pero pérdida de impermeabilidad con carga >20 kg

Contenido de Reciclado

(1) PI Contenido Reciclado Post Industrial: Recogido de los fabricantes o la industria.
(2) PC Contenido Reciclado Post-Consumidor: Recogido de usos finales.

CONTENIDO DE RECICLADO TOTAL	CONTENIDO DE RECICLADO POST-INDUSTRIAL PI (1)	CONTENIDO DE RECICLADO POST-CONSUMIDOR PC (2)
3.5 %	3.5 %	0 %

Mantenimiento

Mantenimiento cada 18 meses.
Foil: revisar traslapos en búsqueda de grietas, desgaste o perforaciones, limpiar y aplicar pintura bituminosa en los sellos.

Durabilidad: 10 – 12 años, Siempre y cuando se cumplan las disposiciones de uso, aplicación y mantenimiento recomendados por FiberGlass Isover.

Estándar Visual

CARACTERÍSTICA	GUÍA DE ACEPTACIÓN
Apariencia de la superficie de exposición	La cara de exposición está protegida con foil de aluminio gofrado, con un traslapo de aproximadamente 5 cm sin foil de aluminio. Por sus características el producto puede presentar apariencia opaca producida por la oxidación natural del foil de aluminio. El foil de aluminio no debe tener manchas marrones de corrosión. Es aceptable un máximo de 0.5 cm de desplazamiento del foil en el lado opuesto al traslapo.
Apariencia de la superficie de aplicación	La cara de aplicación presenta un polietileno negro impreso. No debe presentar ningún imperfecto que afecte en la calidad del producto (perforaciones, rayas profundas, bordes rasgados).

Recomendaciones

- El producto debe desenrollarse sin que se rasgue o delamine.
- El material debe mantenerse preferiblemente en módulos o en estiba en posición vertical con el traslapo hacia arriba.
- Se debe transportar con el montacargas en módulos o estibas y almacenar como máximo 3 módulos por fila (No se deben apilar estibas).
- Se debe almacenar en superficies planas y protegido del sol y del agua. (Máximo 60% de humedad, máxima temperatura de almacenamiento 40°C (104°F)).
- Para la aplicación del producto, se debe usar protección personal como gafas de seguridad, guantes de cuero y ropa de tela gruesa, dirigir siempre la llama al rollo teniendo en cuenta la dirección del viento y evitar la inhalación de vapores generados durante la aplicación.
- El producto debe ser manejado según instructivo de almacenamiento de productos FiberGlass Isover, por lo tanto, no es responsabilidad del fabricante el deterioro del producto como resultado de su mala disposición en el posterior transporte y manipulación, una vez entregado el producto.

Información adicional disponible en FiberGlass Isover, contacte su asesor comercial o consulte nuestra página web: www.isover.com.co

Empaque

PRODUCTO	UNIDAD FÍSICA / EMPAQUE	ÁREA / EMPAQUE (m^2)	MASA/ÁREA kg/m^2
MANTO METAL FL103 PRO 3.2	1 Rollo	10	4.2 (±10%)
MANTO METAL FL103 PRO 3.6	1 Rollo	10	4.7 (±10%)

Certificaciones

Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015
CO11/4442 certificado por SGS.

Copia no controlada. La información contenida en este documento puede ser actualizada sin previo aviso.

PANELES LED

Panel LED de 120x30



DESCRIPCIÓN

Estas luminarias se instalan en techos, cielorrasos o suspendidos en el aire. Emiten un flujo de luz uniforme, ahorran hasta un 50% en comparación con sistemas convencionales de fluorescencia, tienen una larga vida (hasta 10 veces más) y son virtualmente libres de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

- Iluminación Interior
- Tamaño: 120×30 CM
- Potencia: 48W
- Temperatura de Color: 6000K
- Voltaje: AC85-265V,50/60HZ
- Flujo Luminoso: 4080LM
- RA: >80
- Vida: 50,000HRS 0 +11 años
- Factor de potencia: >0.95

USO

- Oficinas
- Comercios
- Locales
- Supermercados
- Bodegas y Depósitos

CERTIFICACIÓN

- Certificación RETILAP
- IP40
- IK04
- RoHS. Directiva está orientada a reducir el uso de algunas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

GARANTIA DE 2 AÑOS

ventas@egaval.co
3175049202
Bogotá, Colombia

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca de Conformidad
Esquema 5

No. 00209

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TUBOS CONDUIT METÁLICOS	IMC	DIÁMETRO ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2, 2 ½", 3", 3 1/2" Y 4" INCLUYE UNIONES, CODOS Y CURVAS

CÓDIGO IAF:	17	CÓDIGO NACE:	24.20	CÓDIGO ICS:	29.120.10

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S – COLMENA S.A.S.

Calle 45A Sur # 60 – 57, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 169/2020 y NTC 332/1994

Fecha de Certificación: 1999 / 11 / 25
Fecha de Renovación: 2021 / 02 / 09
Fecha de Vencimiento: 2024 / 02 / 09

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 02 / 09 y 2023 / 02 / 09

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00209

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 1999 / 11 / 25
FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 02 / 09
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 02 / 09

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TUBOS CONDUIT METÁLICOS

Tipo	IMC
Referencia	Diámetro ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2, 2 ½", 3", 3 1/2" y 4" - Incluye uniones, codos y curvas
Norma aplicable	NTC 169/2008
Características constructivas	Tubos metálicos recubiertos de zinc interior y exteriormente, roscados en ambos extremos, de longitud 3.05
Material	Lámina de acero calidad SAE 1008 al 1015. Zinc: ASTM B6
Rosca	Según NTC 332/1994
Uso	Zonas de riesgo de explosión Como conductor de alambres o cables de un sistema eléctrico
Referencial	NTC 169/2020 y NTC 332/1994

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
AVIVAS

Anexo 1.2.2. Bitácora de obra

19 octubre 2023 Jueves
Dia Soleado
Personal en obra 1oficial + 1 ayudante
Se instala guarda escoba en porcelanato gris: aula 1 y aula 2
Se finaliza desmonte piso lavado aula 3.

Sandra Pinzón
Consorcio MiaGP

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría

20 octubre 2023, Viernes
Dia Soleado
Personal en obra 1oficial + 1 ayudante
Se instala afinado mortero piso aula 03, guarda escoba en porcelanato Piso 2 (aula 1 y 2)

Afinado Piso Aula 3	Guardaescoba Aula 2	Guardaescoba Aula 1

R. Interventoría

21 octubre 2023 Sabado
Personal en obra 1oficial + 1 ayudante
Se realiza retiro escombro

R. Interventoría

22 octubre 2023 Domingo
No se ejecutan labores

23 octubre 2023 Lunes
Se instala Piso porcelanato gris y guardaescoba Aula 3

Piso y guardaescoba porcelanato

Aula 3	Aula 2	Aula 1

24 Octubre de 2023 Martes
Clima: Seco.
Personal Operativo: 1 Oficial
Se realiza la aplicación de pintura en muros de los espacios intervenidos, se requiere mejorar acabados y limpieza

Arq. Alejandra Anggarita
R. Interventoria C.T16.

25 Octubre de 2023 Miércoles
Clima: Seco.
Personal Operativo: 1 Ayudante.
Continua con la aplicación de pintura en vinilo en muros de los espacios intervenidos, en cuanto al enchape de piso en porcelanato se requiere mejorar el embaquillado y limpieza de residuos de pegacor.

Arq. Alejandra Anggarita
R. Interventoria C.T16.

26/OCT/2023
CLIMA: SECO
PERSONAL: 1 AYUDANTE
SE REALIZA ASEO GENERAL, RETIRO DE ESCOMBROS, REEMBOQUILLE DE LAS ZONAS REQUERIDAS, INSTALACIÓN DE GRAVILLA EN BOCA PUERTAS.

R. Interventoria

24/OCT/2023
SE REALIZA ENTREGA PARCIAL DE LOS ESPACIOS: SALA DE PROFESORES 1, SALA DE PROFESORES 2, SALA DE PROFESORES 3, SE ENTREGAN LOS ESPACIOS EN OPTIMAS CONDICIONES. ADICIONAL A ESTO SE SOLICITA EL ESPACIO DE SALA DE DANZAS PARA INICIAR

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EN ESTE ESPACIO.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria

28/OCT/2023
SE INICIAN DESMONTE DE PISO EN EL SALA DE DANZA.
1 OFICIAL, 1 AYUDANTE
CLIMA: NUBLADO

R. Interventoria

30/OCT/2023
SE INICIAL ACTIVIDADES DE AFINADO DE PISO EN SALA DE DANZA.
1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 MAESTRO
CLIMA: NUBLADO
Se requiere adelantar componente eléctrico y realizar su respectiva intervención, mantener el orden y asco en el área de trabajo y si es posible colocar cinta peligro en zona de riesgo.

Arq Alejandra Angarita
R. Interventoria C.T16

31/OCT/2023
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE AFINADO DE PISO EN SALA DE DANZA.
SE REALIZA ASEO CUMPLIENDO CON EL REQUERIMIENTO DE LA NOTA DEL 30 DE OCTUBRE.
R. Interventoria

01/NOV/2023
SE INICIAN LABORES DE INSTALACIÓN DE ENCHAPE 60X60 GRIS EN SALA DE DANZA. R. Interventoria

02/NOV/2023
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPE 60X60 GRIS EN LA SALA DE DANZA. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO.

09/11/23 Sin novedad

03/11/23
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ENCHAPE 60X60 EN SALA DE DANZA.
OFICIAL, AYUDANTE
CLIMA: LLUVIAS FUERTES
R. Interventoría

04/11/23
SE INICIAN ACTIVIDADES DE CORTE E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN SALA DE DANZA
OFICIAL, AYUDANTE
CLIMA: LLUVIAS FUERTES
R. Interventoría

07/11/23
SE INICIAN ACTIVIDADES PINTURA EN MUROS, EN SALA DE DANZA
OFICIAL, AYUDANTE
CLIMA: NUBLADO
R. Interventoría

08/11/23
SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA SOBRE MURO EN SALA DE DANZAS.
OFICIAL, AYUDANTE
CLIMA: NUBLADO
R. Interventoría

09/11/23
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO FINAL PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL ESPACIO SALA DE DANZAS.
R. Interventoría
Alejandra Angarita

10/11/23
Clima: Seco.
Se entrego el espacio de danzas y se solicita a la institución apertura de nuevos espacios en primer piso para la intervención del piso.
Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría

Powered by CamScanner

11/11/2023
Clima seco.
No se encuentra personal, ya que se espera que la institución habilite los espacios.
Por lo anterior la SED en reunión con la interventoría aprobó la intervención de 4 espacios en el primer piso referente al cambio de piso por porcelanato, y la construcción de una batería de baños.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría O.T 16.

12/11/2023
Dominical- NO se laboro.
R. Interventoría.

13/11/2023
Día festivo no se laboro.
R. Interventoría

14/11/2023
Clima: Seco.
Personal operativo: Ninguno
La interventoría solicita al contratista de obra iniciar la intervención del depósito y se evidencio que dentro de este existe un espacio con conexión sanitaria e hidráulica para realizar la batería de baño

Alejandra Angarita
R: Interventoría O.T 16.

Powered by CamScanner

15/11/2023.
Clima: seco.
Personal operativo: 1 Oficial y 2 ayudantes.
Se recomienda al contratista utilizar mortero impermeabilizado para los pisos d
de se evidencia humedad en la actividad de alistado de los mismos, se debe real
el enchape de los baños en espacios del primer piso.

Contratista
Consorcio TIG.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría

16/11/2023
Clima seco.
Personal Operativo: 1 Oficial
Se continua con la instalación de porcelanato en bodega del primer piso, se solicita al contratista realizar la intervención del componente eléctrico.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTIG.

17/11/2023
Clima seco.
Se continua con la instalación de porcelanato en Bodega del primer piso, el contratista utilizo mortero impermeabilizado para evitar la humedad en los pisos.
Se requiere que al finalizar la actividad de instalación de enchape cuente con buenos acabados e intervención del componente eléctrico.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTIG.

Powered by CamScanner

18/11/2023
Clima Nublado. Personal: 1 oficial.
Se continua con la instalación de porcelanato en área de Bodega del primer piso, se requiere la intervención de batería de baño y el componente eléctrico.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.T16.

19/11/2023 Domingo No se laboro R. Interventoría.

20/11/2023.
Clima: Seco
Personal Operativo: 1 Oficial, 1 ayudante.
Se continua con la instalación de porcelanato en área de Bodega del primer piso e instalación de guardaescoba y retiro de piso existente en asbesto cemento.
Se requiere realizar la intervención del baño y la intervencion eléctrica.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.T16.

21/11/22

CLIMA: SECO

PERSONAL: 1 OFICIAL

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE PORCELANATO GRIS 60X60 EN LA ZONA DE BODEGA 1 DEL PRIMER PISO, RETIRO DE PISO EN ASBESTO CEMENTO.

Powered by CamScanner

17-10-23

1 Operarios de maquinas

Continua actividades de excavación, traslado y disposición de material común. Jhon R.

18-10-23

1 operario de maquinas

Continua actividad de excavación, traslados y disposición de material común.

Jhon R

19-10-23

2

Se realizan toma de volumenes de excavación con equipo de topografia

Jhon R.

20-10-23

No hay personal en obra, se espera la llegada de material Jhon R

21-10-23

No hay personal en obra, se espera la llegada de material Jhon R.

22-10-23

No hay personal en obra, dia festivo Jhon R.

23-10-23

No hay personal en obra, se espera la llegada de material. Jhon R.

24-10/23

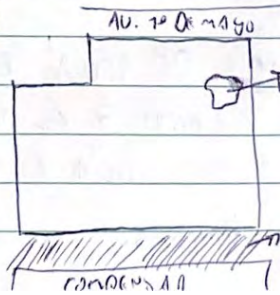
NO HAY PERSONAL DE OBRA, A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE MATERIAL

Jhon R

25-10-23

1 OPERARIO, SE REALIZA COMPACTACIÓN DE SUELO, SE EVIDENCIA FALLO EN EL TERRENO

Jhon R.




26/10/23

1 OPERARIO + 2 AYUDANTES + 1 MAESTRO.

SE REALIZA TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO B 400 A LO LARGO DE LA EXCAVACIÓN, SE INICIAN DESMONTES DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO.

SE INICIA DEMOLICIÓN DE PLACAS, TENDIDO DE HILOS, VERIFICACIÓN DE NIVELES

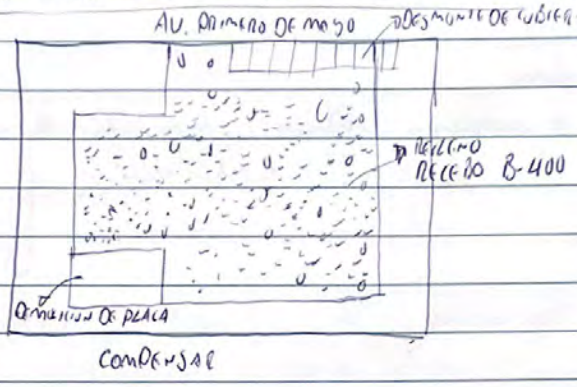Jhon R.



27/10/23

1 operario de maquina + 1 ayudante

Se realiza extendido y compactación de relleno B 400 Jhon R

28/10/23

1 OPERARIO OFICIAL, 1 AYUDANTE

SE REALIZA TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO B400 A LO LARGO DE LA 2D CAPA YA EXTENDIDA, SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO Y DEMOLICIÓN DE PLACA EN LAS MISMAS ZONAS DE LA IMAGEN DE LA NOTA DEL 26 DE OCTUBRE. Jhon R.

30/10/23

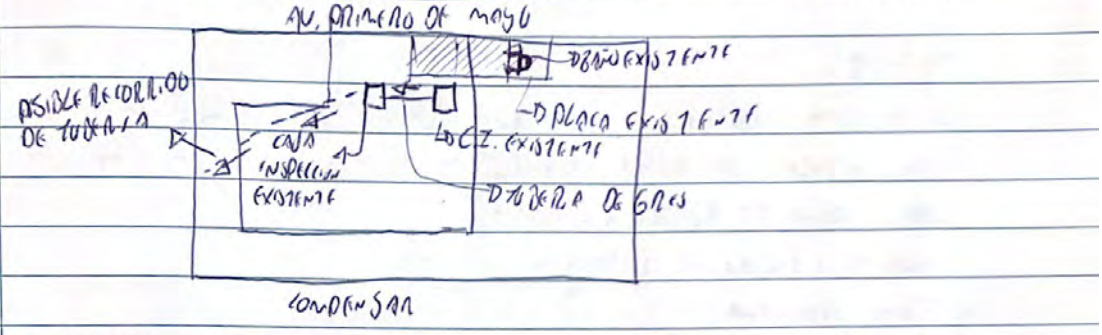
SE REALIZA TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO B 400, SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO, RETIRO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 30X40 QUE SE ENCONTRABAN DEBAJO DE LA PLACA DEMOLIDA. Jhon R.

31/10/23

SE CONTINUA CON TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO B 400, SE REALIZA DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, SE EVIDENCIA LLEGADA DE MALLA ELECTRO SOLDADA 15X15 6mm. FUERTES LLUVIAS EN LA TARDE Y NOCHE. 1 OPERARIO, 2 AYUDANTES Jhon R.

01/11/23

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS EL RELLENO Y EL TERRENO AMANECEN TOTALMENTE SATURADOS, LO QUE IMPIDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN Y RELLENO.
SE INTENTA REALIZAR SONDEO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS EXISTENTES PERO NO ES POSIBLE. LA TUBERIA NO SE DIRIJE A LA CALLE, NI SE ENCUENTRAN CAJAS DE PASO NI CAJAS DE INSPECCIÓN



SE SOLICITA VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORIA PARA ANALIZAR UNA POSIBLE SOLUCIÓN AL TEMA DE LAS CAJAS Y RECORRIDOS DE REDES NUEVAS.

Se le solicita al contratista propuesta de como conectar a la red sanitaria los nuevos baños. Thom R.

02/11/23

1 operario de Maquinaria. CLIMA: FUERTES LLUVIAS
No se trabaja, el terreno se encuentra saturado. Thom R.

03/11/23

1 operario de Maquinaria CLIMA: FUERTES LLUVIAS
No se trabaja el terreno se encuentra saturado. Thom R

04/11/23

TOPÓGRAFO, AYUDANTE

DEBIDO A FUERTES LLUVIAS, EL TERRENO SE ENCUENTRA SATURADO Y NO ES POSIBLE REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVIMIENTOS DE MATERIAL, MAQUINARIA, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTACIÓN

CLIMA: FUERTES LLUVIAS Thom R.

07/11/23

SE REALIZA RETIRO DE AGUA DE POZO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA, SE EVIDENCIA QUE EL TERRENO AÚN PRESENTA ALTO CONTENIDO INTERNO DE AGUA, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SECADO DE TERRENO POR MEDIO DE ESPONJAS, CANECAS. 2 AYUDANTES, 1 OPERARIO

CLIMA: NUBLADO, LLOVIZNA Jhon R.

08/11/23

SE REALIZA NIVELACIÓN Y RELLENO CON RECEBO B-400, SE CONTINUA CON LABORES DE RETIRO DE AGUA, SE REALIZA SECADO DE TERRENO POR MEDIO DE BALDES Y ESPONJAS

1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 OPERARIO, 1 MAESTRO

CLIMA: LLOVIZNA Jhon R.

09/11/23

Se realiza nivelación y relleno con recebo B-400.

1 oficial 1 ayudante, 1 operario

Clima: llovizna Jhon R.

10/11/23

Se realiza excavación para buscar tubería que conecta a la red de alcantarillado.

1 oficial 1 ayudante 1 operario de maquina

Clima: llovizna Jhon R.

11/11/23

SE CONTINUA ACTIVIDADES DE RELLENO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO B-400. DANDO RESPUESTA A LA ANOTACIÓN DEL 10/11/23, SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES POR PARTE DEL LABORATORIO UNICAL LAB, SE REALIZA TOMA DE 3 PUNTOS EN LUGARES ALEATORIOS, LAS 3 TOMAS TIENEN UNA DENSIDAD MAYOR AL 98%. Jhon R.

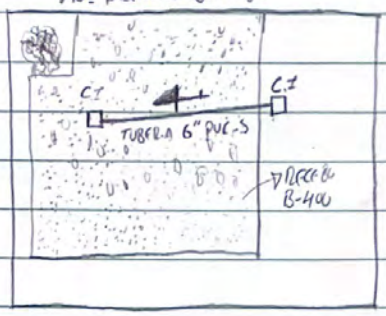
14/11/23

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE BUSQUEDA DE TUBERIA DE RED DE ALCANTARILLADO

1 OFICIAL, 1 AYUDANTE Jhon D.

75 15/11/23

SE REALIZA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 6" PVC PARA DESAGÜE DE AGUAS NEGRAS DE BATERIA DE BAÑO EXISTENTE Jhan R.



PERSONAL: TOPICAL, 1 AYUDANTE, 1 OPERARIO
CLIMA: SECO

16/11/23

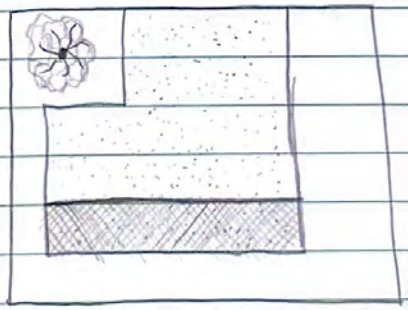
SE INICIAN LABORES DE NIVELACIÓN DE RELLENO E INSTALACIÓN DE MALLA PARA FUNDIDO DE PLACA E: 0.15m
TOPICAL, 1 AYUDANTE, 1 OPERARIO
CLIMA: SECO Jhan R.

17/11/23

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN DE RELLENO E INSTALACIÓN DE MALLA PARA LA FUNDIDA DE PLACA E: 0,15m
CLIMA: SECO
PERSONAL: TOPICAL, 1 AYUDANTE Jhan R.

18/11/23

SE REALIZA FUNDIDA 12m³ DE CONCRETO PARA PLACA E: 0.15m Jhan R.




20/11/23

SE REALIZA TENDIDO DE MALLA PARA FUNDICADO DE PLACA

PERSONAL: 1 AYUDANTE, 1 OFICIAL

CLIMA: NUBLADO, LLUVIZNA Jhon R.

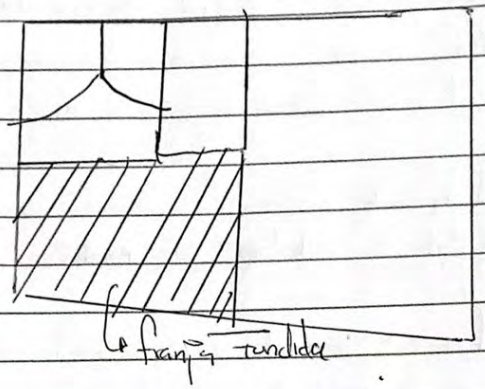21/11/23

18-10-23	1 oficial 1 ayudante Continua actividad de nivelación de siguiente franja a fundir, continua actividad de instalación de malla de acero. Jhon R.
19/10/2023 Jueves	Día Soleado 1 oficial + 1 ayudante Se funde tramo acceso a planchas en concreto 3000psi e=10cm. Jhon R. Sandra Pinzón 
20/10/23	Viernes 2 oficiales 2 ayudantes Se funde tramo de acceso a canchas en concreto 3000 psi e=10cm Jhon R
21/10/23	1 oficial 1 ayudante Se demole sobrante de placa para formaleta del cárcamo Salen a las 10:00 am por fumigación en la institución. Jhon R
22/10/23	No hay personal, día festivo Jhon R
23/10/23	1 oficial Se demuele sobrante de placa para construcción de cárcamo, se espera la llegada de material. Jhon R.
24/10/23	No hay personal en obra, se espera llegada de material. Jhon R.
25/10/23	No hay personal en obra, el contratista no tiene materiales con los que pueda

Continuar la ejecución de las actividades. Thank R.

26/10/23 No hay personal en obra, el contratista no cuenta con materiales con los que pueda continuar la ejecución de las actividades. Thank R

27/10/23 No hay personal en obras. Thank R

28/10/23 No hay personal en obras, se suspenden actividades por elecciones.
Thank R

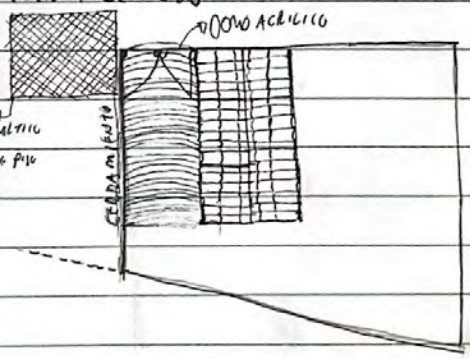
29/10/23 No hay personal en obra, día festivo. Thank R.

30/10/23 1oficial 1ayudante
Inicio construcción de cañuela para recolección de aguas lluvias de la cancha.
Continuan la construcción de la caja de inspección en la entrada debido a obstrucción. Thank R

31/10/23 1OFICIAL
SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE CAÑUELA EN CONCRETO, SE REALIZA DESCARGUE DE MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE VIGA EN CONCRETO EN LA ENTRADA. Thank R

01/10/23 SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE CAÑUELA EN CONCRETO PARA LA RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, SE REALIZA MAMPOSTERIA EN CAJA DE INSPECCIÓN EN LA ENTRADA, SE INICIA CORTE DE DILATACIONES EN PLACA DE CONCRETO Thank R

02/10/23 SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE DOMO ACRILICO Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN LA PUERTA DE INGRESO



ADICIONAL A ESTO SE REALIZA DESMONTE DE MANTO ASFALTICO EN LA PLACA DE CUBIERTA DEL CUARTO DE BASURAS.
SE INICIAN ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA EN EL PERIMETRO DE LA PLACA.

Thank R

03/11/23	1 oficial Continua actividad de demolición de manto existente en la cubierta de baños de la zona de preescolar. Jhon R.
04/11/23	No hay personal en obra, no se adelantan actividades por mal clima Jhon R.
05/11/23	No hay personal en obra, dia festivo Jhon R.
06/11/23	No hay personal en obras, dia festivo Jhon R.
07/11/23	1 oficial 1 ayudante Continua actividad de impermeabilización de la cubierta de preescolar, se aplica emulsion asfaltica, Inicia actividad de instalacion de manto asfal... Jhon R.
08/11/23	1 oficial 1 ayudante Se puede dentellón en la rampa de acceso de la entrada vehicular de la institución. Jhon R.
09/11/23	No hay personal en obra, se espera la llegada de las canchas para su instalación. Jhon R.
10/11/23	2 instaladores Se recibe las canchas, no se realizan ninguna actividad en obra Jhon R.
11/11/23	No hay personal en obra Jhon R.
12/11/23	No hay personal en obras, dia festivo Jhon R.
13/11/23	No hay personal en obra, dia festivo Jhon R.
14/11/23	No hay personal en obra. Jhon R.
15/11/23	2 instaladores Se realiza implantacion de la estructura de las canchas. Jhon R.
16/11/23	SE REALIZA VERIFICACION DE ESCUADRAS Y REPLANTEO DE LAS CANCHAS PERSONAL: 2 INSTALADORES CLIMA: SOLEADO No se realizan actividades. Jhon R.

	SE REALIZA TRAZO Y VERIFICACIÓN DE UBICACIÓN DE MARCOS DE LAS CANCHAS
17/11/23	MULTIPLES.
	PERSONAL: 2 INSTALADORES
	CLIMA: SECO
	No se realizan actividades Jhon R
18/11/23	DEBIDO A UN EVENTO INTERNO DE LA SEDE DEL COLEGIO, NO SE PERMITE INGRESO
	A PERSONAL
	PERSONAL: 2 INSTALADORES
	CLIMA: LLUVIOSO
	No se realizan actividades Jhon R
20/11/23	SE INICIAN ACTIVIDADES DE CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO PARA REALIZAR
	PASOS DE ANCLAJE PARA LOS MARCOS DE LAS CANCHAS
	PERSONAL: 2 INSTALADORES
	CLIMA: SECO
	Se retira el personal a las 2:00 pm. Jhon R.

do estudiantil se realizo actividad de pintura en encerramiento de lol baños. Jhon R.

Miercoles 18 de Octubre de 2023
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Instalador de cubierta
Se realiza actividad de pintura en encerramiento del area del laboratorio. Se finaliza actividad de instalación de planchas en ala central. Jhon R

Jueves 19 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial
Se realiza actividad de pintura en baños de profesores en el encerramiento. Se habla con la institución acerca de la entrega de los espacios de la oficina de mantenimiento, el cual se encuentra con muchos muebles las cuales se le pide a la institución retirarlo el día miercoles 25 de Octubre, para entrar a ejecutar. Jhon R

Viernes 20 de Octubre de 2023.
No hay personal en obra, a la espera de entrega de espacios. Jhon R.

Sabado 21 de Octubre de 2023
No hay personal en obra, a la espera de entrega de espacios. Jhon R.

Domingo 22 de Octubre de 2023.
No hay personal en obra, día festivo. Jhon R.

Lunes 23 de Octubre de 2023.
No hay personal en obra, a la espera de la entrega de espacios

Jhon R.

Martes 24 de Octubre de 2023.
No hay personal en obra, a la espera de entrega de espacios,

Jhon R.

Miercoles 25 de Octubre de 2023
Se inspecciona el espacio del bloque administrativo a intervenir. el colegio no entrega el espacio como se habia acordado. El almacenista se compromete a entregar el espacio el dia lunes 30 de octubre.

Jhon R.

Lunes 30 de Octubre de 2023.
Se realiza inspección del espacio administrativo intervenir.
No entregan el espacio desocupado, aun se encuentran estantes y 2 fotocopiadoras en sitio. No se realiza actividad en obra por no tener espacios adecuados para trabajar.

Jhon R

Martes 31 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores
Se realiza la actividad de demolición de cielo raso en el area de la oficina, para realizar la estructuración el necesario desmontar la cubierta, la cual para poderla bajar toca en el horario que no esten los estudiantes ya que la cubierta es muy grande y se podria ocasionar un accidente por este motivo se dialoga con interventoria y la institución para realizarlo los dias Sabado 4 de Noviembre, Domingo 5 de Noviembre ya que en la institución en esos días no hay estudiantes.

Jhon R

Sabado 4 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de Obra, 4 Instaladores de cubierta.
Se realiza actividad de instalación de estructura metalica, en la hora de la tarde se produce una fuerte lluvia y se para la obra. JhonR

Domingo 5 de Noviembre de 2023.
Personal 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realiza actividad de desmonte de cubierta y se realiza la instalación de estructura metalica. Se realiza la instalación de la cubierta. La teja desmontada se deja en la calle la cual sera recogida el día martes 7 de Noviembre. JhonR

Lunes 6 de Noviembre de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo. JhonR.

Martes 7 de Noviembre de 2023
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realiza actividad de instalacion de cubierta (Segundo tendido), se realiza actividad de pintura en estructura metalica. JhonR.

Miercoles 8 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra.
Se dialoga con interventoria e institución respecto a los puntos electricos que necesitan. Se llega a un acuerdo y se pide el material el cual llega el día 14 de Noviembre en lo cual la institucion esta de acuerdo JhonR.

Martes 14 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de Obra, 1 Electricista.
Se realiza la instalación de salidas electricas e instalación de tubería EMT.

Jhon R.

Miercoles 15 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de Obra, 1 Electricista.
Se realiza instalación de salidas electricas y tubería EMT. Jhon R.

Jueves 16 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Electricista, 1 Oficial.
Se realiza actividad de instalación de salidas electricas y tubería EMT. Se inicio actividad de encorotado en oficina de mantenimiento. Jhon R

Viernes 17 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Se continua actividad de encorotado y se inicia la estructuración del cielo raso en PVC. Se finaliza actividad de instalación de salidas electricas y tubería EMT. Jhon R.

Sabado 18 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante
Se continua con la instalación de cielo raso (estructura) en el area de la oficina. Se finaliza el encorotado.

Jhon R

Domingo 19 de Noviembre de 2023
No se realiza actividad en obra, día festivo Jhon R

Lunes 20 de Noviembre de 2023
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Se realiza instalación de cielo raso en PVC.

Jhon R.

Martes 21 de Noviembre de 2023
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.

17/oct/2023 Martes
2 ayudantas + 1 Soldador
Rid Nublado
Se continua con armado Panales Cerramiento

Sandra Pinzón

Arq. Alejandra Angarita R. Interventoria

18/oct/2023 Miercoles
2 ayudantes + 1 Soldador + Maestro
Se continua con armado de paneles Cerramiento
Se requiere descapote y retiro de capa vegetal existente en todo el area aledaña a la viga para verificar estado real de todos los postes de cerramiento

Sandra Pinzón

R. Interventoria

19/oct/2023 Jueves
3 ayudantes + 1 Soldador + 1 Maestro Nublado
Se continua con armado de Paneles; se inicia Retiro de capa vegetal en vigas y descapote en area aledaña cerramiento

Sandra Pinzón

Arq Alejandra Angarita. R. Interventoria


20/oct/2023 Viernes
3 ayudantes + 1 Soldador + 1 maestro
Continua armado Panales cerramiento y retiro capa vegetal y descapote


Sandra Pinzón

Arq. Alejandra Angarita - R. Interventoria
R. Interventoria 20-10-23


Powered by CamScanner

21/oct/2023 Sábado
3 ayudantes + 1 soldador + 1 maestro
Continua armado paneles cerramiento; y descapote y retiro capa vegetal


Sandra Pinzón



Arq. Alejandra Angarita - R. Interventoría

22/oct/2023 domingo
No se labora





R. Interventoría


23/oct/2023 Lunes
Se continua cargamento de paneles; descapote y retiro capa vegetal


Sandra Pinzón



R. Interventoría

24/oct/2023 Martes
Se continua con armado paneles, descapote y retiro capa vegetal
3 ayudantes + 1 soldador + 1 maestro


Sandra Pinzón


R. Interventoría

25/oct/2023 Miércoles
Clima: Nublado
Recurso humano: 1 supervisor, 1 oficial, 1 ayudante
se continua con armado de paneles para el cerramiento de 2,40m de alto por 2,46ml de ancho en obra se requiere la malla para finalizar armado de los paneles.


Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.I.16

Powered by CamScanner

26/octubre/2023 jueves
Clima: Nublado.
Personal Operativo: 1 Oficial, 1 ayudante. 2 ALBAÑILES
Se continua con armado de paneles para el cerramiento, en varias secciones se observa deterioro en paral metálico de cerramiento existente.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTIG

27/octubre/2023 Viernes
Clima nublado
Personal Operativo: 1 Oficial, 1 ayudante. 3 ALBAÑILES
Se continua con armado de paneles para la instalación del cerramiento, en obra se cuenta con material para la armada de módulos incluyendo la malla.
El día de hoy se labora hasta el mediodía en este frente, dado que la institución es punto de votación.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTIG

SE REALIZA PODA EN ZONA EXTERIOR DEL CERRAMIENTO CRA 72H BIS Y CALLE 28C.

29/10/23
DEBIDO A ELECCIONES NO SE PUDO TRABAJAR

Powered by CamScanner

30/10/23

SE CONTINUA CON EL ARMADO DE PANELES PARA LA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO

CLIMA NUBLADO

PERSONAL: 2 ORNAMENTADORES

31/Octubre/2023 Martes

Continua armado de paneles para cerramiento y pintura color negro para los mismos

Clima: seco

Personal: 2 ornamentadores.

Observación: En obra se encuentra malla calibre #12 y en A.P.U es de calibre 10.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría O.T.I.G.

01/NOVIEMBRE/23

CONTINUA ARMADO DE PANELES PARA CERRAMIENTO, SE CONTINUA CON APLICACIÓN DE PINTURA NEGRA

CLIMA: LLUVIAS FUERTES

PERSONAL: 2ORNAMENTADORES, 1 PINTOR

02/NOVIEMBRE/2023

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ARMADO Y PINTURA DE PANELES PARA CERRAMIENTO

CLIMA: LLUVIA

PERSONAL: 2 ORNAMENTADORES

03/NOVIEMBRE/2023

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ARMADO y PINTURA DE PANELES PARA CERRAMIENTO

CLIMA: LLUVIA

PERSONAL: 2ORNAMENTADORES, 1OFICIAL, 1AYUDANTE.

04/NOVIEMBRE/2023

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ARMADO y PINTURA DE PANELES PARA CERRAMIENTO

Powered by CamScanner

CLIMA: LLUVIA

PERSONAL: ORNAMENTADORES, OFICIAL, AYUDANTE.

DANDO RESPUESTA A LA ANOTACIÓN DEL 31 DE OCTUBRE QUE DICE QUE LA MALLA ENCONTRADA EN OBRA ES CALIBRE #12 Y NO CALIBRE #10, NOS PERMITIMOS ADJUNTAR FACTURA DE COMPRA QUE EVIDENCIA QUE EL MATERIAL DISPUESTO EN OBRA CUMPLE CON LOS DISEÑOS Y LOS APUS DEL CONTRATO.

ICOMALLAS SA
NIT.: 805007404-4
CR 27 33 91 BOGOTA D C
Tel: 7421443 Fax: 7421443

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FBE27246
Fecha : 2023-OCT-26 10:29 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764057196304 de OCT-02-2023
Numeracion Autorizada Del FBE26801 Al FBE34300 Vigencia OCT-02-2024
Vigencia en Meses: 12
cartera@icomallas.com

NOMBRE DEL CLIENTE:	PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS		
NIT.	901531834-2	COD: 901531834	
DIRECCION	CR 18 60C 13S		
CIUDAD	BOGOTA D C		
TELEFONO	3143826320		
FORMA DE PAGO	CONTADO	DESCRIPCION PAGO	
EMAIL CLIENTE	PROCASACONSTRUCCION@GMAIL.COM;		
VENDEDOR	23623411 ROMERO RAMIREZ SANDRA YANETH		
MONEDA	PESOS	REMISION: 115016	

REG	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	001 40329	ONDULADA GALV CUAD 1 1/2" C10 S	MT2	287.920	34,283.0000	19.00	9,870,761.00

Estimado Cliente, nos permitimos informar que ICOMALLAS S.A. no puede solicitar el cambio del material vendido, por lo tanto, después de que un producto haya sido facturado y pagado en su totalidad, usted cuenta con máximo cinco (5) días hábiles para cambio. De acuerdo a nuestra política Comercial, en caso de que no sea reclamado a tiempo, empezarán a correr días de penalidad a su cargo.
Atentamente, Dirección Comercial Nacional.

26 OCT 2023

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 287.920

Observaciones:

SUBTOTAL	9,870,761.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,875,445.00
RETENCIONES	355,742.00
TOTAL A PAGAR	11,390,464.00

Valor Letras : ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

ICOMALLAS S.A. NO GRAVADO

DETALLE DE VALORES

#	BASE	VLR_IMPUESTO	#	BASE	VLR_IMPUESTO	#	BASE	VLR_IMPUESTO	#	BASE	VLR_IMPUESTO
19	9,870,761	1,875,445									

RTE FUENTE : 246,769.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 108,973.00 RTE OTROS: 0.00

CIIU-2511 ICA 11.04*1000

Después de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibido la Factura

Fecha de certificacion: 2023-10-26T10:29:19.

CUFE: ad6721715e749743ac644769b3c3861390942382fa56bf488000d1a338a517415d7b9dc5fe5379ad7b259ba487139d

Powered by CamScanner

07/NOV/2023

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ARMADO y PINTURA DE PANELES PARA CERRAMIENTO.

CLIMA: Seco

PERSONAL: 2 ORNAMENTADORES, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.

Arq. Alejandra Angarita

R. Interventoría

8/NOV/2023 Personal: 2 ornamentadores, 1 oficial y ayudante

Clima: Seco

Continua con la fabricación de módulos R. Interventoría

09/NOV/2023
Clima: Seco
Personal Operativo: 2 Ornamentadores 1 oficial, 1 ayudante
Continua con la fabricación de módulos para la instalación del cerramiento.

Arq María Alejandra Angarita.
R. Interventoria

10/NOV/2023
Clima - seco
Personal Operativo: 2 Ornamentadores, 1 oficial, 1 ayudante.
Continua con la fabricación de módulos para la instalación del cerramiento, aplicación de pintura

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría

11/NOV/2023
Clima: Seco.
Personal Operativo: 2 Ornamentadores, 1 Oficial
1 ayudante,
Continua con la instalación de paneles para el cerramiento, e instalación de malla en un panel.

Arq Alejandra Angarita
R. Interventoria
12/Nov/2023 Domingo no se labora
13/NOV/2023 Lunes festivo - NO se labora.

Powered by CamScanner

14/NOV/2023
Clima: Seco.
Personal Operativo: 2 ornamentadores, 2 oficiales
1 ayudante.
Continua con la fabricación de paneles de
2,46 cm x 2,40 cm, se encuentran armados 58
unidades para un total de 342,43 m².

Arq. Alejandra Angaña
R. Interventoría.

15/NOV/2023
Clima: Seco.
Personal operativo. 2 ornamentadores, 2 oficiales
1. ayudante.
continua con la fabricación de paneles para
el cerramiento, a la fecha se encuentran
61 paneles sin malla, para un total de
avance de cerramiento 359,90 m2.

Arq. Alejandra Angaña
R. Interventoría

16/NOV/2023
CLIMA: SECO
PERSONAL: 2ORNAMENTADORES, 2 OFICIALES. 1AYUDANTE
SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN DE PANELES PARA CERRAMIENTO, SE REALIZA LIMPIEZA DE LA TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES CON UNACTOR. R. Interventoría

17/NOV/2023
CLIMA: SECO
PERSONAL: 2 ORNAMENTADORES, 1PINTOR
SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN DE PANELES PARA CERRAMIENTO
R. Interventoría.

Powered by CamScanner

18/NOV/2023

CLIMA: LLOVIZNAS

PERSONAL: 2ORNAMENTADORES, 1 PINTOR, 1AYUDANTE

SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE PANELES PARA CERRAMIENTO

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C.C. 116.

19/NOV/2023 Domingo no se laboro

20/NOV/2023
Clima Nublado.
Personal Operativo: 2 ornamentadores, 2 oficiales
1 ayudante.
Se Continua con la fabricación de paneles de
2.46 cm de ancho por 2.40 de alto
para realizar el cerramiento.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C.C. 116.

Powered by CamScanner

Fecha: Miercoles 18 de Octubre 2023
Clima: Seco
Personal Operativo: 4 Oficiales, 2 Ayudantes, 2 Pintores, 2 Soldadores
Actividades: Avanza instalación de ceramica pared en baños de piso 1 bloque 1, avanza pintura en muros de bloque 2 y 3. Continua fabricación de barandas. Se realiza instalación de lavamanos baño profesores piso 1 y 2 de bloque 1. Continua instalación de perfileria metalica para cubierta area circulación frente a bloque 2. Se realiza hormigonado de vigueta sobre antepecho de Aula 5 bloque 1. Se realiza retiro viga de escombro. Finaliza instalación de porcelanato en areas de circulación bloque 2 y 3.

Sebastian K
Disp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria U.C.T.I.G.

Fecha: Jueves 19 de Octubre 2023
Clima: Seco
Personal en obra: 4 Oficiales, 2 Ayudantes, 2 Pintores, 2 Soldadores 3 electricos, 2 Ventaneros
Actividades: Avanza aplicación de pintura y estuco en bloque 2 y 3. Continua fabricación de barandas. Inicia aplicación de boquilla en piso porcelanato instalado en bloque 2 y 3. Continua instalación de perfileria metalica en cubierta bloque 2. Se realiza desinstalacion de cubierta cuarto seguridad piso 1 bloque 2, instalación de estructura metalica y cubierta. Instalación de concreto blanca para red p en aula 5 bloque 1. Continua instalación de ventanas en bloque 1 y 3. Inicia aplicación de gravilla para bocaquetas y bordes de escalera en bloque 3 y 2. Suministro piso aula multiple.

Sebastian R
Disp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C.T.I.G.

Powered by CamScanner

Fecha: Viernes 20 de Octubre 2023.
Clima: Seco.
Personal operativo: Inspector de obra, 3 oficiales
1 ayudantes, 2 pintores, 2 eléctricos, 6 soldadores
1 pulidor de piso, 1 instalador de piso en vinilo.
1 instalador de ventanas
Actividades Realizadas:
Continua con la aplicación de pintura en bloque # 3, aplicación de masfico en zona de área multiple para la instalación de piso en vinilo, se recomienda proteger dicho piso y mejorar acabados en estructura metalica continua con la instalación de ventanas en aluminio en baños, pulida de piso aula #2, finalizando actividad de borde de escaleras en gravilla lavada, continua con la fabricación de barandas, y emboquillando enchape de baños.
Recomendaciones: se recomienda que una vez pintado los espacios, que las demas actividades como la instalación de guardaescoba y destronque no afecte el acabado final
Mejorar aseo en obra.

Arq. Alejandra Angaita
R. Interventoría C.T 16.

Sebastian Rivera
Insp Obra

Fecha: Sabado 21 de Octubre 2023
Clima: Seco
Personal en obra: 3 Oficiales, 3 Ayudantes, 3 pintores, 3 electricos, 6 soldadores, 1 pulidor de piso, 2 instaladores de piso vinilo, 2 instaladores de ventana.
Actividades: Continua aplicación de estuco, y pintura sobre muros de piso 1 y 2 bloque 2 y 3, continua aplicación de pintura sobre estructura pasarela bloque 2, instalación de accesorios sanitarios de baños, instalación estructura metálica para lavamanos, instalación de estructura metalica para conformación de cobertia pasarela bloque 2. Inicia aplicación de piso en vinilo, inicia instalación de baranda metalicas, instalación de boquilla en piso.

Sebastian Rivera

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C.T.I.C

Fecha: Domingo 22 de octubre 2023
Clima: seco
Personal en obra: 3 Oficiales, 3 Ayudantes, 2 Soldadores.
Finaliza instalación de enchape en baños piso 2 bloque 2 continua aplicación de boquilla sobre porcelanato, se realiza instalación de meson lavamanos de baño primer piso. Continua instalación de barandas en circulación de bloque 1, 2 y 3.

Sebastian R.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C.T.I.C

Fecha: Lunes 23 de octubre 2023
Clima: Seco
Personal en obra: 3 Oficiales, 3 Ayudantes, 3 pintores, 3 electricos, 6 Soldadores, 1 pulidor de piso, 2 instaladores de piso vinilos, 2 instaladores de ventanas
Actividades: Se realiza instalación de lavamanos en baño piso 2 bloque 2, continua aplicación de boquilla sobre porcelanita, avanza aplicación de pintura sobre muros de bloques 1, 2 y 3. Inicia instalación de puertas en aula 7 y 8 de bloque 1. Finaliza instalación de piso vinilo aula multiple.
Sebastian R

Fecha: Martes 24 de Octubre 2023
Clima: Seco
Personal en obra: 3 Oficiales, 3 Ayudantes, 3electricos, 6 Soldadores 1 pulidor piso, 2 instaladores de ventana
Actividades: Continua instalacion de puertas de sabores en bloque 1 y 3, continua instalación de ventanas en bloque 1, 2 y 3. Avanza pulida de Aula 3 y brillado de Aula 5 en bloque 1, avanza aplicación de gravilla en borde de escaleras y circulación de piso 1 bloque 1. Continua instalación de barandas en areas de circulación piso 1, 2 y 3. Inicia instalación de aparatos sanitarios en baños de piso 1 y 2 bloque 2. Instalación cubierta bloque 2 piso 2

Sebastian R

Powered by CamScanner

Fecha: Miercoles 25 de Octubre 2023
Clima: Seco
Personal en obra: 4 Oficiales, 4 Ayudantes, 3 electricos, 2 Soldadores, 1 pulidor de piso, 2 instaladores de ventana, 3 instaladores fachada, 2 electricos
Actividades: Inicia instalación de fachada principal bloque 3 piso 2, continua instalación de ventanas, continua aplicación de pintura sobre techo y paredes, avanza instalación de cubiertas en salones bloque 1, 2 y 3. Avanza destroncado pisos aulas piso 1 bloque 1. Continua instalación de barandas en zona de circulación bloque 1, 2 y 3. Se realiza reforzamiento de baranda circulación piso 2 bloque 1. Avanza instalación de tubería EMT bloque 2, continua instalación aparatos en aulas bloque 1 y 2.

Sebastian K

Fecha: Jueves 26 de Octubre 2023
Clima: Seco - Lluvia
Personal: 4 Oficiales, 4 Ayudantes, 2 Electricos, 4 Soldadores, 2 instaladores de fachada, 1 instalador de piso.
Actividades: Finaliza instalación de fachada principal de piso 2 bloque 3, continua instalación de tubería EMT y aparatos eléctricos en aulas bloque 1 y 3 inicia instalación de canales tubería para tomas, aplicación de pintura sobre remate canales en fachada bloque 3. Continua aplicación de aparatos sanitarios en baños de piso 1 y 2 bloque 2. Inicia pintura de estructura metálica pasarela, corrección estructura metalica cubiertas, remate de pintura barandas circulaciones piso 1 y 2 bloque 1, 2 y 3.

Sebastian K

Powered by CamScanner

Fecha: Viernes 27 de Octubre 2023
Clima: Lluvioso
Personal: 4 Oficiales, 4 Ayudantes, 2 electricos, 1 pulidor piso
Actividades: Continua aplicación de pintura sobre muros Solares piso 1 y 2 bloque 1 y 3. Continua aplicación de gravilla sobre borde de escalera bloque 1 y 3. Se requiere mejorar acabados.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria

Sebastian Rivera
Inspector Obra

Fecha: sábado 28 de octubre de 2023.
Clima: Nublado
Personal: 4 Oficiales, 4 ayudantes
Actividades Realizadas: continua con la aplicación sobre muro en fachada de bloque 1 y 2 batería de baños y mejorando los detalles de acabados, se requiere que el color de la puerta en bloque 1 del segundo piso corresponda con el diseño remitido por la SED.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria

Sebastian K.
Inspector Obra

Fecha: Domingo 29 de Octubre de 2023
Día no laborable

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria

Sebastian K
Inspector Obra

Powered by CamScanner

Fecha: Lunes 30 de octubre de 2023
Clima: Nublado
Personal Operativo: 4 oficiales, 4 ayudantes
2 eléctricos.
Actividades Realizadas:
Continuan con la instalación de panel led y ajustes en tubería galvanizada de 3/4" en bloque #3, primer piso, finalización de actividad de cielo raso en 1 piso bloque #3, remate de detalles de emboquillado en piso de porcelanato y gravilla en borde de escaleras en zona de circulación, y se realiza aseo.
Se requiere la funcionalidad de las puertas, ya que no cierran bien e instalación de película de seguridad en los vidrios que no son láminados.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.T16.

Sebastian Rivera
Resp Obra

Fecha: Martes 31 de Octubre de 2023
Clima: Lluvioso
Personal Operativo: 4 Oficiales, 4 Ayudantes, 2 electricos,
Actividades realizadas: Continua instalacion de aparatos electricos, Luminarias y tuberia EMT en bloque 3 piso 1 y bloque 2 piso 2. Remate techo, PVC en salon y los, detalle de boquilla para porcelanato piso. Aseo y limpieza de espacios.

Sebastian, R
Resp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría
C. T16.

Powered by CamScanner

Fecha: Miercoles 1 de Noviembre de 2023
Clima: Seco
Personal Operativo: 4 Oficiales, 4 Ayudantes, 2 Soldadores, 1 Electrico
Actividades: Continua instalación de aparatos sanitarios, retoque de pintura, limpieza de tubería EMT, limpieza de marcos de ventanas y puertas. Remate de pintura a lo largo de los bloques 1, 2 y 3. Ajuste de cerradura de puertas

Sebastian K
Insp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C.T16

Fecha: Jueves 2 de Noviembre de 2023
Personal Operativo: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 electricio
Clima: Seco
Actividades: Continua instalación de aparatos electricos, finaliza instalación de tubería EMT, continua remate de estuco y pintura sobre muros, remate de estructura metalica. Limpieza de salones y baños.

Sebastian K
Insp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C.T16

Fecha: Viernes 3 de Noviembre de 2023
Personal Operativo: 1 Oficial 1 Ayudantes
Clima: Seco
Actividades: Avanza remate de espacios con estuco y pintura, limpieza de salones y baños. Inicia preparación de gravilla para borde de escaleras. Se realiza instalacion de fedhor PVC en cuarto de refrigerios.

Sebastian K.

Arq. Alejandra R. Interventoria

Fecha: Sabado 4 de Noviembre del 2023
Clima: Lluvioso
Personal Operativo: 1 Oficial 1 Ayudante
Actividades: Aplicación y Impresa de gravilla para bordes de escalera, continua remate con pintura y estuco de muros bloques 1 2 y 3. Limpieza de barandas y salones.

Sebastian K
Resp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria a.TIC

Fecha: Domingo 5 de Noviembre del 2023
Clima: Seco
Personal Operativo: 2 Oficiales, 2 Ayudantes
Actividades: Reparación detalles de pintura sobre muros externos de bloque 1 2 y 3.

Resp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria a.TIC

Fecha Lunes 6 de Noviembre
No hay personal en obra día festivo

Sebastian K

R. Interventoria.

Feda: Martes 7 de Noviembre
Clima: Seco
Personal Operativo: 3 Oficiales, 3 Ayudante, 1 Aseo
Actividades: Resane de marcas de puerta, resane con estuco y pintura detalle de puertas, limpieza de cubiertas afectadas por la pintura, limpieza de fachada EXT y

Powered by CamScanner

accesorios. Inicia desistalación de adoquín en patio central.

Sebastian K
Resp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría.

Miercoles 8 de Noviembre 2023
Clima: Seco
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante
Actividades: Continua desistalación de adoquín correspondiente a patio central, inicia demolición de viga cintas en concreto ubicadas en patio.
Se realiza entrega de salones a la institución, con las observaciones de falta de cuetas de madera ajuste de tubería inconclusa, pintura de guardaescobas salones 3, 4 y 5, arreglo de filo ventana aula multiple.
Entrega de baños donde se debe realizar el cambio de accesoria sanitario baño profesores piso 1. La rectora expresa inquietudes frente a los acabados de espacios específicos los cuales son compartido con interventoría para su aprobación y posible intervención.

Sebastian K
Resp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría OTI6.

Miercoles 8 de Noviembre 2023
Clima: Seco
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante
Actividades: Continua desistalación de adoquín y demolición de bordillo de confinamiento ubicado en patio central

Sebastian K
Resp Obra

R: Interventoría OTI6

Jueves 10 de Noviembre de 2023
Clima: Seco
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante
Actividades: Finaliza desistalación de adoquín y demolición de bordillo de confinamiento en patio central, empieza picado de recebo compactado existente. Se realiza replanteo de área nueva cordón y se marca nivel al que quedara.

Sebastian K
Resp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría O.T16.

Viernes 10 de Noviembre de 2023
Clima: Seco
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Electrico
Actividades: Continua picado de recebo compactado existente para nivelación de terreno, inicia excavación de recebo frente a bloque 1. Se realiza retiro de escombro con material excavado. Corrección de tubería inundada, arreglo de toma con falla de suministro electrico, instalación de timbre en parte interna de institución.

Sebastian K
Resp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría O.T16.

Sabado 12 de Noviembre 2023
Clima: Seco Personal: 1 Oficial 1 Ayudante
Actividades: Continua picado de recebo compactado en area de patio.

Sebastian K
Insp Obra

R. Interventoria CTG.

Domingo 13 de Noviembre 2023
No hay personal en obra, día festivo.

Lunes 14 de Noviembre 2023
Clima: Seco
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante
Actividades: Se realiza retiro de material sobrante de excavación en recebo compactado para nivelación de cancha patio principal. Inicia instalación de recebo arcón para lograr altura requerida en patio principal.

Sebastian K
Insp Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria CTG.

Martes 14 de Noviembre
Clima: Seco
Personal en obra: 1 Oficial 1 Ayudante
Continua instalación de recebo en cancha patio principal, arcones y debida compactación. Se realiza retiro de material sobrante de excavación.

Insp Obra
Sebastian K

Arq Alejandra Angarita
R. Interventoria CTG

Powered by CamScanner

Miercoles 15 de Noviembre
Clima: Seco
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante
Actividades: Continua aplicación de recebo para avanzar con el debido proceso de compactación para nivelación de superficie cancha patio central. Resane de pintura y filo ventana aula multiple bloque 3.

Sebastián R
Ingo Obra

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.T16.

Jueves 16 de Noviembre 2023
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante Clima: Seco
Actividades: Continua aplicación de recebo para avanzar con su debida compactación y avanzar en la nivelación de la superficie para la conformación de la cancha en el patio central.

Sebastián R
Ingo Obra

Arq. Alejandra Angarita.
R. Interventoria C.T16.

Viernes 17 de Noviembre de 2023.
clima: seco.
Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante
Actividades: se continua con aplicacion de recebo para la compactacion de la cancha en patio existente, se requiere mejorar acabados de los bordillos de escalera limpiar tuberia EMT en zona administrativa y baño 2 piso, y arreglar push de sanitario de profesores.

Arq Alejandra Angarita - R. Interventoria.

Ing MRA GP

Sábado 18 Noviembre de 2023.
Clima: Nublado.
Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante.
Actividades: Se continua con la compactacion del recebo para realizar la cancha de la institucion.
Se requiere terminar de subsanar detalles de acabados en filo de área múltiple, limpieza de tubería EMT en área administrativa y baño, 2 piso, y arreglar el push del sanitario en baño de profesores 2 piso. y terminar las actividades pendiente referente al cambio del portón principal, puerta y persiana. e instalacion de tubería metálica debajo de fachada del bloque #3

Arq. Alejandra Angaita
R. Interventoría O.T16.

Domingo 19 Noviembre de 2023
No hay personal en obra. Día festivo

Lunes 20 Noviembre de 2023
Clima: Lluvioso
Personal Operativo: 1 Oficial, 1 Ayudante
Actividades: Continuo compactación de recebo para conformación de suelo base para realizar cancha en patio de la institución.

Sebastian R
Ing Civil MEM 6P

Arq. Alejandra Angaita
R. Interventoría CT16

Powered by CamScanner

24-Octubre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ayudante, Electrico
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación red eléctrica en área administrativa, se continua con instalación de cielo falso PVC en área administrativa
OBSERVACIONES: Se informa a interventoría y a la institución la necesidad de instalar el cableado de red de cámaras y seguridad en área administrativa ya que posteriormente afectarían el cielo falso instalado. Rectora y personal técnico de cámaras hacen recorrido programan iniciar instalación de red a partir de Mañana.

Yovany T.

25-Octubre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ayudante Electrico
~~HERRAMIENTA~~ Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES ~~REALIZADAS~~: Se continua instalación de cielo falso en área administrativa. Enchape de muros internos en cuarto de refrigerios.
A la fecha la I.E. no ha iniciado a instalar red de Cámaras, se prevee que al hacer esa actividad posteriormente afectaran el PVC. instalado.
Se realiza recorrido con interventoría con el objeto de hacer recepción de las áreas intervenidas y proceder con observaciones si aplican para poder hacer ingreso. Se identifican que en aulas se debe subsanar con observaciones de pintura estructura metálica, subsanar afectaciones en pintura de muros en cielo donde la canal existente presenta filtraciones.

Yovany T.

Powered by CamScanner

26-Octubre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ayudantes, Electrico,
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de enchape en área de administrativa cuarto de refrigerios, Instalación de cielo falso PVC en área administrativa, instalación de redes electricas en área administrativa.
OBSERVACIONES: Se retira a la SST y a interventoria definir si se puede continuar con la instalación de cielo falso dado que ante las reiteradas situaciones en que se ha solicitado instalación de redes de datos y cámaras antes de terminar de instalar cielo falso pues si lo hacen después se vertia comprometido el material, por tanto se establece que el contratista continuará la actividad y después la interventoria dejará dichas redes a la vista y no sobre el nivel del cielo falso instalado en área administ

Yovany T.

27-Octubre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado — Lluvias en la tarde intermitentes
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente SST, Maestro Ayudantes, Electrico
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúo instalación de enchape en área refrigerio, instalación de cielo falso PVC en area administrativa edificio 1

Yovany T.

28-Octubre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ayudante, Electrico
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúo con instalacion de enchape cielo ~~Falso~~ PVC, instalacion luminarias en baños y cocineta.

Yovany T.

Powered by CamScanner

30-Octubre-23 CLIMA: Lluvias de media intensidad
RECURSOS HUMANOS. Ing Residente, SST, Plomero, Ayudantes, Electrico
HERRAMIENTA Y EQUIPOS. Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de Estuco en muros externos de cuarto de refrigerio. Instalación de enchape en muros internos, instalación redes electricas área administrativa demarte de puertas en madera para posteriores mantenimientos.
OBSERVACIONES. Se realiza participacion en simulacro que realizó la I.E.

Yovany T.

31-Octubre-23 CLIMA: Lluvias intermitentes
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Plomero, Ayudantes, Electr
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de estuco y pintura en muros externos cuarto refrigerio, Instalación de Red electrica en baño de Coordinación.

Yovany T.

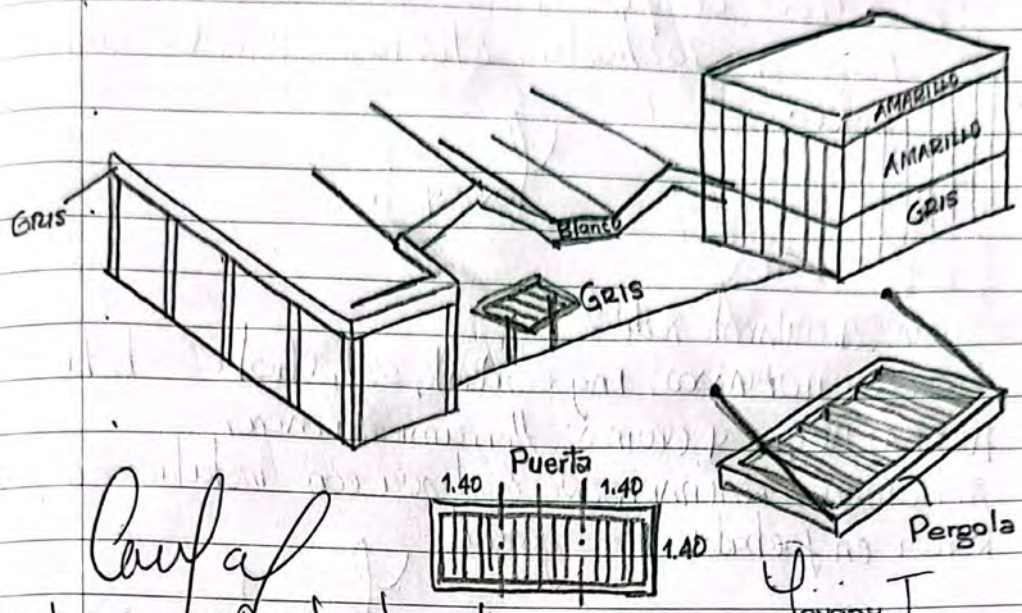
1-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Plomero, Ayudante Electr
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua instalación de redes electricas en area administrativa. Se realiza instalación de cielo falso baños. Se inicia con destronque y pulida de piso en granito existente en área administrativa.

Yovany T.

2-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Plomero, Ayudante, Electrico
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con destronque y pulida piso en area administrativa.

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES: Se realiza comité de seguimiento con supervisión y con interventoría en donde se establece diseño de colores para fachada restrepo Millan.



Yovany T.

3-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ayudante, Electricista
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con pulida y retiro de piso área administrativa. Se inicia mantenimiento de rejas de ventanas interiores área administrativa. Se inicia instalación de pintura texturizada en fachada acorde a colores establecidos por SEO.

Yovany T.

4-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado - lluvias de alta intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ayudante Electricista
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa retiro y pulida de piso y mediacaña en área administrativa. Se continúa con instalación de pintura texturizada en fachada Edificio 1. Se presentan lluvias que condicionan la actividad.

7 Noviembre 23 CLIMA: Lluvia intermitente en la mañana
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Electrico
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con destronque y pulida de piso. Aseo general. Instalación de pintura en fachada. Lluvias limitan actividades de pintura.

Yovany T.

8 Noviembre 23 CLIMA: Parcialmente NUBLO
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Electrico
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalacion de pintura Koraza en fachada. Aseo general.

Yovany T.

9 Noviembre 23 CLIMA: Lluvia de alta intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Electrico
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua instalacion de pintura Koraza en fachada.
Se realiza instalacion de luminaria y tomacorriente en cierto depositos codigos 2 y tomacorriente en bodega cuarto 26 de bloque 2 piso 1

Yovany T.

11 Noviembre 23 CLIMA: Lluvia media intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro Electrico
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta y equipo menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de pintura Koraza en muros fachada principal.

Yovany T.

4-Noviembre-23 CLIMA: Lluvias de baja intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Electrico.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de pintura tipo textura, en fachadas principales. Se realiza mantenimiento de rejas de ventanas externas en edificio 2 Piso 1 y 2.

Yovany T.

5-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Electrico
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de pintura en vigas y columnas en fachada lateral.
Mantenimiento de ventaneria en fachada principal

Yovany T.

6-Noviembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente SST, Maestro, Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación de pintura tipo textura en fachada principal. Mantenimiento de Ventanas y Rejas, en fachada principal.

Yovany T.

7-Noviembre CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación de pintura y de barniz en puertas de madera de area administrativa
Instalación pintura textura en fachadas Principal y lateral.

Yovany T.

Powered by CamScanner

18-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SSH, Maestro, 6 Ayudantes
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de pintura rasca en fachada. Instalacion de puertas en madera. Aseo general.

Yovany T.

20-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SSH, Maestro, Ayudantes
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalacion de pintura Cafe en area de fogonazos blancos atras de columnata metalica instalada en parte externa edificios.

Yovany T.

21-Noviembre-23 Se realiza Subsanacion de observaciones realizadas por interventoria y se realiza acta de comité en donde se establece que el personal de obra, ya culmino actividades y la IE está lista para entrega total. pero la Señora Rectora manifiesta que no recibirá las áreas intervenidas hasta que se cambie el piso vinilo instalado en corredor de edificio 2. por porcelanato. Por tanto se deja registro fotográfico y fílmico del afectado estado de las áreas en bloque 1 para su reacondicionamiento y el bloque quedara cerrado, y personal operativo del consorcio ya no estará en

la institución, Estableciendo que los espacios al sufrir alguna afectación a partir de hoy, ya no será responsabilidad del contratista. Se solicita a interventoría programar fecha para entrega del Colegio.

Cumplió

Yovany T.

Observaciones: se requiere tener en obra los cilindros para la toma de muestras de concreto de los elementos estructurales a fundir, contar con andamios certificados, mejorar acabados en estructura metálica y encorozado, e informar a interventoría el día que se realice la fundida de la zarpa.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.T 16.

Fecha: jueves 19 de Octubre de 2023.
Clima: seco.
Recursos humanos: Inspector, sst, maestro
Personal Operativo: 2 oficiales 7 ayudantes 1 electrico, 1 instalador de ventanas, 2 soldadores
Actividades Realizadas:
continua con instalación de piso en granito en salón de materiales, inicia instalación de pañete metálica en salón de materiales, continua con la instalación de ventanas en aluminio bloque # 13, se realiza filos en vano de ventanas en bloque #12, continua con desmonte de tubería y aparatos eléctricos y pintura en puertas en bloque de bachilleratos. se requiere mejorar rendimiento en obra, orden y aseo.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C.T 16.

Powered by CamScanner

Fecha: Viernes 20 de Octubre de 2023
clima: Seco.
Recursos humanos: Inspector, sst, maestro, 2 oficiales, 7 ayudantes, 3 eléctricos, 1 inst. Ventanas, 2 soldadores
Actividades Realizadas:
Continua con la instalación de Ventanas en aluminio en bloque #13, se inicia a pañetar fachada del bloque #13, continuan con aplicación de pintura en esmalte en puertas del primer piso bloque de bachillerato.
Se requiere fundir el muro de contención y tener en obra los cilindros para la muestra de concreto.

Arq. Alejandra Augusta
R- Interventoria C-T16

Fecha: Sábado 21 de octubre de 2023
Clima: seco.
Personal operativo: 3 oficiales, 6 ayudantes 3 eléctricos, 1 soldador.
Actividades Realizadas: se realizo la fundida de la zapata del muro de contención, se realiza muestra de cilindros en 3 unidades, continua con la instalación de estructura metálica para cubierta en salón de materiales, continua realizando filos de ventanas en bloque #12 y retiro de aparatos eléctricos bloque de bachillerato. Se requiere mejorar acabados en pintura de estructura metálica y mejorar rendimiento en obra.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C-T16

Fecha: Domingo 22 de octubre 2023
Clima: seco
Personal operativo: 1 oficial, 3 ayudantes
Actividades Realizadas: se inicia la actividad de Roceña en escalera acceso a bloques de bachillerato

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C-T16.

Powered by CamScanner

fecha: Lunes 23 de Octubre de 2023
clima: Nublado por la Tarde
Personal Operativo: 3 oficiales, 6 ayudantes
3 eléctricos, 1 soldador.
Actividades Realizadas
Se inicia a encofrar muro de contención, se continua con la actividad de filos en Ventanas en bloque 12 e instalación de Ventanas en aluminio en bloque # 13. y continua con la rocería en escalares hacia bloque de bachillerato y pintura de puertas en bloque de bachillerato e instalación de tubería EMH 3/4"
Observaciones: Se requiere con suma Urgencia realizar la intervención de redes hidrosanitaria para la batería de baños ya que el contratista cuenta con el diseño emitido por la SED.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoria C.I.16.

fecha. Martes 24 de octubre de 2023
clima soleado.
Personal Operativo: 2 Oficiales 6 ayudantes
3 electricos, 1 inst. Ventanas
Se continua con la inst. de Ventanas en bloque # 13
Se realiza encorozado en bloque #12 e instalación de redes electricas en 2 bloque de bachiller y aplicación pintura en puertas 1 bloque de bachillerato.
Observaciones: se requiere el cambio de cubierta en área de salón de materiales ya que se encuentra.

Powered by CamScanner

rayada y opaca no cumple con calidad en acabado, igualmente se solicita el retiro de concreto en zarpa el cual se encuentra en estado de fraguado y no se ha terminado de fundir la zarpa en su totalidad, y mejorar el rendimiento en obra.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría C&TLS.

25-Octubre-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado

RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, 1 Maestro, 5 ayudantes, Ornamentadores cuadrilla eléctrica.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza descapote en áreas de circulación en bachillerato y primaria, se realiza encofrado para pantalla de muro de contención se realiza instalación de tubería EMT en segundo piso bloque 15A bachillerato se continua con fabricación de ventanas en aluminio se realiza enrocatado con mampostería a nivel de cubiertas en bloque 11 se continua con instalación de estructura metálica soporte cubierta en deposito bloque 11

R/ Interventoría

26-Octubre-2023 CLIMA: Soleado

RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 6 Ayudantes, Ornamentadores cuadrilla eléctricos

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de tubería EMT en bloque 15A Bachillerato y en bloque 17 primaria. Se continua con fabricación ventanas en aluminio, se continua con encocreto en Bloque 11. Se realiza instalación de concreto premezclado de 3000 PSI para zarpa y pantalla muro contención.

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES: Se realiza toma de muestras cilindricas para ensayo de resistencia del concreto instalado.
R- Interventoría

23-octubre-2023 CLIMA: Lluvia de alta intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 6 Ayudantes, Ornamentadores Cuadrilla electricos.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con demonte red electrica existente en Bloque 15 A, Bachillerato e instalación de tubería EMT y en Bloque 11. de primaria instalación de tubería EMT, se continúa con fabricación de Ventanas, Picado de fachada para posterior instalación de pañete en Bloque 12. primaria. Descapote de capa vegetal con máquina en áreas de circulación en bachillerato y primaria.
Arq. Alejandra Angarita
R- Interventoría

28-Octubre-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 6 Ayudantes, Ornamentadores, Cuadrilla electricos.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con instalación de tubería EMT en bloque #15A bachillerato y en Bloque 11 primaria. Se continúa con descapote mecanico de áreas de circulación en bachillerato. Se continua con adecuación de muros fachada en bloque 12 primaria para posterior instalación de pañete. Adecuación de Vanos de ventanas. Se continúa con encerramiento Radical de cubiertas en bloques primarias
R- Interventoría
Arq. Alejandra Angarita

30-Octubre-2023 CLIMA: Parcialmente Nublado.
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 6 Ayudantes Ornamentadores, Cuadrilla electricos.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con prefabricación de ventanas en aluminio, Se continúa con descapote mecánico de áreas de circulación primaria y bachillerato. Se continúa con instalación de tubería EMT en bachillerato y primaria. Se continúa con mantenimiento carpintería metálica de bachillerato.

Ing. Residente
R- Interventoría

31-Octubre-2023 CLIMA: Lluvia de alta intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 8 Ayudantes, Ornamentadores técnicos eléctricos.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de cable N°12 para bloque 14 piso 2 primaria. Se continúa con descapote mecánico de áreas circulación primaria. Se continúa instalación tubería EMT en bloque 15A bachillerato. Se continúa fabricación ventanas en aluminio. Se continúa picado de muros fachada en bloque 12 primaria.
OBSERVACIONES: Se socializa con SSO y con interventoría diseño propuesto conector entre bloque 9 y 12.

Ing. Residente
R- Interventoría

1-Noviembre-2023 CLIMA: Lluvia intermitente.
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 6 Ayudantes, Ornamentadores técnicos eléctricos
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza instalación de concreto 3000 PSI premezclado y vibrado en muro contención. Se continúa fabricación de ventanas en aluminio. Se continúa instalación de cable N°12 en Bloque 14 piso 2. Se continúa con instalación tubería EMT Bloque 15A piso 3 bachillerato. Se instala concreto en anden laboratorio
OBSERVACIONES: Se realiza toma de muestras cilíndricas para ensayo de resistencia del concreto.

Ing. Residente
Ing. Alejandra Angarita
R- Interventoría CTT

3 Noviembre 23 CLIMA: Lluvia de baja intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, 6 Ayudantes, Ornamentador, Técnicos elect, Pcos
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con instalación de cable N-12 en bloque 14 Primaria, instalación de tubería EMT en bachillerato. Desmonte de red eléctrica existente en bloque 15 bachillerato. Descapote en áreas de circulación aledañas a bloques intervenidos tanto en bachillerato como en primaria.
OBSERVACIONES: Se presentan lluvias de baja intensidad intermitentes que condicionan el avance en obra.
Se realiza comité de seguimiento con supervisión y con interventoría en donde SED solicita incluir en el alcance de intervención para primaria demolición de enchape existente en muros internos de bloque 12. En área frente a muro de contención construir muretes que se dispongan en forma de escalera acorde a las diferencias de nivel entre los respectivos zapatas. Entre bloque 12 y cota (bloque 9) SED aprueba construir acceso peatonal que posibilite el la circulación de personas con movilidad reducida para los bloques superiores de primaria. (bloque 11 y 14).
SED define que la fachada del bloque 12 sea en color gris basalto, la caja (bloque 9) que sea color amarillo y franjas de unos ventanos sea gris basalto. En bachillerato SED define que columnas y vigas de edificios sean en color gris. y la estructura metálica de forma sea en color amarillo. Las barandas de corredores, y escaleras de bachillerato bloque 15 en color negro. Respecto a ventanas de bachillerato SED solicita mantenimiento estas no cambio.
SED aprueba el cambio de cubiertas de bloque 15. existentes en asbesto cemento por teja ecoroof upvc y refuerzo de estructura metálica soporte de cubierta.
Contratista manifiesta a SED y a interventoría que el estado actual de las ventanas en bloque 15 bachillerato, condiciona dejarlas en optimas condiciones para hacer mantenimiento pues el material con que están pegadas los vidrios ya se sobrexcalentó de la pintura antes instalo.
R. Interventoría

3-Noviembre-23 CLIMA: Lluvia de media intensidad
RECURSO HUMANO: Ing Residente, SST, Electricista ayudantes Ornamentados Técnicos eléctricos
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: PRIMARIA: Se continúa instalación de pañete en fachada bloque 12. Se continúa con instalación de redes eléctricas, se continúa con fabricación de puertas metálicas y de ventanas en aluminio. BACHILLERATO: Se continúa mantenimiento de puertas. Demonte red eléctrica existente instalación tubería EMT, en todos 2 piso.
Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría

4-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Electricista Ayudantes, Ornamentadores técnicos eléctricos
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: PRIMARIA: Se realiza demolición de enchape existente en bloque 12 (muros internos). Se continúa con pañete de fachada de bloque 12 instalación de redes eléctricas. fabricación de ventanas en aluminio y puertas metálicas. Descapotes y limpieza. BACHILLERATO: Se continúa con descapote en áreas de circulación se realiza mantenimiento de puertas existentes. Se continúa con instalación de redes eléctricas en 1 piso. bloque 10A.
Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CSTC.

5-Noviembre-23 CLIMA: Lluvia de baja intensidad intermitente
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Electricista, Ayudantes, Ornamentadores técnicos eléctricos.
ACTIVIDADES REALIZADAS: PRIMARIA: Se continúa con instalación de pañete en fachada de bloque 12. Se realiza instalación de cable N°12 en área primaria. Se realiza instalación de ventanas en bloque 13.
Se continúa con fabricación de puertas metálicas

BACHILLERATO: Se inicia con desmonte de cubierta existente en corredor de bloque 15C. Se realiza desmonte de planchas. Se realiza traslado interno de RCD'S peligrosos. Se continúa con instalación de tubería EMT en bloque 15A.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTL

7-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado.
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ayudantes, Circunstancias técnicos electricos
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta y equipos menores
ACTIVIDADES REALIZADAS: PRIMARIA: Se continúa con instalación de panete en fachada de bloque 12. Instalación ventanas en bloque 13. Instalación de chapas en puertas bloque 11. Fabricación de puertas. Se continúa con excavación para cajas de inspección frente a muro de contención. BACHILLERATO: Se continúa con desmonte de teja existente en bloque 15C. Se realiza instalación de anticorrosivo y pintura a puertas bloque 15C piso 1.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría

8-Noviembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ayudantes, Circunstancias técnicos eléctricos
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta y equipos menores
ACTIVIDADES REALIZADAS: PRIMARIA: Se continúa con fabricación de puertas metálicas, Excepto en casas de circulación. Construcción de caja de inspección frente a muro de contención. Se continúa con instalación de panete en fachada bloque 12. BACHILLERATO: Se continúa con instalación de pintura y antiocorrosivo en puertas bloque 15B piso 1. Se continúa con desmonte de cubierta existente en bachillerato bloque 15B-4C

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría CTL

9- Noviembre-23 CLIMA: Lluvia de mucha intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro Ornamentadores Tecnicos electricos, Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: PRIMARIA: Se realiza instalación de caja de inspección electrica en costado lateral de bloque 12 con canilla cooper well polo a tierra. Se continúa instalación de pañete y dilagras en ventana fachada bloque 12. Se continúa con instalación de filtro frances para drenaje en área de cargue muro de contención.
BACHILLERATO: Se continúa con demonte cubierta existente en Bloque 15A.
OBSERVACIONES: Se realiza comité de seguimiento con SO, Rectoria, interventoria con el objeto de revisión para cobertura que va a tener la I.E. Secretaria de Educación estima aumentar el techo de inversión para la I.E en los bloques 9 y 10 contemplando cambio de cobierta, cambio de carpinteria metálica, Redes electricas.
En bloque 15 (bachillerato) definen pintura de vigas y columnas (Piso 1: Amarillo; Piso 2 Naranja Piso 3 Azul. Solicitan incluir lavado de fachadas
Acorde a lo establecido en este comite, se requiere ajustar modificatorio y presupuesto de primaria y secundaria acorde a los alcances establecidos.

R. Interventoria

10- Noviembre-23 CLIMA: Lluvia de baja intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores Tecnicos electricos, Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: PRIMARIA: Se continua con instalación de red electrica. Se continúa instalación de geotextil y filtro frances en área de cargue muro de contención

NKB

Powered by CamScanner

instalación de tubería pvc 6" desde eje columna en bloque 14 hasta caja de inspección frente a muro de contención.
BACHILLERATO: Se continúa con demonte de cubierta en bloque 15.
instalación de red eléctrica. Descapote en áreas circulación.

R. Interventoría

-11 de Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Prestó, Ornamentadores, Técnicos eléctricos, Ayudantes.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: PRIMARIA: Se construye caja inspección frente a bloque 12. Se realiza encofrado en nivel de cubierta bloque 12. Instalación de concreto 3000psi en área contiguo a muro contención y bloque 12. y 13
BACHILLERATO: Demonte cubierta existente, descapote, demonte redes eléctricas.

R. Interventoría

13-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing. Residente, SST, Maestro, Ornamentadores Técnicos eléctricos, Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa demonte cubierta bachillerato.

Ing. Alejandra Argoty
R. Interventoría

14-Noviembre-23 CLIMA: Lluvia de baja intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ornamentadores Técnicos Eléctricos, Ayudantes
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continúa con encofrado a nivel cubierta bloques 12 y 13 primaria.

Powered by CamScanner

se continua con pañete fachada bloque 12
BACHILLERATO: Se continua con instalacion redes electricas. Se inicia con instalacion de pintura y anticorrosivo en estructura metalica a instalar en reemplazo de la existente. Demonte de cubierta existente.

R. Interventoria
Arq Alexandra Angarita

15-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro Ayudantes, Ornamentadores, TECNICOS electricos
HERRAMIENTA y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: PRIMARIA: Se realiza demonte tablero existente en bloque 12 Encerramiento a nivel de cubierta, Relleno y Compactacion de B-400, en Cárque Muro. BACHILLERATO Se inicia instalacion de estructura metalica soporte de cubierta en bloque 15A

R. Interventoria

16-Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro Ayudantes, Ornamentadores, TECNICO electrico
HERRAMIENTA y EQUIPOS: Herramienta y equipos menores
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación encerramiento a nivel cubiertas bloques 12 y 15. Construccion de nicho para tablero electrico en bloque 12 Relleno y Compactacion de Cárque de Muro.

Arq. Alejandra Angarita
R- Interventoria. C.T16.

17- Noviembre-23 CLIMA: Parcialmente Nublado
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro Ayudantes, Ornamentadores Técnico Electricos.
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua Relleno y compactación de Cargue de muro contención, excavación para instalación tubería en el bloque 14 y 13. Instalación luminarias bloque 14. Encofrados bloques 13 y 12.
BACHILLERATO: Se realiza instalación de estructura metálica soporte de cubierta. Despegote.
Instalación red electrica en piso 1.
Retiro de RCD's peligrosos para disposición final.

R. Interventoría

18-noviembre-23 CLIMA: Lluvia de alta intensidad
RECURSOS HUMANOS: Ing Residente, SST, Maestro, Ayudantes, Ornamentadores Electricos
HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor
ACTIVIDADES REALIZADAS: PRIMARIA: Se continua con relleno y compactación de B-100 en cargue de muro. Se continua pañete en todos bloque 12 (Fachada) instalación redes electricas.
BACHILLERATO: Instalación estructura metálica soporte cubierta.

Arq. Alejandra Angarita
R. Interventoría

19-Noviembre-23 CLIMA: Soleado
RECURSOS HUMANOS: Ornamentadores
ACTIVIDADES REALIZADAS: Instalación de estructura metálica soporte de cubierta

Arq. Alejandra Angarita.
R. Interventoría

Powered by CamScanner

Martes 24 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Initaladorei de cubierta.
Se realizo la entrega de los 5 salonei por parte de la institucion (Aula 10, Aulo 20, Aula 19, Aula 18, Aulo 17), se reciben en perfecto eitado. Se inicio la actividad de pintura en estructura metalica en aulo 10 y Aula 20.

Yovany T.

Miercolei 25 de Octubre de 2023.
Peisonal: 1 Inipector de obra, 4 Initaladorei de cubierta.
Se continua con actividad de pintura en aula 20 y Aula 19

Yovany T.

Jueves 26 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Initaladorei de cubierta
Se finaliza actividad de pintura del Aula 10 y Aulo 20, se inicia actividad de pintura en aula 18 de igual forma se continua actividad de pintura en aulo 19.

Yovany T.

Viernes 27 de Octubre de 2023.
No se realiza actividad en obra por motivo de elecciones el día 29 de Octubre, lo cual la institución le pide al contratista NO estar en la institución deide el día viernes 27 de Octubre, por lo cual se reaguda actividadei el día lunes 30 de Octubre.

Yovany T

Sabado 28 de Octubre de 2023.
No se realiza actividad en obra por temas ya mencionados.

Yovany T.

Domingo 29 de Octubre de 2023
No se realiza actividad en obra, día feriado.

Powered by CamScanner

Lunes 30 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realiza actividad de pintura en aula 18 y Aula 17 y se finaliza actividad en aula 19.

Yovany T.

Martes 31 de Octubre de 2023
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realiza actividad de pintura en aula 17, se finaliza actividad en aula 18.

Yovany T.

Miercoles 1 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de Obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realizo actividad de pintura en aula 17 lo cual queda finalizada.

Yovany T.

Jueves 2 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de Obra, 4 Instaladores de cubierta.
Se realiza subida de material a las 12:30 pm cuando no habian estudiantes en la institución.

Yovany T.

Viernes 3 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realiza desmonte de cubierta en aula 40 y Aula 20, de igual manera se inicia la instalación de cubierta en respectivas aulas.

Yovany T.

Sabado 4 de Noviembre de 2023.
Personal: 4 Instaladores de cubierta, 1 Inspector de obra.
Se realizo desmonte de cubierta en aula 19, 18 y 17

Powered by CamScanner

de igual manera se instalo la cubierta de los respectivos salones.

Yovany T.

Domingo 5 de Noviembre de 2023.
No se realizo actividad en obra, dia festivo.

Yovany T.

Lunes 6 de Noviembre de 2023.
No se realizo actividad en obra, día festivo

Yovany T.

Martes 7 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realizo la entrega de la aula 40, 20, 19, 18 y 17 con gran satisfacción por parte de la institución.

Yovany T.

Miercoles 8 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
La institución hace entrega del ala 2 de la institución la cual se le realizara la intervención de la cubierta y la pintura en estructura metalica. Se inicio actividad de pintura en aula de Educación fisica y aula 15.

Yovany T.

Jueves 9 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realizo la actividad de pintura en estructura metalica en aula 15 y aula 14. Se finaliza actividad de pintura aula de educación fisica.

Yovany T.

Powered by CamScanner

Viernes 10 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta.
Se realiza actividad de pintura en aula 14 y 13, de igual manera se finaliza la actividad de pintura en aula 15.

Yovany T.

Sabado 11 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realiza actividad de pintura en aula 13 y 12. Se finaliza actividad de pintura en aula 14.

Yovany T.

Domingo 12 de Noviembre de 2023
No se realiza actividad en obra, día festivo.

Yovany T.

Lunes 13 de Noviembre de 2023.
No se realiza actividad en obra, dia festivo.

Yovany T.

Martes 14 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta.
Se realiza actividad de pintura en aula 13 y 12 la cual queda finalizada.

Yovany T.

Miercoles 15 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realiza actividad de pintura en aula 12 y se finaliza.
Se inicia actividad de delmonte e instalación de cubierta de aula de Educación física y aula 15.

Yovany T.

Powered by CamScanner

Jueves 16 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta.
Se realiza actividad de desmonte de cubierta e instalación del aula 14 y 13.

Yovany T.

Viernes 17 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta.
Se realiza actividad de desmonte e instalación de cubierta en aula 12.

Yovany T.

Sabado 18 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 4 Instaladores de cubierta
Se realiza la realización e instalación de los remates de la cubierta.

Yovany T.

Domingo 19 de Noviembre de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo.

Yovany T.

Lunes 20 de Noviembre de 2023.
No se realiza actividad en obra, jornada de acero.

Yovany T.

Martes 21 de Noviembre de 2023.
Se programa entrega del ala 2 para el día miercoles 22 de Noviembre de 2023.

Yovany T.

Powered by CamScanner

18/07/23
SE REALIZA LAVADO DE PLACA ROJA Y AMARILLA. LIMPIEZA DE PLACAS GRISES
1 AYUDANTE + 1 OFICIAL
CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE

19/OCT/23
SE REALIZA MEDIACAÑA EN CARCAMOS PERIMETRALES DE OBRA.
1 AYUDANTE + 1 OFICIAL
CLIMA: NUBLADO

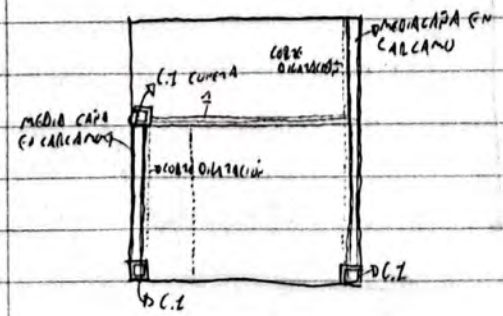
20/OCT/23
SE REALIZA TRAZADO Y CORTE DE DILATACIONES EN PLACAS DE CONCRETO
1 AYUDANTE + 1 OFICIAL
CLIMA: LLOVIZNA EN LA TARDE

27/OCT/23
SE CONTINUA CON TRAZADO Y CORTE DE DILATACIONES EN PLACAS DE CONCRETO Y ELABORACIÓN DE CAJA DE INSPECCION HIDRAULICA
CLIMA: NUBLADO

23/OCT/23
SE REALIZA ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑAS EN CONCRETO PARA CARCAMOS.
1 OFICIAL
CLIMA: NUBLADO.

24/OCT/23
SE REALIZA ELABORACIÓN DE MEDIA CAÑA PARA CARCAMOS Y PISO DE CAJAS DE INSPECCIÓN HIDRAULICA.
1 OFICIAL
CLIMA: NUBLADO.

25/OCT/23
SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE MEDIACAÑAS EN CARCAMOS, SE REALIZA MEDIACAÑAS INTERNAS DE CAJAS DE INSPECCION Y CORTE DE DILATACIONES.




25/OCT/23

SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN CARCAMOS, SE REALIZA ARMADO DE MEDIASCAÑAS EN CAJAS DE INSPECCIÓN

Yovany T.

26/OCT/23

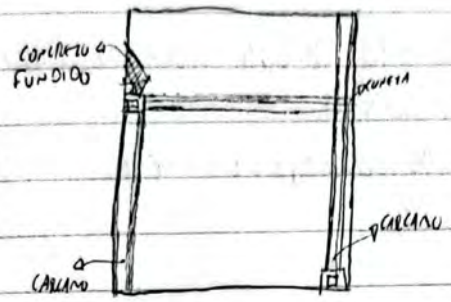SE REALIZA FUNDIDA DE CONCRETO DE REMATE CONTRA CAJA DE INSPECCIÓN



Yovany T.

27/OCT/23

SE DEFINE EL REMATE DE GRADERIAS CONTRA LA PLACA DE CONTRAPISO FUNDIDA. SE COORDINA CON LA INTERVENTORIA REALIZAR UN ESCALÓN PARA REALIZAR EL REMATE.

Yovany T.

28/OCT/23

SE COMIENZAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN Y CORTE PARA REALIZAR EL ESCALON DE REMATE DE LA ZONA.

CLIMA: NUBLADO, LLOVIZNAS

PERSONAL: AYUDANTE, OFICIAL

Yovany T.

30/OCT/23

SE REALIZA MANTENIMIENTO Y DIVISORA EN CANCHAS DEL COLEGIO, SE REALIZAN ACTIVIDADES DEL ESCALON DE REMATE, SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN Y SE INICIA CON EL ARMADO DE HIERRO, CLIMA: LLOVIZNAS, PERSONAL OFICIAL AYUDANTE

Yovany T.

31/OCT/23

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DEL ESCALÓN DE REMATE, SE CONTINUA CON ARMADO DE HIERRO, SE REALIZA CIMPIEZA DE CANCHAS, Y DE LOS ARCOS DE CANCHAS MULTIPLES.

CLIMA: NUBLADO, LLUVIAS EN LA TARDE

OFICIAL, AYUDANTE

Yovany T.

Powered by CamScanner

01/NOV/23
SE REALIZAN MEDIACAÑAS DENTRO DE LOS CARCAMOS, CORTE DE DILATACIONES.
CLIMA: LLUVIAS FUERTES
PERSONAL: 1OFICIAL, 1AYUDANTE
Yovany T.

02/NOV/23
SE REALIZA MEDIACAÑA DENTRO DE LOS CARCAMOS, LAVADO DE PISO, CORTE Y LIMPIEZA DE DILATACIONES.
CLIMA: LLUVIOSAS EN LA TARDE, LLUVIAS EN LA NOCHE
PERSONAL: 1OFICIAL, 1AYUDANTE.
Yovany T.

03/NOV/23
SE REALIZA FUNDIDA DEL PASO EN CONCRETO DE REMATE
CLIMA: LLUVIAS LEVES EN LA MAÑANA
PERSONAL: 1OFICIAL, 1AYUDANTE.
Yovany T.

04/NOV/23
SE REALIZAN RESANES Y RETOQUES EN MEDIACAÑAS QUE LA LLUVIA A AFECTADO. CLIMA LLUVIAS: PERSONAL 1 OFICIAL, 1AYUDANTE
Yovany T.

07/NOV/23
SE REALIZA INSTALACIÓN DE TABLEROS ACRILICOS PARA CANCHAS MULTIPLES DEL COLEGIO
CLIMA: LLUVIOSA
PERSONAL: 1OFICIAL, 1AYUDANTE, 2INSTALADORES
Yovany T.

8/NOV/23
SE INICIAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LA CANCHA MULTIPLE PARA PREPARAR EL AREA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA.
1OFICIAL, 1AYUDANTE DE PINTURA.
CLIMA: LLUVIAS EN LA TARDE
Yovany T.

Powered by CamScanner

9/NOV/23
SE INICIAN ACTIVIDADES DE LAVADO CON ACIDO LA SUPERFICIE. SE DETIENEN EN HORAS DE LA TARDE DEBIDO A FUERTES LLUVIAS
CLIMA: LLUVIAS
PERSONAL: 1OFICIAL, 1AYUDANTE PINTURA
Yovany T.

10/NOV/23
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE LAVADO CON ACIDO DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR. NUEVAMENTE SE DETIENEN ACTIVIDADES POR LLUVIAS FUERTES
CLIMA: LLUVIAS FUERTES
PERSONAL: 1OFICIAL, 1AYUDANTE DE PINTURA.
Yovany T.

11/NOV/23
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE LAVADO CON ACIDO DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR.
CLIMA: NUBLADO
PERSONAL: 1AYUDANTE, 1 OFICIAL PINTURA
Yovany T.

14 NOV/23
SE INICIAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN
PERSONAL: 1AYUDANTE, 1OFICIAL PINTURA
CLIMA: NUBLADO
Yovany T.

15/NOV/23
SE INICIAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN
PERSONAL: 1AYUDANTE, 1OFICIAL PINTURA
CLIMA: SOLEADO
Yovany T.

16/NOV/23
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN, SE INICIA CON ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN DE PERGOLA.
PERSONAL: 2ORNAMENTADORES, 1ELECTRICO, 2PINTORES DE PISO.
CLIMA: NUBLADO
Yovany T.

Powered by CamScanner

17/Nov/2023
Se inicia la Actividad de la aplicación del autonivelante en la concha multiple, se continua con la elaboración de la pergola
Personal: 3 ornamentadores, 3 pintura de Piso
clima: Soleado
Yovany T.

18/Nov/2023
Se continua con la aplicación del autonivelante en el Area de la concha multiple, se continua con la instalación de perfiles para la elaboración de la pergola.
Personal: 3 ornamentadores, 3 pintura de Piso
Clima: Soleado
Yovany T.

19/Nov/2023
Domingo = No se realiza actividades de obra.
Yovany T.

Powered by CamScanner

21-10-2023 4 Oficiales 3 Ayudantes
Actividades: Continua aplicación de estuco para conformación de marcos ventanas en zona administrativa y biblioteca de piso 1, continua aplicación de pintura. Pintura de techo y resane de muro, desistalación de cenicleta en biblioteca. Aplicación de mortero para conformación de base tablero.

Yovany T.

22-10-2023 No hay personal en obra (Día festivo)

Sebastian R.
Consorcio MLAGP

23-10-2023 3 Oficiales 3 Ayudantes
Actividades: Continúa aplicación de estuco para conformación de marcos para ventanas en zona administrativa y biblioteca de piso 1. Continua aplicación de pintura. Continua aplicación de estuco sobre marcos de tablero en biblioteca. Avanza instalación de red hidrosanitaria en baños de segundo piso. Se realiza vaciado de sobrepiso en baño de hombres.

Sebastian Rivera. Yovany T.
Consorcio MLAGP

24-10-2023 3 Oficiales 3 Ayudantes
Actividades: Inicia resane de muros en biblioteca. Continua aplicación de pintura sobre muros de zona administrativa. Continua aplicación de estuco para conformación de marcos de ventanas. Inicia instalación de cerámica en baños de segundo piso

Sebastian R. Yovany T.
Consorcio MLAGP

Powered by CamScanner

25-10-2023 3 Oficiales 3 Ayudantes
Actividades: Inicia aplicación de estuco sobre muro de biblioteca, continua aplicación de estuco para conformación de marcos de ventana en biblioteca. Continua instalación de ceramica de muros en baño de segundo piso.

Consorcio MEAGP
Sebastian Rueda V.

Yovany T.

26-10-2023 2 Oficiales 2 Ayudantes
Actividades: Continua aplicación de estuco sobre muro de biblioteca, continua aplicación de pintura en zona administrativa, continua aplicación de estuco en marcos de ventanas zona administrativa y biblioteca. Continua instalación de ceramica para baños de poso 2. Entrega vantana a institución

Consorcio MEAGP
Sebastian R.

Yovany T.

27-10-2023 2 Oficiales 1 Ayudantes
Actividades: Inicia instalación de tubería EMT para conformación de tendido electrico en zona administrativa, inicia instalación de puertas en aula 101-102-103-104. No se puede realizar la finalización de la instalación de carpintería métalica debido a votaciones y reacondicionamiento de espacio por parte de la registraduria.

Sebastian R.

Yovany T.

28-10-2023 No hay personal en obra, por jornada electoral deshabilitado espacios en la institución

Sebastian R

Yovany T.

29-10-2023 No hay personal en obra (Día Festivo)

Sebastian R.

Yovany T.

Powered by CamScanner

-10-2023 2 Oficiales 3 Ayudantes, 2 electricos
Actividades: Continua aplicación de pintura sobre muros de zona administrativa, continua instalación de tubería EMT para conformación de red electrica en zona administrativa y biblioteca. Inicia instalación de tubería EMT y accesorios para fachada principal. Se realiza instalación de ceramica en grueso para piso de biblioteca. Continua instalación de ceramica de pared en baños de piso 2.

Consorcio MGGP
Sebastian R

Yovany T.

-10-2023 1 Oficiales 2 Ayudantes
Actividades: Continua aplicación de pintura sobre muros de zona administrativa, inicia aplicación de laca sobre mamposteria de oficinas, continua instalación de tubería EMT para conformación de red electrica en zona administrativa y biblioteca. Resane en piso de biblioteca de riel desbastado. Continua instalación de ceramica de pared e inicia instalación de ceramica porcelanato en piso de baños muestras en piso 2

Sebastian R

Yovany T.

-10-2023 1 Oficiales 1 Ayudantes
Actividades: Continua aplicación de pintura sobre muros de zona administrativa, continua aplicación de estuco para resane y conformación de marcos ventanas en biblioteca. Continua instalación de tubería EMT en zona administrativa y biblioteca Continua instalación de ceramica y porcelanato en baños muestras piso 2.


Sebastian R

Yovany T.

02-11-2023 2 Oficiales, 1 Ayudante, 2 Ornamentadores 2 Electricos
Actividades: Continua aplicación de estuco para conformación de marcos de ventanería en zona administrativa y biblioteca en piso 1. Se realiza instalación de puertas salones piso 1. Continua aplicación de pintura sobre muros de zona administrativa, avanza aplicación de pintura sobre muros de zona administrativa, avanza aplicación de placa sobre mamposteria de oficinas. Continúa instalación de electro EMT en zona administrativa y biblioteca. Avanza instalación de ceramica y porcelanato en baños de profesores piso 1.

Sebastian K Yovany T.

03-11-2023 2 oficiales, 1 Ayudante, 2 Electricos
Actividades: Continua aplicación de estuco para conformación de marcos para ventanas. Continua aplicación de pintura en zona administrativa y biblioteca. Inicia alambrado para conformación de tendido electrico. Continua instalación de ceramica y porcelanato en baños de piso 1.
Se realiza reunión con Rectora y coordinadores de la institucion donde se define los colores a aplicar en la fachada de las instalaciones como se indica en el siguiente graficos.



-> Pintura blanca para marcos ventanas

-> Pintura Amarilla para antepechos Ventanas

-> Pintura Gris para mamposteria general

Sebastian K Yovany T.

31-11-2023	2 oficiales 1 Ayudante Continua aplicación de estuco para conformación de marcos ventanas de zona administrativa y biblioteca ademas de aplicación de pintura. Avanza instalación de cerámica en baños profesores piso 2 Sebastian K Yovany T.
30-11-2023	No hay personal en obra. Día festivo Sebastian K
29-11-2023	No hay personal en obra Día festivo Sebastian K
28-11-2023	Continua aplicación de estuco para conformación de marcos ventanas de zona administrativa y biblioteca ademas de aplicación de pintura blanca y amarilla sobre muros. Finaliza aplicación de tela sobre mamposteria de oficinas. Inicia instalación de lamparas. Finaliza instalación de porcelanato para piso en baños profesores piso 2. Sebastian K Yovany T.
27-11-2023	2oficiales 1 Ayudante 2 Ventaneros Continua aplicación de estuco para conformación de marcos ventanas de zona administrativa, y biblioteca ademas de aplicación de pintura blanca sobre muros. Inicia instalación de ventaneria en zona administrativa. Sebastian K Yovany T.
24-11-2023	2 Oficiales, 1 Ayudante 2 Ventaneros Continua aplicación de estuco para conformación de marcos ventanas area administrativa y biblioteca ademas de aplicación de estuco en baños profesores piso 2 Continua aplicación de pintura blanca sobre muros.

Powered by CamScanner

Continua instalación de ventanería en zona administrativa e inicia en biblioteca. Avanza enlucido baño profesores

Sebastian K. Yovany T.

10-11-2023 2 Oficiales 1 Ayudante

Continua aplicación de estuco para conformación de marcos en área administrativa y biblioteca. Finaliza aplicación de pintura en área administrativa y avanza aplicación de pintura en biblioteca. finaliza instalación de cerámica en cuarto vigilancia y cocina e inicia alistado para conformación de mesones en granito.

Sebastian K. Yovany T.

11-11-2023 2 Oficiales 1 Ayudante

Continua aplicación de estuco para conformación de marcos en área administrativa y biblioteca, avanza aplicación de estuco sobre muros internos y externos de baños profesores piso 2. Finaliza aplicación de pintura en área administrativa avanza limpieza de tubería EMT y muebles de zona administrativa.

Sebastian K. Yovany T.

12-11-2023 No hay personal en obra. Día festivo Inspector HSA GP

13-11-2023 Finaliza aplicación de pintura en área administrativa. Inicia aplicación de pintura y reparación de marco puerta acceso de biblioteca. Avanza instalación baldosa porcel cuarto de cocina baños piso 2.

Sebastian K. Yovany T.
Ing Obra

Personal en obra: 2 Oficiales

14-11-2023 2 Oficiales, 2 Pintores
Continua instalación de ceramica cocina baños piso 2. Finaliza aplicación de pintura y resane de paredes en biblioteca. Continua aplicación de pintura piso puerta acceso, biblioteca. Realiza limpieza y aseo de zona administrativa. Inicia embaquillado de muros en ladrillo fachada interna.

Ing Obra Yovany T.

15-11-2023 2 Oficiales, 2 Pintores
Continua instalación de ceramica, aplicación de mortero para mesón granito cocina baños piso 2. Inicia aplicación de pintura en muros de fachada para muestra de color en fachada interna de bloque 1 sobres.


Ing Obra Yovany T.

16-11-2023 2 Oficiales, 1 Ayudantes 2 Pintores
Finaliza actividades de ceramica y meson en baños de piso 2. Continua aplicación de pintura sobre marcos de ventanas y muros de fachada interna de bloque 1.

Ing Obra
Consorcio MCA 6P Yovany T.

17-11-2023 4 Pintores
Finaliza aplicación de pintura en muros y marcos de ventanas correspondientes a fachada interna de bloque 1 y bloque de baños. Inicia aplicación de pintura sobre muros, marcos de ventanas y antepechos en fachada interna de bloque 1 y bloque de puesto fijo.

Ing Obra
Consorcio MCA-6P Yovany T.

18-11-2023	4 Pintores. Continua aplicación de pintura sobre muros, antepechas, marcos de ventanas correspondiente a la fachada interna de bloque 1 y 2 y bloque de punto fijo.  Sebastian K Yovany T. Coriacio MEA GE
19-11-2023	No hay personal en obra. Día festivo.  Yovany
20-11-2023	4 Pintores. Continua aplicación de pintura sobre muros, antepechas, viga canal, placas y marcos de ventanas correspondiente a la fachada interna de bloque 1 y 2 y bloque de punto fijo.  Ing Obra Yovany T.

Powered by CamScanner

Jueves 19 de Octubre, de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra,
No se realiza actividad en obra.

Viernes 20 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Instaladores de cubierta.
Se realiza actividad de pintura en estructura metalica de los partes laterales de los bloques, se instala remate en cubierta de pasillo.

Sabado 21 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Instaladores de cubierta
Se realiza la finalización de instalación de cubierta del bloque central, el cual quedo instalado en perfecto estado.
Yovany T.

Domingo 22 de Octubre de 2023.
Personal: 1
No hay personal en obra, día festivo.
Yovany T.

Lunes 23 de Octubre de 2023.
Personal. 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se inicia la actividad de levantamiento de manto asfaltico de la placa del bloque central, se detienen actividades por fuertes lluvias en la tarde.
Yovany T.

Powered by CamScanner

Martes 24 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se continua con actividad de levantamiento de manto asfaltico en placa del blogue central de la institución, se interrumpen las actividades por fuertes lluvias en la tarde.

Yovany T.

Miercoles 25 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
No se realiza actividad en obra, el día inicio con lluvia y se mantuvo así, se reanudara el dia jueves las actividades.

Yovany T.

Jueves 26 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se reanuda la actividad de levantamiento de manto asfaltico en el area de la placa del blogue central

Yovany T.

Viernes 27 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se finaliza el levantamiento de manto asfaltico de la placa central del blogue de la institución, se retira material peligroso (fibra de vidrio) de la institución.

Yovany T

Sabado 28 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial
Se inicia la actividad de impermeabilización de la placa del blogue central de la institución

Yovany T.

Powered by CamScanner

Domingo 29 de Octubre de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo.

Yovany T.

Lunes 30 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se continua con actividad de impermeabilización en la placa del bloque central de la institución, se detienen activi-dades por motivos de lluvia

Yovany T.

Martes 31 de Octubre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
No se realiza actividad en obra, ya que amaneció lluvioso el día y para una buena impermeabilitación es necesario que la placa este seca.

Yovany T.

Miercoles 1 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se reanuda la actividad de impermeabilitación en la placa del bloque central de la inititución

Yovany T.

Jueves 2 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Oficial, 1 Inspector de obra.
Se continua con actividad de impermeabilitación en la placa del bloque central de la institución

Yovany T.

Viernes 3 de Noviembre de 2023.
Se continua con actividad de impermeabilitación en la placa del bloque central de la institución

Yovany T.

Powered by CamScanner

Sabado 4 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 1 Oficial.
Se finaliza la actividad de impermeabilitación en placa del bloque central de la institución

Yovany T.

Domingo 5 de Noviembre de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo.

Yovany T.

Lunes 6 de Noviembre de 2023.
No se realiza actividad en obra, día festivo.

Yovany T.

Martes 7 de Noviembre de 2023.
Se aprueba la actividad de pintura en fachada y aulas del bloque central de la institución, se dialoga con la inititución y se llega al acuerdo de entrar a intervenir estas areas el día 21 de Noviembre de 2023 cuando los estudiantes ya no esten en la inititución.

Yovany T.

Miercoles 8 de Noviembre de 2023
No se realiza actividades de obra, a la espera de la fecha acordada

Yovany T

Jueves 9 de Noviembre de 2023
No se realiza actividades de obra, a la espera de la fecha acordada


Yovany T.

Viernes 10 de Noviembre de 2023
No se realiza actividades de obra, a la espera de la fecha acordada

Yovany T.


Powered by CamScanner

Sabado 11 de Noviembre de 2023
No se realiza actividades de obra, a la espera de la fecha acordada.




Yovany T.

Domingo 12 de Noviembre de 2023
No se realiza actividades de obra, a la espera de la fecha acordada.




Yovany T.

Lunes 13 de Noviembre de 2023
No se realiza actividades de obra, a la espera de la fecha acordada.



Yovany T.

Martes 14 de Noviembre de 2023
No se realiza actividades de obra, a la espera de la Fecha acordada




Yovany T.

Miercoles 15 de Noviembre de 2023
No se realiza actividades de obra, a la espera de la Fecha acordada




Yovany T.

Jueves 16 de Noviembre de 2023
No se realiza actividades de obra, a la espera de la Fecha acordada




Yovany T.

Viernes 17 de Noviembre de 2023
No se realiza actividades de obra, a la espera de la Fecha acordada.



Yovany T.

Sabado 18 de Noviembre de 2023
No se realiza actividades de obra, a la espera de la Fecha acordada.



Yovany T.

Powered by CamScanner

Domingo 19 de Noviembre de 2023

No se realizan actividades de obra, a la espera de la fecha acordada

Yovany T.

Lunes 20 de Noviembre de 2023

No se realizan actividades de obra, a la espera de la fecha acordada

Yovany T.

Powered by CamScanner

17-10-23

1 Operarios de maquinaria

Continua actividad de excavación, traslado y disposición de material común. Jhon R.

18-10-23

1 operario de maquinaria

Continua actividad de excavación, traslado y disposición de material común.

Jhon R.

19-10-23

2

Se realizan toma de volumenes de excavación con equipo de topografía

Jhon R.

20-10-23

No hay personal en obra, se espera la llegada de material Jhon R

21-10-23

No hay personal en obra, se espera la llegada de material Jhon R.

22-10-23

No hay personal en obra, dia festivo Jhon R.

23-10-23

No hay pasonal en obra, se espera la llegada de material. Jhon R.

24-10/23

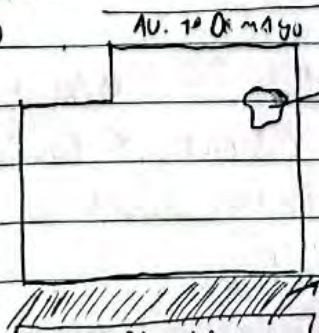
NO HAY PERSONAL DE OBRA, A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE MATERIAL

Jhon R.

25-10-23

TERRANO, SE REALIZA COMPACTACIÓN DE SUELO, SE EVIDENCIA FALLO EN EL TERRANO

Jhon R.




Powered by CamScanner

26/10/23

TOPERARIO + 2 AYUDANTES + MAESTRO.

SE REALIZA TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO B 400 A LO LARGO DE LA EXCAVACIÓN. SE INICIA DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO.

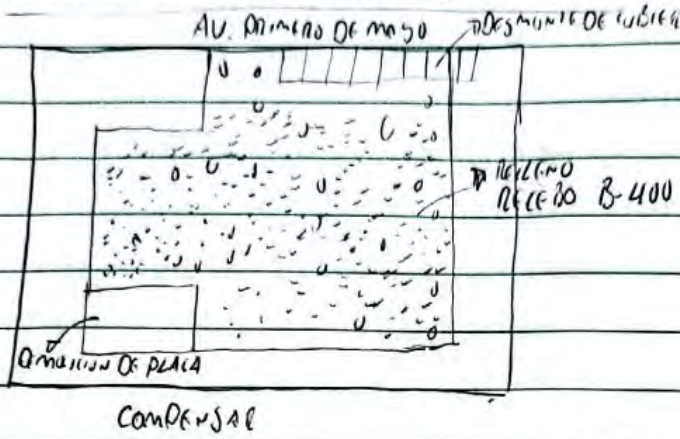SE INICIA DEMOLICIÓN DE PLACAS, TENDIDO DE MALLAS, VERIFICACIÓN DE NIVELES



27/10/23

1 operario de maquina + 1 ayudante

Se realiza extendido y compactación de relleno B 400

28/10/23

TOPERARIO OFICIAL, 1 AYUDANTE

SE REALIZA TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO B400 A LO LARGO DE LA 1ª CAPA YA EXTENDIDA, SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO Y DEMOLICIÓN DE PLACA EN LA MISMAS ZONAS DE LA IMAGEN DE LA NOTA DEL 26 DE OCTUBRE.

30/10/23

SE REALIZA TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO B 400, SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO, RETIRO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 30x40 QUE SE ENCONTRABAN DEBAJO DE LA PLACA DEMOLIDA.

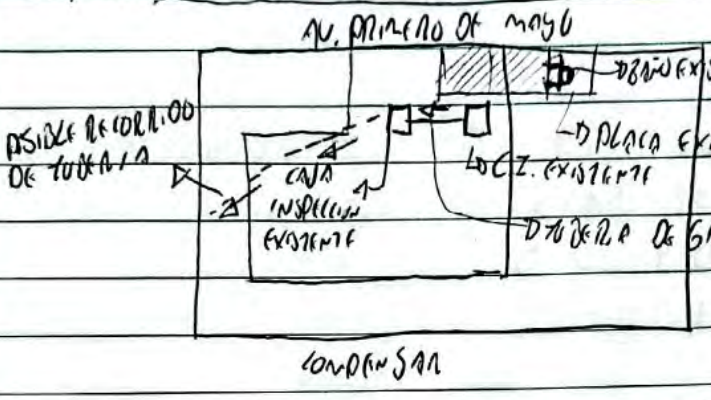
31/10/23

SE CONTINUA CON TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO B 400, SE REALIZA DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, SE EVIDENCIA LLEGADA DE MALLA ELECTRO SOLDADA 15x15 6mm. PUESTA LUEGO EN LA TARDE Y

Powered by CamScanner

01/11/23

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS EL RELLENO Y EL TERRENO AMANECEN TOTALMENTE SATURADOS, LO QUE IMPIDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN Y RELLENO.
SE INTENTA REALIZAR SONDEO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS EXISTENTES PERO NO ES POSIBLE, LA TUBERIA NO SE DIRIGE A LA CALLE, NI SE ENCUENTRAN CAJAS DE PASO NI CAJAS DE INSPECCIÓN



SE SOLICITA VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORIA PARA ANALIZAR UNA POSIBLE SOLUCIÓN AL TEMA DE LAS CAJAS Y RECORRIDOS DE REDES NUEVAS.

Se le solicita al contratista propuesta de como conecta a la red sanitaria los nuevos baños. Jhon R.

02/11/23

1 Operario de Maquinaria. CLIMA: FUERTES LLUVIAS
No se trabaja, el terreno se encuentra saturado. Jhon R.

03/11/23

1 Operario de Maquinaria CLIMA: FUERTES LLUVIAS
No se trabaja el terreno se encuentra saturado. Jhon R.

04/11/23

TOPOGRAFO, AYUDANTE

DEBIDO A FUERTES LLUVIAS, EL TERRENO SE ENCUENTRA SATURADO Y NO ES POSIBLE REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVIMIENTOS DE MATERIAL, MAQUINARIA, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTACIÓN

CLIMA: FUERTES LLUVIAS Jhon R.

Powered by CamScanner

07/11/23

SE REALIZA RETIRO DE AGUA DE POZO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA, SE EVIDENCIA QUE EL TERRENO AÚN PRESENTA ALTO CONTENIDO INTERNO DE AGUA, SE REALIZAN ACTIVIDADES DE SECADO DE TERRENO POR MEDIO DE ESPONJAS, CANECAS, 2 AYUDANTES, 1 OPERARIO

CLIMA: NUBLADO, LLOVIZNA Jhon R.

08/11/23

SE REALIZA NIVELACIÓN Y RELLENO CON RECEBO B-400, SE CONTINUA CON LABORES DE RETIRO DE AGUA, SE REALIZA SECADO DE TERRENO POR MEDIO DE BALDES Y ESPONJAS

1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 OPERARIO, 1 MAESTRO

CLIMA: LLOVIZNA Jhon R.

09/11/23

Se realiza nivelación y relleno con recebo B-400.

1 oficial 1 ayudante, 1 operario

Clima: llovizna Jhon R.

10/11/23

Se realiza excavación para buscar tubería que conecta a la red de alcantarillado.

1 oficial 1 ayudante 1 operario de maquina

Clima: llovizna Jhon R.

11/11/23

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE RELLENO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO B-400. DANDO RESPUESTA A LA ANOTACIÓN DEL 10/11/23, SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES POR PARTE DEL LABORATORIO UNICAL LAB, SE REALIZA TOMA DE 3 PUNTOS EN LUGARES ALEATORIOS, LAS 3 TOMAS TIENEN UNA DENSIDAD MAYOR AL 98%. Jhon R.

14/11/23

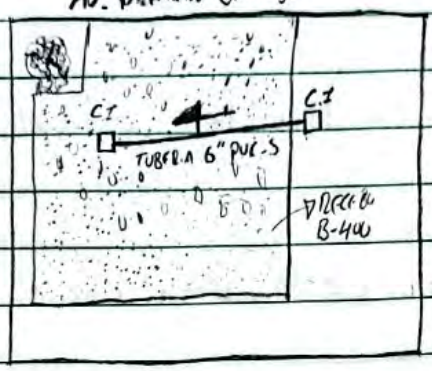
SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE BUSQUEDA DE TUBERIA DE RED DE ALCANTARILLADO

1 OFICIAL, 1 AYUDANTE Jhon R.

Powered by CamScanner

15 15/11/23

SE REALIZA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 6" PVC, PARA DESAGÜE DE AGUAS NEGRAS DE BATERIA DE BAÑO EXISTENTE



PERSONAL: TOPICAL, AYUDANTE, OPERARIO
CLIMA: SECO

16/11/23

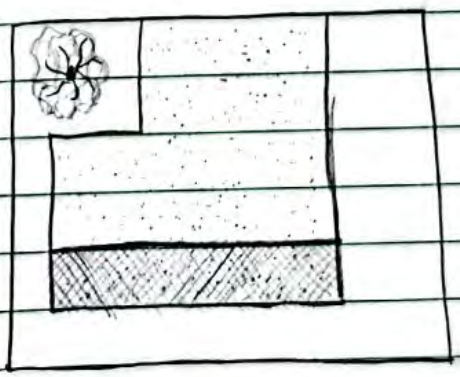
SE INICIAN LABORES DE NIVELACIÓN DE TERRENO E INSTALACIÓN DE MALLA PARA FUNDIDO DE PLACA E: 0.15m
TOPICAL, AYUDANTE, OPERARIO
CLIMA: SECO

17/11/23

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN DE TERRENO E INSTALACIÓN DE MALLA PARA LA FUNDIDA DE PLACA E: 0.15m
CLIMA: SECO
PERSONAL: TOPICAL, AYUDANTE

18/11/23

SE REALIZA FUNDIDA 12m³ DE CONCRETO PARA PLACA E: 0.15m



Powered by CamScanner

20/11/23

SE REALIZA TENDIDO DE MALLA PARA FUNDICADO DE PLACA

PERSONAL: 7 AYUDANTES, 1 OFICIAL

CLIMA: NUBLADO, LLUVIZNA

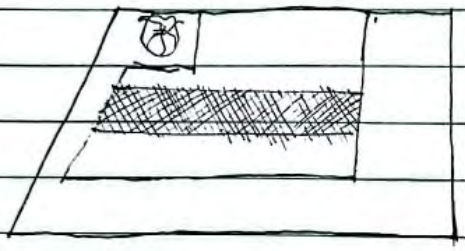
21/11/23

No hay personal en obra, no se realizan actividades

CLIMA: LLUVIAS EN LA TARDE

22/11/23

SE REALIZA FUNDIDO DE PLACA EN CONCRETO E: 0,15m, ARMADO DE MALLA.



PERSONAL: 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, 1 MAESTRO

CLIMA: NUBLADO

Powered by CamScanner

Martes 17 de Octubre
Se reune el residente, la SSO, Interventoria, y el contratista en las instalaciones de la institución; donde se acuerda realizar un cambio arquitectonico en el diseño de la tarima. Se programa revision de nueva propuesta el 27 de octubre. Jhon R.

Viernes 20 de Octubre
Topical Taquichate
Se realiza la reposición de el cielo raso afectado por las filtraciones en la placa mientras se desarrollaba la actividad de demolición de mortero en la placa de cubierta. Se realiza aplicación de acido en hongos que presenta la parte interior de la placa de cubierta; este solo se realiza en un area pequeña, con la finalidad de verificar si el acido muriatico eliminaba el hongo.
Jhon R

Bogotá D.C., 06 de octubre de 2023

2023_RUU_MGP_250

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Edison ricardo duarte
Director de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Suspensión de actividades frente de obra Marruecos y molinos IED.

Cordial saludo,

Siendo las 10:45 am del presente día, se hace presencia del contratista de obra en conjunto con la interventoría y la supervisión en la cual se encontraba en la ejecución de actividades de mampostería estructural desde el nivel -1.10m en los ejes 1,2 y 3 entre ejes C y B.

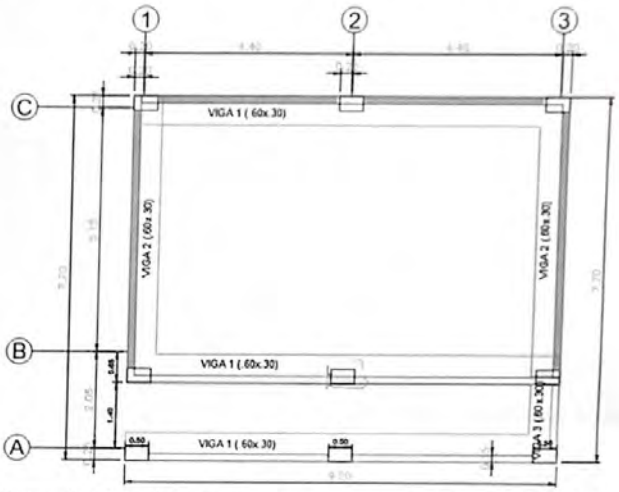


Ilustración 1 Actividades de mampostería estructural adelantas hasta la fecha.

El rector de la institución hace presencia con personal del consejo directivo de la IED, se le manifiesta al rector el resultado de la revisión realizada por parte del ingeniero estructural del contratista, la cual tenia como objetivo revisar la posibilidad de la eliminación del apoyo

intermedio ubicado en el eje 2B, lo cual fue enviado mediante oficio 2023_RUU_MGP_249 - Revisión estructura tarima IED Marruecos y Molinos, en donde se expone que no se viabiliza la opción teniendo en cuenta que la luz supera los 9m entre apoyos.

Frente a lo anterior, el Rector Luis Eduardo hurtado López menciona que no permite la continuidad de las actividades en el frente de obra si el apoyo intermedio persiste y el apoyo principal continua sobre el eje B. Respecto a la determinación manifestamos las siguientes preocupaciones:

1. Las actividades ejecutadas se encuentran acorde con el diseño estructura aprobado el 4 de septiembre de 2023 y la arquitectura presentada y aprobada al rector el 9 agosto de 2023.

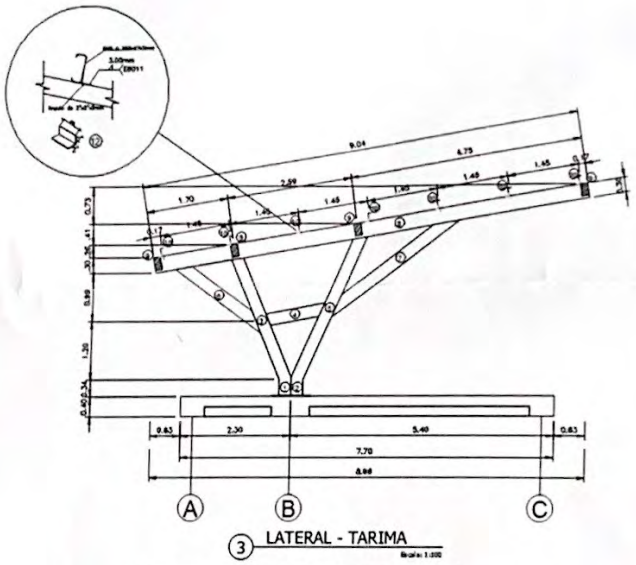


Ilustración 2 Arquitectura tarima aprobada.

2. Se encuentra en obra el 90% del material para la ejecución de la placa de cimentación y entrepiso del diseño aprobado, el rector el día de hoy manifiesta que no permite la ejecución de las actividades y la salida de materiales, se realiza inventario de lo existente responsabilizando a la institución por el material, dejando en claro que materiales como cemento de no ser usado con prontitud puede quedar inutilizable.

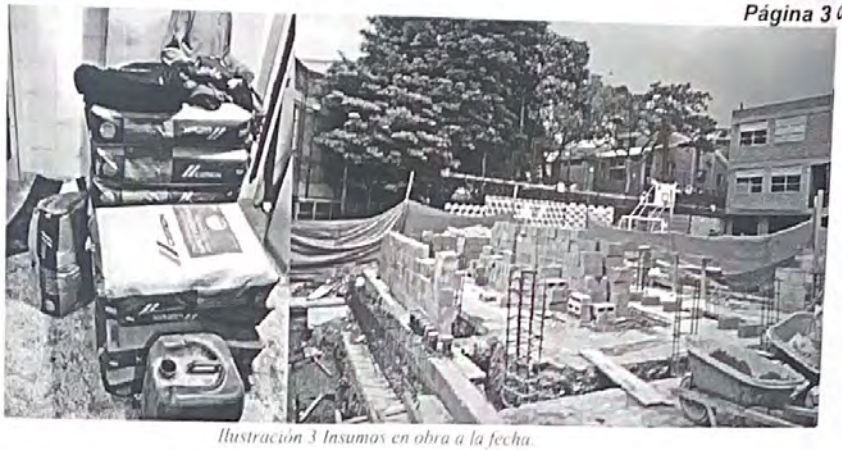


Ilustración 3 Insumos en obra a la fecha.

3. Se cuentan con excavaciones abiertas lo cual con las condiciones climáticas se pueden ver afectadas las estructuras existentes y aquellas en construcción además de la contaminación de los elementos.

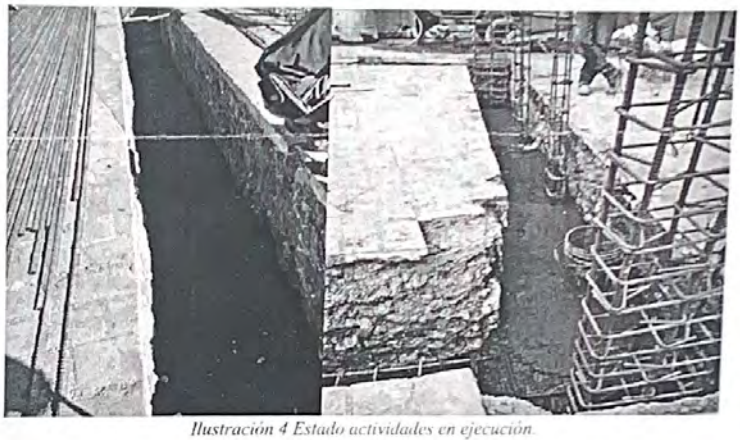


Ilustración 4 Estado actividades en ejecución.

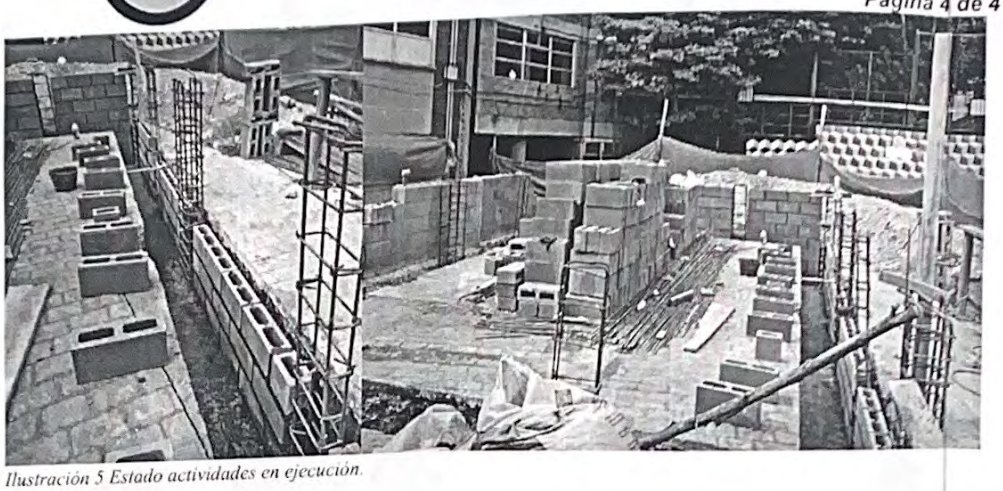


Ilustración 5 Estado actividades en ejecución.

4. Las intervenciones han sufrido obstrucción por parte de la institución principalmente el pasado 22 de septiembre de 2023 y el día de hoy 6 de octubre de 2023, hecho que genera atrasos de obra, afectando el cumplimiento de los tiempos de la programación.

De acuerdo con lo anterior, debido a la imposibilidad de continuar con la construcción del diseño avalado y viabilizado desde el componente arquitectónico y estructural por el inconformismo y el desconocimiento del comportamiento de la estructura por parte del rector de la IED, se nos solicita por parte del mismo a retirar el personal siendo las 11:45 am del día de hoy 6 de septiembre de 2023, sin la posibilidad de retirar ningún insumo que se encuentra en el lugar adquirido por el contratista, dejando la obra inconclusa, representando un riesgo para la comunidad estudiantil, toda vez que la obra se encuentra en actividades de cimentación con excavaciones abiertas y aceros expuestos, escenario bajo el cual el contratista no se hace responsable en ningún momento de cualquier eventualidad que se presente ya que se nos solicitó el desalojo de inmediato de la obra.

Se solicita de manera urgente a la SED que informe la hoja de ruta que se debe seguir frente a estas actividades que se dejaran de ejecutar toda vez que impacta la programación de obra.

Cordialmente,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Lunes 30 de Octubre de 2023
Se realiza reunión en la SED con el rector de la institución en la cual se llega a un acuerdo de modificar el apoyo ége B 2. Se retoman actividades el día 7 de Noviembre de 2023. en la institución.

Jhon R.

Martes 7 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Maestros, 1 Oficial, 1 Ayudante
Se realiza actividad de aseo en sitio, se inicia la actividad de demolición de la rampa, en la cual queda-ra la bodega.

Jhon R.

Miercoles 8 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Maestros, 1 Oficial, 1 Ayudante
Se continua con actividad de demolición de la rampa, se inicia actividad de instalación de muro estructural en el perimetro de la tarima

Jhon R.

Jueves 9 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Maestros, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Se continua con actividad de demolición de la rampa, se continua con la initalación del muro estructural en el perimetro de la tarima

Jhon R

Viernes 10 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Maestros, 1 Oficial, 2 Ayudantes
Se continua la demolición de la rampa, se continua actividad de instalación de muro perimetral de la tarima. Jhon R.

Sabado 11 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Maestros, 1 Oficial, 1 Ayudante
Se finaliza la actividad de demolición de la rampa, se continua con la instalación de muro estructural en el perimetro de la tarima se realiza actividad de fundida de vigas de cimentación del eje

JhonR.

Domingo 12 de Noviembre de 2023.
No se realiza actividad en obra, día feriado. JhonR

Lunes 13 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales
Se realiza actividad de instalación de muro perimetral de la tar

JhonR

Martes 14 de Noviembre de 2023
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Maestros, 1 Ayudante
Se realiza la fundida de las columnas y columnetas del eje C, se continua actividad de instalación de muro estructural del perimetro de la tarima. JhonR

Miercoles 15 de Noviembre. de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Maestros, 1 Ayudante
Se realiza actividad de fundida de la columnas del eje B, se finaliza la instalación de muro estructural del eje 1, C, 3.

JhonR.

Jueves 16 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Maestros, 1 Ayudante
Se realiza actividad de fundida de las columnas del eje B y A. se inicia la instalación de muro estructura del eje B.

JhonR

Viernes 17 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de fundido de columnetas del eje 1, se inicia la figuración del acero de la viga de entrepiso.
JhonR.

Sabado 18 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Oficiales, 1 Ayudante.
Se realiza actividad de fundida de columnetas del eje 3, se continua la figuración del acero de las vigas de entrepiso.
JhonR

Domingo 19 de Noviembre de 2023.
No se realizo actividad en obra, día festivo. JhonR

Lunes 20 de Noviembre de 2023.
Personal: 1 Inspector de obra, 2 Maestros, 2 Oficiales, 1 Ayudante.
Se realizo actividad de figuración del acero de las vigas de entrepiso, se realizo relleno en parte perimetral de la tarima. JhonR

Anexo 1.2.3. Registro Fotográfico

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10** **REGISTRO FOTOGRÁFICO** **IED FE Y ALEGRÍA** **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**	CONSORCIO TIG



Fotografía No.1	Roceria de pasto en acceso a bloque de bachillerato



Fotografía No.2	Fundida de muro de contención entre bloques 14 y 11



Fotografía No.3	Retiro de escombros para sitio de disposición final



Fotografía No.4	Construcción de cajas para desague de carcamos en zona de circulación



Fotografía No.5	Instalación de tuberia para desague de carcamo entre bloques 11 y 14



Fotografía No.6	Recorrido para verificación de avance de obras por parte de la SED,contratista e interventoria



Fotografía No.7	Pintura de puertas en aulas de bloque de bachillerato



Fotografía No.8	Retiro de cubierta en asbesto cemento en circulación en bloque de bachillerato



Fotografía No.9	Retiro de cubierta en asbesto cemento en bloque de bachillerato



Fotografía No.10	Instalaciones eléctricas en aulas de bloque 11



Fotografía No.11	Demolición de alfajia de tableros en aulas de bloque 11



Fotografía No.12	Pañete de fachada en bloque 12



Fotografía No.1	Construcción de caja de inspección



Fotografía No.2	Aplicación de emulsion asfáltica



Fotografía No.3	Fundida de placa



Fotografía No.4	Contrucción de cañuela



Fotografía No.5	Instalación de manto asfáltico



Fotografía No.6	Media caña en mortero impermeabilizado



Fotografía No.7	Implatación de canchas




Fotografía No.8	Instalación de manto asfáltico



Fotografía No.9	Re-instalación de cubierta en policarbonato



Fotografía No.10	Contrucción de cañuela

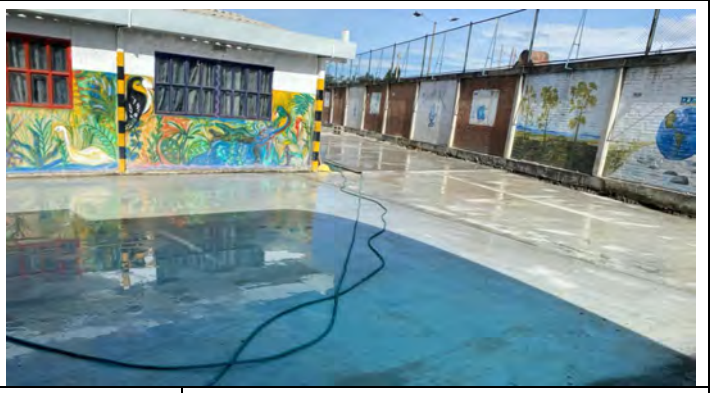

Fotografía No.11	Curado de placa



	Aplicación de emulsion asfáltica



Fotografía No.1	Instalación de bajantes externas para agua lluvia en cubierta de bloque 3



Fotografía No.2	Instalación de cubierta tipo sandwich en zona de cuarto de vigilancia




Fotografía No.3	Aplicación de gravilla lavada en bordes de circulaciones y accesos a segundo piso



Fotografía No.4	Instalación de puertas en aulas y baterias de baños bloque 1,2 y 3



Fotografía No.5	Panorámica de baño de profesores en baterias de baños bloque 2

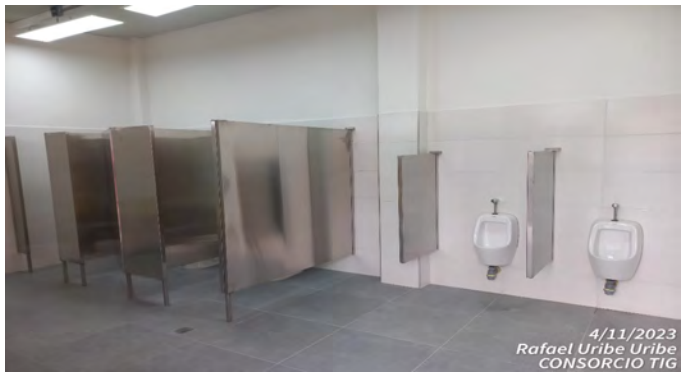

Fotografía No.6	Instalación de divisiones de baños para niños segundo piso



Fotografía No.7	Instalación de lavamanos en zona de baños bloque 2



Fotografía No.8	Panorámica de muro falso terminado en bloque 3 segundo piso




Fotografía No.9	Panorámica de terminación en bateria de baños bloque 2



Fotografía No.10	Panorámica de terminación de bloque 1



Fotografía No.11	Retiro de adoquin de patio central para reemplazarlo por placa de concreto nivelada

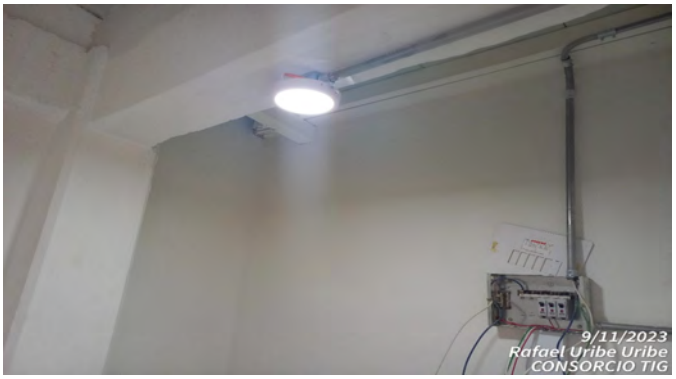

Fotografía No.12	Instalación de lámpara de sobreponer en cuarto de RP



Fotografía No.1	Regatas y aplicación de pañete



Fotografía No.2	Instalacion de tuberia y accesorios



Fotografía No.3	Resane de regatas



Fotografía No.4	Alistado de piso



Fotografía No.5	Instalacion de enchape




Fotografía No.6	Filos de estuco



Fotografía No.7	Pintura en muros interiores



Fotografía No.8	Instalacion de apagadores

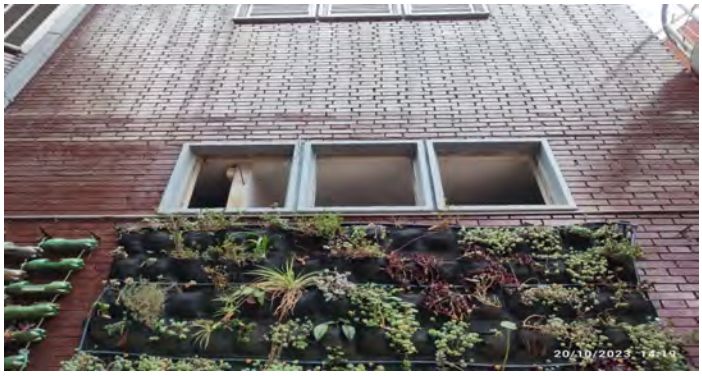

Fotografía No.9	Desmonte de ventanas



Fotografía No.10	Estuco filos y pintura



Fotografía No.11	Instalacion de salidas para luminarias



Fotografía No.12	Resane en maposteria



Fotografía No.1	Instalacion de puertas



Fotografía No.2	Instalacion de estructura de muro en superboard



Fotografía No.3	Instalacion de lamina en superboard



Fotografía No.4	instalacion de sinta malla y resane



Fotografía No.5	aplicación de pintura e instalacion de estructura para cielo raso




Fotografía No.6	Instalacion de enchape en muro



Fotografía No.7	Aplicación de pintura en muros



Fotografía No.8	Remboquillado de enchape

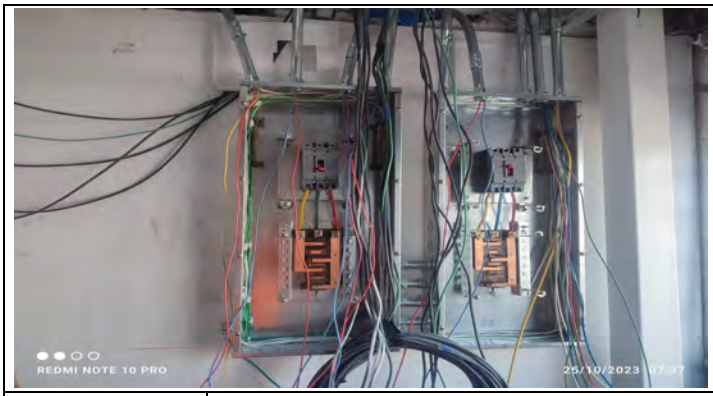

Fotografía No.9	Instalacion de tablero y acometida



Fotografía No.10	Intalacion de estructura para cielo raso



Fotografía No.11	Instalacion de cielo raso pvc



Fotografía No.12	Instalacion de circuitos al tablero



Fotografía No.1	Aseo general



Fotografía No.2	Instalacion de luminarias



Fotografía No.3	Instalacion de cielo raso en drywall



Fotografía No.4	Instalacion de luminarias



Fotografía No.5	Instalacion de marco




Fotografía No.6	Instalacion de espejo



Fotografía No.1	Intalacion de griferia para orinales



Fotografía No.2	Subsanacion de gotera de agua

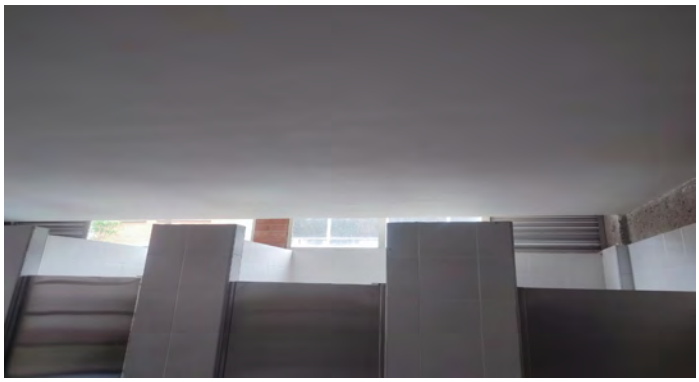

Fotografía No.3	Resane de cielo raso



Fotografía No.4	Instalacion de divisiones en acero



Fotografía No.5	Desmonte de lavamanos



Fotografía No.6	Pulida de meson en granito



Fotografía No.1	Suministro e instalacion de malla electrosoldada



Fotografía No.2	Fundida de paño




Fotografía No.3	Limpieza y lijada de arcos



Fotografía No.4	Aplicación de pintura para arcos



Fotografía No.5	Cableado de postes

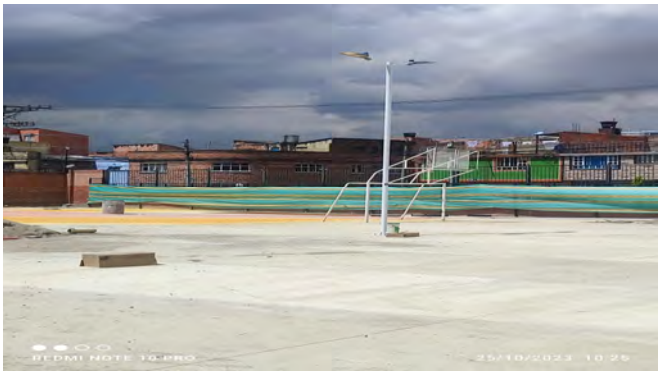

Fotografía No.6	Instalacion de postes



Fotografía No.7	Caja de aguas lluvias



Fotografía No.8	Instalacion de fotoceldas en postes



Fotografía No.9	Aplicación de estampado



Fotografía No.10	Aplicación de estampado



Fotografía No.11	Aplicación de aditivo para estampado



Fotografía No.12	Estampado terminado



Fotografía No.1	Levantamiento de muro



Fotografía No.2	Demolición de muros



Fotografía No.3	Levantamiento de muro



Fotografía No.4	Fundida de columnetas




Fotografía No.5	Excavación de material común



Fotografía No.6	Fundida de columnetas



Fotografía No.7	Excavación de material común

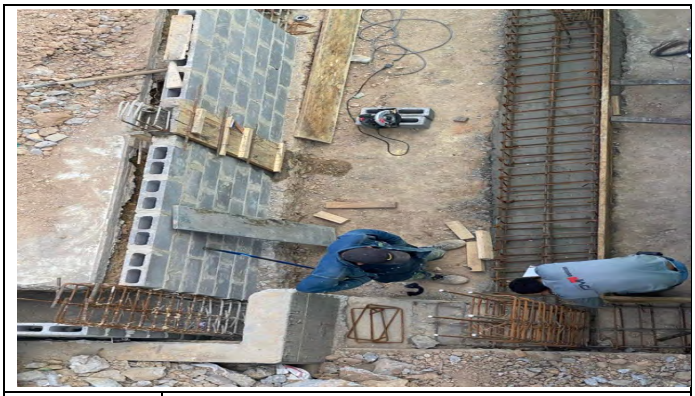

Fotografía No.8	Acero de refuerzo para vigas de cimentación



Fotografía No.9	Levantamiento de muro




Fotografía No.10	Acero de refuerzo para vigas de cimentación



Fotografía No.11	Fundida de columnetas



Fotografía No.12	Demolición de placa

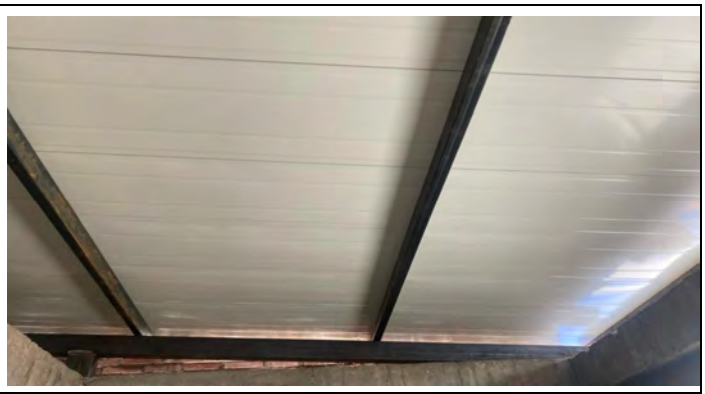

Fotografía No.1	Pintura de estructura metálica



Fotografía No.2	Instalación de cubierta tipo sándwich




Fotografía No.3	Instalación de estructura metálica



Fotografía No.4	Instalación de estructura cielo raso



Fotografía No.5	Instalación red eléctrica

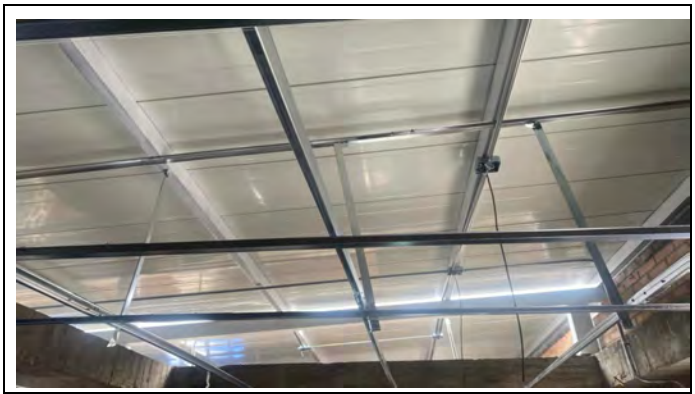


Fotografía No.6	Instalación de estructura cielo raso



Fotografía No.7	Instalación red eléctrica



Fotografía No.8	Instalación red eléctrica

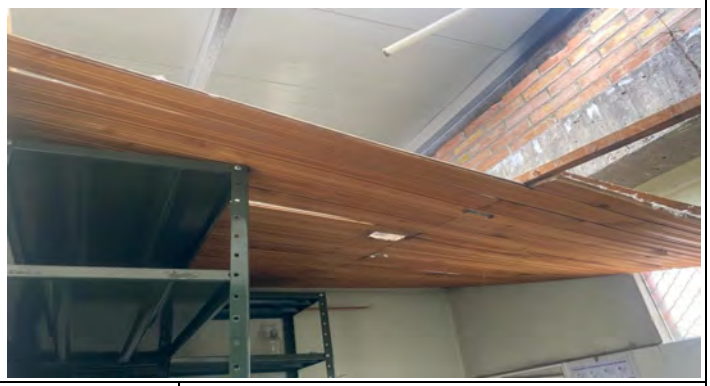


Fotografía No.9	Desmonte cielo raso



Fotografía No.10	Desmonte cielo raso



Fotografía No.11	Instalación de luminaria

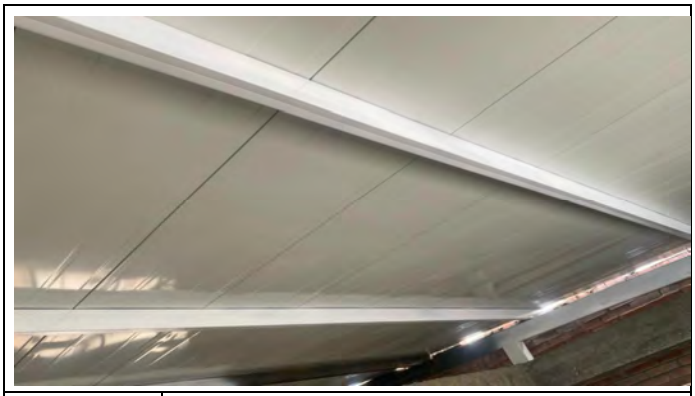

Fotografía No.12	Pintura de estructura metálica



Fotografía No.1	Verificación de niveles



Fotografía No.2	Desmonte de cubierta



Fotografía No.3	Compactación de sub-base granular



Fotografía No.4	Extendido de sub-base granular



Fotografía No.5	Extendido de sub-base granular



Fotografía No.6	Construcción de caja de inspección



Fotografía No.7	Extendido de sub-base granular



Fotografía No.8	Extendido de sub-base granular



Fotografía No.9	Extendido de sub-base granular



Fotografía No.10	Extendido de sub-base granular



Fotografía No.11	Toma de densidades



Fotografía No.12	Instalación de malla de refuerzo para placa



Fotografía No.1	Alistado de piso para posterior instalación de porcelanato sala de profesores VAE



Fotografía No.2	Alistado de piso para posterior instalación de porcelanato sala de profesores Embera



Fotografía No.3	Instalación de piso porcelanato en area de sala de profesores VAE



Fotografía No.4	Instalación de piso porcelanato en area de sala de profesores Embera



Fotografía No.5	Instalación de piso porcelanato en area de sala de profesores Embera



Fotografía No.6	Pintura de murosen areas intervenidas en el segundo piso



Fotografía No.7	Pintura de murosen areas intervenidas en el segundo piso



Fotografía No.8	Pintura de murosen areas intervenidas en el segundo piso



Fotografía No.9	Alistado de piso en zona de aula de danzas



Fotografía No.10	Instalación de piso porcelanato en aula de danzas segundo piso



Fotografía No.11	Area para cambiode piso en primer piso, coordinación



Fotografía No.12	Area para cambiode piso en primer piso, orientación



Fotografía No.1	Corte de angulos para modulos de cerramiento perimetral



Fotografía No.2	Armado de modulos para cerramiento



Fotografía No.3	Modulos de cerramiento antes de coclocar refuerzo centrales



Fotografía No.4	Colocación de refuerzos centrales para colocación de mallas



Fotografía No.5	Limpieza de pasto junto a zona de cerramiento para ver el estado de corrosión del mismo



Fotografía No.6	Limpieza de pasto junto a zona de cerramiento para ver el estado de corrosión del mismo



Fotografía No.7	Aplicación de anticorrosivo en modulos para soldado posterior de malla galvanizada



Fotografía No.8	Aplicación de anticorrosivo en modulos para soldado posterior de malla galvanizada



Fotografía No.9	Modulo pintado para posterior instalación de la malla galvnizada



Fotografía No.10	Malla galvanizada a utilizar en losmodulos del cerramiento



Fotografía No.11	Puntos de soldadura en modulos de cerramiento



Fotografía No.12	Pulida de puntos de soldadura en modulos antes de aplicar anticorrosivo

	
Fotografía No.1	Area de maloka a intervenir en esta institución
Fotografía No.2	Delimitación de area a intervenir en zona de maloka
	
Fotografía No.3	Delimitación de area a intervenir en zona de maloka
Fotografía No.4	Inicio de excavaciones para cimentación de estructura
	
Fotografía No.5	Excavación de vigas de cimentación
Fotografía No.6	Excavación para zapatas



Fotografía No.7	Material a emplear en el desarrollo de las actividades



Fotografía No.8	Trasiego de recebo para rellenos posterior a fundida de cimentación



Fotografía No.9	Trasiego de recebo para rellenos posterior a fundida de cimentación



Fotografía No.10	Excavación en parte central de maloka para armado de vigas y zapatas



Fotografía No.11	Acopio de recebo para posterior relleno en base de vigas y zapatas




Fotografía No.12	Retiro de escombros resultantes de excavación



Fotografía No.1	Instalacion de flanche



Fotografía No.2	Retiro de manto asfaltico

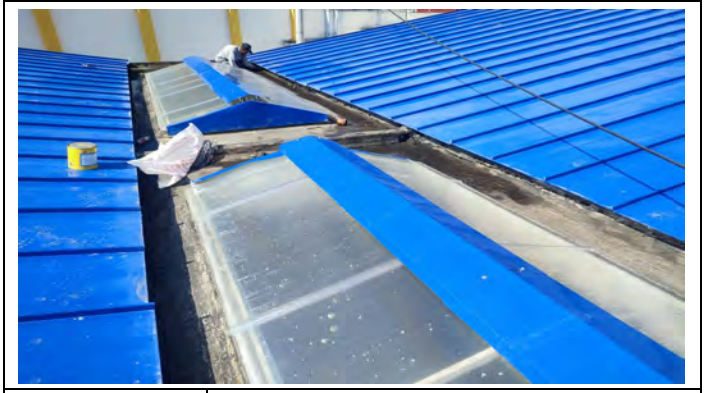

Fotografía No.3	Retiro de manto asfaltico



Fotografía No.4	Aplicación de pintura impermeabilizada




Fotografía No.5	Limpieza de residuos



Fotografía No.6	Acople de residuos



Fotografía No.7	Acople de residuos

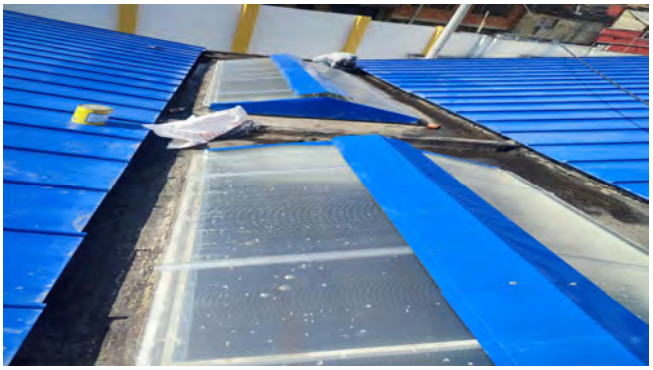

Fotografía No.8	Aseo y limpieza



Fotografía No.1	Desmonte de elementos



Fotografía No.2	Limpieza de estructura metalica



Fotografía No.3	Proteccion a elementos y mobiliario



Fotografía No.4	Desmonte de luminaria



Fotografía No.5	Proteccion a elementos y mobiliario



Fotografía No.6	Pintura de estructura metalica



Fotografía No.7	Instalacion de teja tipo sandwisch




Fotografía No.8	Instalacion de teja tipo sandwisch



Fotografía No.9	Retiro de sintas y elemtos de proteccion



Fotografía No.10	Retiro de sintas y elemtos de proteccion

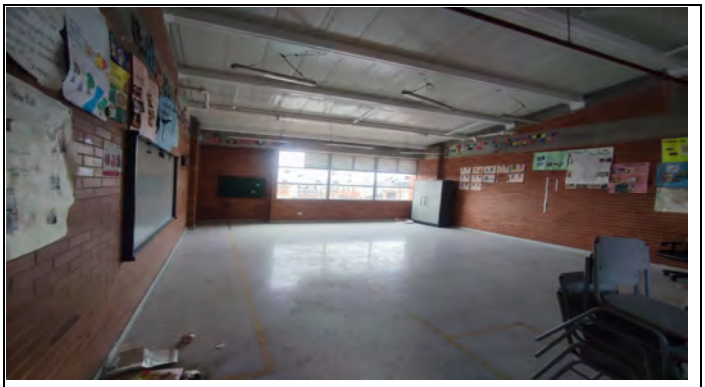

Fotografía No.11	Aseo general



Fotografía No.12	Aseo general

ANEXO 1.3 INFORME SST

ANEXO 1.4 INFORME AMBIENTAL
