Mejoramiento y obras complementarias a las Instalaciones del Centro de Atención y Reparación Integral de las Victimas CAIV del Municipio de Bucaramanga - Santander.

Contrato de Obra: 242 de 2022
Supervisor de Obra: Ing. Edgar Bayona P.
Residente de Obra: Ing Luis Enrique Pedraza
Noviembre 01 - 10 / 2022

Se da inicio a la obra, mediante acta realizada por los interesados, se resuelven temas precontractuales como son: Reconocimiento de obra, Documentos requeridos por parte de la entidad, planes y Programación de obra, Afiliación del personal tanto encargado como tecnico y laboral de la obra.

Noviembre 11

Se Inicia ejecución del contrato en el sitio de trabajo.
Se da capacitación y entrega de dotación al personal tecnico por parte del profesional HSEQ Maria Monica Herrera.
Se inician labores de preliminares replanteo de obra y labores de demolición de pisos en las areas acordadas de oficinas de la institución CAIV.

Powered by CamScanner

Noviembre 12

Se continua con labores de demolición de pisos en el area de oficinas y salon de reuniones y tambien se redlza labor de recogida de escombros y se asigna sitio de acopio de los mismos en la parte posterior de la obra, sin afectar Funcionalidad del mismo.

Noviembre 15

Se da inicio a labores de demolicón de antepecho de los muros y tambien se redlizan labores de escarificación y/o pelado de muros internos para acondicionar los mismos para proxima actividad de Frisos.

Noviembre 16

Se continua con la actividad de trabajos en los muros de los salones para alistamiento de Frisos

Noviembre 17

Se continua con la misma actividad de muros adicional con la recolección de escombros producto de la misma para mantener aseo y orden en el area de trabajo.

Powered by CamScanner

Noviembre 18

Se realizan labores de desmonte de cielorraso en el area de Oficinas y se fijan las luminarias para que continuen con su funcionamiento, se acopia el material de residuo para evacuación

Noviembre 19

Se realizan labores de desmonte de cielorraso en area de salon de reuniones se fijan luminarias, y se continua con el aseo y recolección de escombros para su evacuación.

Noviembre (20) 21

Inician labores la cuadrilla de electricos revisión de planos, se inician regates y acondicionamiento de la zona para empezar a instalar las respectivas tuberias electricas.

Noviembre 22

Se continua con labores electricas regates, instalación de tuberias y cajas de distribución y tomas en los sitios indicados en planos. Llega material de Friso, como es arena, cemento y mallas en general Para proximo inicio de labores

Noviembre 23

Teniendo acumulación de escombros viene volqueta y se lleva este material al sitio autorizado para tal fin.
Se continua el avance de la cuadrilla electrica, regatos, tuberia, cajas y demas para avanzar en el salon de oficinas.
Se da inicio con la cuadrilla de friso y resanes de los muros para alistamiento de los mismo y proceder a iniciar labores.
Se aprecia tubera hidraulica que atraviesa por la parte superior del salón de oficinas y se dispuso por parte del Ingeniero Bayona (supervisor) que se debia trasladar esta tubera de 1/2" hidraulica y empotrarla por los muros para su correcto funcionamiento y adecuación.

Noviembre 24

Se continua con labores de pegado de malla gallinero en las paredes tapando huecos y fisuras y regatos, para asi resanar bien las mismas y poder frisar en su totalidad, tambien se trabajó instalando cajas y tuberias en la parte electrica.
Se inspecciona el area de cubierta para determinar el area de impermeabilización

Powered by CamScanner

y tambien se definen las zonas donde se van a poner los condensadores de los aires acondicionados, se revisa la canal perimetral y se define darle mantenimiento y limpieza para su buen funcionamiento todo lo anterior se tiene acompañamiento por el Ing Bayona supervisor de la Alcaldia de Bucaramanga.

Noviembre 25

Se continua con labores de Friso, malla y resanes, como tambien con las labores de la parte electrica en el salon de reuniones, llega material electrico como son tubos 3/4, terminales 3/4 PVC, cajas cuadradas, suplementos y discos de corte

Noviembre 26

Realizan labores de Friso en el area salon de OFICINAS y se continuan labores de la parte electrica en area de salon de reuniones, se define instalacion de tableros electricos en sitio de sala de reuniones, llega material de arena para mejorar condiciones de Friso.

Noviembre 28

Continuacion con labores en los dos sitios definidos (Oficinas y Reuniones) en un lugar se trabaja en la parte electrica y en el otro se trabaja en Friso.

Powered by CamScanner

Noviembre 29

Se realizan trabajo Electrico y se continua con trabajos de friso, Entra material de cemento y Arena
Se da charla por parte de la siso a los trabajadores.

30/11/2022 En el salón en intervención que da a la cra 13, se detalla que los frisos necesarios en las paredes, su espesor se incrementa con respecto al pactado inicialmente (Item: 8.1.1) que es de 2cm, y en sitio hay espesores necesarios de 4cm y 7cm; motivo por el cual se requiere la pactación de nuevos items para estos frisos.
El tubo de la red hidraúlica que pasa sobre el cielo raso, debe ser incrustado en la pared, por lo cual se debe pactar el respectivo precio unitario "Traslado red hidraúlica aerea, en tubería P.V.C 1/2", incluye regata y resane/ml por ml.
En las ventanas que dan a la calle, debe habilitarse la parte superior, y en la parte inferior interna, en el cajón se proyecta instalar cajoneras en madera de 30cm de profundidad, motivo por el cual se debe pactar el item para el suministro e instalación de las cajoneras.
La supervisión de la obra, autoriza para la demolición del piso del cuarto de aperos del costado sur, zona central y su reposición con mortero con particulas de cuarzo (pachado

Powered by CamScanner

contra chulmuto); a este mismo costado, las instalaciones eléctricas existentes a la vista, deben quedar incrustadas en las paredes. También se autoriza el cambio del cielo raso por el pactado en el contrato. En la zona del pasillo que comunica las oficinas del costado norte con el costado sur, se tiene contemplado la instalación de seis (6) tomas para corriente eléctrica normal y seis (6) para corriente regulada, cuando no es zona de oficinas, sino se utiliza como pasillo, depósito y lavado de manos; motivo por el cual se eliman dos (2). En esta zona también se debe cambiar el piso existente por el contemplado en el contrato (con martillo con particulas de cuarzo)
En la zona del patio posterior, frente a la ludoteca, hay presencia de un hundimiento en el piso, producto de daño en la red sanitaria, lo cual esta poniendo en riesgo la estabilidad de las construcciones aledañas y a los transeuntes que por allí circulan (zona caperina); motivo por el cual se debe realizar y realizar las reparaciones pertinentes.

01/12/2022 Se inician trabajos de friso en la parte externa de fachada, se continua con friso interno en area de OFICINAS, se hace inspecciones en area de cubierta por temas de impermabilizacion y se continua con trabajos de redes electricas en los diferentes sectores de la Institución CAIU.

02/12/2022 Se continuan labores de friso tanto en la parte interna, como externa, se dejaron regados externos para instalacion de redes de aires acondicionados, se hacen mantenimiento y revision de Aires acondicionados y se continua con redes electricas en la Uba

03/12/2022 Se trae material de Impermeabilizacion de cubierta, tambien material de arena, cemento y puntillas se continua con labores de friso externo e interno, se mete tuberia electrica en diferentes sectores de oficina y se instalan tuberias para los aires acondicionados.

05/12/2022 Se toman niveles de pisos en el area de OFICINAS, encontrando un desnivel de 0,10 mts para mortero, se sugiere a la supervision modificar el item correspondiente a esta actividad, se inicia trabajos de Impermeabilizacion en area de cubierta, en la parte electrica de redes de tomacorriente en area de pasillo y area de OFICINA de Psicologia se continua laborando en frisos externos e internos..

06/12/2022 Realizan trabajos normalmente las cuadrillas de Friso interno, de Friso externo, se inician labores de estuco en muros internos, la cuadrilla de la parte electrica sigue con las redes en las diferentes areas de Oficinas, se realizan cortes en area de tejas y tambien limpieza para adecuar la zona para su correcta impermeabilizacion., llega material de malla tipo gallinero tanto para Frisos, como para soporte del mortero interno

Hay visita de los arquitectos del taller de arquitectura de la Alcaldia de Bucaramanga, para dar sugerencias en los diferentes labores y acondicionar las nuevas zonas a trabajar.

07/12/2022 Se trabaja en Friso externo de Fachada, en las areas de picados de Fachada se denota desgaste y Fatiga de los muros en tapia pisada, se aplican los correctivos en malla y mortero para mejorar condiciones y asi poder Frisar mejor, se continua con trabajos en areas internas de electricidad en conexiones de alumbrado (instalacion de cajas octogonales), Se inician trabajos de impermeabilizacion con el manto en areas de canales. Se realizan labores de Estuco en areas internas de oficinas, se hace aseo y limpieza de las areas de trabajo.

08/12/2022 Se trabaja en horas de la mañana en area externa, se realizan labores de Estuco exterior (inicio) y Se avanza normalmente en los trabajos.

09/12/2022 En el area del salón de informática se determina picar los muros en zonas donde las grietas estan muy pronunciadas y donde hay muros en tapia pisada para mejorar condiciones con mortero y malla gallinero, en salon de Oficinas se trabaja en Estuco, por la parte electrica se continuan labores de instalación de cajas octogonales en areas de baños con sus respectivas redes, en la parte externa de Fachada, se inician labores sobre la calle 41 demoliendo o raspando los muros y sobre la cra13 se continuan trabajos de Estuco para exteriores y Frisos, ademas se realizan regatas para acondicionamiento de redes de aires acondicionados tambien se trabaja en area de la cubierta en impermeabilizacion.

10/12/2022 Se continua trabajando en Frisos interno y externo, Estucos de Fachada, impermeabilizacion y parte electrica, se trabajo hasta el medio dia.

12/12/2022

El Supervisor de obra en visita realizada el dia de hoy, evidencia la presencia de personal (dos (2) trabajadores) realizando trabajos sobre la cubierta, sin contar con linea de vida y accesorios de seguridad como es el arnes, ademas del peso de las dos personas, tambien hay un cilindro de gas de 40 lb, que genera sobrepeso motivo por el cual se le exige al contratista, suspender los trabajos de la cubierta, hasta tanto se habilite la linea de vida y se disponga de los elementos de seguridad del personal.

Al momento de la visita, no se observa la presencia del profesional HSEQ, el cual es de estricto cumplimiento. Se informa que si esta situacion vuelve a presentarse, se procedera a tramitar la sancion correspondiente por incumplimiento.

13/12/2022

Se continua trabajando en las areas internas en estuco, resane de muros con malla y Friso, Se trabaja en la parte electrica en area de cajas Para iluminacion se corrige y se instala manto asfaltico en la cubierta del area de OFICINAS, Se revisan y se implementan los instrumentos de proteccion a los trabajadores, Se continua con Friso externo en muros de fachada, tambien se trabaja en cuadrilla de estuco para exteriores

14/12/2022 Se continua trabajando en los diferentes labores de estuco, friso, parte electrica, impermeabilizacion de cubierta, se hace cambio de caja de tacos en la parte electrica pues no correspondia a los presupuestados inicialmente. y se deja espacio para instalar los adecuados para tal Fin se trabaja en la parte externa en friso y estuco de fachadas, llovio en horas de la tarde, y no se pudo trabajar en la impermeabilizacion de la cubierta.

15/12/2022 Se hacen labores de desmonte de aires acondicionados sobre la calle 41 y las oficinas ubicadas en este sector se trabaja en friso sobre este sector y se continua en labores de estuco sobre la carrera 13 en la parte interna se realizan labores de antepiso y mortero en area de OFICINAS y se realizan labores electricas en cajas y cableado, se trabaja normalmente en los diferentes areas de la institucion

16/12/2022 Realizacion de trabajos de fachada friso, estuco, reforzamiento con malla cenefas y dilataciones sobre la calle 41 y la carrera 13, se continua con trabajos de mortero en area de oficinas y en parte electrica se realizan trabajos de cableado

17/12/2022
Sin novedad alguna, Se sigue trabajando en las actividades que se tienen realizando en fachada (Friso y estuco), se termina el mortero en area de oficinas, se continua con mas trabajos electricos cableado y ductería, llega material electrico., se trabaja hasta medio dia

19/12/2022
Se desmonta el letrero o aviso en mal estado en fachada del caiv, se Frisa y estuca en area externa se incluyen tuberias de aires acondicionados en el area externa antes de pasar se desmonta cielorazo en mal estado en area de oficina de Psicologia y Pasillos se frisa y resana en area de computo se inician trabajos de tuberia EMT por la parte electrica.

20/12/2022
Se Finaliza Friso en parte externa y se continuan trabajos de estuco, se desmontaron los aleros o techitos en mal estado en area de ventanas, Se continua con arreglos en area de salon de computo en Friso y resanes, la parte electrica continua con cableado general

21/12/2022 Llega material electrico, cable ductería Se continua estucando la fachada, se hacen arreglos generales de friso y estuco en la parte interna,

Powered by CamScanner

se continua trabajando en la parte electrica, se solicita al ingeniero electrico diseñador de las redes, despejar dudas de algunos de los items plantados para cumplir con las actividades del proyecto, se botaron los escombros del sitio de trabajo por medio de una volqueta, autorizada para llevarlos al sitio de escombros.

22/12/2022

Realizan labores de Estuco para exterior en Fachada y lijado del mismo, se le da un terminado a los alfajias Superiores ya que se encontraban en mal estado, se estuca el salon de informatica interno y se lija, se continuan los trabajos electricos de cableado.

23/12/2022

Se continuan labores de Fachada en estuco y resanes y lijado, tambien se continua labores de estuco y lijado en zona interna, se hace reunion con la direccion del CNIV donde solicita reinstacion de aires acondicionados en areas de oficina de trabajo y se define trabajar en estas zonas los dias lunes y martes de la siguiente semana, se continua instalando redes electricas internas.

26/12/2022
Se trabaja en lijado de zona exterior para alistamiento de pintura en fachada, se trabaja en aires acondicionado en zona acordada para mejorar las condiciones climaticas de los empleados del CAIV, se instalan soportes metalicos para poder instalar estructura del drywall, ya que fue necesario estos soportes por las luces de mas de 5 metros en areas de oficina y no instalarlos en las tejas que podrian desmejorar las condiciones de los mismos, se instalan Estructura cuadrada de 10x10. se trabaja en la parte electrica.

3/01/2023 Se reinician labores en la obra CAIV dando continuidad a los trabajos que se vienen realizando a lo largo de la obra como son Piso, friso y estuco en fachada exterior.

1/2/2023 se continuan realizando labores en la parte eléctrica como son ducteria y cableado aereas en el area de oficinas, se continuan realizando actividades de impermeabilizacion de la cubierta en el ala Noroeste.

2/2/2023 se realizan actividades de instalación de cielo raso en Drywall en el area de oficinas, se continúa con la impermeabilización de la cubierta en la zona Noroeste.

Powered by CamScanner

3/02/2023	se adelantan labores de pintura interna en el area de oficinas y salon de reuniones, se siguen adelantando activi dades de impermeabilizacion de la cubier
4/02/2023	se continuan realizand labores de pintur en interiores en las areas de oficin y de reuniones, se continua con las labores de impermeabilizacion de cubi erta.
6/02/2023	se continuan realizando labores de im- permeabilizacion de la cubierta, se realiza labores de instalacion de cielo raso en el salon de reuniones, se realiza alistamien eamasillado y lijado de drywall en el area de oficinas.
07/02/2023	se realizan labores de pintura en el cielo raso del area de oficinas, en el salon de reuniones se realiza alistamiento de cielo raso enmasillado y lijado, continua la impermeabilizacion de cubierta en el ala oeste.
8/02/2023	se realizan actividades por parte del equipo de electricos se hace la medicion, distribucion, marcacion y corte en el cielo- raso del area de oficinas para hacer la instalacion de los paneles de luz LED, conti- nua la impermeabilizacion de la cubierta.

Powered by CamScanner

9/02/2023 se realizan actividades de pintura de cielo raso en la sala de informática, en la parte eléctrica se realiza la instalación del Rack en el área de oficinas, continúa la impermeabilización de la cubierta en el ala oeste.

10/02/2023 se realizan actividades por parte del equipo de eléctricos que consta de: medición, distribución, marcación, y corte en el cielo raso de la sala de informática y se instalan los paneles de luz LED, continua la impermeabilización de la cubierta en el ala oeste.

11/02/2023 Se realizan actividades de impermeabilización de la cubierta en el ala sur oeste, se realiza la reunion con el personal encargado de las labores de enchape de piso y guarda escoba, se hacen las respectivas mediciones y calculos de areas a intervenir inicialmente.

12/02/2023 Se realizan actividades de impermeabilización de la cubierta, se procede a instalar la estructura para el nuevo cielo raso en dry wall en el area de pasillo.

13/02/2023 Se realiza alistamiento de cielo raso en dry wall. emasillado y lijado en el area de pasillo, se realiza el retiro de escombros pendientes en el patio, se realiza actividades de impermeabilización en el ala sur.

Powered by CamScanner

3/02/2023	se adelantan labores de pintura interna en el area de oficinas y salon de reuniones, se siguen adelantando activi-dades de impermeabilizacion de la cubierta
4/02/2023	se continuan realizand labores de pintura en interiores en las areas de oficinas y de reuniones, se continua con las labores de impermeabilizacion de cubi-erta.
6/02/2023	se continuan realizando labores de im-permeabilizacion de la cubierta, se realizan labores de instalacion de cielorraso en el salon de reuniones, se realiza aislamiento emmasillado y lijado de dry wall en el area de oficinas.
07/02/2023	se realizan labores de pintura en el cielo raso del area de oficinas, en el salon de reuniones se realiza aislamiento de cielo raso emmasillado y lijado, continua la impermeabilizacion de cubierta en el ala oeste.
8/02/2023	se realizan actividades por parte del equipo de electricos se hace la medicion, distribucion, marcacion y corte en el cielo-raso del area de oficinas para hacer la instalacion de los paneles de luz LED, conti-nua la impermeabilizacion de la cubierta.

Powered by CamScanner

14/02/2023	Se realizan labores de Pintura en el cielo-raso en el area de pasillo, se realizan labores de (Pintura) en el ala sur. ↓Impermeabilización de cubierta.
15/02/2023	Se inician las labores de enchape en el area de oficinas, se realizan labores de Pintura de cielo raso en el pasillo y se continúa con impermeabilización de cubierta.
17/02/2023	Se continúa con las labores de enchape en el area de oficinas, se continúa con la impermeabilización de cubierta, se completan labores de Pintura de cielo raso en el area del pasillo.
18/02/2023	se realizan labores de impermeabilización de la cubierta sobre el area de pasillo, se realiza labores de enchape guardaescobas en el area de oficinas.
20/02/2023	El equipo de enchape realiza labores de brechado en el area de oficinas, continúa labores de impermeabilización de la cubierta en el ala sur.
21/02/2023	Se inician labores de instalación de enchape en la sala de informatica, se procede a realizar la instalación de la estructura para el cielo raso en Drywall en el baño de hombres, continúa labores de impermeabilización de la cubierta.

Powered by CamScanner

27/02/2023 Se inician labores de demolición de piso en el área de psicología, se procede a instalar el cielo raso en el baño de hombres, se continua con las labores de impermeabilización de la cubierta en el ala sureste.

28/02/2023 se continúa las labores de enchape de piso en la sala de informática, se continúa y finaliza la demolición de piso en el área de psicología, se realizan actividades de impermeabilización de la cubierta en el ala sureste.

29/04/2023 se inicia labores de excavación manual en el area de psicología, se realizan actividades de alistamiento de drywall enmasillado y lijado en el baño de hombres, se continua con labores de impermeabilización de la cubierta,

01/05/23 se realiza la instalación del guarda escobas en la sala de informática, se continua alistamiento de drywall enmasillado y lijado en el baño de hombres, se inicia demolición de piso en el area de pasillo, se continúa con la impermeabilización de la cubierta en el ala sureste con la novedad que se rompieron 2 tramos de tejas y un segmento de cielo raso de drywall en la sala de informatica (solo daños materiales) por ende se suspenden las labores de impermeabilización.

27/02/2023	se continua con la demolición de piso en el area de pasillo, se instala la tuberia electrica en la misma área, se da inicio a la instalacion de la estructura de cielo raso en Drywall en el area de psicologia, continuan suspendidas las labores de limpieza habilitacion hasta que se realice la compra del material y la reparación del cielo raso y el cambio de las tejas averiadas
28/02/2023	se continúa con la instalación de la estructura de cielo raso y se inicia la instalación del mismo en el área de psicología, se inicia la reparacion y sustitución de elementos de la cubierta anteriormente averiada, se suspende la obra.
01/06/2023	Se da reinicio a la obra a través del acta de reinicio No. 2. Se realiza enmasillado y lijado de cielorraso drywall en el area de psicología. se adelantan labores de estuco y lijado de muros en el area de psicología y pasillo, se pinta el cielo-raso del area de psicología y pasillo, enmasillado y lijado de cielorraso en el area de baños, se hace una visita al lote colindante Parte oriental para socializar que se requiere urgente donalor y levantar el muro colindante.
2/06/2023	se realizan labores de pintura de cielorraso en las areas de baños, se hace la marcación y corte en los cielorrasos de las areas de pasillo, psicología y baños, se procede a instalar las luminarias led en dichas areas, se continua

Powered by CamScanner

las adecuaciones en el alrededor del area de informática con la instalación de las luminarias led que debieron ser reemplazadas.
se instalan Anteles drywall en el techo de los ventanas se enmasilla y lija la misma area, se procede a hacer retoques de estuco y lijado, se realizan labores de Pintura, se realiza limpieza en el area de oficinas, se hace la entrega de dicha area donde también se instalaron 2 equipos nuevos y uno existente de Aires acondicionados.

03/06/2023 Se realiza el retiro de escombros y limpieza en el Patio trasero, quedando despejada el area para la llegada de nuevo material, se recibe material.
Se requirió al Propietario del Parqueadero colindante la urgencia de iniciar trabajos en el muro aledaño.

05/06/2023 Se realizan labores de compactación, se instala la malla electrosoldada y se hace el antepiso en el area de psicología

06/06/2023 Se realizan labores de mortero en el area de Psicología, se hace una visita al Parqueadero que colinda con el Predio de CAIV por el costado oriental cl. 97-13-36 con el fin de socializar que se van a iniciar unas labores de demolición del muro medianero en tapia pisada que separa los 2 Predios Para luego Proceder a construir la cimentación y el muro nuevo de mampostería, se hace enfasis en que se requiere realizar estos trabajos de manera urgente debido al mal estado del muro existente el cual está en riesgo de caida lo cual puede afectar seriamente al Parqueadero ocacionando Posibles daños materiales a algunos Vehiculos.

Powered by CamScanner

07/06/2023	Se realiza un recorrido con el supervisor para verificar los avances de la obra y se concreta plan de trabajo para continuar las actividades faltantes. Se le manifiesta al supervisor que aún no han dado la viabilidad de iniciar labores en el muro del predio colindante.
08/06/2023	Se realizan actividades de recogida de escombros, actividades de resanteo y relleno de piso.
09/06/2023	Se realiza una reunión con la directora del CAIV y los arrendatarios del parqueadero colindante con el fin de concertar y llegar a un acuerdo definitivo del inicio de labores en el muro colindante, sin respuesta positiva a tal fin.
10/06/2023	Se recibió un viaje de arena, no se trabajó en el muro.
11/06/2023	No se laboró porque no se dió permiso en el parqueadero colindante.
12/06/2023	No se laboró
13/06/2023	se realiza actividad de mortero de oficina, instalación malla oficina, se hace picado de pared en fachada
15/06/2023	se inician labores de cerramiento y demolición de muro, ya que el propietario y los arrendatarios se ponen de acuerdo y aprueban dar inicio a las labores.

Powered by CamScanner

16/06/2023 Se continuan labores de demolición de muro

17/06/2023 continuan labores de demolición de muro, se realiza acopio de escombros.

18/06/2023 Se realiza labores de demolición de muro

19/06/2023 Se realiza labores de demolición de muro, se realiza acopio de escombros.

20/06/2023 se realiza acopio de escombros, se continúa con picado de muro, se instala malla y friso en fachada para socalo

21/06/2023 Se realizan labores de excavación en el area de muro, se realiza acopio de escombros

22/06/2023 Se realizan labores de instalación de malla y friso en fachada

23/06/2023 se realizan labores de friso en fachada sacalo

24/06/2023 Se realiza armado de estructura de acero para viga, la cuadrilla electrica trabaja en regata y canalización de datos, se realiza limpieza y desbroce en area de excavación. Se deja constancia que los trabajadores de archivo rompieron una Acuerta de vidrio, el Vigilante tambien hace registro escrito.

Powered by CamScanner

26/06/2023	Se realizan labores de concreto solado en area de muro, la cuadrilla electrica realiza instalacion de nuevos puntos de internet, se instala la estructura de acero para la viga de cimentacion y la estructura de columnas, se comienza a fundir la viga de cimentacion
27/06/2023	Se continua con la fundicion de la viga de cimentacion en area de muro
28/06/2023	se continua con la fundicion de la viga de cimentacion en area de muro
29/06/2023	se realizan labores de armado de estructura para columnas en area de muro
30/06/2023	se realizan labores de armado de estructura para columnas y viga
01/07/2023	se realizan labores de (friso) estuco en area de fachada sacal
04/07/2023	Se realizan labores de demolicion de friso se realiza visita por parte del supervisor encargado Wilson Motta para verificar las actividades en obra y se establece el compromiso de colocar mas personal para reforzar las actividades muro, enchape, fachada

Powered by CamScanner

5/07/2023 En cumplimiento con los compromisos pactados en la visita del supervisor se refuerzan los cundrillos y se realizan labores de viga en muro, enchape, zocalo fachada.

6/07/2023 se realizan labores de mampostería en muro, enchape, zocalo, se realizan trabajos de instalación de aires acondicionados.

7/7/2023 se realizan labores de mampostería en muro, aires acondicionados, demolición de piso, Pintura de puertas y Ventanas, friso, estuco, Pintura, instalación de Ventanas.

8/7/2023 se realizan labores de estuco y Pintura, aires acondicionados, acopio de escombros, lechada de muro, limpieza.

10/7/2023 se realizan labores de viga de muro, estuco, Pintura, limpieza y entrega de oficinas de Psicología e Informática.

11/7/2023 se realizan labores de relleno, mortero en area de muro, pintura y zocalo fachada.

12/7/2023 se realizan labores de mortero en area de muro, zocalo, estuco y Pintura, columnas de muro.

13/7/2023 se realizan labores de mampostería en muro, zocalo, estuco y Pintura.

14/7/2023 se realiza labores de mampostería, armado de viga y Pintura.

Powered by CamScanner

15/07/2023	Se realizan labores de sobrelo en fachada, viga de muro, estuco y pintura en fachada y se recibe material triturado.
17/07/2023	se realizan trabajos de viga de muro, desmonte de cielorraso (cocina), se inicia la instalación de los alerones de las puertas y ventanas en fachada, se realiza una caja de aguas lluvias y empalme de tuberías en el patio.
18/07/2023	Se continúa con la instalación de alerones en la fachada, mampostería de muros, compactación en Patio.
19/07/2023	Se realizan labores de pintura en fachada, se instala malla electrosoldada en area de patio, se continúa mampostería de muro.
20/07/2023	se realizan labores de mampostería en muro, se funde la placa en area de patio, instalación de alerones en fachada.
21/07/2023	se realizan labores de instalaciones y acabados en area de Patio, instalación de alerones y pintura en fachada, armado de estructura de viga de muro, se recibe material Pintura y perfiles para estructura de cielorraso.
22/07/2023	se realizan actividades de armado de estructura de viga, instalación de Perfiles para estructura de cielorraso, montaje de alerones sobre fachada.

Powered by CamScanner

24/07/2023 Se realizan trabajos de vigas en el muro colindante, instalación de elevanos en fachada, aire acondicionado.

25/07/2023 Se realizan labores de demolición de friso, pintura en ventanas, impermeabilización de cubierta, mortero.

26/07/2023 Se realizan labores de pintura en ventanas fachada, instalación de estructura para cielorraso, alfajía de muro.

27/07/2023 Se realizan labores de alfajía de muro, regata, cableado y ductería eléctrica y datos.

28/07/2023 Se realizan labores de alfajía, detalles de muro, regatas, cableado y canalización de red eléctrica y datos, estuco, pintura, cielorraso.

29/07/2023 Se realizan labores de friso, regata demolición de friso, antepiso, canalización y cableado eléctrico y datos.

30/07/2023 Se realizan labores de friso, estuco, mortero, enchape, redes eléctricas, suministro e instalación de ventanas.

31/07/2023 Se realizan labores de friso, estuco, redes eléctricas, cielorraso, impermeabilización.

01/08/2023 Se realizan labores de friso, instalación de cielorraso.

Powered by CamScanner

02/8/2023	se realizan labores de friso, estuco, Pintura, instalación de cielorraso, detalles drywall, instalación de letrero y escudo en fachada.
3/8/2023	se realizan labores de marcación y corte en cielorraso, acabados de piso, friso, instalación de lavaplatos, enchape.
04/8/2023	se realizan labores de instalación de luminarias, estuco, Pintura,
05/8/2023	Se realizan labores de friso, desmonte de cielorraso, estuco, demolición de piso, retoques en fachada
07/08/2023	se realizan labores de Pintura, instalación de cielorraso, incluye estructura, marcado, corte e instalación de luminarias en cielorraso, se tomo nivel de piso, antepiso.
8/8/2023	se realizan labores de estuco, Pintura, antepiso, Pintura bajo cubierta.
9/8/2023	se realizan labores de estuco, Pintura, mortero.
10/8/2023	se realizan labores de estuco y Pintura en pared y bajo cubierta.

Powered by CamScanner

11/8/2023	Se realizan labores de Pintura bajo cubierta, Pintura de canales y bajantes, Pintura columnas metálicas, orden y aseo.
12/8/2023	Se realizan labores de Pintura de muros y bajo cubierta, Pintura de canales y bajante, Pintura de columnas metálicas, orden y aseo.
14/8/2023	Se realizan labores de Pintura, orden y aseo.
15/8/2023	Se realizan labores de Pintura, orden y aseo.
16/8/2023	Se realizan labores de replanteo, la cuadrilla de carpintería inspecciona y mide las areas a intervenir, se toman niveles y medidas de piso a intervenir
17/8/2023	Se realizan labores de estuco, Pintura, orden y aseo, se dosifican areas terminadas, se recibe material de Pisos
18/8/2023	
18/8/2023	se realizan labores de Pintura, retoques interior y exterior, orden y limpieza
9/8/2023	Se realizan labores de Mantenimiento de puerta Principal, estuco, Pintura, Piso en Vinilo, orden y limpieza.
21/8/2023	Se realizan labores de Mantenimiento de Puerta, estuco, Pintura, Piso en Vinilo, orden y limpieza.

Powered by CamScanner

22/8/2023	se realizan labores de instalación de piso en vinilo, retoques de pintura, instalación de muebles madera, orden y limpieza. se realizó inspección con el soperviSor, donde se hacen algunas observaciones y pendientes de actividades por mejorar, dentro de las actividades del contrato, las cuales quedan plasmadas en el acta de ejecución del contrato.
30/8/2023	Luego de mejorar actividades pendientes se firma el acta de recibo final.


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM
1,1	MEDICIONES	1,1,1

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

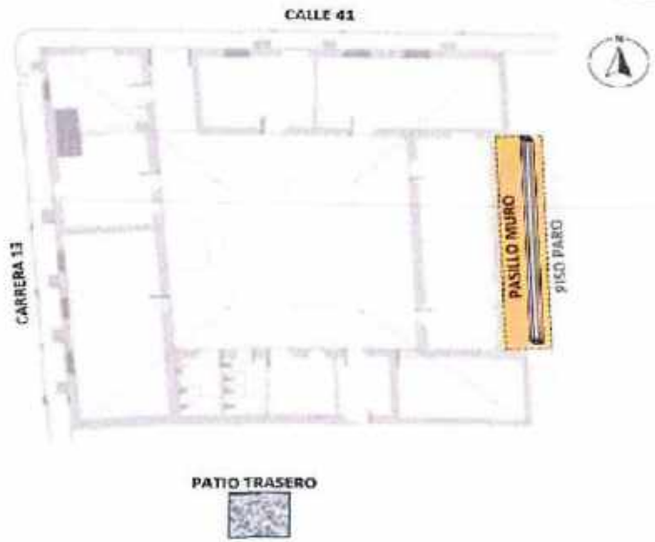

DESCRIPCIÓN: Localización y replanteo manual para el proyecto

UNIDAD: m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
PASILLO MURO	16,30	1,07		17,44			1	17,44
PISO PARQ	16,30	0,52		8,48			1	8,48
PATIO TRASERO	5,92	5,22		30,90			1	30,90
TOTAL PRESENTE INFORME								56,82
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								56,82

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA


Autorizó:
SUPERVISOR V.o B.o

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPITULO		ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2	DESMONTES	1,2,1	Desmonte de muro divisorio liviano, incluye cargue y retiro	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

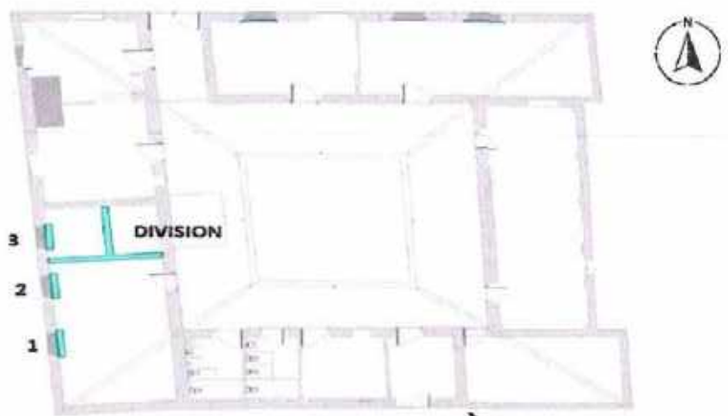

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Volumen	Cant.		
DESMONTE DIVISION LIVIANA								
DIVISION LIVIANA	8.70		2.51	21.84			1	21.84
TAPA EN VENTANA 1	1.40		2.40	3.36			1	3.36
TAPA EN VENTANA 2	1.40		2.40	3.36			1	3.36
TAPA EN VENTANA 3	1.40		2.40	3.36			1	3.36
TOTAL PRESENTE INFORME								31,92
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								31,92


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2	DESMONTES	1,2,2	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

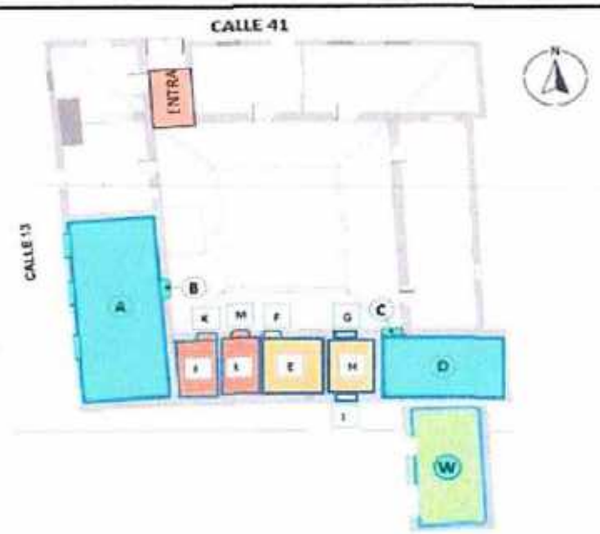

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
DESMONTE CIELO RASO								
AREA A	13,75	5,40		74,23		74,23	1	74,23
AREA B	1,43	0,65		0,93		0,93	1	0,93
AREA C	1,46	0,58		0,85		0,85	1	0,85
AREA D	7,46	4,56		34,00		34,00	1	34,00
AREA E	4,59	4,16		19,07		19,07	1	19,07
AREA F	0,70	1,32		0,92		0,92	1	0,92
AREA G	0,70	1,60		1,12		1,12	1	1,12
AREA H	3,90	3,22		12,54		12,54	1	12,54
AREA I	0,78	1,37		1,07		1,07	1	1,07
AREA J	4,25	2,66		11,31		11,31	1	11,31
AREA K	1,37	0,78		1,07		1,07	1	1,07
AREA L	4,24	2,5		10,60		10,60	1	10,60
AREA M	1,1	0,6		0,66		0,66	1	0,66
AREA W	8,25	7,85		64,76		64,76	1	64,76
ENTRADA	6,13	2,40		14,71			1	14,71
TOTAL PRESENTE INFORME								247,83
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								247,83

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR

VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2	DESMONTES	1,2,3	Desmonte de letrero existente	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Volumen	Cant.		
LETRERO						1,00	1	1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,3	DEMOLICIONES	1,3,1	Demolición de friso muros, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
FACHADA CALLE 41	27,65		4,90	135,49			1	135,49
FACHADA CARRERA 13	32,15		5,58	179,24			1	179,24
MENOS AREA VENTANAS Y PUERTA PRINCIPAL EXTERIOR				-38,66			1	-38,66
AREA A LONGITUD	13,75		3,21	44,13			2	88,25
AREA A ANCHO	5,40		3,21	17,33			2	34,67
AREA B		0,65	3,21	2,09			2	4,18
AREA C		0,58	3,21	1,86			2	3,72
AREA D LONGITUD	7,45		3,21	23,91			2	47,83
AREA D ANCHO	4,56		3,21	14,65			2	29,30
AREA E LONGITUD	4,59		3,21	14,73			2	29,47
AREA E ANCHO	4,16		3,21	13,34			2	26,68
AREA F		0,70	3,21	2,25			2	4,49
AREA G		0,70	3,21	2,25			1	2,25
AREA H LONGITUD	3,90		3,21	12,52			2	25,04
AREA H ANCHO	3,22		3,21	10,34			2	20,67
AREA I		0,78	3,21	2,50			1	2,50
AREA W ANCHO	7,14		2,65	18,92			2	37,84
AREA W LONGITUD	8,25		2,65	21,86			2	43,73
MENOS AREA VENTANAS Y PUERTAS INTERIOR				-29,44			1	-29,44
ALFAJIA CORNIZAS				-59,80			1	-59,80
TOTAL PRESENTE INFORME								587,43
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								587,43


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,3	DEMOLICIONES	1,3,2	Demolición de piso y alistado en mortero con martillo eléctrico, incluye , cargue, retiro y disposición final	m3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

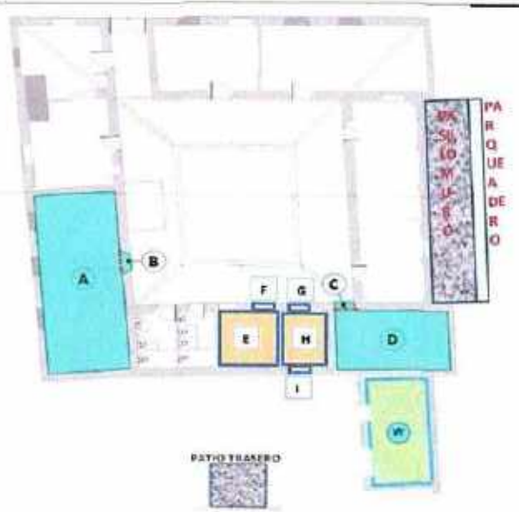

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Espesor	Area	Volumen	Cant.		
AREA A (OFICINAS)	13,75	5,40	0,15		11,13		1	11,13
AREA B	1,43	0,65	0,15		0,14		1	0,14
AREA C	1,46	0,58	0,15		0,13		1	0,13
AREA D (INFORMATICA)	7,45	4,56	0,15		5,10		1	5,10
AREA E (PSICOLOGIA)	4,59	4,16	0,15		2,86		1	2,86
AREA F	0,70	1,32	0,15		0,14		1	0,14
AREA G	0,70	1,50	0,15		0,17		1	0,17
AREA H (PASILLO)	3,90	3,22	0,15		1,88		1	1,88
AREA I	0,78	1,37	0,15		0,16		1	0,16
PASILLO MURO	16,30	1,07	0,15		2,62		1	2,62
PISO PARQ	16,30	0,85	0,15		2,08		1	2,08
PATIO TRASER	5,92	5,22	0,15		4,64		1	4,64
AREA W	8,25	7,86	0,15		9,72		1	9,72
TOTAL PRESENTE INFORME								40,76
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								40,76


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 282 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPITULO		ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1.3	DEMOLICIONES	1.3.3	Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final	m3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

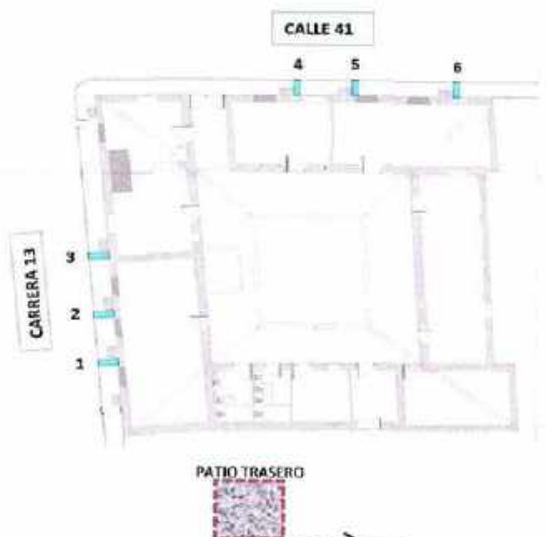

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Espesor	Área	Volumen	Cant.		
CORTE Y DEMOLICION ANDEN								
CORTE 1	0,98	0,26	0,15		0,04		1	0,04
CORTE 2	0,98	0,26	0,15		0,04		1	0,04
CORTE 3	0,98	0,26	0,15		0,04		1	0,04
CORTE 4	0,98	0,26	0,15		0,04		1	0,04
CORTE 5	0,98	0,26	0,15		0,04		1	0,04
CORTE 6	0,94	0,26	0,15		0,04		1	0,04
PISO PATIO TRASERO	22,28	0,10	0,15		0,33		1	0,33
TOTAL PRESENTE INFORME								0,56
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								0,56

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR

VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,1	PLACA DE PISO	2,1,1	Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio.	m3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Espesor	Área	Volumen	Cant.		
PLACA ANTEPISO								
AREA A	13,75	5,40	0,10		7,42		1	7,42
AREA B	1,43	0,65	0,10		0,09		1	0,09
AREA C	1,46	0,59	0,10		0,09		1	0,09
AREA D	7,45	4,56	0,10		3,40		1	3,40
AREA E	4,59	4,16	0,10		1,91		1	1,91
AREA F	0,70	1,32	0,10		0,09		1	0,09
AREA G	0,70	1,60	0,10		0,11		1	0,11
AREA H	3,90	3,22	0,10		1,25		1	1,25
AREA I	0,78	1,37	0,10		0,11		1	0,11
PASILLO MURO	16,30	1,07	0,10		1,74		1	1,74
PISO PARQ	16,30	0,52	0,10		0,85		1	0,85
PATIO TRASER	5,92	5,22	0,10		3,09		1	3,09
AREA W	8,25	7,86	0,10		6,48		1	6,48
TOTAL PRESENTE INFORME								26,64
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								26,64

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR


VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,1	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,1,1	Malla electro soldada	Kg

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

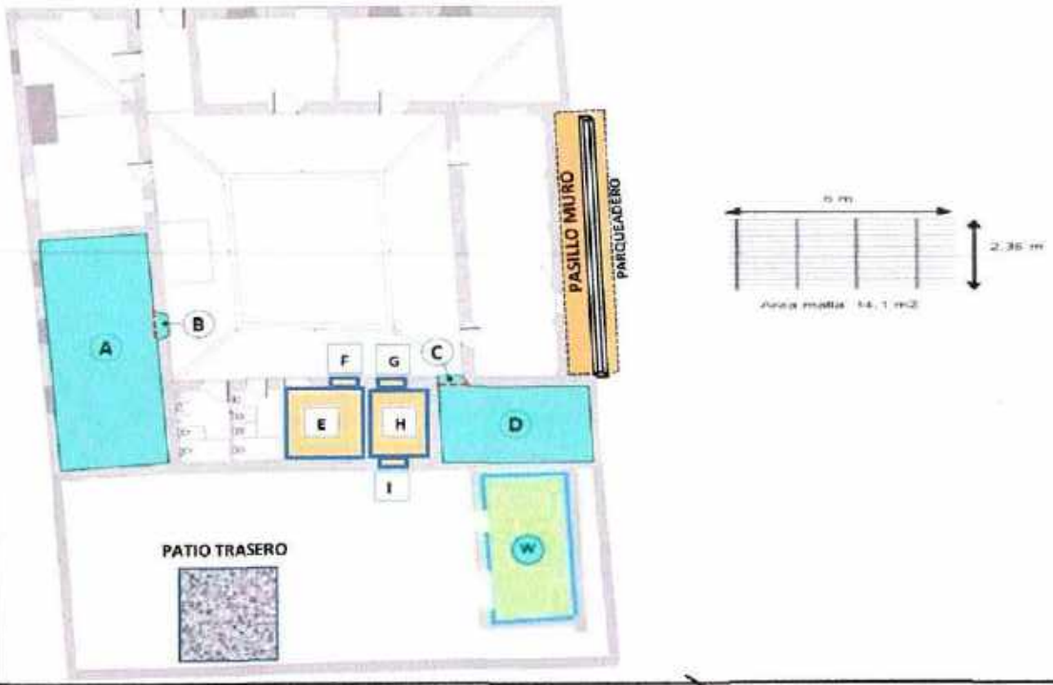

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Dens	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	PESO TOTAL
AREA A (OFICINAS)	13,75	5,40		74,23	2,20		1	163,31
AREA B	1,43	0,65		0,93	2,20		1	2,04
AREA C	1,46	0,58		0,85	2,20		1	1,86
AREA D (INFORMATICA)	7,45	4,56		34,00	2,20		1	74,80
AREA E (PSICOLOGIA)	4,59	4,16		19,07	2,20		1	41,96
AREA F	0,70	1,32		0,92	2,20		1	2,03
AREA G	0,70	1,60		1,12	2,20		1	2,46
AREA H (PASILLO)	3,90	3,22		12,54	2,20		1	27,58
AREA I	0,78	1,37		1,07	2,20		1	2,35
PASILLO MURO	16,30	1,07		17,44	2,20		1	38,37
PISO PARQ	15,90	0,52		8,48	2,20		1	18,65
PATIO TRASER	5,92	5,22		30,90	2,20		1	67,99
AREA W	8,25	7,86		64,80	2,20		1	142,57
TOTAL PRESENTE INFORME								585,97
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								585,97


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 252 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4,1	CUBIERTAS	4,1,1	Impermeabilización y mantenimiento de cubierta con manto asfáltico 4.2mm modificado con polipropileno atáctico. Incluye pintura reflectiva con base asfáltica	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

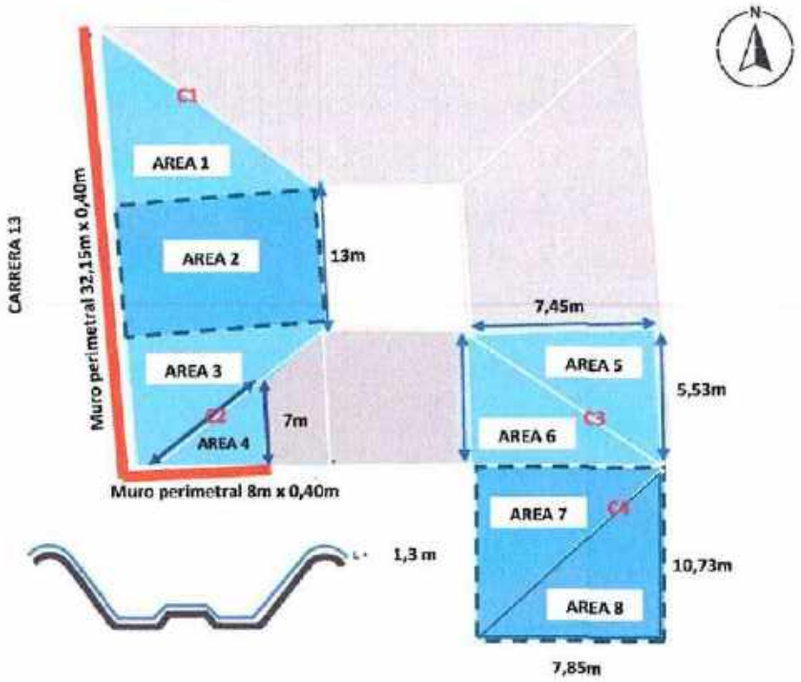

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
AREA 1	12,49	10,00		62,45			1	62,45
AREA 2	13,00	10,00		130,00			1	130,00
AREA 3	12,49	10,00		62,45			1	62,45
AREA 4	8,00	7,00		28,00				
AREA 5	7,45	5,53		20,58			1	20,58
AREA 6	9,69	4,55		22,03			1	22,03
AREA 7	10,21	8,25		42,10			1	42,10
AREA 8	10,73	7,85		42,10			1	42,10
MURO SUP PERIM OCC	32,15	0,40		12,86			1	12,86
MURO SUP PERIM SUR	8,00	0,40		3,20			1	3,20
CANAL 1	16,00	0,30		4,80			1	4,80
CANAL 2	10,00	0,30		3,00			1	3,00
CANAL 3	8,73	0,30		2,62			1	2,62
CANAL 4	11,39	0,30		3,42			1	3,42
TOTAL PRESENTE INFORME								411,60
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								411,60


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	**CONTRATISTA:**	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**REPRESENTANTE LEGAL:**	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		**SUPERVISOR:**	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	**PERIODO PRESENTE INFORME:**	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.1	CIELO RASOS EN DRY WALL	5.1.1	Cielo raso en lámina de yeso regular 1/2", incluye acabado en pintura vinilo tipo 2	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

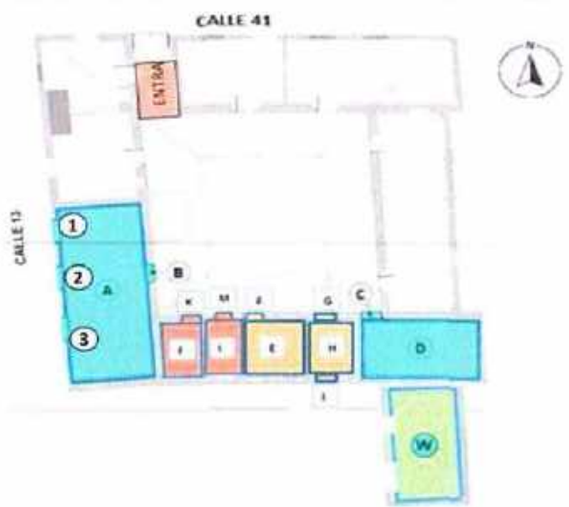

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
CIELO RASO EN LAMINA DE YESO								
AREA A	13,75	5,40		74,23			1	74,23
TAPAS VENTANAS								
TAPA EN VENTANA 1				2,17			1	2,17
TAPA EN VENTANA 2				2,17			1	2,17
TAPA EN VENTANA 3				2,17			1	2,17
AREA B	1,43	0,65		0,93			1	0,93
AREA C	1,46	0,58		0,85			1	0,85
AREA D	7,45	4,56		34,00			1	34,00
AREA E	4,59	4,16		19,07			1	19,07
AREA F	0,70	1,32		0,92			1	0,92
AREA G	0,70	1,60		1,12			1	1,12
AREA H	3,90	3,22		12,54			1	12,54
AREA I	0,78	1,37		1,07			1	1,07
AREA J	4,25	2,66		11,31			1	11,31
AREA K	1,37	0,78		1,07			1	1,07
AREA L	4,24	2,5		10,60			1	10,60
AREA M	1,1	0,6		0,66			1	0,66
AREA W	8,25	7,85		64,76			1	64,76
ENTRADA	6,13	2,40		14,71			1	14,71
TOTAL PRESENTE INFORME								239,63
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								239,63


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	**DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA**	**SUPERVISOR** VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6,1	TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA	6,1,1	Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

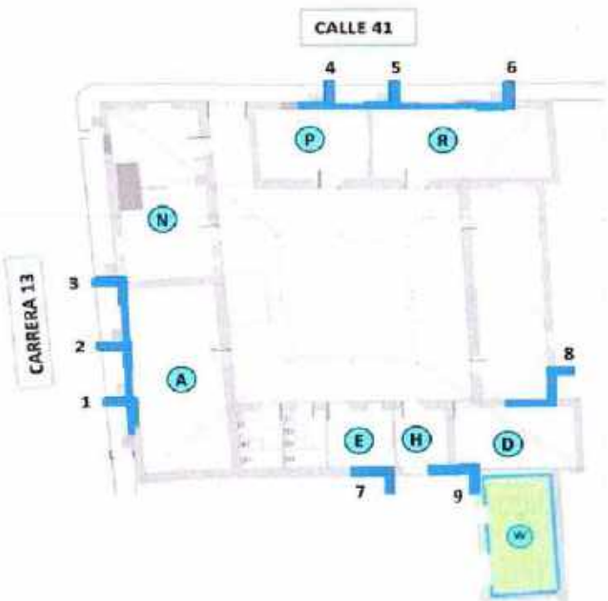

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.	NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
RED HIDRAULICA PVC 1/2"								
RED 1	3,33						1	3,33
RED 2	3,33						1	3,33
RED 3	3,33						1	3,33
RED 4	3,33						1	3,33
RED 5	3,33						1	3,33
RED 6	3,33						1	3,33
RED 7	4,50						1	4,50
RED 8	3,80						1	3,80
RED 9	2,50						1	2,50
TOTAL PRESENTE INFORME								30,80
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								30,80


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7.1	TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA	7.1.1	Red agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

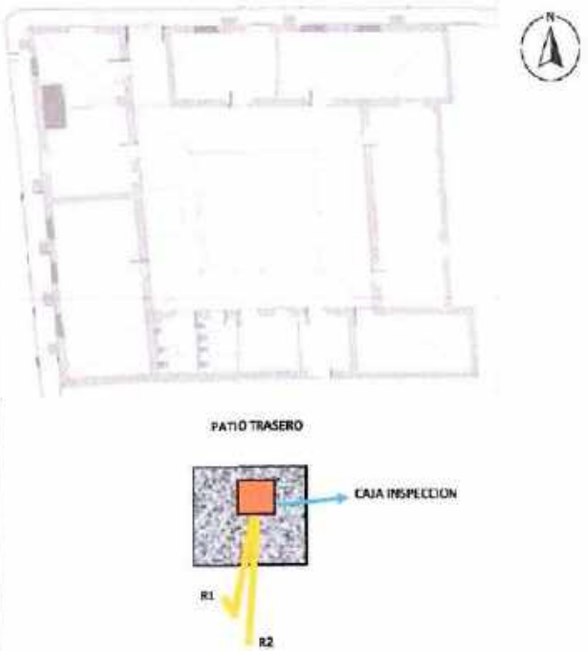


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
RED 1	3,50						1	3,50
RED 2	2,50						1	2,50

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8,1	FRISOS Y ESTUCOS PARED	8,1,1	Friso allanado sobre pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

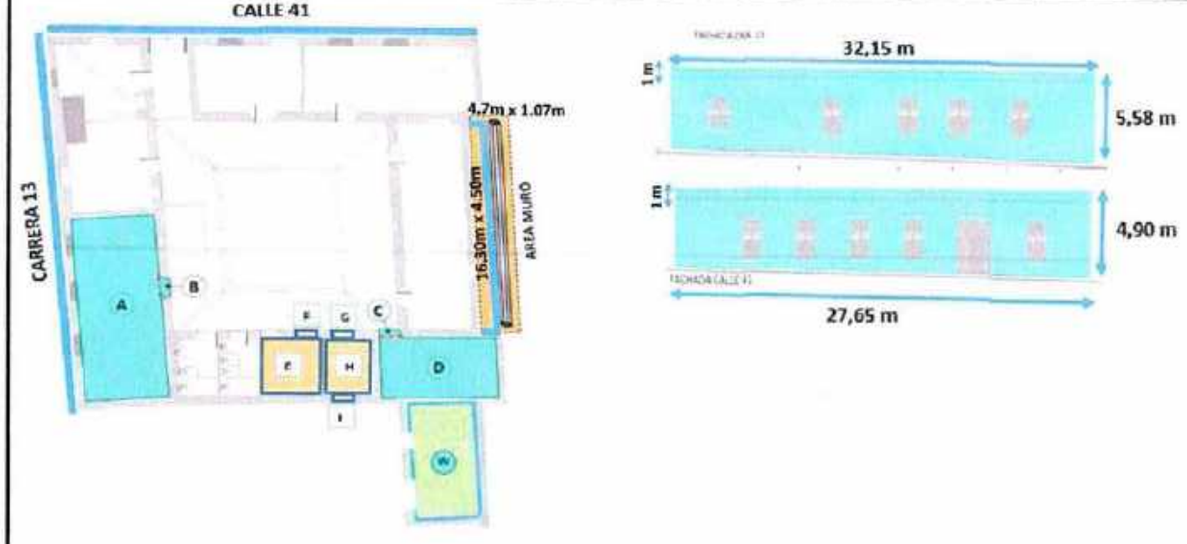

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
FACHADA CALLE 41	27,65		4,90	135,49			1	135,49
FACHADA CARRERA 13	32,15		5,58	179,24			1	179,24
MENOS AREA VENTANAS Y PUERTA PRINCIPAL EXTERIOR				-38,66			1	-38,66
AREA A LONGITUD	13,75		3,21	44,13			2	88,25
AREA A ANCHO	5,40		3,21	17,33			2	34,67
AREA B		0,65	3,21	2,09			2	4,18
AREA C		0,58	3,21	1,86			2	3,72
AREA D LONGITUD	7,45		3,21	23,91			2	47,83
AREA D ANCHO	4,56		3,21	14,65			2	29,30
AREA E LONGITUD	4,59		3,21	14,73			2	29,47
AREA E ANCHO	4,16		3,21	13,34			2	26,68
AREA F		0,70	3,21	2,25			2	4,49
AREA G		0,70	3,21	2,25			2	4,49
AREA H LONGITUD	3,90		3,21	12,52			2	25,04
AREA H ANCHO	3,22		3,21	10,34			2	20,67
AREA I		0,78	3,21	2,50			2	5,01
AREA W LONGITUD	8,25		2,65	21,86			2	43,73
AREA W ANCHO	7,85		2,65	20,80			2	41,61
MURO MEDIANERO	16,30		4,50	73,35			1	73,35
PASILLO MURO	1,07		4,70	5,03			2	10,06
MENOS AREA VENTANAS Y PUERTAS INTERIOR				-35,30			1	-35,30
SOCALOFACHADA				74,53			1	74,53
TOTAL PRESENTE INFORME								807,82
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								807,82

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA


Autorizó:
SUPERVISOR
VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	ADICIONAL CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	INTERVENTORÍA:	
SUPERVISIÓN:		REPRESENTANTE LEGAL:	
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8,1	FRISOS Y ESTUCOS PARED	8,1,1	Friso allanado para socalo con mortero 1:4 impermeabilizado e=3 cm, incluye filos y dilataciones	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

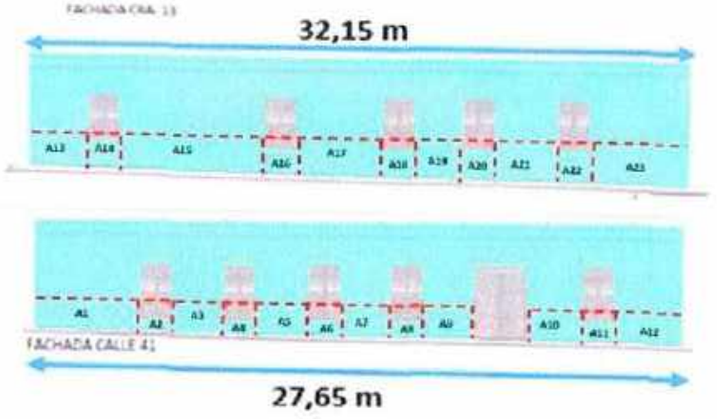

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
FACHADA CALLE 41								
AREA 1	4,24		1,16	4,90			1	4,90
AREA 2	1,27		0,53	0,67			1	0,67
AREA 3	2,38		1,18	2,80			1	2,80
AREA 4	1,27		0,61	0,77			1	0,77
AREA 5	2,37		1,18	2,80			1	2,80
AREA 6	1,27		0,71	0,90			1	0,90
AREA 7	2,26		1,17	2,63			1	2,63
AREA 8	1,25		0,80	0,99			1	0,99
AREA 9	2,25		1,19	2,68			1	2,68
AREA 10	2,22		1,18	2,61			1	2,61
AREA 11	1,28		0,91	1,16			1	1,16
AREA 12	3,22		1,18	3,80			1	3,80
FACHADA CRA. 13								
AREA 13	2,64		1,18	3,10			1	3,10
AREA 14	1,28		1,02	1,31			1	1,31
AREA 15	6,22		1,24	7,71			1	7,71
AREA 16	1,30		1,13	1,46			1	1,46
AREA 17	2,90		1,37	3,96			1	3,96
AREA 18	1,27		1,24	1,57			1	1,57
AREA 19	2,83		1,56	4,40			1	4,40
AREA 20	1,29		1,34	1,72			1	1,72
AREA 21	2,77		1,66	4,60			1	4,60
AREA 22	1,31		1,47	1,93			1	1,93
AREA 23	8,80		1,83	16,06			1	16,06
TOTAL PRESENTE INFORME								74,53
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								74,53

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR


VoBo


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM
8,1	FRISOS Y ESTUCOS PARED	8,1,2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

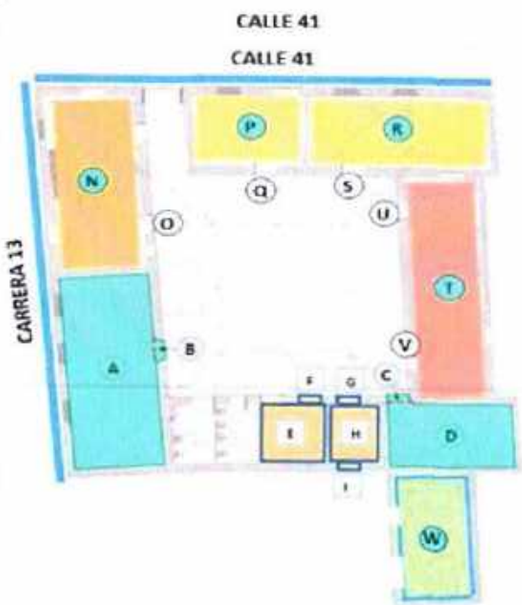

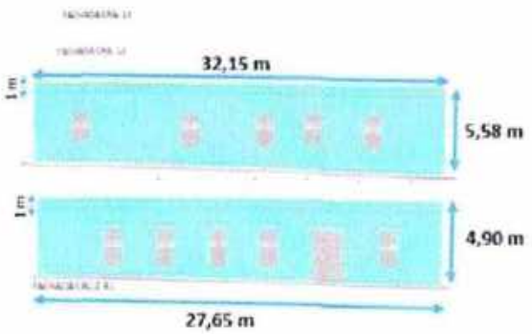

DESCRIPCIÓN							UNIDAD	
Estuco plástico pared interior y/o exterior							m2	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.		
FACHADA CALLE 41	27,65		4,90	135,49			1	135,49
FACHADA CARRERA 13	32,15		5,58	179,24			1	179,24
MENOS VENTANAS Y PUERTA PRINCIPAL				-38,66			1	-38,66
AREA A LONGITUD	13,75		3,21	44,13			2	88,25
AREA A ANCHO	5,40		3,21	17,33			2	34,67
AREA B		0,65	3,21	2,09			2	4,18
AREA C		0,58	3,21	1,86			2	3,72
AREA D LONGITUD	7,45		3,21	23,91			2	47,83
AREA D ANCHO	4,56		3,21	14,65			2	29,30
AREA E LONGITUD	4,59		3,21	14,73			2	29,47
AREA E ANCHO	4,16		3,21	13,34			2	26,68
AREA F		0,70	3,21	2,25			2	4,49
AREA G		0,70	3,21	2,25			2	4,49
AREA H LONGITUD	3,90		3,21	12,52			2	25,04
AREA H ANCHO	3,22		3,21	10,34			2	20,67
AREA I		0,78	3,21	2,50			2	5,01
AREA N LONGITUD	11,85		3,21	38,04			2	76,08
AREA N ANCHO	5,30		3,21	17,01			2	34,03
AREA O		0,65	3,21	2,09			2	4,17
AREA P LONGITUD	6,80		3,21	21,83			2	43,66
AREA P ANCHO	5,20		3,21	16,69			2	33,38
AREA Q		0,66	3,21	2,12			2	4,24
AREA R LONGITUD	10,84		3,21	34,80			2	69,59
AREA R ANCHO	5,13		3,21	16,47			2	32,93
AREA S		0,63	3,21	2,02			2	4,04
AREA T LONGITUD	15,84		2,85	45,14			2	90,29
AREA T ANCHO	4,07		2,85	11,60			2	23,20
AREA U		0,44	2,85	1,25			2	2,51
AREA V		0,44	2,85	1,25			2	2,51
AREA W LONGITUD	8,29		2,65	21,97			2	43,94
AREA W ANCHO	7,14		2,65	18,92			2	37,84
ENTRADA	6,13		3,55	21,76			0	0,00
MENOS VENTANAS Y PUERTAS INTERIOR				-35,30			1	-35,30
TOTAL PRESENTE INFORME								1.066,96
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								1.066,96

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:

SUPERVISOR


VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPITULO		ITEM
8.2	PINTURA PARED	8.2.1

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

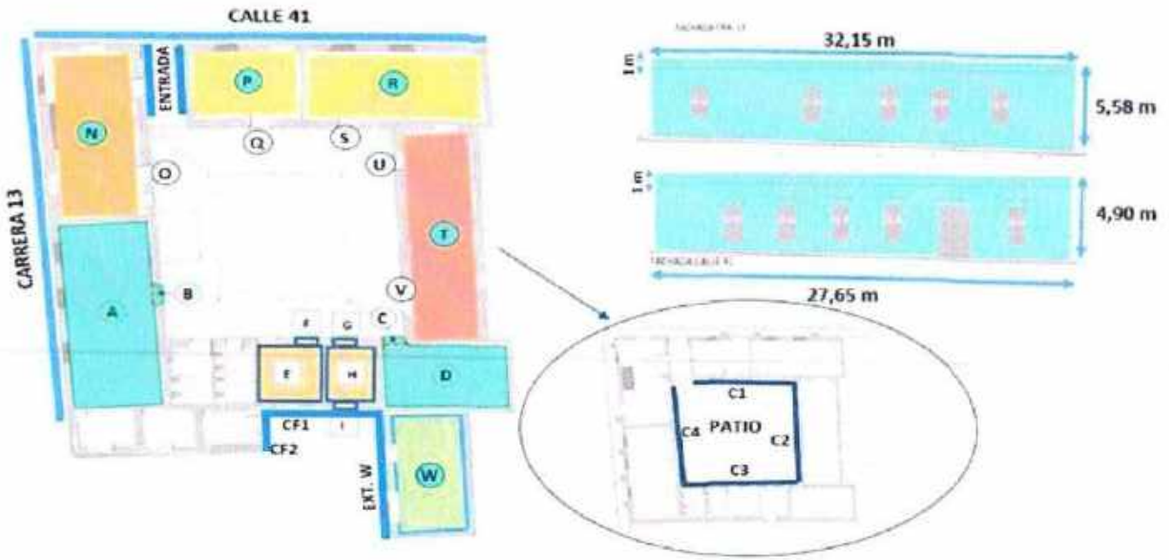

DESCRIPCIÓN							UNIDAD	
Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos							m2	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A LONGITUD	13,75		3,21	44,13			2	88,25
AREA A ANCHO	5,40		3,21	17,33			2	34,67
AREA B		0,65	3,21	2,09			2	4,18
AREA C		0,58	3,21	1,86			2	3,72
AREA D LONGITUD	7,45		3,21	23,91			2	47,83
AREA D ANCHO	4,56		3,21	14,65			2	29,30
AREA E LONGITUD	4,59		3,21	14,73			2	29,47
AREA E ANCHO	4,16		3,21	13,34			2	26,68
AREA F		0,70	3,21	2,25			2	4,49
AREA G		0,70	3,21	2,25			2	4,49
AREA H LONGITUD	3,90		3,21	12,52			2	25,04
AREA H ANCHO	3,22		3,21	10,34			2	20,67
AREA I		0,78	3,21	2,50			2	5,01
AREA N LONGITUD	11,85		3,21	38,04			2	76,08
AREA N ANCHO	5,30		3,21	17,01			2	34,03
AREA O		0,65	3,21	2,09			2	4,17
AREA P LONGITUD	6,80		3,21	21,83			2	43,66
AREA P ANCHO	5,20		3,21	16,69			2	33,38
AREA Q		0,66	3,21	2,12			2	4,24
AREA R LONGITUD	10,84		3,21	34,80			2	69,59
AREA R ANCHO	5,13		3,21	16,47			2	32,93
AREA S		0,63	3,21	2,02			2	4,04
AREA T LONGITUD	15,84		3,21	50,85			2	101,69
AREA T ANCHO	4,07		3,21	13,06			2	26,13
AREA U		0,44	3,21	1,41			2	2,82
AREA V		0,44	3,21	1,41			2	2,82
AREA W LONGITUD	8,29		3,21	26,61			2	53,22
AREA W ANCHO	7,85		3,21	25,20			2	50,40
EXTERIOR W	7,85		3,45	27,04			1	27,04
MURO CAFETERIA 1	5,04		3,76	18,94			1	18,94
MURO CAFETERIA 2	3,14		1,22	3,82			1	3,82
ENTRADA	6,13		3,55	21,76			2	43,52
C1 PATIO	12,50		3,74	46,75			1	46,75
C2 PATIO	20,21		3,74	75,59			1	75,59
C3 PATIO	14,78		3,74	55,28			1	55,28
C4 PATIO	16,07		3,74	60,10			1	60,10
MENOS VENTANAS Y PUERTAS INTERIOR				-60,21			1	-60,21
TOTAL PRESENTE INFORME								1.133,84
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								1.133,84


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8,2	PINTURA PARED	8,2,2	Pintura acrilica exterior pared, sobre estuco, dos manos.	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

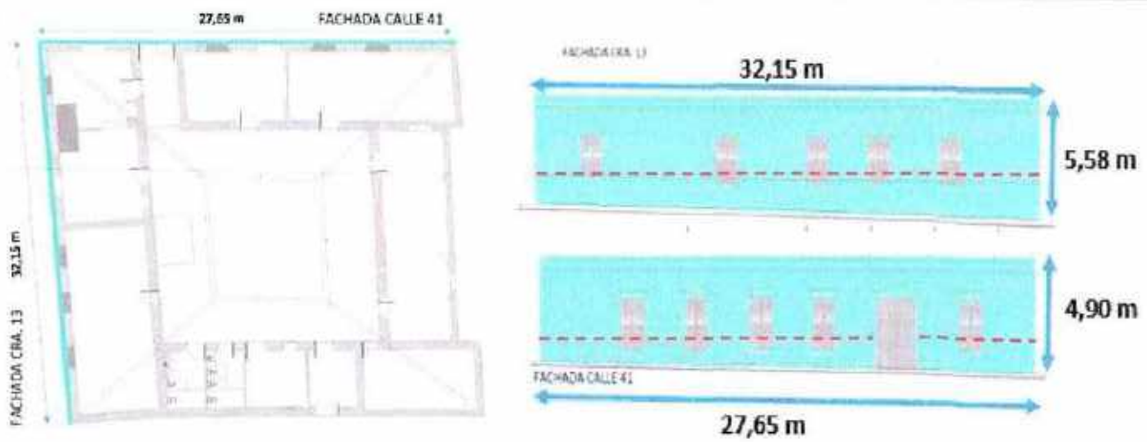

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
FACHADA CALLE 41	27,65		4,90	135,49			1	135,49
FACHADA CRA. 13	32,15		5,58	179,40			1	179,40
ALFAJIA / CORNIZAS	59,80		1,00	59,80			1	59,80
MENOS VENTANAS Y PUERTA				-38,86			1	-38,86
MENOS SOCALO				-74,53			1	-74,53
TOTAL PRESENTE INFORME								261,49
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								261,49

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA


Autorizó:
SUPERVISOR
VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8,2	PINTURA PARED	8,2,3	Pintura acrilica exterior sócalo, sobre estuco, dos manos, color RAL 7016 o similar	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

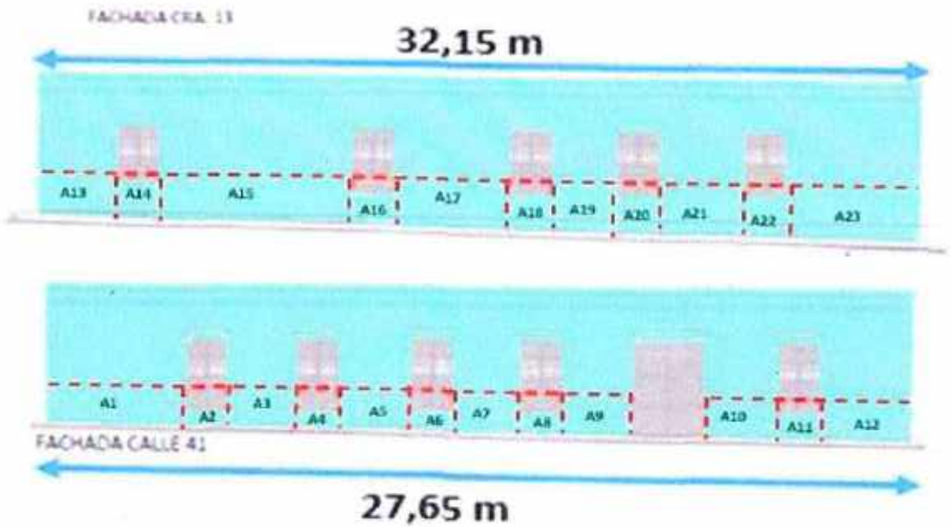

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
FACHADA CALLE 41								
AREA 1	4,24		1,16	4,90			1	4,90
AREA 2	1,27		0,53	0,67			1	0,67
AREA 3	2,38		1,16	2,80			1	2,80
AREA 4	1,27		0,61	0,77			1	0,77
AREA 5	2,37		1,16	2,80			1	2,80
AREA 6	1,27		0,71	0,90			1	0,90
AREA 7	2,26		1,17	2,63			1	2,63
AREA 8	1,25		0,80	0,99			1	0,99
AREA 9	2,25		1,19	2,68			1	2,68
AREA 10	2,22		1,18	2,61			1	2,61
AREA 11	1,28		0,91	1,16			1	1,16
AREA 12	3,22		1,18	3,80			1	3,80
FACHADA CRA. 13								
AREA 13	2,64		1,18	3,10			1	3,10
AREA 14	1,28		1,02	1,31			1	1,31
AREA 15	6,22		1,24	7,71			1	7,71
AREA 16	1,30		1,13	1,46			1	1,46
AREA 17	2,90		1,37	3,96			1	3,96
AREA 18	1,27		1,24	1,57			1	1,57
AREA 19	2,83		1,56	4,40			1	4,40
AREA 20	1,29		1,34	1,72			1	1,72
AREA 21	2,77		1,66	4,60			1	4,60
AREA 22	1,31		1,47	1,93			1	1,93
AREA 23	8,80		1,83	16,06			1	16,06
TOTAL PRESENTE INFORME								74,53
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								74,53

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR


VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 252 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
9,1	MORTEROS DE NIVELACIÓN	9,1,1	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm.	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

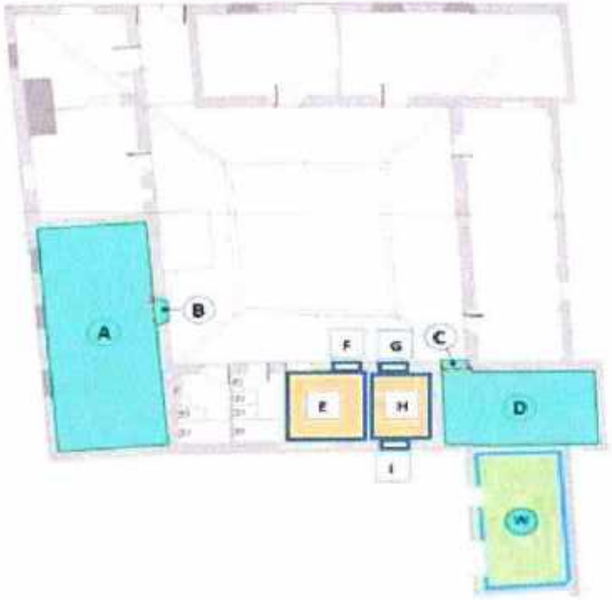

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
ALISTADO DE PISO EN MORTERO								
AREA A	13,75	5,40		74,23			1	74,23
AREA B	1,43	0,65		0,93			1	0,93
AREA C	1,46	0,58		0,85			1	0,85
AREA D	7,45	4,56		34,00			1	34,00
AREA E	4,59	4,16		19,07			1	19,07
AREA F	0,70	1,32		0,92			1	0,92
AREA G	0,70	1,60		1,12			1	1,12
AREA H	3,90	3,22		12,54			1	12,54
AREA I	0,78	1,37		1,07			1	1,07
AREA W	8,25	7,85		64,76			1	64,76
TOTAL PRESENTE INFORME								209,49
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								209,49

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR

Vobo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10,1	PUERTAS	10,1,1	Mantenimiento de puerta metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y poliuretano	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
MANTENIMIENTO DE PUERTAS								
PUERTA 1	1,23		2,85	3,51			1	3,51
PUERTA 2	1,22		2,90	3,54			1	3,54
PUERTA 3	1,27		2,92	3,71			1	3,71
PUERTA 4	1,20		2,00	2,40			1	2,40
PUERTA 5	0,83		1,90	1,58			1	1,58
PUERTA 6	1,12		2,90	3,25			1	3,25
PUERTA 7	1,28		2,90	3,71			1	3,71
PUERTA 8	1,28		2,71	3,47			1	3,47
PUERTA 9	1,28		2,71	3,47			1	3,47
PUERTA 10	2,40		2,20	5,28			1	5,28
PUERTA 11	1,28		2,77	3,55			1	3,55
PUERTA 12	1,29		2,79	3,60			1	3,60
PUERTA 13	0,98		2,82	2,76			1	2,76
PUERTA 14	0,98		2,82	2,76			1	2,76
PUERTA 15	1,13		1,97	2,23			1	2,23
PUERTA 16	1,22		2,58	3,15			1	3,15
TOTAL PRESENTE INFORME								51,95
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								51,95


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR Vo.Bo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 202 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10,2	VENTANAS	10,2,1	Ventana corrediza de aluminio 5020 y vidrio incoloro de 4 mm	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

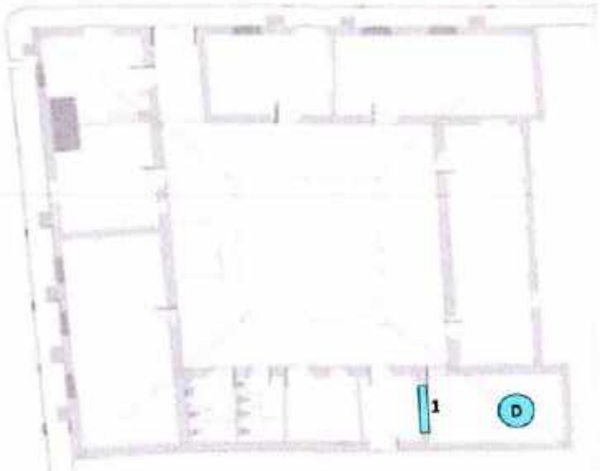

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
VENTANA CORREDIZA								
VENTANA 1	3,15		1,03	3,24		3,24	1	3,24
TOTAL PRESENTE INFORME								3,24
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								3,24

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10,2	VENTANAS	10,2,2	Mantenimiento pintura de ventana metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
MANTENIMIENTO VENTANAS								
VENTANAS 1	1,31		2,42	3,17			1	3,17
VENTANAS 2	1,30		2,50	3,25			1	3,25
VENTANAS 3	1,29		2,49	3,21			1	3,21
VENTANAS 4	1,30		2,42	3,15			1	3,15
VENTANAS 7	1,26		2,40	3,02			1	3,02
VENTANAS 8	1,26		2,40	3,02			1	3,02
VENTANAS 9	1,26		2,38	3,00			1	3,00
VENTANAS 10	1,26		2,47	3,11			1	3,11
VENTANAS 11	0,90		1,97	1,77			1	1,77
VENTANAS 12	1,70		2,52	4,28			1	4,28
VENTANAS 13	0,75		2,10	1,58			1	1,58
TOTAL PRESENTE INFORME								32,57
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								32,57

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 202 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
11	SEÑALIZACIÓN	11,1,1	Suministro e instalacion de Letrero en acrilico, incluye instalación a pared	Und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



FACHADA CALLE 41

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
LETRERO						1,00	1,00	1,00

TOTAL PRESENTE INFORME	1,00
TOTAL INFORME ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO	1,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR Vobo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 06 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
12	AIRE ACONDICIONADO	12,1,1	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 36000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

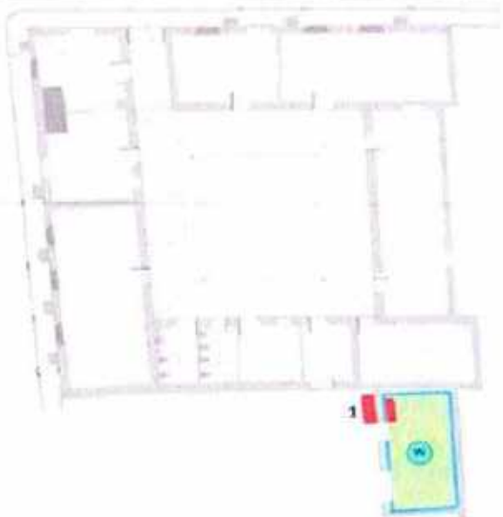

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AIRE ACONDICIONADO								
AREA W (LUDOTECA)						1,00	0,00	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								1,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								1,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR Vobo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPITULO		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
13	ASEO Y LIMPIEZA	13,1,1	Aseo y limpieza.	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

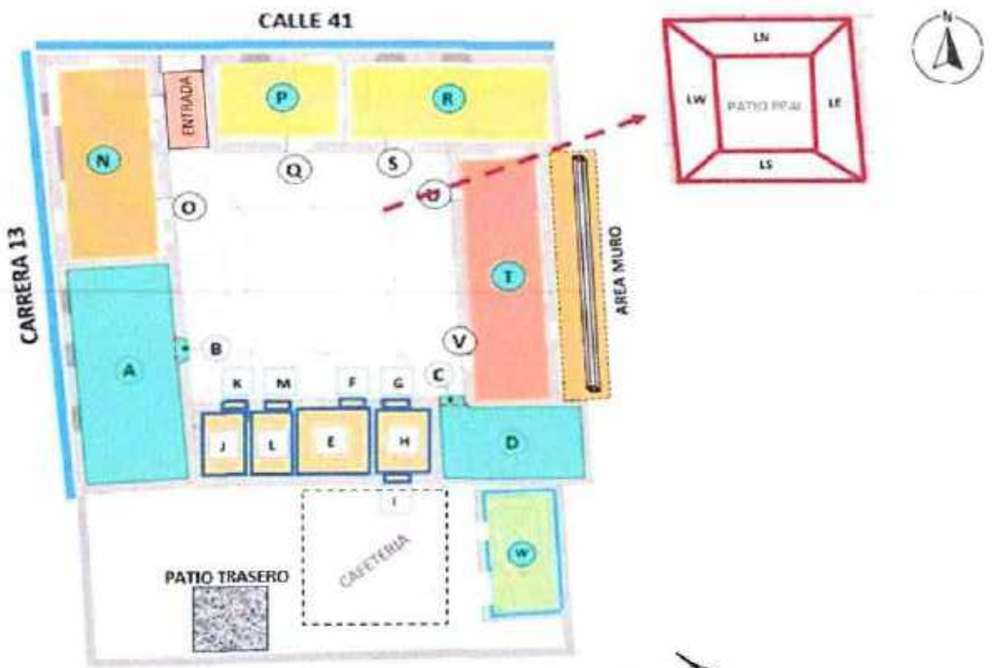

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
AREA A	13,75	5,40		74,23			1	74,23
AREA B	1,43	0,65		0,93			1	0,93
AREA C	1,46	0,58		0,85			1	0,85
AREA D	7,45	4,56		34,00			1	34,00
AREA E	4,59	4,16		19,07			1	19,07
AREA F	0,70	1,32		0,92			1	0,92
AREA G	0,70	1,60		1,12			1	1,12
AREA H	3,90	3,22		12,54			1	12,54
AREA I	0,78	1,37		1,07			1	1,07
AREA J	4,25	2,66		11,31			1	11,31
AREA K	1,37	0,78		1,07			1	1,07
AREA L	4,24	2,5		10,60			1	10,60
AREA M	1,1	0,6		0,66			1	0,66
AREA N	11,85	5,30		62,81			1	62,81
AREA O	1,31	0,65		0,85			1	0,85
AREA P	6,80	5,20		35,36			1	35,36
AREA Q	1,28	0,66		0,84			1	0,84
AREA R	10,94	5,13		55,61			1	55,61
AREA S	1,48	0,63		0,93			1	0,93
AREA T	15,84	4,07		64,47			1	64,47
AREA U	1,22	44,00		53,68			1	53,68
AREA V	1,22	44,00		53,68			1	53,68
AREA W	8,25	7,85		64,76			1	64,76
PASILLO MURO	16,30	1,07		17,44			1	17,44
PISO PARQ	16,30	0,52		8,48			1	8,48
PATIO TRASER	5,92	5,22		30,90			1	30,90
AREA CAFETERIA	7,85	7,58		59,50			1	59,50
ENTRADA	6,13	2,40		14,71			1	14,71
AREA LN	10,3	3,50		36,05			1	36,05
AREA LW	12,736	3,50		44,57			1	44,57
AREA LE	12,26	3,50		42,91			1	42,91
AREA LS	11,44	3,50		40,04			1	40,04
TOTAL PRESENTE INFORME								855,96
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								855,96


Elaboró:	Revisó:	Autorizo:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
14,1	Mantenimiento Unidades Multi Split	14,1,1	Revision y mantenimiento de equipo mini split (Condensadora+evaporadora)	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

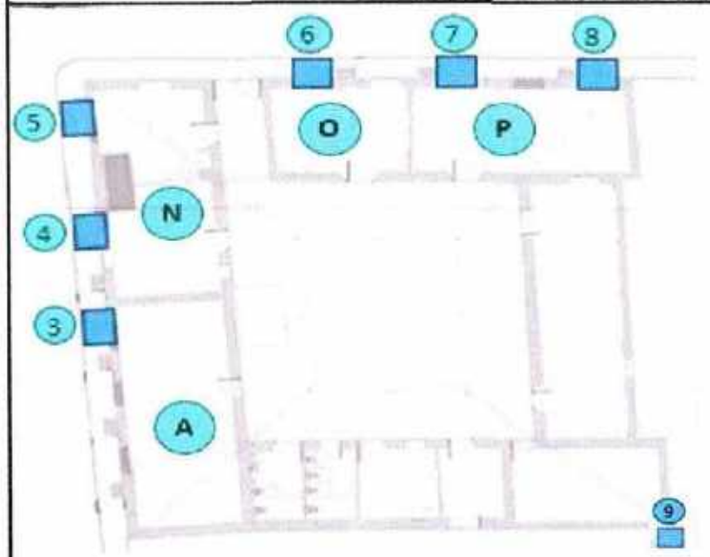



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.		
AREA A								
EQUIPO 3						1,00	1	1,00
AREA N								
EQUIPO 4						1,00	1	1,00
EQUIPO 5						1,00	1	1,00
AREA O								
EQUIPO 6						1,00	1	1,00
AREA P								
EQUIPO 7						1,00	1	1,00
EQUIPO 8						1,00	1	1,00
AREA E								
EQUIPO 9						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								7,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								7,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR Vobo.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
14,2	Tuberia del sistema Mini Split	14,2,1	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 1/2" incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

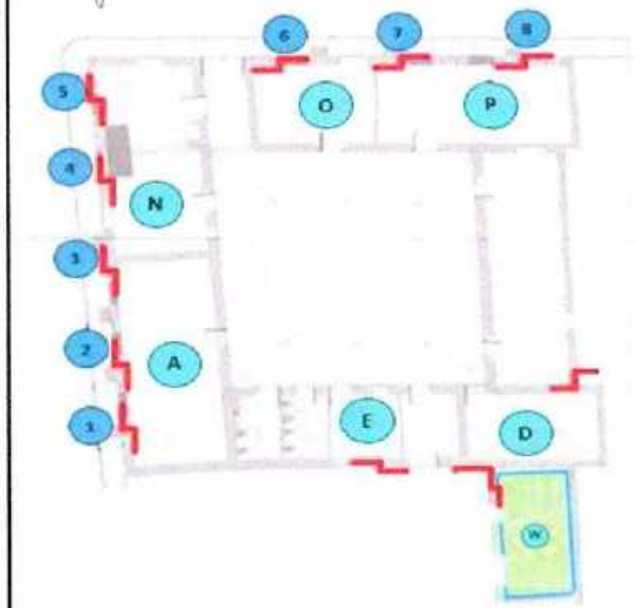

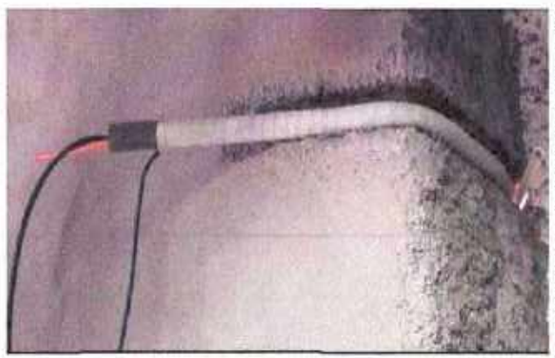

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A								
EQUIPO 1	5,20						1,00	5,20
EQUIPO 2	5,20						1,00	5,20
EQUIPO 3	5,20						1,00	5,20
AREA N								
EQUIPO 4	5,20						1,00	5,20
EQUIPO 5	5,20						1,00	5,20
AREA O								
EQUIPO 6	5,20						1,00	5,20
AREA P								
EQUIPO 7	5,20						1,00	5,20
EQUIPO 8	5,20						1,00	5,20
AREA E								
EQUIPO 9	4,50						1,00	4,50
AREA D								
EQUIPO 10	3,80						1,00	3,80
AREA W								
EQUIPO 11	2,50						1,00	2,50
TOTAL PRESENTE INFORME								52,40
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								52,40


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
14,2	Tuberia del sistema Mini Split	14,2,2	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 3/8" incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

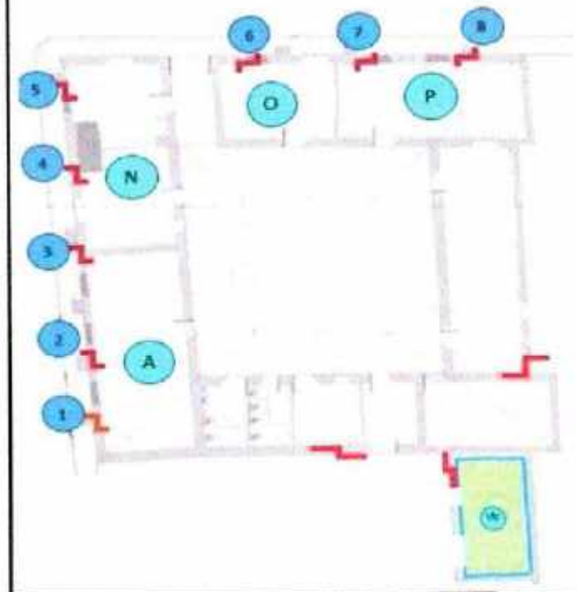

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A								
EQUIPO 1	0,63						1	0,63
EQUIPO 2	0,63						1	0,63
EQUIPO 3	0,63						1	0,63
AREA N								
EQUIPO 4	0,63						1	0,63
EQUIPO 5	0,63						1	0,63
AREA O								
EQUIPO 6	0,63						1	0,63
AREA P								
EQUIPO 7	0,63						1	0,63
EQUIPO 8	0,63						1	0,63
AREA E								
EQUIPO 9	0,63						1	0,63
AREA D								
EQUIPO 10	0,63						1	0,63
AREA W								
EQUIPO 11	0,63						1	0,63
TOTAL PRESENTE INFORME								6,88
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								6,88

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR


Vobo.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	**CONTRATISTA:**	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**REPRESENTANTE LEGAL:**	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		**SUPERVISOR:**	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	**PERIODO PRESENTE INFORME:**	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
14,2	Tuberia del sistema Mini Split	14,2,3	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 1/4' (3/8 R) incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

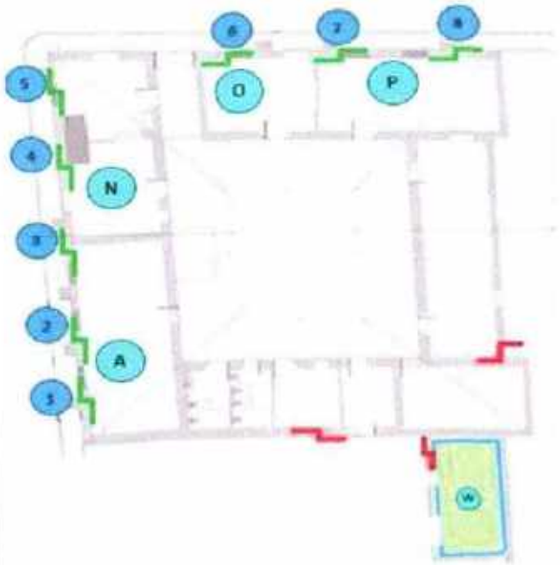

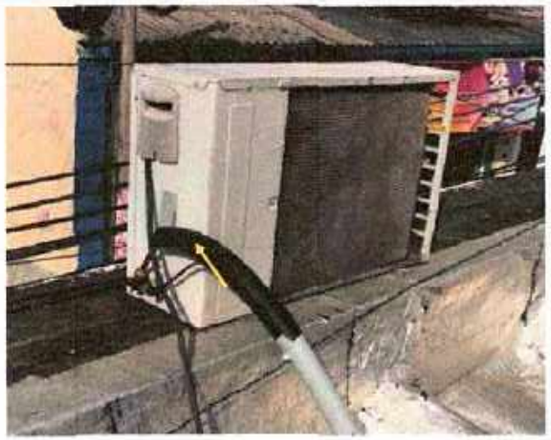

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A								
EQUIPO 1	5,00						1	5,00
EQUIPO 2	5,00						1	5,00
EQUIPO 3	5,00						1	5,00
AREA N							1	
EQUIPO 4	5,00						1	5,00
EQUIPO 5	5,00						1	5,00
AREA O								
EQUIPO 6	5,00						1	5,00
AREA P								
EQUIPO 7	5,00						1	5,00
EQUIPO 8	5,00						1	5,00
AREA E								
EQUIPO 9	4,50						1	4,50
AREA D								
EQUIPO 10	3,80						1	3,80
AREA W								
EQUIPO 11	2,50						1	2,50
TOTAL PRESENTE INFORME								50,80
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								50,80

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	**DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA**	**SUPERVISOR**


V.B.O.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15	Suministro de dispositivos correctivos	15.1.1	Suministro e instalación de Patch cord CAT 6A 7ft, azul.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

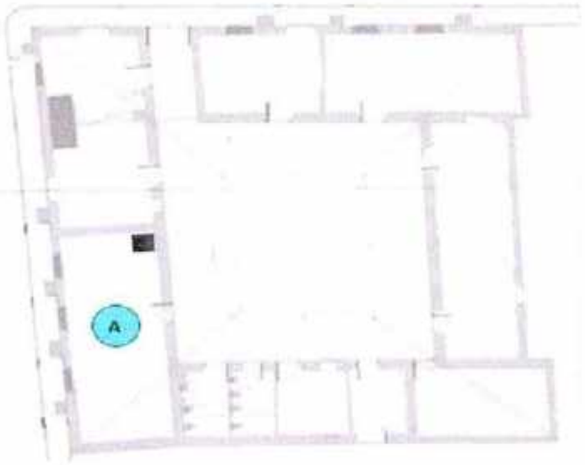

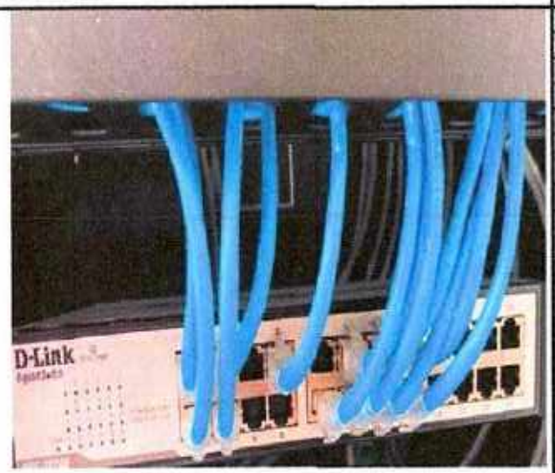

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
Patch cord 1						1,00	1	1,00
Patch cord 2						1,00	1	1,00
Patch cord 3						1,00	1	1,00
Patch cord 4						1,00	1	1,00
Patch cord 5						1,00	1	1,00
Patch cord 6						1,00	1	1,00
Patch cord 7						1,00	1	1,00
Patch cord 8						1,00	1	1,00
Patch cord 9						1,00	1	1,00
Patch cord 10						1,00	1	1,00
Patch cord 11						1,00	1	1,00
Patch cord 12						1,00	1	1,00
Patch cord 13						1,00	1	1,00
Patch cord 14						1,00	1	1,00
Patch cord 15						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								15,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								15,00

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR


VoBo.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15.2	SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN	15.2.1	Suministro e instalación de cable UTP cat 6A color azul	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

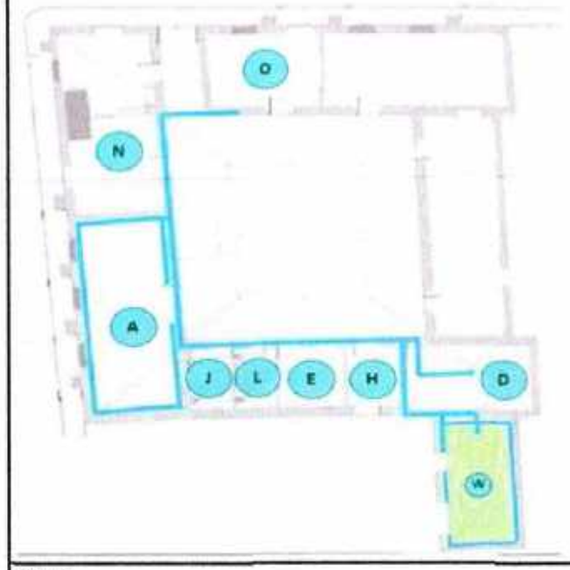

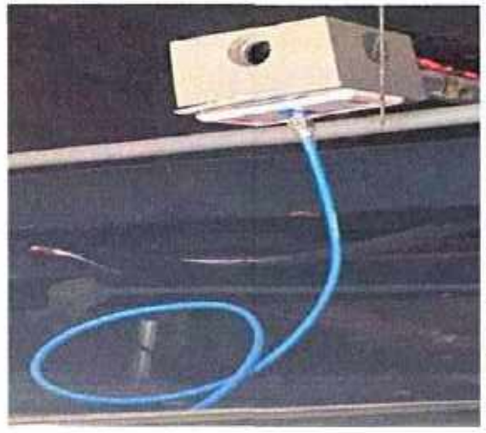

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
Oficinas, psicologia, pasillo, informatica								
AREA O - AREA A	65,80						1	65,80
PUNTOS AREA A	40,28						5	201,40
AREA A - AREA D	106,40						2	212,80
AREA H - AREA W	12,00						2	24,00
TOTAL PRESENTE INFORME								504,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								504,00

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR


VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,2	SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN	15.2.2	Suministro e instalacion de Face Plate sencillo cat 6A	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

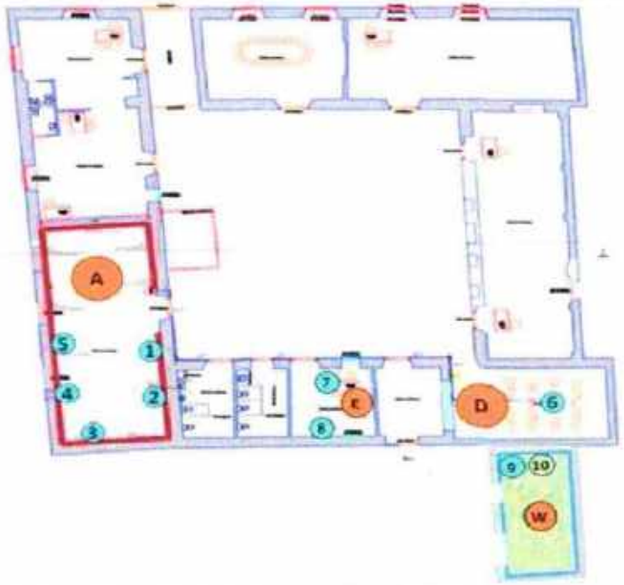

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
Face Plate sencillo 1						1,00	1	1,00
Face Plate sencillo 2						1,00	1	1,00
Face Plate sencillo 3						1,00	1	1,00
Face Plate sencillo 4						1,00	1	1,00
Face Plate sencillo 5						1,00	1	1,00
AREA D (INFORMATICA)								
Face Plate sencillo 6						1,00	1	1,00
AREA E (PSICOLOGIA)								
Face Plate sencillo 7						1,00	1	1,00
Face Plate sencillo 8						1,00	1	1,00
AREA W (LUDOTECA)								
Face Plate sencillo 9						1,00	1	1,00
Face Plate sencillo 10						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								10,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								10,00

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR

Vobo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 202 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,2	SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN	15,2,3	Suministro e instalacion de Face Plate dobles cat 6A	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
Face Plate doble 1						1,00	1	1,00
Face Plate doble 2						1,00	1	1,00
Face Plate doble 3						1,00	1	1,00
Face Plate doble 4						1,00	1	1,00
AREA D (INFORMATICA)								
Face Plate doble 5						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								5,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								5,00

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR


VoBo.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,2	SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN	15,2,4	Suministro e instalación de Amarre de Velcro. Pk 10 para moños de 12 cables	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

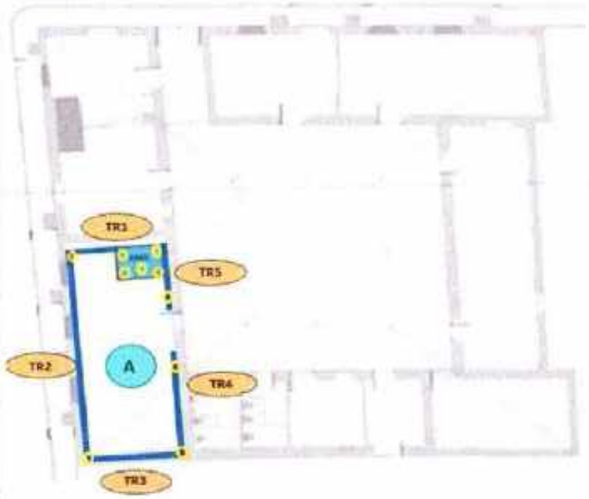

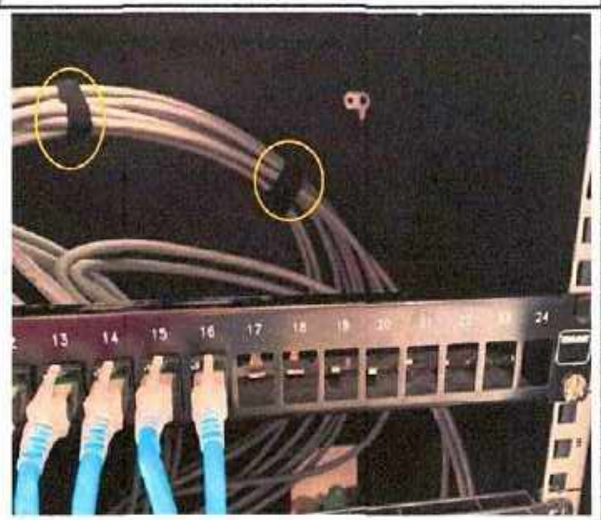

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
Amarre de Velcro Rack						1,00	5	5,00
Amarre de Velcro canaleta								
TRAMO 1						1,00	1	1,00
TRAMO 2						1,00	1	1,00
TRAMO 3						1,00	1	1,00
TRAMO 4						1,00	1	1,00
TRAMO 5						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								10,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								10,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,2	SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN	15,2,5	Suministro e instalación de Jack módulo para hesraje color azul de 24 puertos	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

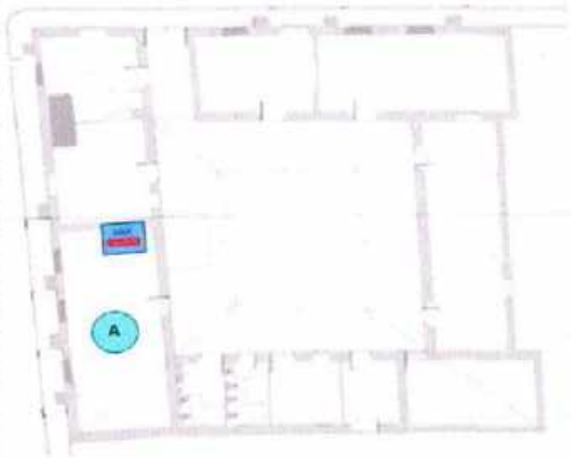

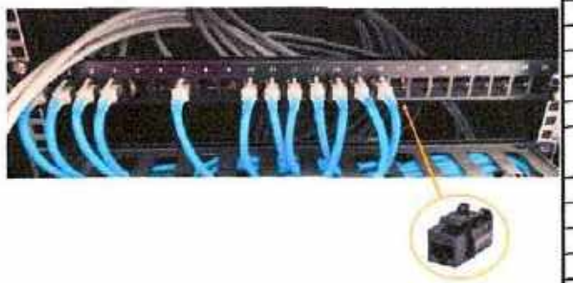

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.		
AREA A OFICINAS								
RACK OFICINAS						1,00	12	12,00
TOTAL PRESENTE INFORME								12,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								12,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR V°B°

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,2	SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN	15,2,6	Suministro e instalación de Patch cord 10G, 5ft, azul.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

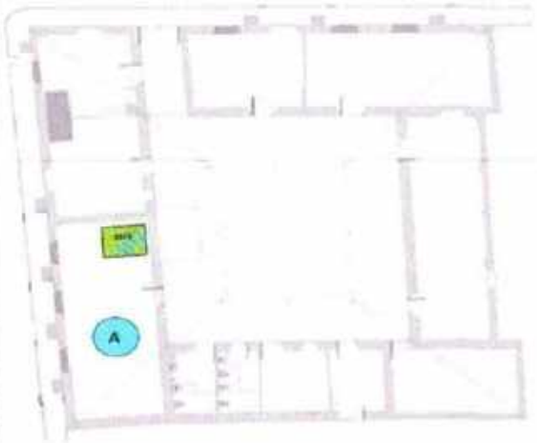





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
Rack Area de Oficinas						1,00	16	16,00
TOTAL PRESENTE INFORME								16,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								16,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR Vobo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,2	SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN	15,2,7	Suministro e instalacion de Rack de 9U de pared	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

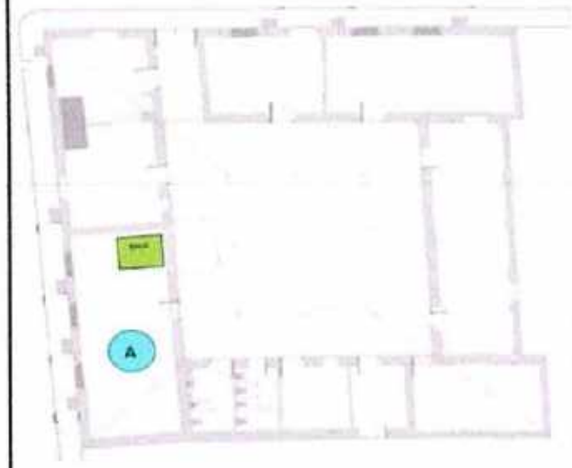



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								1,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								1,00

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15.2	SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN	15,2,8	Suministro e instalacion de patch pannel 24 puertos	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



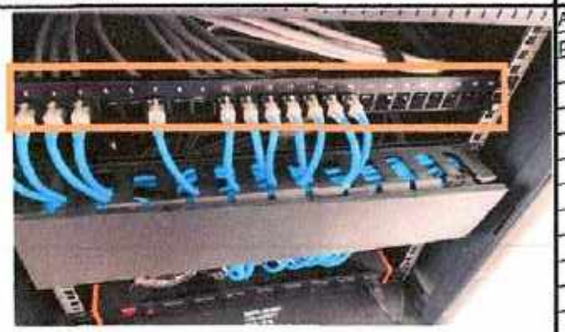

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
patch pannel						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								1,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								1,00

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR

VoBo.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 282 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,2	SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN	15,2,9	Suministro e instalacion de organizador horizontal 1 con tapa de alta capacidad	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



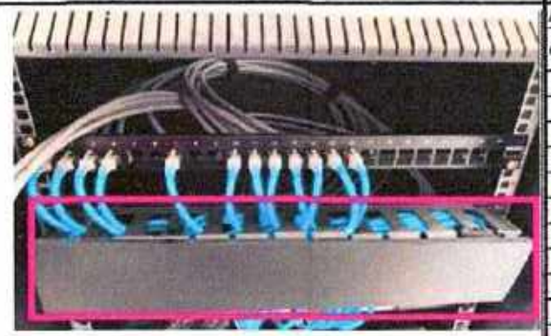

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
organizador horizontal						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								1,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								1,00

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,2	SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN	15,2.10	Suministro e instalación de Multitoma Horizontal con 8 toma corrientes NEMA 5-15P, Especializada para equipos de comunicaciones	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



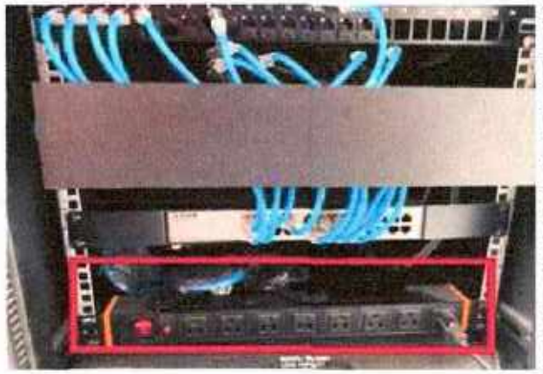

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
Multitoma Horizontal						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								1,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								1,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,4	UPS	15,4,1	Suministro e instalación UPS on-line 3000 VA/2700W, FP 0,8 120 V, onda sano pura. Clavija entrada l5-30p, autonomia 5/14 minutos	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

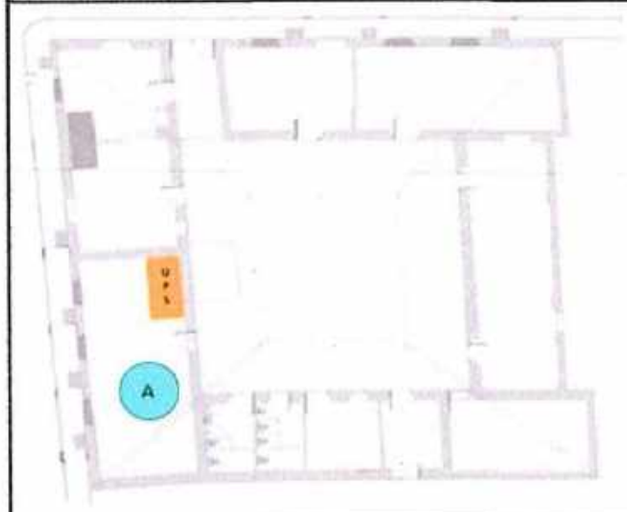





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
AREA A (OFICINAS)						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								1,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								1,00

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,5	SWITCHES	15,5,1	SWITCH DE ACCESO 24 RJ45 PUERTOS PoE	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
SWITCH 24 RJ45						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								1,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								1,00

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 252 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,6	DATOS, WIFI Y CCTV	15,6,1	Suministro e instalacion de canaleta con tabique de separacion	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
TRAMO 1	4,48						1	4,48
TRAMO 2	5,40						1	5,40
TRAMO 3	13,75						1	13,75
TRAMO 4	5,40						1	5,40
TRAMO 5	6,97						1	6,97
TOTAL PRESENTE INFORME								36,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								36,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR Vo.Bo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
15,6	DATOS, WIFI Y CCTV	15,6,3	Suministro e instalacion de cajas Radwell 5800	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

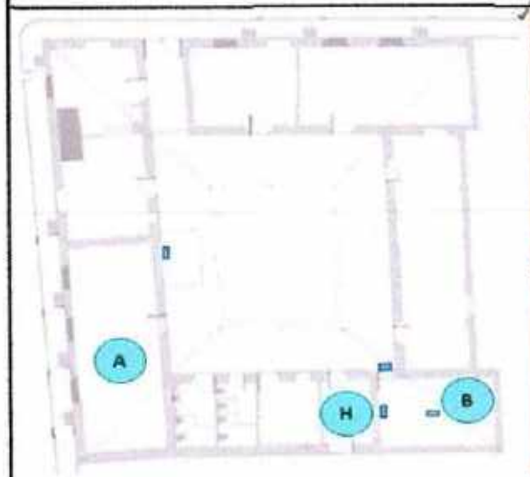





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.		
pasillo, informatica, oficinas								
AREA A (OFICINAS)						1,00	1	1,00
PASILLO AREA B						1,00	1	1,00
AREA B (INFORMATICA)						1,00	2	2,00
TOTAL PRESENTE INFORME								4,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								4,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 282 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16.1	DATOS, WIFI Y CCTV	16,1,1	Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

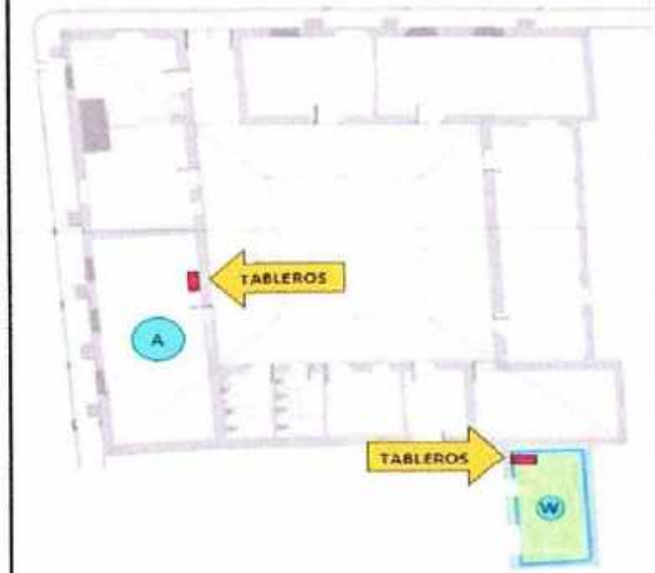



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
Caja tableros AREA A						1,00	1	1,00
AREA W (LUDOTECA)								
Caja tableros AREA W						1,00	1	1,00

TOTAL PRESENTE INFORME	2,00
TOTAL INFORME ANTERIOR	0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO	2,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 252 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,1	DATOS, WIFI Y CCTV	16,1,3	Instalación y conexión de equipos de Aire Acondicionado, incluye accesorios de instalación.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

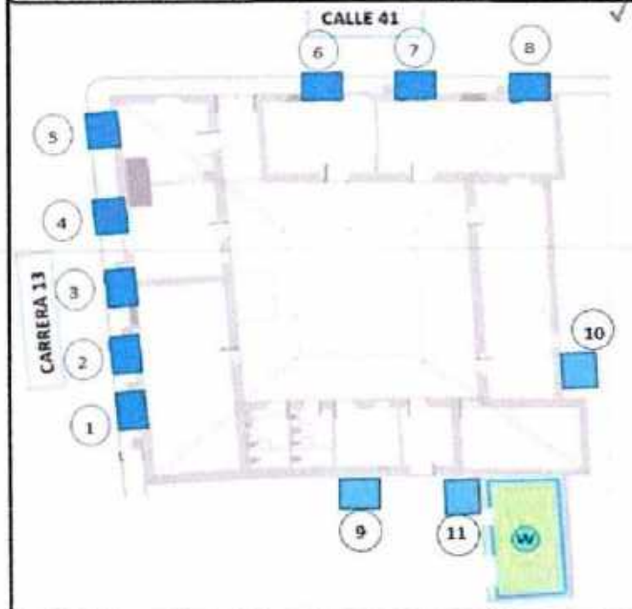



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
CARRERA 13								
EQUIPO 1						1	1	1,00
EQUIPO 2						1	1	1,00
EQUIPO 3						1	1	1,00
EQUIPO 4						1	1	1,00
EQUIPO 5						1	1	1,00
CALLE 41								
EQUIPO 6						1	1	1,00
EQUIPO 7						1	1	1,00
EQUIPO 8						1	1	1,00
AREA E(PSICOLOGIA)								
EQUIPO 9						1	1	1,00
AREA D(INFORMATICA)								
EQUIPO 10						1	1	1,00
AREA W(LUDOTECA)								
EQUIPO 11						1	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								11,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								11,00

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR


VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,2	CANALIZACIÓN DE BAJA TENSION	16,2,1	Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1", y demas accesorios de instalación y marcación.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

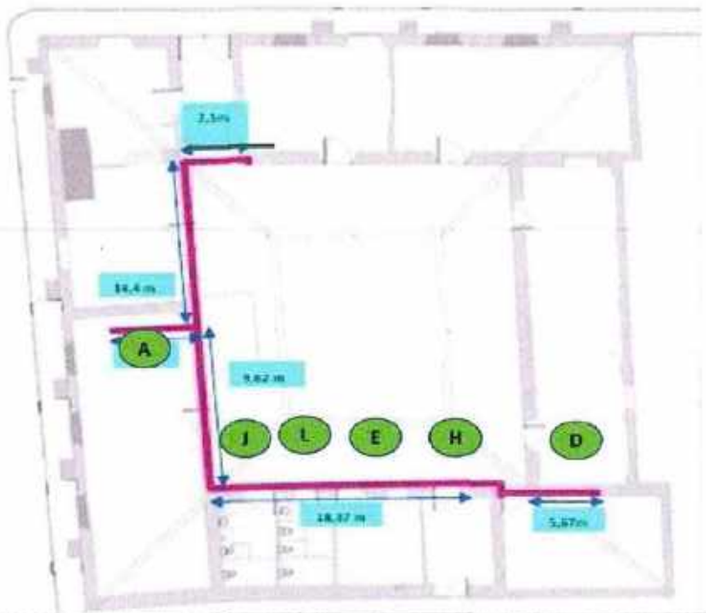

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
Oficinas, baños, psicologia, pasillo, informatica								
ENTRADA	2,50						1	2,50
ENTRADA A OFICINA	14,40						1	14,40
OFICINA A TABLEROS	4,80						1	4,80
OFICINA A WC	9,62						1	9,62
WC A INFORMATICA	18,37						1	18,37
INFORMATICA A TABLEROS	5,67						1	5,67
TOTAL PRESENTE INFORME								55,36
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								55,36

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR
VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,2	CANALIZACION DE BAJA TENSION	16,2,2	Regata y resane de traslado para puntos electricos y de comunicaciones.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.		
Oficinas, psicologia, pasillo, informatica								
AREA A (OFICINAS)	39,51						1	39,51
AREA D (INFORMATICA)	25,25						1	25,25
AREA E (PSICOLOGIA)	18,71						1	18,71
AREA H (PASILLO)	15,45						1	15,45
AREA W LUDOTECA	24,64						1	24,64
REGATAS AIRE ACONDICIONADO								
EQUIPO 1	5,20						1	5,20
EQUIPO 2	5,20						1	5,20
EQUIPO 3	5,20						1	5,20
EQUIPO 4	5,20						1	5,20
EQUIPO 5	5,20						1	5,20
EQUIPO 6	5,20						1	5,20
EQUIPO 7	5,20						1	5,20
EQUIPO 8	5,20						1	5,20
EQUIPO 9	4,50						1	4,50
EQUIPO 10	3,80						1	3,80
EQUIPO 11	2,50						1	2,50
TOTAL PRESENTE INFORME								175,96
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								175,96

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR

VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,3	REDES	16,3,1	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 3x8 + 1x8N + 1x8T LSHF (Libre de halogenos). Incluye accesorios de instalación y señalización.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.		
Oficinas, psicologia, pasillo, informatica								
AREA A (OFICINAS)	36,28						1	36,28
AREA D (INFORMATICA)	22,02						1	22,02
AREA E (PSICOLOGIA)	15,48						1	15,48
AREA H (PASILLO)	12,22						1	12,22
AREA W LUDOTECA	41,40						1	41,40
TOTAL PRESENTE INFORME								127,40
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								127,40

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 282 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,3	REDES	16,3,2	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Oficinas, psicologia, pasillo, informatica								
AREA A (OFICINAS)	39,51						1	39,51
AREA D (INFORMATICA)	25,25						1	25,25
AREA E (PSICOLOGIA)	18,71						1	18,71
AREA H (PASILLO)	15,45						1	15,45
AREA W LUDOTECA	41,40						1	41,40
TOTAL PRESENTE INFORME								140,32
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								140,32

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR


V°B°

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 282 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,4	ESTRUCTURAS	16,4,1	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

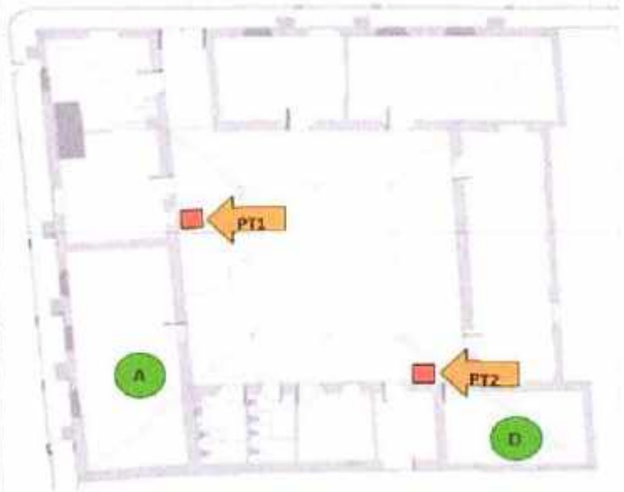



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.		
AREA A PUESTA TIERRA 1						1,00	1	1,00
AREA D PUESTA TIERRA 2						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								2,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								2,00

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR


VoBo.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16.4	ESTRUCTURAS	16.4.2	Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de inspección para electrodo de puesta a tierra.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

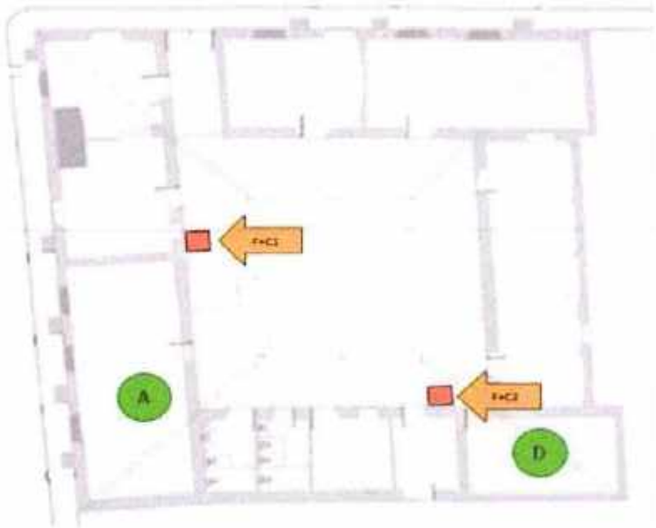

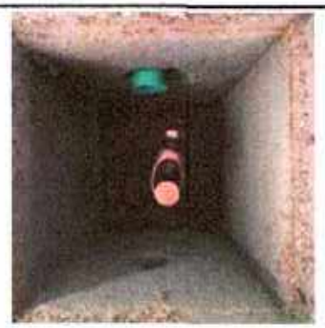

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
AREA A FOSO+CAJA1						1,00	1	1,00
AREA D FOSO+CAJA 2						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								2,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								2,00

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 252 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,5	EQUIPOS	16,5,1	Suministro, transporte e instalación de UPS 3 kVA Monofasica incluye ByPass, acomadita y demas accesorios de instalación y marcación.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

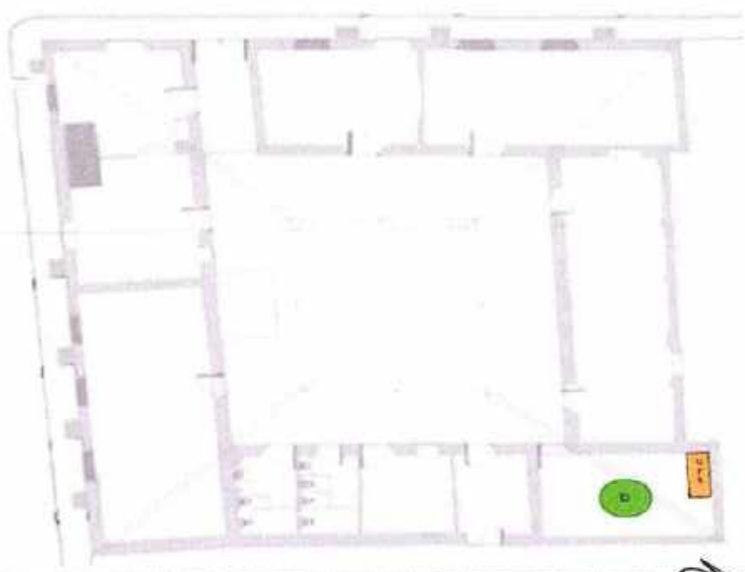




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.		
UPS AREA D						1,00	1	1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,5	EQUIPOS	16,5,2	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T36-3F empotrable Mini Pragma de 36 Módulos - 63 A - REF MIP20312T demás accesorios de instalación y señalización.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

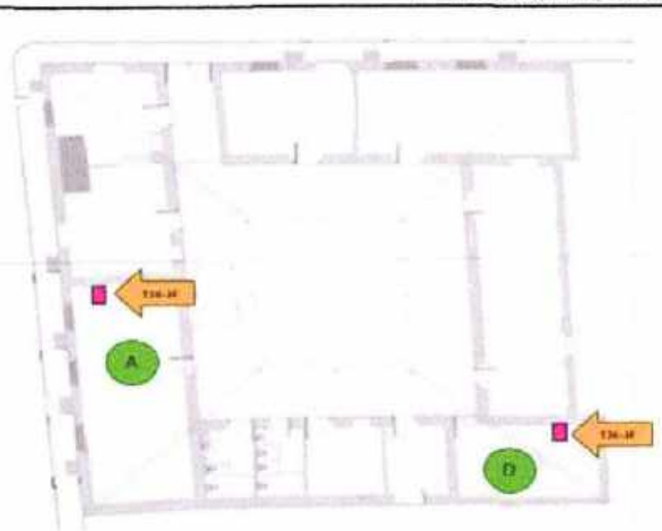





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
TABLERO T36-3FAREA A						1,00	1	1,00
TABLERO T36-3FAREA B						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								2,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								2,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16.5	EQUIPOS	16.5.3	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T24-3F empotrable MINI PRAGMA de 24 Módulos - demás accesorios de instalación y señalización.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

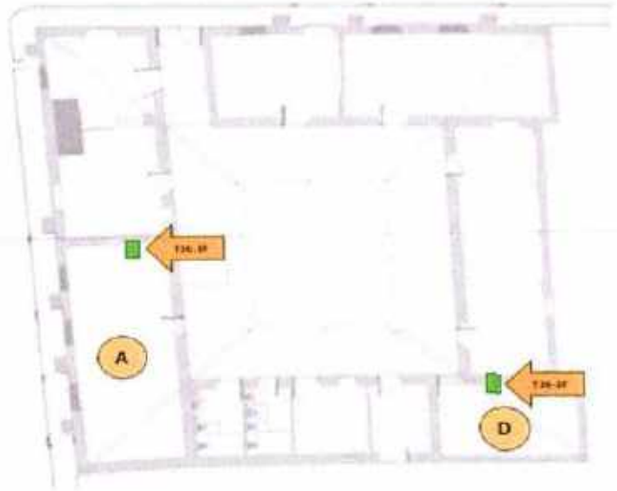

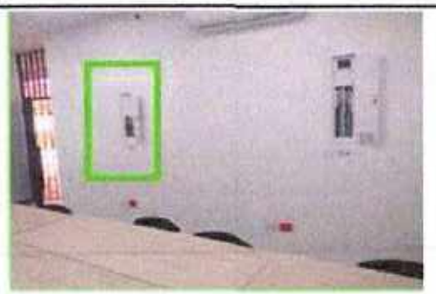




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
TABLERO T24-3F AREA A						1,00	1	1,00
TABLERO T24-3FAREA B						1,00	1	1,00


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,5	EQUIPOS	16,5,4	Suministro, transporte e instalación de Automático enchulable 1x15 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

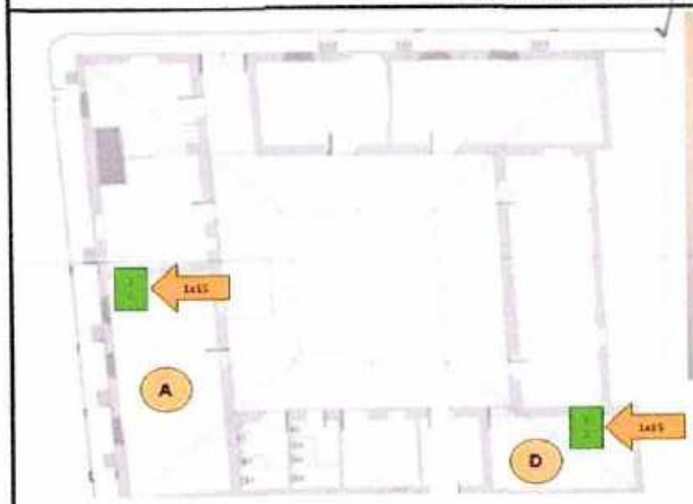

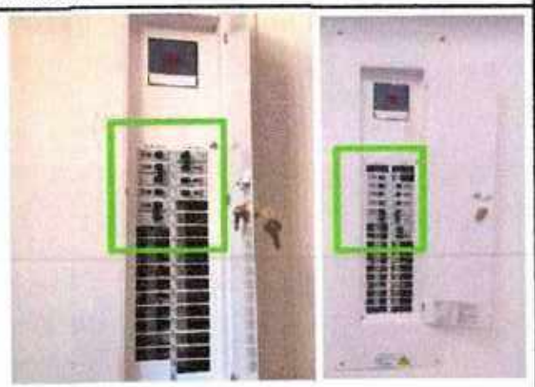

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AUTOMATICOS1X15 AREA A						1,00	10	10,00
AUTOMATICOS1X15 AREA B						1,00	13	13,00
TOTAL PRESENTE INFORME								23,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								23,00

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR


VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 09 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16.5	EQUIPOS	16.5.5	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

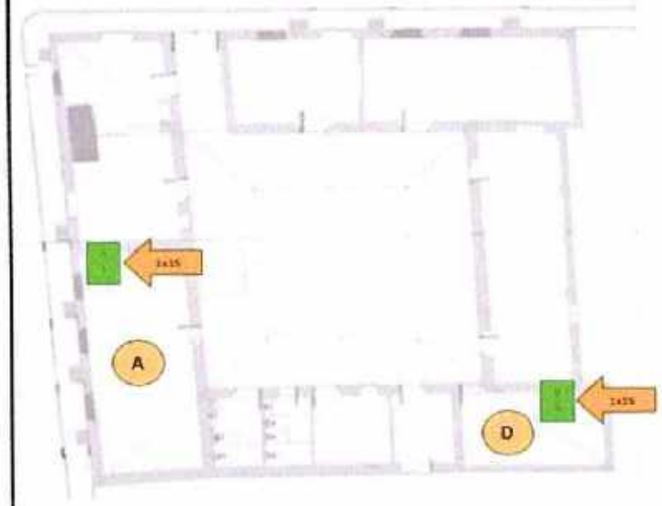





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AUTOMATICOS1X20 AREA A						1,00	3	3,00
AUTOMATICOS1X20 AREA B						1,00	5	5,00
TOTAL PRESENTE INFORME								8,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								8,00


Elaboró: RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	Revisó: DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	Autorizó: SUPERVISOR VoBo.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	**CONTRATISTA:**	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**REPRESENTANTE LEGAL:**	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		**SUPERVISOR:**	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	**PERIODO PRESENTE INFORME:**	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,5	EQUIPOS	16,5,6	Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x70A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, incluye marcación RETIE.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

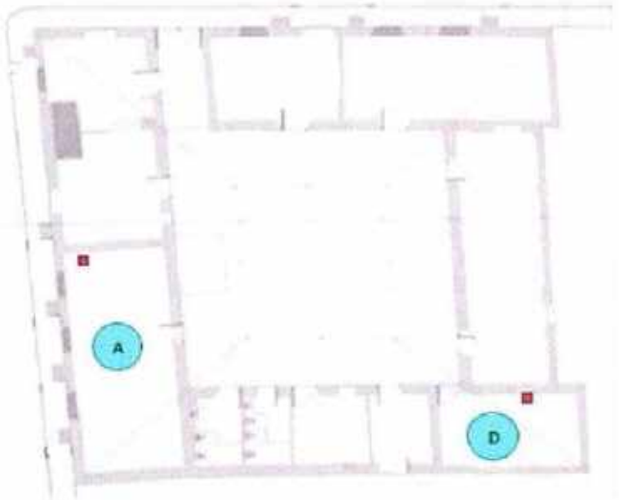

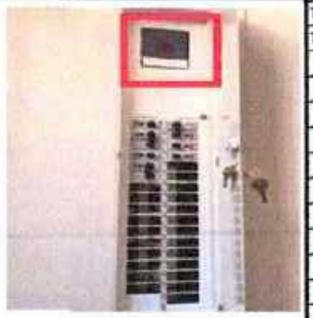




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.		
TOTALIZADOR AREA A						1,00	1,00	1,00
TOTALIZADOR AREA D						1,00	1,00	1,00


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,6	INTERIOR	16,6,3	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

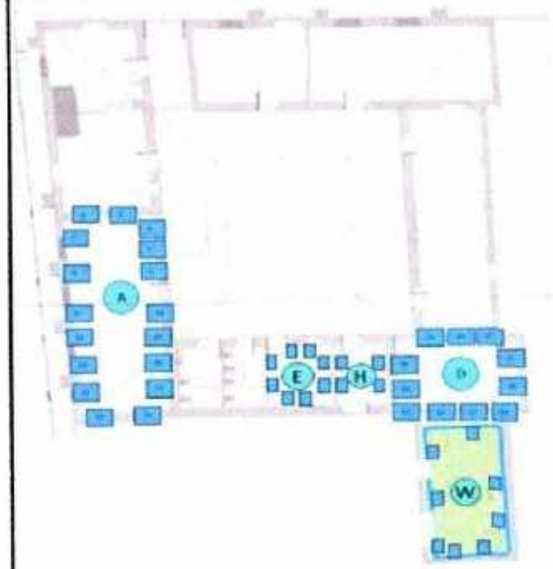

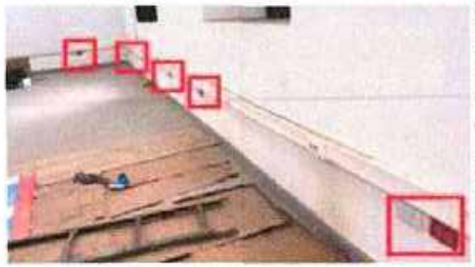

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
AREA A (OFICINAS)								
TOMAS						1,00	18,00	18,00
AREA D (INFORMATICA)								
TOMAS						1,00	11,00	11,00
AREA E(PSICOLOGIA)								
TOMAS						1,00	8,00	8,00
AREA H(PASILLO)								
TOMAS						1,00	4,00	4,00
AREA W(LUDOTECA)								
TOMAS						1,00	9,00	9,00


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 09 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,6	INTERIOR	16,6,4	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular, conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)								
TOMAS						1,00	18,00	18,00
AREA D (INFORMATICA)								
TOMAS						1,00	11,00	11,00
AREA E (PSICOLOGIA)								
TOMAS						1,00	8,00	8,00
AREA H (PASILLO)								
TOMAS						1,00	4,00	4,00
TOTAL PRESENTE INFORME								41,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								41,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 202 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
16,6	INTERIOR	16,6,6	Suministro, transporte e instalación de PANEL LED SLIM 40W 60X60cm - 100.000 horas - dimerizable o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

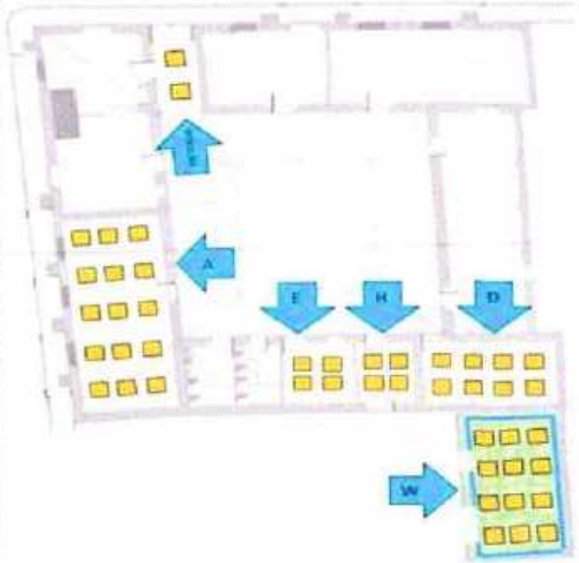

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA A (OFICINAS)						1,00	15	15,00
AREA D (INFORMATICA)						1,00	8	8,00
AREA E (PSICOLOGIA)						1,00	4	4,00
AREA H (PASILLO)						1,00	4	4,00
AREA W (LUDOTECA)						1,00	12	12,00
ENTRADA						1,00	2	2,00
TOTAL PRESENTE INFORME								45,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								45,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 282 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP. 01	Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelana tipo porcelanato institucional antideslizante, ancho 8cm.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

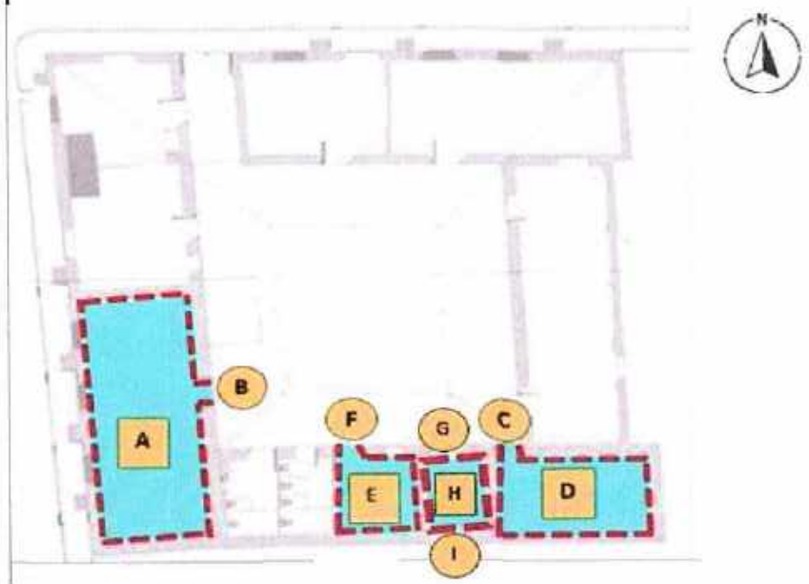

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Espesor	Área	Volumen	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
GUARDAESCOBA								
AREA A LONGITUD	13,75						2	27,49
AREA A ANCHO	5,40						2	10,80
AREA B		0,65					2	1,30
AREA C		0,58					2	1,16
AREA D LONGITUD	7,45						2	14,90
AREA D ANCHO	4,56						2	9,13
AREA E LONGITUD	4,59						2	9,18
AREA E ANCHO	4,16						2	8,31
AREA F		0,70					2	1,40
AREA G		0,70					0	0,00
AREA H LONGITUD	3,90						0	0,00
AREA H ANCHO	3,22						0	0,00
AREA I		0,68					0	0,00
MENOS LONG PUERTAS								
PUERTA B	-1,26						1	-1,26
PUERTA C	-1,24						1	-1,24
PUERTA F	-1,20						1	-1,20
PUERTA G	-1,20						0	0,00
PUERTA I	-0,89						0	0,00
TOTAL PRESENTE INFORME								79,97
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								79,97

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.02	Suministro e instalacion de enchape piso en ceramica tipo porcelanato, formato 60cm x 60cm, institucional, antideslizante.	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Espesor	Área	Volumen	Cant.		
Enchape ceramico								
AREA A	13,75	5,40		74,23			1	74,23
AREA B	1,43	0,65		0,93			1	0,93
AREA C	1,46	0,58		0,85			1	0,85
AREA D	7,45	4,56		34,00			1	34,00
AREA E	4,59	4,16		19,07			1	19,07
AREA F	0,70	1,32		0,92			1	0,92
TOTAL PRESENTE INFORME								130,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								130,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.03	Demolicion muro en tapia medianero, espesor 62cm, incluye transporte escombros.	m3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

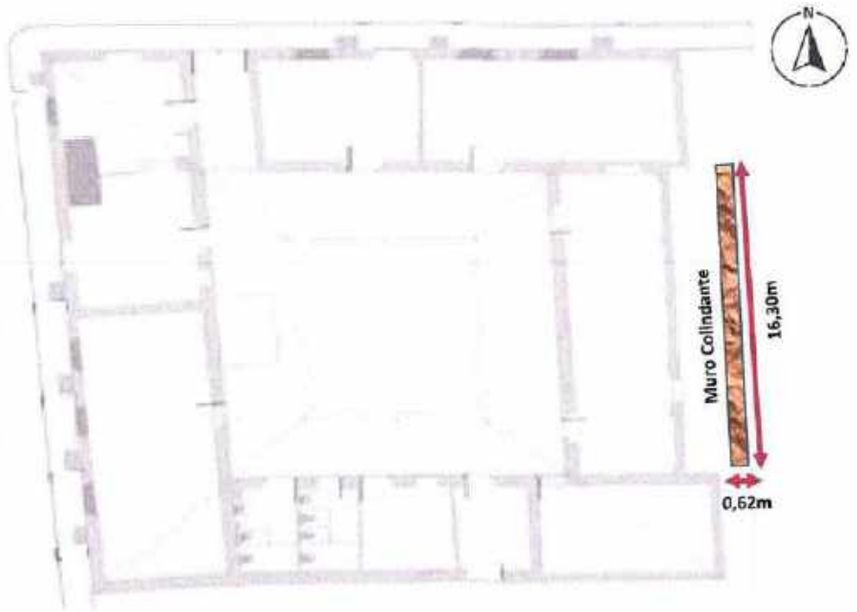



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
Muro Colindante	16,30	0,62	4,50		45,48		1	45,48
TOTAL PRESENTE INFORME								45,48
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								45,48

Elaboró: RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	Revisó: DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	Autorizó: SUPERVISOR VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.04	Cerramiento con madera rolliza y tela polipropileno, altura 2,50m.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMÓRIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
Cerramiento								
LONGITUD 1	2,50						1	2,50
LONGITUD 2	20,00						1	20,00
LONGITUD 3	2,50						1	2,50
TOTAL PRESENTE INFORME								25,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								25,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.05	Excavacion manual en material comun, incluye retiro.	m3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

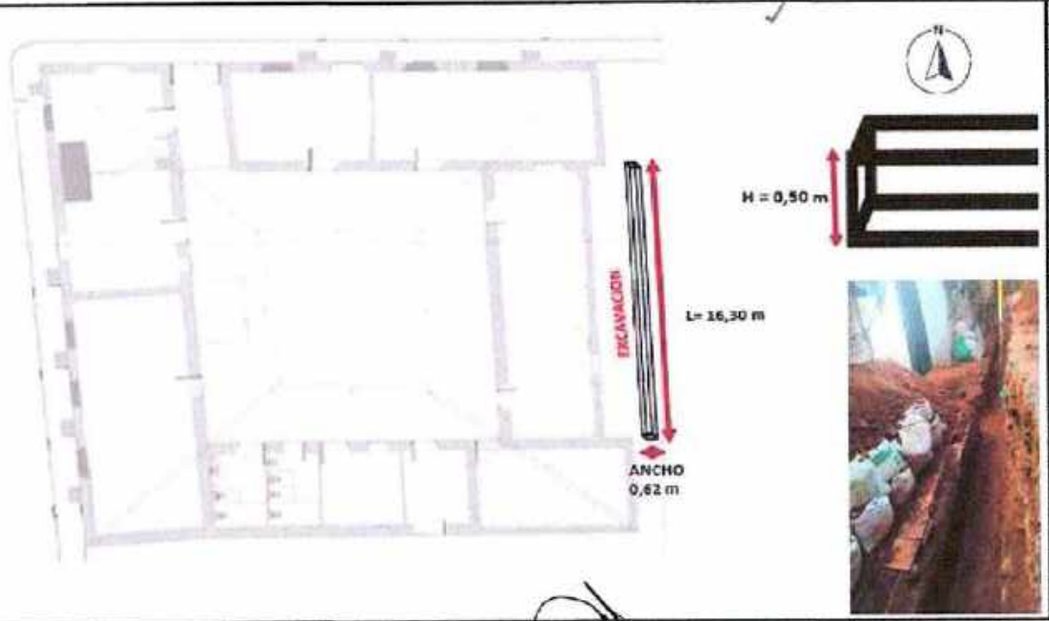

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
Excavacion manual	16,30	0,62	0,50		5,05		1	5,05
TOTAL PRESENTE INFORME								5,05
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								5,05


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.06	Relleno compactado con material seleccionado de prestamo.	m3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

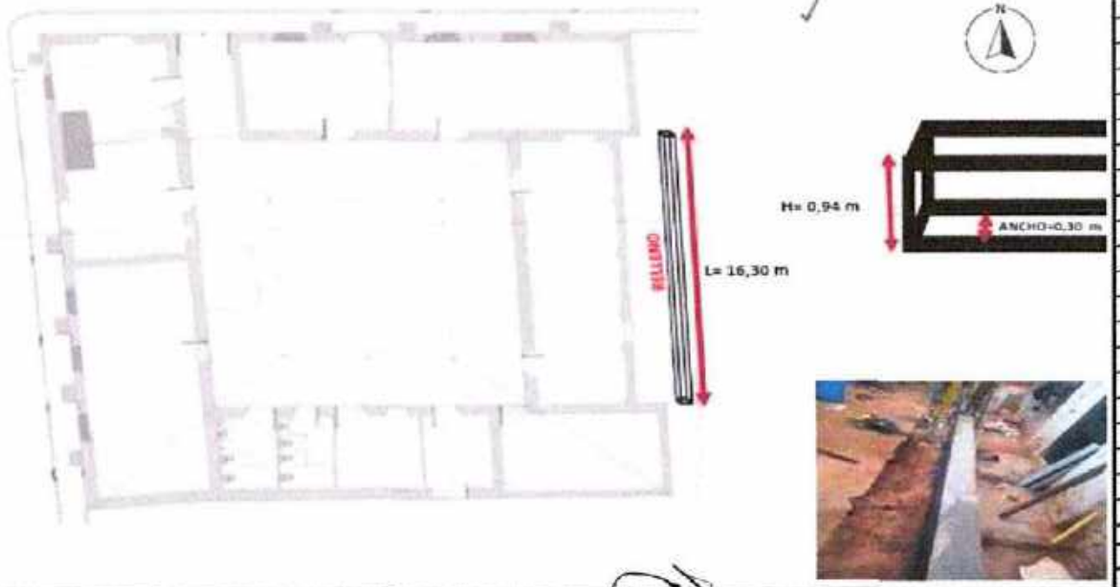

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Volumen	Cant.		
Relleno compactado	16,30	0,45	1,00		7,34		1	7,34
TOTAL PRESENTE INFORME								7,34
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								7,34


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 282 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.07	Concreto Solado 1500 psi, espesor 5cm.	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

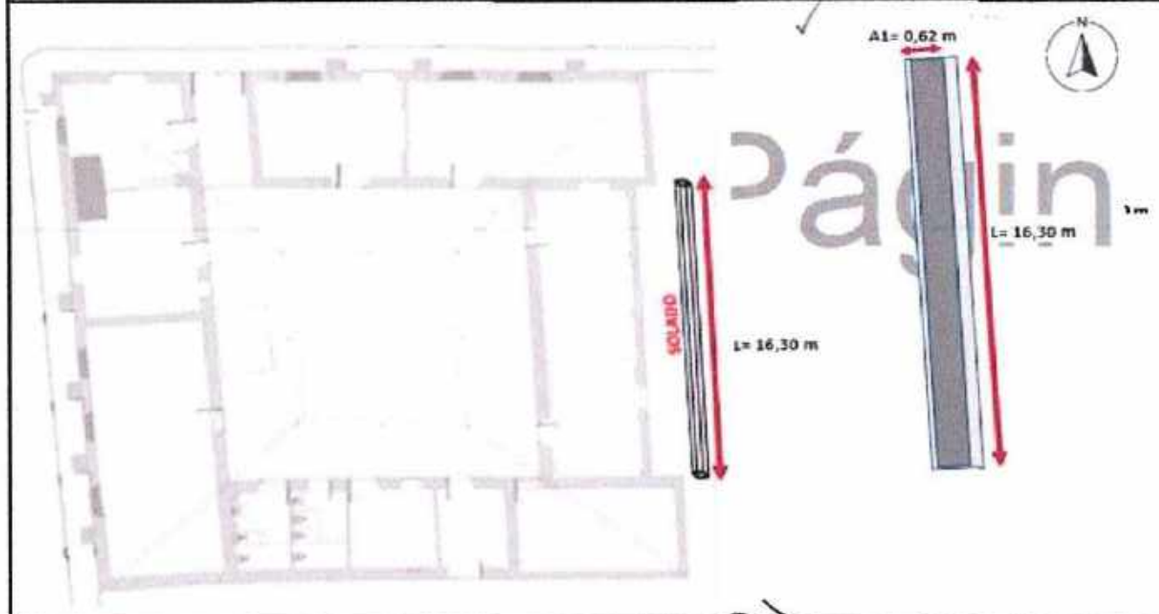

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
Concreto Solado	16,30	0,62		10,11			1	10,11
TOTAL PRESENTE INFORME								10,11
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								10,11


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.08	Concreto 3000 psi para viga de cimentación, sección 30cm x 40cm.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

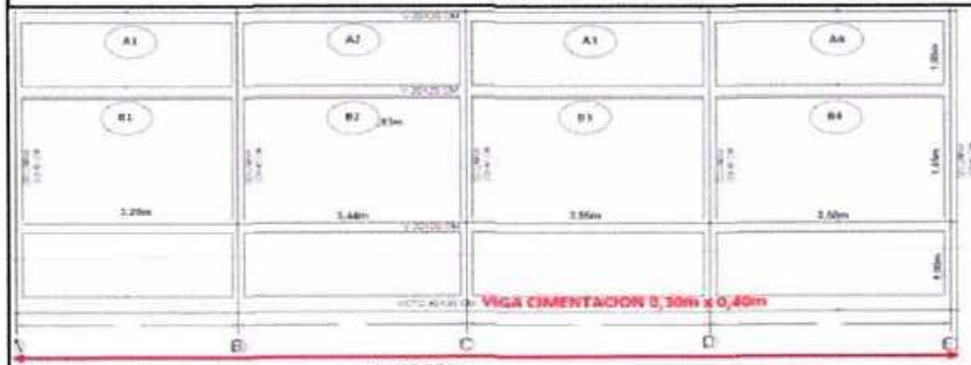





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Viga cimiento muro	16,30						1	16,30
TOTAL PRESENTE INFORME								16,30
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								16,30

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR
VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.09	Concreto 3000 psi para columna sección 20cm x 40cm.	m3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
Columnas 20x40 cm								
Columna 1	0,40	0,20	4,04		0,32		1	0,32
Columna 2	0,40	0,20	4,04		0,32		1	0,32
Columna 3	0,40	0,20	4,04		0,32		1	0,32
Columna 4	0,40	0,20	4,04		0,32		1	0,32
Columna 5	0,40	0,20	4,04		0,32		1	0,32
TOTAL PRESENTE INFORME								1,62
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								1,62


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP10	Concreto 3000 psi viga sección 20cm x 20cm.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

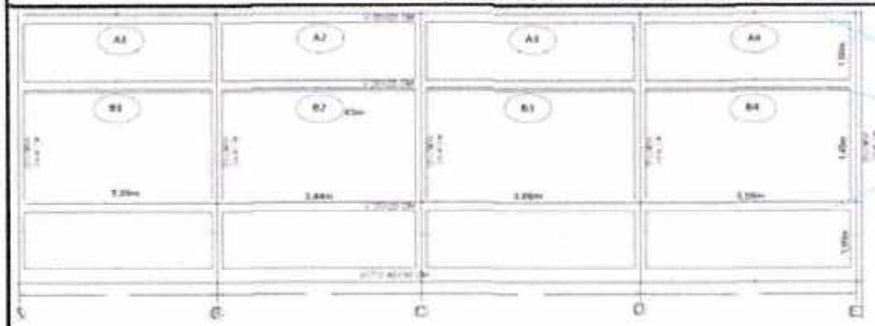




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
Viga 1 20x20	16,30						3	48,90

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA		

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.11	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	kg

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

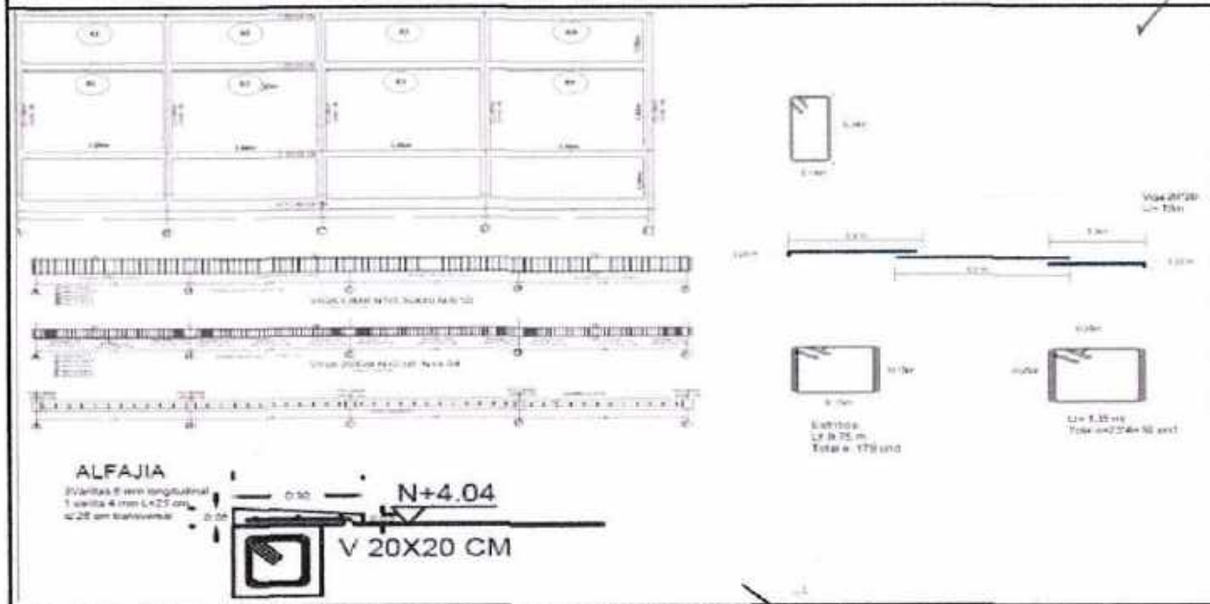

LOCALIZACIÓN	Ø	Long.	# Col/ vigas	Peso Kgxml	Longitud Total	Peso total Kg	NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Columnas	5/8	4,80	5,00	1,56	96,00		4	149,76
Columnas	3/8	1,15	5,00	0,56	373,75		65	209,30
Columnas	1/2	4,80	3,00	1,00	28,80		2	28,80
Vigas 0,3 x 0,4	1/2	18,00	1,00	1,00	72,00		4	72,00
Vigas 0,3 x 0,4	3/8	1,35	1,00	0,56	124,20		92	69,55
Vigas 0,2 x 0,2	1/2	18,00	3,00	1,00	216,00		4	216,00
Vigas 0,2 x 0,2	3/8	0,75	3,00	0,56	402,75		179	225,54
varilla 6mm Alfajia	6mm	6,00	1,00	0,22	18,00		3	3,96
varilla 4mm Alfajia	4mm	1/4	1,00	0,10	16,75		67	1,68
TOTAL PRESENTE INFORME								976,59
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								976,59


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 202 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.12	Mamposteria H-15 ladrillo de arcilla.	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

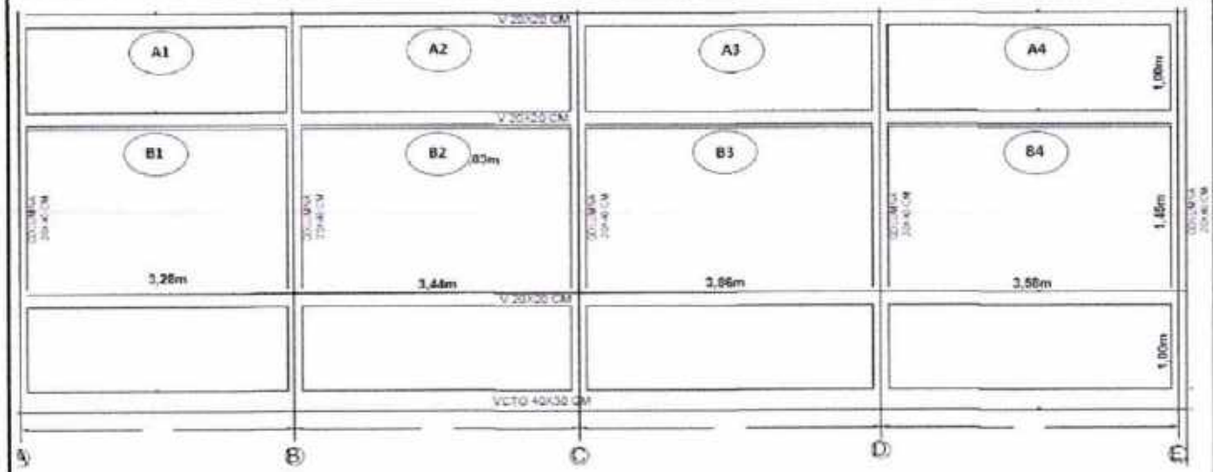

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
AREA A1	3,28		1,00	3,28			1	3,28
AREA A2	3,44		1,00	3,44			1	3,44
AREA A3	3,86		1,00	3,86			1	3,86
AREA A4	3,58		1,00	3,58			1	3,58
AREA B1	3,28		1,45	4,76			1	4,76
AREA B2	3,44		1,45	4,99			1	4,99
AREA B3	3,86		1,45	5,60			1	5,60
AREA B4	3,58		1,45	5,19			1	5,19
TOTAL PRESENTE INFORME								34,69
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								34,69

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	**CONTRATISTA:**	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**REPRESENTANTE LEGAL:**	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		**SUPERVISOR:**	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	**"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	**PERIODO PRESENTE INFORME:**	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.14	Alfajia en concreto de 3000 psi seccion 0,30m x 0,04m.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Alfajia en concreto de 3000 psi seccion 0,30m x 0,04m. L= 16,40m

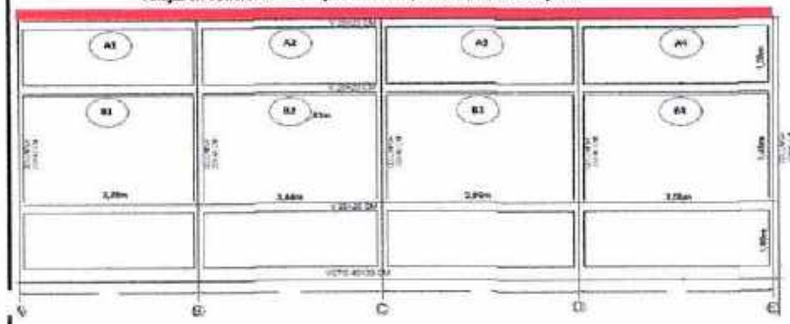




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
Alfajia	16,40						1	16,40

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.15	Suministro e instalación de cajonera empotrada en madera RH, espesor 15mm, abierta, ancho variable 1,50m - 1,80m, altura 1,20 m y prof. 0,35 m, con tapas laterales, superior y trasera, incluye manijas y divisiones.	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

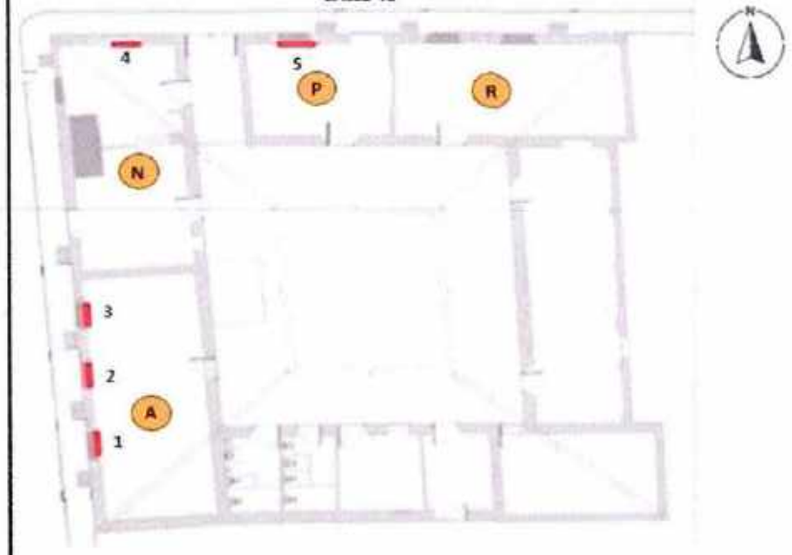

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
Mueble en madera						1,00	5	5,00
TOTAL PRESENTE INFORME								5,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								5,00

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR


VoBo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.17	Suministro e instalación de ventana metalica de 1,38 m x 2,40 m, incluye marco, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color madera, similar a existentes	und

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

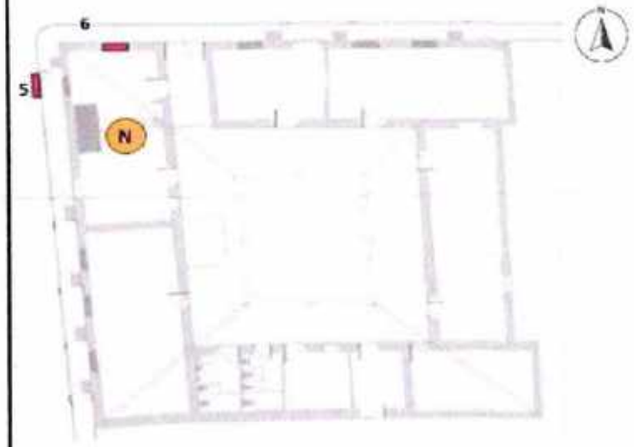

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.		
AREA N								
Ventana 5						1,00	1	1,00
Ventana 6						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								2,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								2,00


Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP 18	Alerones en estructura de madera sobre ventanas y puerta principal, ancho 0,35m, incluye viguetas, techo en machimbre impermeabilizado y teja de barro tipo española.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

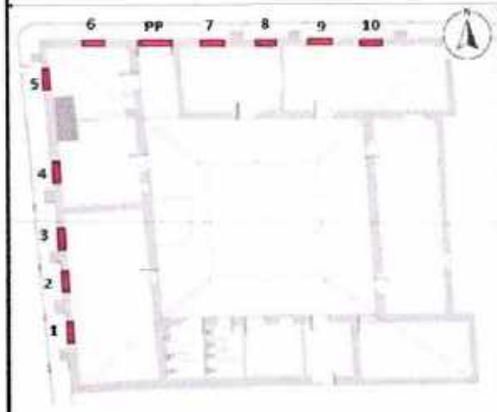



FACHADA CRA 13



FACHADA CLL 41

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Alerones								
VENTANA 1	2,00						1	2,00
VENTANA 2	2,00						1	2,00
VENTANA 3	2,00						1	2,00
VENTANA 4	2,00						1	2,00
VENTANA 5	2,00						1	2,00
VENTANA 6	2,00						1	2,00
VENTANA 7	2,00						1	2,00
VENTANA 8	2,00						1	2,00
VENTANA 9	2,00						1	2,00
VENTANA 10	2,00						1	2,00
PUERTA PRINCIPAL	3,00						1	3,00
TOTAL PRESENTE INFORME								23,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								23,00


Elaboró: RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	Revisó: DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	Autorizó: SUPERVISOR Vobo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.19	Suministro e Instalacion de piso en vinilo.	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

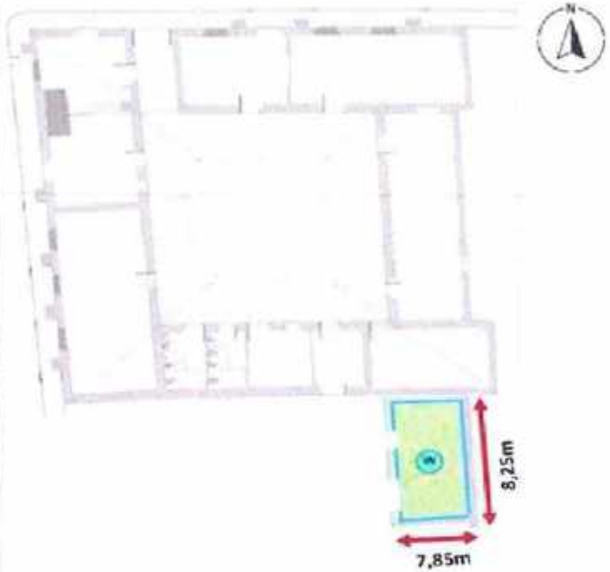


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NÚMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Volumen	Cant.		
AREA W	8,25	7,85		64,76			1	64,76

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 252 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.20	Guardescoba en Vinilo, altura 8cm.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

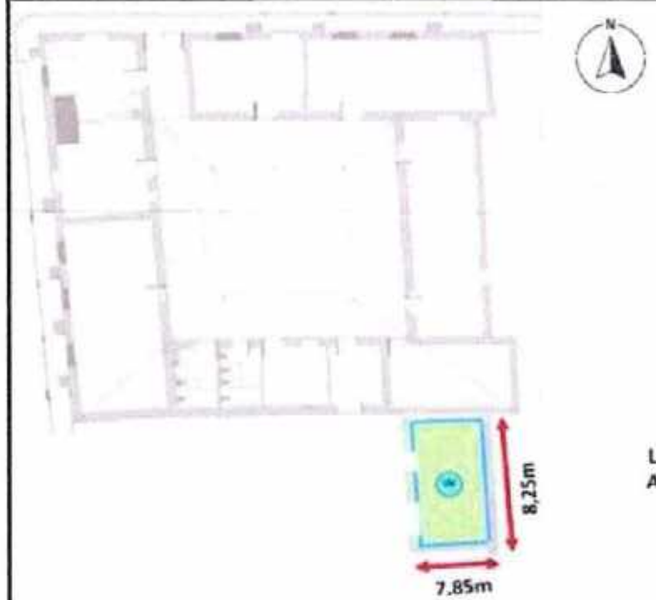

LONGITUD = 8,25m x 2 =16,50m
ANCHO = 7,85m x 2 =15,70m


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Volumen	Cant.		
AREA W LONGITUD	8,25						2	16,50
AREA W ANCHO	7,85						2	15,70
MENOS L PUERTA	-1,22						1	-1,22

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 282 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.21	Suministro e instalación de correas metálicas para soporte estructural del cielo raso.	ml

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

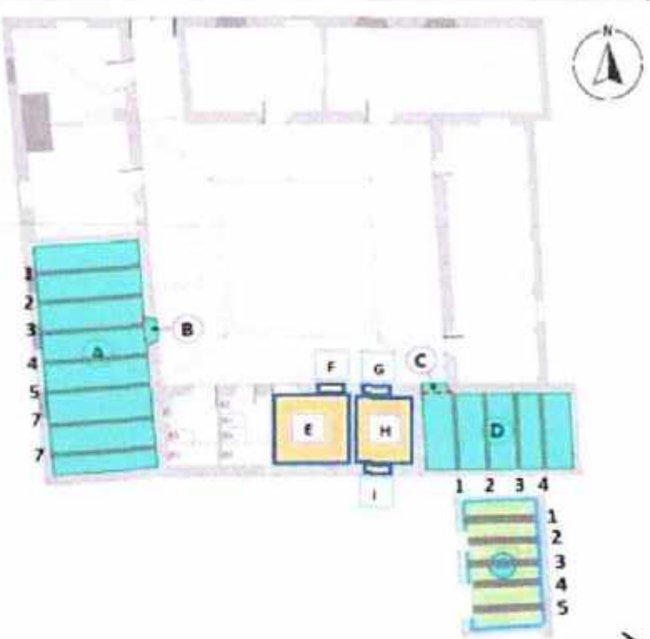

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Área	Volumen	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Correas metalicas								
AREA A (OFICINAS)								
CORREA 1	5,99						1	5,99
CORREA 2	5,99						1	5,99
CORREA 3	5,99						1	5,99
CORREA 4	5,99						1	5,99
CORREA 5	5,99						1	5,99
CORREA 6	5,99						1	5,99
CORREA 7	5,99						1	5,99
AREA D (INFORMATICA)								
CORREA 1	5,15						1	5,15
CORREA 2	5,15						1	5,15
CORREA 3	5,15						1	5,15
CORREA 4	5,15						1	5,15
AREA D (INFORMATICA)								
AREA W	7,95						5	39,75
TOTAL PRESENTE INFORME								102,25
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								102,25

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR


VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	**CONTRATISTA:**	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**REPRESENTANTE LEGAL:**	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		**SUPERVISOR:**	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	**PERIODO PRESENTE INFORME:**	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.22	Mamposteria en ladrillo Tolosa	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

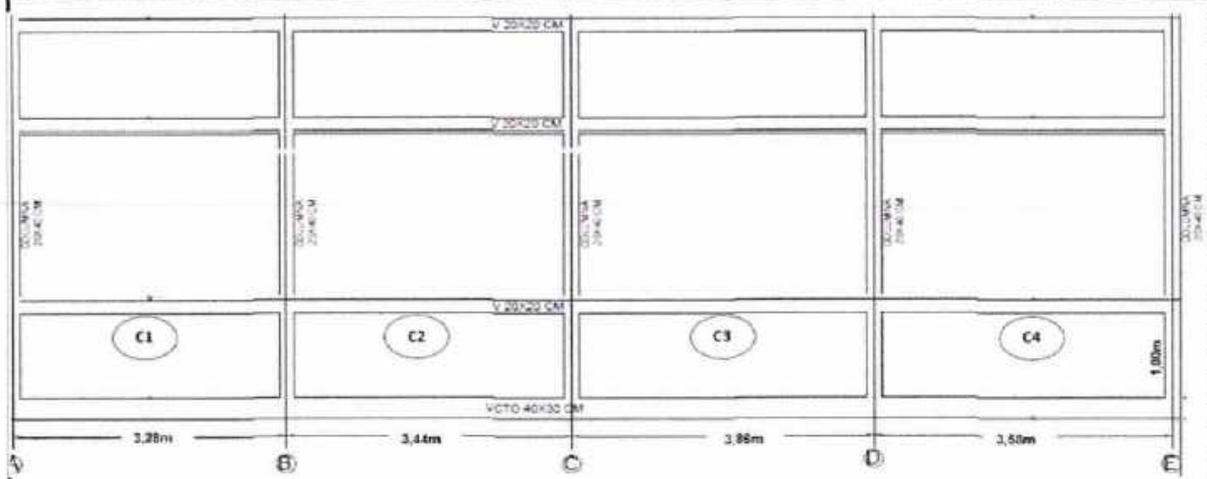

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long.	Ancho	Altura	Area	Volumen	Cant.	NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
AREA C1	3,28		1,00	3,28			1	3,28
AREA C2	3,44		1,00	3,44			1	3,44
AREA C3	3,86		1,00	3,86			1	3,86
AREA C4	3,58		1,00	3,58			1	3,58
							TOTAL PRESENTE INFORME	**14,16**
							TOTAL INFORME ANTERIOR	0,00
							TOTAL ACUMULADO EJECUTADO	**14,16**

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR

VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	**CONTRATISTA:**	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**REPRESENTANTE LEGAL:**	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		**SUPERVISOR:**	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	**PERIODO PRESENTE INFORME:**	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.23	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AIRE ACONDICIONADO								
AREA A (OFICINAS)						1,00	2,00	2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	**CONTRATISTA:**	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**REPRESENTANTE LEGAL:**	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		**SUPERVISOR:**	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	**PERIODO PRESENTE INFORME:**	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP 24	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 24000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Area	Peso	Cant.		
AREA D (INFORMATICA)						1,00	0,00	1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP 25	Caja de Inspección de aguas residuales de 60 x 60 hecha en sitio.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
Caja de Inspección						1,00	1	1,00
TOTAL PRESENTE INFORME								1,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								1,00

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR


VoBo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.26	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED, 12W o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación.	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

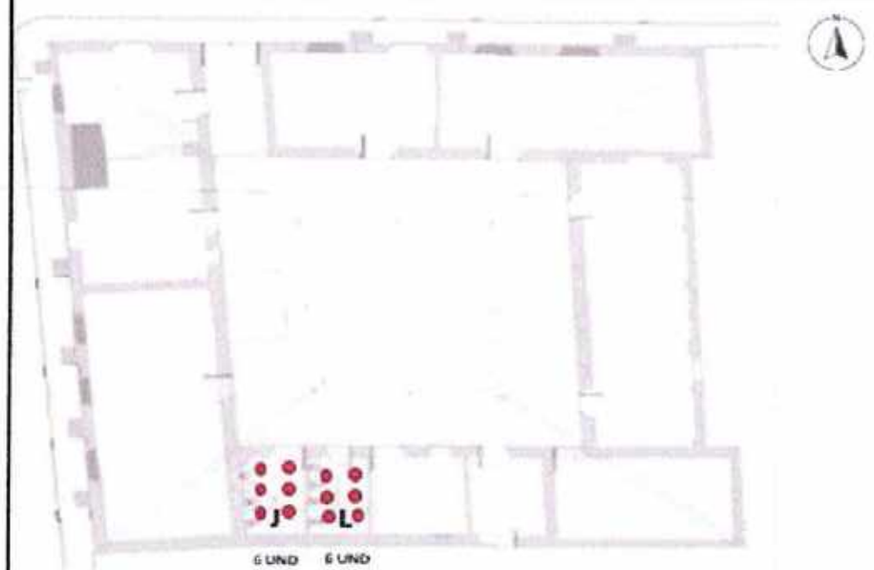

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
AREA J						1,00	6	6,00
AREA L						1,00	6	6,00
TOTAL PRESENTE INFORME								12,00
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								12,00

Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Revisó:
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Autorizó:
SUPERVISOR


Vobo.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.27	Suministro e instalación de ventana con marco metalico de 1,97m x 0,90 m, en tubo cuadrado 3/4 , incluye vidrio, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color negro	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

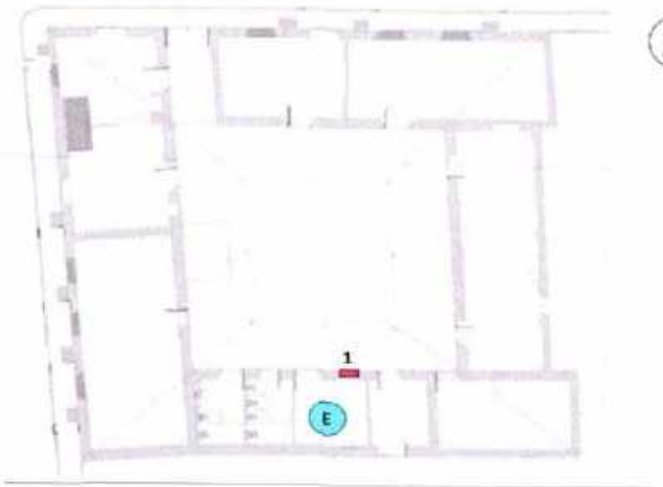


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long.	Ancho	Altura	Área	Peso	Cant.		
VENTANA 1	0,90		1,97	1,77			1	1,77

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO # 262 DE 2022	CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES JAIMES
SUPERVISIÓN:		SUPERVISOR:	EDGAR BAYONA FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL		
UBICACIÓN:	CALLE 41 # 13 - 08 BARRIO GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA	PERIODO PRESENTE INFORME:	

CAPÍTULO		ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP	ITEMS ADICIONALES	NP.28	Pintura vinilo tipo 2 bajo teja asbesto cemento, dos manos	m2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

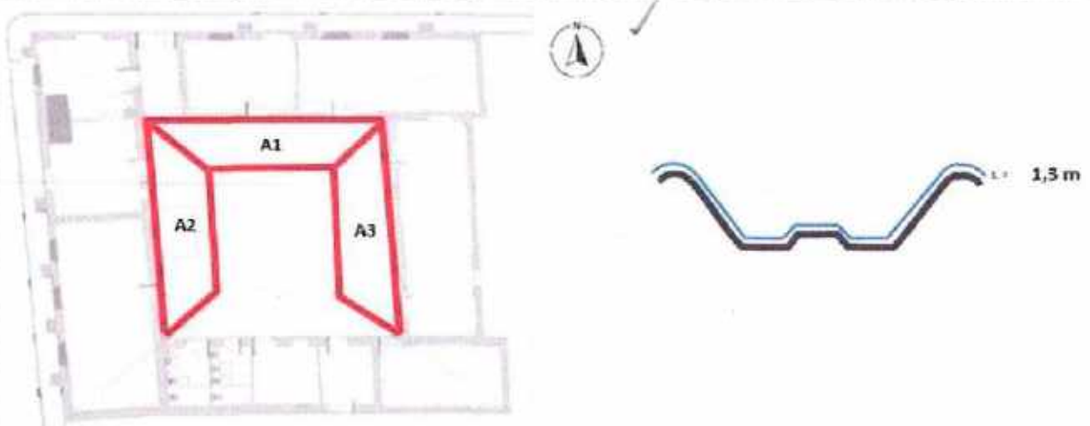

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						NUMERO DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Long. 1	Long. 2	Ancho	Área	Peso	Cant.		
TEJAS PATIO								
AREA 1	15,73	10,53	3,50	45,96			1	45,96
AREA 2	15,56	9,40	3,50	43,67			1	43,67
AREA 3	20,37	12,22	3,50	57,03			1	57,03
TOTAL PRESENTE INFORME								146,66
TOTAL INFORME ANTERIOR								0,00
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO								146,66

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA	SUPERVISOR

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

INFORME No 1

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS ACTA FINAL

CONTRATO 262 DE 2022

OBJETO:

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

AGOSTO 2023

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de mejorar las instalaciones en cuanto a la parte estética y estructural para otorgar a la comunidad víctima del conflicto armado unos espacios con una infraestructura apropiada y mejorar la calidad en la atención de esta población El Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura elaboró el proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" de esta manera se busca optimizar las áreas funcionales y aprovechar el espacio que actualmente no se utiliza.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La infraestructura por mejorar requirió reformas locativas descritas como la demolición de friso, friso impermeabilizado, estuco, pintura de fachada e interiores demolición de pisos y ante pisos enchape, guardaescobas, sustitución de estructura y cielo raso en material Drywall, impermeabilización de la cubierta, mantenimiento de puertas y ventanas, suministro e instalación de aire acondicionado de 36000 BTU; en el sistema eléctrico se requirió la instalación de redes nuevas, regatas, canalización y la instalación de tuberías embebidas en los muros y pisos, tubería aérea para las respectiva iluminación, cableado, luminarias, tomas, tableros, canaletas, rack, multitoma, UPS, switch, cajas de inspección y puestas a tierra, acometidas principales de distribución mejorando la red eléctrica así como como la de voz y datos. También fue necesario ejecutar items no previstos como lo son: enchape y guardaescobas en cerámica tipo porcelanato, Demolición de muro medianero de tapia pisada, cerramiento con madera rolliza y polipropileno, excavación manual en material común, relleno compactado con material seleccionado de préstamo, concreto solado, viga de cimentación, vigas aéreas columnas de sección, acero de refuerzo, mampostería en ladrillo H15, alfajía en concreto, instalación de cajoneras empotradas, instalación de ventana metálica, alerones sobre ventanas y puerta principal, instalación de piso y guardaescobas en vinilo, instalación de correas metálicas para soporte estructural de cielorraso, mampostería en ladrillo temosa de arcilla, suministro e instalación de aires acondicionados de 12000 BTU, 24000 BTU, caja de inspección de aguas residuales, instalación de luminarias led 12W,

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

instalación de ventana metálica con marco en tubo cuadrado, Pintura vinilo tipo 2 bajo teja asbesto cemento.

.

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

ITEM	DESCRIPCION
1	CAPITULO 1 PRELIMINARES
2	CAPITULO 2 CONCRETOS
3	CAPITULO 3 ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
4	CAPITULO 4 CUBIERTAS Y CANALES
5	CAPITULO 5 CIELOS RASOS
6	CAPITULO 6 RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA
7	CAPITULO 7 RED AGUA LLUVIA
8	CAPITULO 8 ACABADOS DE PARED
9	CAPITULO 9 ACABADOS DE PISOS
10	CAPITULO 10 PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS
11	CAPITULO 11 SEÑALIZACIÓN
12	CAPITULO 12 AIRE ACONDICIONADO
13	CAPITULO 13 ASEO Y LIMPIEZA
14	CAPITULO 14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS DEL SISTEMA
15	CAPITULO 15 CABLEADO UTP ÁREA DE TRABAJO
16	CAPITULO 16 INSTALACIONES ELECTRICAS
NP	ITEMS NO PREVISTOS

LOCALIZACIÓN

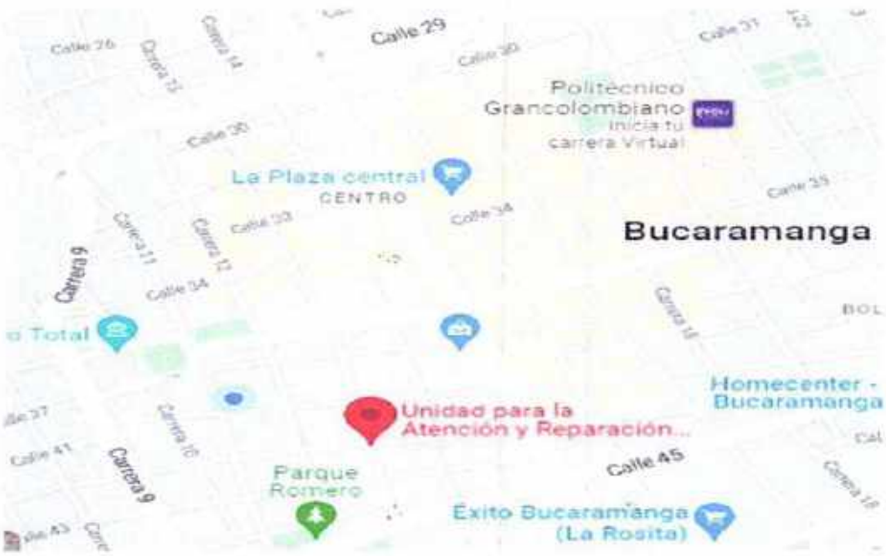


Ilustración 1 Localización de la obra a intervenir

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:		262 de 13 DE OCTUBRE DE 2022			
OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".			
VALOR INICIAL:		$ 287.514.037, 00			
VALOR ADICIONAL:		$ 150.084.139,70			
VALOR TOTAL:		$ 437.598.176,70			
PLAZO INICIAL:		DOS (2) MESES			
PLAZO ADICIONAL 1:		(1) MES			
PLAZO ADICIONAL 2:		DOS (2) MESES			
PLAZO ADICIONAL 3:		VEINTE (20) DIAS			
CONTRATISTA:		CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ CC.13.722.479			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:		CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ CC.13.722.479			
SUPERVISOR:		EDGAR BAYONA FLOREZ			
ANTICIPO (30%)		$86.254.211,10			
FECHA DE INICIACION:		01/11/2022			
ACTA DE SUSPENSION	Nº 1	28/12/2022			
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION	Nº 1	16/01/23023			
ACTA DE REINICIO	Nº 1	31/01/2023			
ACTA DE SUSPENSION	Nº 2	28/02/2023			
ACTA DE REINICIO	Nº 2	01/06/2023			
ACTA ACLARATORIA REINICIO	Nº 2	20/06/2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		22/08/2023			
MUNICIPIO:		BUCARAMANGA SANTANDER			
CENTROS DE TRABAJO:		CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.			

Tabla 1. Información general del contrato

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

1.2. ACTAS DE CONTRATOS

ACTA	FECHA	OBSERVACION
FIRMA DE CONTRATO	01/11/2022	Se realiza firma de contrato posterior a la adjudicación
ACTA DE INICIO	01/11/2022	Se realiza acta de inicio
ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	12/12/2022	Proceso de entrega de anticipo
ACTA DE SUSPENSION	28/12/22	Se autoriza suspender el contrato
PRORROGA SUSPENSION	16/01/2023	Se prorroga la suspensión del contrato
ACTA DE REINICIO	31/01/2023	Se reinicia el contrato
ADICIONAL EN PLAZO	02/02/2023	Se autoriza prorrogar el contrato por un (1) mes más
ACTA PACTACION DE PRECIOS NO PREVISTOS 1	24/02/2023	Se pactan precios e ítems
ACTA DE SUSPENSION	28/02/2023	Se autoriza suspender el contrato
ACTA DE REINICIO	01/06/2023	Se reinicia el contrato
ACTA ACLARATORIA REINICIO	20/06/2023	Se aclara fecha de terminación
PRORROGA EN PLAZO	01/08/2023	Se prorroga veinte (20) días más
ACTA PACTACION DE PRECIOS NO PREVISTOS 2	15/08/2023	Se pactan precios e ítems
ACTA DE EJECUCION	22/08/2023	Se terminan las obras

Tabla 6. Listado de actas de contrato

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades u obras que se ejecutaron son las siguientes:

MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				ULTIMAS CONDICIONES ACTUALIZADAS (ADICIONAL N° 1)		MODIFICACIÓN N° 1		NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UND	CANT	VLR UNT	VLR TOTAL	CANT	VLR TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**										
1.1	**MEDICIONES**										
1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	110,01	$2.057,00	$ 226.290,57	144,73	$ 297.709,61	711,23	$ 1.463.001,75	855,96	$ 1.760.711,36
1.2	**DESMONTES**										
1.2.1	Desmonte de muro divisorio liviano, incluye cargue y retiro	m2	42,00	$11.446,00	$ 480.732,00	42,00	$ 480.732,00	-10,08	-$ 115.410,02	31,92	$ 365.321,98
1.2.2	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro	m2	110,01	$13.540,00	$ 1.489.535,40	144,73	$ 1.959.644,20	103,10	$ 1.396.030,84	247,83	$ 3.355.675,04
1.2.3	Desmonte de letrero existente	und	1,00	$367.839,00	$ 367.839,00	1,00	$ 367.839,00			1,00	$ 367.839,00
1.3	**DEMOLICIONES**										
1.3.1	Demolición de friso muros, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final	m2	503,09	$12.857,00	$ 6.468.228,13	503,09	$ 6.468.228,13	84,34	$ 1.084.359,38	587,43	$ 7.552.587,51

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

1.3.2	Demolición de piso y alistado en mortero con martillo eléctrico, incluye , cargue, retiro y disposición final	m3	16,52	$178.247,00	$ 2.944.640,44	31,44	$ 5.604.085,68	9,32	$ 1.661.262,04	40,76	$ 7.265.347,72
1.3.3	Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	0,30	$217.357,00	$ 65.207,10	0,30	$ 65.207,10	0,26	$ 56.938,84	0,56	$ 122.145,94
				SUBTOTAL	**$ 12.042.472,64**		**$ 15.243.445,72**				**$ 20.789.628,56**
2,00	**CONCRETOS**										
2.1	**PLACA DE PISO**										
2.1.1	Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio.	m3	11,00	$ 1.061.464,00	$ 11.897.185,46	20,95	$ 22.656.670,80	5,69	$ 6.153.530,16	26,64	$ 28.810.200,96
				SUBTOTAL	**$ 11.897.185,46**		**$ 22.656.670,80**				**$ 28.810.200,96**
3	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
3.1	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS										
3.1.1	Malla electro soldada	kg	277,00	$10.429,00	$ 2.888.833,00	620,03	$ 6.466.277,97	-34,06	-$ 355.196,84	585,97	$ 6.111.081,13
				SUBTOTAL	**$ 2.888.833,00**		**$ 6.466.277,97**				**$ 6.111.081,13**
4	**CUBIERTAS Y CANALES**										
4.1	**CUBIERTAS**										
4.1.1	Impermeabilización y mantenimiento de cubierta con manto asfáltico 4.2mm modificado con polipropileno atáctico. Incluye pintura reflectiva con base asfáltica	m2	366,32	$109.687,00	$ 40.180.541,84	461,32	$ 50.600.806,84	-49,72	-$ 5.453.637,64	411,60	$ 45.147.169,20

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

				SUBTOTAL	**$ 40.180.541,84**		**$ 50.600.806,84**				**$ 45.147.169,20**
5	**CIELOS RASOS**										
5.1	**CIELO RASOS EN DRY WALL**										
5.1.1	Cielo raso en lámina de yeso regular 1/2", incluye acabado en pintura vinilo tipo 2	m2	110,01	$61.729,00	$ 6.790.807,29	209,50	$ 12.932.225,50	30,13	$ 1.859.894,77	239,63	$ 14.792.120,27
5.1.2	Suministro e instalacion de canaleta en pvc para ducteria de aires	ml	25,00	$59.440,00	$ 1.486.000,00	25,00	$ 1.486.000,00	-25,00	-$ 1.486.000,00		
				SUBTOTAL	**$ 8.276.807,29**		**$ 14.418.225,50**				**$ 14.792.120,27**
6	**RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA**										
6.1	TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA										
6.1.1	Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	ml	20,00	$13.350,00	$ 267.000,00	20,00	$ 267.000,00	10,80	$ 144.177,33	30,80	$ 411.177,33
6.1.2	Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 2", incluye accesorios de conexión	ml	20,00	$59.636,00	$ 1.192.720,00	20,00	$ 1.192.720,00	-20,00	-$ 1.192.720,00		
6.2	**PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA**										
6.2.1	Pasamuros 4" H.G. 304 schedule 40, L=65cm	und	10,00	$442.665,00	$ 4.426.650,00	10,00	$ 4.426.650,00	-10,00	-$ 4.426.650,00		
				SUBTOTAL	**$ 5.886.370,00**		**$ 5.886.370,00**				**$ 411.177,33**
7	**RED AGUA LLUVIA**										
7.1	**TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA**										
7.1.1	Red agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	ml	20,00	$50.596,00	$ 1.011.920,00	20,00	$ 1.011.920,00	-14,00	-$ 708.344,00	6,00	$ 303.576,00

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

				SUBTOTAL	**$ 1.011.920,00**						**$ 303.576,00**
8	**ACABADOS DE PARED**										
8.1	**FRISOS Y ESTUCOS PARED**										
8.1.1	Friso allanado sobre pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones	m2	501,03	$35.758,00	$ 17.915.830,74	728,04	$ 26.033.254,32	79,78	$ 2.852.773,24	807,82	$ 28.886.027,56
8.1.2	Estuco plástico pared interior y/o exterior	m2	501,03	$16.640,00	$ 8.337.139,20	746,21	$ 12.416.934,40	320,75	$ 5.337.322,36	1.066,96	$ 17.754.256,76
8.2	**PINTURA PARED**										
8.2.1	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos	m2	253,75	$17.679,00	$ 4.486.046,25	359,42	$ 6.354.186,18	774,42	$ 13.691.052,96	1.133,84	$ 20.045.239,14
8.2.2	Pintura acrilica exterior pared, sobre estuco, dos manos.	m2	186,58	$20.005,00	$ 3.732.532,90	292,33	$ 5.848.061,65	-30,84	-$ 616.954,20	261,49	$ 5.231.107,45
8.2.3	Pintura acrilica exterior sócalo, sobre estuco, dos manos, color RAL 7016 o similar	m2	60,70	$20.005,00	$ 1.214.303,50	60,70	$ 1.214.303,50	13,83	$ 276.669,15	74,53	$ 1.490.972,65
				SUBTOTAL	**$ 35.685.852,59**		**$ 52.878.660,05**				**$ 73.407.603,56**
9	**ACABADOS DE PISOS**										
9.1	**MORTEROS DE NIVELACIÓN**										
9.1.1	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm.	m2	110,01	$66.094,00	$ 7.271.000,94	209,50	$ 13.846.693,00	-0,01	-$ 660,94	209,49	$ 13.846.032,06
9.2	**ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR**										
9.2.1	Piso en mortero autonivelante con arena de cuarzo fina pigmentada de color gris claro, espesor 2cm.	m2	110,01	$81.406,00	$ 8.955.474,06						

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

9.3	**GUARDA ESCOBA Y MEDIACAÑA**										
9.3.1	Piso en mortero autonivelante con arena de cuarzo fina pigmentada de color gris claro, espesor 2cm. Para guardaescoba	ml	62,00	$49.455,00	$ 3.066.210,00						
				SUBTOTAL	**$ 19.292.685,00**		**$ 13.846.693,00**				**$ 13.846.032,06**
10,00	**PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS**										
10.1	**PUERTAS**										
10.1.1	Mantenimiento de puerta metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y poliuretano	m2	13,99	$51.202,00	$ 716.315,98	13,99	$ 716.315,98	37,96	$ 1.943.735,44	51,95	$ 2.660.051,42
10.2	**VENTANAS**										
10.2.1	Ventana corrediza de aluminio 5020 y vidrio incoloro de 4 mm	m2	4,49	$299.843,00	$ 1.346.533,87	4,49	$ 1.346.533,87	-1,25	-$ 373.694,33	3,24	$ 972.839,54
10.2.2	Mantenimiento pintura de ventana metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior	m2	34,50	$62.652,00	$ 2.161.494,00	34,50	$ 2.161.494,00	-1,93	-$ 120.962,22	32,57	$ 2.040.531,78
				SUBTOTAL	**$ 4.224.343,85**		**$ 4.224.343,85**				**$ 6.673.422,75**
11,00	**SEÑALIZACIÓN**										
11.1.1	Suministro e instalacion de Letrero en acrilico, incluye instalación a pared	und	1,00	$866.775,00	$ 866.775,00	1,00	$ 866.775,00			1,00	$ 866.775,00
				SUBTOTAL	**$ 866.775,00**		**$ 866.775,00**				**$ 866.775,00**
12,00	**AIRE ACONDICIONADO**										

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

12.1.1	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 36000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und	2,00	$5.126.502,00	$ 10.253.004,00	2,00	$ 10.253.004,00	-1,00	-$ 5.126.502,00	1,00	$ 5.126.502,00
				SUBTOTAL	**$ 10.253.004,00**		**$ 10.253.004,00**				**$ 5.126.502,00**
13,00	**ASEO Y LIMPIEZA**										
13.1.1	Aseo y limpieza.	m2	110,01	$3.433,00	$ 377.664,33	110,01	$ 377.664,33	745,95	$ 2.560.849,09	855,96	$ 2.938.513,42
				SUBTOTAL	**$ 377.664,33**						**$ 2.938.513,42**
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MINI SPLIT E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS CORRECTIVOS										
14,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS DEL SISTEMA**										
14.1	**Mantenimiento Unidades Multi Split**										
14.1.1	Revision y mantenimiento de equipo mini split (Condensadora+evaporadora)	und	8,00	$412.551,00	$ 3.300.408,00	8,00	$ 3.300.408,00	-1,00	-$ 412.551,00	7,00	$ 2.887.857,00
14.2	**Tuberia del sistema Mini Split**										
14.2.1	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 1/2" incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	ml	35,00	$79.066,00	$ 2.767.310,00	35,00	$ 2.767.310,00	17,40	$ 1.375.748,40	52,40	$ 4.143.058,40
14.2.2	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 3/8" incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	ml	5,00	$72.371,00	$ 361.855,00	5,00	$ 361.855,00	1,88	$ 135.695,63	6,88	$ 497.550,63

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

14.2.3	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 1/4' (3/8 R) incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	ml	40,00	$92.629,00	$ 3.705.160,00	40,00	$ 3.705.160,00	10,80	$ 1.000.393,20	50,80	$ 4.705.553,20
14.2.4	Suministro, Instalacion y Soporte de tuberia 3/4" de PVC de alta presion soldada y aislada con Rubatex para drenaje	ml	40,00	$79.261,00	$ 3.170.440,00	40,00	$ 3.170.440,00	-40,00	-$ 3.170.440,00		
14.3	**Suministro de dispositivos correctivos**								$ -		
14.3.1	Suministro e instalacion de tarjeta de control de operación del equipo condensador de un sistema Mini Split	und	2,00	$613.357,00	$ 1.226.714,00	2,00	$ 1.226.714,00	-2,00	-$ 1.226.714,00		
14.3.2	Suministro e instalacion de tarjeta de control de operación del equipo evaporador de un sistema Mini Split	und	3,00	$421.058,00	$ 1.263.174,00	3,00	$ 1.263.174,00	-3,00	-$ 1.263.174,00		
				SUBTOTAL	**$ 15.795.061,00**		**$ 16.172.725,33**				**$ 12.234.019,23**
	RED DE DATOS, WIFI Y CCTV										
15,00	**CABLEADO UTP ÁREA DE TRABAJO**										
15.1.1	Suministro e instalación de Patch cord CAT 6A 7ft, azul.	UND	15,00	$91.235,00	$ 1.368.525,00	15,00	$ 1.368.525,00			15,00	$ 1.368.525,00
15.2	**SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN**										
15.2.1	Suministro e instalación de cable UTP cat 6A color azul	ML	480,00	$13.665,00	$ 6.559.200,00	480,00	$ 6.559.200,00	24,00	$ 327.960,00	504,00	$ 6.887.160,00
15.2.2	Suministro e instalacion de Face Plate sencillo cat 6A	UND	6,00	$24.233,00	$ 145.398,00	6,00	$ 145.398,00	4,00	$ 96.932,00	10,00	$ 242.330,00

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

15.2.3	Suministro e instalacion de Face Plate dobles cat 6A	UND	9,00	$ 27.810,00	$ 250.290,00	9,00	$	250.290,00	-4,00	-$ 111.240,00	5,00	$ 139.050,00
15.2.4	Suministro e instalación de Amarre de Velcro. Pk 10 para moños de 12 cables	UND	20,00	$ 2.940,00	$ 58.800,00	20,00	$	58.800,00	-10,00	-$ 29.400,00	10,00	$ 29.400,00
15.2.5	Suministro e instalación de Jack módulo para herraje color azul de 24 puertos	UND	39,00	$ 66.722,00	$ 2.602.158,00	39,00	$	2.602.158,00	-27,00	-$ 1.801.494,00	12,00	$ 800.664,00
15.2.6	Suministro e instalación de Patch cord 10G, 5ft, azul.	UND	25,00	$ 77.295,00	$ 1.932.375,00	25,00	$	1.932.375,00	-9,00	-$ 695.655,00	16,00	$ 1.236.720,00
15.2.7	Suministro e instalacion de Rack de 9U de pared	UND	1,00	$ 1.200.145,00	$ 1.200.145,00	1,00	$	1.200.145,00			1,00	$ 1.200.145,00
15.2.8	Suministro e instalacion de patch pannel 24 puertos	UND	1,00	$ 1.863.860,00	$ 1.863.860,00	1,00	$	1.863.860,00			1,00	$ 1.863.860,00
15.2.9	Suministro e instalacion de organizador horizontal 1 con tapa de alta capacidad	UND	1,00	$ 198.856,00	$ 198.856,00	1,00	$	198.856,00			1,00	$ 198.856,00
15.2.10	Suministro e instalación de Mutitoma Horizontal con 12 toma corrientes NEMA 5-15P, Especializada para equipos de comunicaciones	UND	1,00	$ 367.572,00	$ 367.572,00	1,00	$	367.572,00			1,00	$ 367.572,00
15.2.11	Marquillado general de rack	GLB	1,00	$ 537.625,00	$ 537.625,00	1,00	$	537.625,00	-1,00	-$ 537.625,00		
15.2.12	Certificaciones de punto UTP	PTO	15,00	$ 28.471,00	$ 427.065,00	15,00	$	427.065,00	-15,00	-$ 427.065,00		
15.3	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**											
15.3.1	Suministro e instalación de puesta a tierra para centro de cableado. Incluye barra de puesta a tierra para rack sello UL, Conector de puesta a tierra y Barra puesta a tierra para centro de cableado	UND	1,00	$1.877.906,00	$ 1.877.906,00	1,00	$	1.877.906,00	-1,00	-$ 1.877.906,00		

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

	de acuerdo a estandar BICSI/J-STD-606-A										
15.4	**UPS**										
15.4.1	Suministro e Instalación UPS on-line 3000 VA/2500W, FP 0,8 120 V, onda seno pura. Clavija entrada I5-30p, autonomia 5/14 minutos	UND	1,00	$6.361.576,00	$ 6.361.576,00	1,00	$ 6.361.576,00			1,00	$ 6.361.576,00
	EQUIPOS ACTIVOS										
15.5	**SWITCHES**										
15.5.1	SWITCH DE ACCESO 24 RJ45 PUERTOS PoE	UND	1,00	$ 6.186.650,00	$ 6.186.650,00	1,00	$ 6.186.650,00			1,00	$ 6.186.650,00
	DUCTERIA Y ACCESORIOS										
15.6	**DATOS, WIFI Y CCTV**										
15.6.1	Suministro e instalacion de canaleta con tabique de separacion	ML	41,00	$31.994,00	$ 1.311.754,00	41,00	$ 1.311.754,00	-5,00	-$ 160.088,50	36,00	$ 1.151.665,50
15.6.2	Suministro e instalacion de Tuberia EMT 1" y demas accesorios de instalacion y marcacion para ambientes TI	ML	28,00	$46.118,00	$ 1.291.304,00	28,00	$ 1.291.304,00	-28,00	-$ 1.291.304,00		
15.6.3	Suministro e instalacion de cajas Radwell 5800	UND	5,00	$19.587,00	$ 97.935,00	5,00	$ 97.935,00	-1,00	-$ 19.587,00	4,00	$ 78.348,00
				SUBTOTAL	**$ 34.638.994,00**		**$ 34.638.994,00**				**$ 28.112.521,50**
16,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

16.1.1	Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar.	UND	1,00	$526.377,00	$ 526.377,00	1,00	$ 526.377,00	1,00	$ 526.377,00	2,00	$ 1.052.754,00
16.1.2	Instalación y conexión de equipo existente (ventilador, camara cctv, sonido, campana), incluye base y accesorios de instalación.	UND	22,00	$45.844,00	$ 1.008.568,00	22,00	$ 1.008.568,00	-22,00	-$ 1.008.568,00		
16.1.3	Instalación y conexión de equipos de Aire Acondicionado, incluye accesorios de instalación.	UND	8,00	$134.727,00	$ 1.077.816,00	8,00	$ 1.077.816,00	3,00	$ 404.181,00	11,00	$ 1.481.997,00
16.2	**CANALIZACION DE BAJA TENSION**										
16.2.1	Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1", y demas accesorios de instalación y marcación.	ML	135,00	$51.221,00	$ 6.914.835,00	135,00	$ 6.914.835,00	-79,64	-$ 4.079.240,44	55,36	$ 2.835.594,56
16.2.2	Regata y resane de traslado para puntos electricos y de comUnicaciones.	ML	241,00	$36.519,00	$ 8.801.079,00	241,00	$ 8.801.079,00	-65,04	-$ 2.375.191,77	175,96	$ 6.425.887,23
16.3	**REDES**										
16.3.1	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 3x8 + 1x8N + 1x8T LSHF (Libre de halogenos). Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	86,00	$50.972,00	$ 4.383.592,00	86,00	$ 4.383.592,00	41,40	$ 2.110.240,80	127,40	$ 6.493.832,80
16.3.2	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	ML	46,50	$15.212,00	$ 707.358,00	46,50	$ 707.358,00	52,42	$ 797.414,70	98,92	$ 1.504.772,70
16.4	**ESTRUCTURAS**										

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

16.4.1	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra.	UND	2,00	$444.621,00	$ 889.242,00	2,00	$ 889.242,00			2,00	$ 889.242,00
16.4.2	Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de inspección para electrodo de puesta a tierra.	UND	2,00	$146.739,00	$ 293.478,00	2,00	$ 293.478,00	-2,00	-$ 293.478,00		
16.4.3	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	UND	2,00	$575.895,00	$ 1.151.790,00	2,00	$ 1.151.790,00	-2,00	-$ 1.151.790,00		
16.5	**EQUIPOS**										
16.5.1	Suministro, transporte e instalación de UPS 3 kVA Monofasica incluye ByPass, acomedita y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	2,00	$6.497.706,00	$ 12.995.412,00	2,00	$ 12.995.412,00	-1,00	-$ 6.497.706,00	1,00	$ 6.497.706,00
16.5.2	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T36-3F empotrable Mini Pragma de 36 Módulos - 63 A - REF MIP20312T demás accesorios de instalación y señalización.	UND	2,00	$679.972,00	$ 1.359.944,00	2,00	$ 1.359.944,00			2,00	$ 1.359.944,00
16.5.3	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T24-3F empotrable MINI PRAGMA de 24 Módulos - demás accesorios de instalación y señalización.	UND	2,00	$470.247,00	$ 940.494,00	2,00	$ 940.494,00			2,00	$ 940.494,00

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

16.5.4	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x15 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	96,00	$23.481,00	$ 2.254.176,00	96,00	$ 2.254.176,00	-73,00	-$ 1.714.113,00	23,00	$ 540.063,00
16.5.5	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	8,00	$23.481,00	$ 187.848,00	8,00	$ 187.848,00			8,00	$ 187.848,00
16.5.6	Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x70A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye marcación RETIE.	UND	4,00	$544.812,00	$ 2.179.248,00	4,00	$ 2.179.248,00	-2,00	-$ 1.089.624,00	2,00	$ 1.089.624,00
16.5.7	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 2x30 A, 220-127V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	4,00	$45.785,00	$ 183.140,00	4,00	$ 183.140,00	-4,00	-$ 183.140,00		
16.6	**INTERIOR**										
16.6.1	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	92,00	$118.103,00	$ 10.865.476,00	92,00	$ 10.865.476,00	-92,00	-$ 10.865.476,00		
16.6.2	Suministro, transporte e instalación de luminaria BALA DIMERIZABLE (zona limpia), 8W, 4000K, IP65. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	12,00	$131.086,00	$ 1.573.032,00	12,00	$ 1.573.032,00	-12,00	-$ 1.573.032,00		

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

16.6.3	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	31,00	$186.285,00	$ 5.774.835,00	31,00	$ 5.774.835,00	19,00	$ 3.539.415,00	50,00	$ 9.314.250,00
16.6.4	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	20,00	$376.757,00	$ 7.535.140,00	20,00	$ 7.535.140,00	21,00	$ 7.911.897,00	41,00	$ 15.447.037,00
16.6.5	Suministro, transporte e instalación de driver de emergencia es ref ELD07, autonomia 90 minutos con 5 años de garantia. El driver debe permitir que la luminaria pueda ser utilizada tanto en operación normal como en emergencia. incluye bateria, cargador, circuito inversor, cableado, accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	5,00	$411.726,00	$ 2.058.630,00	5,00	$ 2.058.630,00	-5,00	-$ 2.058.630,00		

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

16.6.6	Suministro, transporte e instalación de PANEL LED SLIM 40W 60X60cm - 100.000 horas - dimerizable o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	31,00	$339.807,00	$ 10.534.017,00	45,00	$ 15.291.315,00			45,00	$ 15.291.315,00
				SUBTOTAL	**$ 84.195.527,00**		**$ 88.952.825,00**				**$ 71.352.361,30**
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
NP. 01	Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelana tipo porcelanato institucional antideslizante, ancho 8cm.	ml		$ 24.672		92,79	$ 2.289.314,88	-12,82	-$ 316.295,04	79,97	$ 1.973.019,84
NP. 02	Suministro e instalacion de enchape piso en ceramica tipo porcelanato, formato 60cm x 60cm, institucional, antideslizante.	m2		$ 94.496		144,92	$ 13.694.360,32	-14,92	-$ 1.409.880,32	130,00	$ 12.284.480,00
NP. 03	Demolicion muro en tapia medianero, espesor 62cm, incluye transporte escombros.	m3		$ 51.812		41,63	$ 2.156.933,56	3,85	$ 199.476,20	45,48	$ 2.356.409,76
NP. 04	Cerramiento con madera rolliza y tela polipropileno, altura 2,50m.	ml		$ 26.407		60,00	$ 1.584.420,00	-35,00	-$ 924.245,00	25,00	$ 660.175,00
NP. 05	Excavacion manual en material comun, incluye retiro.	m3		$ 55.501		4,90	$ 271.954,90	0,15	$ 8.491,65	5,05	$ 280.446,55

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

NP. 06	Relleno compactado con material seleccionado de prestamo.	m3		$ 67.349		4,47	$ 301.144,32	2,86	$ 192.860,60	7,34	$	494.004,92
NP. 07	Concreto Solado 1500 psi, espesor 5cm.	m2		$ 39.045		7,90	$ 308.455,50	2,21	$ 86.289,45	10,11	$	394.744,95
NP. 08	Concreto 3000 psi para viga de cimentación, sección 30cm x 40cm.	ml		$ 162.575		15,80	$ 2.568.685,00	0,50	$ 81.287,50	16,30	$	2.649.972,50
NP. 09	Concreto 3000 psi para columna sección 20cm x 40cm.	m3		$ 1.432.215		1,62	$ 2.320.188,30	0,00	-$ 5.728,86	1,62	$	2.314.459,44
NP. 10	Concreto 3000 psi viga sección 20cm x 20cm.	ml		$ 106.847		31,60	$ 3.376.365,20	17,30	$ 1.848.453,10	48,90	$	5.224.818,30
NP. 11	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.	kg		$ 13.015		818,86	$ 10.657.462,90	157,73	$ 2.052.816,91	976,59	$	12.710.279,81
NP. 12	Mamposteria H-15 ladrillo de arcilla.	m2		$ 90.212		56,83	$ 5.126.747,96	-22,14	-$ 1.997.293,68	34,69	$	3.129.454,28
NP. 13	Filtro con Geodren planar diam. 4", altura 0,50m.	ml		$ 107.000		15,80	$ 1.690.600,00	-15,80	-$ 1.690.600,00			
NP. 14	Alfajia en concreto de 3000 psi seccion 0,30m x 0,04m.	ml		$ 43.040		15,80	$ 680.032,00	0,60	$ 25.824,00	16,40	$	705.856,00
NP. 15	Suministro e instalación de cajonera empotrada en madera RH, espesor 15mm, abierta, ancho variable 1,50m - 1,80m, altura 1,20 m y prof. 0,35 m, con tapas laterales, superior y trasera, incluye manijas y divisiones.	und		$ 2.507.691		9,00	$ 22.569.219,00	-4,00	-$10.030.764,00	5,00	$	12.538.455,00

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

NP. 16	Suministro e instalación de tranca para ventana tipo pasador en madera zapan o similar, long.variable 1,20m a 1,50m, sección 4cm x 8cm, incluye pintura en esmalte y soportes laterales metalicos.	und		$ 137.296		12,00	$ 1.647.552,00	-12,00	-$ 1.647.552,00		
NP. 17	Suministro e instalación de ventana metalica de 1,38 m x 2,40 m, incluye marco, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color madera, similar a existentes	und		$ 1.531.148		1,00	$ 1.531.148,00	1,00	$ 1.531.148,00	2,00	$ 3.062.296,00
NP. 18	Alerones en estructura de madera sobre ventanas y puerta principal, ancho 0,35m, incluye viguetas, techo en machimbre impermebilizado y teja de barro tipo española.	ml		$ 164.400		23,00	$ 3.781.200,00			23,00	$ 3.781.200,00
NP. 19	Suministro e Instalacion de piso en vinilo.	m2		$ 271.135		64,76	$ 17.558.702,60	0,00	$ 677,84	64,76	$ 17.559.380,44
NP. 20	Guardescoba en Vinilo, altura 8cm.	ml		$ 34.406		32,20	$ 1.107.873,20	-1,22	-$ 41.975,32	30,98	$ 1.065.897,88
NP. 21	Suministro e instalación de correas metálicas para soporte estructural del cielo raso.	ml		$ 84.320		62,50	$ 5.270.000,00	39,75	$ 3.351.298,40	102,25	$ 8.621.298,40
NP. 22	Mamposteria en ladrillo temosa de arcilla, espesor 18 cm.	m2		$ 140.382				14,16	$ 1.987.809,12	14,16	$ 1.987.809,12
NP. 23	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und		$ 2.773.268,00				2,00	$ 4.012.136,00	2,00	$ 4.012.136,00
NP. 24	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con	und		$ 4.417.268,00				1,00	$ 3.884.338,00	1,00	$ 3.884.338,00

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

	capacidad de 24000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220										
NP. 25	Caja de Inspección de aguas residuales de 60 x 60 x 60, en mampóstería tipo temosa, incluye losa de piso en concreto 3000 psi, e=7cm y tapa en concreto reforzado de 3000psi, e=5cm..	und		$ 467.567,00				1,00	$ 572.217,00	1,00	$ 572.217,00
NP. 26	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED, 12W o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación.	und		$ 61.879,00				12,00	$ 824.760,00	12,00	$ 824.760,00
NP. 27	Suministro e instalación de ventana con marco metalico de 1,97m x 0,90 m, en tubo cuadrado 3/4 , incluye vidrio, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color negro	m2		$ 709.148,00				1,77	$ 1.743.121,40	1,77	$ 1.743.121,40
NP. 28	Pintura vinilo tipo 2 bajo teja asbesto cemento, dos manos.	m2		$ 19.395,00				146,66	$ 2.844.441,85	146,66	$ 2.844.441,85
	SUBTOTAL						**$ 100.492.359,64**				**$ 107.675.472,43**
VALORES TOTALES				**$ 287.514.037,00**		**$ 437.598.176,70**			**$ 0,00**		**$ 437.598.176,70**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

3. ANALISIS DEL PRESUPUESTO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**287.514.037,00**
VALOR ADICIONAL	**$**	**150.084.139,70**
ANTICIPO (30%)	**$**	**86.254.211,10**
VALOR TOTAL	**$**	**437.416.475,26**
VALOR ACTA FINAL	**$**	**351.162.264,16**

3.1. DURACION DEL PROYECTO

El acta de inicio del contrato se firmó por las partes una vez fue asignada la supervisión el día 13 de octubre de 2022, por lo tanto, a futuro el contratista no podrá exigir ningún valor adicional por el tiempo transcurrido entre la celebración del contrato y el inicio de la obra.

La obra "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" inició el día 1 de noviembre de 2022, el contrato tuvo la primera suspensión a partir del día 28 de diciembre de 2022, se reiniciaron labores el día 31 de enero de 2023, se dio la segunda suspensión el día 28 de febrero de 2023 reiniciando actividades desde el día 01 de junio de 2023, se otorgó una prórroga de VEINTE (20) días, finalizando el contrato el día 22 de agosto de 2023. Las actividades anteriormente descritas se desarrollaron en un plazo total de CINCO (5) meses y VEINTE (20) días calendario. Vencido el plazo del contrato o de los eventos de terminación anticipada previstos en la ley; previamente a la liquidación, el supervisor y el contratista, extenderán el acta de recibo definitivo de la obra, en el cual se dejará constancia de las cantidades, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar.

4. SEÑALIZACION

La entidad define puntualmente los tipos de señales que son los siguientes:

TIPO DE SEÑAL	NOMBRE
SEÑALES PREVENTIVAS	SPO-01. TRABAJOS EN LA VIA
SEÑALES INFORMATIVAS	SIO-02 INICIO DE OBRA – SIO-03 FIN DE OBRA
DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN	BARRERAS DE CERRAMIENTO COLOMBINAS REFLECTIVAS

DISPOSITIVOS DE CANALIZACIÓN	BARRERAS DE CERRAMIENTO COLOMBINAS REFLECTIVAS MALETINES CINTA PELIGRO
SEÑALES PERMANENTES	SEÑALES VERTICALES DEFINITIVAS

Se Mantiene la señalización de la obra y las vallas informativas y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

6. CONTROL DE CALIDAD

Se continúa garantizando la calidad del proyecto, cumpliendo el plan de aseguramiento de la calidad y cumpliendo los objetivos:

- Cumplir con las fechas de facturación establecidas
- Cumplir con el cronograma de obra planteado
- Cumplir con la rentabilidad planificada para el proyecto
- Controlar el consumo de materiales planificados
- Minimizar el número de las NO conformidades generados en el proyecto
- Maximizar la productividad de la maquinaria y equipos
- Atender y dar respuesta oportuna a los PQRS de comunidad y entidades, que genere el proyecto

Todo lo anterior contará con la respectiva planificación y control por parte de la empresa.

7. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

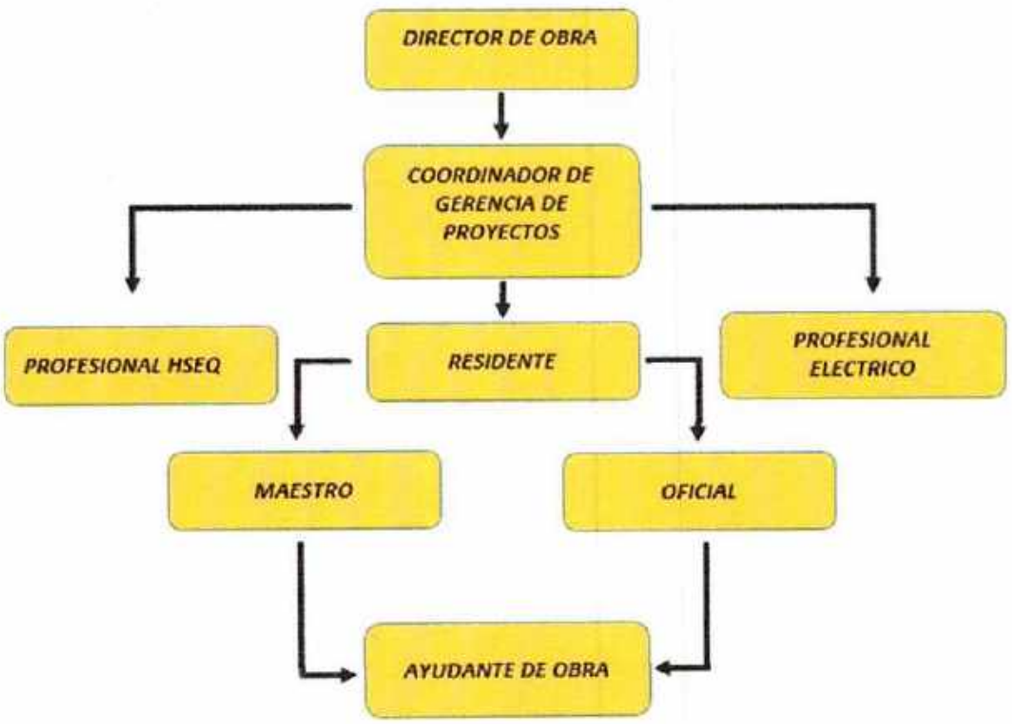


Ilustración 2 Organigrama del proyecto

En la Ilustración No 2 Se observa el organigrama contemplado para la realización del proyecto **"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**

8. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PRINCIPALES CARGOS

A continuación, se describen las responsabilidades de cada cargo y la influencia que se tiene en el proyecto.

CARGO	PERSONA A CARGO	RESPONSABILIDADES	INFLUENCIA EN EL PROYECTO	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ	Responsable de dar la aprobación de las diferentes actividades a ejecutar, la forma como se desarrolló, y estuvo informado de cada inicio de proceso y dar su aprobación final., tuvo comunicación directa y	ALTA	50%

		constante con el *residente de obra.*		
RESIDENTE DE OBRA	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	Responsable de todos los procesos del Proyecto, es el directo implicado en todas las decisiones que se tomen frente al inicio, planeación, ejecución, monitoreo y cierre, responsable de garantizar que el proyecto cumpla con los parámetros establecidos. estuvo presente en todos los procesos del proyecto.	ALTA	100%
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	Hacer seguimiento e implementación al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Mitigar, controlar riesgos propios del proyecto y mantener accidentalidad en ceros.	ALTA	100%
PROFESIONAL ELECTRICO	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	Responsable de ejecutar y desarrollar a cabalidad los procesos del Proyecto que implican las redes eléctricas, voz y datos, cumplir con los parámetros establecidos en la planeación y desarrollo de la obra.	ALTA	100%

Tabla 1 roles y responsabilidades

9. GESTIÓN DE RIESGO

9.1. Identificación y análisis de riesgos

La identificación de riesgos se hace con el fin de verificar que el proyecto llegue a un feliz término

Ing. Civil.

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

ING. CIVIL

ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

General	General	General	General	General	General	General	Clase
interno	externo	interno	interno	interno	interno	interno	Fuente
planeacion	ejecucion	ejecución	ejecución	ejecución	planeación	ejecución	Etapa
economico	operacional	operacional	operacional	operacional	económico	operacional	Tipo
Financiamiento del contrato	Falta de calidad en el servicio prestado	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Estimación inadecuada de los costos	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Desequilibrio económico	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	Desequilibrio económico	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	Consecuencia de la ocurrencia del evento
raro	posible	posible	raro	posible	improbable	posible	Probabilidad
Insignificante	Menor	Menor	Insignificante	Moderado	Menor	Moderado	Impacto
1	2	2	1	3	2	3	Valoración del riesgo
bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	Categoría
Contratista	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante	¿A quién se le asigna?
evitar el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	1	2	2	1	2	Probabilidad
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante	menor	insignificante	menor	Impacto
1	1	1	1	2	1	2	Valoración del riesgo
bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	Categoría
si	si	si	si	si	si	si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista	Entidad contratante y secretaria gestora	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante y secretaria gestora	Persona responsable por implementar el tratamiento
01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	Fecha estimada en que se completa el

Incorporación de controles

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 262 DE 2022

WILSON MOTTA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.738.495 expedida en Barranquilla, me permito certificar que desempeñé labores como SUPERVISOR del del contrato de obra N° 262 del 13 de octubre de 2022, durante el periodo comprendido entre el 20 de junio de 2023 a 12 de julio de 2023, el objeto, los periodos y los valores de dicho contrato se describen a continuación:

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	262 del 13 de Octubre de 2022
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
Nit o C.C. No.	13.722.479
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$ 287.514.037,00
VALOR ADICIONAL	$ 150.084.139,70
VALOR TOTAL:	$ 437.598.176,70
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL 2	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL 3	VEINTE (20) DIAS
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DIAS
NOMBRE SUPERVISOR	ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
FECHA DE INICIACION:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	22 DE AGOSTO DE 2023

Dada en Bucaramanga a los siete (7) días de septiembre de 2023

Ing. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Supervisor contrato
Secretaria de Infraestructura

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

CERTIFICACIÓN DE APORTES

Yo, CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía 13.722.479 de Bucaramanga (Santander) en calidad de Contratista y ANA PATRICIA SANTAMARÍA MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía número 63.512.736, expedida en Bucaramanga, y tarjeta profesional T.P 117264–T, en calidad de CONTADOR PUBLICO de CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, de acuerdo con la ley 789 de 2002 manifestamos bajo gravedad de juramento que el contratista anteriormente mencionado no presenta obligaciones pendientes de pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de seguridad social y parafiscales en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2022 al 22 de agosto de 2023.

Dado en Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023.

Atentamente:

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
CC. 13.722.479 de Bucaramanga
Contratista
Cajs_75@hotmail.com
Móvil: 316 744 0198

ANA PATRICIA SANTAMARÍA MEDINA
Contador Publico
T.P 117264-T

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

Ana Patricia Santamaria Medina Contador Publico
T.P 117264-T

PAZ Y SALVO

Yo, **ANA PATRICIA SANTAMARÍA MEDINA**, identificada con cédula de ciudadanía *número 63.512.736, expedida en Bucaramanga, y tarjeta profesional T.P 117264–T, en* calidad de **CONTADOR PÚBLICO** del contratista **CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ**, identificado con cédula número 13.722.479 de Bucaramanga, hago constar que la empresa amortizó el anticipo entregado por parte del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, con motivo de la ejecución del contrato No. 262 de 2022.

Dado en Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023.

Ana Patricia Santamaría Medina Contador Publico

T.P 117264-T

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

Periodo: (01-11-2022 al 28-12-2022, del 31-01-2023 al 28-02-2023, y 01-06-2023 hasta el 22-08-2023)



SUPERVISOR DE OBRA: ING. EDGAR BAYONA FLOREZ

CONTRATISTA: CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

EDGAR BAYONA FLOREZ.
Supervisor de obra
Septiembre de 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

El contrato de obra fue adjudicado mediante el proceso de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 262 de 2022, al contratista **CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ**, en representación propia y su contrato fue suscrito el día 13 de octubre de 2022 con la siguiente información:

CONTRATO:	262 del 13 de octubre de 2022.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ CC: 13.722.479
SUPERVISOR DE OBRA:	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2022.
PLAZO ADICIONAL 1:	1 mes
PLAZO ADICIONAL 2:	2 meses
PLAZO ADICIONAL 3:	20 días
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	22 de agosto de 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 287.514.037
VALOR ADICIONAL:	$ 150.084.139,70
VALOR TOTAL:	$ 437.598.176,70

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
Cumplimiento B100029707
Extracontractual No B100007005

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP No 9644 18/10/2022

POLIZAS No: B100029707
B100007005

AMPAROS:

Cumplimiento del contrato	2023-10-13* 2023-12-23
Buen manejo de Anticipo	2023-10-13* 2023-12-23
Estabilidad de la obra	2023-10-13* 2028-08-23
Salarios y prest. Sociales	2023-10-13* 2026-08-23
Responsabilidad Civil	2023-10-13* 2023-08-23

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CUADRO DE RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO	262 del 13 de octubre de 2022.
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS CAIV, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".
FECHA DEL CONTRATO	13 de octubre de 2022.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$287.514.037,00.
VALOR ANTICIPO (30%)	$86.254.211,00.
CONTRATISTA	CARLOS ÁNDRES JAIMES SUAREZ.
SUPERVISOR	EDGAR BAYONA FLOREZ.
FECHA DE INICIO	01 de Noviembre de 2022.
FECHA DE SUSPENSION N°1	28 de diciembre de 2022.
FECHA DE REINICIO N°1	31 de enero de 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2	28 de febrero de 2023.
FECHA DE REINICIO N°2	01 de junio de 2023.
PLAZO INICIAL	Dos (2) meses (60 días calendario).
PLAZO ADICIONAL N° 1	Un (1) mes (30 días calendario).
PLAZO ADICIONAL N° 2	Dos (2) meses (60 días calendario).
PLAZO ADICIONAL N°3	Veinte (20 días calendario).
PLAZO TOTAL ACUMULADO	5 meses y veinte (20) días (170 días calendario).
VALOR ADICIONAL	$ 150.084.139,70.
VALOR ACTUALIZADO	$ 437.598.176,70.
FECHA DE TERMINACION	22 de agosto de 2023.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	No. 4376 del 21 de julio de 2022.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	No. 3530 del 13 de abril de 2023.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	No. 9644 del 18 de octubre de 2022.

CUADRO DE RESUMEN DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD DE LA OBRA	B-100029707	13/10/2022	23/08/2028	$ 57.502.807,40
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100007005	13/10/2022	23/08/2023	$ 200.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100029707	13/10/2022	23/08/2026	$ 28.751.403,70
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	B-100029707	13/10/2022	23/12/2023	$ 57.502.807,40
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	B-100029707	13/10/2022	23/12/2023	$86.254.211,00

1. INTRODUCCIÓN

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA a través de la Secretaría de Infraestructura, previo el procedimiento de inscripción en el banco de proyectos del Municipio de Bucaramanga del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"**.

El presente informe de supervisión tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, ambiental y contable sobre la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista del contrato de obra pública N° 262 del 13 de Octubre de 2022, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"** celebrado entre el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, durante el período comprendido entre el 01/11/2022 al 30/12/2022, del 31/01/2023 al 30/03/2023 y del 01/06/23 hasta el 22/08/2023.

De igual manera, resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Secretaria de Infraestructura en cabeza del supervisor designado ing. Edgar Bayona Flórez durante el mismo período mencionado anteriormente, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y el estado del contrato y de la obra pública que nos ocupa.

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones destinadas a lograr la optimización de los recursos disponibles por parte del Contratista con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato y las metas físicas alcanzables al inicio del mismo.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 8
3. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO 10
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 11
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL A ACTIVIDADES LEGALES 11
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A ACTIVIDADES TECNICAS 11
7. SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROGRAMA DE OBRA E INVERSION 12
8. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN 12
9. SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12
10. CORRESPONDENCIA GENERADA: 13
11. CONTRATO DE OBRA 13
11.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 13
11.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA DURANTE EL PERIODO 14
11.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 14
11.2.2 ACTIVIDADES LEGALES 14
11.2.3 GARANTÍA ÚNICA (VIGENCIA) 15
11.2.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS 15
11.3 ESTADO DEL TIEMPO 30
11.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA 30
11.5 EQUIPO DEL CONTRATISTA 31
11.6 PROGRAMACIÓN DE OBRA 31
11.7 VALOR EJECUTADO 34
12. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 42
13. ANEXOS 42
13.1 PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 42
13.2 MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA 42
13.3 INFORME HSEQ 42
13.4 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GERENCIA DEL PROYECTO 42
13.5 BITACORA DE OBRA 42
13.6 REGISTRO FOTOGRAFICO 42
REGISTRO FOTOGRAFICO 43

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto: **"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"**.

Este proyecto pretende atender las necesidades en el mejoramiento y obras complementarias a las instalaciones del centro de atención y reparación integral de las víctimas (CAIV) del municipio de Bucaramanga, Santander, realizando en sí mantenimiento a los acabados de pared para la fachada exterior/interior mediante frisos allanados sobre pared con mortero 1:4 impermeabilizado de espesor de 2 cm, incluyendo filos y dilataciones, aplicación del estuco plástico a la pared sobre el friso y de la pintura vinilo tipo I para la pared interior 3 manos sobre el estuco y de la pintura acrílica exterior sobre la pared y sócalo previamente estucado, la impermeabilización de la cubierta con manto asfáltico 4.2mm como también de la aplicación de la pintura vinilo tipo I interior sobre pared, cerchas metálicas- correas, y parales metálicos en la parte inferior de la teja ubicado en el patio central de las instalaciones CAIV.

Desmonte del letrero y cielo raso existes en las oficinas de la unidad de atención a víctimas, personería y alcaldía, en los baños públicos, en el pasillo de la entrada principal y el de la ludoteca para su posterior suministro e instalación de letrero en acrílico, incluyendo instalación a pared y del nuevo cielo raso respectivamente, elaborado en láminas de yeso ½" incluyendo los acabados de pintura vinilo tipo I, adecuación de los acabados de pisos interiores por medio del suministro e instalación de enchape piso en cerámica tipo porcelanato, formato 60cm x 60cm, institucional, antideslizante incluyendo guardaescobas del mismo tipo de porcelanato de ancho de 8 cm; Como también el suministro e instalación de piso en vinilo, incluyendo el guardaescobas de ancho de 8 cm. La intervención de la deteriorada losa de entre piso del patio trasero y a su vez la fabricación de una caja de Inspección de aguas residuales de 60 x 60 x 60 cm, en mampostería tipo temosa, incluyendo losa de piso en concreto 3000 psi, de espesor de 7cm y tapa en concreto reforzado de 3000 psi, de espesor de 5cm.


El reemplazo de la luminaria y demás componentes eléctricos para renovando las redes de datos, Wifi, y CCTV, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de las redes eléctricas vigentes en Colombia (RETIE), del mantenimiento de equipos mini split e instalación de dispositivos correctivos mediante el suministro e instalación equipos y elementos del sistema, así como del suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220 y del suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220 en las oficinas de la unidad de atención a víctimas, personería, alcaldía, y salones de capacitación del SENA.

Fue necesario adicionar el cerramiento a la demolición y construcción de nuevo "muro medianero (costado oriental - parqueadero)", esto debido en gran parte a que el muro se encuentra elaborado de tierra pisada, y por su condición actual de deterioro, abandono y su

falta de mantenimiento ha hecho que el muro no sea seguro frente a un evento sísmico incumpliendo así con la normativa vigente presente (NSR-10). Se construirá unas cajoneras empotradas en madera RH para los espacios existentes entre las ventanas de la oficina de la alcaldía en las instalaciones del (CAIV) de espesor 15mm, abierta, ancho variable de 1,50m - 1,80m, altura 1,20 m y profundidad 0,35 m, con tapas laterales, superior y trasera, incluye manijas y divisiones para el uso de archivadores.

Para finalizar esta intervención obedece a la conservación de la arquitectura colonial española existente es por esto que se hace necesario suministrar e instalar alerones en estructura de madera para adornar las ventanas y la puerta principal al exterior de la fachada principal de instalaciones del (CAIV) del municipio de Bucaramanga, logrando así hacer juego con los colores escogidos para la pintura acrílica exterior tanto para la pared como para el sócalo, además se incluye el mantenimiento de la pintura a las ventanas metálicas y de la puerta existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior. Esto con el propósito principal de establecer al (CAIV) como modelo tipo para las futuras obras complementarias y de mejoramientos a predios pertenecientes al municipio y que forman parte del centro histórico y cultural de nuestra ciudad, y que de esta forma esta iniciativa busca sumarse a las labores de revitalización del centro que actualmente se están ejecutando en la capital santandereana. Este esquema se aprecia en la siguiente ilustración.

Ilustración 1. Esquema modelo tipo fachada exterior CAIV.

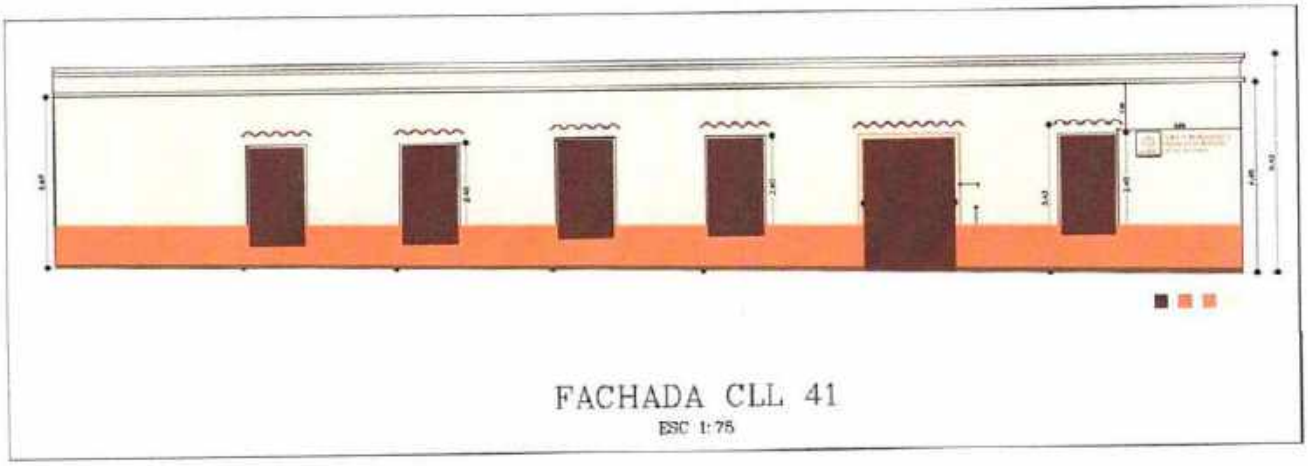

3. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO





La intervención es en la comuna 15, específicamente en la dirección Calle 41 # 13-08, Barrio García Rovira, Bucaramanga, Santander. Cuenta con una planta de un nivel el cual está distribuido por el patio central en donde se encuentran las salas de oficinas, sala de informática, sala de reuniones, sala de psicología, área de baños, pasillo de acceso al patio trasero, cafetería y la sala de ludoteca.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas del proyecto incluyen la documentación entregada por el Municipio de Bucaramanga, a saber: Estudios Previos, Pliego de Condiciones Definitivo, Especificaciones técnicas, - Análisis de Precios Unitarios, - Listado de equipos y herramientas- - Listado de mano de obra, - Listado de materiales, Discriminación de AU, - Programación de obra, - Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, cantidades y precios) y Planos de diseño del sitio de intervención.

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL A ACTIVIDADES LEGALES

A la fecha, se han suscrito las siguientes actas del Contrato obra pública No. 262 de 2022:

ACTA	FECHA
Acta de Inicio	Noviembre 01 de 2022
Acta de Anticipo	Diciembre 07 de 2022
Acta de Suspensión al Plazo N°1	Diciembre 28 de 2022
Acta de Reinicio de Contrato N°1	Enero 31 de 2022
Acta de Pactación de Precios Unitarios N° 1	Febrero 24 de 2023
Adicional N° 1 en plazo	Febrero 02 de 2023
Acta de Suspensión al Plazo N°2	Febrero 28 de 2023
Acta de Reinicio de Contrato N°2	Junio 01 de 2023
Adicional N°2 en valor y plazo	Abril 13 de 2023
Acta Aclaratoria al acta de Reinicio N°2 del plazo del contrato	Junio 20 de 2023
Adicional N°3 en plazo	Agosto 01 de 2023

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A ACTIVIDADES TECNICAS

Se ha mantenido el control y seguimiento en las actividades ejecutadas para este periodo, donde se han intervenido a las instalaciones del centro de atención y reparación integral de las víctimas (CAIV) del municipio de Bucaramanga, Santander.

Adicional en tiempo	Se solicitaron tres adicionales de tiempo para cumplir a cabalidad con el objeto de contrato.
Balance de Obra.	Se realizó la elaboración y revisión del Balance de obra, actividad ejecutada conjuntamente con el Contratista, con el fin de ajustar las cantidades a las necesidades del proyecto.
Adición de ítems no previstos	Se han requerido ítems de obra no previstos, los cuales fueron pactados en las actas de Pactación de precios No. 1, y No. 2.

Registro fotográfico	La supervisión mantiene un registro fotográfico por medio del cual se visualiza el estado inicial de lo intervenido, y el avance de las obras a la fecha de cierre de este informe. Se muestra un registro fotográfico para cada una de las actividades realizadas durante el periodo.

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROGRAMA DE OBRA E INVERSION

La Supervisión en sus funciones de vigilancia y control, ha realizado seguimiento a los Programas de Trabajo del contratista de obra, evaluando el avance de obra semanal por actividades.

Descripción y Cantidades de Las Actividades Programadas y Ejecutadas	En este se comprende la ejecución del presupuesto de obra y las cantidades ejecutadas.
Control cronograma de avance de obra	Se realiza un seguimiento y monitoreo al Programa de Trabajo vigente presentado por el Contratista.

8. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN

La Supervisión ha venido efectuando el seguimiento a la programación vigente entregada por el contratista de obra, actualizada según el adicional N°2 en valor y plazo, correspondiente al contrato de obra pública inspeccionado.

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Supervisión ha efectuado el seguimiento a las actividades realizadas por el contratista con el fin de preservar la seguridad y salud de sus trabajadores y subcontratistas, vigilando que se cumpla con la normatividad legal colombiana en materia laboral y se implemente satisfactoriamente el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.

Informe HSEQ	El contratista cuenta con un profesional HSEQ, el cual hace verificación en campo del cumplimiento de: Entrega de la dotación mínima, Entrega de los EPP, Afiliaciones y Planillas de pago del personal técnico y administrativo, Señalización de obra, y la correcta implementación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

Para más información, remitirse al Informe HSEQ elaborado por la profesional HSEQ del contratista, el cual se anexa a este informe.

10. CORRESPONDENCIA GENERADA:

FECHA	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
13/06/2023	Ratificar solicitud de permiso y espacio interno para la realización de los trabajos correspondientes al C.O.P No. 262 del 2022.	CARLOS ANDRÉS JAIMES SUAREZ	ARRENDATARIO O PROPIETARIO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 41#13-36.
13/06/2023	Solicitud de permiso para ingresar al espacio interno para la realización de los trabajos del muro medianero correspondientes al C.O.P No. 262 del 2022.	DORIS HERNANDEZ SANTOS	EDGAR CRUZ

11. CONTRATO DE OBRA

11.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato N°:	262 del 13 de octubre de 2022
Objeto: "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	
Valor Inicial:	$ 287.514.037,00
Adición en Valor N°1:	$ 150.084.139,70
Valor Total:	$ 437.598.176,70
Contratista	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ Identificado con cédula de ciudadanía 13.722.476.
Contratante	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor de obra:	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ, Profesional Universitarios de la Secretaria de Infraestructura.
Plazo Inicial:	Dos (2) meses. (60 días calendario).
Plazo Adicional N° 1:	Un (1) mes. (30 días calendario).
Plazo Adicional N° 2:	Dos (2) meses. (60 días calendario).
Plazo Adicional N°3:	Veinte (20) días. (20 días calendario).
Plazo Total	Cinco (5) meses y veinte (20) días. (170 días calendario).
Fecha de Inicio:	Noviembre 01 de 2022
Fecha de Terminación inicial:	Diciembre 30 de 2022

Fecha de Suspensión N° 1:	Diciembre 28 de 2022
Fecha de Reinicio N° 1:	Enero 31 de 2023
Fecha de Terminación N°2:	Febrero 02 de 2023
Fecha de Suspensión N° 2:	Febrero 28 de 2023
Fecha de Reinicio N° 2:	Junio 01 de 2023
Fecha de Terminación N°3:	Agosto 02 de 2023
Plazo Adicional N° 3:	Veinte (20) días. (20 días calendario).
Fecha de Terminación N°4:	Agosto 22 de 2023.
Municipio:	Bucaramanga

11.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA DURANTE EL PERIODO

11.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante este periodo, el contratista ha desarrollado las siguientes actividades administrativas:

- Asistencia a los comités técnicos virtuales programados por el Municipio de Bucaramanga desarrollados en la plataforma Microsoft Teams.
- Elaboración de balances de obra.
- Pago de planillas del personal de obra al Sistema de Seguridad Social.
- Participación en la elaboración de la bitácora técnica de la obra.
- Elaboración presente informe.

11.2.2 ACTIVIDADES LEGALES

ACTA	FECHA
Acta de Inicio	Noviembre 01 de 2022
Acta de Anticipo	Diciembre 07 de 2022
Acta de Suspensión al Plazo N°1	Diciembre 28 de 2022
Acta de Reinicio de Contrato N°1	Enero 31 de 2022
Acta de Pactación de Precios Unitarios N° 1	Febrero 24 de 2023
Adicional N° 1 en plazo	Febrero 02 de 2023
Acta de Suspensión al Plazo N°2	Febrero 28 de 2023
Acta de Reinicio de Contrato N°2	Junio 01 de 2023
Adicional N°2 en valor y plazo	Abril 13 de 2023
Acta Aclaratoria al acta de Reinicio N°2 del plazo del contrato	Junio 20 de 2023
Adicional N°3 en plazo	Agosto 01 de 2023

11.2.3 GARANTÍA ÚNICA (VIGENCIA)

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD DE LA OBRA	B-100029707	13/10/2022	23/08/2028	$ 57.502.807,40
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100007005	13/10/2022	23/08/2023	$ 200.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	B-100029707	13/10/2022	23/08/2026	$ 28.751.403,70
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	B-100029707	13/10/2022	23/12/2023	$ 57.502.807,40
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	B-100029707	13/10/2022	23/12/2023	$87.254.211,00

11.2.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo del presente informe, el contratista ha desarrollado las siguientes actividades en obra:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**			
1.1	**MEDICIONES**			
1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	855,96	$ 2.057,00
1.2	**DESMONTES**			
1.2.1	Desmonte de muro divisorio liviano, incluye cargue y retiro	m2	31,92	$ 11.446,00
1.2.2	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro	m2	247,83	$ 13.540,00
1.2.3	Desmonte de letrero existente	und	1,00	$ 367.839,00

1.3	**DEMOLICIONES**				
1.3.1	Demolición de friso muros, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final	m2	587,43	$	12.857,00
1.3.2	Demolición de piso y alistado en mortero con martillo eléctrico, incluye , cargue, retiro y disposición final	m3	40,76	$	178.247,00
1.3.3	Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	0,56	$	217.357,00
2,00	**CONCRETOS**				
2.1	**PLACA DE PISO**				
2.1.1	Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio.	m3	26,64	$	1.081.464,00
3	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**				
3.1	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				
3.1.1	Malla electro soldada	kg	585,97	$	10.429,00
4	**CUBIERTAS Y CANALES**				
4.1	**CUBIERTAS**				
4.1.1	Impermeabilización y mantenimiento de cubierta con manto asfáltico 4.2mm modificado con polipropileno atáctico. Incluye pintura reflectiva con base asfáltica	m2	411,60	$	109.687,00
5	**CIELOS RASOS**				
5.1	**CIELO RASOS EN DRY WALL**				

5.1.1	Cielo raso en lámina de yeso regular 1/2", incluye acabado en pintura vinilo tipo 2	m2	239,63	$	61.729,00
5.1.2	Suministro e instalacion de canaleta en pvc para ducteria de aires	ml	0,00	$	59.440,00
6	**RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA**				
6.1	TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA				
6.1.1	Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	m	30,80	$	13.350,00
6.1.2	Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 2", incluye accesorios de conexión	m	0,00	$	59.636,00
6.2	**PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA**				
6.2.1	Pasamuros 4" H.G. 304 schedule 40, L=65cm	und	0,00	$	442.665,00
7	**RED AGUA LLUVIA**				
7.1	**TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA**				
7.1.1	Red agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	m	6,00	$	50.596,00
8	**ACABADOS DE PARED**				
8.1	**FRISOS Y ESTUCOS PARED**				
8.1.1	Friso allanado sobre pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones	m2	807,82	$	35.758,00

8.1.2	Estuco plástico pared interior y/o exterior	m2	1066,96	$	16.640,00
8.2	**PINTURA PARED**				
8.2.1	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos	m2	1133,84	$	17.679,00
8.2.2	Pintura acrílica exterior pared, sobre estuco, dos manos.	m2	261,49	$	20.005,00
8.2.3	Pintura acrilica exterior sócalo, sobre estuco, dos manos, color RAL 7016 o similar	m2	74,53	$	20.005,00
9	**ACABADOS DE PISOS**				
9.1	**MORTEROS DE NIVELACIÓN**				
9.1.1	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm.	m2	209,49	$	66.094,00
9.2	**ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR**				
9.2.1	Piso en mortero autonivelante con arena de cuarzo fina pigmentada de color gris claro, espesor 2cm.	m2	0,00	$	81.406,00
9.3	**GUARDA ESCOBA Y MEDIACAÑA**				
9.3.1	Piso en mortero autonivelante con arena de cuarzo fina pigmentada de color gris claro, espesor 2cm. Para guardaescoba	ml	0,00	$	49.455,00
	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS				
10.1	**PUERTAS**				

10.1.1	Mantenimiento de puerta metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y poliuretano	m2	51,95	$	51.202,00
10.2	**VENTANAS**				
10.2.1	Ventana corrediza de aluminio 5020 y vidrio incoloro de 4 mm	m2	3,24	$	299.843,00
10.2.2	Mantenimiento pintura de ventana metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior	m2	32,57	$	62.652,00
11	**SEÑALIZACIÓN**				
11.1.1	Suministro e instalacion de Letrero en acrilico, incluye instalación a pared	und	1,00	$	866.775,00
12	**AIRE ACONDICIONADO**				
12.1.1	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 36000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und	1,00	$	5.126.502,00
13	**ASEO Y LIMPIEZA**				
13.1.1	Aseo y limpieza.	m2	855,96	$	3.433,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MINI SPLIT E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS CORRECTIVOS					
14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS DEL SISTEMA**				
14.1	**Mantenimiento Unidades Multi Split**				

14.1.1	Revision y mantenimiento de equipo mini split (Condensadora+evaporadora)	und	7,00	$	412.551,00
14.2	**Tuberia del sistema Mini Split**				
14.2.1	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 1/2" incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	m	52,4	$	79.066,00
14.2.2	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 3/8" incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	m	6,88	$	72.371,00
14.2.3	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 1/4' (3/8 R) incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	m	50,80	$	92.629,00
14.2.4	Suministro, Instalacion y Soporte de tuberia 3/4" de PVC de alta presion soldada y aislada con Rubatex para drenaje	m	0,00	$	79.261,00
14.3	**Suministro de dispositivos correctivos**				
14.3.1	Suministro e instalacion de tarjeta de control de operación del equipo condensador de un sistema Mini Split	und	0,00	$	613.357,00
14.3.2	Suministro e instalacion de tarjeta de control de operación del equipo evaporador de un sistema Mini Split	und	0,00	$	421.058,00
RED DE DATOS, WIFI Y CCTV					

15	**CABLEADO UTP ÁREA DE TRABAJO**			
15.1.1	Suministro e instalación de Patch cord CAT 6A 7ft, azul.	UND	15,00	$91.235,00
15.2	**SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN**			
15.2.1	Suministro e instalación de cable UTP cat 6A color azul	ML	504,00	$13.665,00
15.2.2	Suministro e instalacion de Face Plate sencillo cat 6A	UND	10,00	$24.233,00
15.2.3	Suministro e instalacion de Face Plate dobles cat 6A	UND	5,00	$ 27.810,00
15.2.4	Suministro e instalación de Amarre de Velcro. Pk 10 para moños de 12 cables	UND	10,00	$ 2.940,00
15.2.5	Suministro e instalación de Jack módulo para herraje color azul de 24 puertos	UND	12,00	$ 66.722,00
15.2.6	Suministro e instalación de Patch cord 10G, 5ft, azul.	UND	16,00	$ 77.295,00
15.2.7	Suministro e instalacion de Rack de 9U de pared	UND	1,00	$ 1.200.145,00
15.2.8	Suministro e instalacion de patch pannel 24 puertos	UND	1,00	$ 1.863.860,00
15.2.9	Suministro e instalacion de organizador horizontal 1 con tapa de alta capacidad	UND	1,00	$ 198.856,00

15.2.10	Suministro e instalación de Mutitoma Horizontal con 12 toma corrientes NEMA 5-15P, Especializada para equipos de comunicaciones	UND	1,00	$ 367.572,00
15.2.11	Marquillado general de rack	GLB	0,00	$ 537.625,00
15.2.12	Certificaciones de punto UTP	PTO	0,00	$ 28.471,00
15.3	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**			
15.3.1	Suministro e instalación de puesta a tierra para centro de cableado. Incluye barra de puesta a tierra para rack sello UL, Conector de puesta a tierra y Barra puesta a tierra para centro de cableado de acuerdo a estandar BICSI/J-STD-606-A	UND	1,00	$1.877.906,00
15.4	**UPS**			
15.4.1	Suministro e Instalación UPS on-line 3000 VA/2500W, FP 0,8 120 V, onda seno pura. Clavija entrada I5-30p, autonomia 5/14 minutos	UND	1,00	$6.361.576,00
	EQUIPOS ACTIVOS			
15.5	**SWITCHES**			
15.5.1	SWITCH DE ACCESO 24 RJ45 PUERTOS PoE	UND	1,00	$ 6.186.650,00
	DUCTERIA Y ACCESORIOS			
15.6	**DATOS, WIFI Y CCTV**			
15.6.1	Suministro e instalacion de canaleta con tabique de separacion	ML	36,00	$31.994,00

15.6.2	Suministro e instalacion de Tuberia EMT 1" y demas accesorios de instalacion y marcacion para ambientes TI	ML	0,00	$46.118,00
15.6.3	Suministro e instalacion de cajas Radwell 5800	UND	4,00	$19.587,00
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
16.1.1	Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar.	UND	2,00	$ 526.377,00
16.1.2	Instalación y conexión de equipo existente (ventilador, camara cctv, sonido, campana), incluye base y accesorios de instalación.	UND	0,00	$ 45.844,00
16.1.3	Instalación y conexión de equipos de Aire Acondicionado, incluye accesorios de instalación.	UND	11,00	$ 134.727,00
16.2	**CANALIZACION DE BAJA TENSION**			
16.2.1	Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1", y demas accesorios de instalación y marcación.	ML	55,36	$ 51.221,00
16.2.2	Regata y resane de traslado para puntos electricos y de comUnicaciones.	ML	175,96	$ 36.519,00
16.3	**REDES**			

16.3.1	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 3x8 + 1x8N + 1x8T LSHF (Libre de halogenos). Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	127,40	$	50.972,00
16.3.2	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	ML	98,92	$	15.212,00
16.4	**ESTRUCTURAS**				
16.4.1	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra.	UND	2,00	$	444.621,00
16.4.2	Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de inspección para electrodo de puesta a tierra.	UND	0,00	$	146.739,00
16.4.3	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	UND	0,00	$	575.895,00
16.5	**EQUIPOS**				
16.5.1	Suministro, transporte e instalación de UPS 3 kVA Monofasica incluye ByPass, acomedita y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	1,00	$	6.497.706,00

16.5.2	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T36-3F empotrable Mini Pragma de 36 Módulos - 63 A - REF MIP20312T demás accesorios de instalación y señalización.	UND	2,00	$	679.972,00
16.5.3	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T24-3F empotrable MINI PRAGMA de 24 Módulos - demás accesorios de instalación y señalización.	UND	2,00	$	470.247,00
16.5.4	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x15 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	23,00	$	23.481,00
16.5.5	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	8,00	$	23.481,00
16.5.6	Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x70A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye marcación RETIE.	UND	2,00	$	544.812,00
16.5.7	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 2x30 A, 220-127V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	0,00	$	45.785,00
16.6	**INTERIOR**				

16.6.1	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	0,00	$	118.103,00
16.6.2	Suministro, transporte e instalación de luminaria BALA DIMERIZABLE (zona limpia), 8W, 4000K, IP65. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	0,00	$	131.086,00
16.6.3	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	50,00	$	186.285,00
16.6.4	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	41,00	$	376.757,00

16.6.5	Suministro, transporte e instalación de driver de emergencia es ref ELD07, autonomia 90 minutos con 5 años de garantia. El driver debe permitir que la luminaria pueda ser utilizada tanto en operación normal como en emergencia. incluye batería, cargador, circuito inversor, cableado, accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	0,00	$	411.726,00
16.6.6	Suministro, transporte e instalación de PANEL LED SLIM 40W 60X60cm - 100.000 horas - dimerizable o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	45,00	$	339.807,00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				
NP. 01	Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelana tipo porcelanato institucional antideslizante, ancho 8cm.	ml	79,97	$	24.672,00
NP. 02	Suministro e instalacion de enchape piso en ceramica tipo porcelanato, formato 60cm x 60cm, institucional, antideslizante.	m2	130,00	$	94.496,00
NP. 03	Demolicion muro en tapia medianero, espesor 62cm, incluye transporte escombros.	m3	45,48	$	51.812,00

NP. 04	Cerramiento con madera rolliza y tela polipropileno, altura 2,50m.	ml	25,00	$	26.407,00
NP. 05	Excavacion manual en material comun, incluye retiro.	m3	5,05	$	55.501,00
NP. 06	Relleno compactado con material seleccionado de prestamo.	m3	7,34	$	67.349,00
NP. 07	Concreto Solado 1500 psi, espesor 5cm.	m2	10,11	$	39.045,00
NP. 08	Concreto 3000 psi para viga de cimentación, sección 30cm x 40cm.	ml	16,30	$	162.575,00
NP. 09	Concreto 3000 psi para columna sección 20cm x 40cm.	m3	1,62	$	1.432.215,00
NP. 10	Concreto 3000 psi viga sección 20cm x 20cm.	ml	48,90	$	106.847,00
NP. 11	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.	kg	976,59	$	13.015,00
NP. 12	Mamposteria H-15 ladrillo de arcilla.	m2	34,69	$	90.212,00
NP. 13	Filtro con Geodren planar diam. 4", altura 0,50m.	ml	0,00	$	107.000,00
NP. 14	Alfajia en concreto de 3000 psi seccion 0,30m x 0,04m.	ml	16,40	$	43.040,00
NP. 15	Suministro e instalación de cajonera empotrada en madera RH, espesor 15mm, abierta, ancho variable 1,50m - 1,80m, altura 1,20 m y prof. 0,35 m, con tapas laterales, superior y trasera, incluye manijas y divisiones.	und	5,00	$	2.507.691,00

NP. 16	Suministro e instalación de tranca para ventana tipo pasador en madera zapan o similar, long.variable 1,20m a 1,50m, sección 4cm x 8cm, incluye pintura en esmalte y soportes laterales metalicos.	und	0,00	$	137.296,00
NP. 17	Suministro e instalación de ventana metalica de 1,38 m x 2,40 m, incluye marco, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color madera, similar a existentes	und	2,00	$	1.531.148,00
NP. 18	Alerones en estructura de madera sobre ventanas y puerta principal, ancho 0,35m, incluye viguetas, techo en machimbre impermebilizado y teja de barro tipo española.	ml	23,00	$	164.400,00
NP. 19	Suministro e Instalacion de piso en vinilo.	m2	64,76	$	271.135,00
NP. 20	Guardescoba en Vinilo, altura 8cm.	ml	30,98	$	34.406,00
NP. 21	Suministro e instalación de correas metálicas para soporte estructural del cielo raso.	ml	102,25	$	84.320,00
NP. 22	Mamposteria en ladrillo temosa de arcilla, espesor 18 cm.	m2	14,16	$	140.382,00
NP. 23	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und	2,00	$	2.006.068,00

NP. 24	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 24000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und	1,00	$	3.884.338,00
NP. 25	Caja de Inspección de aguas residuales de 60 x 60 x 60, en mampóstería tipo temosa, incluye losa de piso en concreto 3000 psi, e=7cm y tapa en concreto reforzado de 3000psi, e=5cm..	und	1,00	$	572.217,00
NP. 26	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED, 12W o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación.	und	12,00	$	68.730,00
NP. 27	Suministro e instalación de ventana con marco metalico de 1,97m x 0,90 m, en tubo cuadrado 3/4 , incluye vidrio, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color negro	m2	1,77	$	983.148,00
NP. 28	Pintura vinilo tipo 2 bajo teja asbesto cemento, dos manos.	m2	146,66	$	19.395,00

11.3 ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo de tiempo registrado en el presente informe, no se presentaron condiciones del tiempo adversas para no poder ejecutar la obra a su cabalidad.

11.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cumpliendo con lo establecido en el pliego de condiciones el contratista presento el siguiente personal técnico y profesional mínimo requerido en obra:

PERSONAL MÍNIMO CONTRATISTA			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**% DEDIC.**
1	Carlos Andrés Jaimes Suarez	Director de Obra	50 %
2	Luis Enrique Pedraza Rodríguez	Residente de Obra	100 %
3	María Mónica Herrera Herrera	Profesional HSEQ	100 %
4	Marco Antonio López García	Profesional Electricista	100 %
5	Fredy Rueda Rosas	Residente Auxiliar de Obra	100 %

El personal presentado por el contratista en su propuesta cumple con los requerimientos expuestos en el pliego de condiciones. Para información sobre el personal operativo del contratista remitirse al Informe HSEQ elaborado por la profesional María Mónica Herrera Herrera, Profesional HSEQ, el cual se anexa a este informe.


11.5 EQUIPO DEL CONTRATISTA


A continuación, se muestra una relación del equipo mínimo requerido para la obra civil que debe tener el contratista durante la ejecución del proyecto, de igual forma se presenta la cantidad en obra durante el periodo del presente informe:


EQUIPOS EN OBRA	CANTIDAD OBRA
Vibrador eléctrico de concreto	1
Vibrocompactador o apisonador	1
Compresor portátil diésel media tensión con dos martillos	1
Pulidora de mano	1
Sección de andamio certificado	1
Martillo demoledor eléctrico	1

11.6 PROGRAMACIÓN DE OBRA

La presente programación está actualizada de acuerdo al adicional No. 2 en valor y plazo aprobado para el presente contrato.

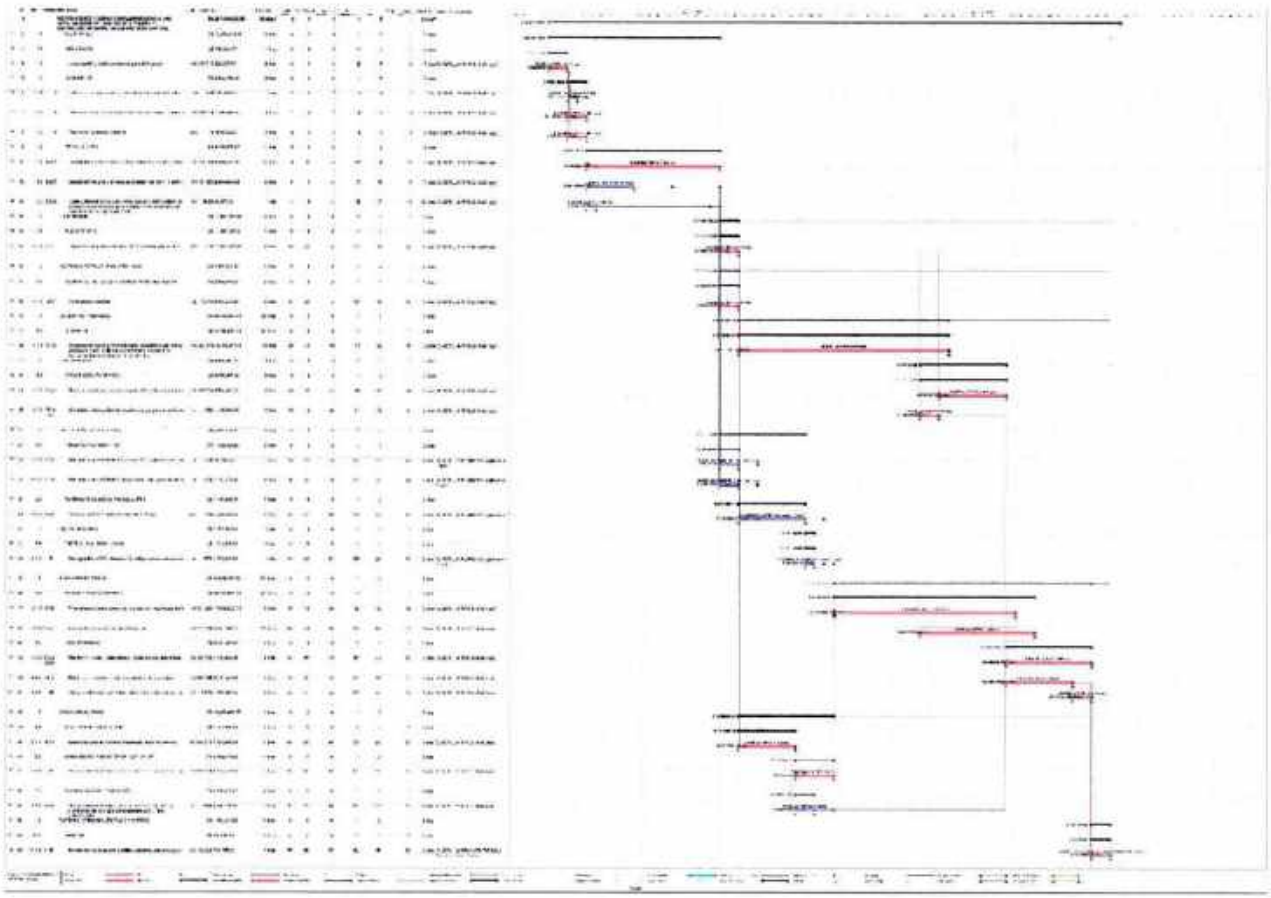

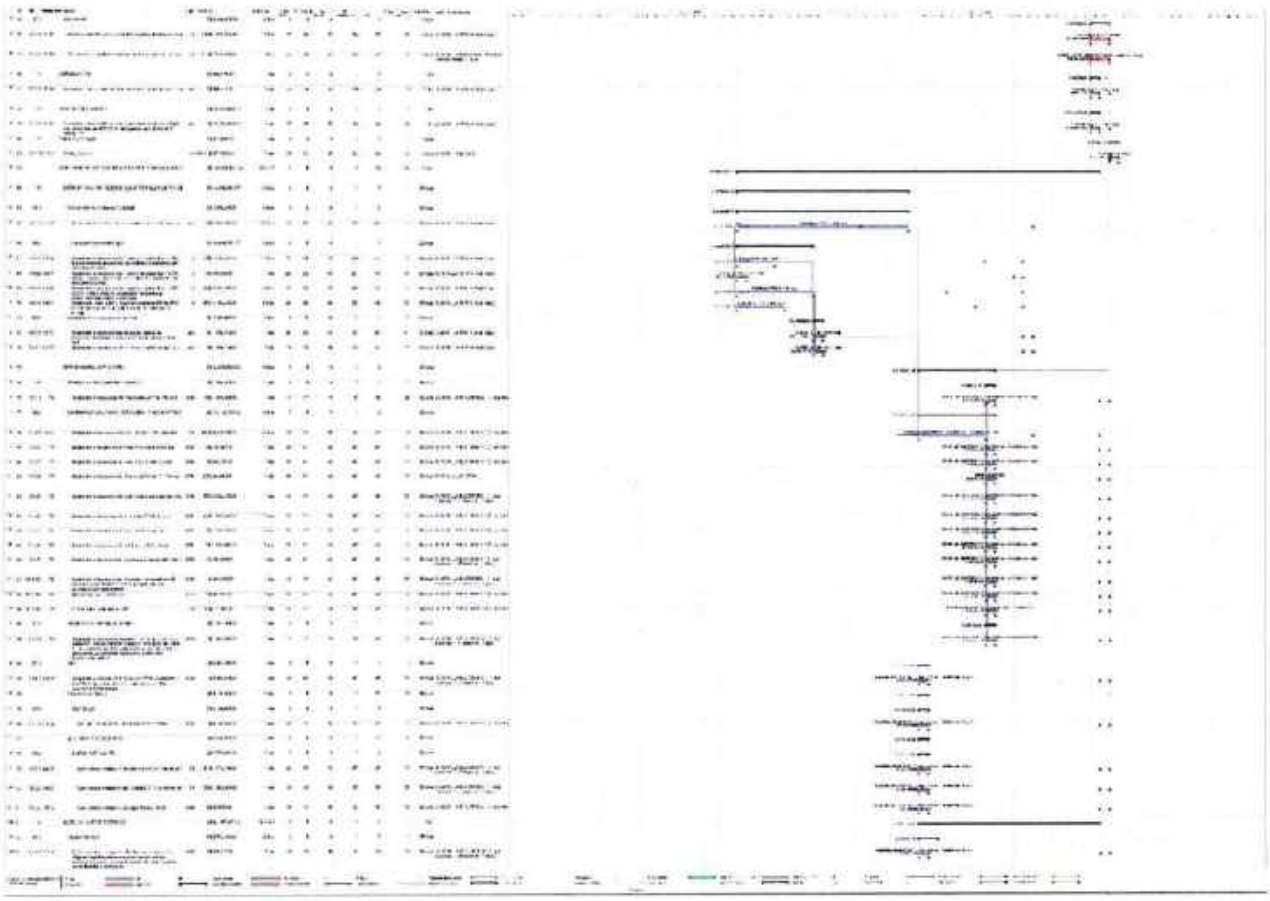

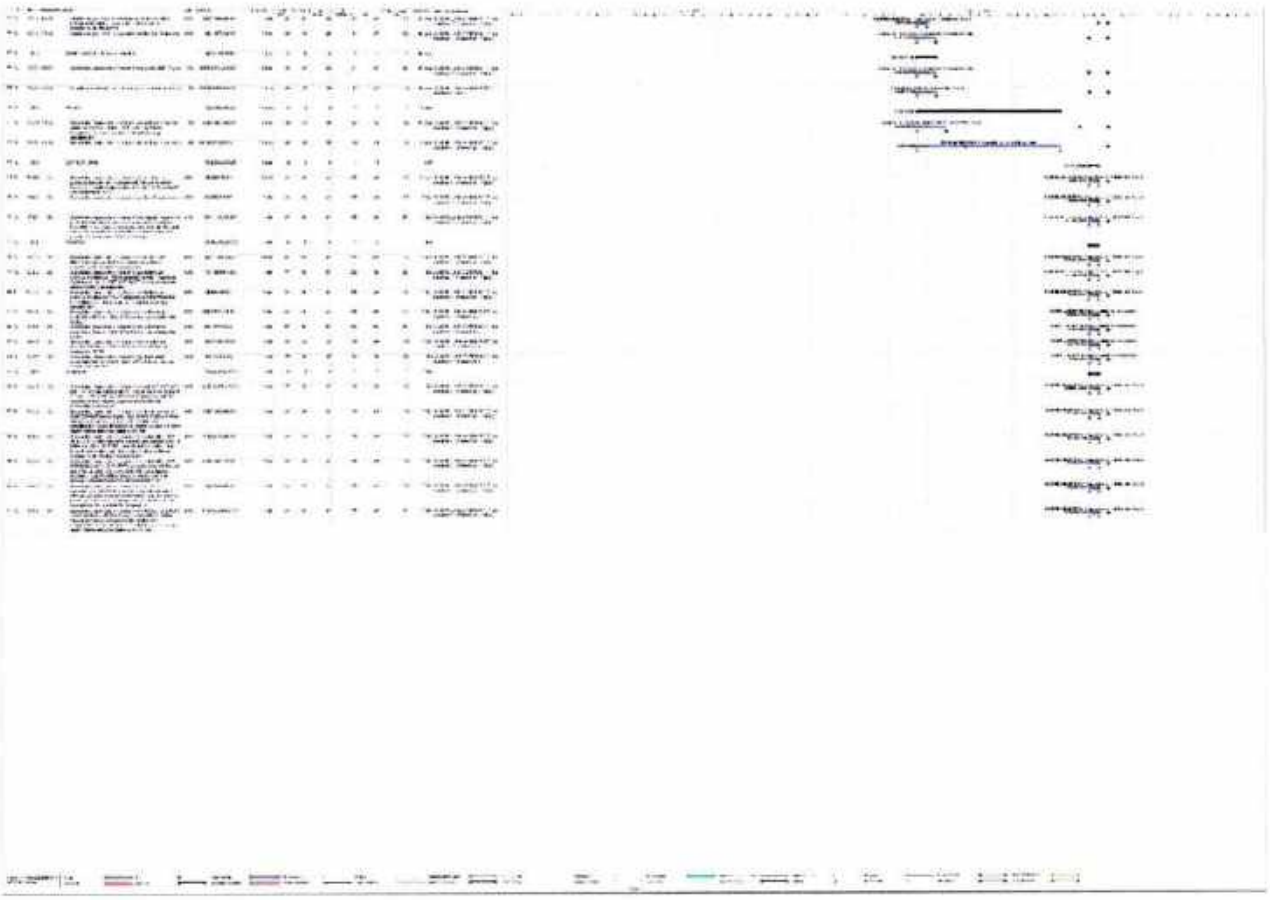

11.7 VALOR EJECUTADO

De conformidad con el acta de recibo parcial, el valor ejecutado en el periodo del presente informe, asciende a la suma de **$351.343.965,00** el cual se discrimina de la siguiente manera:

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA AJUSTADAS EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS			
		UND	VLR UND	CANT	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	MEDICIONES				
1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	$2.057,00	56,82	$ 116.878,74

1.2	**DESMONTES**				
1.2.1	Desmonte de muro divisorio liviano, incluye cargue y retiro	m2	$11.446,00	31,92	$ 365.356,32
1.2.2	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro	m2	$13.540,00	247,83	$ 3.355.618,20
1.2.3	Desmonte de letrero existente	und	$367.839,00	1,00	$ 367.839,00
1.3	**DEMOLICIONES**				
1.3.1	Demolición de friso muros, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final	m2	$12.857,00	587,43	$ 7.552.587,51
1.3.2	Demolición de piso y alistado en mortero con martillo eléctrico, incluye , cargue, retiro y disposición final	m3	$178.247,00	40,76	$ 7.265.347,72
1.3.3	Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	$217.357,00	0,56	$ 121.719,92
2,00	**CONCRETOS**				
2.1	**PLACA DE PISO**				
2.1.1	Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio.	m3	$ 1.081.464,00	26,64	$ 28.810.200,96
3	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**				
3.1	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				
3.1.1	Malla electro soldada	kg	$10.429,00	585,97	$ 6.111.081,13
4	**CUBIERTAS Y CANALES**				
4.1	**CUBIERTAS**				
4.1.1	Impermeabilización y mantenimiento de cubierta con manto asfáltico 4.2mm modificado con polipropileno atáctico. Incluye pintura reflectiva con base asfáltica	m2	$109.687,00	411,60	$ 45.147.169,20
5	**CIELOS RASOS**				
5.1	**CIELO RASOS EN DRY WALL**				
5.1.1	Cielo raso en lámina de yeso regular 1/2", incluye acabado en pintura vinilo tipo 2	m2	$61.729,00	239,63	$ 14.792.120,27
5.1.2	Suministro e instalacion de canaleta en pvc para ducteria de aires	ml	$59.440,00		
6	**RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA**				
6.1	TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA				
6.1.1	Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	ml	$13.350,00	30,80	$ 411.180,00
6.1.2	Red hidráulica PVC RDE 21 Diámetro 2", incluye accesorios de conexión	ml	$59.636,00		
6.2	**PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA**				
6.2.1	Pasamuros 4" H.G. 304 schedule 40, L=65cm	und	$442.665,00		
7	**RED AGUA LLUVIA**				

7.1	**TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA**				
7.1.1	Red agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	ml	$50.596,00	6,00	$ 303.576,00
8	**ACABADOS DE PARED**				
8.1	**FRISOS Y ESTUCOS PARED**				
8.1.1	Friso allanado sobre pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones	m2	$35.758,00	807,82	$ 28.886.027,56
8.1.2	Estuco plástico pared interior y/o exterior	m2	$16.640,00	1.066,96	$ 17.754.214,40
8.2	**PINTURA PARED**				
8.2.1	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos	m2	$17.679,00	1.133,84	$ 20.045.157,36
8.2.2	Pintura acrilica exterior pared, sobre estuco, dos manos.	m2	$20.005,00	261,49	$ 5.231.107,45
8.2.3	Pintura acrilica exterior sócalo, sobre estuco, dos manos, color RAL 7016 o similar	m2	$20.005,00	74,53	$ 1.490.972,65
9	**ACABADOS DE PISOS**				
9.1	**MORTEROS DE NIVELACIÓN**				
9.1.1	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm.	m2	$66.094,00	209,49	$ 13.846.032,06
9.2	**ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR**				
9.2.1	Piso en mortero autonivelante con arena de cuarzo fina pigmentada de color gris claro, espesor 2cm.	m2	$81.406,00		
9.3	**GUARDA ESCOBA Y MEDIACAÑA**				
9.3.1	Piso en mortero autonivelante con arena de cuarzo fina pigmentada de color gris claro, espesor 2cm. Para guardaescoba	ml	$49.455,00		
10,00	**PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS**				
10.1	**PUERTAS**				
10.1.1	Mantenimiento de puerta metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y poliuretano	m2	$51.202,00	51,95	$ 2.659.943,90
10.2	**VENTANAS**				
10.2.1	Ventana corrediza de aluminio 5020 y vidrio incoloro de 4 mm	m2	$299.843,00	3,24	$ 971.491,32
10.2.2	Mantenimiento pintura de ventana metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior	m2	$62.652,00	32,57	$ 2.040.575,64
11,00	**SEÑALIZACIÓN**				
11.1.1	Suministro e instalacion de Letrero en acrilico, incluye instalación a pared	und	$866.775,00	1,00	$ 866.775,00
12,00	**AIRE ACONDICIONADO**				
12.1.1	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 36000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und	$5.126.502,00	1,00	$ 5.126.502,00

13,00	**ASEO Y LIMPIEZA**				
13.1.1	Aseo y limpieza.	m2	$3.433,00	855,96	$ 2.938.510,68
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MINI SPLIT E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS CORRECTIVOS					
14,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS Y ELEMENTOS DEL SISTEMA**				
14.1	**Mantenimiento Unidades Multi Split**				
14.1.1	Revision y mantenimiento de equipo mini split (Condensadora+evaporadora)	und	$412.551,00	7,00	$ 2.887.857,00
14.2	**Tuberia del sistema Mini Split**				
14.2.1	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 1/2" incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	ml	$79.066,00	52,40	$ 4.143.058,40
14.2.2	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 3/8" incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	ml	$72.371,00	6,88	$ 497.912,48
14.2.3	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 1/4' (3/8 R) incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con manguera rubatex	ml	$92.629,00	50,80	$ 4.705.553,20
14.2.4	Suministro, Instalacion y Soporte de tuberia 3/4" de PVC de alta presion soldada y aislada con Rubatex para drenaje.	ml	$79.261,00		
14.3	**Suministro de dispositivos correctivos**				
14.3.1	Suministro e instalacion de tarjeta de control de operación del equipo condensador de un sistema Mini Split	und	$613.357,00		
14.3.2	Suministro e instalacion de tarjeta de control de operación del equipo evaporador de un sistema Mini Split	und	$421.058,00		
RED DE DATOS, WIFI Y CCTV					
15,00	**CABLEADO UTP ÁREA DE TRABAJO**				
15.1.1	Suministro e instalación de Patch cord CAT 6A 7ft, azul.	UND	$91.235,00	15,00	$ 1.368.525,00
15.2	**SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN**				
15.2.1	Suministro e instalación de cable UTP cat 6A color azul	ML	$13.665,00	504,00	$ 6.887.160,00
15.2.2	Suministro e instalacion de Face Plate sencillo cat 6A	UND	$24.233,00	10,00	$ 242.330,00
15.2.3	Suministro e instalacion de Face Plate dobles cat 6A	UND	$ 27.810,00	5,00	$ 139.050,00
15.2.4	Suministro e instalación de Amarre de Velcro. Pk 10 para moños de 12 cables	UND	$ 2.940,00	10,00	$ 29.400,00
15.2.5	Suministro e instalación de Jack módulo para herraje color azul de 24 puertos	UND	$ 66.722,00	12,00	$ 800.664,00

15.2.6	Suministro e instalación de Patch cord 10G, 5ft, azul.	UND	$ 77.295,00	16,00	$ 1.236.720,00
15.2.7	Suministro e instalacion de Rack de 9U de pared	UND	$ 1.200.145,00	1,00	$ 1.200.145,00
15.2.8	Suministro e instalacion de patch pannel 24 puertos	UND	$ 1.863.860,00	1,00	$ 1.863.860,00
15.2.9	Suministro e instalacion de organizador horizontal 1 con tapa de alta capacidad	UND	$ 198.856,00	1,00	$ 198.856,00
15.2.10	Suministro e instalación de Mutitoma Horizontal con 12 toma corrientes NEMA 5-15P, Especializada para equipos de comunicaciones	UND	$ 367.572,00	1,00	$ 367.572,00
15.2.11	Marquillado general de rack	GLB	$ 537.625,00	1,00	$ 537.625,00
15.2.12	Certificaciones de punto UTP	PTO	$ 28.471,00		
15.3	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**				
15.3.1	Suministro e instalación de puesta a tierra para centro de cableado. Incluye barra de puesta a tierra para rack sello UL, Conector de puesta a tierra y Barra puesta a tierra para centro de cableado de acuerdo a estandar BICSI/J-STD-606-A	UND	$1.677.906,00		
15.4	**UPS**				
15.4.1	Suministro e Instalación UPS on-line 3000 VA/2500W, FP 0,8 120 V, onda seno pura. Clavija entrada l5-30p. autonomia 5/14 minutos	UND	$6.361.576,00	1,00	$ 6.361.576,00
EQUIPOS ACTIVOS					
15.5	**SWITCHES**				
15.5.1	SWITCH DE ACCESO 24 RJ45 PUERTOS PoE	UND	$ 6.186.650,00	1,00	$ 6.186.650,00
	DUCTERIA Y ACCESORIOS				
15.6	**DATOS, WIFI Y CCTV**				
15.6.1	Suministro e instalacion de canaleta con tabique de separacion	ML	$31.994,00	36,00	$ 1.151.784,00
15.6.2	Suministro e instalacion de Tuberia EMT 1" y demas accesorios de instalacion y marcacion para ambientes TI	ML	$46.118,00		
15.6.3	Suministro e instalacion de cajas Radwell 5800	UND	$19.587,00	4,00	$ 78.348,00
16,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
16.1.1	Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar.	UND	$526.377,00	2,00	$ 1.052.754,00
16.1.2	Instalación y conexión de equipo existente (ventilador, camara cctv, sonido, campana), incluye base y accesorios de instalación.	UND	$45.844,00		
16.1.3	Instalación y conexión de equipos de Aire Acondicionado, incluye accesorios de instalación.	UND	$134.727,00	11,00	$ 1.481.997,00

16.2	**CANALIZACION DE BAJA TENSION**				
16.2.1	Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1", y demas accesorios de instalación y marcación.	ML	$51.221,00	55,36	$ 2.835.594,56
16.2.2	Regata y resane de traslado para puntos electricos y de comUnicaciones.	ML	$36.519,00	175,96	$ 6.425.883,24
16.3	**REDES**				
16.3.1	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 3x8 + 1x8N + 1x8T LSHF (Libre de halogenos). Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	$50.972,00	127,40	$ 6.493.832,80
16.3.2	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	ML	$15.212,00	140,32	$ 2.134.547,84
16.4	**ESTRUCTURAS**				
16.4.1	Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra.	UND	$444.621,00	2,00	$ 889.242,00
16.4.2	Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de inspección para electrodo de puesta a tierra.	UND	$146.739,00	2,00	$ 293.478,00
16.4.3	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	UND	$575.895,00		
16.5	**EQUIPOS**				
16.5.1	Suministro, transporte e instalación de UPS 3 kVA Monofasica incluye ByPass, acomedita y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	$6.497.706,00	1,00	$ 6.497.706,00
16.5.2	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T36-3F empotrable Mini Pragma de 36 Módulos - 63 A - REF MIP20312T demás accesorios de instalación y señalización.	UND	$679.972,00	2,00	$ 1.359.944,00
16.5.3	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T24-3F empotrable MINI PRAGMA de 24 Módulos - demás accesorios de instalación y señalización.	UND	$470.247,00	2,00	$ 940.494,00
16.5.4	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x15 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	$23.481,00	23,00	$ 540.063,00
16.5.5	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	$23.481,00	8,00	$ 187.848,00
16.5.6	Suministro, transporte e instalación de Totalizador industriel 3x70A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye marcación RETIE.	UND	$544.812,00	2,00	$ 1.089.624,00

16.5.7	Suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 2x30 A, 220-127V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	$45.765,00		
16.6	**INTERIOR**				
16.6.1	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	$118.103,00		
16.6.2	Suministro, transporte e instalación de luminaria BALA DIMERIZABLE (zona limpia), 8W, 4000K, IP65. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	$131.086,00		
16.6.3	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	$186.285,00	50,00	$ 9.314.250,00
16.6.4	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	$376.757,00	41,00	$ 15.447.037,00
16.6.5	Suministro, transporte e instalación de driver de emergencia es ref ELD07, autonomia 90 minutos con 5 años de garantia. El driver debe permitir que la luminaria pueda ser utilizada tanto en operación normal como en emergencia. incluye bateria, cargador, circuito inversor, cableado, accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	$411.726,00		
16.6.6	Suministro, transporte e instalación de PANEL LED SLIM 40W 60X60cm - 100.000 horas - dimerizable o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	$339.807,00	45,00	$ 15.291.315,00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**				
NP. 01	Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelana tipo porcelanato institucional antideslizante, ancho 8cm.	ml	$ 24.672,00	79,97	$ 1.973.019,84
NP. 02	Suministro e instalacion de enchape piso en ceramica tipo porcelanato, formato 60cm x 60cm, institucional, antideslizante.	m2	$ 94.496,00	130,00	$ 12.284.480,00

NP. 03	Demolicion muro en tapia medianero, espesor 62cm, incluye transporte escombros.	m3	$ 51.812,00	45,48	$ 2.356.409,76
NP. 04	Cerramiento con madera rolliza y tela polipropileno, altura 2,50m.	ml	$ 26.407,00	25,00	$ 660.175,00
NP. 05	Excavacion manual en material comun, incluye retiro.	m3	$ 55.501,00	5,05	$ 280.280,05
NP. 06	Relleno compactado con material seleccionado de prestamo.	m3	$ 67.349,00	7,34	$ 494.341,66
NP. 07	Concreto Solado 1500 psi, espesor 5cm.	m2	$ 39.045,00	10,11	$ 394.744,95
NP. 08	Concreto 3000 psi para viga de cimentación, sección 30cm x 40cm.	ml	$ 162.575,00	16,30	$ 2.649.972,50
NP. 09	Concreto 3000 psi para columna sección 20cm x 40cm.	m3	$ 1.432.215,00	1,62	$ 2.320.188,30
NP. 10	Concreto 3000 psi viga sección 20cm x 20cm.	ml	$ 106.847,00	48,90	$ 5.224.818,30
NP. 11	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.	kg	$ 13.015,00	976,59	$ 12.710.318,85
NP. 12	Mamposteria H-15 ladrillo de arcilla.	m2	$ 90.212,00	34,69	$ 3.129.454,28
NP. 13	Filtro con Geodren planar diam. 4", altura 0,50m.	ml	$ 107.000,00		
NP. 14	Alfajia en concreto de 3000 psi seccion 0,30m x 0,04m.	ml	$ 43.040,00	16,40	$ 705.856,00
NP. 15	Suministro e instalación de cajonera empotrada en madera RH, espesor 15mm, abierta, ancho variable 1,50m - 1,80m, altura 1,20 m y prof. 0,35 m, con tapas laterales, superior y trasera, incluye manijas y divisiones.	und	$ 2.507.691,00	5,00	$ 12.538.455,00
NP. 16	Suministro e instalación de tranca para ventana tipo pasador en madera zapan o similar, long.variable 1,20m a 1,50m, sección 4cm x 8cm, incluye pintura en esmalte y soportes laterales metalicos.	und	$ 137.296,00		
NP. 17	Suministro e instalación de ventana metalica de 1,38 m x 2,40 m, incluye marco, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color madera, similar a existentes	und	$ 1.531.148,00	2,00	$ 3.062.296,00
NP. 18	Alerones en estructura de madera sobre ventanas y puerta principal, ancho 0,35m, incluye viguetas, techo en machimbre impermebilizado y teja de barro tipo española.	ml	$ 164.400,00	23,00	$ 3.781.200,00
NP. 19	Suministro e Instalacion de piso en vinilo.	m2	$ 271.135,00	64,76	$ 17.558.702,60
NP. 20	Guardescoba en Vinilo, altura 8cm.	ml	$ 34.406,00	30,98	$ 1.065.897,88
NP. 21	Suministro e instalación de correas metálicas para soporte estructural del cielo raso.	ml	$ 84.320,00	102,25	$ 8.621.720,00
NP. 22	Mamposteria en ladrillo temosa de arcilla, espesor 18 cm	m2	$ 140.382	14,16	$ 1.987.809,12
NP. 23	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und	$ 2.006.068,00	2,00	$ 4.012.136,00
NP. 24	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 24000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220	und	$ 3.884.338,00	1,00	$ 3.884.338,00

NP. 25	Caja de Inspección de aguas residuales de 60 x 60 x 60, en mampóstería tipo temosa, incluye losa de piso en concreto 3000 psi, e=7cm y tapa en concreto reforzado de 3000psi, e=5cm..	und	$ 572.217,00	1,00	$ 572.217,00
NP. 26	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED, 12W o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación.	und	$ 68.730,00	12,00	$ 824.760,00
NP. 27	Suministro e instalación de ventana con marco metalico de 1,97m x 0,90 m, en tubo cuadrado 3/4 , incluye vidrio, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color negro	m2	$ 983.148,00	1,77	$ 1.740.171,96
NP. 28	Pintura vinilo tipo 2 bajo teja asbesto cemento, dos manos.	m2	$ 19.395,00	146,66	$ 2.844.470,70
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 319.282.098,73**
Administración 32%					**$ 102.170.271,59**
Utilidad 5%					**$ 15.964.104,94**
Costos Indirectos (AIU 37 %)					**$ 118.134.376,53**
VALOR TOTAL					**$ 437.416.475,26**

12. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

13. ANEXOS

13.1 PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

13.2 MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

13.3 INFORME HSEQ

13.4 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GERENCIA DEL PROYECTO

13.5 BITACORA DE OBRA

13.6 REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DESPUES



1.2.1	Desmonte de muro divisorio liviano, incluye cargue y retiro.






1.2.2	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro.

ANTES



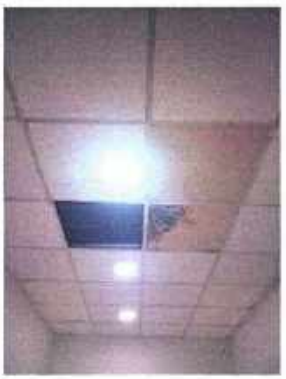



DESPUES







1.2.3	Desmonte de letrero existente.

ANTES





DESPUES



1.3.1	Demolición de friso muros, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final.

ANTES





DESPUES









1.3.2	Demolición de piso y alistado en mortero con martillo eléctrico, incluye, cargue, retiro y disposición final.

ANTES







DESPUES





1.3.3	Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de redes, incluye cargue, retiro y disposición final.

ANTES



DESPUES



2.1.1	Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio.

ANTES





DESPUES







3.1.1	Malla electro soldada.

ANTES





DESPUES







4.1.1	Impermeabilización y mantenimiento de cubierta con manto asfáltico 4.2mm modificado con polipropileno asfáltico. Incluye pintura reflectiva con base asfáltica.


ANTES





DESPUES

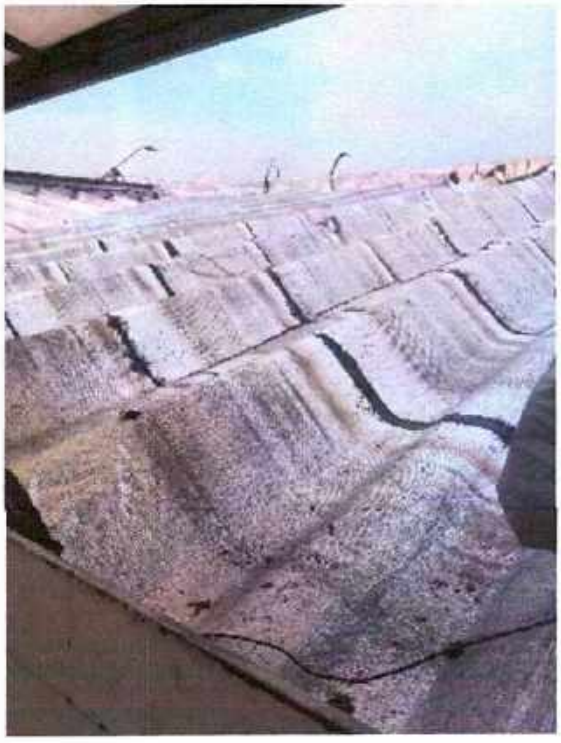


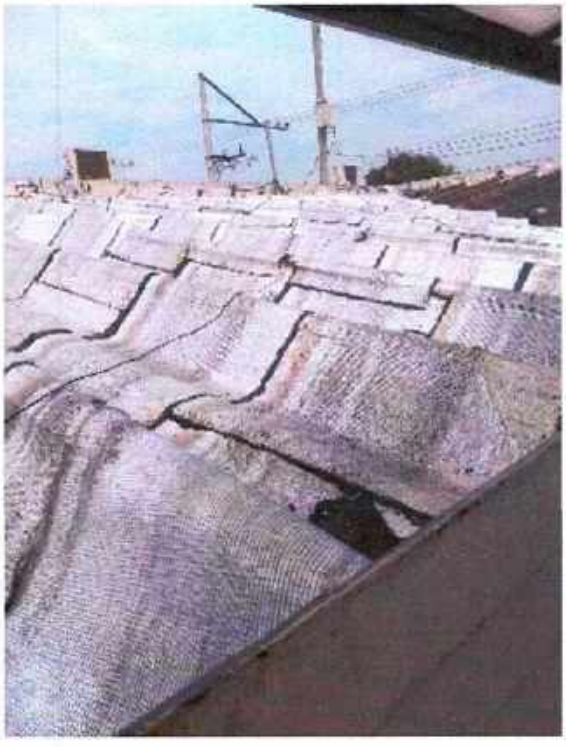

5.1.1	Cielo raso en lámina de yeso regular 1/2", incluye acabado en pintura vinilo tipo 2

ANTES



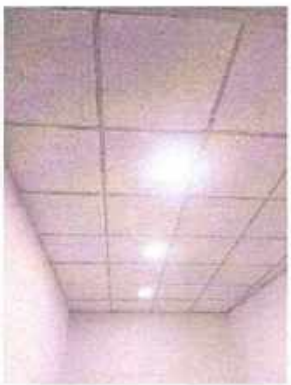


DESPUES







7.1.1	Red agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión.

ANTES



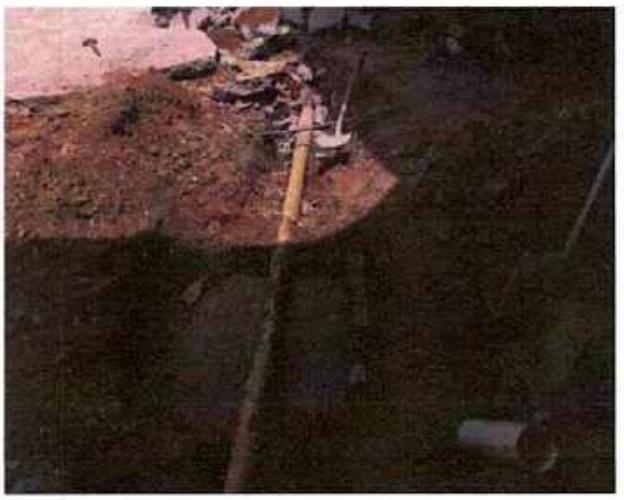

DESPUES





8.1.1	Friso allanado sobre pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones.

ANTES











DESPUES

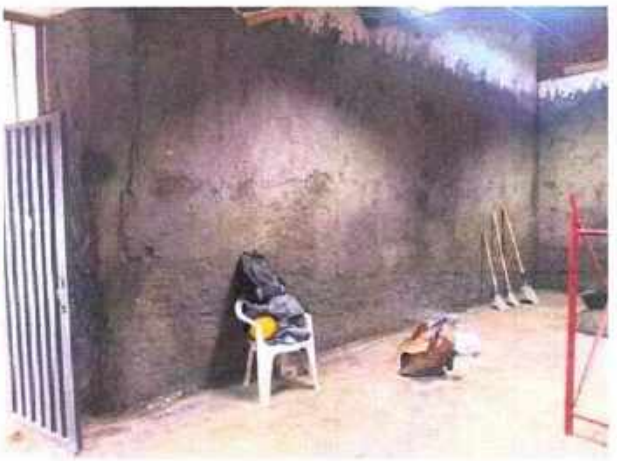

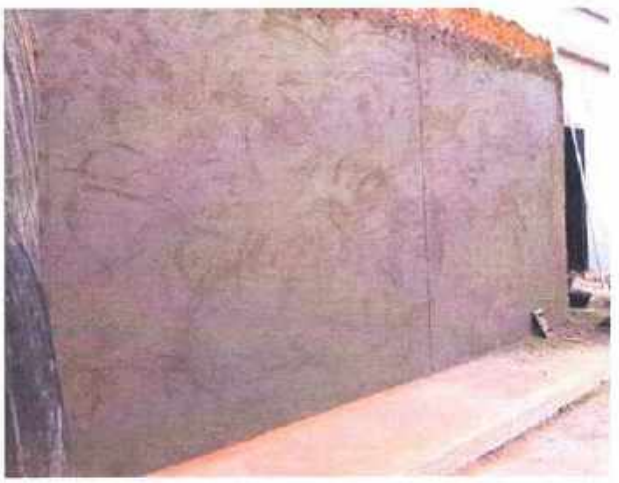

8.2.1	Estuco plástico pared interior y/o exterior.

ANTES





DESPUES





8.2.1	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos.

ANTES











DESPUES







8.2.2	Pintura acrílica exterior pared, sobre estuco, dos manos.

ANTES




DESPUES





8.2.3	Pintura acrílica exterior sócalo, sobre estuco, dos manos, color RAL 7016 o similar.

ANTES



DESPUES



9.1.1	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm.

ANTES







DESPUES





10.1.1	Mantenimiento de puerta metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y poliuretano.

ANTES





DESPUES





10.2.1	Ventana corrediza de aluminio 5020 y vidrio incoloro de 4 mm.

ANTES



DESPUES



10.2.2	Mantenimiento pintura de ventana metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior.

ANTES



DESPUES





11.1.1	Suministro e instalación de Letrero en acrílico, incluye instalación a pared.

ANTES



DESPUES




12.1.1	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 36000BTU refrigerante (ecológico) 410 voltaje 220.

ANTES



DESPUES

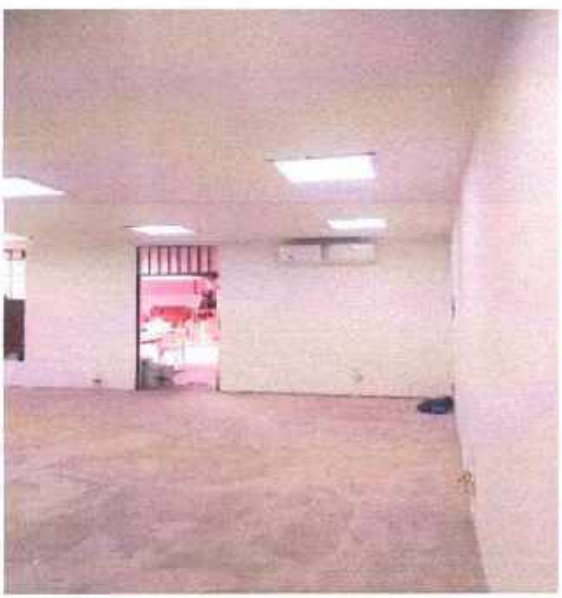



13.1.1	Aseo y limpieza.

ANTES





DESPUES








14.1.1	Revisión y mantenimiento de equipo mini split (Condensadora + evaporadora).

ANTES

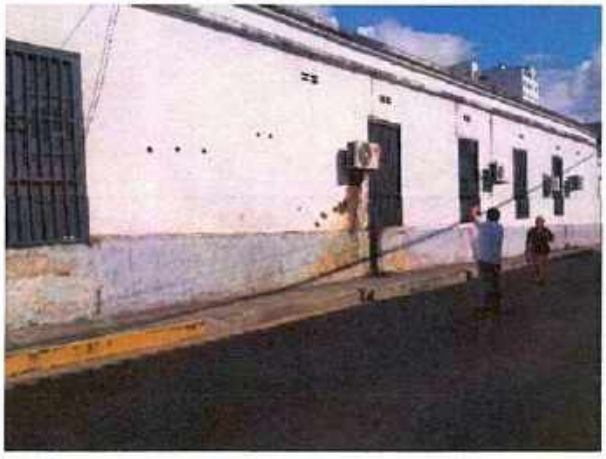







DESPUES











15.1.1	Suministro e instalación de Patch cord CAT 6A 7ft, azul.



15.2.3	Suministro e instalación de Face Plate dobles cat 6ª.



15.2.7	Suministro e instalación de Rack de 9U de pared.



15.2.8	Suministro e instalación de Patch panel 24 puertos.



15.2.10	Suministro e instalación de Mutitoma Horizontal con 12 toma corrientes NEMA 5-15P, especializada para equipos de comunicaciones.



15.4.1	Suministro e Instalación UPS on-line 3000 VA/2500W, FP 0,8 120 V, onda seno pura. Clavija entrada I5-30p, autonomía 5/14 minutos.



15.6.1	Suministro e instalación de canaleta con tabique de separación.

ANTES





DESPUES





16.2.2	Regata y resane de traslado para puntos eléctricos y de comunicaciones.

ANTES






DESPUES





16.5.2	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T36-3F empotrable Mini Pragma de 36 Módulos - 63 A - REF MIP20312T demás accesorios de instalación y señalización.

ANTES

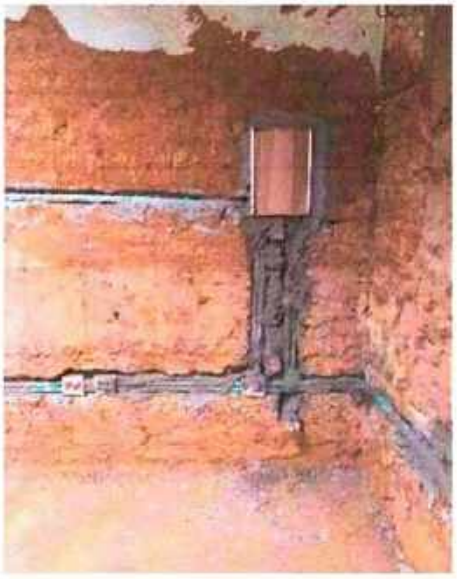



DESPUES





16.5.3	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T24-3F empotrable MINI PRAGMA de 24 Módulos, demás accesorios de instalación y señalización.


ANTES





DESPUES



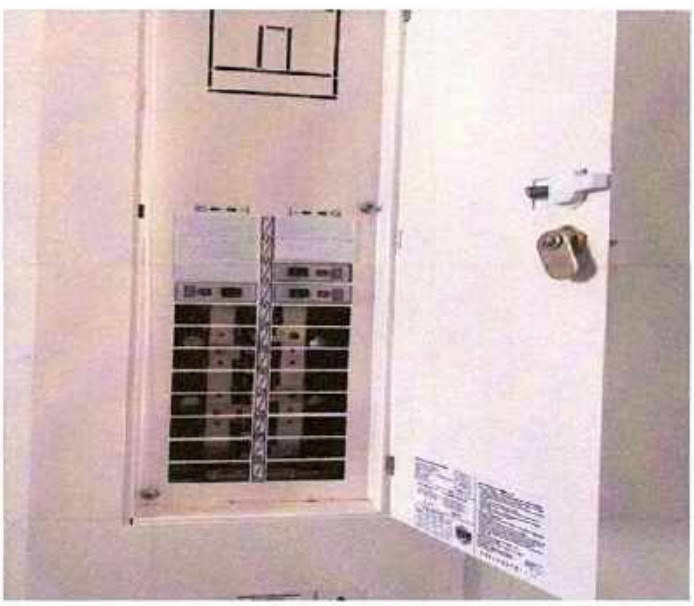


16.6.6	Suministro, transporte e instalación de PANEL LED SLIM 40W 60X60cm - 100.000 horas - dimerizable o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.

ANTES





DESPUES

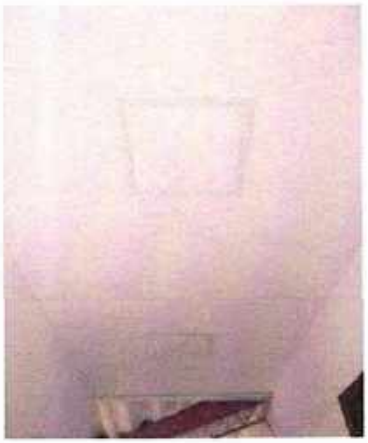




NP.01	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelana tipo porcelanato institucional antideslizante, ancho 8cm.

ANTES




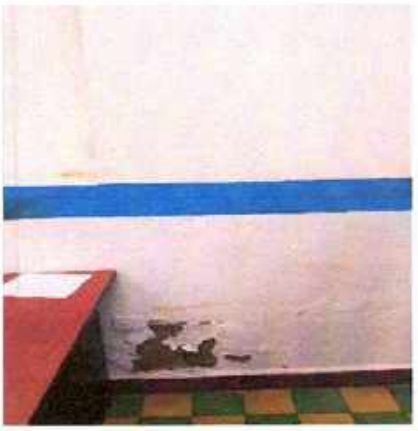






DESPUES

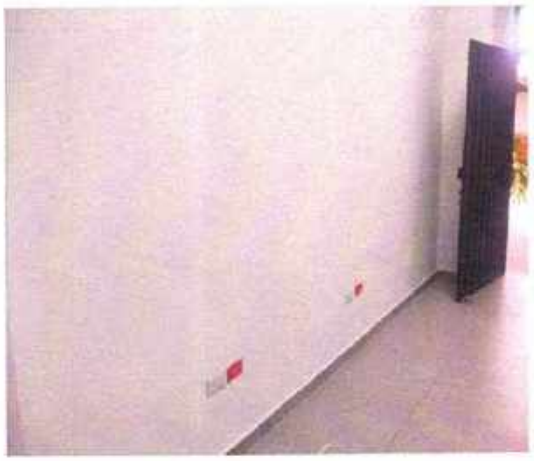

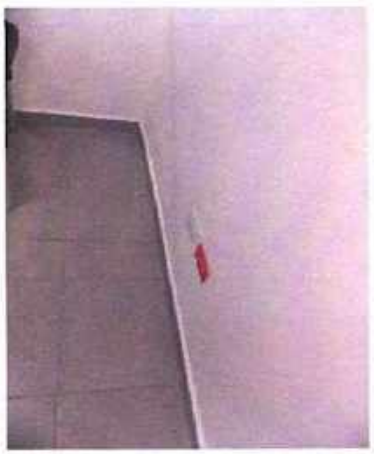



NP.02	Suministro e instalación de enchape piso en cerámica tipo porcelanato, formato 60cm x 60cm, institucional, antideslizante.

ANTES











DESPUES














NP.03	Demolición muro en tapia medianero, espesor 62cm, incluye transporte escombros.

ANTES





DESPUES

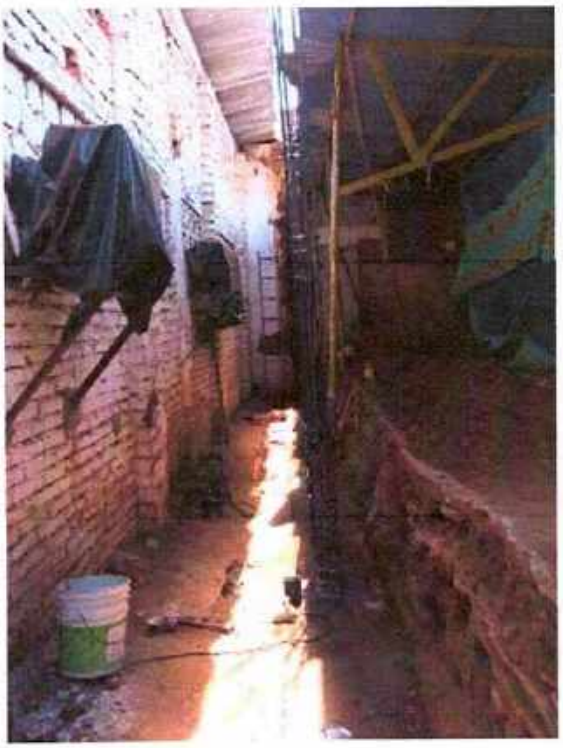




NP.04	Cerramiento con madera rolliza y tela polipropileno, altura 2,50m.






NP.08	Concreto 3000 psi para viga de cimentación, sección 30cm x 40cm.




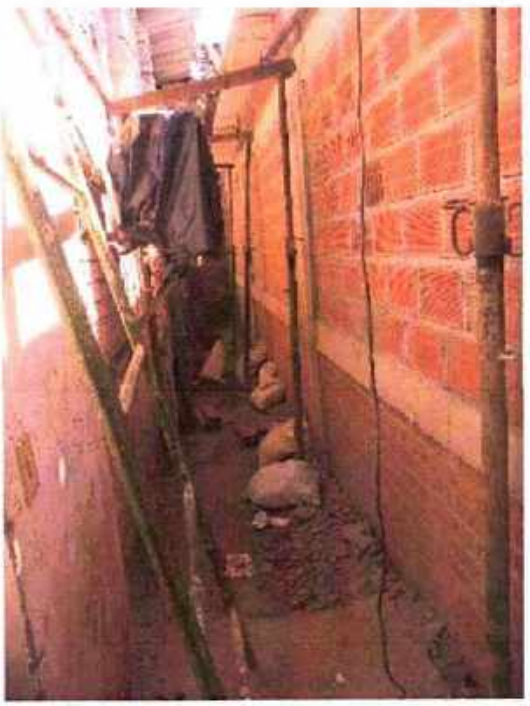


NP.09	Concreto 3000 psi para columna sección 20cm x 40cm.



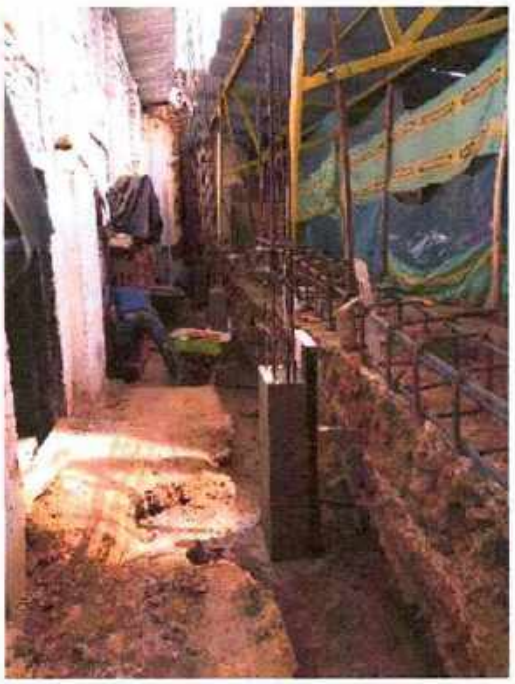

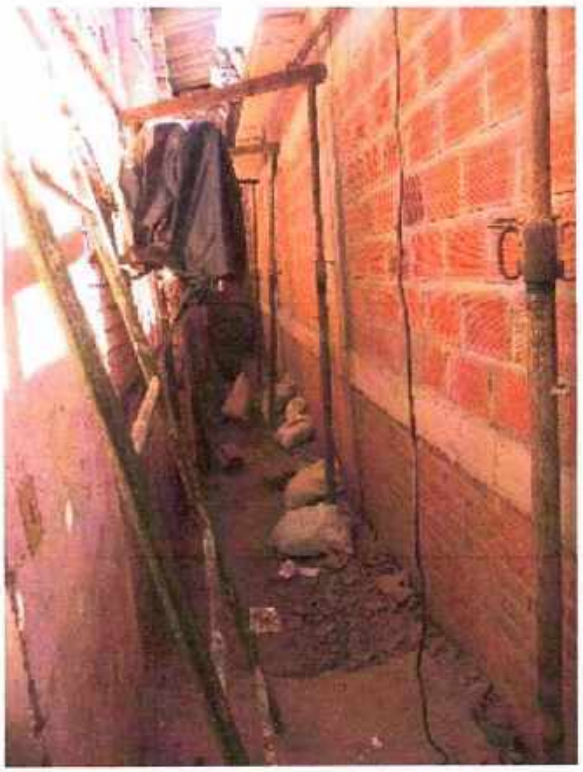


NP.10	Concreto 3000 psi viga sección 20cm x 20cm.

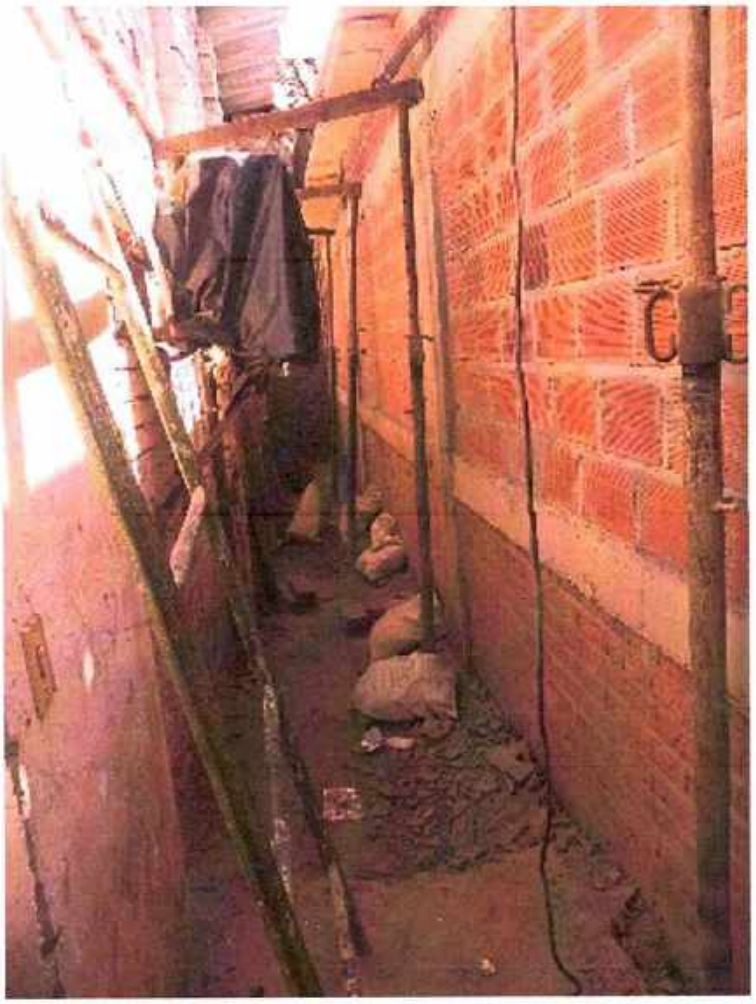


NP.11	Acero de refuerzo Fy 420 MPa.






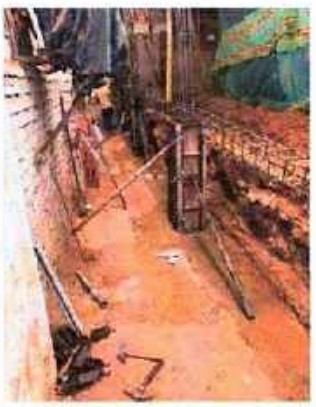

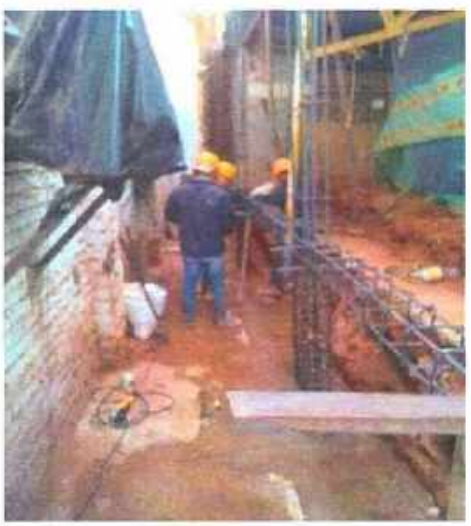

NP.12	Mampostería H-15 ladrillo de arcilla.

ANTES

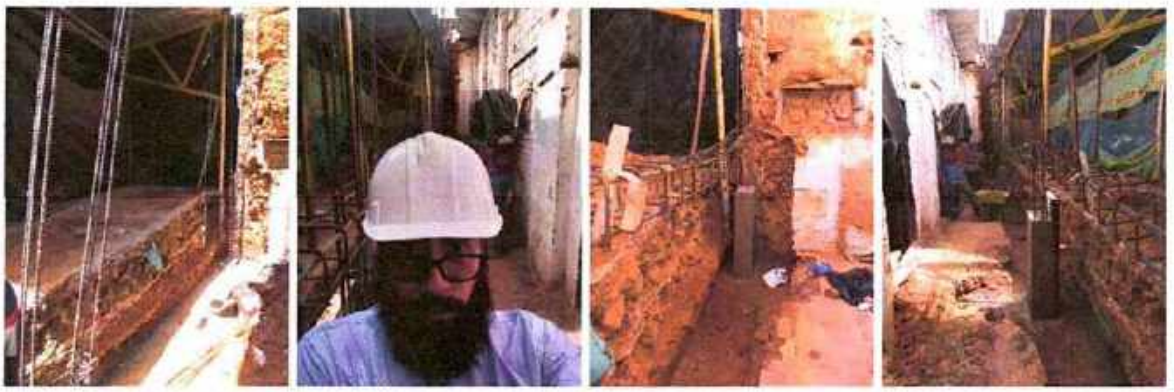

DESPUES



NP.14	Alfajía en concreto de 3000 psi sección 0,30m x 0,04m.

ANTES



DESPUES





NP.15	Suministro e instalación de cajonera empotrada en madera RH, espesor 15mm, abierta, ancho variable 1,50m - 1,80m, altura 1,20 m y Prof. 0,35 m, con tapas laterales, superior y trasera, incluye manijas y divisiones.

ANTES



DESPUES





NP.17	Suministro e instalación de ventana metálica de 1,38 m x 2,40 m, incluye marco, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior color madera, similar a existentes.

ANTES





DESPUES







NP.18	Alerones en estructura de madera sobre ventanas y puerta principal, ancho 0,35m, incluye viguetas, techo en machimbre impermeabilizado y teja de barro tipo española.

ANTES





DESPUES







NP.19	Suministro e Instalación de piso en vinilo.

ANTES









DESPUES



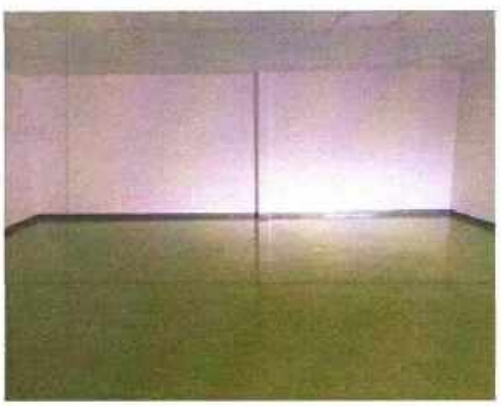

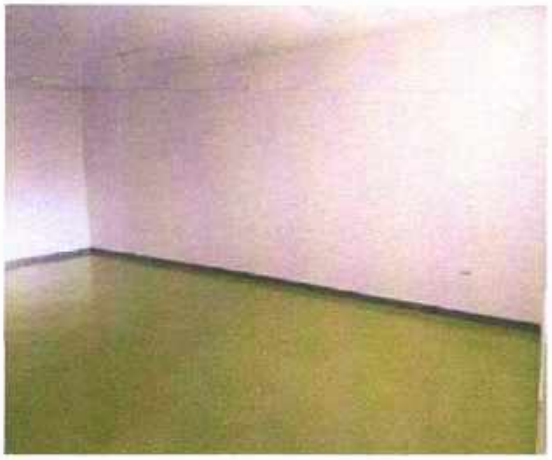



NP.20	Guardaescoba en Vinilo, altura 8cm.

ANTES



DESPUES



NP.21	Suministro e instalación de correas metálicas para soporte estructural de cielo raso.







NP.22	Mampostería en ladrillo temosa de arcilla, espesor 18 cm.

ANTES




DESPUES





NP.25	Caja de Inspección de aguas residuales de 60 x 60 x 60, en mampostería tipo temosa, incluye losa de piso en concreto 3000 psi, e=7cm y tapa en concreto reforzado de 3000psi, e=5cm.





NP.26	Suministro Transporte e instalación de luminaria LED, 12W o similar, Incluye cableado y accesorios de instalación.



NP.28	Pintura vinilo tipo 2 bajo teja asbesto cemento, dos manos.

ANTES







DESPUES












	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	1,1,1	Localización y replanteo manual para el proyecto

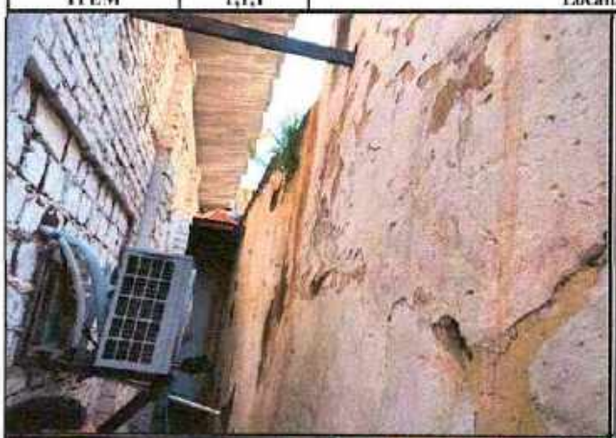




OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	1,2,1	Desmonte de muro divisorio liviano, incluye cargue y retiro




OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	1.2.2	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro









OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	1.2.3	Desmonte de letrero existente





OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238.37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**1,3,1**	**Demolición de friso muros, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final**









OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	1,3,2	Demolición de piso y alistado en mortero con martillo eléctrico, incluye, cargue, retiro y disposición final









OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	1,3,3	Corte y demolición de piso y ante piso con martillo eléctrico y cortadora de concreto para instalación de









OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**2,11**	**Placa de ante piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio.**









OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	3,11	Malla electro soldada







OBSERVACIONES

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	4,11	Impermeabilización y mantenimiento de cubierta con manto asfáltico 4.2mm modificado con polipropileno

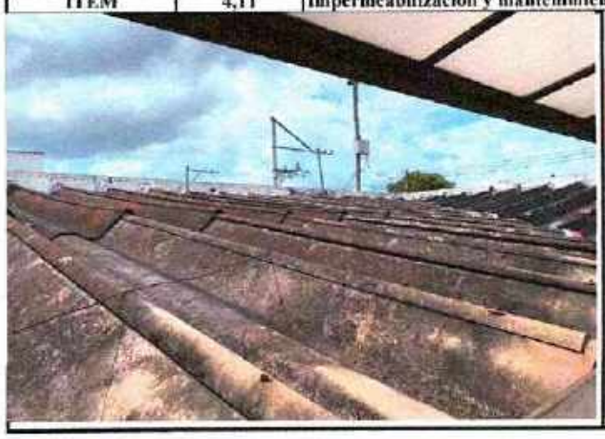





OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1
CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
ITEM	**5.11**	**Cielo raso en lámina de yeso regular 1/2", incluye acabado en pintura vinilo tipo 2**	




OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1
CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
ITEM	**6.11**	**Red hidráulica PVC RDE 9 Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión**	




OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**7.11**	**Red agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión**





OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1


CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**8.11**	**Friso allanado sobre pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones**





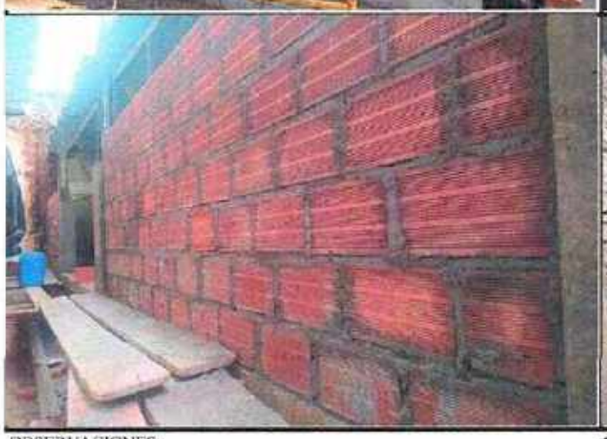



OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**8,1,2**	**Estuco plástico pared interior y/o exterior**






	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**8,2,1**	**Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos**








OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Código: F-GDI-5200-238,37-073
			Fecha: 06-Feb-2014
			Versión: 02
			Página 1 de 1
CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**8,2,2**	**Pintura acrílica exterior pared, sobre estuco, dos manos.**





OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Código: F-GDI-5200-238,37-073
			Fecha: 06-Feb-2014
			Versión: 02
			Página 1 de 1
CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**8,2,3**	**Pintura acrílica exterior sócalo, sobre estuco, dos manos, color RAL 7016 o similar**





OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
ITEM	**9,1,1**	**Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm.**	





OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
ITEM	**10,1,1**	**Mantenimiento de puerta metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y poliuretano**	





OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
ITEM	**10,2,1**	**Ventana corrediza de aluminio 5020 y vidrio incoloro de 4 mm**	





OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	10,2,2	Mantenimiento pintura de ventana metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de





OBSERVACIONES: OBSERVACIONES

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	11,1,1	Suministro e instalacion de Letrero en acrilico, incluye instalación a pared





OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 28/02/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	12,1,1	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 36000BTU refrigerante









	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238.37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**13.1.1**	**Aseo y limpieza.**









OBSERVACIONES: _____

OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	14,2,3	Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 1/4' (3/8 R) incluye soporte, accesorios, soldadura y






OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	15,1,1	Suministro e instalación de Patch cord CAT 6A 7ft, azul.

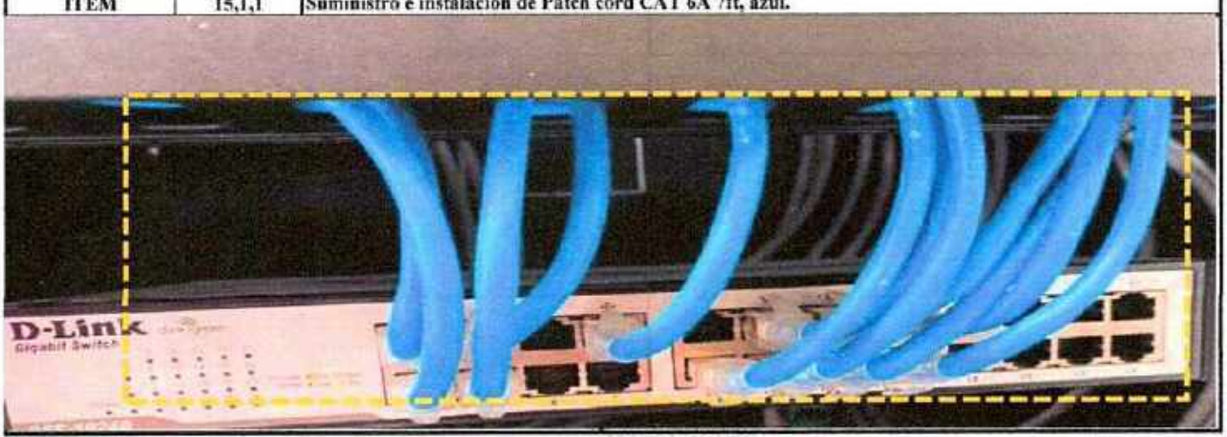

OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____


	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	15,2,1	Suministro e instalación de cable UTP cat 6A color azul




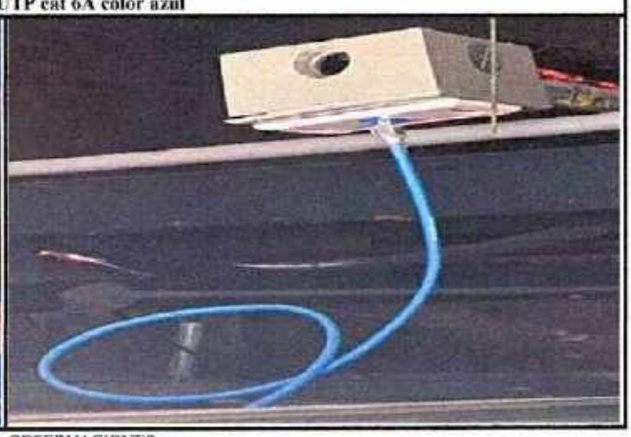

OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
ITEM	**15,2,2**	**Suministro e instalacion de Face Plate sencillo cat 6A**	

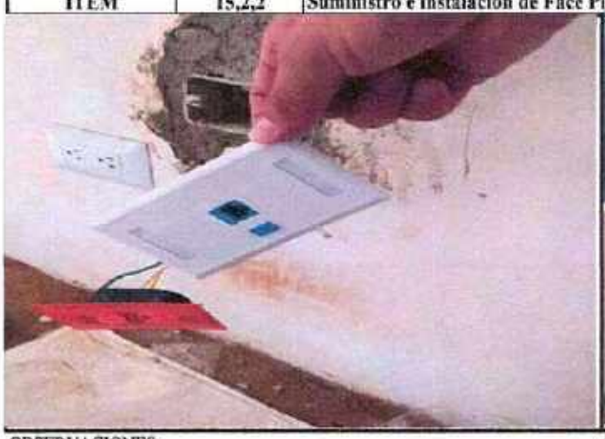




OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
ITEM	**15,2,3**	**Suministro e instalacion de Face Plate dobles cat 6A**	

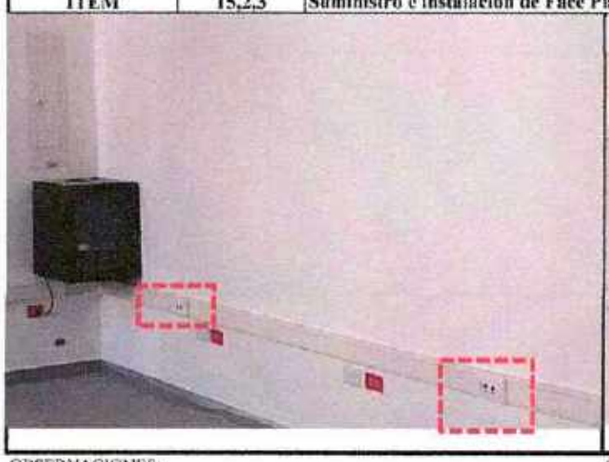





OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
ITEM	**15,2,4**	**Suministro e instalación de Amarre de Velcro. Pk 10 para moños de 12 cables**	

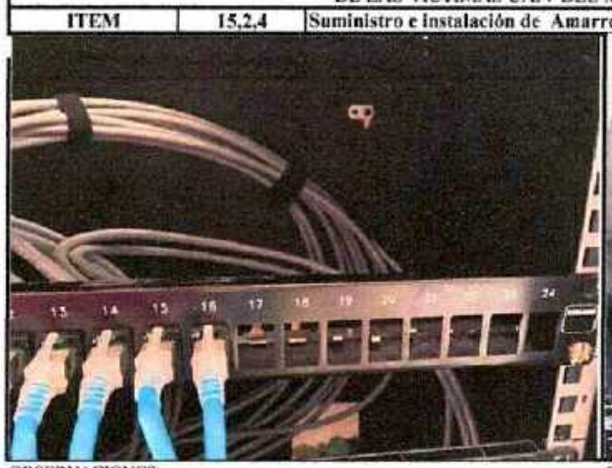

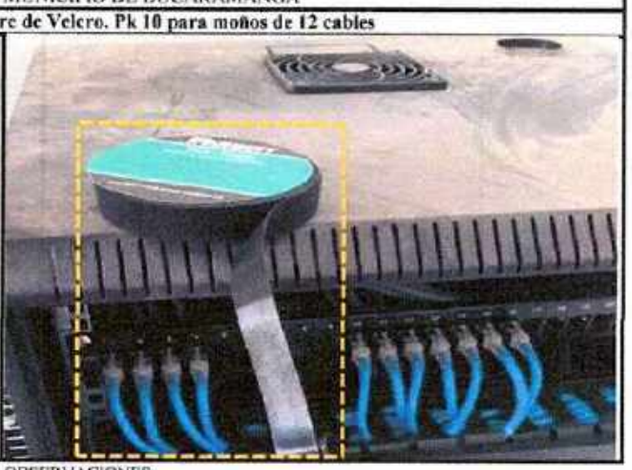


OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**15,2,5**	**Suministro e instalación de Jack módulo para herraje color azul de 24 puertos**

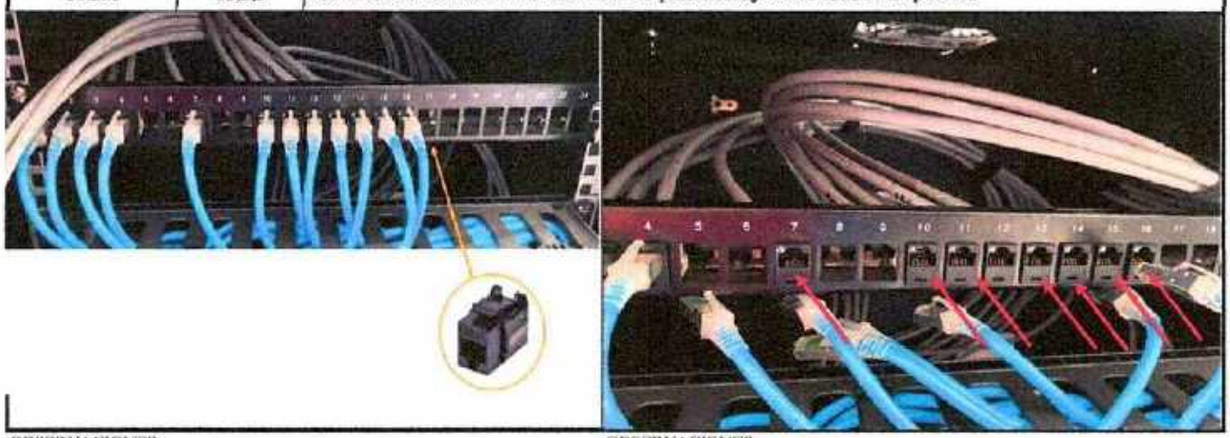


OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**15,2,6**	**Suministro e instalación de Patch cord 10G, 5ft, azul.**

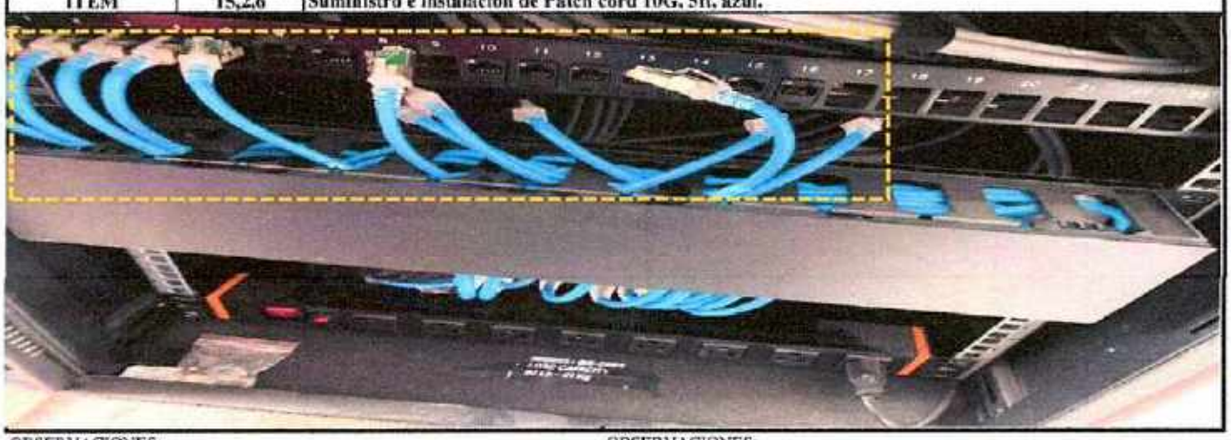

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**15,2,7**	**Suministro e instalacion de Rack de 9U de pared**




OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	15,2,8	Suministro e instalacion de patch pannel 24 puertos

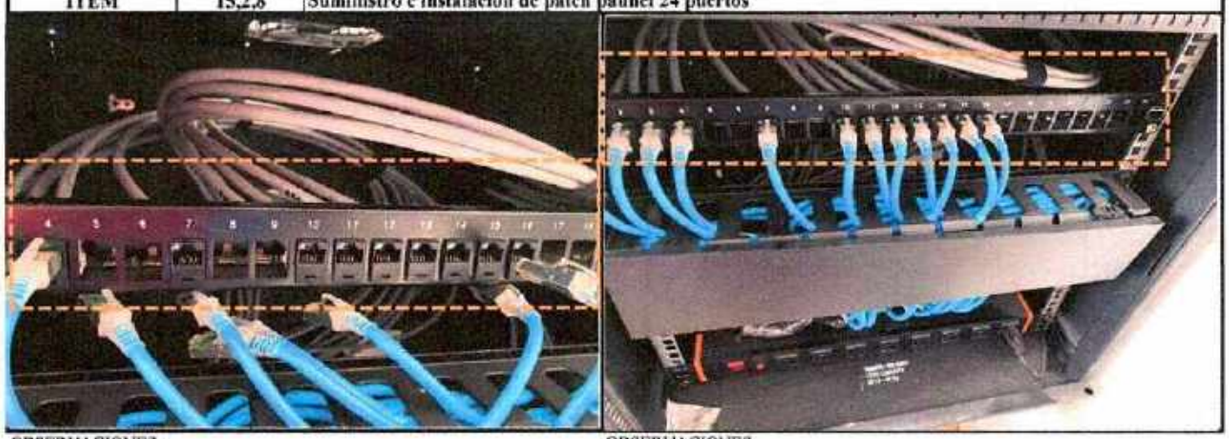


OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	15,2,9	Suministro e instalacion de organizador horizontal 1 con tapa de alta capacidad

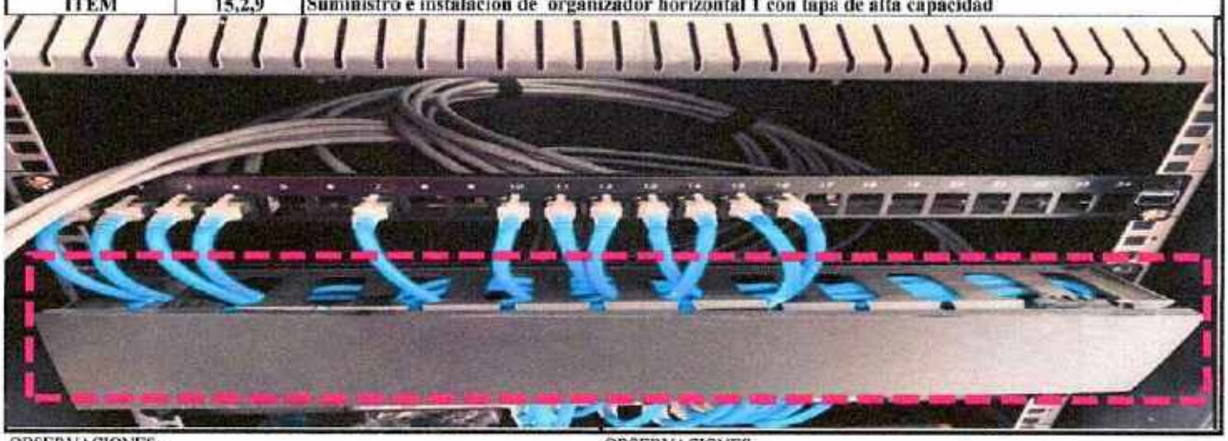


OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1


CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	15,2,10	Suministro e instalación de Mutitoma Horizontal con 12 toma corrientes NEMA 5-15P, Especializada para

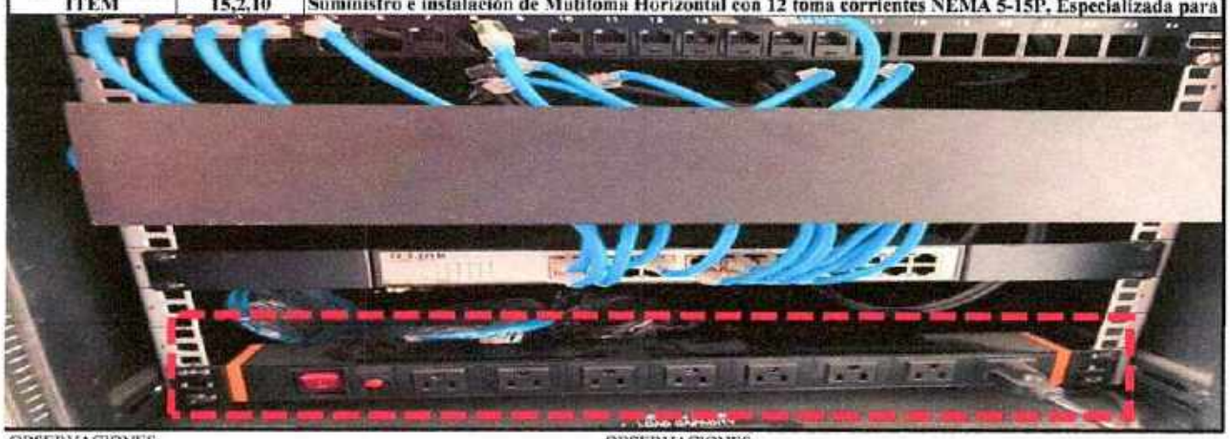

OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

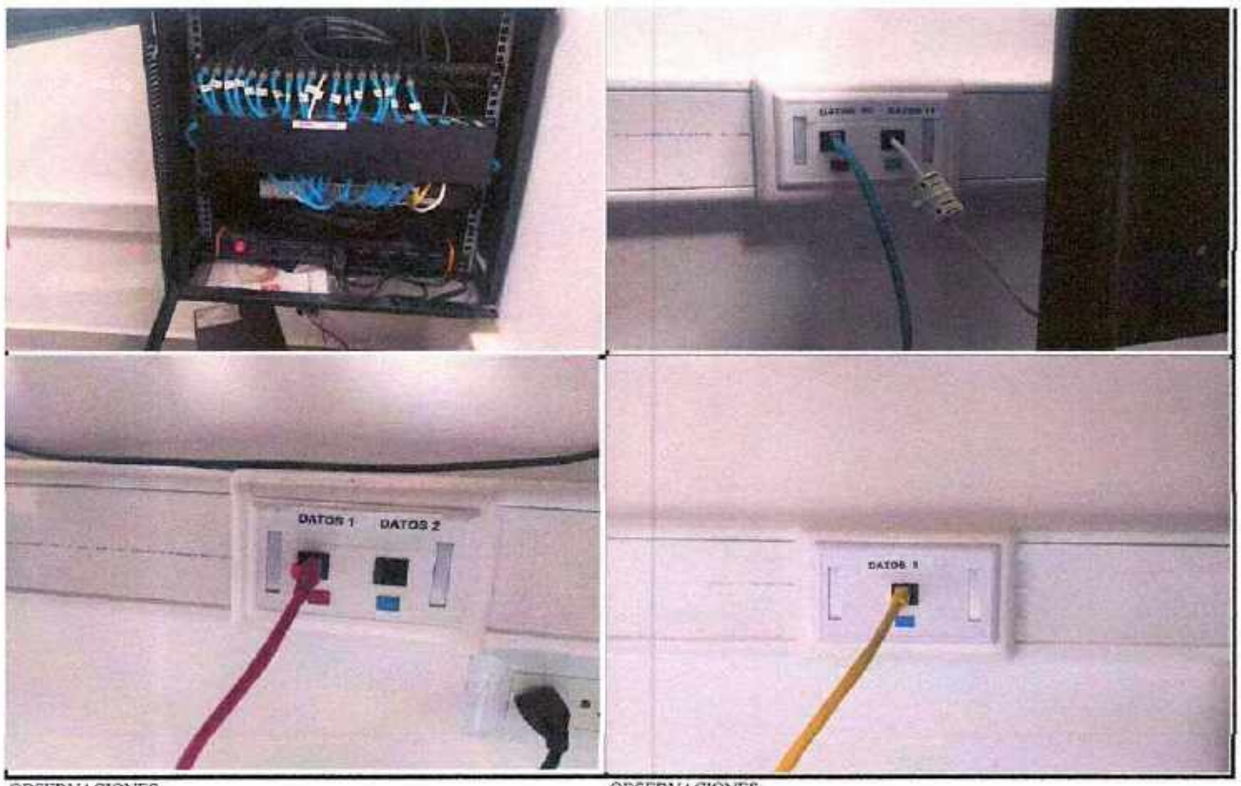


OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1
CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
ITEM	**15,4,1**	**Suministro e Instalación UPS on-line 3000 VA/2500W, FP 0,8 120 V, onda seno pura. Clavija entrada l5-**	



OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1
CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
ITEM	**15,5,1**	**SWITCH DE ACCESO 24 RJ45 PUERTOS PoE**	

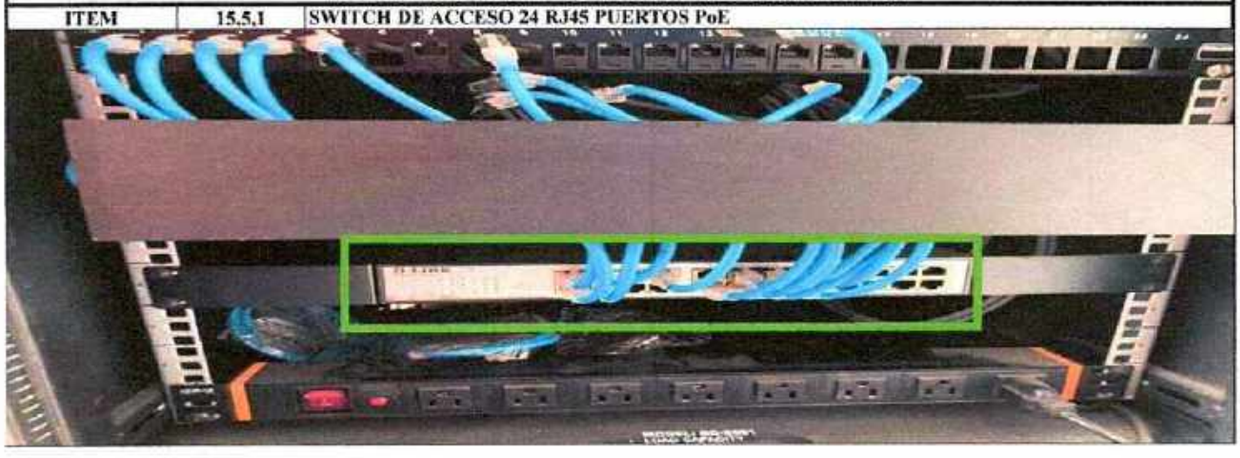


	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**15,6,3**	**Suministro e instalacion de cajas Radwell 5800**

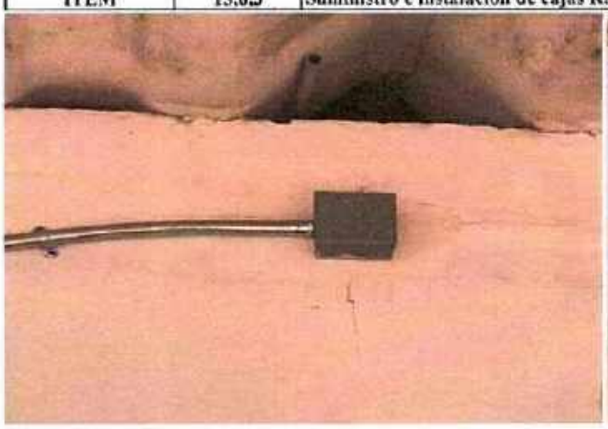



OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,1,1**	**Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas**





OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,1,3**	**Instalación y conexión de equipos de Aire Acondicionado, incluye accesorios de instalación.**










OBSERVACIONES: _____


	REGISTRO FOTOGRAFICO		Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1
CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
ITEM	**16,2,1**	**Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1", y demas accesorios de instalación y marcación.**	

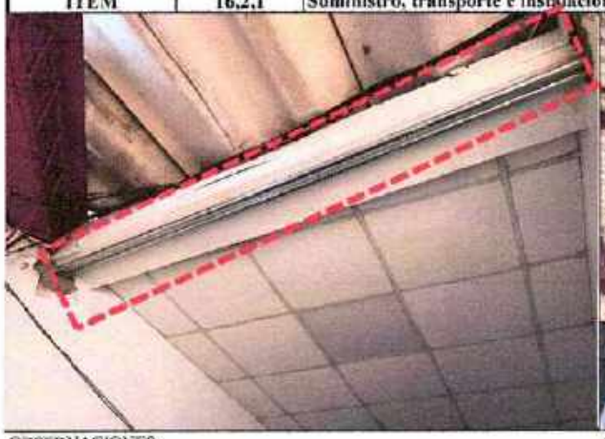



OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1
CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
ITEM	**16,2,2**	**Regata y resane de traslado para puntos electricos y de comunicaciones.**	

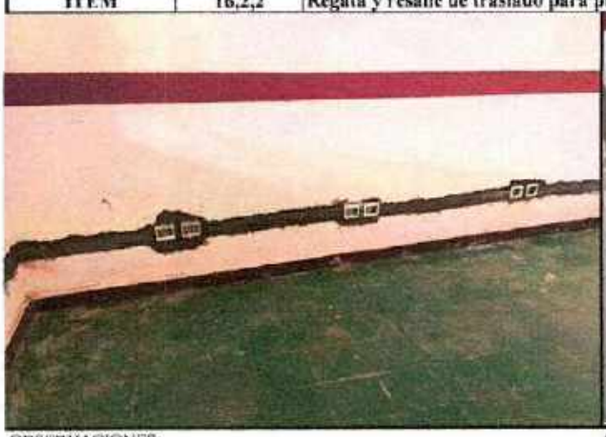




OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,3,1**	**Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 3x8 + 1x8N + 1x8T LSHF (Libre**

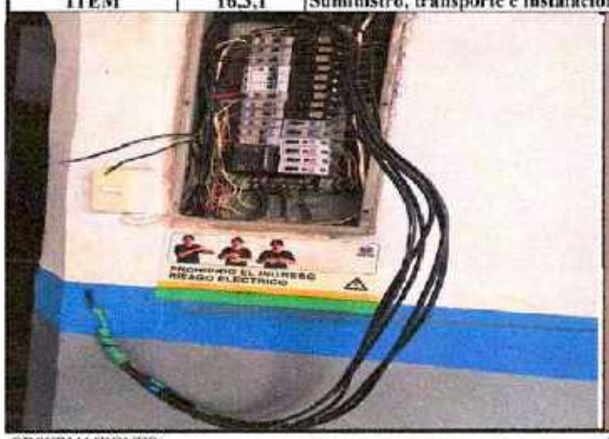



OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,3,2**	**Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC**






OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,4,1**	**Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperweil. Incluye conector**

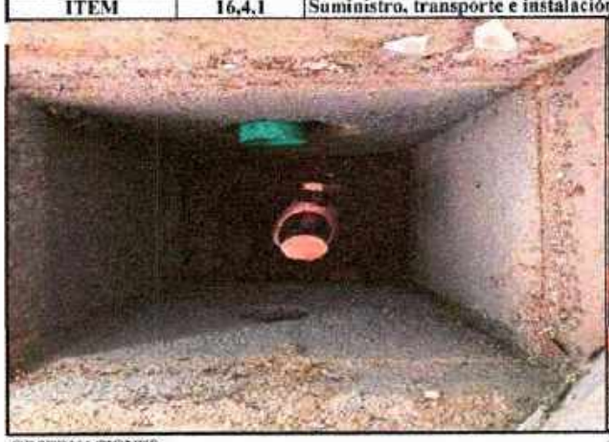



OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,4,2**	**Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de inspección para electrodo de puesta a tierra.**





OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:


	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,5,1**	**Suministro, transporte e instalación de UPS 3 kVA Monofasica incluye ByPass, acomedita y demas**



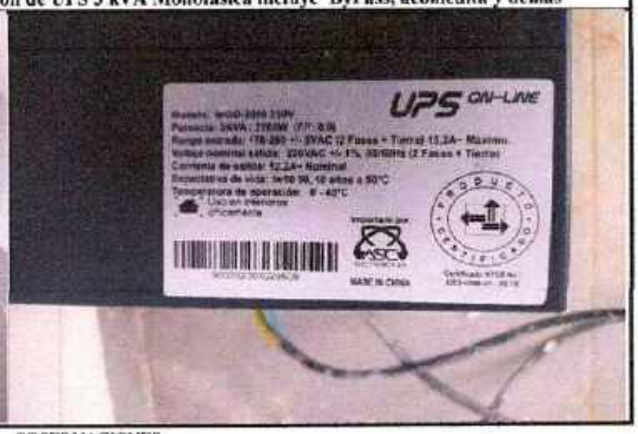

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,5,2**	**Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T36-3F empotrable Mini Pragma**





OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,5,3**	**Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T24-3F empotrable MINI**






OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,5,4**	**Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x15 A, 120V, 20-6 KA. Incluye**

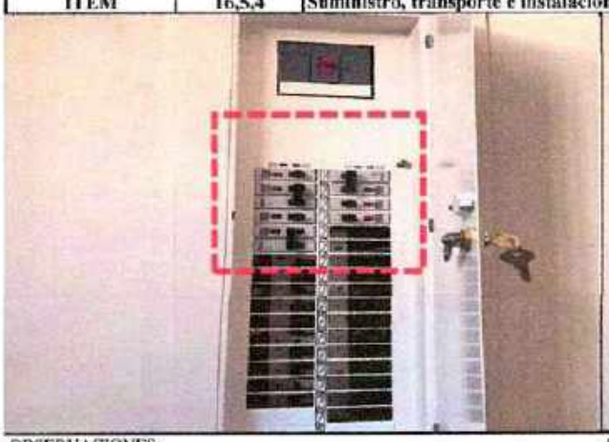




OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:


	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,5,5**	**Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye**

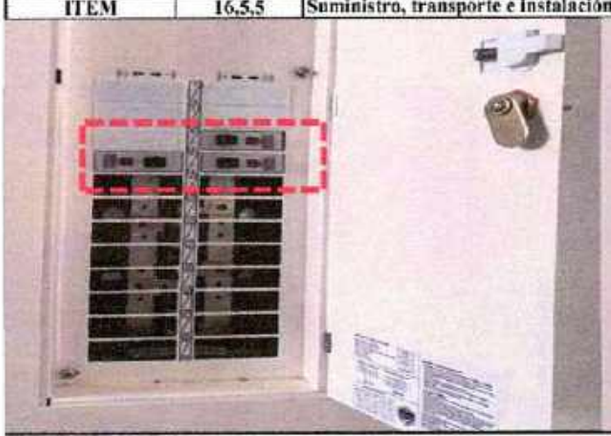

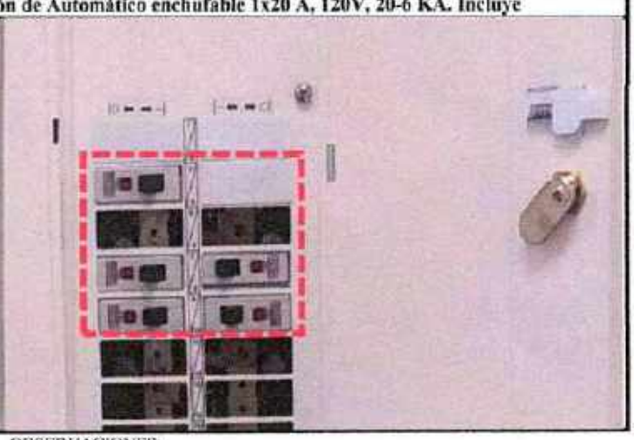


OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
ITEM	**16,5,6**	**Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x70A c-C 240-440V, 25-12,5 KA. Incluye**	




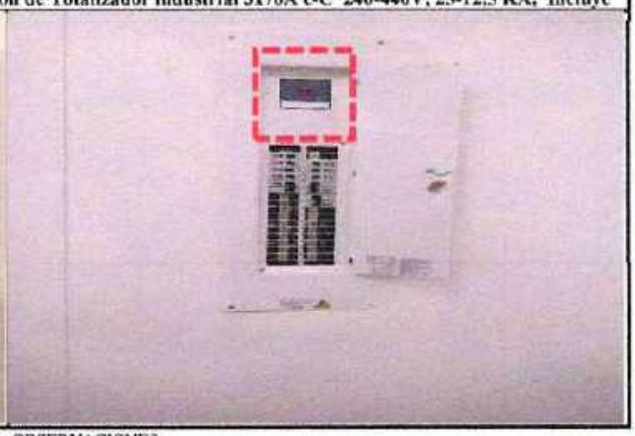


OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
ITEM	**16,6,3**	**Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye**	

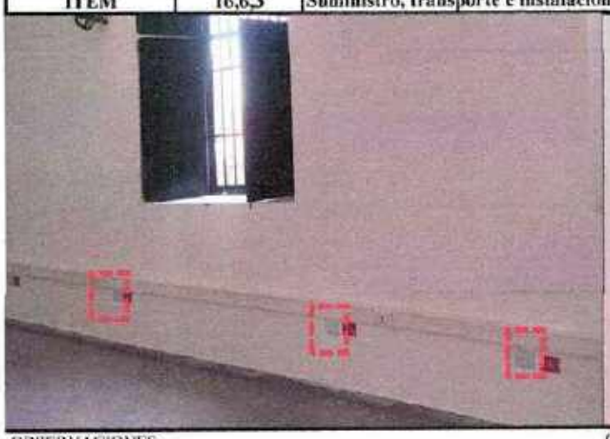

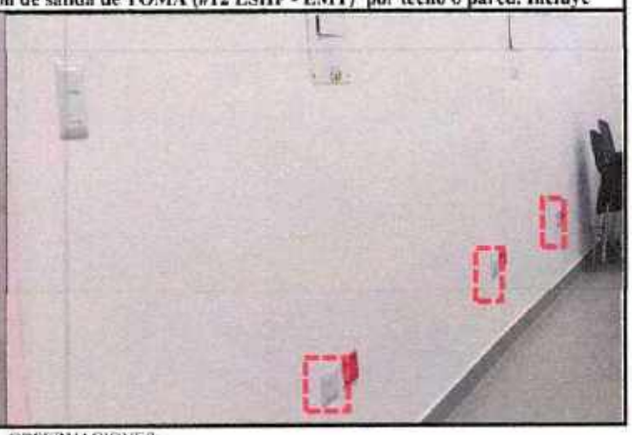


OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
ITEM	**16,6,4**	**Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o**	



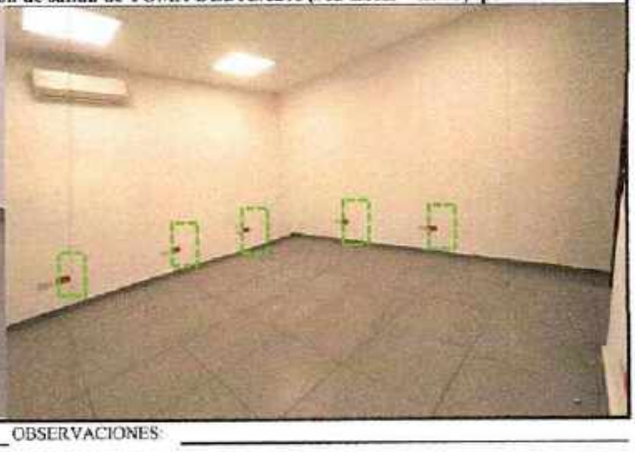

OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**16,6,6**	**Suministro, transporte e instalación de PANEL LED SLIM 40W 60X60cm - 100.000 horas - dimerizable o**





OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**NP 01**	**Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelana tipo porcelanato institucional**





OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**NP 02**	**Suministro e instalacion de enchape piso en ceramica tipo porcelanato, formato 60cm x 60cm,**






OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 03	**Demolicion muro en tapia medianero, espesor 62cm, incluye transporte escombros.**

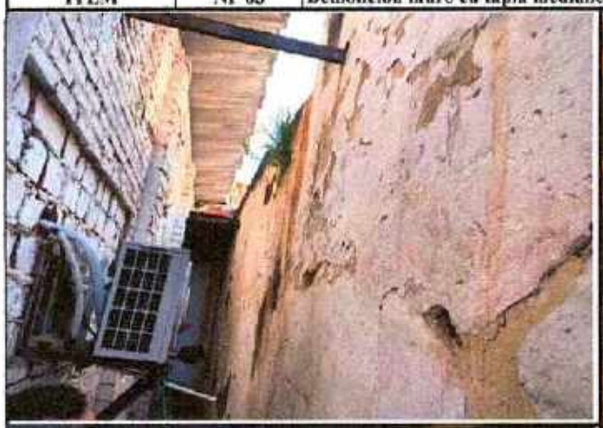







OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 04	**Cerramiento con madera rolliza y tela polipropileno, altura 2,50m.**





OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 05	Excavacion manual en material comun, incluye retiro.





OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 06	Relleno compactado con material seleccionado de prestamo.





OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 07	Concreto Solado 1500 psi, espesor 5cm.





OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**NP 08**	**Concreto 3000 psi para viga de cimentación, sección 30cm x 40cm.**




OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**NP 09**	**Concreto 3000 psi para columna sección 20cm x 40cm.**





OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**NP 10**	**Concreto 3000 psi viga sección 20cm x 20cm.**

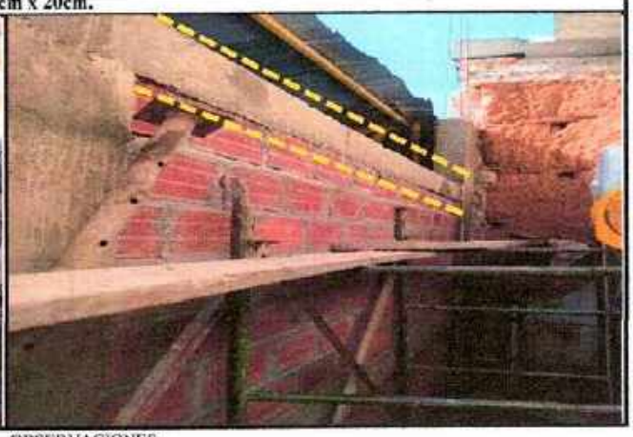OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 11	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.





OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____


	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 12	Mamposteria H-15 ladrillo de arcilla.



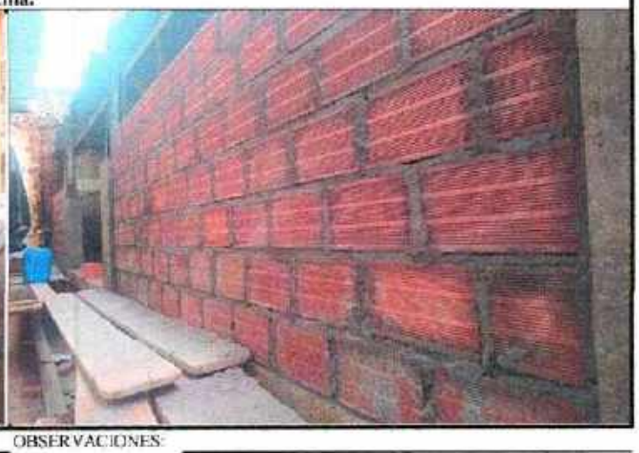

OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 14	Alfajia en concreto de 3000 psi seccion 0,30m x 0,04m.





OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
ITEM	**NP 15**	**Suministro e instalación de cajonera empotrada en madera RH, espesor 15mm, abierta, ancho variable**	









OBSERVACIONES: _____

OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
ITEM	**NP 17**	**Suministro e instalación de ventana metalica de 1,38 m x 2,40 m, incluye marco, con acabado en pintura**	









OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO		Código: F-GDI-5200-238,37-073
			Fecha: 06-Feb-2014
			Versión: 02
			Página 1 de 1
CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			
"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
ITEM	**NP 18**	**Alerones en estructura de madera sobre ventanas y puerta principal, ancho 0,35m, incluye viguetas, techo**	









OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 19	Suministro e Instalacion de piso en vinilo.










OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 20	Guardescoba en Vinilo, altura 8cm.

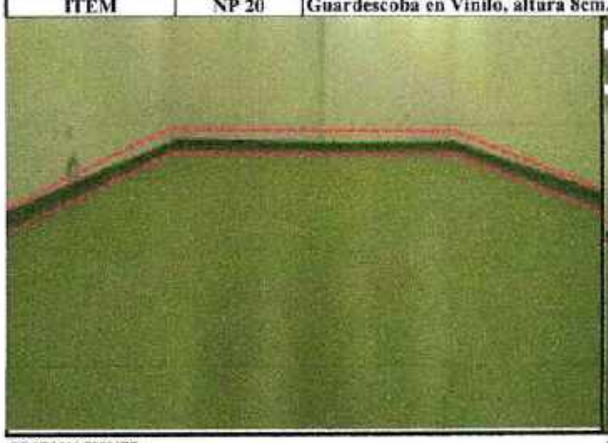



OBSERVACIONES: _____ OBSERVACIONES: _____

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 21	**Suministro e instalación de correas metálicas para soporte estructural del cielo raso.**







OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	FECHA:	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	NP 22	**Mamposteria Temosa ladrillo de arcilla.**

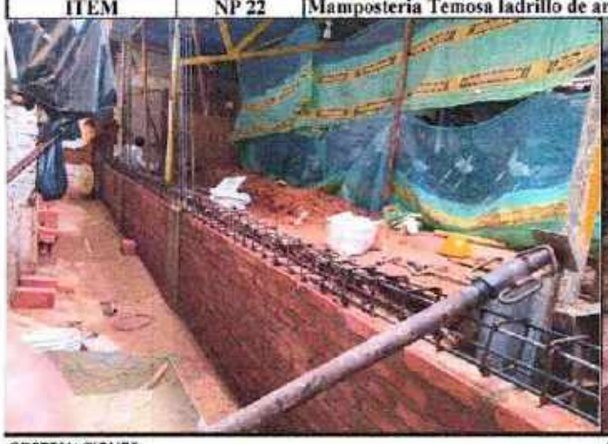



OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
ITEM	**NP 23**	**Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12000BTU refrigerante**	

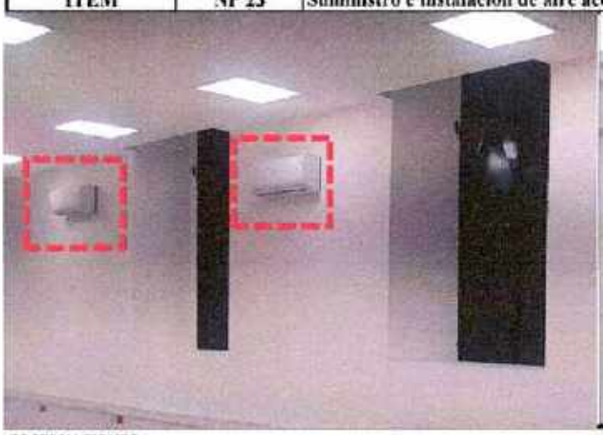



OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
ITEM	**NP 24**	**Suministro e instalación de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 24000BTU refrigerante**	





OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
ITEM	**NP 25**	**Caja de Inspección de aguas residuales de 60 x 60 x 60, en mampóstería tipo temosa, incluye losa de piso**	







OBSERVACIONES



OBSERVACIONES

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073
		Fecha: 06-Feb-2014
		Versión: 02
		Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**NP 26**	**Suministro, transporte e instalación de luminaria LED, 12W o similar. Incluye cableado y accesorios de**









OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**NP 27**	**Suministro e instalación de ventana con marco metalico de 1,97m x 0,90 m, en tubo cuadrado 3/4 , incluye**





OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: F-GDI-5200-238,37-073 Fecha: 06-Feb-2014 Versión: 02 Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO # 262 DE 2022	**FECHA:**	01/11/2022 A 11/08/2023
OBJETO:			

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM	**NP 28**	**Pintura vinilo tipo 2 bajo teja asbesto cemento, dos manos.**









OBSERVACIONES:

Ing. Civil	**FORMATO PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA JULIO 2023

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
65039412	jul-23	ago-23	$ 867.800	$ 498.500	$ 1.993.400	$ 498.500	16/08/2023

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
65039425	jul-23	jul-23	$ 6.100	$ 145.000	$ 185.600	$ -	16/08/2023

REALIZA

MARIA MONICA HERRERA HERRERA
PROFESIONAL EN SST

FORMATO PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA JUNIO 2023

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
64275246	jun-23	jul-23	$ 821.900	$ 472.400	$ 1.888.200	$ 472.400	19/07/2023

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
64275245	jun-23	jun-23	$ 6.100	$ 145.000	$ 185.600	$ -	19/07/2023

REALIZA

MARIA MONICA HERRERA HERRERA
PROFESIONAL EN SST

Ing. Civil	**FORMATO PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA FEBRERO 2023

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
61695579	feb-23	mar-23	657500	377900	1510900	377900	17/03/2023

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
61695573	feb-23	feb-23	6100	145000	185600	N/A	17/03/2023

REALIZA

MARIA MONICA HERRERA HERRERA
PROFESIONAL EN SST

Ing. Civil.	**FORMATO PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA ENERO 2023

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
61317285	ene-23	feb-23	262500	151000	603100	141200	10/02/2023

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
61317050	ene-23	ene-23	6100	145000	185600	N/A	10/02/2023

REALIZA

MARIA MONICA HERRERA HERRERA
PROFESIONAL EN SST

Ing. Civil	**FORMATO PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA DICIEMBRE 2022

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
60308531	dic-22	ene-23	511500	313800	1254600	293800	17/01/2023

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
60308600	dic-22	dic-22	5300	125000	160000	N/A	17/01/2023

REALIZA

MARIA MONICA HERRERA HERRERA
PROFESIONAL EN SST

Ing. Civil.	**FORMATO PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA NOVIEMBRE 2022

"MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
59937623	nov-22	dic-22	347000	199200	796600	199200	12/12/2022

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

PLANILLA NUMERO	PERIODO DE COTIZACION	PERIODO DE SERVICIO	TOTAL ARL	TOTAL EPS	TOTAL AFP	TOTAL CCF	FECHA DE PAGO
59767350	nov-22	nov-22	5300	125000	160000	N/A	12/12/2023

REALIZA

MARIA MONICA HERRERA HERRERA
PROFESIONAL EN SST

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-14, 02:01:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65656067

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 14/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1007252286	ORLANDO ROJAS PAEZ	01	00	X																	0	12	12	12	(230201) PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 464.000	$ 18.600	4.000	$ 464.000	$ 32.500	(CCF39) CAJASAN	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000
CC 1098628937	CLAUDIA MAYERLY TOLEDO OSORIO	01	00	X																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	4.000	$ 1.160.000	$ 81.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1098628140	FREDDY ENRIQUE RUEDA ROSAS	01	00	X																	0	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4.000	$ 1.160.000	$ 81.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1098681964	HENRY ALFREDO RANGEL MORENO	01	00	X																	0	12	12	12	(230201) PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 464.000	$ 18.600	4.000	$ 464.000	$ 32.500	(CCF39) CAJASAN	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000
CC 1098972158	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	01	00	X																	0	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 850.667	$ 136.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 850.667	$ 34.100	4.000	$ 850.667	$ 59.500	(CCF39) CAJASAN	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 13514000	LUIS GERARDO URIBE ROSAS	01	00	X																	0	23	23	23	(230201) PORVENIR	$ 1.487.334	$ 238.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.487.334	$ 59.500	4.000	$ 1.487.334	$ 103.600	(CCF39) CAJASAN	$ 1.487.334	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.000
CC 2553733	GLORIA INES ROA PEREZ	01	00																		0	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	4.000	$ 1.160.000	$ 81.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 91299157	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	01	00	X																	0	22	22	22	(230201) PORVENIR	$ 850.667	$ 136.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 850.667	$ 34.100	4.000	$ 850.667	$ 59.500	(CCF39) CAJASAN	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 91509474	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	01	00	X																	0	22	22	22	(230201) PORVENIR	$ 850.667	$ 136.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 850.667	$ 34.100	4.000	$ 850.667	$ 59.500	(CCF39) CAJASAN	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.447.335	$ 8.447.335	$ 8.447.335	$ 8.447.335	$ 1.352.000	$ 338.200	$ 568.500	$ 338.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.616.900	$ 0	$ 2.616.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-14, 02:45:51 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 65660793

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 14/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 13722479	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ	57	03																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS905) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(MN 02) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-23. 05:22:08 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 65039412

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 16/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	14	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1022252246	ORLANDO ROJAS PAEZ	01	00																		30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,840	$ 1.160.000	$ 9.800	(CCF30) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.200
CC 1098733506	OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA	01	00		X																23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 855.667	$ 136.200	(EPS013) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 855.667	$ 34.100	0,840	$ 855.667	$ 7.200	(CCF30) CAJASAN	$ 852.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.700
CC 1026072037	GLADYS MAYERLY TOLEDO OSORIO	01	00																		30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,840	$ 1.160.000	$ 9.800	(CCF30) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.200
CC 1098639149	FREDDY ENRIQUE RUEDA ROSAS	01	00																		30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0,840	$ 1.160.000	$ 9.800	(CCF30) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.200
CC 1098653502	MIGUEL ALEJANDRO ESPAÑOLA ARIAS	01	00		X																1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 25.667	$ 1.000	0,840	$ 38.667	$ 2.700	(CCF30) CAJASAN	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.500
CC 1098655351	JORGE DANIEL RIZO SANCHEZ	01	00		X																1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 25.667	$ 1.000	0,840	$ 38.667	$ 2.700	(CCF30) CAJASAN	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.500
CC 1102811954	HENRY ALFREDO RAMIREZ MORENO	01	00																		30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,840	$ 1.160.000	$ 9.800	(CCF30) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.200
CC 1098372158	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	01	00																		30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS013) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,840	$ 1.160.000	$ 9.800	(CCF30) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.200
CC 13514993	LUIS OCTAVIO SIERRA ROSAS	01	00																		30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.940.000	$ 310.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.940.000	$ 77.600	0,840	$ 1.940.000	$ 16.300	(CCF30) CAJASAN	$ 1.940.000	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.700
CC 13918781	EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ	01	00	X	X																4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	0,840	$ 154.667	$ 1.300	(CCF30) CAJASAN	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.600
CC 28352733	GLORIA INES ROA PEREZ	01	00																		30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,840	$ 1.160.000	$ 9.800	(CCF30) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.200
CC 91268157	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	01	00																		30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,840	$ 1.160.000	$ 9.800	(CCF30) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.200
CC 91529554	JOHN FREDY ORDOÑEZ	01	00	X	X																4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	0,840	$ 154.667	$ 1.300	(CCF30) CAJASAN	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.600
CC 91553474	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	01	00																		30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,840	$ 1.160.000	$ 9.800	(CCF30) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77, Línea Ética: 018000 517805.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.457.335	$ 12.457.335	$ 12.457.335	$ 12.457.335	$ 1.993.400	$ 498.500	$ 867.500	$ 498.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.858.200	$ 0	$ 3.858.200

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-23, 05:22:19 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 65039425

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 16/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	SLN	INT	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13722479	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ	57	00																	0	30	30	0	(25-14)-COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 185,600	(EPS022) SALUD TOTAL EPS	$ 1,160,000	$ 145,000	0,522	$ 1,160,000	$ 6,080	(ARL-23) ARL SURA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 145,000	$ 6,080	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-26, 06:45:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 64275246

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 19/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	12	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	PLT	IRP	Días Apor	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007252246	ORLANDO ROJAS PAEZ	01	00	X																	0	22	22	22	22	(23301) PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 850.667	$ 34.100	0.040	$ 850.667	$ 59.300	(CCF39) CAJASAN	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 1065703588	OSCAR ANDRES BERCHAN SILVA	01	00	X																	0	16	16	16	16	(23301) PORVENIR	$ 610.667	$ 39.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 610.667	$ 24.400	0.040	$ 610.667	$ 43.700	(CCF39) CAJASAN	$ 610.667	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.700
CC 1065809192	GLADYS MAYERLY TOLEDO OSORIO	01	00	X																	0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 850.667	$ 136.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 850.667	$ 34.100	0.040	$ 850.667	$ 59.300	(CCF39) CAJASAN	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 1098628149	FREDDY ENRIQUE RUEDA ROSAS	01	00																		0	30	30	30	30	(23301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0.040	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1098703167	MIGUEL ALEJANDRO ESPINOSA ARIAS	01	00																		0	30	30	30	30	(23301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0.040	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1098805341	JORGE DANIEL REO SANCHEZ	01	00	X																	0	22	22	22	22	(23301) PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 850.667	$ 34.000	0.040	$ 850.667	$ 59.300	(CCF39) CAJASAN	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.600
CC 1098975994	HENRY ALFREDO RANGEL MORENO	01	00	A																	0	16	16	16	16	(23301) PORVENIR	$ 610.667	$ 39.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 610.667	$ 24.400	0.040	$ 610.667	$ 43.700	(CCF39) CAJASAN	$ 610.667	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.700
CC 1098972168	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	01	00	A																	0	26	26	26	26	(23301) PROTECCION	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	0.040	$ 1.121.334	$ 80.700	(CCF39) CAJASAN	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 1251853	LUIS GERARDO HERRERA ROSAS	01	00	A																	0	16	16	16	16	(23301) PORVENIR	$ 1.164.000	$ 186.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.164.000	$ 46.600	0.040	$ 1.164.000	$ 81.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.164.000	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.600
CC 2828723	GLORIA INES ROA PEREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(23301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0.040	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 91259157	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	01	00	X																	0	26	26	26	26	(23301) PORVENIR	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	0.040	$ 1.121.334	$ 80.700	(CCF39) CAJASAN	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 91939974	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	01	00	X																	0	26	26	26	26	(23301) PORVENIR	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	0.040	$ 1.121.334	$ 80.700	(CCF39) CAJASAN	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517896.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11,797,337	$ 11,797,337	$ 11,797,337	$ 11,797,337	$ 1,888,200	$ 472,400	$ 821,900	$ 472,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,654,900	$ 0	$ 3,654,900

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-26, 06:46:01 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 64275245

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 19/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	INT	PAG P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FIP	Días APP	Días ERP	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total$
CC 13722479	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ	57	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,160,000	$ 185,600	SURA EPS	$ 1,160,000	$ 145,000	0.522	$ 1,160,000	$ 6,100	SURA CCF BARRANCA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 0	$ 185,600	$ 145,000	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336,700	$ 0	$ 336,700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517506.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-21, 11:58:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61695579

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 17/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	IRET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineduca	Total
CC 1065615878	ANDERSON CELIS HERNANDEZ	01	00	X	X																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 541.334	$ 86.700	EPS017) FAMISANAR EPS	$ 541.334	$ 21.700	6.960	$ 541.334	$ 37.700	(CCF39) CAJASAN	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.800
CC 1098636149	FREDDY ENRIQUE RUEDA ROSAS	01	00	X																	0	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.121.324	$ 179.500	EPS010) EPS SURA	$ 1.121.324	$ 44.900	6.960	$ 1.121.324	$ 78.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.121.324	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 1095072159	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	01	00	X																	0	29	29	29	(230301) PROTECCION	$ 855.334	$ 142.100	EPS034) NUEVA EPS	$ 855.334	$ 35.000	6.960	$ 855.334	$ 61.900	(CCF39) CAJASAN	$ 855.334	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 1193895666	SERGIO ANDRES CASTELLANOS RINCON	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.150.000	$ 190.900	EPS034) NUEVA EPS	$ 1.150.000	$ 46.000	6.960	$ 1.150.000	$ 80.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.000
CC 1.[illegible]	LUIS GERARDO LARENA ROSAS	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.540.000	$ 210.400	EPS010) EPS SURA	$ 1.540.000	$ 77.000	6.960	$ 1.540.000	$ 107.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.540.000	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.700
CC 1218761	EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.150.000	$ 185.600	EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.150.000	$ 46.000	6.960	$ 1.150.000	$ 80.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7525723	GLORIA INES ESTUPIÑAN PEREZ	01	00	X																	0	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 850.667	$ 130.200	EPS034) NUEVA EPS	$ 850.667	$ 34.100	6.960	$ 850.667	$ 59.200	(CCF39) CAJASAN	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 91259197	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	01	00	X																	0	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 855.334	$ 142.100	EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 855.334	$ 35.000	6.960	$ 855.334	$ 61.900	(CCF39) CAJASAN	$ 855.334	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 9859474	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	01	00	X																	0	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 855.334	$ 142.100	EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 855.334	$ 35.000	6.960	$ 855.334	$ 61.900	(CCF39) CAJASAN	$ 855.334	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.441.337	$ 9.441.337	$ 9.441.337	$ 9.441.337	$ 1.510.000	$ 377.900	$ 657.500	$ 377.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.924.200	$ 0	$ 2.924.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517808.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-21, 11:55:30 AM **Tipo Planilla:** E PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 61695573

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 17/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET F	RET P	TDP	TAE	TDP	TAP	VSP	CUN	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13722479	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ	57	(N)																		0	28	0	0	(25-44) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS002 SA	ID TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.160	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.160	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

ARUS. Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517808.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-10, 10:53:46 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61317285

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	Ret T.P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1066330470	LUIS EDUARDO ECHEVERRIA PEREZ	01	00	X	X																6	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 270.867	$ 43.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 270.867	$ 10.900	6,960	$ 270.867	$ 18.900	(CCF39) CAJASAN	$ 270.867	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.300
CC 1232990000	SERGIO ANDRES CASTELLANOS RINCON	01	00	X																	6	28	28	28	28	(230201) PORVENIR	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 13514093	LUIS GERARDO URIBE ROSAS	01	00	X																	6	11	11	11	11	(230201) PORVENIR	$ 711.334	$ 113.900	(EPS010) EPS SURA	$ 711.334	$ 28.500	6,960	$ 711.334	$ 49.600	(CCF39) CAJASAN	$ 711.334	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500
CC 1071 [illegible]	EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ	01	00	X																	6	28	28	28	28	(230201) PORVENIR	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS044) SALUD TOTAL EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF39) CAJASAN	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 4,[illegible]	VICTOR JULIO MESA PADILLA	01	00	X	X																6	7	7	7	7	(230201) PORVENIR	$ 270.867	$ 43.400	(EPS044) SALUD TOTAL EPS	$ 270.867	$ 10.900	6,960	$ 270.867	$ 18.900	(CCF39) CAJASAN	$ 270.867	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.100
CC 9852452	JORGE LEONARDO CONTRERAS BRICEÑO	01	00	X	X																6	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 270.867	$ 43.400	(EPS034) SPS-S COOSALUD (NOVEDAD)	$ 270.867	$ 10.900	6,960	$ 270.867	$ 18.900	(CCF39) CAJASAN	$ 27.067	$ 1.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.766.003	$ 3.766.003	$ 3.766.003	$ 3.522.403	$ 693.100	$ 151.000	$ 262.500	$ 141.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.157.800	$ 0	$ 1.157.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-10, 10:56:04 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 61317050

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2023

PAGADO 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	INT	INT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 13722479	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ	57	00																		0	30	30	0	(25-1) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(RX-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 86 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-21, 11:01:43 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 60308531

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** enero de 2023

PAGADO 17/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	11	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minsalud	Total
CC 1[illegible]	LUIS ALBERTO CIRDLES BETIN	01	00	X	X																0	1	1	1	(230201) PORVENIR	$ 22.333	$ 5.100	(ESS024) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 33.333	$ 1.400	6,840	$ 33.333	$ 2.400	(CCF38) CAJASAN	$ 33.333	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.300
CC 7[illegible]	LUIS EDUARDO MENDOZA PEREZ	01	00	X	X																0	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 966.667	$ 154.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 966.667	$ 36.700	6,240	$ 966.667	$ 67.300	(CCF38) CAJASAN	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.400
CC 1[illegible]	LUIS ALBERTO FLOREZ FLOREZ	01	00		X																1	31	31	31	(230201) PORVENIR	$ 966.667	$ 80.700	(ESS024) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 966.667	$ 32.700	6,540	$ 966.667	$ 39.533	(CCF38) CAJASAN	$ 966.667	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.900
CC 1[illegible]	ALDER JUBANI RIVERA MARTINEZ	01	00	X	X																0	12	12	12	(230201) PORVENIR	$ 400.000	$ 84.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 400.000	$ 16.800	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF38) CAJASAN	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 1[illegible]	MARIA MONICA PEREIRA RIVERA	01	00		X																1	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 966.667	$ 154.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 966.667	$ 36.700	6,240	$ 966.667	$ 67.300	(CCF38) CAJASAN	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.400
CC 1[illegible]	EDWIN RICARDO OSORIO JEREZ	01	00		X																0	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,000	$ 1.000.000	$ 60.000	(CCF38) CAJASAN	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.000
CC 1[illegible]	RAMIRO PARDO FONTECHA	01	00												X						0	15	15	15	(230201) PORVENIR	$ 500.000	$ 80.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 500.000	$ 70.000	0,000	$ 500.000	$ 0	(CCF38) CAJASAN	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000
CC 1[illegible]	RAMIRO PARDO FONTECHA	01	00		X																0	2	2	2	(230201) PORVENIR	$ 66.667	$ 10.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 66.667	$ 7.700	6,960	$ 66.667	$ 4.700	(CCF38) CAJASAN	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.800
CC 4[illegible]	VICTOR JULIO MESA PADILLA	01	00	X	X																0	29	29	29	(230201) PORVENIR	$ 966.667	$ 154.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 966.667	$ 36.700	6,240	$ 966.667	$ 67.300	(CCF38) CAJASAN	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.400
CC 1[illegible]	JORGE LEONARDO CONTRERAS DIRCEO	01	00	X	X																0	10	10	10	(230114) COLPENSIONES	$ 400.000	$ 64.000	(ESS024) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 400.000	$ 16.800	6,900	$ 400.000	$ 27.900	(CCF38) CAJASAN	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 9[illegible]	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	01	00		X																0	28	28	28	(230201) PORVENIR	$ 980.000	$ 156.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 980.000	$ 39.200	6,960	$ 980.000	$ 68.300	(CCF38) CAJASAN	$ 980.000	$ 39.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.500
CC 9[illegible]	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	01	00		X																0	28	28	28	(230201) PORVENIR	$ 980.000	$ 156.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 980.000	$ 39.200	6,960	$ 980.000	$ 68.300	(CCF38) CAJASAN	$ 980.000	$ 39.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 88 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.840.002	$ 7.840.002	$ 7.840.002	$ 7.673.332	$ 1.254.600	$ 313.800	$ 511.500	$ 293.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.373.700	$ 0	$ 2.373.700

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-21, 11:01:51 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 60308600

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 17/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IBC	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 13722479	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ	57	00																		0	30	0	0	05-14 COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	SPS002 SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	0.522	$ 1.000.000	$ 5.300	NN-CC NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS
Tecnología - Información - Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-13, 12:36:34 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 59937623

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 12/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1061740583	LUIS ALBERTO FLOREZ FLOREZ	01	00	X																	0	0	0	0	(23301) FONPENSIONES	$ 200.000	$ 32.000	(ESS024) EPS S COOSALUD EMPRESARIAL	$ 200.000	$ 8.000	0,348	$ 200.000	$ 1.000	(CCF30) CAJASAN	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.000
CC 1090372159	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	01	00	X																	0	29	29	29	(23302) PROTECCION S	$ 1.015.000	$ 162.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.015.000	$ 40.600	0,348	$ 1.015.000	$ 76.705	(CCF30) CAJASAN	$ 1.015.000	$ 40.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.305
CC 13[illegible]1	EDWIN NICOLEDES OSORIO JEREZ	01	00	X																	0	21	21	21	(23301) FONPENSIONES	$ 700.000	$ 112.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 700.000	$ 28.000	0,348	$ 700.000	$ 54.600	(CCF30) CAJASAN	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.600
CC 1065[illegible]903	RAMIRO PARDO FONTECHA	01	00	X																	0	21	21	21	(23301) FONPENSIONES	$ 700.000	$ 112.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 700.000	$ 28.000	0,348	$ 700.000	$ 54.600	(CCF30) CAJASAN	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.600
CC 9[illegible]755	ROBINSON LEGUIZAMO ARANCO	01	00	X	X																0	10	10	10	(23301) FONPENSIONES	$ 333.334	$ 53.400	(EPS041) POSITIVA/MUEVASPS PILO MOVILIDAD	$ 333.334	$ 13.400	0,348	$ 333.334	$ 26.005	(CCF30) CAJASAN	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.000
CC 91[illegible]157	LUIS ENRIQUE PEDRAZA HERNANDEZ	01	00	X																	0	29	29	29	(23301) FONPENSIONES	$ 1.015.000	$ 162.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.015.000	$ 40.600	0,348	$ 1.015.000	$ 79.705	(CCF30) CAJASAN	$ 1.015.000	$ 40.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.305
CC 91[illegible]474	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	01	00	X																	0	29	29	29	(23301) FONPENSIONES	$ 1.015.000	$ 162.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.015.000	$ 40.600	0,348	$ 1.015.000	$ 79.705	(CCF30) CAJASAN	$ 1.015.000	$ 40.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.305

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.978.334	$ 4.978.334	$ 4.978.334	$ 4.978.334	$ 796.600	$ 199.200	$ 347.000	$ 199.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.542.000	$ 0	$ 1.542.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-13, 12:36:52 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 59767350

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

PAGADO 12/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	**Dirección**	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	316694482
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13722479	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ	57	00																	0	30	30	0		COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 100.000	EPS025 SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	0.522	$ 1.000.000	$ 5.300		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 100.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT. 13.722.479-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 013-2023

EFECTIVO

RECIBIDO DE: CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT o CC NIT. 13.722.479-1

PAGADO A : HENRY ALFREDO RANGEL MORENO
NIT o CC : 1.098.815.964

FECHA : 31-ago-23
CONCEPTO : **PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES**
FORMA DE PAGO : **EFECTIVO**

TERCERO	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
HENRY ALFREDO RANGEL MORENO	1.098.815.964	PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 402.675,00	
HENRY ALFREDO RANGEL MORENO	1.098.815.964	PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 402.675,00
		SUMAS IGUALES	**$ 402.675**	**$ 402.675**

HE RECIBIDO EN EFECTIVO LA SUMA DE CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO Henry Rangel Moreno
NOMBRE: HENRY ALFREDO RANGEL MORENO
NIT o CC 1.098.815.964

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2023

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	31/08/2023
Nombre Empleador	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C. o NIT	NIT: 13.722.479-1
Nombre del Trabajador:	HENRY ALFREDO RANGEL MORENO
Cedula de Ciudadanía	1.098.815.964
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Clase de Contrato	Por Labor Contratada
Causa de Terminación	Terminación Labor

Datos para la liquidación		**Liquidación Prima Legal**	
Fecha de Ingreso	16-jun-23	Fecha de Inicio	1-jul-23
Fecha de Retiro	10-ago-23	Fecha de Retiro	10-ago-23
Días Trabajados	56	**Días para liquidar Prima**	40
Salario Basico	1.160.000	**Liquidación Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	1-jul-23
Auxilio de Transporte	140.606	Fecha de Retiro	10-ago-23
Salario Base	**1.300.606**	**Días para liquidar Vacaciones**	40

Liquidación de Prestaciones Sociales	
Cesantías	202.316
Intereses a las Cesantías	3.777
Prima de Servicios	144.512
Vacaciones	64.444
Total Prestaciones	415.049
TOTAL LIQUIDACION	**415.049**
Deducciones	
Salud	6.187
Pensión	6.187
Total Deducciones	12.374
Neto a pagar	**402.676**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

Henry Ranga Moreno
HENRY ALFREDO RANGEL MORENO
1.098.815.964
EMPLEADO

CARLOS ANDRÉS JAIMES SUÁREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
T.P. 68202101014STD

Bucaramanga, 10 agosto de 2023

Señor:
HENRY ALFREDO RANGEL MORENO
Ciudad

Referencia: Examen de Retiro

Cordial saludo,

Nos permitimos informarle la dirección para realizarse los respectivos exámenes de retiro de la empresa.

Por favor presentarse a nombre de la empresa CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

INFORMACIÓN DE LA CITACIÓN:
FECHA: 11 AGOSTO 2023
HORA: 8:00 am
LUGAR: cra 35a # 52-70 Medicid ips

Atentamente,

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C 13.722.479 de Bucaramanga

Conjunto, Germania Torre 3 Apartamento 1909
Móvil: 3166944822
Bucaramanga – Santander

CARLOS ANDRÉS JAIMES SUÁREZ

INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

T.P. 68202101014STD

PAZ Y SALVO

Yo, HENRY ALFREDO RANGEL MORENO identificado con Cedula de Ciudadania N° 1.098.815.964, DECLARO que la EMPRESA del Ing. CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, NIT : 13.722.479-0 ; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS ,SOBRETIEMPOS DOMINICALES , DIAS FERIADOS , INDEMNIZACIONES , LIQUIDACIONES , PRIMAS , CESANTIAS , VACACIONES , AUXILIOS DE ENFERMEDAD , INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY ,dineros cancelados en efectivo por el tiempo que labore en la empresa.

La presente se firmó el dia 31 de agosto de 2023.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR NOMBRE COMPLETO



Henry Rangel Moreno

HENRY ALFREDO RANGEL MORENO
C.C 1.098.815.964
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

Conjunto, Germania Torre 3 Apartamento 1909

Móvil: 3166944822

Bucaramanga - Santander

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT. 13.722.479-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 012-2023

EFECTIVO

RECIBIDO DE: CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT o CC NIT. 13.722.479-1

PAGADO A : OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA
NIT o CC : 1.065.233.906

FECHA : 31-jul-23
CONCEPTO : **PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES**
FORMA DE PAGO : **EFECTIVO**

TERCERO	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA	1.065.233.906	PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 241.577,00	
OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA	1.065.233.906	PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 241.577,00
		SUMAS IGUALES	**$ 241.577**	**$ 241.577**

HE RECIBIDO EN EFECTIVO LA SUMA DE DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE

ANDRÉS MERCHAN

FIRMA DEL BENEFICIARIO
NOMBRE: **OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA**
NIT o CC **1.065.233.906**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2023

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	**31/07/2023**
Nombre Empleador	**CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ**
C.C. o NIT	**NIT: 13.722.479-1**
Nombre del Trabajador	**OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA**
Cedula de Ciudadanía	**1.065.233.906**
Cargo	**AYUDANTE DE OBRA**
Clase de Contrato	**Por Labor Contratada**
Causa de Terminación	**Terminación Labor**

Datos para la liquidación		**Liquidación Prima Legal**	
Fecha de Ingreso	15-jun-23	Fecha de Inicio	1-jul-23
Fecha de Retiro	22-jul-23	Fecha de Retiro	22-jul-23
Dias Trabajados	38	**Dias para liquidar Prima**	22
Salario Basico	1.160.000	**Liquidación Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	1-jul-23
Auxilio de Transporte	140.606	Fecha de Retiro	22-jul-23
Salario Base	**1.300.606**	**Dias para liquidar Vacaciones**	22

Liquidación de Prestaciones Sociales	
Cesantías	137.286
Intereses a las Cesantías	1.739
Prima de Servicios	79.481
Vacaciones	36.444
Total Prestaciones	253.951
TOTAL LIQUIDACION	**253.951**

Deducciones	
Salud	6.187
Pensión	6.187
Total Deducciones	12.374
Neto a pagar	**241.577**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

ANDRÉS MERCHAN
OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA
1.065.233.906
EMPLEADO

CARLOS ANDRÉS JAIMES SUÁREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
T.P. 68202101014STD

Bucaramanga, 22 julio de 2023

Señor:
OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA
Ciudad

Referencia: Examen de Retiro

Cordial saludo,

Nos permitimos informarle la dirección para realizarse los respectivos exámenes de retiro de la empresa.

Por favor presentarse a nombre de la empresa CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

INFORMACIÓN DE LA CITACIÓN:
FECHA: 24 JULIO 2023
HORA: 8:00 am
LUGAR: cra 35a # 52-70 Medicid ips

Atentamente,

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C 13.722.479 de Bucaramanga

Conjunto, Germania Torre 3 Apartamento 1909
Móvil: 3166944822
Bucaramanga – Santander

CARLOS ANDRÉS JAIMES SUÁREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
T.P. 68202101014STD

PAZ Y SALVO

Yo, OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.065.233.906, DECLARO que la EMPRESA del Ing. CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, NIT : 13.722.479-0 ; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS ,SOBRETIEMPOS DOMINICALES , DIAS FERIADOS , INDEMNIZACIONES , LIQUIDACIONES , PRIMAS , CESANTIAS , VACACIONES , AUXILIOS DE ENFERMEDAD , INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY ,dineros cancelados en efectivo por el tiempo que labore en la empresa.

La presente se firmó el día 31 de julio de 2023.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO



ANDRÉS MERCHAN

OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA
C.C 1.065.233.906
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

Conjunto, Germania Torre 3 Apartamento 1909
Móvil 3166944822
Bucaramanga - Santander

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT. 13.722.479-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 014-2023

EFECTIVO

RECIBIDO DE:		CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT o CC		NIT. 13.722.479-1
PAGADO A	:	ORLANDO ROJAS PAEZ
NIT o CC	:	1.007.252.246
FECHA	:	31-ago-23
CONCEPTO	:	**PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES**
FORMA DE PAGO	:	**EFECTIVO**

TERCERO	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
ORLANDO ROJAS PAEZ	1.007.252.246	PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 425.205,00	
ORLANDO ROJAS PAEZ	1.007.252.246	PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 425.205,00
		SUMAS IGUALES	**$ 425.205**	**$ 425.205**

HE RECIBIDO EN EFECTIVO LA SUMA DE CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MCTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO Orlando Rojas P.
NOMBRE: **ORLANDO ROJAS PAEZ**
NIT o CC **1.007.252.246**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2023

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	**31/08/2023**
Nombre Empleador	**CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ**
C.C. o NIT	**NIT: 13.722.479-1**
Nombre del Trabajador	**ORLANDO ROJAS PAEZ**
Cedula de Ciudadanía	**1.007.252.246**
Cargo	**AYUDANTE DE OBRA**
Clase de Contrato	**Por Labor Contratada**
Causa de Terminación	**Terminación Labor**

Datos para la liquidación		**Liquidación Prima Legal**	
Fecha de Ingreso	9-jun-23	Fecha de Inicio	1-jul-23
Fecha de Retiro	10-ago-23	Fecha de Retiro	10-ago-23
Dias Trabajados	62	**Dias para liquidar Prima**	40
Salario Basico	1.160.000	**Liquidación Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	1-jul-23
Auxilio de Transporte	140.606	Fecha de Retiro	10-ago-23
Salario Base	**1.300.606**	**Dias para liquidar Vacaciones**	40

Liquidación de Prestaciones Sociales	
Cesantías	223.993
Intereses a las Cesantías	4.629
Prima de Servicios	144.512
Vacaciones	64.444
Total Prestaciones	437.579
TOTAL LIQUIDACION	**437.579**
Deducciones	
Salud	6.187
Pensión	6.187
Total Deducciones	12.374
Neto a pagar	**425.205**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

Orlando Rojas P.

ORLANDO ROJAS PAEZ
1.007.252.246
EMPLEADO

CARLOS ANDRÉS JAIMES SUÁREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
T.P. 68202101014STD

Bucaramanga, 10 agosto de 2023

Señor:
ORLANDO ROJAS PAEZ
Ciudad

Referencia: Examen de Retiro

Cordial saludo,

Nos permitimos informarle la dirección para realizarse los respectivos exámenes de retiro de la empresa.

Por favor presentarse a nombre de la empresa CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

INFORMACIÓN DE LA CITACIÓN:
FECHA: 11 AGOSTO 2023
HORA: 8:00 am
LUGAR: cra 35a # 52-70 Medicid ips

Atentamente,

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C 13.722.479 de Bucaramanga

Conjunto, Germania Torre 3 Apartamento 1909
Móvil: 3166944822
Bucaramanga - Santander

CARLOS ANDRÉS JAIMES SUÁREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
T.P. 68202161014STD

PAZ Y SALVO

Yo, ORLANDO ROJAS PAEZ identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.007.252.246, DECLARO que la EMPRESA del Ing. CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, NIT : 13.722.479-0 ; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS ,SOBRETIEMPOS DOMINICALES , DIAS FERIADOS , INDEMNIZACIONES , LIQUIDACIONES , PRIMAS , CESANTIAS , VACACIONES , AUXILIOS DE ENFERMEDAD , INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY ,dineros cancelados en efectivo por el tiempo que labore en la empresa.

La presente se firmó el día 31 de agosto de 2023.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO



Orlando Rojas P.

ORLANDO ROJAS PAEZ
C.C 1.007.252.246
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

Conjunto, Germania Torre 3 Apartamento 1909
Móvil: 3166944822
Bucaramanga – Santander

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT. 13.722.479-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 010-2023

EFECTIVO

RECIBIDO DE:		CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT o CC		NIT. 13.722.479-1
PAGADO A	:	JOHN FREDY ORDOÑEZ
NIT o CC	:	91.528.004
FECHA	:	31-jul-23
CONCEPTO	:	**PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES**
FORMA DE PAGO	:	**EFECTIVO**

TERCERO	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
JOHN FREDY ORDOÑEZ	91.528.004	PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 22.992,00	
JOHN FREDY ORDOÑEZ	91.528.004	PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 22.992,00
		SUMAS IGUALES	**$ 22.992**	**$ 22.992**

HE RECIBIDO EN EFECTIVO LA SUMA DE VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO John Freddy Ordoñez

NOMBRE: JOHN FREDY ORDOÑEZ

NIT o CC 91.528.004

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2023

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	**31/07/2023**
Nombre Empleador	**CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ**
C.C. o NIT	**NIT: 13.722.479-1**
Nombre del Trabajador	**JOHN FREDY ORDOÑEZ**
Cedula de Ciudadanía	**91.528.004**
Cargo	**AYUDANTE DE OBRA**
Clase de Contrato	**Por Labor Contratada**
Causa de Terminación	**Terminación Labor**

Datos para la liquidación		**Liquidación Prima Legal**	
Fecha de Ingreso	5-jul-23	Fecha de Inicio	5-jul-23
Fecha de Retiro	8-jul-23	Fecha de Retiro	8-jul-23
Dias Trabajados	4	**Dias para liquidar Prima**	4
Salario Basico	1.160.000	**Liquidación Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	5-jul-23
Auxilio de Transporte	140.606	Fecha de Retiro	8-jul-23
Salario Base	**1.300.606**	**Dias para liquidar Vacaciones**	4

Liquidación de Prestaciones Sociales	
Cesantias	14.451
Intereses a las Cesantias	19
Prima de Servicios	14.451
Vacaciones	6.444
Total Prestaciones	35.366
TOTAL LIQUIDACION	**35.366**
Deducciones	
Salud	6.187
Pensión	6.187
Total Deducciones	12.374
Neto a pagar	**22.992**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

John Fredy Ordoñez
JOHN FREDY ORDOÑEZ
91.528.004
EMPLEADO

CARLOS ANDRÉS JAIMES SUÁREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
T.P. 68202101014STD

Bucaramanga, 8 julio de 2023

Señor:
JOHN FREDY ORDOÑEZ
Ciudad

Referencia: Examen de Retiro

Cordial saludo,

Nos permitimos informarle la dirección para realizarse los respectivos exámenes de retiro de la empresa.

Por favor presentarse a nombre de la empresa CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

INFORMACIÓN DE LA CITACIÓN:
FECHA: 10 JULIO 2023
HORA: 8:00 am
LUGAR: cra 35a # 52-70 Medicid ips

Atentamente,

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C 13.722.479 de Bucaramanga

Conjunto, Germania Torre 3 Apartamento 1909
Móvil: 3166944822
Bucaramanga – Santander

CARLOS ANDRÉS JAIMES SUÁREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
T.P. 68202101014STD

PAZ Y SALVO

Yo, JOHN FREDY ORDOÑEZ , identificado con Cedula de Ciudadanía N° 91.528.004, DECLARO que la EMPRESA del Ing. CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, NIT : 13.722.479-0 ; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS ,SOBRETIEMPOS DOMINICALES , DIAS FERIADOS , INDEMNIZACIONES , LIQUIDACIONES , PRIMAS , CESANTIAS , VACACIONES , AUXILIOS DE ENFERMEDAD , INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY ,dineros cancelados en efectivo por el tiempo que labore en la empresa.

La presente se firmó el día 31 de julio de 2023.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO



John Fredy Ordoñez
JOHN FREDY ORDOÑEZ
C.C 91.528.004
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

Conjunto, Germania Torre 3 Apartamento 1909
Móvil 3166944822
Bucaramanga - Santander

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT. 13.722.479-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 011-2023

EFECTIVO

RECIBIDO DE:		CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT o CC		NIT. 13.722.479-1
PAGADO A	:	EDWIN NICOMEDES OSORIO SUAREZ
NIT o CC	:	13.718.761
FECHA	:	31-jul-23
CONCEPTO	:	**PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES**
FORMA DE PAGO	:	**EFECTIVO**

TERCERO	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
EDWIN NICOMEDES OSORIO SUAREZ	13.718.761	PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 22.992,00	
EDWIN NICOMEDES OSORIO SUAREZ	13.718.761	PAGO LIQUIDACION Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 22.992,00
		SUMAS IGUALES	**$ 22.992**	**$ 22.992**

HE RECIBIDO EN EFECTIVO LA SUMA DE VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO EDWIN OSORIO

NOMBRE: EDWIN NICOMEDES OSORIO SUAREZ

NIT o CC 13.718.761

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	31/07/2023
Nombre Empleador	**CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ**
C.C. o NIT	**NIT: 13.722.479-1**
Nombre del Trabajador	EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ
Cedula de Ciudadanía	**13.718.761**
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Clase de Contrato	**Por Labor Contratada**
Causa de Terminación	**Terminación Labor**

Datos para la liquidación

Fecha de Ingreso	12-jul-23
Fecha de Retiro	15-jul-23
Dias Trabajados	4
Salario Basico	1.160.000
Salario Variable	0
Auxilio de Transporte	140.606
Salario Base	**1.300.606**

Liquidación Prima Legal

Fecha de Inicio	12-jul-23
Fecha de Retiro	15-jul-23
Dias para liquidar Prima	4

Liquidación Vacaciones

Fecha de Inicio	12-jul-23
Fecha de Retiro	15-jul-23
Dias para liquidar Vacaciones	4

Liquidación de Prestaciones Sociales

Cesantias	14.451
Intereses a las Cesantias	19
Prima de Servicios	14.451
Vacaciones	6.444
Total Prestaciones	35.366
TOTAL LIQUIDACION	**35.366**

Deducciones

Salud	6.187
Pensión	6.187
Total Deducciones	12.374
Neto a pagar	**22.992**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

EDWIN OSORIO
EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ
13.718.761
EMPLEADO

CARLOS ANDRÉS JAIMES SUÁREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
T.P. 68202101014STD

Bucaramanga, 15 julio de 2023

Señor:
EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ
Ciudad

Referencia: Examen de Retiro

Cordial saludo,

Nos permitimos informarle la dirección para realizarse los respectivos exámenes de retiro de la empresa.

Por favor presentarse a nombre de la empresa CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

INFORMACIÓN DE LA CITACIÓN:
FECHA: 17 JULIO 2023
HORA: 8:00 am
LUGAR: cra 35a # 52-70 Medicid ips

Atentamente,

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C 13.722.479 de Bucaramanga

Conjunto, Germania Torre 3 Apartamento 1909
Móvil: 3166944822
Bucaramanga – Santander

CARLOS ANDRÉS JAIMES SUÁREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS
T.P. 68202101014STD

PAZ Y SALVO

Yo, EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 13.718.761, DECLARO que la EMPRESA del Ing. CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, NIT : 13.722.479-0 ; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS ,SOBRETIEMPOS DOMINICALES , DIAS FERIADOS , INDEMNIZACIONES , LIQUIDACIONES , PRIMAS , CESANTIAS , VACACIONES , AUXILIOS DE ENFERMEDAD , INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY ,dineros cancelados en efectivo por el tiempo que labore en la empresa.

La presente se firmó el día 31 de julio de 2023.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO



EDWIN OSORIO

EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ
C.C 13.718.761
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

Conjunto, Germania Torre 3 Apartamento 1909
Móvil: 3166944822
Bucaramanga - Santander

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

PAZ Y SALVO

Yo, ALDER JULIAN RIVERA MARTINEZ identificado con Cedula de Ciudadanía N° *1.098.757.965, DECLARO que la EMPRESA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, con* CC: 13.722.479 de Bucaramanga; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD, INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY, por el tiempo que laboré en el Contrato De Obra N° 262 de 13 de octubre de 2022 con objeto "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

La presente se firmó el día 13 de diciembre de 2022.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO

Alder Julian Rivera
ALDER JULIAN RIVERA MARTINEZ
C.C 1.098.757.965
Cargo: Ayudante de Obra



CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2022

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	30/12/2022
Nombre Empleador	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C. o NIT	NIT: 13.722.479-1
Nombre del Trabajador:	ALDER JULIAN RIVERA MARTINEZ
Cedula de Ciudadania	1.,098.757.965
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Clase de Contrato	Por Labor Contratada
Cause de Terminación	Terminación Labor

Datos para la liquidación		Liquidación Prima Legal	
Fecha de Ingreso	2-dic-22	Fecha de Inicio	2-dic-22
Fecha de Retiro	13-dic-22	Fecha de Retiro	13-dic-22
Dias Trabajados	12	**Dias para liquidar Prima**	12
Salario Basico	1.000.000	**Liquidación Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	2-dic-22
Auxilio de Transporte	117.172	Fecha de Retiro	13-dic-22
Salario Base	**1.117.172**	**Dias para liquidar Vacaciones**	12

Liquidación de Prestaciones Sociales	
Cesantias	37.239
Intereses a las Cesantias	149
Prima de Servicios	37.239
Vacaciones	16.667
Salario	446.869
Total Prestaciones	538.163
TOTAL LIQUIDACION	**538.163**

Deducciones	
Salud	17.875
Pensión	17.875
Total Deducciones	35.750
Neto a pagar	**502.413**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

Alder Julian Rivera

ALDER JULIAN RIVERA MARTINEZ
1.,098.757.965
EMPLEADO

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

PAZ Y SALVO

Yo, LUIS ALBERTO FLOREZ FLOREZ identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.098.743.563, DECLARO que la EMPRESA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, con CC: 13.722.479 de Bucaramanga; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD, INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY, por el tiempo que laboré en el Contrato De Obra N° 262 de 13 de octubre de 2022 con objeto "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

La presente se firmó el día 30 de diciembre de 2022.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO

Luis Florez Florez

LUIS ALBERTO FLOREZ FLOREZ
C.C 1.098.743.563
Cargo: Ayudante de Obra



CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2022

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	**30/12/2022**
Nombre Empleador	**CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ**
C.C. o NIT	**NIT: 13.722.479-1**
Nombre del Trabajador:	**LUIS ALBERTO FLOREZ FLOREZ**
Cedula de Ciudadania	**1.098.743.563**
Cargo	**AYUDANTE DE OBRA**
Clase de Contrato	**Por Labor Contratada**
Causa de Terminación	**Terminación Labor**

Datos para la liquidación

Fecha de Ingreso	25-nov-22
Fecha de Retiro	17-dic-22
Dias Trabajados	**23**
Salario Basico	1.000.000
Salario Variable	0
Auxilio de Transporte	117.172
Salario Base	**1.117.172**

Liquidación de Prestaciones Sociales

Cesantias	71.375
Intereses a las Cesantias	647
Prima de Servicios	71.375
Vacaciones	31.944
Salario	856.499
Total Prestaciones	1.031.740
TOTAL LIQUIDACION	**1.031.740**

Deducciones

Salud	34.260
Pensión	34.260
Total Deducciones	**68.520**
Neto a pagar	**963.220**

Liquidación Prima Legal

Fecha de Inicio	25-nov-22
Fecha de Retiro	17-dic-22
Dias para liquidar Prima	23

Liquidación Vacaciones

Fecha de Inicio	25-nov-22
Fecha de Retiro	17-dic-22
Dias para liquidar Vacaciones	23

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT 13.722.479-1
EMPLEADOR

Luis Florez Florez

LUIS ALBERTO FLOREZ FLOREZ
1.098.743.563
EMPLEADO

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

PAZ Y SALVO

Yo, RAMIRO PARDO FONTECHA identificado con Cedula de Ciudadanía N° 13.952.903, DECLARO que la EMPRESA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, con CC: 13.722.479 de Bucaramanga; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD, INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY, por el tiempo que laboré en el Contrato De Obra N° 262 de 13 de octubre de 2022 con objeto "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".


La presente se firmó el dia 17 de diciembre de 2022.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO

Ramiro Pardo F.
RAMIRO PARDO FONTECHA
C.C 13.952.903
Cargo: Ayudante de Obra



CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0188 – 311 748 2169

Nombre Empleador	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C. o NIT	NIT: 13.722.479-1
Nombre del Trabajador:	RAMIRO PARDO FONTECHA
Cedula de Ciudadania	13.952.903
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Clase de Contrato	Por Labor Contratada
Causa de Terminación	Terminación Labor

Datos para la liquidación		**Liquidación Prima Legal**	
Fecha de Ingreso	10-nov-22	Fecha de Inicio	10-nov-22
Fecha de Retiro	17-dic-22	Fecha de Retiro	17-dic-22
Dias Trabajados	38	**Dias para liquidar Prima**	38
Salario Basico	1.000.000	**Liquidación Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	10-nov-22
Auxilio de Transporte	117.172	Fecha de Retiro	17-dic-22
Salario Base	**1.117.172**	**Dias para liquidar Vacaciones**	38

Liquidación de Prestaciones Sociales	
Cesantias	117.924
Intereses a las Cesantias	1.484
Prima de Servicios	117.624
Vacaciones	52.778
Salario	1.415.085
Total Prestaciones	1.705.203
TOTAL LIQUIDACION	**1.705.203**
Deducciones	
Salud	56.603
Pensión	56.603
Total Deducciones	113.207
Neto a pagar	**1.591.997**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

Ramiro Pardo F.
RAMIRO PARDO FONTECHA
13.952.903
EMPLEADO

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

PAZ Y SALVO

Yo, ROBINSON LEGUIZAMO ARANGO identificado con Cedula de Ciudadanía N° 80.220.799, DECLARO que la EMPRESA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, con CC: 13.722.479 de Bucaramanga; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD, INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY, por el tiempo que laboré en el Contrato De Obra N° 262 de 13 de octubre de 2022 con objeto "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

.

La presente se firmó el día 19 de noviembre de 2022.


Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO

Robinson Leguizamo

ROBINSON LEGUIZAMO ARANGO
C.C 80.220.799
Cargo: Ayudante de Obra



CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0196 – 311 748 2169

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2022

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	30/12/2022
Nombre Empleador	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C. o NIT	NIT: 13.722.479-1
Nombre del Trabajador	ROBINSON LEGUIZAMO ARANGO
Cedula de Ciudadania	80.220.799
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Clase de Contrato	Por Labor Contratada
Causa de Terminación	Terminación Labor

Datos para la liquidación		**Liquidación Prima Legal**	
Fecha de Ingreso	10-nov-22	Fecha de Inicio	10-nov-22
Fecha de Retiro	19-nov-22	Fecha de Retiro	19-nov-22
Dias Trabajados	10	**Dias para liquidar Prima**	10
Salario Basico	1.000.000	**Liquidacion Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	10-nov-22
Auxilio de Transporte	117.172	Fecha de Retiro	19-nov-22
Salario Base	**1.117.172**	**Dias para liquidar Vacaciones**	10

Liquidación de Prestaciones Sociales	
Cesantías	31.033
Intereses a las Cesantías	103
Prima de Servicios	31.033
Vacaciones	19.999
Salario	372.391
Total Prestaciones	448.448
TOTAL LIQUIDACION	**448.448**

Deducciones	
Salud	14.896
Pensión	14.896
Total Deducciones	29.791
Neto a pagar	**418.657**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

Robinson Leguizamo

ROBINSON LEGUIZAMO ARANGO
80.220.799
EMPLEADO

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

PAZ Y SALVO

Yo, LUIS ALBERTO CHOLES BETIN identificado con Cedula de Ciudadania N° 1.082.953.160, DECLARO que la EMPRESA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, con CC: 13.722.479 de Bucaramanga; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD, INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY, por el tiempo que laboré en el Contrato De Obra N° 262 de 13 de octubre de 2022 con objeto "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

La presente se firmó el día 06 de diciembre de 2022.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO

Luis Choles

LUIS ALBERTO CHOLES BETIN
C.C 1.082.953.160
Cargo: Ayudante de Obra



CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2022

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	**30/12/2022**
Nombre Empleador	**CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ**
C.C. o NIT	**NIT: 13.722.479-1**
Nombre del Trabajador	**LUIS ALBERTO CHOLES BETIN**
Cedula de Ciudadanía	**1.082.953.160**
Cargo	**AYUDANTE DE OBRA**
Clase de Contrato	**Por Labor Contratada**
Causa de Terminación	**Terminación Labor**

Datos para la liquidación		**Liquidación Prima Legal**	
Fecha de Ingreso	6-dic-22	Fecha de Inicio	6-dic-22
Fecha de Retiro	6-dic-22	Fecha de Retiro	6-dic-22
Dias Trabajados	1	**Dias para liquidar Prima**	1
Salario Basico	1.000.000	**Liquidación Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	6-dic-22
Auxilio de Transporte	117.172	Fecha de Retiro	6-dic-22
Salario Base	**1.117.172**	**Dias para liquidar Vacaciones**	1

Liquidación de Prestaciones Sociales	
Cesantías	3.103
Intereses a las Cesantías	1
Prima de Servicios	3.103
Vacaciones	1.389
Salario	37.239
Total Prestaciones	44.836
TOTAL LIQUIDACION	**44.836**

Deducciones	
Salud	1.490
Pensión	1.490
Total Deducciones	2.979
Neto a pagar	**41.856**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2023

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	30/01/2023
Nombre Empleador	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C. o NIT	NIT: 13.722.479-1
Nombre del Trabajador	JORGE LEONARDO CONTRERAS BRICEÑO
Cedula de Ciudadanía	88.026.452
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Clase de Contrato	Por Labor Contratada
Causa de Terminación	Terminación Labor

Datos para la liquidación		**Liquidación Prima Legal**	
Fecha de Ingreso	2-ene-23	Fecha de Inicio	2-ene-23
Fecha de Retiro	8-ene-23	Fecha de Retiro	8-ene-23
Dias Trabajados	7	**Dias para liquidar Prima**	7
Salario Basico	1.160.000	**Liquidación Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	2-ene-23
Auxilio de Transporte	140.606	Fecha de Retiro	8-ene-23
Salario Base	**1.300.606**	**Dias para liquidar Vacaciones**	7

Liquidación de Prestaciones Sociales	
Cesantías	25.290
Intereses a las Cesantías	59
Prima de Servicios	25.290
Vacaciones	11.275
Salario	333.475
Total Prestaciones	395.391
TOTAL LIQUIDACION	**395.391**

Deducciones	
Salud	12.139
Pensión	12.139
Total Deducciones	24.278
Neto a pagar	**341.113**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

Jorge L. Contreras

JORGE LEONARDO CONTRERAS BRICEÑO
88.026.452
EMPLEADO

Ing. Civil
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

PAZ Y SALVO

Yo, JORGE LEONARDO CONTRERAS BRICEÑO identificado con Cedula de Ciudadanía N° 88.026.452, DECLARO que la EMPRESA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, con CC: 13.722.479 de Bucaramanga; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD, INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY, por el tiempo que laboré en el Contrato De Obra N° 262 de 13 de octubre de 2022 con objeto "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

.

La presente se firmó el dia 08 de enero de 2023.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO



Jorge L. Contreras

JORGE LEONARDO CONTRERAS BRICEÑO
C.C 88.026.452
Cargo: Ayudante de Obra

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

Ing. Civil
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

PAZ Y SALVO

Yo, JORGE LEONARDO CONTRERAS BRICEÑO identificado con Cedula de Ciudadania N° 88.026.452, DECLARO que la EMPRESA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, con CC: 13.722.479 de Bucaramanga; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD, INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY, por el tiempo que laboré en el Contrato De Obra N° 262 de 13 de octubre de 2022 con objeto "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

La presente se firmó el día 30 de diciembre de 2022.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO

Jorge L. Contreras
JORGE LEONARDO CONTRERAS BRICEÑO
C.C 88.026.452
Cargo: Ayudante de Obra



CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2022

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	30/12/2022
Nombre Empleador	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C. o NIT	NIT: 13.722.479-1
Nombre del Trabajador	JORGE LEONARDO CONTRERAS BRICEÑO
Cedula de Ciudadanía	88.026.452
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Clase de Contrato	Por Labor Contratada
Causa de Terminación	Terminación Labor

Datos para la liquidación		
Fecha de Ingreso		19-dic-22
Fecha de Retiro		30-dic-22
Dias Trabajados		12
Salario Basico		1.000.000
Salario Variable		0
Auxilio de Transporte		117.172
Salario Base		**1.117.172**

Liquidación de Prestaciones Sociales		
Cesantias		97.239
Intereses a las Cesantias		149
Prima de Servicios		97.239
Vacaciones		16.667
Salario		446.869
Total Prestaciones		536.163
TOTAL LIQUIDACION		**536.163**

Deducciones	
Salud	17.875
Pensión	17.875
Total Deducciones	35.750
Neto a pagar	**502.413**

Liquidación Prima Legal	
Fecha de Inicio	19-dic-22
Fecha de Retiro	30-dic-22
Dias para liquidar Prima	12

Liquidación Vacaciones	
Fecha de Inicio	19-dic-22
Fecha de Retiro	30-dic-22
Dias para liquidar Vacaciones	12

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

Jorge L. Contreras
JORGE LEONARDO CONTRERAS BRICEÑO
88.026.452
EMPLEADO

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

PAZ Y SALVO

Yo, LUIS EDUARDO MENDOZA PEREZ identificado con Cedula de Ciudadanía N° *1.096.220.470, DECLARO que la EMPRESA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, con* CC: 13.722.479 de Bucaramanga; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD, INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY, por el tiempo que laboré en el Contrato De Obra N° 262 de 13 de octubre de 2022 con objeto "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

.

La presente se firmó el día 08 de enero de 2023.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO



Luis Mendoza Perez

LUIS EDUARDO MENDOZA PEREZ
C.C 1.096.220.470
Cargo: Ayudante de Obra

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Ceje_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 746 2169

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2023

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	30/01/2023
Nombre Empleador	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C. o NIT	NIT: 13.722.479-1
Nombre del Trabajador:	LUIS EDUARDO MENDOZA PEREZ
Cedula de Ciudadania	1.098.220.470
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Clase de Contrato	Por Labor Contratada
Causa de Terminación	Terminación Labor

Datos para la liquidación		Liquidación Prima Legal	
Fecha de Ingreso	2-ene-23	Fecha de Inicio	2-ene-23
Fecha de Retiro	8-ene-23	Fecha de Retiro	8-ene-23
Dias Trabajados	7	**Dias para liquidar Prima**	7
Salario Basico	1.160.000	Liquidación Vacaciones	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	2-ene-23
Auxilio de Transporte	140.606	Fecha de Retiro	8-ene-23
Salario Base	1.300.606	**Dias para liquidar Vacaciones**	7

Liquidación de Prestaciones Sociales	
Cesantias	25.290
Intereses a las Cesantias	59
Prima de Servicios	25.290
Vacaciones	11.276
Salario	303.475
Total Prestaciones	365.391
TOTAL LIQUIDACION	**365.391**

Deducciones	
Salud	12.139
Pensión	12.139
Total Deducciones	24.278
Neto a pagar	**341.113**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.[illegible]
EMPLEADOR

Luis Mendoza Perez

LUIS EDUARDO MENDOZA PEREZ
1.098.220.470
EMPLEADO

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

PAZ Y SALVO

Yo, LUIS EDUARDO MENDOZA PEREZ identificado con Cedula de Ciudadanía N° *1.096.220.470, DECLARO que la EMPRESA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, con* CC: 13.722.479 de Bucaramanga; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD, INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY, por el tiempo que laboré en el Contrato De Obra N° 262 de 13 de octubre de 2022 con objeto "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

.

La presente se firmó el dia 30 de diciembre de 2022.


Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO

Luis Mendoza Perez

LUIS EDUARDO MENDOZA PEREZ
C.C 1.096.220.470
Cargo: Ayudante de Obra



CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2022

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	**30/12/2022**
Nombre Empleador	**CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ**
C.C. o NIT	**NIT: 13.722.479-1**
Nombre del Trabajador:	**LUIS EDUARDO MENDOZA PEREZ**
Cedula de Ciudadania	**1.096.220.470**
Cargo	**AYUDANTE DE OBRA**
Clase de Contrato	**Por Labor Contratada**
Causa de Terminación	**Terminación Labor**

Datos para la liquidación		**Liquidación Prima Legal**	
Fecha de Ingreso	2-dic-22	Fecha de Inicio	2-dic-22
Fecha de Retiro	30-dic-22	Fecha de Retiro	30-dic-22
Dias Trabajados	29	**Dias para liquidar Prima**	29
Salario Basico	1.000.000	**Liquidación Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	2-dic-22
Auxilio de Transporte	117.172	Fecha de Retiro	30-dic-22
Salario Base	**1.117.172**	**Dias para liquidar Vacaciones**	29

Liquidación de Prestaciones Sociales		
Cesantias	89.994	
Intereses a las Cesantias	870	
Prima de Servicios	89.994	
Vacaciones	40.278	
Salario	1.079.933	
Total Prestaciones	1.301.069	
TOTAL LIQUIDACION	**1.301.069**	
Deducciones		
Salud	43.197	
Pensión	43.197	
Total Deducciones	86.395	
Neto a pagar	**1.214.675**	

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

Luis Mendoza Perez
LUIS EDUARDO MENDOZA PEREZ
1.096.220.470
EMPLEADO

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

PAZ Y SALVO

Yo, VICTOR JULIO MESA PADILLA identificado con Cedula de Ciudadanía N° 4.288.803, *DECLARO que la EMPRESA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, con CC: 13.722.479* de Bucaramanga; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD, INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY, por el tiempo que laboré en el Contrato De Obra N° 262 de 13 de octubre de 2022 con objeto "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

.

La presente se firmó el día 08 de enero de 2023.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR NOMBRE COMPLETO

Victor Mesa Padilla

VICTOR JULIO MESA PADILLA
C.C 4.288.803
Cargo: Ayudante de Obra



CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909, Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2023

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	**30/01/2023**
Nombre Empleador	**CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ**
C.C. o NIT	**NIT: 13.722.479-1**
Nombre del Trabajador:	**VICTOR JULIO MESA PRADILLA**
Cedula de Ciudadanía	**4.288.803**
Cargo	**AYUDANTE DE OBRA**
Clase de Contrato	**Por Labor Contratada**
Causa de Terminación	**Terminación Labor**

Datos para la liquidacion		**Liquidación Prima Legal**	
Fecha de Ingreso	2-ene-23	Fecha de Inicio	2-ene-23
Fecha de Retiro	8-ene-23	Fecha de Retiro	8-ene-23
Dias Trabajados	7	**Dias para liquidar Prima**	7
Salario Basico	1.160.000	**Liquidación Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	2-ene-23
Auxilio de Transporte	140.606	Fecha de Retiro	8-ene-23
Salario Basu	1.300.606	**Dias para liquidar Vacaciones**	7

Liquidacion de Prestaciones Sociales		
Cesantias	25.290	
Intereses a las Cesantias	59	
Prima de Servicios	25.290	
Vacaciones	11.278	
Salario	303.475	
Total Prestaciones	365.391	
TOTAL LIQUIDACION	**365.391**	
Deducciones		
Salud	12.139	
Pensión	12.139	
Total Deducciones	24.278	
Neto a pagar	**341.113**	

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

Victor Mesa Padilla
VICTOR JULIO MESA PRADILLA
4.288.803
EMPLEADO

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

PAZ Y SALVO

Yo, VICTOR JULIO MESA PADILLA identificado con Cedula de Ciudadanía N° 4.288.803, *DECLARO que la EMPRESA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, con CC: 13.722.479* de Bucaramanga; SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD, INCAPACIDADES Y TODA CLASE DE ACREENCIAS LABORALES QUE ME CONOCE LA LEY, por el tiempo que laboré en el Contrato De Obra N° 262 de 13 de octubre de 2022 con objeto "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

La presente se firmó el dia 30 de diciembre de 2022.

Atentamente,

FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE COMPLETO

Victor Mesa Padilla
VICTOR JULIO MESA PADILLA
C.C 4.288.803
Cargo: Ayudante de Obra



CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ - NIT: 13722479
Transversal 35 # 92 – 170 condominio Germania torre 3 apto 1909. Bucaramanga
Cajs_75@hotmail.com
316 744 0198 – 311 748 2169

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ

NIT: 13.722.479-1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 2022

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Fecha de Liquidación	**30/12/2022**
Nombre Empleador	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
C.C. o NIT	**NIT: 13.722.479-1**
Nombre del Trabajador:	VICTOR JULIO MESA PRADILLA
Cedula de Ciudadanía	**4.288.803**
Cargo	**AYUDANTE DE OBRA**
Clase de Contrato	**Por Labor Contratada**
Causa de Terminación	**Terminación Labor**

Datos para la liquidación		**Liquidación Prima Legal**	
Fecha de Ingreso	2-dic-22	Fecha de Inicio	2-dic-22
Fecha de Retiro	30-dic-22	Fecha de Retiro	30-dic-22
Dias Trabajados	29	**Dias para liquidar Prima**	29
Salario Basico	1.000.000	**Liquidación Vacaciones**	
Salario Variable	0	Fecha de Inicio	2-dic-22
Auxilio de Transporte	117.172	Fecha de Retiro	30-dic-22
Salario Base	**1.117.172**	**Dias para liquidar Vacaciones**	29

Liquidación de Prestaciones Sociales	
Cesantías	89.994
Intereses a las Cesantías	870
Prima de Servicios	89.994
Vacaciones	40.278
Salario	1.079.933
Total Prestaciones	1.301.069
TOTAL LIQUIDACION	**1.301.069**

Deducciones	
Salud	43.197
Pensión	43.197
Total Deducciones	86.395
Neto a pagar	**1.214.675**

CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT: 13.722.479-1
EMPLEADOR

Victor Mesa Padilla
VICTOR JULIO MESA PRADILLA
4.288.803
EMPLEADO

POLIZAS

seguros mundial
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.12 10:08:24 -05:00

Código de Seguridad: 8kTipiZ3H6ds5P2NKCdxUA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000059-D001

No. PÓLIZA	8-100029707	No. ANEXO	13	No. CERTIFICADO	22210263	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/10/2022	24:00 Horas Del	30/08/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JAIMES SUAREZ, CARLOS ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	13.722.479
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	3166944822
ASEGURADO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	No. DOC. IDENTIDAD	890.201.222-0
DIRECCIÓN	CALLE 35 N 10 43 FASE I PISO 2	TELÉFONO	76337000
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	No. DOC. IDENTIDAD	890.201.222-0
DIRECCIÓN	CALLE 35 N 10 43 FASE I PISO 2	TELÉFONO	76337000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE APLICA ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN IGUAL.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SI-SI-SAMC-001-2022-2 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 23/12/2023	87.519.635,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 23/08/2026	43.759.817,70	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/08/2023	24:00 Horas Del 30/08/2028	87.519.635,40	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 23/12/2023	131.279.453,10	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 350.078.541,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS G Y V GENERACION VICTOR	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APLICADO A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PINSA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.12 10:09:36 -05:00

Código de Seguridad: dfABSkkyvRcI4uxo63EInQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSLSBR000000027-0001

No. PÓLIZA	8-100087085	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	22210264	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/10/2022	23:59 Horas Del	23/08/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JAIMES SUAREZ, CARLOS ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	13.722.479
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	3166944822
ASEGURADO	JAIMES SUAREZ, CARLOS ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	13.722.479
DIRECCIÓN	NORTE DE SANTANDER VILLA ROSARIO	TELÉFONO	3166944822
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE APLICA ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN IGUAL.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 262 CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE BUCARAMANGA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	100.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	50.000.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	50.000.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	50.000.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS G Y V GENERACION VICTOR	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMARA LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D08I

No. PÓLIZA	8-100007005	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	22210264	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/10/2022	23:59 Horas Del	23/06/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE BUCARAMANGA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA A DF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100029707** y endoso, **13** cuyo afianzado es: **JAIMES SUAREZ, CARLOS ANDRES** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** , expedida por la Compañía en **12/09/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **12** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.12 10:08:24 -05:00

Código de Seguridad: BkTipiZ3H6dsSP2wKCdxUA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUSJ0000000059-D001

No. PÓLIZA	B-100829707	No. ANEXO	13	No. CERTIFICADO	22210263	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/10/2022	24:00 Horas Del	30/08/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JAIMES SUAREZ, CARLOS ANDRES	**No. DOC. IDENTIDAD**	13.722.479
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	3166944822
ASEGURADO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.222-0
DIRECCIÓN	CALLE 35 N 10 43 FASE I PISO 2	**TELÉFONO**	76337000
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.222-0
DIRECCIÓN	CALLE 35 N 10 43 FASE I PISO 2	**TELÉFONO**	76337000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE APLICA ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN IGUAL.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SI-SI-SAMC-001-2022-2 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL *MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER*

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/08/2022	24:00 Horas Del 22/12/2023	87.519.635,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 23/08/2026	43.759.817,70	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/08/2023	24:00 Horas Del 30/08/2028	87.519.635,40	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 01/08/2023	24:00 Horas Del 23/12/2023	131.279.453,10	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 350.878.541,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS G Y V GENERACION VICTOR	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PATA - APY

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.12 10:09:36 -05:00

Código de Seguridad: dfABSkkyvRcI4uxo63EImQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS0000000027-D001

No. PÓLIZA	B-100007005	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	22210264	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/10/2022	23:59 Horas Del	23/08/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JAIMES SUAREZ, CARLOS ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	13.722.479
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	3166944822
ASEGURADO	JAIMES SUAREZ, CARLOS ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	13.722.479
DIRECCIÓN	NORTE DE SANTANDER VILLA ROSARIO	TELÉFONO	3166944822
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE APLICA ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN IGUAL.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 262 CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL *MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE BUCARAMANGA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE* Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	100.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
PATRONAL	60.000.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	60.000.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	60.000.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS G Y V GENERACION VICTOR	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA VIGILADA ANI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007005	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	22210264	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	13/10/2022	23:59 Horas Del	23/08/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE BUCARAMANGA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA APIT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APP

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100029707** y endoso, **13** cuyo afianzado es: **JAIMES SUAREZ, CARLOS ANDRES** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA / MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ,** expedida por la Compañía en **12/09/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **12** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Ing. Civil.
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
ING. CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

15. ESTAMPILLA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300351199

Contribuyente

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Fecha de Expedición 2023/07/04 **Fecha Limite de Pago** 2023/07/10

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13722479
Nombre CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300351199(3900)000000000004290(96)20230710

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300351199**

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Tipo de Doc. C.C. Número 13722479
Nombre: CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300351199**

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Total a Pagar $4.290

Fecha de Expedición 2023/07/04 **Fecha Limite de Pago** 2023/07/10

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300351199**

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390
Total a Pagar $4.290

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13722479
Nombre CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300351199(3900)000000000003900(96)20230710

Fecha de Expedición 2023/07/04
Fecha Limite de Pago 2023/07/10

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300351199**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13722479
Nombre CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Fecha de Expedición 2023/07/04

Total a Pagar $4.290

(415)8902012356005(8020)02502300351199(3900)000000000003900(96)20230710

(415)8902012356006(8020)02502300351199(3900)000000000000390(96)20230710

PRO HOSPITAL $3.900

BP G. 110480011504-1
BP SYC. 220480126454

Total $3.900
Ordenanza 012 $390

Pago Electrónicamente

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7396094

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 97059234		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
21	09	2023
FECHA VENCIMIENTO		
26	09	2023

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE El pago oportuno de este cupon es valido máximo hasta el quinto dia de haberse generado en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupon

Nombre Pagador CARLOS ANDRES JAIMES **NIT o C.C.** 13722479

Dirección REAL DE MINAS **Teléfono** +57,316

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Santander		
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 225,450.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 225,450.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7396094(3900)000000225450(96)20230926

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 97059234

Ciudad | NIT 13722479 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: CARLOS ANDRES JAIMES

Rco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

Redeban

SEP 26 2023 19:36:35 REMICT 9.91

EXITO BUCARAMANGA ORIE
TRV ORIENTAL 92-218
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C.UNICO: 0011958683 TER: 58683021
C.BANC: 0007
RECIBO: 001192 RRN: 002327
C.C.B: 3007019974
RECAUDO APRO: 816156
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7396094
VALOR $ 225.450

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

EXITO ORIENTAL
COMPRA Y RECOGE AL TELEFONO:3053594720

146197 *SERVICIO NACIONAL 225.450
Factura: 7396094
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 225.450
EFECTIVO 255.450

FACTURAS APROBADAS
Fac.7396094 Apro:816155 BANCO:0007
CAMBIO 30.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	225450	225450	0
TOTAL=	225450	225450	0

>> MAPA:1836 ID:2023092-6193530
Vr.POS:252 Motor:7.1.1E#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR A. 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/SEP/2023 19:36 0352 08 0241 8499

NUT:20230926035200080241
352 - 039Y2

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HN4226466 225.450
TOTAL TRANSACCION: 225450
Este documento no es Factura de venta.

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7396095

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupon es valido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupon

REFERENCIA No.	97059332	
FECHA DE EXPEDICION		
21	09	2023
FECHA VENCIMIENTO		
26	09	2023

Nombre Pagador	CARLOS ANDRES JAIMES	NIT o C.C.	13722479
Dirección	REAL DE MINAS	Teléfono	+57,316

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Santander		
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	$ 346,150.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 346,150.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7396095(3900)000000346150(96)20230926

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 97059332

Ciudad | NIT 13722479 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: CARLOS ANDRES JAIMES

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hara los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignacion hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

Redeban

SEP 26 2023 19:34:10 REMICT 9.91

EXITO BUCARAMANGA ORIE
TRV ORIENTAL 92-218
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C.UNICO: 0011958683 TER: 58683021
C.BANC: 0007
RECIBO: 001190 RRN: 002324
C.C.B: 300701997A
RECAUDO APRO: 666218
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7396095
VALOR $ 346.150

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

EXITO ORIENTAL
COMPRA Y RECOGE AL TELEFONO:3053594720

146197 *SERVICIO NACIONAL 346.150
Factura: 7396095
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 346.150
EFECTIVO 400.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.7396095 Apro:666218 BANCO:0007
CAMBIO 53.850

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	346150	346150	0
TOTAL=	346150	346150	0

>> MAPA:1836 ID:2023092-6193335
Vr.POS:252 Motor:7.1.13#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8823 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR A. 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/SEP/2023 19:34 0362 08 0240 8499

NUT:20230926035200080240
362 - 039Y2

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HN4226465 346.150
TOTAL TRANSACCION: 346150
Este documento no es Factura de venta.

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7396097

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 97059458		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
21	09	2023
FECHA VENCIMIENTO		
26	09	2023

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE El pago oportuno de este cupón es valido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupon

Nombre Pagador CARLOS ANDRES JAIMES NIT o C.C. 13722479

Dirección REAL DE MINAS Teléfono +57,316

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Santander		
DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 213,900.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 213,900.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7396097(3900)000000213900(96)20230926

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 97059458

Ciudad | NIT 13722479 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: CARLOS ANDRES JAIMES

Eco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hara los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

Redeban

SEP 26 2023 19:32:29 RBMICT 9.91

EXITO BUCARAMANGA ORIE
TRV ORIENTAL 92-218
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C.UNICO: 0011958683 TER: 58683021
C.BANC: 0007
RECIBO: 001188 RRN: 002321
C.C.B: 3007019974
RECAUDO APRO: 511062
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7396097
VALOR $ 213.900

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

EXITO ORIENTAL
COMPRA Y RECOGE AL TELEFONO:3053594720

145197 *SERVICIO NACIONAL 213.900
Factura: 7396097
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 213.900
EFECTIVO 215.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.7396097 Apro:511062 BANCO:0007
CAMBIO 1.100

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	213900	213900	0
TOTAL=	213900	213900	0

>> MAPA:1836 ID:2023092-6133200
Vr.POS:262 Motor:7.1.13#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8823 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR A. 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/SEP/2023 19:32 0352 08 0239 8499

NUT:20230926035200080239
352 - 039Y2

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HN4225464 213.900
TOTAL TRANSACCION: 213900
Este documento no es Factura de venta.

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7396099

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 97059538		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
21	09	2023
FECHA VENCIMIENTO		
26	09	2023

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupon es valido maximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupon

Nombre Pagador CARLOS ANDRES JAIMES **NIT o C.C.** 13722479

Dirección REAL DE MINAS **Teléfono** +57,316

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Santander		
TRESCIENTOS TRECE MIL CIEN PESOS.	SUBTOTAL	$ 313,100.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 313,100.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo cartiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7396099(3900)000000313100(96)20230926

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 REFERENCIA No. 97059538

Ciudad | NIT 13722479 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: CARLOS ANDRES JAIMES

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hara los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

Redeban

SEP 26 2023 19:30:31 REMICT 9.91

EXITO BUCARAMANGA ORIE
TRV ORIENTAL 92-218
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C.UNICO: 0011958683 TER: 58683021
C.BANC: 0007
RECIBO: 001186 RRN: 002318
C.C.E: 3007019974
RECAUDO APRO: 582323
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7396099
VALOR $ 313.100

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

EXITO ORIENTAL
COMPRA Y RECOGE AL TELEFONO:3053594720

145197 *SERVICIO NACIONAL 313.100
Factura: 7396099
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 313.100
EFECTIVO 320.100

FACTURAS APROBADAS
Fac.7396099 Apro:582323 BANCO:0007
CAMBIO 7.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	313100	313100	0
TOTAL=	313100	313100	0

>> MAPA:1836 ID:2023092-6193006
Vr.POS:252 Motor:7.1.13#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8823 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR A. 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/SEP/2023 19:30 0352 08 0237 8499

NUT:20230926035200080237
352 - 039Y2

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HN4225463 313.100
TOTAL TRANSACCION: 313100
Este documento no es Factura de venta.

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7396100

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 97059636		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
21	09	2023
FECHA VENCIMIENTO		
26	09	2023

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupon es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupon

Nombre Pagador CARLOS ANDRES JAIMES **NIT o C.C.** 13722479

Dirección REAL DE MINAS **Teléfono** +57,316

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Santander		
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 376,400.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 376,400.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7396100(3900)000000376400(96)20230926

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 97059636

Ciudad | NIT 13722479 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: CARLOS ANDRES JAIMES

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignacion hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

Redeban

SEP 26 2023 19:28:57 REMICT 9.91

EXITO BUCARAMANGA ORIE
TRV ORIENTAL 92-218
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C.UNICO: 0011958683 TER: 58683021
C.BANC: 0007
RECIBO: 001184 RRN: 002315
C.C.B: 3007019974
RECAUDO APRO: 801934
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7396100
VALOR $ 376.400

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

EXITO ORIENTAL
COMPRA Y RECOGE AL TELEFONO:3053594720

145197 *SERVICIO NACIONAL 376.400
Factura: 7396100
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 376.400
EFECTIVO 377.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.7396100 Apro:801934 BANCO:0007
CAMBIO 600

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	376400	376400	0
TOTAL=	376400	376400	0

>> MAPA:1836 ID:2023092-6192755
Vr.POS:252 Motor:7.1.13#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8823 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR A. 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/SEP/2023 19:29 0352 08 0236 8499

NUT:20230926035200080236
352 - 039Y2

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HN4225462 376.400
TOTAL TRANSACCION: 376400
Este documento no es Factura de venta.

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7396103

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupon

REFERENCIA		
No. 97059825		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
21	09	2023
FECHA VENCIMIENTO		
26	09	2023

Nombre Pagador CARLOS ANDRES — **NIT o C.C.** 13722479

Dirección REAL DE MINAS — **Teléfono** +57,316

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Santander		
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 274,600.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 274,600.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7396103(3900)000000274600(96)20230926

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 97059825

Ciudad | | | | NIT 13722479 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: CARLOS ANDRES JAIMES

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo empara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

Redeban

SEP 26 2023 19:26:40 REMICT 9.91

EXITO BUCARAMANGA ORIE
TRV ORIENTAL 92-218
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C.UNICO: 001958683 TER: 58683021
C.BANC: 0007
RECIBO: 001182 RRN: 002312
C.C.B: 3007019974
RECAUDO APRO: 878139
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7396103
VALOR $ 274.600

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

EXITO ORIENTAL
COMPRA Y RECOGE AL TELEFONO:3053594720

145197 *SERVICIO NACIONAL 274.600
Factura: 7396103
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 274.600
EFECTIVO 300.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.7396103 Aprb:878139 BANCO:0007
CAMBIO 25.400

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	274600	274600	0
TOTAL=	274600	274600	0

>> MAPA:1836 ID:2023092-6132608
Vr.POS:252 Motor:7.1.13#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8823 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR A. 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/SEP/2023 19:26 0352 08 0235 8499

NUT:20230926035200080235
352 - 039Y2

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HN4225461 274.600
TOTAL TRANSACCION: 274600
Este documento no es Factura de venta.

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7396104

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupon es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupon

REFERENCIA		
No. 97059920		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
21	09	2023
FECHA VENCIMIENTO		
26	09	2023

Nombre Pagador: CARLOS ANDRES JAIMES — NIT o C.C.: 13722479

Dirección: REAL DE MINAS — Teléfono: +57,316

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Santander		
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 29,700.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 29,700.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7396104(3900)000000029700(96)20230926

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 97059920

Ciudad | NIT 13722479 | Teléfono

Nombre del Pagador / Cliente: CARLOS ANDRES JAIMES

Rco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hara los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

Redeban

SEP 26 2023 19:25:03 RBMICT 9.91

EXITO BUCARAMANGA ORIE
TRV ORIENTAL 92-218
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C.UNICO: 0011958683 TER: 58683021
C.BANC: 0007
RECIBO: 001180 RRN: 002309
C.C.B: 3007019974
RECAUDO APRO: 350810
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7396104
VALOR $ 29.700

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

EXITO ORIENTAL
COMPRA Y RECOGE AL TELEFONO:3053594720

145197 *SERVICIO NACIONAL 29.700
Factura: 7396104
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 29.700
EFECTIVO 100.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.7396104 Apro:350810 BANCO:0007
CAMBIO 70.300

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
*00%	29700	29700	0
TOTAL=	29700	29700	0

>> MAPA:1836 ID:2023092-6[illegible]92435
Vr.POS:252 Motor:7.1.1[illegible]#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR A. 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/SEP/2023 19:25 0362 08 0234 8499

NUT:20230926035200080234
352 - 039Y2

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HN4225460 29.700
TOTAL TRANSACCION: 29700
Este documento no es Factura de venta.

	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	CÓDIGO:	
Alcaldía de Bucaramanga		VERSIÓN:	
	FORMATO DE ACTA DE ENTREGA DE INVENTARIO	VIGENCIA:	

CUIDAD:	BUCARAMANGA	FECHA:	09/ 08/ 23

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	262 DE 2022
OBJETO:	ENTREGA TABLEROS DE REDES ELECTRICAS DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ
ITEM:	Retiro, desarme, traporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar.

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO B	ESTADO R	ESTADO M	SERIALES	DISPOSICIÓN
CAJA DE TABLEROS METALICA	1		X			
AUTOMATICOS 15A	3		X			
AUTOMATICOS 20A	3	X				
AUTOMATICOS DOBLES 20A	3	X				
CAJA DE TABLEROS PLASTICA	1	X				
AUTOMATICOS 20A	4					

REGISTRO FOTOGRAFICO






AVALADO POR:	ENTREGADO:	RECIBIDO POR
NOMBRE: Edgar Bayona Flórez CARGO: Supervisor Contrato de obra 262 de 2022 ALCALDIA DE BUCARAMANGA	NOMBRE: Carlos Andrés Jaimes Suarez CARGO: Contratista Contrato de obra 262 de 2022	NOMBRE: Daniel Eduardo Jaimes Ruiz CARGO: Inventarios ALCALDIA DE BUCARAMANGA
