CONTRATO DE
OBRA No. 082 de 2023

INFORME DE OBRA

FINAL ☐ ☒ **PARCIAL** **N°2**

Periodo: del 29 de Junio al 28 de Julio de 2023.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS		**CONTRATO NO:** 082 DEL 2023	
Objeto: SUMINISTRO E INSTALACIÓN FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TÉCNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		**Valor:** $1´568.908.267.oo **Anticipo 40% :** $627.563.306.80	
Duración:	(6) SEIS MESES	**Municipio:**	**IQUIRA RIVERA SALADOBLANCO CAMPOALEGRE PITALITO ELIAS**
Nombre del Interventor:	Martinica Company S.A.S.		**Contrato No: 220 DE 2022**

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

En el presente informe describiremos los frentes de trabajo que se iniciaron en el segundo mes de ejecución del contrato, igualmente se mencionan las actividades desarrolladas en el periodo de este informe por la empresa EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato que tiene como objeto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TÉCNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Igualmente describimos el estado y avance de las obras, haciendo un comparativo con la programación de obra evidenciando el estado actual de los trabajos, adicionalmente se relaciona la información financiera ejecutada de acuerdo con los procesos constructivos desarrollados.

Es de resaltar que todas las actividades realizadas por EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS se han informado y comunicado a la interventoría y a la supervisión a cargo de Aguas del Huila

En la PTAP de la vereda Valencia de la paz en el municipio de Iquira se suspendieron las actividades debido a que estamos a la espera de la realización de balance de mayores y menores cantidades y reconocimiento de trasiego adicionales debido a que 250 metros antes de llegar a la obra las condiciones de la vía no permiten el acceso de volquetas y camiones que llevan el material, teniendo así la necesidad de realizar un trasiego en un vehículo de menor capacidad tipo 4x4 de capacidad 1000 kl, esta actividad no estaba contemplada inicialmente, por lo que nos vemos en la necesidad de suspender las actividades en éste frente y realizar una reprogramación de obra, la cual fue presentada a la interventoría el día 27 de Julio del 2023

A continuación, se realiza una breve descripción de todas y cada una de las actividades desarrolladas en cada uno de los frentes de trabajo y los hechos más relevantes acontecidos en el periodo del presente informe.

PTAP acueducto centro poblado Rio Frío, Rivera

- Amarre de hierro correspondiente a la zapata corrida, columnetas y viga del cerramiento con malla eslabonada
- Excavaciones y solados de zapatas corridas, vigas, columnetas y mampostería correspondiente al cerramiento en malla eslabonada
- Fundición de zapata corrida y vigas en concreto de 3000 PSI del cerramiento perimetral definitivo en malla eslabonada
- Pega de mampostería correspondiente al cerramiento perimetral definitivo en malla eslabonada.
- Amarre del hierro y fundición de Concreto impermeabilizado de 280 Kg/m2 para estructuras enterradas y semienterradas del tanque de almacenamiento de agua potable semienterrado con las respectivas instalaciones de los pasamuros.
- Elaboración e instalación de módulos en malla eslabonada para el cerramiento perimetral definitivo
- Corte, figurado, amarre de hierro y fundición de las columnas de la caseta del operario.

PTAP acueducto regional Aguadas-San Vicente-Las Limas, Elias

- Fundición de solado, amarre de hierro y fundición con concreto impermeabilizado de 280 kg/cm2 correspondiente a la placa de soporte de la planta de tratamiento de agua potable
- Amarre de hierro correspondiente a la zapata corrida, columnetas y viga del cerramiento con malla eslabonada
- Fundición de zapata corrida y vigas en concreto de 3000 PSI de la zapata corrida y viga de cimentación del cerramiento perimetral definitivo en malla eslabonada
- Pega de mampostería correspondiente al cerramiento perimetral definitivo en malla eslabonada.

- Se realiza fundición de columnetas realizando la respectiva instalación de la tubería de 2"
- Elaboración e instalación de módulos en malla eslabonada para el cerramiento perimetral definitivo.
- Se realiza mejoramiento con recebo compactado a toda la zapata corrida del cerramiento debido a que el material encontrado al realizar esas excavaciones

En todos los frentes de obra estamos realizando el corte y figurado del hierro in situ, con varillas de 6 m para poder facilitar el transporte y amarrado del mismo.

el porcentaje de avance de obra según las cantidades ejecutadas es del 27.54%

En el **anexo 01** se entrega copia de la bitácora de obra donde se evidencian las actividades desarrolladas y ejecutadas en el periodo del presente informe

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Socialización	09/05/2023 11/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	**30**	**0**	**28/11/2023**
Iniciación	29/05/2023	60	0	**28/11/2023**

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de Inicio		29/05/23
Acta de recibo No 1	1	17/07/23

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO..... $ 1.568.908.267.00

VALOR DEL ANTICIPO.....$ 627.563.306.80

PORCENTAJE DE ANTICIPO.....40%

AVANCE FISICO REAL

Avance Físico Mensual..... 14.24%
Avance Físico Acumulado..... 25.28%

AVANCE EN TIEMPO

Tiempo Total de Obra..... 180 días
Tiempo Total Transcurrido .....60 días
Tiempo Total que les queda..... 120 días
Avance Porcentual según plazo inicial.....35%


AVANCE FINANCIERO

Inversión Contratada..... $ 1.568.908.267.00
Inversión Ejecutada en el Periodo..... $ 138,739,052.51
Porcentaje Ejecutado en el Periodo.....14.24%
Inversión Total Ejecutada..... $ 466,903,578.14

Porcentaje Total Ejecutado..... $ 25.28%

El avance físico a la fecha es de 25.28%, de acuerdo a la programación presentada a la fecha debería ser del 10.48%. presentando un avance de

AVANCE %	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					10.48%
EJECUTADO																					25.28%

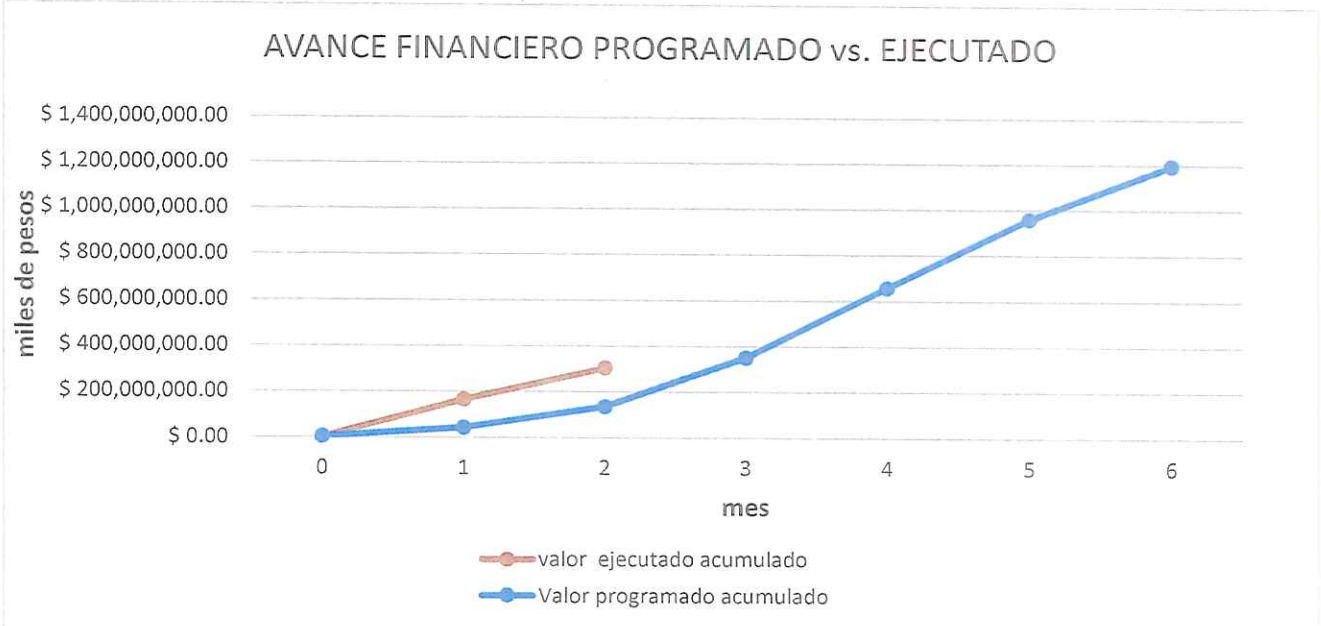

Mes	inicio 29 Mayo	28-jun	28-jul	28-ago	28-sep	28-oct	28-nov
	0	1	2	3	4	5	6
Valor programado acumulado*	0	$ 38.798	$ 132.408	$ 849,212	$ 981,210	$ 1,043,197	$ 1,197,639
valor ejecutado acumulado*	0	$ 164,082	$ 302.821				

*Valores en Miles

En la anterior gráfica presentamos el comparativo del avance financiero programado vs el avance financiero físico ejecutado a corte de obra realizado el 30 de Julio de 2023, en éstas curvas se puede evidenciar avance significativo producido por el rendimiento en la ejecución de las obras, por otra parte, el día 27 de Julio se presenta una nueva programación de obra modificando la inicialmente presentada debido al impedimento de iniciar trabajos en el municipio de Saladoblanco ya que por la vía de acceso a la PTAP iniciaron la construcción de una placa huella cerrando por completo la vía, esta condición no se tenía prevista lo cual nos modifica por completo el plan de obra que teníamos establecido

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo (40%)				$ 627.563.306.80
Acta de recibo No 1	17 Julio 2023	$ 173,224,801.00	$ 69,289,920.00	$ 103,934,881.00
TOTAL				$ 731.498.187.80
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor facturado**	**Valor no facturado**
$ 1.568.908.267.00	$ 0.00	$ 1.568.908.267.00	$ 173,224,801.00	$ 1.395.683.466.00

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

En los 2 frentes de obra que se abrieron (PTAP acueducto centro poblado Rio Frio y PTAP acueducto regional Aguadas – San Vicente – Las Limas en el municipio de Elías) disponemos de personal administrativo, técnico, operativo, mano de obra calificada y no calificada (ayudantes y oficiales de construcción) capacitado y con los conocimientos necesarios en la medida de lo posible son personas de la comunidad cercana al área de influencia de cada uno de los frentes donde hemos iniciado las actividades y personal externo para llevar a cabo el cumplimiento de la ejecución de obra correspondiente a "SUMINISTRO E INSTALACIÓN FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TÉCNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

En la siguiente tabla, relacionamos el personal mínimo requerido que se encontraba vinculado al proyecto en el periodo comprendido entre el 29 de Junio y el 28 de Julio de 2023

Tabla No 01. Personal Mínimo requerido dispuesto en obra

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	% DEDICACION
Director de Obra	Jairo Hoyos Granados	10%.
Residente de Obra	Robert Rojas Quintero	100%
Profesional SISOMA	Linda Tatiana Salas	100%

Adicionalmente en cada uno de los 2 frentes en ejecución de obra contamos con cuadrillas de mano de obra no calificada relacionada en el **anexo # 07** Planillas de pago de Seguridad social

3. ASPECTOS TECNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

El día 17 de Julio de 2023 se recibieron por parte de la ingeniera estructural de Aguas del Huila Olga Patricia Gonzales los planos donde se realiza una modificación a la placa del tanque de almacenamiento de agua potable enterrado del centro poblado Rio Frio municipio de Rivera el cual en el diseño inicial era una placa maciza de 20 cm de espesor y La ingeniera estructural de Aguas del Huila la modificó por una placa aligerada.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

En el periodo de este informe se recibieron los informes de la placa de soporte de tratamiento de agua potable en el centro poblado de Rio frío en el municipio de Rivera, se realizó la fundición de la placa de soporte de la PTAP de la vereda Valencia de La Paz en el municipio de Iquira y la fundición de la placa de soporte de la PTAP Aguadas -San Vicente - Las Limas, en el municipio de Elías donde se tomaron cilindros para análisis de laboratorio de la resistencia a la compresión para un concreto de 4000 PSI. La interventoría ya tiene los resultados.

También se tomó cilindro para ensayo de la resistencia a la compresión del concreto premezclado utilizado en la fundición de la placa de piso del tanque de almacenamiento de agua en el centro poblado Rio Frio del municipio de Rivera.

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Se entregan los resultados de laboratorio ver **Anexo 3**

4.3. Comentarios y Conclusiones

N/A

5. INFORME AMBIENTAL

1. Identificación de situaciones Ambientales

Se presentó el PMA (Plan de Manejo Ambiental), Durante este periodo no se han presentado situaciones de impactos ambientales.

2. Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

No se han generado daños ni perjuicios a terceros.

3. Descripción de Actividades Desarrollada en el Periodo

- Jornadas de Limpieza de obra en los sitios donde se vienen desarrollando actividades de obra.

4. Registro Fotográfico

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO CENTRO POBLADO RIO FRIO, MUNICIPIO DE RIVERA.





CERRAMIENTO PERIMETRAL





FUNDICION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE





FUNDICION VIGAS Y COLUMNAS CASETA DEL OPERARIO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL AGUADAS- SAN VICENTE – LAS LIMAS, MUNICIPIO DE ELIAS.



FUNDICION PLACA SOPORTE PTAP






EXCAVACIONES CERRAMIENTO PERIMETRAL





FUNDICION DE ZAPATAS CORRIDAS DEL CERRAMIENTO PERMETRAL



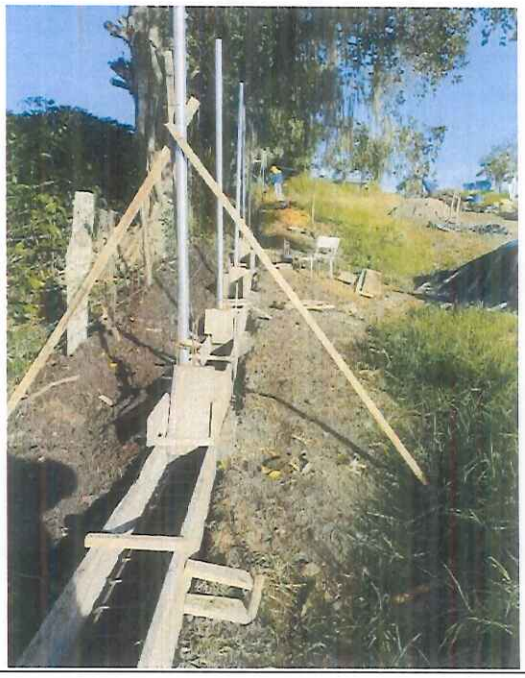



CERRAMIENTO PERIMETRAL DEFINITIVO

Ing. Gustavo Rodríguez
RL. Equiservicios industriales S.A.S.

Vo. Bo Ing. José William Tamayo Polania
Director de Interventoría

ANEXO 1
BITACORAS

BITACORA PTAP ACUEDUCTO CENTRO POBLADO RIO FRIO, MUNICIPIO DE RIVERA

27 de Junio de 2023
Día soleado
Se termina de formaletear la viga del cerramiento y se realiza la fundición.
Termina de llegar el pedido de material para el cerramiento.

Ing. Residente

28 de Junio de 2023
Día soleado
Se desencofra viga del cerramiento fundida ayer, el ornamentador inicia el trabajo de soldar modulos para el cerramiento

Ing. Residente

29 de Junio de 2023
Día Soleado
iniciamos la pega de la mampostería correspondiente a los módulos del cerramiento. El ornamentador continúa elaborando los modulos para el cerramiento.

Ing. Residente

30 de Junio de 2023
día soleado
llega todo el hierro correspondiente al tanque de almacenamiento de agua potable y las placas y vigas de la caseta del operario, el ornamentador

continúa trabajando, al día de hoy se tienen 9 módulos completos listos para instalar.

Ing. Residente

04 de Julio de 2023
Día soleado
Iniciamos con la actividad de pega de mampostería correspondiente al cerramiento perimetral definitivo. Iniciamos también el amarrado (de) y Figurado de hierro para la placa de piso del tanque de almacenamiento de agua. El soldador continúa trabajando en el armado de módulos con sus respectivas mallas del cerramiento perimetral definitivo.

Ing. Residente

05 de Julio de 2023
Día soleado
Continuamos con el corte, Figurado y armado de hierro para el piso del tanque de almacenamiento de agua potable.
El soldador continua con los trabajos de corte y armado de módulos para el cerramiento perimetral definitivo.

Ing. Residente

06 de Julio de 2023
Día soleado
Continuamos con las actividades de corte, figuración y amarre de hierro para el Piso del tanque de almacenamiento de agua. y con los trabajos del soldada para el cerramiento definitivo perimetral.

Ing. Residente

07 de Julio de 2023
Día Nublado y lluvioso de 3 - 5 pm.
Continuan los trabajos de figuración y amarre de hierro para la placa del piso del tanque de almacenamiento de agua.

Ing Residente

08 de Julio de 2023
Día lluvioso de 7 a 9 am. y nublado el resto de día.
Continuamos actividad de figuración y amarre de hierro para la placa de piso del tanque de almacenamiento de agua.

Ing. Residente

10 de Julio de 2023
Día soleado
Se amarran los hierros verticales que tienen su inicio en la Placa de piso del tanque.
Continuamos con las actividades de corte, figurado, trabajos de ornamenta

ción para el cerramiento perimetral definitivo.

Ing. Residente

10 de Julio de 2023
Día soleado.
Continuamos con amarre de hierro de la placa de piso del tanque de almacenamiento de agua instalamos segundo empanillado y acero vertical que arranca en la placa. El ornamentador continúa con la elaboración de los módulos para el cerramiento.

Ing. Residente

12 de Julio de 2023
Día Soleado
continuamos con actividades de amarre de hierro para la placa de piso del tanque de almacenamiento de agua

Ing. Residente

13 de Julio de 2023.
Día soleado
continuamos actividades de amarre de segundo empanillado y trabajos de ornamentación en la elaboración de módulos para cerramiento perimetral definitivo.

Ing. Residente

14 de Julio de 2023
Dia nublado.
Se termina de amarrar los hierros de la placa de piso del tanque de almacenamiento de agua potable, se instalan y aseguran los pasamuros y se termina de formaletear

Ing. Residente

15 de Julio de 2023
Dia soleado.
Se realiza fundición de la placa de piso del tanque de almacenamiento de agua con con creto premezclado de 4000 PSI impermeabilizado, se realiza toma de cilindros para ensayo de laboratorio de Resistencia a la compresión

Ing. Residente

17 de Julio de 2023
Dia lluvioso (4 horas)
Iniciamos con corte y figurado de hierros de muros del tanque de almacenamiento de agua. continuamos con pega de mampos tería de cerramiento perimetral y cimentación continua elaborando módulos para cerramiento.

Ing. Residente

18 de Julio de 2023
Día soleado
Continuamos amarrando el hierro del tanque de almacenamiento de agua
Se pega mampostería de cerramiento perimetral
El soldador trabaja en la elaboración de los modulos del cerramiento.

Ing. Residente

19 de Julio de 2023
Día soleado
Amarre de Acero muros del tanque de almacenamiento de agua potable.
Se realizó fundicion de columnetas y zapatas corrida del cerramiento perimetral definitivo.
El soldador trabaja en la elaboración de modulos del cerramiento.

Ing. Residente

20 de Julio de 2023 - Día Soleado
Se realiza corte y figurado de hierro y se funden columnetas de cerramiento perimetral.

Ing. Residente

21 de Julio de 2023
Día Soleado
Se realiza fundición de vigas del cerramiento.
Se inicia instalación de modulos del cerramiento continuamos con el corte, figurado y amarre del hierro correspondiente a las

zapatas corridas, vigas y muros del tanque de almacenamiento de agua potable

Ing. Residente

22 de Julio de 2023
Dia soleado
Se realiza pega de waypasteria correspondiente al cerramiento perimetral definitivo
Continuamos instalando modulos de malla eslabonada del cerramiento
Continuamos amarando hierro de los muros del tanque de almacenamiento de agua

Ing. Residente

24 de Julio de 2023
Dia soleado
Se realiza corte y figurado de hierro correspondiente a las zapatas y las vigas de la caseta del operario.
Se finaliza el amarrado del hierro del tanque. Se amarran las columnas de la caseta del operario. Continuamos instalando los modulos en malla eslabonada del cerramiento perimetral definitivo
Se inicia a formaletear los muros del tanque de almacenamiento de agua potable.

Ing. Residente

25 de Julio de 2023
Día soleado
se funde zapata corrida del cerramiento perimetral. Se realiza corte, figurado y amarre de la zapata corrida, vigas y columnetas del cerramiento. Se instalan módulos de malla eslabonada

Ing. Residente

26 de Julio de 2023
Día Soleado
Continuamos formaletando los muros del tanque de almacenamiento de agua potable. Se realiza corte, flejre y amarre de las vigas de cimentación de la caseta del operario.
Continuamos instalando módulos del cerramiento.

Ing Residente

27/07/2023
Día Soleado
continuamos instalando la formaleta de los muros del tanque de almacenamiento de agua potable. continuamos con la pega de mampostería del cerramiento y la instalación y amarre de hierro de las vigas de cimentación de la caseta del operador

Ing Residente

28 de Julio de 2023
Día soleado
Se realiza jornada de orden y aseo
Se realiza formaleteado de columnetas del cerramiento perimetral y continuamos formaleteando los muros del tanque de almacenamiento de agua potable

Ing. Residente

29 de Julio de 2023
Día soleado
continuamos con la instalación de formaletas para los muros del tanque de almacenamiento de agua, se funden columnetas de cerramiento.

Ing. Residente

31 de Julio de 2023
Día soleado
Se realiza fundición de las vigas de cimentación de la caseta del operador.
ornamentador continúa trabajando en la elaboración e instalación de módulos del cerramiento en malla estabonada.
continuamos trabajando en la intalación de la formaleta para los muros del tanque de almacenamiento de agua potable.

Ing. Residente

BITACORA PTAP ACUEDUCTO REGIONAL AGUADAS – SAN VICENTE – LAS LIMAS, MUNICIPIO DE ELIAS

en el cerramiento en la linea norte colindante con el hotel.

Ing. Residente

26 de Junio de 2023
Día nublado
Continuan trabajos de excavaciones y poda de monte y maleza en el area del cerramiento

Ing. Residente

27 de Junio de 2023
día soleado
Continuan excavaciones de cerramiento costado norte

Ing. Residente

28 de Junio de 2023
Día soleado
Se realiza relleno compactado mecánicamente con recebo de prestamo en el area de la placa de soporte de la planta de tratamiento de agua potable.

Ing. Residente

29 de Junio de 2023
Dia en la manana nublado y lluvias en la tarde. Se continua con excavaciones del

cerramiento y se finaliza el relleno con pactado mecánicamente con recebo de préstamo se recepciona cemento y ladrillo.

Ing. Residente

30 de Junio de 2023
Día soleado
Se realiza famaleteado de la placa de soporte de la planta de tratamiento de agua potable, se funde solado de la misma, se recibe material pétreo, hierro y estructura metálica para cerramiento definitivo

Ing. Residente

04 Julio de 2023
Día nublado
Continuamos con actividades de fundición de concreto para solado de limpieza en el área de la placa de soporte de la planta de tratamiento de agua potable
como comentario adicional; se evidenciaron en la visita técnica inicial que la línea donde va el cerramiento en el costado Sur hay 4 árboles de gran tamaño que interfieren en la ejecución de la actividad del cerramiento. Se plantearán 3 opciones para que el gerente del acueducto en compañía de la interventoría y aguas del huila nos indiquen cómo debemos proceder.

Ing. Residente

05 de Julio de 2023
Dia soleado
Se finaliza la fundición de concreto para solado de limpieza y se inicia con la instalación del hierro flejado en obra.

Ing. Residente

06 de Julio de 2023
Dia soleado
Continuamos con la instalación del acero de refuerzo flejado en obra en la placa de soporte de la planta de tratamiento de agua potable. Se recibe comunicado verbal del gerente del acueducto informandonos que la opción mas favorable es correr el retro hacia la planta de tratamiento (Norte) el costado sur que presenta el problema de los árboles de gran tamaño, y que ese cerco antiguo quedara como cerca viva. Quedamos a la espera de una comunicación oficial por parte de la interventoria.

Ing. Residente

07 de Julio de 2023
Dia nublado
Se termina la actividad de amarrado del acero figurado de refuerzo y procedemos a formaletear la placa de soporte.

Ing. Residente

08 de Julio de 2023
día Nublado
Se recibe material del cerramiento definitivo y se realiza la fundición de la placa de soporte de la planta de tratamiento de agua potable con concreto impermeabilizado de 4000 PSI mezclado en sitio.

Ing. Residente

10 de Julio de 2023
Día nublado
continuamos con las excavaciones para la zapata corrida del cerramiento, en algu nos tramos se encuentra material limoso lo cual obliga a sobre excavar entre 30y 30 cm adicionales para realizar mejoramiento con recebo compactado y poder fundir la zapata corrida. tambien seguimos con la actividad de corte y figurado del hierro de la zapata corrida.

Ing. Residente

11 de Julio de 2023
Dia lluvioso (5 horas)
Continuamos con excavaciones del cerramiento y con el mejoramiento con recebo compactado. Igualmente con el armado del hierro figu rado de la zapata corrida

Ing. Residente

12 de Julio de 2023.
Dia Nublado.
Continuamos con las excavaciones y nivelamiento con recebo compactado en el cerramiento definitivo y con el corte, figurado y armado de acero de refuerzo de la zapata corrida del cerramiento.

Ing. Residente

13 de Julio de 2023.
Dia Nublado y lluviaso (3 horas)
Continuan excavaciones y nivelamiento con recebo compactado. Se inicia la fundición de la zapata corrida para el cerramiento definitivo.

Ing. Residente

14 de Julio de 2023
Dia Nublado
Continuamos con la fundicion con concreto preparado en obra de la zapata corrida del cerramiento perimetral.
Continuamos con el armado del hierro figurado en obra para las zapatas del cerramiento.

Ing. Residente

15 de Julio de 2023
Dia nublado
continuamos con las excavaciones de la zapata y mejoramiento con recebo compactado del cerramiento definitivo. Se termina el costado Norte.

Ing. Residente

(16 al) 17 de Julio de 2023
Dia: lluvias de 8:00am a 12:30pm. y de 3:30pm hasta la noche.
En las horas que se pudo trabajar se realizaron excavaciones para la zapata corrida del cerramiento perimetral definitivo

Ing. Residente

18 de Julio de 2023
Dia: lluvias de 7:00 am a 10:00 am
Se realizan excavaciones de la zapata corrida del cerramiento perimetral definitivo
Se realiza desenraizado en las excavaciones del costado sur.
Se realiza armare de hierro e instalación de las canastas de la viga de cimentación iniciando por el costado Norte desde la entrada.

Ing. Residente

19 de Julio de 2023
Dia Nublado con llovizna
Se realiza fundición de la zapata corrida y viga de cimentación del cerramiento definitivo perimetral.

Ing. Residente

20 Julio 2023
Dia Nublado
Continuamos con la actividad de fundición de las vigas de cimentación del cerramiento perimetral definitivo. Igualmente continuamos con las excavaciones y desenraizamiento en el costado sur. El ornamentador trabaja en el armado de modulos en malla eslabonada del cerramiento perimetral definitivo

Ing. Residente

21 de Julio de 2023
Dia: lluvias de 8:00 am a 3:0pm
Se trabaja en fundición de vigas de cimentación y se realiza unas encofrado de vigas.
Soldador trabajando en corte y armado de modulos en malla eslabonada del cerramiento perimetral definitivo.

Ing. Residente

23 de Julio de 2023
Dia: lluvias de 6:00 am a 11:00 am.
Se funde un tramo de viga de cimentación del cerramiento.

Ing. Residente

24 de Julio de 2023
Dia lluvias de 6:00 am a 2:00 pm.
se funde un tramo de viga de cimentación
Se realiza mejoramiento con recebo a la zapata del cerramiento perimetral

Ing. Residente

25 Julio de 2023
Dia Nublado
Continúan excavaciones de la zapata del cerramiento perimetral definitivo.
continuamos haciendo mejoramiento con recebo compactado al cerramiento perimetral.
Se arman e instalan las canastillas de Hierro correspondientes a la zapata corrida del cerramiento perimetral.

Ing. Residente

26 de Julio de 2023
Dia Nublado
Se realiza pega de Bloque correspondiente al cerramiento perimetral definitivo, se realiza amarre de hierro y se instala en la zapata corrida del cerramiento perimetral

definitivo, y se continuan las excavaciones para la zapata corrida

Ing. Residente

27 de Julio de 2023
Día soleado
continuamos con pega de mampostería del cerramiento. Se trabaja en el armare de hierro de la zapata y las vigas del cerramiento perimetral

Ing. Residente

28 de Julio de 2023
Día: lluvias de 8:00am a 12:pm.
Continuamos pegando bloque en cerramiento se excava para zapata corrida y se realiza mejoramiento del terreno con recebo compactado.
Iniciamos a instalar módulos del cerramiento

Ing. Residente

29 de Julio de 2023
Día nublado
continuan excavaciones, armado de hierro, mejoramiento del terreno con recebo compactado correspondiente al cerramiento perimetral definitivo.

Ing. Residente

ANEXO 02
INFORME INVERSION ANTICIPO

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

INFORME No. 002

Gobernación del Huila

HUILA CRECE

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE:	OBRA CIVIL	**No.**	082 del 14/04/2023
FECHA ELABORACIÓN:	Abril del 2023		HOJA 1 DE 1

I. IDENTIFICACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."				
CONTRATISTA	**EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S**	**NIT O C.C**	900.410.655-8	**CONTRATO N°**	82
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 1.568.908.267,00**		**VALOR ANTICIPO:**	40%	**$ 627.563.306,80**
			OTROS IMPUESTOS DPTAL:	5%	$ 31.378.165,00
			VALOR TOTAL ANTICIPO:		**$ 596.185.141,80**

II. DATOS ESPECIFICOS

DETALLE MANEJO DEL ANTICIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	SALDO	%	REEMBOLSO 3	%	SALDO	%
1	**COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES**	**$ 221.780.872,75**	**37,20%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**
	CAPITULO 1: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA VALENCIA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 42.925.330,21	7,20%	$ -	0,00%	-	0,00%	$ -	0,00%
	CAPITULO 2: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO CENTRO POBLADO RIO FRIO, MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 128.775.990,63	21,60%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	CAPITULO 6: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL AGUADAS-SAN VICENTE-LAS LIMAS, MUNICIPIO DE ELIAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 50.079.551,91	8,40%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	**GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO**	**$ 39.207.864,40**	**6,58%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**
	CAPITULO 1: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA VALENCIA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 14.308.443,40	2,40%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	CAPITULO 2: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO CENTRO POBLADO RIO FRIO, MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 24.899.421,00	4,18%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
3	**TRANSPORTE DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPOS**	**$ 28.980.175,63**	**4,86%**	**$ 14.671.732,23**	**2,46%**	**$ 14.671.732,23**	**2,46%**	**$ 0,00**	**0,00%**
	CAPITULO 1: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA VALENCIA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 3.577.110,85	0,60%	$ -	0,00%		0,00%	$ -	0,00%
	CAPITULO 2: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO CENTRO POBLADO RIO FRIO, MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 10.731.332,55	1,80%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%

	CAPITULO 3: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL SAN RAFAEL-PIRULINDA, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 3.642.307,11	0,61%	$ 3.642.307,11	0,61%	$ 3.642.307,11	0,61%	$ -	0,00%
	CAPITULO 4: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO BAJO, MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 3.577.110,85	0,60%	$ 3.577.110,85	0,60%	$ 3.577.110,85	0,60%	$ -	0,00%
	CAPITULO 5: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA MORTIÑAL, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 3.279.018,28	0,55%	$ 3.279.018,28	0,55%	$ 3.279.018,28	0,55%	$ -	0,00%
	CAPITULO 6: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL AGUADAS-SAN VICENTE-LAS LIMAS, MUNICIPIO DE ELIAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 4.173.295,99	0,70%	$ 4.173.295,99	0,70%	$ 4.173.295,99	0,70%	$ -	0,00%
4	**CONTRATOS DE OBRA CIVIL**	**$ 306.216.229,02**	**51,36%**	**$ 250.771.010,83**	**42,06%**	**$ 250.771.010,83**	**42,06%**	$ -	**0,00%**
	CAPITULO 1: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA VALENCIA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 10.731.332,55	1,80%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	CAPITULO 2: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO CENTRO POBLADO RIO FRIO, MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 32.193.997,66	5,40%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	CAPITULO 3: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL SAN RAFAEL-PIRULINDA, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 10.618.687,42	1,78%	$ 10.618.687,42	1,78%	$ 10.618.687,42	1,78%	$ -	0,00%
	CAPITULO 4: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO BAJO, MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 126.000.000,00	21,13%	$ 126.000.000,00	21,13%	$ 126.000.000,00	21,13%	$ -	0,00%
	CAPITULO 5: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA MORTIÑAL, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 114.152.323,41	19,15%	$ 114.152.323,41	19,15%	$ 114.152.323,41	19,15%	$ -	0,00%
	CAPITULO 6: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL AGUADAS-SAN VICENTE-LAS LIMAS, MUNICIPIO DE ELIAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 12.519.887,98	2,10%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
	TOTAL	**$ 596.185.141,80**	**100,00%**	**$ 265.442.743,06**	**44,52%**	**$ 265.442.743,06**	**44,52%**	**$ 0,00**	**0,00%**

RESUMEN ESTADO EJECUCION FIDUCIA A CORTE 31/07/2023		
VALOR ANTICIPO	40%	$ 627.563.306,80
DESCUENTO POR OTROS IMPUESTOS	5%	$ 31.378.165,00
VALOR GIRADO A LA FIDUCIA		$ 596.185.141,80
VALOR REEMBOLSADO DE LA FIDUCIA SEGUN INFORME No. 1		330.742.398,74
VALOR REEMBOLSADO DE LA FIDUCIA SEGUN INFORME No. 2		265.442.743,06
VALOR TOTAL REEMBOLSADO DE LA FIDUCIA		596.185.141,80
SALDO EN CUENTA FIDUCIARIA		-

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
MARTINICA COMPANY S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 3					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA : 27/06/2023		
P.A. ANT EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S 082			PAGADO A : EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS		
			N.I.T : 900410655-8		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES				
				TOTAL ITEM 1	$ 0,00
2	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO				
				TOTAL ITEM 2	$ 0,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPOS				
	CAPITULO 3: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL SAN RAFAEL-PIRULINDA, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				$ 3.642.307,11
	CAPITULO 4: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO BAJO, MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				$ 3.577.110,85
	CAPITULO 5: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA MORTIÑAL, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				$ 3.279.018,28
	CAPITULO 6: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL AGUADAS-SAN VICENTE-LAS LIMAS, MUNICIPIO DE ELIAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				$ 4.173.295,99
				TOTAL ITEM 3	$ 14.671.732,23
4	CONTRATOS DE OBRA CIVIL				
	CAPITULO 3: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL SAN RAFAEL-PIRULINDA, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				$ 10.618.687,42
	CAPITULO 4: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO BAJO, MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				$ 126.000.000,00
	CAPITULO 5: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA MORTIÑAL, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.				$ 114.152.323,41
				TOTAL ITEM 4	$ 250.771.010,83
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	$ 265.442.743,06

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO
ORDEN DE OPERACIÓN No. 3

1	COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES	$ -	0,00%

2	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	$ -	0,00%

3	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPOS	$ 14.671.732,23	2,46%
	CAPITULO 3: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL SAN RAFAEL-PIRULINDA, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 3.642.307,11	0,61%

ITEM	NIT	PROVEEDOR	No. FACTURA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO
1	890903475-1	EQUIPOS GLEASON S.A.	52-54680	$ 1.273.538,00	$ 1.273.538,00	$ 13.398.194,23
2	890903475-1	EQUIPOS GLEASON S.A.	52-54728	$ 1.282.559,00	$ 1.282.559,00	$ 12.115.635,23
3	12.139.767	ARBEY ANACONA CERON	CTA COBRO	$ 1.090.000,00	$ 1.086.210,11	$ 11.029.425,12
					$ 3.642.307,11	

	CAPITULO 4: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO BAJO, MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 3.577.110,85	0,60%

ITEM	NIT	PROVEEDOR	No. FACTURA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO
1	12.120.378	HUMBERTO FLOREZ OLAYA	CTA COBRO	$ 3.580.000,00	$ 3.577.110,85	$ 7.452.314,27
					$ 3.577.110,85	

	CAPITULO 5: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA MORTIÑAL, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 3.279.018,28	0,55%

ITEM	NIT	PROVEEDOR	No. FACTURA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO
1	7.723.440	ARBEY ANACONA CERON	CTA COBRO	$ 3.280.000,00	$ 3.279.018,28	$ 4.173.295,99
					$ 3.279.018,28	

	CAPITULO 6: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL AGUADAS-SAN VICENTE-LAS LIMAS, MUNICIPIO DE ELIAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 4.173.295,99	0,70%

ITEM	NIT	PROVEEDOR	No. FACTURA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO
1	7.723.440	ARBEY ANACONA CERON	CTA COBRO	$ 4.180.000,00	$ 4.173.295,99	$ -
					$ 4.173.295,99	$ -

4	CONTRATOS DE OBRA CIVIL	$ 250.771.010,83	42,06%
	CAPITULO 3: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO REGIONAL SAN RAFAEL-PIRULINDA, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 10.618.687,42	1,78%

ITEM	NIT	CONTRATISTA	No. FACTURA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO
1	12.109.374	JAVIER SERRANO PEREZ	CUENTA DE COBRO	$ 10.618.687,42	$ 10.618.687,42	$ 240.152.323,41
					$ 10.618.687,42	

	CAPITULO 4: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO BAJO, MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 126.000.000,00	21,13%

ITEM	NIT	CONTRATISTA	No. FACTURA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO
1	901.620.786	INVERSIONES SERVIDECON	CUENTA DE COBRO	$ 126.000.000,00	$ 126.000.000,00	$ 114.152.323,41
					$ 126.000.000,00	

	CAPITULO 5: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO VEREDA MORTIÑAL, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 114.152.323,41	19,15%

ITEM	NIT	CONTRATISTA	No. FACTURA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO
1	901.226.744	CONSTRUPISOS TM SAS	CUENTA DE COBRO	$ 114.152.323,41	$ 114.152.323,41	$ -
					$ 114.152.323,41	$ -

	VALOR	%
TOTAL RECIBIDO POR ORDEN DE OPERACIÓN No. 3	$ 265.442.743,06	44,52%
TOTAL ANT. AMORTIZADO DE LA ORDEN DE OPERACIÓN No. 3	$ 265.442.743,06	44,52%
TOTAL ANT. POR AMORTIZAR	$ -	0,00%

EQUIPOS GLEASON S.A.

NIT: 890,903,475-1
CARRERA 5 NO. 29 -50 SUR ZONA INDUSTRIAL Tel.877 31 60
NEIVA - Huila
orlando.liz@equiposgleason.com
Autoriza DIAN:18764039079268 de 04/11/2022. De 52-53001 a 52-55500. Vigencia: 12 meses
CIIU: 7730 REGIMEN ORDINARIO - RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 2bfb41ce2c60c0b7623140f6e84bdcf0292d02885e736b3cfd3f995232557f276f29c0569c692793f41ffe9c82d33c03

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

52-54680
Página 1 de 1
CRÉDITO

Cliente: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S 900,410,655-8 Fecha: 05/07/2023
Obra: 3925 - TANQUE RIO FRIO - RIVERA Vencimiento: 20/07/2023
Entrega: CL 46 N 16 24 OF 705 P 07 TO EMPRESARIAL SAN JUAN PLAZA Tel: 6756018 3133496226
Período: 16/06/2023 30/06/2023 Vendedor: 1 ORLANDO LIZ DURAN Validación: 05/07/2023 11:03:56

Reg.		Artículo	Docum	Fecha	Cant	SaldoObra	Días	Vr.Unit	Vr.Parcial
1	57	ALINEADOR 1.000 MM	S-Ini	16/06/2023	8.00	8.00	15	81.71	9,805
2	64	ALINEADOR 2.000 MM	S-Ini	16/06/2023	16.00	16.00	15	163.44	39,226
3	71	ALINEADOR 3.000 MM	S-Ini	16/06/2023	12.00	12.00	15	245.15	44,127
4	78	ALINEADOR 6.000 MM	S-Ini	16/06/2023	8.00	8.00	15	490.32	58,838
5	46	ANGULO EXTERIOR 60 X 60 X 600 MM	S-Ini	16/06/2023	8.00	8.00	15	48.54	5,825
6	48	CHAPETA	S-Ini	16/06/2023	300.00	300.00	15	25.98	116,910
7	107	CORBATA 300 MM	S-Ini	16/06/2023	60.00	60.00	15	17.31	15,579
8	173	ESQUINERO 100 X 100 X 300 MM	S-Ini	16/06/2023	6.00	6.00	15	57.80	5,202
9	171	ESQUINERO 100 X 100 X 600 MM	S-Ini	16/06/2023	10.00	10.00	15	113.78	17,067
10	523	PANEL 100 X 600 MM	S-Ini	16/06/2023	10.00	10.00	15	61.69	9,254
11	190	PANEL 250 X 600 MM	S-Ini	16/06/2023	2.00	2.00	15	154.77	4,643
12	192	PANEL 300 X 1.200 MM	S-Ini	16/06/2023	8.00	8.00	15	370.14	44,417
13	530	PANEL 300 X 600 MM	S-Ini	16/06/2023	54.00	54.00	15	185.06	149,899
14	199	PANEL 600 X 1.200 MM	S-Ini	16/06/2023	26.00	26.00	15	741.35	289,127
15	201	PANEL 600 X 600 MM	S-Ini	16/06/2023	8.00	8.00	15	370.14	44,417
16	180	PANEL 80 X 600 MM	S-Ini	16/06/2023	6.00	6.00	15	493.51	44,416
17	2640	PANEL ESP 50 X 600 MM	S-Ini	16/06/2023	4.00	4.00	15	48.70	2,922
18	299	PARAL 1.00 A 1.50 M	S-Ini	16/06/2023	8.00	8.00	15	187.32	22,478
19	303	PARAL 2.30 A 3.60 M	S-Ini	16/06/2023	16.00	16.00	15	187.32	44,957
20	38	PIN DOBLE	S-Ini	16/06/2023	120.00	120.00	15	11.90	21,420
21	40	TENSOR	S-Ini	16/06/2023	100.00	100.00	15	77.93	116,895

Tarifa IVA: 19.00%

ALQUILER :	1,107,424
Rte.Fte:	44,297
SUBTOTAL:	1,107,424
DCTO. GRAL:	0
VALOR IVA:	210,411
TOTAL RTE.FTE:	44,297
TOTAL:	1,273,538

Vo Bo
Item 2.4.5 6-07-2023

Valor en letras:UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *

Favor consignar en las Cuentas Corrientes (Bancolombia 27740360643, Occidente 45003699-1, Bogotá 22500617-0, Davivienda 036469998805, Banco Popular 110181155409) a nombre de Equipos Gleason S.A.

Favor abstenerse de efectuar retención en la fuente por ICA (Impuesto de Industria y Comercio). Somos AUTORRETENEDORES en el municipio de Neiva. La empresa cancela este gravamen al municipio de Neiva, que de acuerdo con la Ley es a quien le pertenece. Cualquier duda sobre este particular por favor consultarla a la compañía.

Actividad económica 7730 - 4659

CANCELADO

EQ

Firma del Emisor

Nombre y Cédula del Receptor

RECIBIDO 05 07 2023

Firma y Sello del Receptor - Fecha recibido

Aguas del Huila 082.
174
pagado

Esta factura de venta causará un interés mensual a la máxima tasa estipulada por la ley a partir de la fecha de vencimiento. De no ser pagada oportunamente, autorizo registrar esta obligación en bancos de datos o demás centrales de información financiera. La firma de unapersona distinta al cliente implica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el cliente para firmar, confesar la deuda y obligar al cliente.

Documento generado con el Software Cervino de Altos Software SAS. Nit.811.022.121-1. www.altos-soft.com

ORIGINAL CLIENTE

EQUIPOS GLEASON S.A.

NIT: 890,903,475-1
CARRERA 5 NO. 29 -50 SUR ZONA INDUSTRIAL Tel.877 31 60
NEIVA - Huila
orlando.liz@equiposgleason.com
Autoriza DIAN:18764039079268 de 04/11/2022. De 52-53001 a 52-55500. Vigencia: 12 meses
CIIU: 7730 REGIMEN ORDINARIO - RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 82282175dfb08ae41f75fcf227953abd67fa42ff38847cfd1fd9056fb0570a297de6c7bbe78d870258aad38f7d82d552

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
52-54728
Página 1 de 1
CRÉDITO

Cliente: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S 900,410,655-8 Fecha: 21/07/2023
Obra: 3925 - TANQUE RIO FRIO - RIVERA Vencimiento: 05/08/2023
Entrega: CL 46 N 16 24 OF 705 P 07 TO EMPRESARIAL SAN JUAN PLAZA Tel: 6756018 3133496226
Período: 01/07/2023 15/07/2023 Vendedor: 1 ORLANDO LIZ DURAN Validación: 21/07/2023 07:43:55

Reg.		Artículo	Docum	Fecha	Cant	SaldoObra	Días	Vr.Unit	Vr.Parcial
1	57	ALINEADOR 1.000 MM	S-Ini	01/07/2023	8.00	8.00	15	81.71	9,805
2	64	ALINEADOR 2.000 MM	S-Ini	01/07/2023	16.00	16.00	15	163.44	39,226
3	71	ALINEADOR 3.000 MM	S-Ini	01/07/2023	12.00	12.00	15	245.15	44,127
4	78	ALINEADOR 6.000 MM	S-Ini	01/07/2023	8.00	8.00	13	490.32	50,993
5	78	ALINEADOR 6.000 MM	RM-20439	14/07/2023	8.00	16.00	2	490.32	15,690
6	46	ANGULO EXTERIOR 60 X 60 X 600 MM	S-Ini	01/07/2023	8.00	8.00	15	48.54	5,825
7	18	CHAPETA	S-Ini	01/07/2023	300.00	300.00	15	25.98	116,910
8	107	CORBATA 300 MM	S-Ini	01/07/2023	60.00	60.00	15	17.31	15,579
9	173	ESQUINERO 100 X 100 X 300 MM	S-Ini	01/07/2023	6.00	6.00	15	57.80	5,202
10	171	ESQUINERO 100 X 100 X 600 MM	S-Ini	01/07/2023	10.00	10.00	15	113.78	17,067
11	523	PANEL 100 X 600 MM	S-Ini	01/07/2023	10.00	10.00	15	61.69	9,254
12	190	PANEL 250 X 600 MM	S-Ini	01/07/2023	2.00	2.00	15	154.77	4,643
13	192	PANEL 300 X 1.200 MM	S-Ini	01/07/2023	8.00	8.00	15	370.14	44,417
14	530	PANEL 300 X 600 MM	S-Ini	01/07/2023	54.00	54.00	15	185.06	149,899
15	199	PANEL 600 X 1.200 MM	S-Ini	01/07/2023	26.00	26.00	15	741.35	289,127
16	201	PANEL 600 X 600 MM	S-Ini	01/07/2023	8.00	8.00	15	370.14	44,417
17	180	PANEL 80 X 600 MM	S-Ini	01/07/2023	6.00	6.00	15	493.51	44,416
18	2640	PANEL ESP 50 X 600 MM	S-Ini	01/07/2023	4.00	4.00	15	48.70	2,922
19	299	PARAL 1.00 A 1.50 M	S-Ini	01/07/2023	8.00	8.00	15	187.32	22,478
20	303	PARAL 2.30 A 3.60 M	S-Ini	01/07/2023	16.00	16.00	15	187.32	44,957
21	38	PIN DOBLE	S-Ini	01/07/2023	120.00	120.00	15	11.90	21,420
22	40	TENSOR	S-Ini	01/07/2023	100.00	100.00	15	77.93	116,895

Tarifa IVA: 19.00%

ALQUILER :	1,115,269
Rte.Fte:	44,611
SUBTOTAL:	1,115,269
DCTO. GRAL:	0
VALOR IVA:	211,901
TOTAL RTE.FTE:	44,611
TOTAL:	1,232,559

CANCELADO

'alor en letras:UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
avor consignar en las Cuentas Corrientes (Bancolombia 27740360643, Occidente 45003699-1, Bogotá 22500617-0, Davivienda 036469998805, Banco opular 110181155409) a nombre de Equipos Gleason S.A.
avor abstenerse de efectuar retención en la fuente por ICA (Impuesto de Industria y Comercio). Somos AUTORRETENEDORES en el municipio de Neiva. La mpresa cancela este gravamen al municipio de Neiva, que de acuerdo con la Ley es a quien le pertenece. Cualquier duda sobre este particular porfavor onsultarla a la compañía.
ctividad económica 7730 - 4659

EQ

Firma del Emisor

Nombre y Cédula del Receptor

Firma y Sello del Receptor - Fecha recibido

Fecha 21 07 2023
Aguas del Huila 022
174
Firma Nately

Esta factura de venta causará un interés mensual a la máxima tasa estipulada por la ley a partir de la fecha de vencimiento. De no ser pagada oportunamente, autorizo registrar esta obligación en bancos de datos o demás centrales de información financiera. La firma de unapersona distinta al cliente mplica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el cliente para firmar, confesar la deuda y obligar al cliente.

Documento generado con el Software Cervino de Altos Software SAS. Nit.811.022.121-1. www.altos-soft.com
ORIGINAL CLIENTE

05 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS

NIT. 900.410.655-8

DEBE A:

ARBEY ANACONA CERON
identificado con cedula de ciudadanía NIT. 12.239.767

EL VALOR DE:

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.090.000), equivalente a servicio de transporte de material para el municipio de Saladoblanco del CT. 082 de 2023 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Régimen simplificado

Cordialmente,

CANCELADO

Arbey Anacona Ceron

ARBEY ANACONA CERON
CC. 12.139.767
CEL. 3105517261
SALADO BLANCO

CAUSACION - RELACION ESTA
Fecha 05 06 2023
Proyecto Aguas del Huila 082
C Costo 174
O Compra Salado blanco
O Pedido
Firma

10 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS

NIT. 900.410.655-8

DEBE A:

HUMBERTO FLOREZ OLAYA

identificado con cedula de ciudadanía NIT. 12.120.378-7

EL VALOR DE:

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.580.000), equivalente a servicio de transporte de material para el municipio de Campoalegre del CT. 082 de 2023 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Régimen simplificado

CANCELADO

CAUCASIA INDUSTRIAL FORESTAL
Fecha 10 06 2023
Aguas del Huila 082
174
Campoalegre.
Natalia

Cordialmente,

HUMBERTO FLOREZ OLAYA
CC. 12.120.378
CEL. 3208470924

05 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS

NIT. 900.410.655-8

DEBE A:

ARBEY ANACONA CERON
identificado con cedula de ciudadanía NIT. 12.239.767

EL VALOR DE:

TRES MILLONES DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.280.000), equivalente a servicio de transporte de material para el municipio de Pitalito del CT. 082 de 2023 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Régimen simplificado

Cordialmente,

CANCELADO

Arbey Anacona Ceron

ARBEY ANACONA CERON
CC. 12.139.767
CEL. 3105517261
SALADO BLANCO

CAU ... TAL
Fecha 05 06 2023
Proyecto Aguas del Huila 082
C Costo 174
O Compra Pitalito
O Pedido
Firma Natalia

05 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS

NIT. 900.410.655-8

DEBE A:

ARBEY ANACONA CERON
identificado con cedula de ciudadanía NIT. 12.239.767

EL VALOR DE:

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($4.180.000), equivalente a servicio de transporte de material para el municipio de Elias del CT. 082 de 2023 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Régimen simplificado

Cordialmente,

Arby Anacona Ceron

ARBEY ANACONA CERON
CC. 12.139.767
CEL. 3105517261
SALADOBLANCO

CAUSACIÓN - PRESUPUESTA
Fecha 05 06 2023
Proyecto Aguas del Huila
C Costo CTO 082
O Compra CC. 174
O Pedido Elias
Firma Nately

JAVIER SERRANO PEREZ
C.C. 12.109.374

CUENTA DE COBRO No. 01

Neiva 20 de junio de 2023

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
NIT 900.410.655-8

DEBE A:

JAVIER SERRANO PEREZ

Cedula ciudadanía No. 12.109.374

La suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE $10.618.687.42, por concepto de **ANTICIPO** según contrato **CE-036 DE 2023**, cuyo objeto es **Contrato para trasiego de material de la planta de tratamiento de agua potable PTAP ACUEDUCTO REGIONAL SAN RAFAEL-PIRULINDA-MUNICIPIO SALADOBLANCO, Departamento del Huila.**

JAVIER SERRANO PEREZ
C.C. 12.109.374
Contratista

CRA 37 NO. 20ª-84
javiserranoper@gmail.com

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit. 900.410.655-8	**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato Número **CE-036**	**Concepto** **Contrato para trasiego de material de la planta de tratamiento de agua potable PTAP ACUEDUCTO REGIONAL SAN RAFAEL-PIRULINDA-MUNICIPIO SALADOBLANCO, Departamento del Huila.**	**Fecha: 20/06/2023**

PROYECTO

Contrato para trasiego de material de la planta de tratamiento de agua potable PTAP ACUEDUCTO REGIONAL SAN RAFAEL-PIRULINDA-MUNICIPIO SALADOBLANCO, Departamento del Huila.

CONTRATANTE

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. **NIT:** 900.410.655-8	**Domicilio en:** CALLE 46 No. 16-24 OF. 705	**Teléfono:** 8641641

CONTRATISTA

JAVIER SERRANO PEREZ C.C. **12.109.374**	**Domicilio en:** CRA 37 NO. 20ª-84	**Teléfono:** 3108857604 Email: javiserranoper@gmail.com

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$26.546.718.55
COSTO DIRECTO		$24.133.380.50
ADMINISTRACION	**6%**	$1.448.002.83
IMPREVISTO	**2%**	$482.667.61
UTILIDAD	**2%**	$482.667.61

SON: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.

FORMA DE PAGO	ACTAS MENSUALES
ANTICIPO	**$10.618.687.42**
PLAZO:	TRES MESES
FECHA DE INICIACION:	20/06/2023
FECHA DE TERMINACION:	19/09/2023

FECHA Y LUGAR EN QUE SE FIRMA EL CONTRATO:	NEIVA, 20/06/2023

ENTRE LOS SUSCRITOS A SABER **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL**, MAYOR DE EDAD Y VECINO DE NEIVA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 12.193.284

O UN TERCERO SUFRA EN DESARROLLO O CON OCASIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. **5.** SIN PERJUICIO DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, REPETIR CONTRA EL CONTRATISTA O LOS TERCEROS RESPONSABLES, SEGÚN EL CASO, POR LAS INDEMNIZACIONES QUE DEBAN PAGAR COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEFECTUOSA DEL PRESENTE CONTRATO. **6.** FORMULARLE AL CONTRATISTA OPORTUNAMENTE, LAS SUGERENCIAS QUE CONSIDEREN CONVENIENTES Y PERTINENTES. **B. DEL CONTRATISTA:** CONSTITUYEN DERECHOS DEL CONTRATISTA PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO: **1.** RECIBIR OPORTUNAMENTE LA FORMA DE PAGO ACORDADA EN EL PRESENTE CONTRATO.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A: A) DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS PARCIALES Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. B) SUMINISTRAR LA HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LAS CANTIDADES Y TIEMPOS INDICADOS.C) SUMINISTRAR EL PERSONAL NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO OPORTUNO AL DESARROLLO DE LA OBRA Y CUMPLIR LAS NORMAS DE LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EN LOS PLANOS TECNICOS. D) MANTENER LOS SITIOS DE TRABAJO, LOS CAMPAMENTOS E INSTALACIONES EN PERFECTO ESTADO DE ORDEN Y LIMPIEZA. E) REMOVER OPORTUNAMENTE LOS EQUIPOS, MATERIALES SOBRANTES, ETC., PARA PERMITIR EL DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES. F) NO HACER CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, PLANOS, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, ETC., SIN LA APROBACIÓN PREVIA Y ESCRITA DE **EL CONTRATANTE**. G) MANTENERSE OPORTUNAMENTE INFORMADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA PARA ADQUIRIR OPORTUNAMENTE LOS EQUIPOS Y EJECUTAR LOS TRABAJOS NECESARIOS. H) ENTREGAR UNA PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN SE REQUIERAN EN LA OBRA. I) DIRIGIR PERSONALMENTE LAS OBRAS DEL PRESENTE CONTRATO Y NO SUBCONTRATARLAS O CEDERLEAS. J) PONER A DISPOSICION DE CADA UNO DE SUS TRABAJADORES LAS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ACATANDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. K) DAR CUMPLIMIENTO VEINTENAL EN SU TOTALIDAD AL CORTE DE MANO DE OBRA PROYECTADO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA PARA EL PAGO EN EL ACTA. L) ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA CADA ACTIVIDAD DEBIDAMENTE TERMINADA PARA CHEQUEO Y AUTORIZACION DE AVANCE DE OBRA. M) ADMINISTRAR Y VIGILAR LA DEBIDA UTILIZACION DE LOS MATERIALES RETIRADOS DEL ALMACEN DE LA OBRA CON AUTORIZACION DEL RESIDENTE DE OBRA VERIFICANDO LA CORRECTA DISPOSICION FINAL SIN DESPERDICIOS. N) ENTREGAR A **EL CONTRATANTE** UNA COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO A SUS TRABAJADORES DE CADA VEINTENA DEBIDAMENTE FIRMADA POR CADA UNO DE ELLOS DURANTE TODA LA EJECUCION A MANERA DE SER UTILIZADA COMO PAZ Y SALVO CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES. O) CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y AMBIENTALES DISPUESTAS EN EL PLAN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA. P) NO INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS NI ALUCINOGENOS DENTRO DE LA OBRA, NI TRABAJAR BAJO LOS EFECTOS DE ESTAS Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA EN EL PERSONAL A SU CARGO DE OTRA FORMA **EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA** ESTAN EN TODO EL DERECHO DE EXPULSAR DEFINITIVAMENTE AL PERSONAL QUE NO CUMPLA CON ESTA NORMA. Q) RESPONDER POR EL DEBIDO USO DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO SUMINISTRADO POR **EL CONTRATANTE** PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA OBRA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. R) MANTENER EN BUEN ESTADO LAS ACTIVIDADES ENTREGADAS A EL RESIDENTE PARA EL AVANCE DE OBRA S) EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DE LA ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE CONTRATE QUE VENGA DE UN LUGAR DISTINTO DE LA CIUDAD DE NEIVA, YA SEA TRANSPORTE LOCAL O DE CIUDAD A CIUDAD. T) TODAS LAS DEMÁS QUE EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO LE CORRESPONDAN DE TAL MODO QUE PUEDA CONSTRUIR CORRECTA Y OPORTUNAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.U) EL CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA: PRECIOS UNITARIOS. **"EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S."** PAGARÁ AL CONTRATISTA LAS ACTIVIDADES QUE REALMENTE ÉSTEEJECUTE, POR EL VALOR ACORDADO. DE CONFORMIDAD CON EL **ANEXO 2** (CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES DE OBRA).

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GASTOS INHERENTES A LA EJECUCION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DECLARA QUE EN EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS O EROGACIONES EN QUE DEBAN INCURRIR PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. SE ESTABLECEN COMO CAUSALES PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO LAS SIGUIENTES: 1) EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES EN CABEZA **DEL CONTRATISTA**. 2) LA QUIEBRA, CONCORDATO, DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN **DEL CONTRATISTA**. 3) LA SUSPENSIÓN INDEBIDA DEL CONTRATO POR **EL CONTRATISTA**. 4) EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO AL CRONOGRAMA DE LA OBRA. 5) LA MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL DESACATO DE ÓRDENES **DEL CONTRATANTE** Y EL RESIDENTE DE OBRA PARA LA DEBIDA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. **PARÁGRAFO PRIMERO**: **EL CONTRATANTE** PODRÁ SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO SIN QUE HAYA LUGAR A INDEMNIZACIÓN ALGUNA EN FAVOR **DEL CONTRATISTA**, QUIÉN UNA VEZ REANUDADA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, DEBERÁ CONTINUAR CUMPLIENDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, EN LOS MISMOS TÉRMINOS PACTADOS. **EL CONTRATISTA** TENDRA DERECHO A QUE SE LE PAGUEN LAS OBRAS EJECUTADAS CORRECTAMENTE HASTA EL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO PARA LO CUAL SE ELABORARA UN ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA. **PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA** AUTORIZA A EL **CONTRATANTE** EL DESCUENTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS DE LA ULTIMA ACTA DE CORTE DE OBRA Y SI DICHOS RECURSOS NO SON SUFICIENTES DE LA RETEGARANTIA PARA EL PAGO DE SUS TRABAJADORES Y OBLIGACIONES DEJADAS EN LA OBRA DE ACUERDO A ACTIVIDADES INCONCLUSAS Y DE MALA CALIDAD O EN MAL ESTADO O QUE SE HAYAN PROYECTADO PARA PAGO EN ACTAS DE CORTE MANO DE OBRA Y NO EJECUTARON.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONSIDERACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD TANTO POR SUS TRABAJADORES, COMO POR SUS SUBCONTRATISTAS; DICHO CONSIDERACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO (**ANEXO 1**) Y SU INCUMPLIMIENTO, EN CUALQUIERA DE SUS APARTES, GENERARÁ LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ASEO. **EL CONTRATISTA** SE OBLIGA A MANTENER LA OBRA EN BUEN ESTADO DE ASEO, SEGÚN LO EXIJAN LOS REPRESENTANTES DE **EL CONTRATANTE**.SI **EL CONTRATISTA** O SUS DEPENDIENTES DAÑARA, ROMPIERA O ENSUCIARÁ ALGO DE LA EDIFICACIÓN, EL CONTRATANTE PODRÁ CONTRATAR LA REPARACIÓN O LIMPIEZA CON UN TERCERO. **EL CONTRATISTA** AUTORIZA A **EL CONTRATANTE** PARA QUE DEDUZCA DEL VALOR QUE SE LE ADEUDE, LOS COSTOS DEL TRABAJO REALIZADO POR ESTOS CONCEPTOS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: EL CONTRATANTE REALIZARA LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE **EL CONTRATISTA**, PERO ESTO NO REPRESENTA NINGUNA VINCULACION DIRECTA Y SOLIDARIA CON **EL CONTRATANTE.CLAUSULA DECIMA SEXTA-NOTIFICACIONES: EL CONTRATISTA ACEPTA COMO CANAL DE COMUNICACIÓN PARA EFECTOS CONTRACTUALES SU CORREOELECTRONICO:**_____

INVERSIONES SERVIDECON S.A.S
NIT.901.620.786

CUENTA DE COBRO No. 01
Neiva 15 de junio de 2023

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
NIT 900.410.655-8

DEBE A:

INVERSIONES SERVIDECON S.A.S

Nit. No. 9 0 1. 6 2 0.7 8 6

La suma de CIENTO VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $126.000.000, por concepto de **ANTICIPO** según contrato **CE-047 DE 2023**, cuyo objeto es **CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA EL SUMINISTRO Y EJECUCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPOALEGRE, PITALITO Y SALADOBLANCO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

GABRIEL EDUARDO RODRIGUEZ AGUILLON
C.C. 1032507854
R/L INVERSIONES SERVIDECON S.A.S

CRA 23 NO. 4C-39
Celular 313 2208983

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit. 900.410.655-8	CONTRATO DE OBRA	
Contrato Número CE-047	Concepto **CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA EL SUMINISTRO Y EJECUCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPOALEGRE,PITALITO Y SALADOBLANCO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	Fecha: 15/06/2023

CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA EL SUMINISTRO Y EJECUCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPOALEGRE,PITALITO Y SALADOBLANCO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATANTE

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. **NIT:** 900.410.655-8	**Domicile en:** CALLE 46 No. 16-24 OF. 705	**Teléfono:** 8641641

CONTRATISTA

INVERSIONES SERVIDECON SAS NIT. 9 0 1 6 2 0 7 8 6	**Domicilio en:** CR 23 4 C 39	**Teléfono:** 3 2 0 2 6 5 8 9 5 2

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 315.000.000
COSTO DIRECTO		**$271.668.822.77**
ADMINISTRACION	**5%**	**$13.583.441.14**
IMPREVISTO	**5%**	**$ 13.583.441.14**
UTILIDAD	**5%**	$13.583.441.14
IVA	**19%**	$2.580.853.82

SON: TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE.

FORMA DE PAGO	CORTES CATORCENALES
PLAZO:	CUATRO MESES
ANTICIPO:	CIENTO VEINTISEIS MILLONES PESOS M/CTE
FECHA DE INICIACION:	15/06/2023
FECHA DE TERMINACION:	14/10/2023

FECHA Y LUGAR EN QUE SE FIRMA EL CONTRATO:	NEIVA, 15/06/2023

ENTRE LOS SUSCRITOS A SABER **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL**, MAYOR DE EDAD Y VECINO DE NEIVA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 12.193.284 EXPEDIDA EN GARZON - HUILA , OBRANDO EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. NIT: **900.410.655-8**, QUIE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ **EL CONTRATANTE**, POR UNA PARTE, **GABIREL EDUARDO RODRIGUEZ AGUILLON**, MAYOR DE EDAD Y VECINO DE NEIVA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1032507854
