Nombre del Contratista: HENRY PUENTES DUSSAN **Cédula: 12.111.266**	**VALOR INICIAL:** $315.929.750,oó **ADICIONAL No.1:** $ 25.604.416,25 **VALOR TOTAL:** $341.534.166,25
Certificado de Disponibilidad No. 2639-2982 **Reserva Nro. 11.** **Registro presupuestal: 3342** **Forma de Pago:** El MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: La Entidad cancelará la ejecución del contrato, mediante acta(s) de recibo parcial, recibidas, aprobadas y certificadas por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance hasta el 90%, y el restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y/o supervisor. Los valores facturados deben ser conforme a las tarifas establecidas en el presente estudio, y sin superar el valor total del presupuesto estimado.	**Periodo de Ejecución: 20 –06 -2019 al 11-07-2019**

Objeto: ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN, PISOS, PINTURA, CUBIERTAS, CIELO RASOS Y VARIOS.

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 19 de diciembre de 2018
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: 29 de noviembre de 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN: Once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019)
Registro Banco de Proyectos: 2016410010093 -2018410010022

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios


En este informe se presenta las actividades ejecutadas que faltaban para culminar el alcance físico del proyecto.

Inicialmente es necesario dejar constancia que durante los meses de diciembre de 2018 a febrero de 2019, no se ejecutó obra debido a la socialización y posterior suspensión del contrato de obra 1368-2018, y por ende no hubo personal laborando.

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 20 de junio de 2019 al 11 de julio de 2019 se ejecutaron las siguientes actividades:


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

1.2 Desmonte de puertas con marco, ventanas rejas, medidas convencionales. Cantidad 4 unidades. Se realiza el desmonte de las puertas faltantes para reparar 2 unidades, se retiran las puertas de baños de cocinas y la puerta del aula de informática.

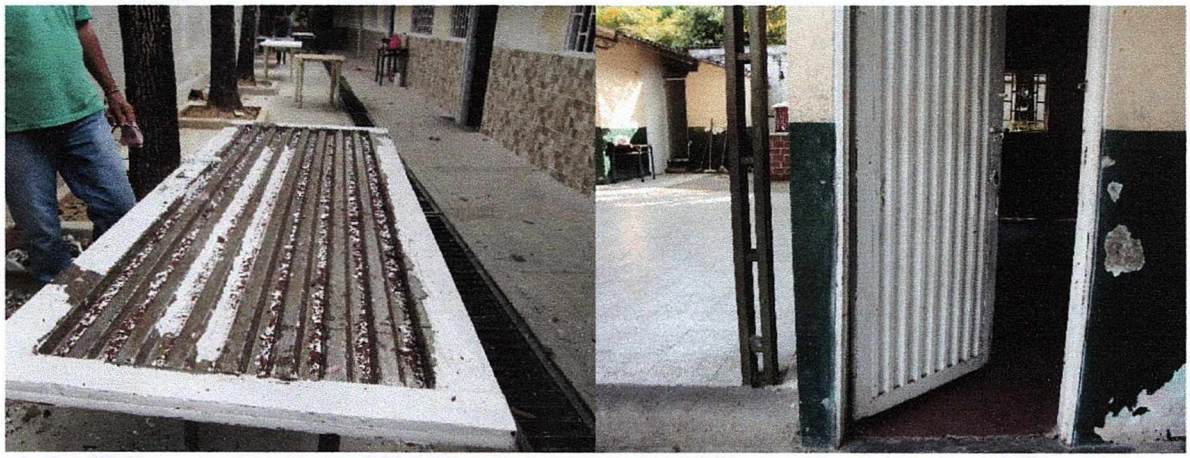

1.5 Demolición de pisos existentes sin alistado, baldosín, gres, enchape, incluye retiro, se realiza la rotura y demolición de pisos de salones de 1 piso quedando pendiente 2 piso.



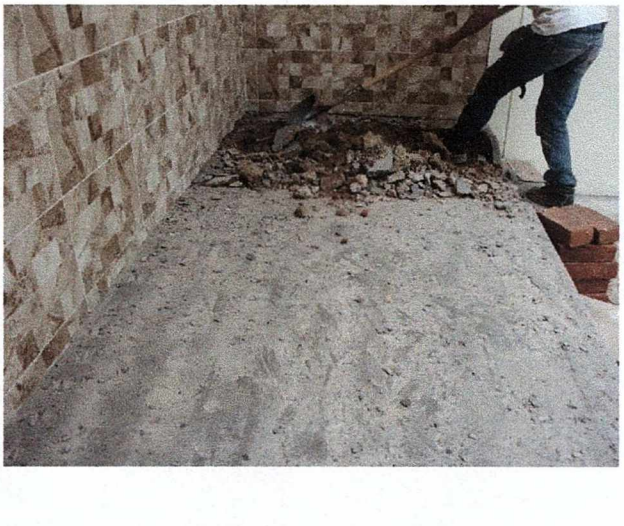


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

6.2 - suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 según diseño. Incluye m.o. construcción bajante, pintura base.





7.11 Suministro y construcción de alistado con mortero 1:4 para el piso e= .04, se realiza el alistado de instalación de pisos de salones.

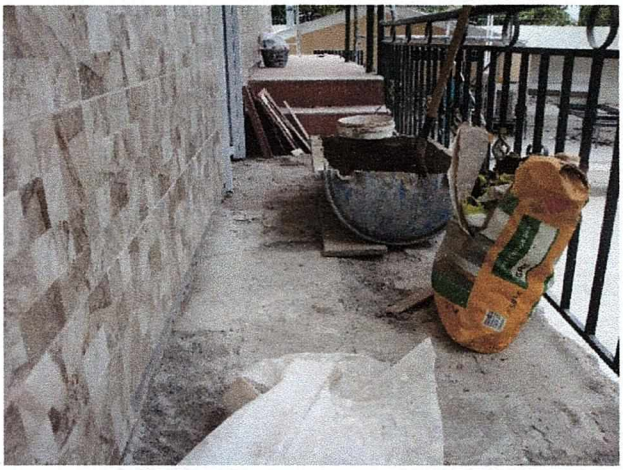



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

7.12 Placa de contrapiso e = 0.08 concreto 2500 PSI. para anden exterior. Se interviene el anden exterior en el portón de entrada.






8.3 Suministro e instalación de cerámica pared cocina y baño de 32,3x56 cm color arena. incluye bosel y fragüe.







La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva


9.1 Suministro e instalación de llave de paso para control de 1/2" incluye accesorios y tapa pvc.

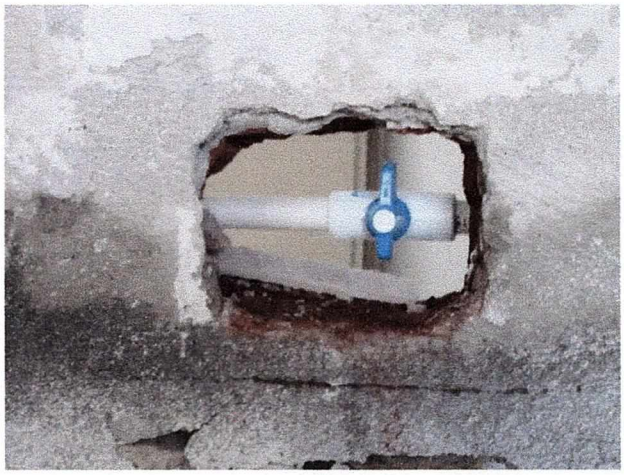

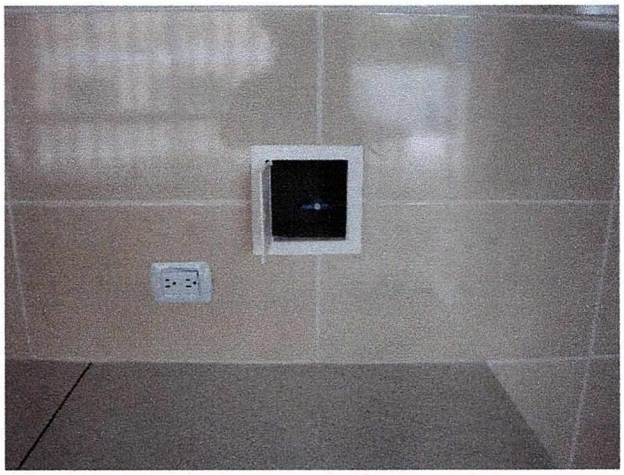

9.2 Suministro e instalación de llave terminal de 1/2" incluye accesorios.

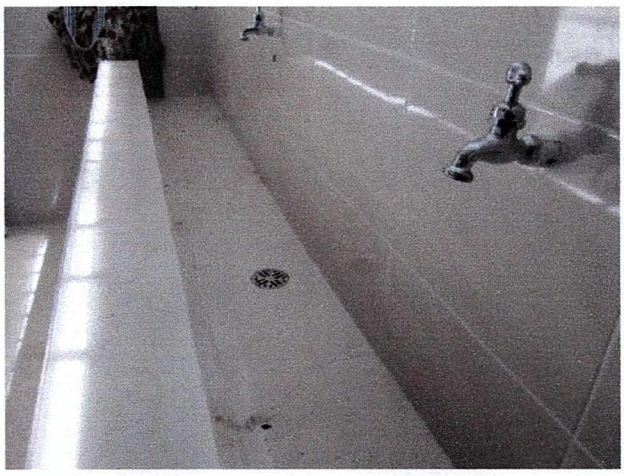

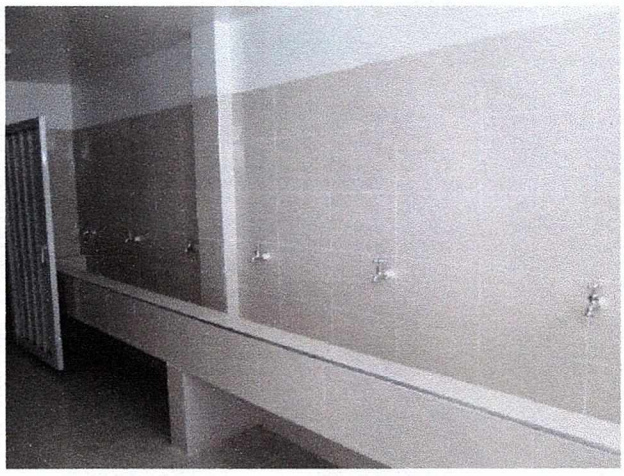


10.6 Punto eléctrico 110V con Lámpara Led de 18W8". Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT de 1/2" y accesorios





10.16 Suministro e instalación de acometida 2No8+1No.8 Cu AWG HFFR. Incluye accesorios.



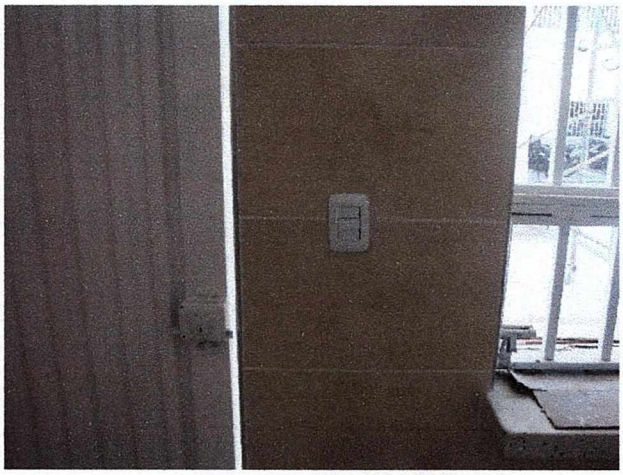

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

12.10 Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros interiores y cielo rasos incluye Resane Masilla acrílica.





13.3 - Suministro e instalación de Lavaplatos línea económica en acero inoxidable. Incluye grifería y accesorios.





13.5 - Suministro e instalación de Rejilla con sosco en aluminio de 5"x4" para desagüe piso en 3" pvc.






2

16.10 - Placa de piso e = 0.10 concreto 2500 PSI. con fibra de Nylon(600grs/m3). para patios. Se avanza en la construcción de placas de piso de patios de la quedando faltando un tramo en el patio de entrada.




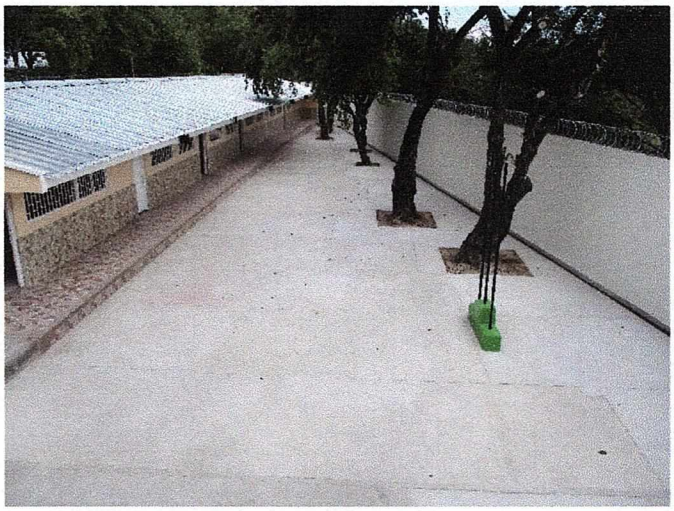


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

16.15 Construcción de lavatraperos de 0,80 m x 0,40. Incluye enchape de piso y pared, boceles, boquilla y rejilla de piso.



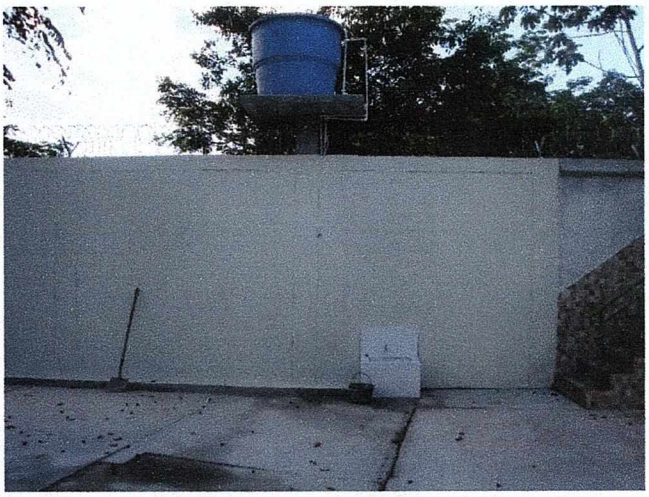

16.16 - Construcción de canal rectangular recolector de aguas superficiales de patio secundario en concreto de 3.000 psi. A = 0,30 m, h = 0,40 m, espesor de paredes = 0,10 m, espesor de fondo = 0,10 m

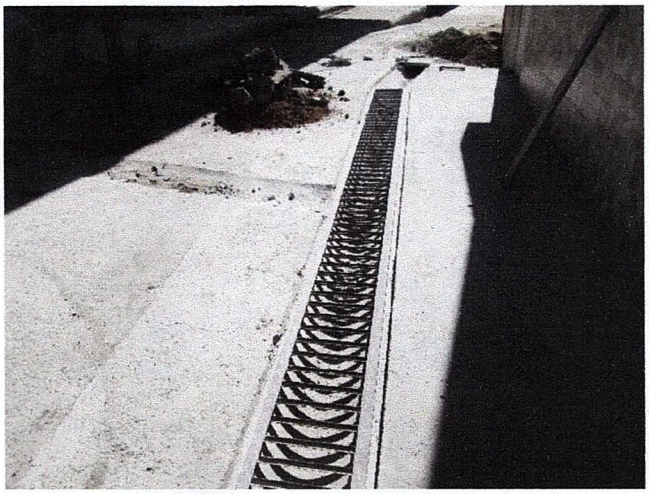



16.37 Suministro e instalación de cerámica piso y pared color a escoger. Incluye boquilla. Los pisos de los salones fueron cambiados con excepción del salón de Quinto por encontrarse en buen estado.





16.40 - Desmonte e instalación de estufa de cocina. Incluye revisión y reparación.






La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

16.41 - Desmonte e instalación de cocineta de sala de profesores. Incluye poceta de lavaplatos y mueble.






16.44 - Arreglo de armarios organizadores de salones. Incluye arreglo de puertas con bisagras y hojales para candado, estuco pintura.

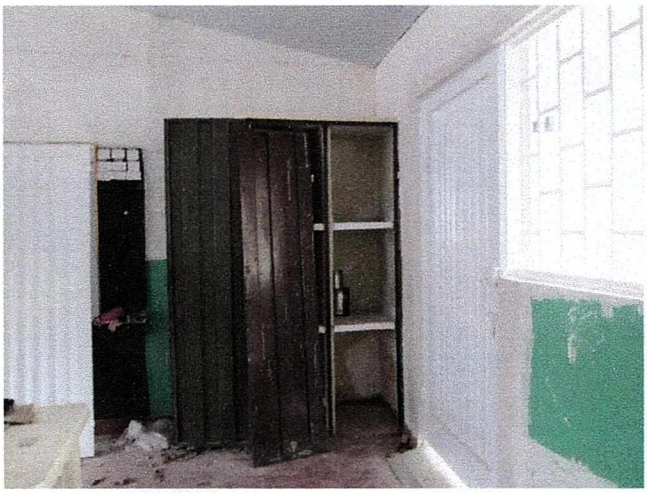




La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

16.45 - Arreglo de armario organizador en salón de Preescolar. Incluye suministro e instalación de puerta metálica nueva con bisagras y hojales para candado, estuco y pintura y poyo.

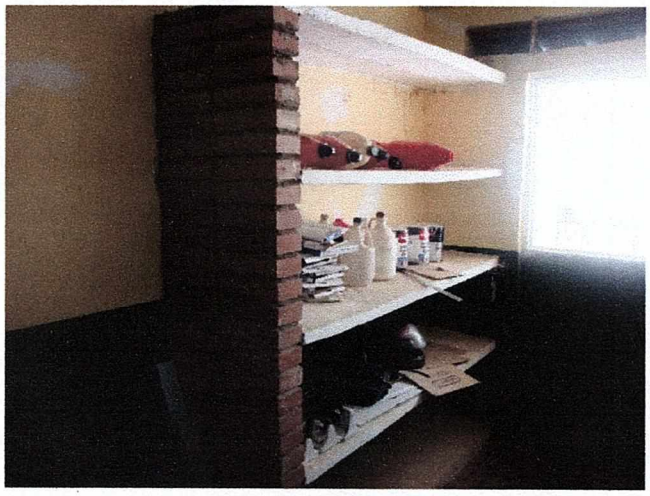

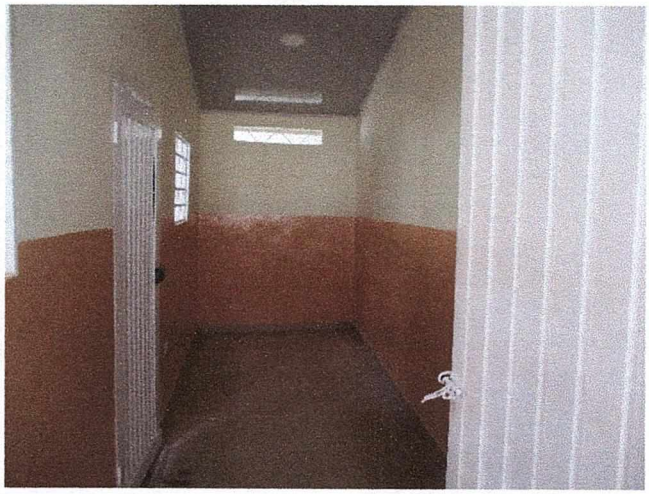

16.47 Suministro y construcción de red en tubería PVC presion de 1" Incluye accesorios incluye regata.





La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

16.49 - Suministro e instalación de sanitarios infantiles.






16.50 - Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer en la batería de Kinder. Incluye grifería, desagüe, mesón completo enchapado y boceles.






La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

16.51 - Instalación de pisos en cerámica. mortero de pega y fraguado.

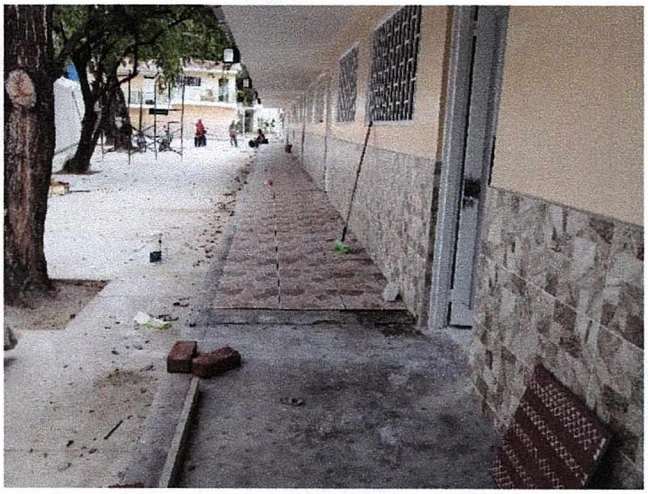

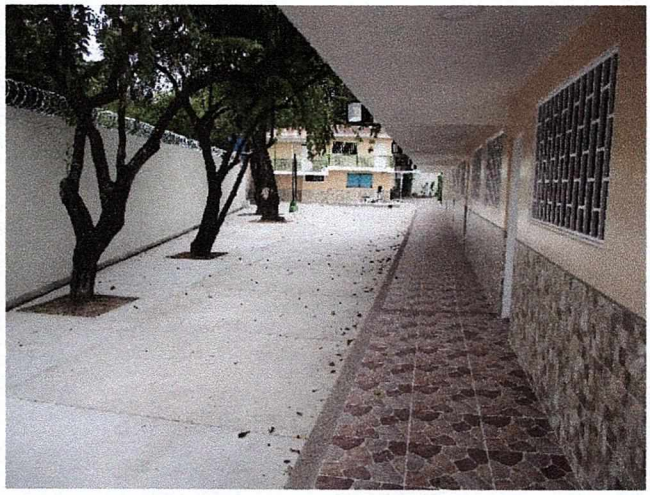

16.52 - Adecuación de muros de matera. Incluye limpieza, reconstrucción parcial y pintura





La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

16.53 - Adecuación de lavamanos corrido de patio principal. Incluye enchape y boceles.





16.55 - Demolición de la Gruta de la Virgen y construcción e sitio nuevo. Incluye ladrillo tolete pañetado y acabado enchape igual al de zócalos.





La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

16.57 - Suministro e instalación de lámpara Led de 18W8" de sobreponer. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR y accesorios.



2,5




16.58 - Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo 1 exterior certificada NTC tres manos. Incluye resane, macilla acrílica.







16.59 - Suministro de guardaescoba altura 10 cm, incluye fragüe.



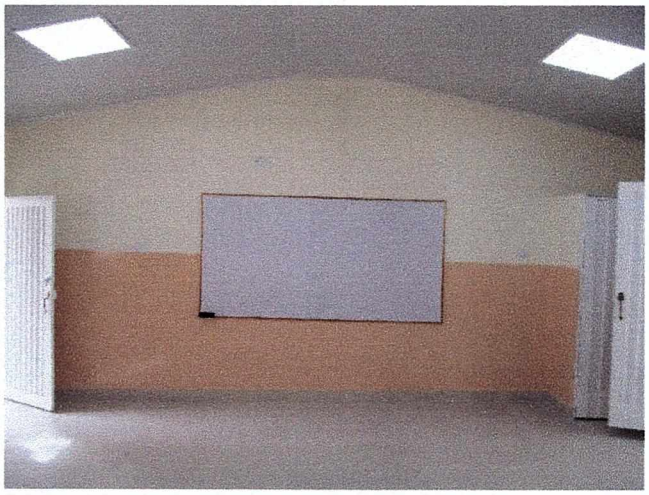

16.60 - Suministro y aplicación de estuco sobre muros. Incluye resanes y pañetes.

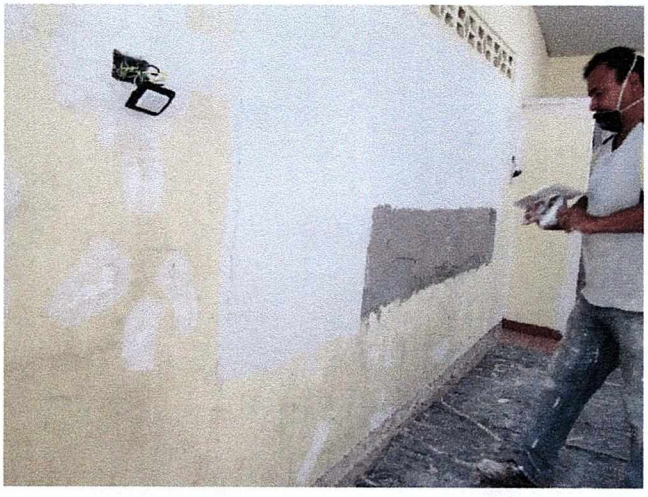

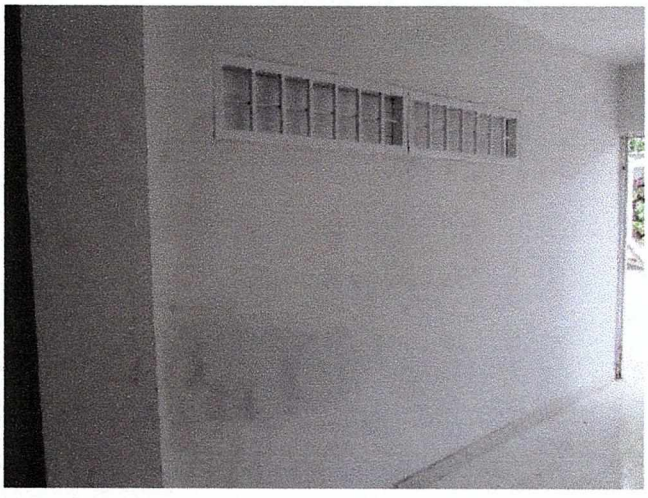

TIPO DE ACTA	No	FECHA
ACTA DE INICIO No. 1	1	19-12-2018
ACTA DE SUSPENSION No.1	2	03-01-2019
ACTA DE REINICIO No.1	3	28-02-2019
OTRO SI No.1 MODIFICATORIO DE CANTIDADES	4	02-04-2019
ACTA PARCIAL No. 1	5	11-04-2019
ACTA PARCIAL No.2	6	14-05-2019
OTRO SI No.2 ADICIONAL TIEMPO	7	06-06-2019
OTROSI No.3 ADICIONAL DINERO	8	12-06-2019
ACTA PARCIAL No.3	9	19-06-2019
ACTA N° 4 - FINAL	10	11-07-2019

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento a la Cláusula Sexta: Valor y Forma de Pago – El MUNICIPIO cancelará AL CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: La Entidad cancelará la ejecución del contrato, mediante acta(s) de recibo parcial, recibidas, aprobadas y certificadas por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance hasta el 90%, y el restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y/o supervisor. Los valores facturados deben ser conforme a las tarifas establecidas en el presente estudio, y sin superar el valor total del presupuesto estimado.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 333081	11-05-2019	$118.219.259,69	$118.219.259,69	$197.710.490,31
COMPROBANTE DE EGRESO No. 334055	29-05-2019	$82.855.414,24	$201.074.673,93	$114.855.076,07

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

COMPROBANTE DE EGRESO No. 337688	10-07-2019	$106.052.642,14	$307.127.316,07	$34.406.850,18
COMPROBANTE DE EGRESO No. Pendiente	Pendiente	$ 34.406.850,18	$341.534.166,25	$0,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$315.929.750°°	$25.604.416,25	$341.534.166,25	$341.534.166,25	$0,00

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

CONTROL DE PÓLIZAS

POLIZAS SEGUN CONTRATO:

A continuación, se presenta la póliza de seguro de cumplimiento que ampara al Contrato de obra 1368 de 2018, expedida por la Aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A.., la cual fue realizada según el Contrato 1368-2018, con fecha 27 de noviembre de 2019 y aprobada por el Municipio de Neiva el 29 de noviembre de 2019.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 047 BO 2991107	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 63.185.950	27/11/2018	30/01/2020
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 63.185.950	27/11/2018	27/11/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 63.185.950	27/11/2018	30/07/2022
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 047 LB 704757	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL	**HASTA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$156.248.400	27/11/2018	30/01/2020

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

POLIZAS SEGUN INICIO CONTRATO:

A continuación, se presenta la póliza de seguro de cumplimiento que ampara al Contrato de obra 1368 de 2018, expedida por la Aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A.., la cual fue ampliada según el Inicio con fecha 19 de diciembre de 2019 y aprobada por el Municipio de Neiva.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 047 BO 2991107	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 63.185.950	19/12/2018	21/02/2020
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 63.185.950	19/12/2018	19/12/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 63.185.950	19/12/2018	21/08/2022
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 047 LB 704757	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL	**HASTA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$165.623.200	19/12/2018	21/02/2020

SEGUN REINICIO No.1.

A continuación, se presenta la póliza de seguro de cumplimiento que ampara al Contrato de obra 1368 de 2018, expedida por la Aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A.., la cual fue ampliada según el Reinicio No.1 con fecha 28 de febrero de 2019 y aprobada por el Municipio de Neiva el 3 de marzo de 2019.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 047 BO 2991107	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 63.185.950	19/12/2018	21/04/2020
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 63.185.950	19/12/2018	19/12/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 63.185.950	19/12/2018	21/10/2022

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 047 LB 704757	VR. ASEGURADO	VIGENCIA	
		DEL	HASTA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$165.623.200	19/12/2018	21/02/2020

SEGUN OTROSI No.2 ADICIONAL TIEMPO

A continuación se presenta la póliza de seguro de cumplimiento que ampara al Contrato de obra 1368 de 2018, expedida por la Aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A.., la cual fue ampliada según el OTROSI No.2 con fecha 07 de junio de 2019 y aprobada por el Municipio de Neiva el 07 de junio de 2019.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 047 BO 2991107	VR. ASEGURADO	VIGENCIA	
		DEL	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 63.185.950	19/12/2018	21/05/2020
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 63.185.950	19/12/2018	19/12/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 63.185.950	19/12/2018	21/11/2022
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 047 LB 704757	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL	**HASTA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$165.623.200	19/12/2018	21/05/2020

SEGUN OTROSI No.3 ADICIONAL DINERO

A continuación se presenta la póliza de seguro de cumplimiento que ampara al Contrato de obra 1368 de 2018, expedida por la Aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A.., la cual fue ampliada según el OTROSI No.3 con fecha 14 de junio de 2019 y aprobada por el Municipio de Neiva el 17 de junio de 2019.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 047 BO 2991107	VR. ASEGURADO	VIGENCIA	
		DEL	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 68.306.834	19/12/2018	21/05/2020
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 68.306.834	19/12/2018	19/12/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 68.306.834	19/12/2018	21/11/2022
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 047 LB 704757	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL	**HASTA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$165.623.200	19/12/2018	21/05/2020

PÓLIZA FINAL DEL CONTRATO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 047 BO 2991107	VR. ASEGURADO	VIGENCIA	
		DEL	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 68.306.834	19/12/2018	21/05/2020
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 68.306.834	11/07/2019	10/07/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 68.306.834	19/12/2018	21/11/2022

- ✓ En cumplimiento de la cláusula octava del contrato, se verifica la no exigencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista.
- ✓ Cláusula Décima Séptima - Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibos de Tesorería Municipal números 2018902000003318-2019925000000084 - 2019820000000043 - 2019902000001904

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

✓ En cumplimiento de la Cláusula Décima Primera - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de junio /2019, según planillas Nro. 8494617301 - 8494504179 – 8494502009 - 8494167902 del mes de julio /2019 8495355607 - 8495641583 - 8495289371- 8495355617 discriminados así:

Planilla Nro. Residente 8494502009		
APORTES	**PERÍODO DE PAGO**	**VALOR**
SALUD	JUNIO-2019	$208.300
PENSIÓN	JUNIO-2019	$266.600
RIESGOS PROFESIONALES	JUNIO-2019	$0.00
	TOTAL	$474.900°°

Planilla Nro. 8494617301 **PERSONAL**		
APORTES	**PERÍODO DE PAGO**	VALOR
SALUD	JUNIO-2019	$253.000
PENSIÓN	JUNIO-2019	$323.400
RIESGOS PROFESIONALES	JUNIO-2019	$141.000
ICBF	JUNIO-2019	$61.000
SENA	JUNIO-2019	$40.800
CONFAMILIAR	JUNIO-2019	$81.400
	TOTAL	$900.700°°

Planilla Director Nro.8494504179		
APORTES	**PERÍODO DE PAGO**	**VALOR**
SALUD	JUNIO-2019	$207.200
PENSIÓN	JUNIO-2019	$265.200
RIESGOS PROFESIONALES	JUNIO-2019	$0.00
	TOTAL	$472.400°°

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Planilla Nro. 8494167902		
APORTES	**PERÍODO DE PAGO**	**VALOR**
SALUD	JUNIO-2019	$103.600
PENSIÓN	JUNIO-2019	$132.500
RIESGOS PROFESIONALES	JUNIO-2019	$4.400
	TOTAL	$240.500°°

Planilla Nro. Residente 8495289371		
APORTES	**PERÍODO DE PAGO**	**VALOR**
SALUD	JULIO-2019	$207.200
PENSIÓN	JULIO-2019	$265.200
RIESGOS PROFESIONALES	JULIO-2019	$0.00
	TOTAL	$472.400°°

Planilla Nro. 8495355607 **PERSONAL**		
APORTES	**PERÍODO DE PAGO**	VALOR
SALUD	JULIO-2019	$83.400
PENSIÓN	JULIO-2019	$106.400
RIESGOS PROFESIONALES	JULIO-2019	$46.400
ICBF	JULIO-2019	$20.100
SENA	JULIO-2019	$13.500
CONFAMILIAR	JULIO-2019	$26.700
	TOTAL	$296.500°°

Planilla Director Nro. 8495641583		
APORTES	**PERÍODO DE PAGO**	**VALOR**
SALUD	JULIO-2019	$207.200
PENSIÓN	JULIO-2019	$265.200
RIESGOS PROFESIONALES	JULIO-2019	$0.00
	TOTAL	$472.400°°

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Planilla Nro. 8495355617		
APORTES	**PERÍODO DE PAGO**	**VALOR**
SALUD	JULIO-2019	$103.600
PENSIÓN	JULIO-2019	$132.500
RIESGOS PROFESIONALES	JULIO-2019	$4.400
	TOTAL	$240.500°°

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor y el ingeniero de apoyo a la supervisión del contrato 1368-2018, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, por lo tanto, se autoriza el **PAGO DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No 4** del contrato:

C.D.P	RESERVA	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2639 y 2982	**11**	1109	$ 34.406.850,18
Valor a Pagar.			$ 34.406.850,18

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago del ACTA DE **RECIBO FINAL No 4** del contrato 1368 de 2018.

Informe presentado en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2019.

ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Servidor Público
Secretario de Educación Municipal
Supervisor

Luz Adriana Gordillo P.
LUZ ADRIANA GORDILLO PERDOMO
Ingeniera de Apoyo Contrato 1368-2018

Juan Castillo
Revisó Texto Jurídico:
Juan Castillo Ortiz
Abogado Contratista SEM

ELKIN TRUJILLO ROA
Asesor Infraestructura

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva
