ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado N° I-2023-85624
Fecha: 28-07-2023 - 12:40
Folios: 1 Anexos:
Radicador: LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 07ZHA

Bogotá D.C. julio 28 de 2023

MEMORANDO

PARA: **MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS**
Líder área Administrativa y financiera DCCEE

DE: **Arq. LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES**
Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría 4146310 -22
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

ASUNTO: Se remite para revisión y trámite acta parcial No. 7 Contrato de obra 4077646-22 Contratista Consorcio Constructor 2022.

Respetada Ingeniera María Ayde,

Buen día, para su revisión y trámite respectivo, adjunto los siguientes documentos para el trámite del acta parcial No. 7 del contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077646-2022, suscrito con el Contratista Consorcio Constructor 2022.

1. Oficio de solicitud de aprobación del acta interventoría.
2. Acta parcial 7 en Excel
3. Memorias de Calculo.
4. Aportes parafiscales
5. FURC
6. RUT
7. Pre Factura
8. Resolución DIAN
9. Certificación Bancaria.
10. Acta de autorización de pagos No. 7 por interventoría

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente;

Arq. LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES
Apoyo a la supervisión contrato de interventoría 4146310-22
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito

.Proyectó: Luis Enrique Campos Torres – Apoyo a la Supervisión interventoría

CONSORCIO INTERCEL

Bogotá D.C, julio 28 de 2023

CITC-SED-297-2023

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: Arq. Carlos Rolando Arias T.
Supervisor General
rarias@educacionbogota.gov.co
Atn: Arq. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
lecampos@educacionbogota.gov.co Ciudad.

Ref: CO1.PCCNTR.4146310 cuyo objeto es INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA - GRUPO 10.

Asunto: Entrega de Acta Parcial No. 07 Contrato de Obra 4077646/2022

Por medio de la presente, se remite acta parcial No. 07 contrato 4077646/2022 correspondiente al periodo del 03/07/2023 hasta el 02/08/2023 la cual fue revisada y aprobada por la interventoría, con la siguiente documentación anexa:

1. Carta Remisoria
2. Acta Parcial No. 7 (PDF y editable)
3. Carta para autorizar el pago PDF
4. Memorias de cantidades por frente PDF
5. FURC
6. Pre Factura y Resolución de facturación DIAN
7. Certificación Bancaria
8. Soportes parafiscales
9. RUT y RIT actualizados

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGUIZAMO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCEL

Proyecto: Arq. Myriam González

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:						
RECIBIDO POR:						
Hora		Fecha				Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?		No.	4077646	Fecha:	19	10	2022
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022			NIT	X	C.C.		No.	901.639.619-8
Dirección :	CLL. 93 BIS No.19- 50 OF.105			Teléfonos	601-2572405				
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el aporte			NIT No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco				

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	8	8	0	8	3	8	6	7	7							Banco	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4330
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial	
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar			
Beneficiario								NIT		C.C.		No.	
Cuenta Bancaria							Banco			Ahorros		Corriente	

DATOS DILIGENCIADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso. NOTA 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de pago. NOTA 2º: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios.

Fecha Acta de Inicio	3	1	2023	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición				
Valor compromiso inicial	$ 11.419.923.186,00			Valor adición(es)											Valor total compromiso	$ 11.419.923.186,00			

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	7	Periodo a pagar	De	Fecha	3	7	2023	A:	Fecha	2	8	2023			
Recibo a Satisfacción No	4077646/7	→	Fecha	2	8	2023	Anticipo		% Anticipo		→	Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4847-22	07	O230116011300000 0763802001	18				$ 486.261.713			$ 486.261.713
TOTAL							$ 486.261.713			$ 486.261.713
Valor en Letras	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/L							Total a Pagar		$ 486.261.713,00

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA					Firma del Directivo responsable del Area fincional	
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.						
Elaborado por:	FELIPE ANDRES LEON HERNANDEZ				Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEED						
Fecha elaboración	16	8	2023	Ext:	3142	Fecha aprobación	16 08 2023

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADO POR TESORERIA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

OK AFC

CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

Oficina Principal
CALLE 93 BIS 19-50 OFICINA 105
BOGOTÁ D.C.
TEL:3196088434

NIT: 901639619-0
contabilidad.picar@gmail.com

Razon Social: **SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**
NIT/CC: **899999061-9**
Contacto: LUIS CAMPOS
Direccion: AV EL DORADO 66-63
Ciudad: BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
Telefono: 601324100000 -
Email: lecampos@educacionbogota.gov.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Factura electrónica de venta #18
Fecha Generación: 16/08/2023 10:36
Fecha Vencimiento: 16/08/2023
Forma de Pago: **CONTADO**
Vendido Por: ALVARO

Lista	*Descuento*	*Precio*	*Iva*	*Total U.*	*Cant.*	*Total*
→ 000006 - **CONTRATO 4077646-2022 ACTA PARCIAL N° 7 PERIODO DESDE EL 03/07/2023 HASTA 02/08/2023**						
$377,796,374.50	$0.00	$377,796,374.50	$0.00	$377,796,374.50	1	**$377,796,374.50**
→ 000002 - **A.I.U**						
$108,465,339.12	$0.00	$108,465,339.12	$0.00	$108,465,339.12	1	**$108,465,339.12**

SUBTOTAL	$486,261,713.62
TOTAL	**$486,261,713.62**
DESCUENTO FINANCIERO	**$0.62**
TOTAL A PAGAR	**$486,261,713.00**

Notas

- CONTRATO COPCCNTR 4077646 ACTA PARCIAL N° 7 PERIODO DESDE EL 03/07/23 HASTA 02/08/23 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAM A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PROORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764043314242 valida desde 2023-01-26 hasta 2024-01-26 rangos del 1 al 50 prefijo - responsable del impuesto sobre las ventas. Esta factura de venta se asimila en sus afectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio y causa interés de mora a la máxima tasa permitida por la ley

Total articulos en factura **2**

CUFE: ec9d1289a6ecaafc47e28da06eba1f916328e75e2293c1e4db7a43dfbe6d2fd65d09105bdc917684d2980b2f4ed72a8c

Fecha Generación: 2023-08-16 10:36:43

Fecha Expedición Electronica: 2023-08-16 10:41:00

Email Enviado el: 2023-08-16 10:43:34

Email Recibido el: 2023-08-16 10:48:01

PAGADO	$0
SALDO	$486,261,713

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 07

CONTRATO DE OBRA No. 4077646 / 22

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATISTA :	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	**OBJETO:**	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10		
DIRECCION :	CALLE 93 BIS No. 19-50 OFICINA 105				
C.C. ó NIT :	901639619-8	**ESTABLECIMIENTOS :**	920-844-832-904-914	**PLAZO INICIAL :**	11 MESES
TELEFONO :	257 2405	**LOCALIZACION :**	KENNEDY Y FONTIBON	**FECHA INICIACION :**	3 de enero de 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCEL	**VR. INICIAL :**	$ 11.419.923.186,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL :**	2 de diciembre de 2023
DIRECCION :	Av. 15 # 124-29 Oficina 601	**ANTICIPO :**		**PLAZO ADICIONAL(MODF.CONT) :**	
C.C. ó NIT :	901649204-0	**VR. ADICIONAL :**		**TIEMPO SUSPENDIDO :**	
TELEFONO :	466 0395	**VR. FINAL :**	$ 11.419.923.186,00	**PLAZO TOTAL :**	11 MESES
				FECHA FINAL :	2 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	8-jun-22	4847	20-oct-22	$ 11.419.923.186,00	$ 9.858.033.387,00	$ 486.261.713,00	$ 9.371.771.674,00
TOTAL				$ 11.419.923.186,00	$ 9.858.033.387,00	$ 486.261.713,00	$ 9.371.771.674,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 486.261.713,00 SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS MCTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	020 - VAN UDEN - SEDE CESAR VICENTE				
1.1.1	REPLANTEO	M2	20,99	$ 3.206,00	$ 67.293,94
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	56,30	$ 35.390,00	$ 1.992.457,00
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	37,59	$ 41.474,00	$ 1.559.007,66
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,41	$ 20.982,00	$ 491.188,62
1.2.15	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,09	$ 24.665,00	$ 569.514,85
1.2.18	DEMOLICION DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,17	$ 14.022,00	$ 745.549,74
1.2.20	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35,73	$ 8.871,00	$ 316.960,83
1.2.23	DEMOLICION DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POTOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 13.937,00	$ 13.937,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METALICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,91	$ 26.218,00	$ 181.166,38
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METALICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,17	$ 13.937,00	$ 44.110,61
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00	$ 14.814,00	$ 118.512,00
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2", (INCLUYE EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10,05	$ 16.801,00	$ 168.850,05
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA. LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O RESCATE A METÁLICA	M2	43,05	$ 29.067,00	$ 1.251.334,35
1.3.5	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACION DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2		$ 68.944,00	$ -
1.3.7	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES, INCLUYE RUNDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO	UN		$ 90.977,00	$ -
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PLOMERIA DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,30	$ 13.299,00	$ 43.886,70
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,40	$ 10.569,00	$ 67.641,60
1.4.7	PASAMANO CANDELETA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M	M3	12,20	$ 22.906,00	$ 279.453,20
2.1.3	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,26	$ 103.549,00	$ 130.471,74
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	2,34	$ 95.471,00	$ 223.402,14
2.2.20	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.12 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO)	M2		$ 124.084,00	$ -
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	23,37	$ 106.558,00	$ 2.490.260,46
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	45,57	$ 8.667,00	$ 394.958,66
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	12,28	$ 44.538,00	$ 546.926,64
3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2,57	$ 115.494,00	$ 296.819,58
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	19,50	$ 68.451,00	$ 1.334.794,50
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	4,00	$ 63.365,00	$ 253.460,00
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	11,80	$ 36.887,00	$ 435.266,60
4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 61.744,00	$ -
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	UN	3,00	$ 69.240,00	$ 207.720,00
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	27,60	$ 14.577,00	$ 402.325,20
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8,00	$ 45.351,00	$ 362.808,00
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8,00	$ 45.351,00	$ 362.808,00
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	8,00	$ 138.022,00	$ 1.104.176,00
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	8,00	$ 71.750,00	$ 574.000,00
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	1,00	$ 47.536,00	$ 47.536,00
4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	$ 511.487,00	$ 511.487,00
4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	$ 701.191,00	$ 701.191,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	$ 15.656.094,27		$ 81.993.578,76		$ 97.649.673,03	
		20,99	$ 67.293,94	20,99	$ 67.293,94	100,0%
		56,30	$ 1.992.457,00	56,30	$ 1.992.457,00	100,0%
		37,59	$ 1.559.007,66	37,59	$ 1.559.007,66	100,0%
		23,41	$ 491.188,62	23,41	$ 491.188,62	100,0%
		23,09	$ 569.514,85	23,09	$ 569.514,85	100,0%
		53,17	$ 745.549,74	53,17	$ 745.549,74	100,0%
		35,73	$ 316.960,83	35,73	$ 316.960,83	100,0%
		1,00	$ 13.937,00	1,00	$ 13.937,00	100,0%
		6,91	$ 181.166,38	6,91	$ 181.166,38	100,0%
		3,17	$ 44.180,29	3,17	$ 44.180,29	100,2%
		8,00	$ 118.512,00	8,00	$ 118.512,00	100,0%
		10,05	$ 168.850,05	10,05	$ 168.850,05	100,0%
		43,05	$ 1.251.334,35	43,05	$ 1.251.334,35	100,0%
1,25	$ 86.180,00			1,25	$ 86.180,00	
2,00	$ 181.954,00			2,00	$ 181.954,00	
2,00	$ 26.598,00			2,00	$ 26.598,00	
		6,40	$ 67.641,60	6,40	$ 67.641,60	
		12,02	$ 275.330,12	12,02	$ 275.330,12	
		1,26	$ 130.471,74	1,26	$ 130.471,74	
		2,34	$ 223.402,14	2,34	$ 223.402,14	
0,30	$ 37.225,20			0,30	$ 37.225,20	
		23,37	$ 2.490.260,46	23,37	$ 2.490.260,46	
		45,57	$ 394.955,19	45,57	$ 394.955,19	
		12,28	$ 546.926,64	12,28	$ 546.926,64	
		2,57	$ 296.819,58	2,57	$ 296.819,58	
		19,50	$ 1.334.794,50	19,50	$ 1.334.794,50	100,0%
		4,00	$ 253.460,00	4,00	$ 253.460,00	100,0%
		11,80	$ 435.266,60	11,80	$ 435.266,60	100,0%
4,03	$ 248.828,32			4,03	$ 248.828,32	
		3,00	$ 207.720,00	3,00	$ 207.720,00	100,0%
		27,60	$ 402.325,20	27,60	$ 402.325,20	100,0%
		8,00	$ 362.808,00	8,00	$ 362.808,00	100,0%
		8,00	$ 362.808,00	8,00	$ 362.808,00	100,0%
		8,00	$ 1.104.176,00	8,00	$ 1.104.176,00	100,0%
		8,00	$ 574.000,00	8,00	$ 574.000,00	100,0%
		1,00	$ 47.536,00	1,00	$ 47.536,00	100,0%
		1,00	$ 511.487,00	1,00	$ 511.487,00	100,0%
		1,00	$ 701.191,00	1,00	$ 701.191,00	100,0%

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	CDI MARSELLA - ATENCION EMERGENCIA BAÑOS						$ 769.023,22		$ 6.560.965,61		$ 7.329.988,83	
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00		239,87	$ 769.023,22			239,87	$ 769.023,22	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.390,00				9,25	$ 327.357,50	9,25	$ 327.357,50	
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.613,00				4,00	$ 142.452,00	4,00	$ 142.452,00	
1.2.14	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.510,00				4,00	$ 122.040,00	4,00	$ 122.040,00	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.650,00				1,00	$ 22.650,00	1,00	$ 22.650,00	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.299,00				13,20	$ 175.546,80	13,20	$ 175.546,80	
2.1.3	EXCAVACION MANUAL EN RELLENO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 103.549,00				2,00	$ 207.098,00	2,00	$ 207.098,00	
2.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		$ 47.146,00				5,00	$ 235.730,00	5,00	$ 235.730,00	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 95.471,00				2,00	$ 190.942,00	2,00	$ 190.942,00	
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 122.753,00				4,00	$ 491.012,00	4,00	$ 491.012,00	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.912,00				30,69	$ 242.819,28	30,69	$ 242.819,28	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UN		$ 18.981,00				8,00	$ 151.848,00	8,00	$ 151.848,00	
4.8.2	CAJA DE INSPECCION 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO <= 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UN		$ 729.577,00				1,00	$ 729.577,00	1,00	$ 729.577,00	
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 144.542,00				2,00	$ 289.084,00	2,00	$ 289.084,00	
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 3.798,00				59,00	$ 224.082,00	59,00	$ 224.082,00	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2		$ 43.798,00				4,00	$ 175.192,00	4,00	$ 175.192,00	
7.1.8	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M		$ 55.956,00				1,00	$ 55.956,00	1,00	$ 55.956,00	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2		$ 150.616,00				4,00	$ 602.464,00	4,00	$ 602.464,00	
11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 24.861,00				4,00	$ 99.444,00	4,00	$ 99.444,00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.669,00				239,87	$ 1.839.563,03	239,87	$ 1.839.563,03	
20.1.5	PROTECCION PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTON CORRUGADO, PLASTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION)	M2		$ 6.018,00				6,00	$ 36.108,00	6,00	$ 36.108,00	
	CDI NUEVA CASTILLA - ATENCION EMERGENCIA INUNDACION DE CUARTO DE MAQUINA						$ -		$ 1.797.294,00		$ 1.797.294,00	
1.4.8	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 1.797.294,00				1,00	$ 1.797.294,00	1,00	$ 1.797.294,00	
	CDI DURAN DUSSAN - COCINA						$ 66.776.126,79		$ -		$ 66.776.126,79	
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00		150,00	$ 480.900,00			150,00	$ 480.900,00	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.390,00		25,00	$ 884.750,00			25,00	$ 884.750,00	
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20.982,00		135,12	$ 2.835.087,84			135,12	$ 2.835.087,84	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.299,00		57,40	$ 763.362,60			57,40	$ 763.362,60	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 36.887,00		4,00	$ 147.548,00			4,00	$ 147.548,00	
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 69.240,00		4,00	$ 276.960,00			4,00	$ 276.960,00	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M		$ 17.424,00		152,94	$ 2.664.826,56			152,94	$ 2.664.826,56	
7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO	M2		$ 181.051,00		135,12	$ 24.463.611,12			135,12	$ 24.463.611,12	
7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 52.105,00		22,20	$ 1.156.731,00			22,20	$ 1.156.731,00	
9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UN		$ 825.141,00		32,50	$ 26.817.082,50			32,50	$ 26.817.082,50	
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 10.823,00		10,12	$ 109.528,76			10,12	$ 109.528,76	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 5.453,00		25,52	$ 139.160,56			25,52	$ 139.160,56	
13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 18.544,00		10,12	$ 187.665,28			10,12	$ 187.665,28	
13.2.13	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS - AREA DE COLUMNAS - (HASTA 60 CM)	M		$ 11.477,00		6,23	$ 71.501,71			6,23	$ 71.501,71	
17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M		$ 29.887,00		152,94	$ 4.570.917,78			152,94	$ 4.570.917,78	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.669,00		157,32	$ 1.206.487,08			157,32	$ 1.206.487,08	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 11.419.923.186,00	$ 486.261.713,62	$ 1.561.889.801,39	$ 2.048.151.515,01 17,93%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	( )			
VALOR A PAGAR		$ 486.261.713,62	$ 1.561.889.801,39	$ 2.048.151.515,01
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA		-$ 0,62	-$ 2,39	-$ 3,01
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 486.261.713,00	$ 1.561.889.799,00	$ 2.048.151.512,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 9.371.771.674,00	SALDO POR AMORTIZAR		
		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
C.C. O NIT: 901639619-8
REP. LEGAL : ÁLVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ PEREZ
C.C. : 72.270.722 de Barranquilla

NOMBRE DE INTERVENTORIA : CONSORCIO INTERCEL
C.C. O NIT: 901649204-0
REP. LEGAL : CARLOS ENRIQUE ESCOBAR
C.C. : 80.424.760

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 07

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077646-22 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022.

Correspondiente al periodo: 03 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 2 DE AGOSTO DE 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los DOS (02) días del mes de agosto del 2023, se reunieron las siguientes personas:CARLOS ENRIQUE ESCOBAR, identificado con cedula No. 80.424.760 de Bogotá en su condición de Representante Legal de CONSORCIO INTERCEL con NIT. 901.649.204-0en calidad de Interventor, y ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ, identificado con cedula No. 72.270.722 de Barranquilla - Atlántico, en su condición de Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022, con NIT. 901.639.619-0 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	($ 11.419.923.186) ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.
FORMA DE PAGO:	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCEL

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 07, el cual corresponde a un valor de ($ 484.898.981,00) CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 17,92%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

INTERVENTOR
CARLOS ENRIQUE ESCOBAR L
Representante Legal
CONSORCIO INTERCEL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764043314242

(415)7707212489984(8020) 001876404331424 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 9 6 1 9	0				

11. Razón social
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 93 BIS 19 50 OF 105

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-01-26 / 06:27:29 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ PEREZ ALVARO ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 72270722 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

997. Fecha formalización 2023-01-26 18:27:29

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764043314242

(415)7707212489984(8020) 001876404331424 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 9 6 1 9	0				

11. Razón social

CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 CL 93 BIS 19 50 OF 105	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		1	50	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CERTIFICADO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Los suscritos ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ identificado con C.C. No. 72.270.722 de Barranquilla quien actual como representante legal del CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 y ASTRID DIAZ CABEZAS identificada con CC. No. 38.235.389 de Ibagué, y con tarjeta profesional No. T-84.000 de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora del CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 identificado con NIT 901.639.619-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 02 días del mes de agosto de 2023.

ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 72.270.722 de Barranquilla

ASTRID DIAZ CABEZAS
CONTADORA
T.P. No. 84000-T
C.C. No. 38.235.389 de Ibagué

Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente certificamos que el cliente **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022** identificado con NT **901639619-0** es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el día **18/10/2022** con la Cuenta Ahorros **No 880-83867-7** Denominada **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022.** La cual se Encuentra Activa y Vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022.** Es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 28 de JULIO de 2023 en la ciudad de Riohacha.

Cordialmente,

Banco de Occidente
OFICINA RIOHACHA
PAOLA ANDREA CUBILLOS GARCIA

PAOLA ANDREA CUBILLOS GARCIA
Asesor de Soporte Comercial
Oficina Riohacha

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.29DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	6,64

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
VENTANAS LABORATORIO FACHADA EXTERIOR		1,03	1,97	3,00						6,09	
		1,04	0,53							0,55	
					-						
TOTAL										6,64	





Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.3CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M	REF.	107,16

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑOS ENTRADAS		1,25		4,00						5,00	
CORTE EN LABORATORIO MEDIA CAÑA		13,52		1,00						13,52	
		40,78		1,00						40,78	
		15,34		1,00						15,34	
		32,52		1,00						32,52	
TOTAL										107,16	



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.13 COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE ACERO)	UND.	M	REF.	4,94

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
COLUMNAS ENTRADA BAÑO			2,47	2,00						4,94
										4,94

CROQUIS





Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.3.2 MESÓN EN CONCRETO E = 0.10 M HASTA 0.6 M DE ANCHO ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO.	UND.	M	REF.	2,46

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MESON LABORATORIO LAVADO INSTRUMENTAL	0,65	2,46								2,46
										2,46

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.4.1SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	UND.	KG	REF.	35,42

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MESON LABORATORIO LAVADO INSTRUMENTAL	2,46			4,00						9,84	
	0,66			11,00						7,26	
	0,50			3,00						1,50	
ACERO COLUMNETAS BAÑOS	2,47			6,00						14,82	
ESTRIBOS COLUMNAS DE BAÑOS ENTRADA	0,25			32,00						2,00	
TOTAL										35,42	

Observaciones EL ACERO DE LOS ESTRIBOS ES MULTIPLICADO POR 0,25 QUE ES EL PESO DE VARILLA DE 1/4 POR METRO LINEAL

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	3.MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.1.2 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	UND.	M2	REF.	3,44

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO ENTRADA BAÑO NIÑAS		0,95	2,47							2,35
POCETAS	1,22		0,45	2,00						1,10
TOTAL										3,44

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	3.MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.3.4 ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO ASATISFACCIÓN)	UND.	UND	REF.	35,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MESON LABORATORIO LAVADO INSTRUMENTAL				8,00						8,00	
BAÑO NIÑAS				6,00						6,00	
BAÑO NIÑOS				6,00						6,00	
COLUMNAS Y VIGETAS LABORATORIO				15,00						15,00	
TOTAL										35,00	



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	7.PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.1.8 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	UND.	M	REF.	144,64

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
LABORATORIO	14,38			2,00						28,76
	19,38			2,00						38,76
BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS	33,56			2,00						67,12
BAÑOS MOVILIDAD REDUCIDA	5,00			2,00						10,00
TOTAL										144,64

CROQUIS





Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	7.PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.1.2 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E = 2 CM	UND.	M	REF.	48,69

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
LABORATORIO	16,23			3,00						48,69	
TOTAL										48,69	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	7.PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	UND.	M	REF.	5,05

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
LABORATORIO	1,30			1,00						1,30
	1,25			3,00						3,75
TOTAL										5,05

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	8.MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	8.14 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	UND.	M2	REF.	7,66

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MURO ENTRADA MUJERES	1,22		2,15	1,00						2,62	
DUCHA		2,80	1,80							5,04	
TOTAL										7,66	



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.1.16SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJA PARA PUERTA METALICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD. TERMINADA CON ANTICORROSIVO. PINTADA E	UND.	M2	REF.	6,96

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
LABORATORIO PUERTA		1,30	1,95							2,54	
BAÑOS MOVILIDAD REDUCIDA PUERTA		1,00	2,47							2,47	
INTERNA DE LABORATORIO		1,00	1,95							1,95	
TOTAL										6,96	



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.1.33MARCO DE PUERTAS (INCLUYE PINTURA Y BASE ANTICORROSIVO)	UND.	M	REF.	16,04

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
LABORATORIO PUERTA			1,95	2,00						3,90	
			1,30	1,00						1,30	
BAÑOS MOVILIDAD REDUCIDA PUERTA			2,47	2,00						4,94	
			1,00	1,00						1,00	
LABORATORIO INTERNA			1,95	2,00						3,90	
			1,00	1,00						1,00	
TOTAL										16,04	



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UND.	M2	REF.	14,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
VENTANAS LABORATORIO		1,84	1,52	1,00						2,80
		1,03	1,68	3,00						5,19
		1,03	0,54	1,00						0,56
VENTANAS BAÑOS		1,23	0,56	2,00						1,38
		1,23	0,53	2,00						1,30
VENTANA LABORATORIO CONTRA CANCHA		1,84	1,51	1,00						2,78
TOTAL										14,00

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	UND.	M2	REF.	11,23

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
VENTANAS LABORATORIO		1,84	1,52							2,80	
		1,03	1,68	3,00						5,19	
		1,03	0,54							0,56	
VENTANAS BAÑOS		1,23	0,56	2,00						1,38	
		1,23	0,53	2,00						1,30	
TOTAL										11,23	



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.5SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UND.	UND	REF.	12,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑOS				4,00						4,00	
BAÑO NIÑAS				8,00						8,00	
										12,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — FECHA: DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.8SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UND.	UND	REF.	5,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑOS				5,00						5,00	
										5,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA ((INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UND.	UND	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO MOVIDAD REDUCIDA				1,00						1,00	
										1,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.11SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UND.	UND	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO MOVIDAD REDUCIDA				1,00						1,00	
										1,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.23SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UND.	UND	REF.	10,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑOS NIÑAS				2,00						2,00	
BAÑOS NIÑOS				2,00						2,00	
BAÑO MOVIDAD REDUCIDA				1,00						1,00	
LABORATORIO				5,00						5,00	
										10,00	



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UND.	UND	REF.	16,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑOS NIÑAS				5,00						5,00
BAÑOS NIÑOS				5,00						5,00
BAÑO MOVIDAD REDUCIDA				1,00						1,00
LABORATORIO				5,00						5,00
										16,00

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.37SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UND.	UND	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO MOVIDAD REDUCIDA				1,00						1,00	
										1,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 16"	UND.	UND	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO MOVIDAD REDUCIDA				1,00						1,00	
										1,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.50SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTIVANDÁLICA DE PARED INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA Y VÁLVULA DE DESCARGA	UND.	UND	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DUCHA DE ENERGENCIA Y LAVAOJOS LABORATORIO				1,00						1,00	
										1,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	12 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	UND.	M2	REF.	40,21

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑOS NIÑAS		1,30	1,80	10,00						23,40
		0,60	1,60	8,00						7,68
		1,50	1,80	2,00						5,40
BAÑOS NIÑOS		1,30	1,80	5,00						11,70
		0,60	1,60	4,00						3,84
		1,50	1,80	1,00						2,70
CORTE 06										-14,51
TOTAL										40,21

CROQUIS



Observaciones CADA UNO DE LOS RESULTADOS DE LOS BAÑOS DE NIÑAS FUE MULTIPLIADO POR 2 YA QUE TIENE LAS MISMAS DIMENSIONES EN AMBOS LADOS DE LOS BAÑOS

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	12 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.20SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON CORRIDO PLANO EN POLIMERO Y FIBRA DE VIDRIO. FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6CM, REENGRUESE DE 3CM TERMINADO, ANCHO 50 CM	UND.	M2	REF.	9,25

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑOS	3,00			2,00						6,00	
LABORATORIO	0,80			2,00						1,60	
	0,55			3,00						1,65	
TOTAL										9,25	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	12 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	UND.	UND	REF.	5,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑOS NIÑOS		0,50	1,17	5,00						5,00	
TOTAL										5,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.1.6 PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND.	M2	REF.	9,61

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO ENTRADA BAÑO NIÑAS		3,00	2,47	2,00						7,41
POCETAS	1,22		0,45	4,00						2,20
TOTAL										9,61

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.6PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	205,97

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PERIMETRO BAÑO MUJERES PARTE SUPERIOR	29,35		0,30							29,35	
PERIMETRO BAÑO HOMBRES PARTE SUPERIOR	24,87		0,30							24,87	
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA PARTE SUPERIOR	6,30		0,30							6,30	
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA TECHO	1,95	1,85								3,61	
BAÑO MUJERES TECHO	5,75	4,30								24,73	
BAÑOS HOMBRES TECHO	2,70	3,70								9,99	
	1,56	4,60								7,18	
	2,75	2,70								7,43	
LABORATORIO	7,30	2,40								17,52	
	8,45	2,40								14,43	
	7,00	2,40								16,80	





MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.6PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	205,97

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	4,25	2,40								10,20
	7,91	2,00								15,82
	7,40	2,40			-					17,76
TOTAL										205,97

CROQUIS



Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.14 DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Salon Administrativo 2	3,85	2,93		1,00						11,28	
Salon Administrativo 3	3,97	3,33		1,00						13,22	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										24,50	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	21	MES	7	AÑO 23
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646			
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.2.15 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Demolicion cuarto de refrigerios	0,70	0,82		1,00						0,57
Demolicion cuarto de refrigerios	0,82	1,32		1,00						1,08
Demilicion cuchilla Salon 5 mampuesto	8,50	0,20		1,00						1,70
Demilicion cuchilla Salon informatica mampuesto	9,90	0,20		2,00						3,96
Demilicion cuchilla Salones administrativos mampuesto	9,90	0,20		1,00						1,98
Pasillo nuevo	2,15	0,25		1,00						0,54
Puerta de pasillo nuevo	2,20	0,91		1,00						2,00
TOTAL										11,84

CROQUIS









Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.2.29 DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
Vantana cuarto amnistrativo	2,58	1,32		1,00						3,41	
Vantana cuarto amnistrativo	2,01	1,32		1,00						2,65	
Vantana Salon 5	9,80	1,30		1,00						12,74	
Ventana salon 6	7,05	0,48		1,00						3,38	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										22,18	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Excavacion Bordillo zona verde	14,35	0,15	0,15							0,32
Excavacion Bordillo zona verde	5,23	0,15	0,15							0,12
Excavacion Bordillo zona verde	11,30	0,15	0,15							0,25
Excavacion para viga cimentacion muro nuevo pasillo	7,05	0,30	0,35							0,74
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										1,4300

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.8 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	UND.	M3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Relleno Parqueadero	8,20	14,00	0,30							34,44	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										34,44	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.6 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Viga cinta salon 5	5,10			4,00						20,40	
Viga cinta Baños niños	5,10			2,00						10,20	
Viga cinta Baños niñas	5,10			2,00						10,20	
Viga cinta Salon informatica	5,10			2,00						10,20	
Vigas cinta salon administrativo 1	5,10			2,00						10,20	
Vigas cinta salon administrativo 2	5,10			2,00						10,20	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										71,40	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		


FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.13 COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE ACERO)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Columnetas cuarto de aseo y shut			2,18		2,00					4,36
Columnetas cuarto de aseo y shut			2,20		2,00					4,40
TOTAL										8,76

CROQUIS

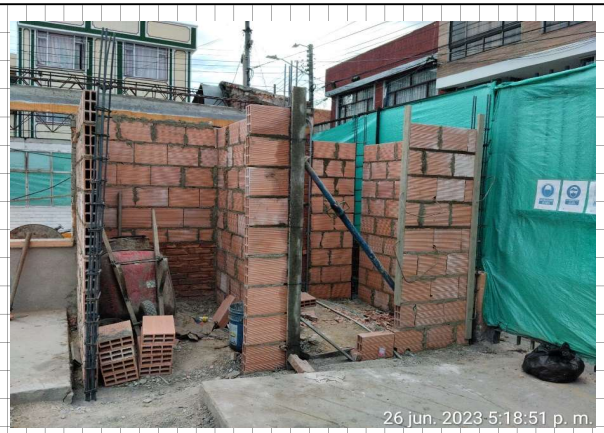

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.24 PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	UND. M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa anden enfrente de cuarto de aseo	1,65	2,25			3,71				0,14	3,57
Placa esquina de cancha	1,76	1,90								3,34
TOTAL										6,92

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.3.5 VIGA DINTEL EN CONCRETO 2500 PSI DE 0.20 X 0.15 M (NO INCLUYE ACERO)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bordillo FUNDIDO	14,35									14,35
Bordillo FUNDIDO	5,23									5,23
Bordillo	11,30									11,30
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										30,88

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.3.15 SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A-10 H=0.40 M)	UND. M	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bordillo de parqueadero	2,00			1,00						2,00
Bordillo de parqueadero	7,40			2,00						7,40
Bordillo de parqueadero	11,70			1,00						11,70
Bordillo de parqueadero	7,40			1,00						7,40
Bordillo de parqueadero	8,35			1,00						8,35
										-
										-
										-
										-
TOTAL										36,85

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.3.18 CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cinta de parqueaderos	11,70			2,00						23,40
Cinta de parqueaderos	7,40			1,00						7,40
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										30,80

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	UND.	KG	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	PESO	CANTIDAD		L	a	h			
Viga cinta salon 5	22,00		0,99	4,00						87,12	
Viga cinta salon 5 flejes	0,58		0,56	70,00						22,74	
Viga cinta Baños niños	11,00		0,99	4,00						43,56	
Viga cinta Baños niños flejes	0,58		0,56	70,00						22,74	
Viga cinta Baños niñas	11,00		0,99	4,00						43,56	
Viga cinta Baños niñas flejes	0,58		0,56	70,00						22,74	
Viga cinta Salon informatica	11,00		0,99	4,00						43,56	
Viga cinta Salon informatica flejes	0,58		0,56	70,00						22,74	
Vigas cinta salon administrativo 1	11,00		0,99	4,00						43,56	
Vigas cinta salon administrativo 2	11,00		0,99	4,00						43,56	
Vigas cinta salon administrativo 1 flejes	0,58		0,56	70,00						22,74	
Vigas cinta salon administrativo 2 flejes	0,58		0,56	70,00						22,74	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										441,34	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	UND.	KG	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	M2	PESO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Bordillos zona verde	3,16	2,08		1,00						6,57
Bordillos zona verde	1,15	2,08		1,00						2,39
Bordillos zona verde	2,49	2,08		1,00						5,17
Placa enfrente de cuarto de aseo	2,85	2,08		1,00						5,93
Placa esquina de cancha	3,34	2,08		1,00						6,96
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										27,02

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	UND.	KG	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	PESO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Salones administrativos estructural	8,57	12,63		9,00						974,15	
Salones administrativos tipo C	8,50	4,08		2,00						69,36	
Salon informatica estructural	9,01	12,63		9,00						1.024,17	
Salon informatica tipo C	8,50	4,08		1,00						34,68	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										1051,18	



Observaciones: se autoriza x interventoria el 50% miebtras se envia el concepto estructural

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.1.2 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	UND. M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Muro de cuarto de refrigerios	1,28	2,57		1,00						3,29
Muros de cuarto de aseo y shut	2,18	1,78		2,00						7,76
Muros de cuarto de aseo y shut	0,33	2,18		1,00						0,72
Muros de cuarto de aseo y shut	0,88	2,18		1,00						1,92
Muros de cuarto de aseo y shut	1,41	1,23		1,00						1,73
Muros de cuarto de aseo y shut	1,41	0,87		1,00						1,23
Muros de cuarto de aseo y shut	2,20	1,78		1,00						3,92
Muros de cuarto de aseo y shut	2,20	0,64		1,00						1,41
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
		-								-
										-
										-
TOTAL										21,97

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.1.6 MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
cuchillas Salon informatica	9,90		0,40	1,00						3,96	
Cuchillas Salones administrativos	9,90		0,40	1,00						3,96	
										-	
TOTAL										7,92	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		


FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Anclajes vigas cinta salon informatica				16,00						16,00
Anclajes vigas cinta salones administrativos				8,00						8,00
Anclajes vigas cinta salones administrativos				8,00						8,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										32,00

CROQUIS

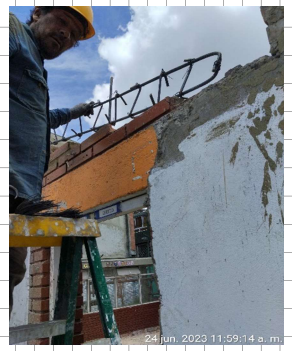



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.3.13 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Tuberia Baño prescolar	9,27									9,27	
Tuberia que conecta a bañp prescolar	26,58									26,58	
TOTAL										35,85	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.3.15 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Tuberia baño prescolar	13,89									13,89	
										-	
TOTAL										13,89	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Puntos sanitarios baño prescolar	5,00									5,00	
										-	
TOTAL										5,00	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Puntos lavamanos baño prescolar	5,00									5,00	
										-	
TOTAL										5,00	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.2.69 PISO EN ADOQUÍN PREFABRICADO 10 X 20 X 8 COLOR CHOCOLATE, TRÁFICO PESADO INCLUYE BASE Y SELLO DE ARENA	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Adoquin parquedero	11,80	7,50								88,50
Adoquin parquedero	2,05	3,55								7,28
										-
										-
										-
										-
TOTAL										95,78

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Salon Prescolar	2,38	0,49		1,00						1,17	
Salon 1	0,95	0,56		1,00						0,53	
Salon 1	2,31	1,33		1,00						3,07	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,58	1,32		1,00						3,41	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,22	1,32		1,00						2,93	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,26	1,32		1,00						2,98	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,30	0,30		1,00						0,39	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,74	0,30		1,00						0,52	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,01	1,32		1,00						2,65	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,89	1,32		1,00						2,49	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,88	1,32		1,00						2,48	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,01	1,32		1,00						2,65	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,12	1,32		1,00						2,80	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,34	0,35		1,00						0,47	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,32	0,35		1,00						0,46	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,40	1,32		1,00						3,17	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,49	0,56		1,00						1,39	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,52	0,56		1,00						1,41	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	3,50	4,62		1,00						16,17	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,11	1,32		1,00						2,79	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	6,78	0,48		1,00						3,25	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	5,62	2,69		1,00						15,12	
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	5,75	0,48		1,00						2,76	
TOTAL										75,06	







Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	21	MES	7	AÑO 23
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646			
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS	V. PARCIAL	VANOS	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	21	MES	7	AÑO 23
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646			
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.1.1 PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Tarima Pañete	7,03	0,45		1,00						3,16
Tarima Pañete	3,88	0,45		2,00						3,49
Pañete cubierta salon 6	4,30	0,69		1,00						2,97
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										9,62

CROQUIS







Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	21	MES	7	AÑO 23
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646				
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.1.2 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	UND. M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Tarima Pañete	7,03	0,45		1,00						3,16
Tarima Pañete	3,88	0,45		2,00						3,49
Pañete cubierta salon 6	4,30	0,69		1,00						2,97
PAÑETE ML VENTANAS PERIMETRO										-
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,58		1,32	1,00	7,80					7,80
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,22		1,32	1,00	7,08					7,08
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,26		1,32	1,00	7,16					7,16
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,30		0,30	1,00	3,20					3,20
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,74		0,30	1,00	4,08					4,08
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,01		1,32	1,00	6,66					6,66
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,89		1,32	1,00	6,42					6,42
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,88		1,32	1,00	6,40					6,40
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,01		1,32	1,00	6,66					6,66
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,12		1,32	1,00	6,88					6,88
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,34		0,35	1,00	3,38					3,38
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	1,32		0,35	1,00	3,34					3,34
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,40		1,32	1,00	7,44					7,44
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,49		0,56	1,00	6,10					6,10
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,52		0,56	1,00	6,16					6,16
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	3,50		4,62	1,00	16,24					16,24
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	2,11		1,32	1,00	6,86					6,86
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	6,78		0,48	1,00	14,52					14,52
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	5,62		2,69	1,00	16,62					16,62
VENTANAS COSTADO ORIENTAL	5,75		0,48	1,00	12,46					12,46
										-
										-
TOTAL										165,08

CROQUIS







Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

			FECHA	DIA	21	MES	7	AÑO 23
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022		CONTRATO OBRA No.			SED C01.PCCNTR.4077646		
DIRECTOR TECNICO								
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL							

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.1.2 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS	V. PARCIAL	VANOS	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Salon 6	5,15	4,02								20,70
Baños niños	5,15	2,90								14,94
Baños niñas	5,15	2,93								15,09
Salon administrativo 1	5,15	3,76								19,36
Salon administrativo 2	5,15	3,85								19,83
Salon informatica	5,15	8,89								45,78
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										135,70

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 21	MES 7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1.1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.3 CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UND.	M	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
LADO 1	7,50		2,30	1,00						7,50	
LADO 2	5,00		2,30	1,00						5,00	
LADO 3	7,50		2,30	1,00						7,50	
LADO 4	5,00		2,00	1,00						5,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										25,00	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA	21	MES	7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	1,2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.2.13 DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
cocina general	6,6	9,72		1,00						64,15
aseo quimicos	2,4	0,87		1,00						2,09
hall baños	4,04	0,71		1,00						2,87
baño mixto	2,25	1,28		1,00						2,88
vestier mixto	1,37	1,71		1,00						2,34
acceso personal	2,87	1,27		1,00						3,64
cuarto esquinero	3,02	5,85		1,00						17,67
cuarto secos	3,76	5,85		1,00						22,00
hall	0,75	0,67		1,00						0,50
acceso materia prima	5,23	2,21		1,00						11,56
hall	1	0,67		1,00						0,67
basuras	2,97	1,6		1,00						4,75
										-
										-
										-
TOTAL										135,12

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 21	MES 7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1.4 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.4.3 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
corte en super board perimetro de carcamo en cocina general	2	0,15	0,05	4,00	4,30					17,20	
corte en super board perimetro de carcamo en cuarto esquinero	1	0,15		2,00	2,30					4,60	
corte en super board perimetro de carcamo en shoot basuras	1	0,15		1,00	2,30					2,30	
corte en super board perimetro de carcamo en hall cuartos frios	1	0,15		2,00	2,30					4,60	
corte en metal deck perimetro de carcamo en cocina general	2	0,15	0,05	4,00	4,30					17,20	
corte en metal deck perimetro de carcamo en cuarto esquinero	1	0,15		2,00	2,30					4,60	
corte en metal deck perimetro de carcamo en shoot basuras	1	0,15		1,00	2,30					2,30	
corte en metal deck perimetro de carcamo en hall ded cuartos frios	1	0,15		2,00	2,30					4,60	
TOTAL										57,40	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 21	MES 7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	4.2 RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	M	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
sifon de piso carcamo en cuarto esquinero	3			3,00						3,00
sifon de piso carcamo en hall cuartos frios	4			4,00						4,00
TOTAL										7,00

CROQUIS



Observaciones	corresponde a la tuberia sanitaria para conectar 4 de los 10 carcamos a instalar

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 21	MES 7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	4.2 RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	un	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
sifon de piso carcamo en cuarto esquinero				2,00						2,00	
sifon de piso carcamo en hall cuartos frios				2,00						2,00	
TOTAL										4,00	

Observaciones	sifones nuevos a instalar en acceso a cuartos frios y en cuarto de esquina

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		


CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA	21	MES	7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	7,2 ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7,2,34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	UND.	M	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
cocina general	6,6	9,72	0,10	1,00	31,84					31,84	
aseo quimicos	2,4	0,87	0,10	1,00	5,74					5,74	
hall baños	4,04	0,71	0,10	1,00	8,70					8,70	
baño mixto	2,25	1,28	0,10	1,00	6,26					6,26	
vestier mixto	1,37	1,71	0,10	1,00	5,36					5,36	
acceso personal	2,87	1,27	0,10	1,00	7,48					7,48	
cuarto esquinero	3,02	5,85	0,10	1,00	16,94					16,94	
cuarto secos	3,76	5,85	0,10	1,00	18,42					18,42	
hall	0,75	0,67	0,10	1,00	2,04					2,04	
acceso materia prima	5,23	2,21	0,10	1,00	14,08					14,08	
hall	1	0,67	0,10	1,00	2,54					2,54	
basuras	2,97	1,6	0,10	1,00	8,34					8,34	
cuarto refrigeracion	4,1	3,7	0,10	1,00	14,80					14,80	
cuarto congelacion	1,9	3,7	0,10	1,00	10,40					10,40	
TOTAL										152,94	





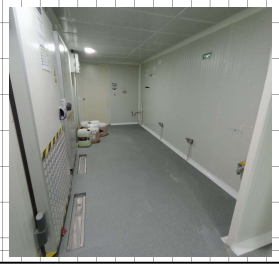

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 21	MES 7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	7,2 ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7,2,40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO	UND.	M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
cocina general	6,6	9,72		1,00						64,15
aseo quimicos	2,4	0,87		1,00						2,09
hall baños	4,04	0,71		1,00						2,87
baño mixto	2,25	1,28		1,00						2,88
vestier mixto	1,37	1,71		1,00						2,34
acceso personal	2,87	1,27		1,00						3,64
cuarto esquinero	3,02	5,85		1,00						17,67
cuarto secos	3,76	5,85		1,00						22,00
hall	0,75	0,67		1,00						0,50
acceso materia prima	5,23	2,21		1,00						11,56
hall	1	0,67		1,00						0,67
basuras	2,97	1,6		1,00						4,75
TOTAL										135,12

CROQUIS

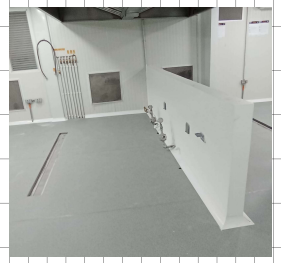



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		


CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 21	MES 7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	7,2 ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7,2,41 PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND.	m2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
cuarto refrigeracion	4,1	3,7		1,00						15,17	
cuarto congelacion	1,9	3,7		1,00						7,03	
TOTAL										22,20	





Observaciones	

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA	21	MES 7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL					

CAPITULO	9,3 OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UND. un	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
rejilla en cocina general	2	0,15	0,05	4,00	4,30					10,00	
rejillas en cuarto esquinero	1	0,15		2,00	2,30					2,50	
rejillao en shoot basuras	1	0,15		1,00	2,30					1,25	
rejilla en hall cuartos frios	1	0,15		2,00	2,30					2,50	
carcamo en cocina general	2	0,15	0,05	4,00	4,30					10,00	
carcamo en cuarto esquinero	1	0,15		2,00	2,30					2,50	
carcamo en shoot basuras	1	0,15		1,00	2,30					1,25	
carcamo en hall cuartos frios	1	0,15		2,00	2,30					2,50	
TOTAL										32,50	

Observaciones	

CONTRATISTA


Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA	21	MES 7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL					

CAPITULO	13.1 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.1.9 ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	m2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muro en cocina general	5,27	0,15	0,96	2,00						10,12	
TOTAL										10,12	

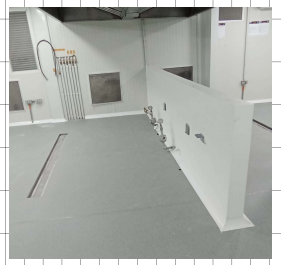



Observaciones	

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA	21	MES	7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	13.1 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.1.11 ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	UND.	ml	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muro en cocina general	5,27	0,15	0,96	1,00						25,52	
TOTAL										25,52	

Observaciones	corresponde a los filos del muro que separa dos espacios en la cocina

CONTRATISTA


Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 21	MES 7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.6 PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND. m2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muro en cocina general	5,27	0,15	0,96	2,00						10,12	
TOTAL										10,12	

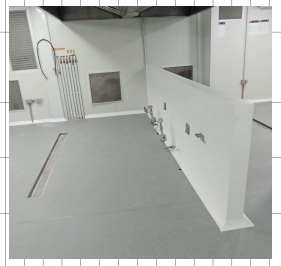



Observaciones	

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 21	MES 7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.2.13 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS - AREA DE COLUMNAS - (HASTA 60 CM)	UND.	ml	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
muro en cocina general	5,27	0,15	0,96	1,00						6,23	
TOTAL										6,23	

Observaciones	corresponde a los ml de pintura en la cocina

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA	21	MES	7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	17.1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.22 TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	UND. M	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
cocina general	6,6	9,72	0,10	1,00	31,84					31,84	
aseo quimicos	2,4	0,87	0,10	1,00	5,74					5,74	
hall baños	4,04	0,71	0,10	1,00	8,70					8,70	
baño mixto	2,25	1,28	0,10	1,00	6,26					6,26	
vestier mixto	1,37	1,71	0,10	1,00	5,36					5,36	
acceso personal	2,87	1,27	0,10	1,00	7,48					7,48	
cuarto esquinero	3,02	5,85	0,10	1,00	16,94					16,94	
cuarto secos	3,76	5,85	0,10	1,00	18,42					18,42	
hall	0,75	0,67	0,10	1,00	2,04					2,04	
acceso materia prima	5,23	2,21	0,10	1,00	14,08					14,08	
hall	1	0,67	0,10	1,00	2,54					2,54	
basuras	2,97	1,6	0,10	1,00	8,34					8,34	
cuarto refrigeracion	4,1	3,7	0,10	1,00	14,80					14,80	
cuarto congelacion	1,9	3,7	0,10	1,00	10,40					10,40	
TOTAL										152,94	



Observaciones	corresponde al sello adicional que se le aplico al piso contra pared y al piso con media caña

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 21	MES 7	AÑO 23
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	20,1,1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
cocina general	6,6	9,72								64,15
aseo quimicos	2,4	0,87								2,09
hall baños	4,04	0,71								2,87
baño mixto	2,25	1,28								2,88
vestier mixto	1,37	1,71								2,34
acceso personal	2,87	1,27								3,64
cuarto esquinero	3,02	5,85								17,67
cuarto secos	3,76	5,85								22,00
hall	0,75	0,67								0,50
acceso materia prima	5,23	2,21								11,56
hall	1	0,67								0,67
basuras	2,97	1,6								4,75
cuarto refrigeracion	4,1	3,7								15,17
cuarto congelacion	1,9	3,7								7,03
TOTAL										157,32

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
COLEGIO NUEVA MARSELLA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 21 **MES** 7 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.1 REPLANTEO	UND.	UND	M2	239,87

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ASEO BAÑO PISO 1	9,85	7,10								69,94
ASEO BAÑO PISO 2	9,85	7,10								69,94
EXTERIORES				100,00						100,00
TOTAL										239,87

CROQUIS





Observaciones

EL REPLANTEO PRESENTADO CORRESPONDE AL ANALISIS QUE SE DEBIO REALIZAR UNA VEZ SE ATENDIÓ LA VISITA INICIAL PARA DETERMINAR LOS TRABAJOS A EJECUTAR, MEDIANTE LA INSPECCION DE LA RED SANITARIA HASTA EL POSO DE ALCANTARILLADO. REDES SIN PLANOS Y PERSONAL DEL COLEGIO SIN CONOCIMIENTO POR DONDE VA LA RED. RED TAPADA POR HECES Y TODO TIPO DE ELEMENTOS.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 21 **MES** 7 **AÑO** 2023


DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1..2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.16 DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
DIVISIONES ENTRE SALONES	4,40	1,13		1,00	1,00					4,97
	0,82	0,86		1,00	1,00					0,71
	0,81	1,28		1,00						1,04
	0,98	3,50		1,00						3,43
	0,54	1,20		1,00						0,65
TOTAL										10,79

CROQUIS

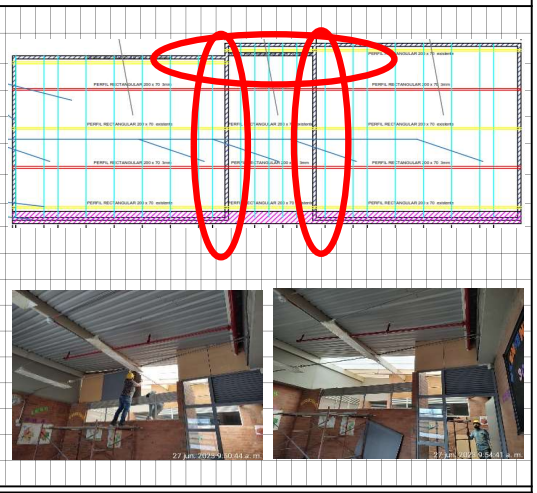

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.4 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.3 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
AULA 01	0,20			24,00						4,80	
AULA 02	0,10			12,00						1,20	
										-	
					-						
TOTAL										6,00	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		


CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — FECHA: DIA 21 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO: — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	8.1. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	8.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	UND.	M2		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO PROFESORAS		1,00	0,80							0,80	
		1,20	0,80							0,96	
		1,30	0,80							1,04	
TOTAL										2,80	

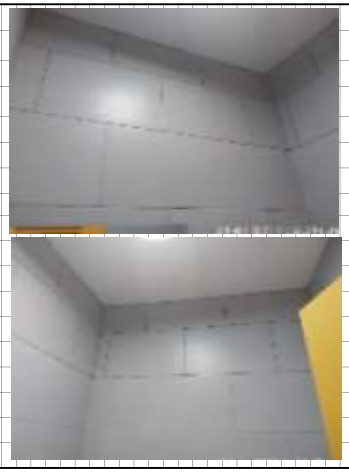

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		


CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 21 **MES** 7 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	8.1. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	8.1.5 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND.	M2		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DIVISIONES ENTRE SALONES		4,40	1,38	1,00						6,07	
		0,86	0,82	1,00						0,71	
		0,86	1,28	1,00						1,10	
		3,50	1,20	1,00						4,20	
		0,54	1,20	1,00						0,65	
TOTAL										12,73	

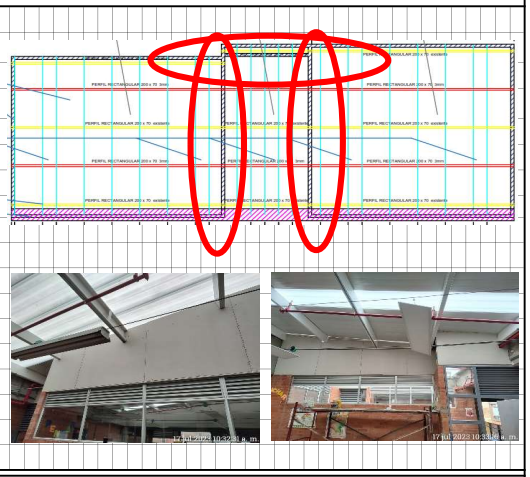

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 21 **MES** 7 **AÑO** 2023


DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.2.1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
AULA 2	6,52	1,17		0,80						6,10	
AULA 2	5,36	1,42		6,40						48,71	
AULA 2	6,52	0,70		0,80						3,65	
PASILLO	2,80	1,17		0,80						2,62	
PASILLO	3,60	0,70		0,80						2,02	
AULA 1	5,10	0,70		0,80						2,86	
AULA 1	0,83	1,17		0,80						0,78	
AULA 1	0,83	0,70		0,80						0,46	
TOTAL										67,20	

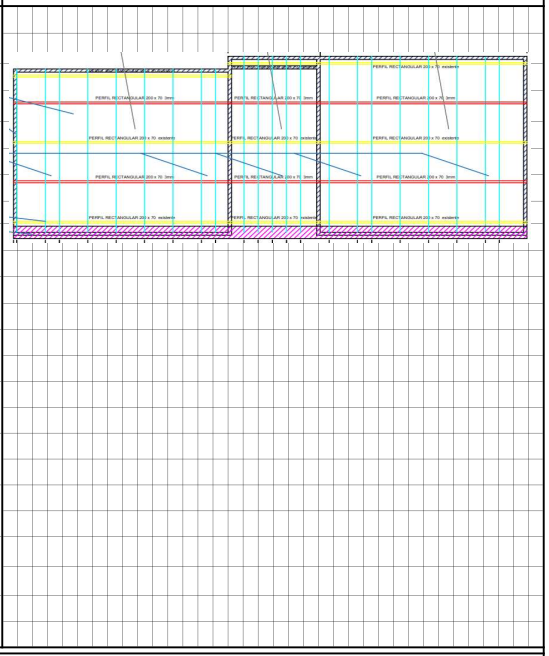

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 21 **MES** 7 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.4 PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.4.3 ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	ML		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DIVISIONES ENTRE SALONES	6,63			3,00						19,89	
	8,80			3,00						26,40	
	1,05			2,90						3,05	
										-	
					-						
					-						
TOTAL										49,34	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		


CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 21 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	17.1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17,1,4 CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	ML		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CUBIERTA	17,60			1,00						17,60	
					-						
TOTAL										17,60	

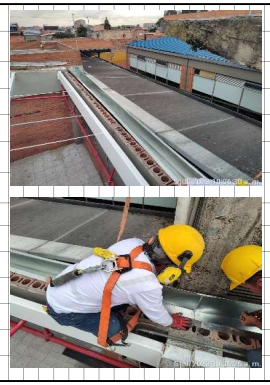

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 21 **MES** 7 **AÑO** 2023


DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	17.1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.26 TEJA TRASLUCIDA EN FIBRA ACOPLADA A CUBIERTA TIPO SANDWICH (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO)	UND.	M		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
AULA 1	5,36			2,00						10,72
AULA 2	6,52			2,00						13,04
HALL ACCESO	5,62			7,00						39,34
					-					
TOTAL										63,10

CROQUIS

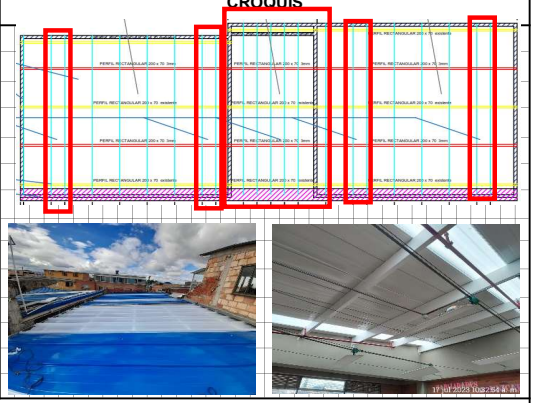

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		


CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — FECHA: DIA 21 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO: — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	17,1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	UND.	M2		

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	DESCUENTO	CANTIDAD		L	a	h			
AULA 02	7,40	6,90	1,00	1,00						50,06	
AULA 01	7,20	6,40	1,00	1,00						45,08	
										-	
TOTAL										95,1400	

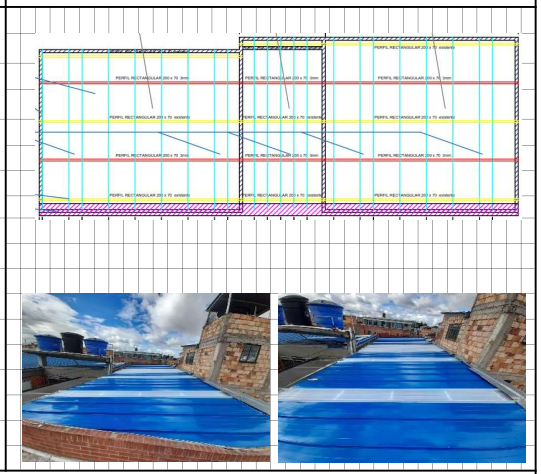

Observaciones	SE REALIZA DESCUENTO DE TEJA TRASLUCIDA

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.3 CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UND.	ML	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
acopio de materiales long 1	9,10			1,00	-					9,10
acopio de materiales long 2		5,70		1,00						5,70
acopio de materiales long 3	9,10			1,00	-					9,10
acopio de materiales long 4		5,70		1,00						5,70
baños	1,50			1,00						1,50
										-
										-
										-
										-
TOTAL										31,10

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.7 DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND. M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO DE NIÑOS	0,36		1,50	2,00	1,08					1,08
	1,90		1,50	1,00	2,85					2,85
	0,32		1,50	1,00	0,48					0,48
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										4,41

CROQUIS

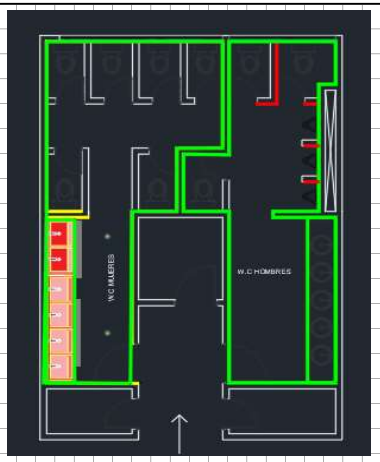

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.14 DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND. M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑÓ DE NIÑOS 1	1,00	2,28		1,00	2,28					2,28
BAÑÓ DE NIÑOS 2	1,65	1,92		1,00	3,16					3,16
BAÑÓ DE NIÑOS 3	1,34	2,90		1,00	3,89					3,89
BAÑÓ DE NIÑOS 4	0,14	0,94		1,00	0,13					0,13
BAÑÓ DE NIÑOS 5	2,28	3,86		1,00	8,81					8,81
TOTAL										18,27

CROQUIS

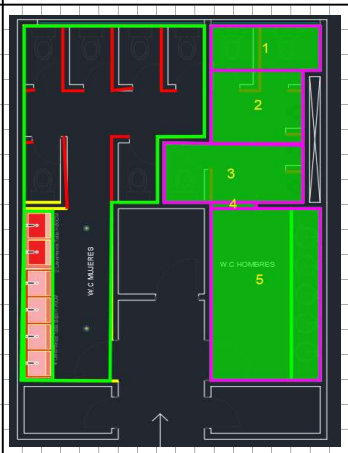



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.20 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND. M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO BAÑÓ NIÑÓS	3,13		1,80	1,00	5,63					5,63
	0,98		1,80	1,00	1,76					1,76
	1,34		1,80	1,00	2,41					2,41
	0,98		1,80	1,00	1,76					1,76
	2,65		1,80	1,00	4,77					4,77
	2,28		1,80	1,00	4,10					4,10
	1,00		1,80	1,00	1,80					1,80
	0,36		1,80	1,00	0,65					0,65
	2,97		1,80	1,00	5,35					5,35
	0,98		1,80	1,00	1,76					1,76
	0,14		1,80	1,00	0,25					0,25
	1,34		1,80	1,00	2,41					2,41
	3,86		1,80	1,00	6,95					6,95
	2,28		1,80	1,00	4,10					4,10
					-					-
					-					-
TOTAL										43,72

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.23 DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
LAVAMANOS				5,00	5,00					5,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										5,00

CROQUIS

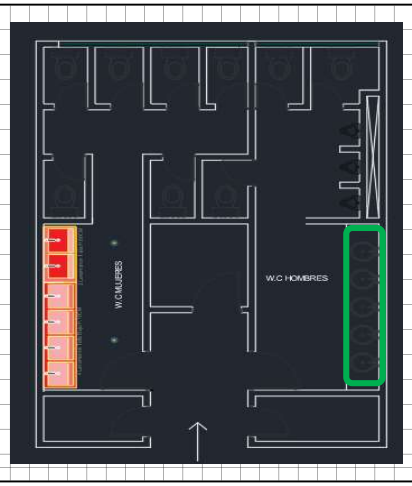



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.28 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO NIÑÓS	0,60		0,90	3,00	1,62					1,62
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										1,62

CROQUIS

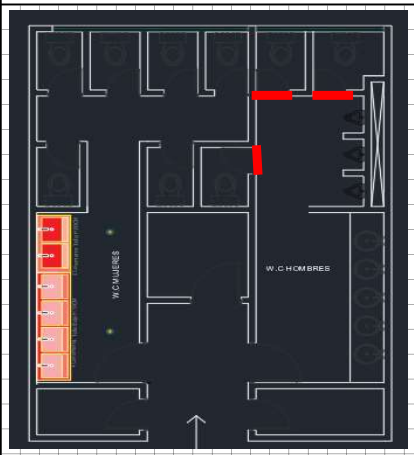





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.30 DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO NIÑOS				3,00	3,00					3,00
ORINALES				3,00	3,00					3,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										6,00

CROQUIS

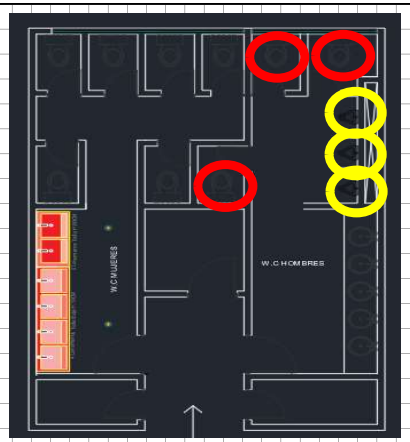





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.3 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUBIERTA	5,65			1,00	5,65					5,65
	4,34			1,00	4,34					4,34
	20,03			1,00	20,03					20,03
	10,67			1,00	10,67					10,67
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										40,69

CROQUIS

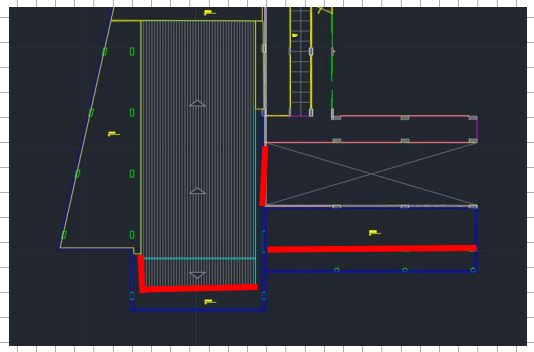

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	3.2 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.3 POYO EN CONCRETO PARA VESTIER (ANCHO 0.43 M ESPESOR 0.12 M)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CAJONES DE MAQUINARIA	0,80			1,00	0,80					0,80
	0,80			1,00	0,80					0,80
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										1,60

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.1.2 ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ZONA DE FACHADA PRINCIPAL	4,34	1,00		1,00	4,34					4,34
	5,65	2,20		1,00	12,43					12,43
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL										16,77

CROQUIS

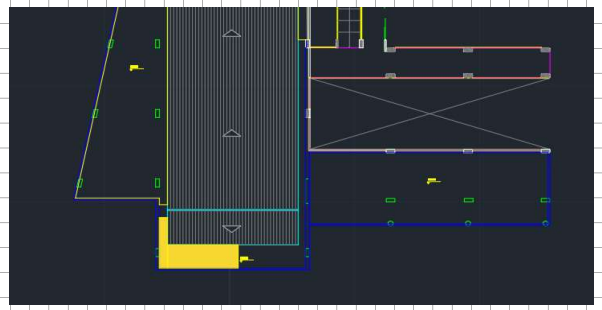

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	UND. M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ZONA DE FACHADA PRINCIPAL	4,34	1,00		1,00	4,34					4,34
	5,65	2,20		1,00	12,43					12,43
	0,99	1,90		1,00	1,88					1,88
	1,10	3,53		1,00	3,88					3,88
TOTAL										22,53

CROQUIS

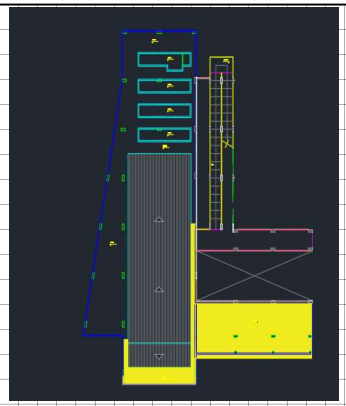



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ZONA DE GARGOLAS	20,03	0,10		1,00	2,00					2,00
TOTAL										2,00

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

FECHA DIA 21 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UND.	M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
										564,00
TOTAL										564,00

CROQUIS

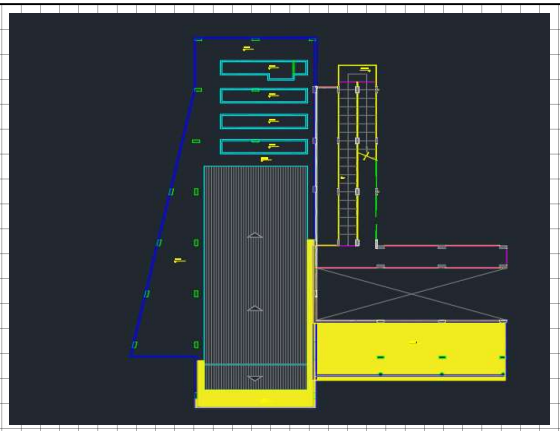

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	7.1 ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.1.8 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	UND. M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
BAÑO NIÑOS	5,62			2,00						11,24
	5,48			2,00						10,96
	2,85			2,00						5,70
	2,85			2,00						5,70
BAÑO PROFESOR 1	1,35			2,00						2,70
	1,35			2,00						2,70
	1,55			2,00						3,10
	1,55			2,00						3,10
BAÑO PROFESOR 2	1,35			2,00						2,70
	1,35			2,00						2,70
	1,55			2,00						3,10
	1,55			2,00						3,10
										56,80

CROQUIS

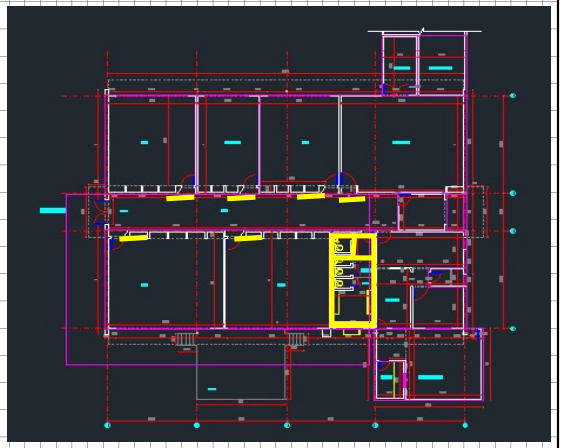







Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	7.2. ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15,	UND.	M2	REF.	


AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BOCAPUERTAS BAÑOS	0,80			3,00						2,40	
BOCAPUERTAS SALONES	0,80			6,00						4,80	
BOCAPUERTAS ACCESO PRINCIPAL	1,58			1,00						1,58	
										8,78	









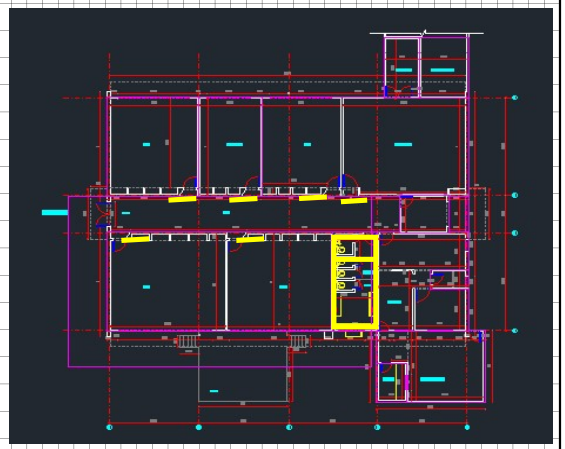

Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL


CAPITULO	9.1 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.1.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
SALON 7		0,88	2,07	1,00						1,82	
SALON 7 .1		0,67	2,05	1,00						1,37	
SALON 7 .2		0,80	2,06	1,00						1,65	
BAÑO PROFESOR 1		0,80	2,06	1,00						1,65	
BAÑO PROFESOR 2		0,80	2,06	1,00						1,65	
BAÑO NIÑOS		0,78	2,04	1,00						1,59	
CUARTO DE ALMACENAMIENTO		0,80	2,05	1,00						1,64	
TIENDA ESCOLAR		0,90	2,05	1,00						1,85	





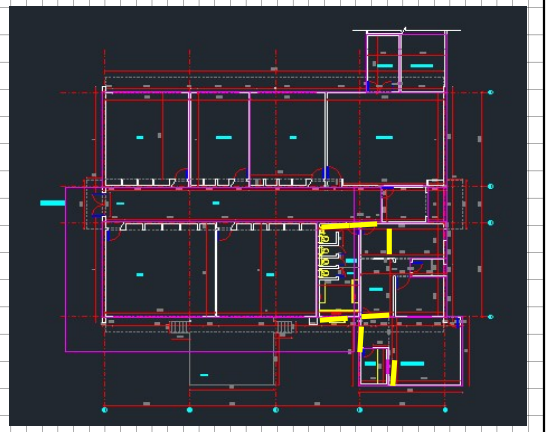

TOTAL 13,22

Observaciones

Pag. ____ de ____

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	9.1 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL


ITEM:	9.1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
SALON 1		0,96	2,08	1,00						2,00	
SALON 2		0,87	2,08	1,00						1,81	
SALON 3		0,87	2,08	1,00						1,81	
SALON 4		0,87	2,08	1,00						1,81	
SALON 5		0,89	2,08	1,00						1,85	
SALON 6		0,87	2,08	1,00						1,81	
PUERTA PRINCIPAL 1		1,80	2,04	1,00						3,67	
PUERTA PRINCIPAL 2		1,80	2,07	1,00						3,73	
TOTAL										18,48	







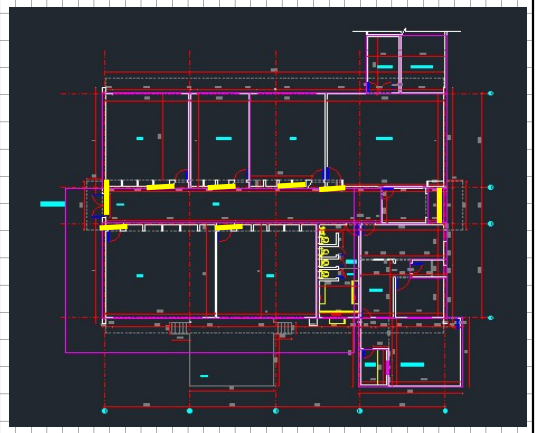

Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	9.1 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.1.33 MARCO DE PUERTAS (INCLUYE PINTURA Y BASE ANTICORROSIVO)	UND. ML	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
SALON 1		0,96	2,08	1,00						5,12	
SALON 2		0,87	2,08	1,00						5,03	
SALON 3		0,87	2,08	1,00						5,03	
SALON 4		0,87	2,08	1,00						5,03	
SALON 5		0,89	2,08	1,00						5,05	
SALON 6		0,87	2,08	1,00						5,03	
SALON 7		0,88	2,07	1,00						5,02	
SALON 7 .1		0,67	2,05	1,00						4,77	
SALON 7 .2		0,80	2,06	1,00						4,92	
BAÑO PROFESOR 1		0,80	2,06	1,00						4,92	
BAÑO PROFESOR 2		0,80	2,06	1,00						4,92	
BAÑO NIÑOS		0,78	2,04	1,00						4,86	
CUARTO DE ALMACENAMIENTO		0,80	2,05	1,00						4,90	
TIENDA ESCOLAR		0,90	2,05	1,00						5,00	
PUERTA PRINCIPAL 1		1,80	2,04	1,00						5,88	
PUERTA PRINCIPAL 2		1,80	2,07	1,00						5,94	
TOTAL										81,42	











Observaciones

Pag. ____ de ____

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL


CAPITULO	9.2 CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
VENTANA TIENDA ESCOLAR		1,55	1,99	1,00						3,08	
TOTAL										3,08	





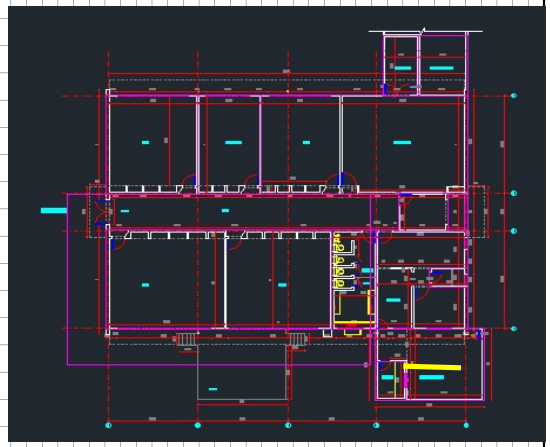

Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.1.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑOS				6,00						6,00	
TOTAL										6,00	





Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.1.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑOS				3,00						3,00	
TOTAL										3,00	





Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.1.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO PROFESORES				2,00						2,00	
BAÑO NIÑOS				2,00						2,00	
TOTAL										4,00	





Observaciones

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	12.1 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	UND. M	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑOS NIÑOS		1,29	1,80	3,00						6,97	
BAÑOS NIÑOS		0,38	1,80	2,00						1,37	
BAÑOS NIÑOS		0,20	1,80	1,00						0,36	
BAÑOS NIÑOS		0,57	1,50	3,00						2,57	
										-	
TOTAL										11,26	









Observaciones

Pag. ____ de ____

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 20 MES 7 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	12.1 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.1.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	UND.	un	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
division orinal niños		0,40	1,00	3,00						3,00	
TOTAL										3,00	









Observaciones

Pag. ____ de ____

INSPECTOR DE OBRA
ING. BRIAM SANCHEZ
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1,1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.1.1 REPLANTEO	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
REPLANTEO CAFETERIA	3,50	3,00		1,00						10,50
REPLANTEO BIBLIOTECA	8,37		2,75	1,00	23,02					23,02
										33,52

CROQUIS





Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.2.20 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MURO FONDO TIENDA ESCOLAR	3,10		2,80	1,00						8,68	
MURO LATERAL 1 TIENDA ESCOLAR	1,70		2,80	1,00						4,76	
MURO LATERAL 2 TIENDA ESCOLAR	0,60		2,80	1,00						1,68	
										15,12	



Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20	MES 7	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.2.30 DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DESMONTE LAVA PLATOS				1,00						1,00	
										-	
										-	
										1,00	



Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20	MES 7	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.2.44 DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DESMONTE LUMINARIAS				2,00						2,00	
										-	
										-	
										2,00	

Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.4 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.4.6 PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MURO FONDO TIENDA ESCOLAR	3,10		2,80	1,00						8,68	
MURO LATERAL 1 TIENDA ESCOLAR	1,70		2,80	1,00						4,76	
MURO LATERAL 2 TIENDA ESCOLAR	0,60		2,80	1,00						1,68	
										15,12	



Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	7.2 ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.2.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	UND.	ML	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CIELO RASO LADO 1	3,50			1,00						3,50	
CIELO RASO LADO 2	3,00			1,00						3,00	
CIELO RASO LADO 3	3,50			1,00						3,50	
CIELO RASO LADO 4	3,00			1,00						3,00	
										13,00	



Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	7.2 ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.2.39 WIN DE ALUMINIO	UND.	ML	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
EN FILOS DE TERMINACION DE ENCHAPE	1,58		2,80	1,00						2,80	
EN FILOS DE TERMINACION DE ENCHAPE	1,00		2,80	1,00						2,80	
										5,60	

Observaciones NO SE PUEDE COBRAR COMO ML DE ENCHAPE YA QUE EL MURO ES DE 1.8 8 ML Y EL OTRO MURO ERS DE 1

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	8.1 MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	8.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MURO FONDO TIENDA ESCOLAR	3,10		2,80	1,00						8,68	
MURO LATERAL 1 TIENDA ESCOLAR	1,70		2,80	1,00						4,76	
MURO LATERAL 2 TIENDA ESCOLAR	0,60		2,80	1,00						1,68	
										15,12	



Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	9.3 OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA MICROPERFORADA CAL 18 (PROTECTOR MALLA CALIBRE 18 MICROPERFORADA)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MODULOS CONTRA VENTANAS EXTERIORE	0,20		0,60	3,00						0,36	
										0,36	

Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.1.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
TAPA REGISTRO EN MURO				1,00						1,00	
										1,00	

Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	14.1 CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	14.1.1 CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
AR EA DE CAFETERIA	3,50	3,00		1,00						10,50	
										10,50	





Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	15.2 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.2.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
	2,89		1,20	1,00	3,47					3,47	
	0,56		1,20	1,00	0,67					0,67	
	4,92		1,20	1,00	5,90					5,90	
	1,80		1,20	1,00	2,16					2,16	
	0,95		1,20	3,00	3,42					3,42	
										15,62	



Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	15.2 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.2.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION FIJA O MOVIL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. INC PELICULA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS POR UNA CARA, ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS COMO BARRAS DE GIRO, MANIJAS, CHAPAS	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
	2,89		2,30	1,00	6,65					6,65	
	0,56		2,30	1,00	1,29					1,29	
	4,92		2,30	1,00	11,32					11,32	
	1,80		2,30	1,00	4,14					4,14	
	0,95		2,30	3,00	6,56					6,56	

Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	20,1 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ASEO CAFETERIA	3,50		3,00	1,00	10,50					10,50
ASEO BIBLIOTECA	8,37		2,75	1,00	23,02					23,02
										33,52

CROQUIS



Observaciones

RESIDENTE DE OBRA
Ing CARLOS BOTIA
CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:914 - COLEGIO RODRIGO ARENAS SEDE A SIMON BOLIVAR		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 23 **MES** 7 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.44 DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	UN	REF.	5,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
DESMONTE BALAS DE BAÑO				5,00						5,00	
TOTAL										5,00	

Observaciones

María Paula Giron G.

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20 MES 7 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	1,3 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1,3,5 MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
VENTANA DE AULA JUNTO A BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA		2,50	0,50	1,00						1,25	
										1,25	

Observaciones	

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1,3 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1,3,7 MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CAJAS EXISTERNTE BAÑO NIÑAS				2,00						2,00	
CAJAS EXISTERNTE EXTERIOR				1,00						1,00	
										3,00	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20	MES 7	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1,4 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.4.3 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	1,00	0,30	0,15	2,00						2,00	
										2,00	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20	MES 7	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	2.2 CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.2.20 RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.12 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
RAMPA ACCESO BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	0,30	1,00	0,12	1,00						0,300	
										0,30	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20 MES 7 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	4.2 RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.2.11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 4" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	ML	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-L	1,23		2,80	1,00						4,03	
										4,03	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20	MES 7	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	5.1 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	5,1,12 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
COCINA				1,00						1,00	
										1,00	

Observaciones	

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20 MES 7 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	5.1 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO NIÑAS				1,00						1,00
COCINA				1,00						1,00
BAÑO PROFESORES				1,00						1,00
BAÑO MOB REDUCIDA				1,00						1,00
										4,00

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20	MES 7	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	5.1 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	5.1.72 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO NIÑAS				4,00						4,00
COCINA				3,00						1,00
BAÑO PROFESORES				1,00						1,00
BAÑO MOB REDUCIDA				1,00						1,00
										7,00

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20 MES 7 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	5.1 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.1.83 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED DIAMETRO 0.30 M - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO PROFESORES				1,00						1,00
BAÑO MOB REDUCIDA				1,00						1,00
										2,00

CROQUIS



Observaciones	

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20 MES 7 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		


CAPITULO	5.1 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.1.88 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO NIÑAS				4,00						4,00
COCINA				3,00						2,00
										6,00

CROQUIS



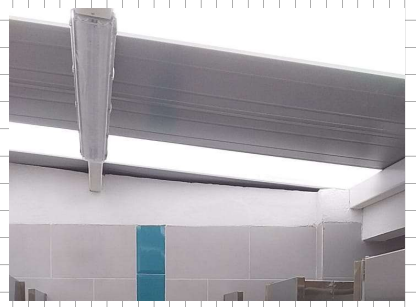

Observaciones	

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	8,1 MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	8,1,4 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	UND. M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MOVILIDAD REDUCIDA	1,41		2,13	1,00						3,00
MOVILIDAD REDUCIDA	1,41		2,13	1,00						3,00
MOVILIDAD REDUCIDA	2,17		2,13	1,00						4,62
MOVILIDAD REDUCIDA	1,00		2,13	1,00						2,13
MOVILIDAD REDUCIDA	0,19		2,10	1,00						0,40
BAÑO DE NIÑAS	1,06		2,13	1,00						2,26
BAÑO DE NIÑAS	2,87		2,13	1,00						6,11
BAÑO DE NIÑAS	5,58		2,13	1,00						11,89
BAÑO DE NIÑAS	0,62		2,13	1,00						1,32
BAÑO DE NIÑAS	0,12		2,13	1,00						0,26
BAÑO DE NIÑAS	2,16		2,13	1,00						4,60
BAÑO DE NIÑAS	0,14		2,13	1,00						0,30
BAÑO DE NIÑAS	0,44		2,13	1,00						0,94
BAÑO DE NIÑAS	0,12		2,13	1,00						0,26
BAÑO DE NIÑAS	0,42		2,13	1,00						0,89
BAÑO DE NIÑAS	3,03		2,13	1,00						6,45
BAÑO DE NIÑAS	0,72		2,13	1,00						1,53
BAÑO DE NIÑAS	0,40		2,13	1,00	-					0,85
										50,82

CROQUIS







MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20	MES 7	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	8,1 MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	8,1,4 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS	V. PARCIAL	VANOS	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS

Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20	MES 7	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	9,1 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA		0,80	2,50	1,00						2,00	
BAÑO NIÑAS		1,00	2,50	1,00						2,50	
										4,50	



Observaciones	

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20	MES 7	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	9,1 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.1.33 MARCO DE PUERTAS (INCLUYE PINTURA Y BASE ANTICORROSIVO)	UND.	ML	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA		1,00	2,50	1,00						6,00	
BAÑO NIÑAS		0,80	2,50	1,00						5,80	
										11,80	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20 MES 7 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA				1,00						1,00	
										1,00	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20 MES 7 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.1.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑAS				1,00						1,00	
										1,00	



Observaciones	

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20 MES 7 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	11.1.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑAS				2,00						2,00	
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA				1,00						1,00	
										3,00	



Observaciones	

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20 MES 7 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	12.1 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.1.12 SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DISCAPACITADOS FIJA A MURO L= 60 CM	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA				1,00						1,00	
										1,00	

Observaciones

CONTRATISTA


Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20 MES 7 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	12.1 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	12.1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE A MURO EN ACERO INOXIDABLE - MOVILIDAD REDUCIDA	UND.	UN	REF.	

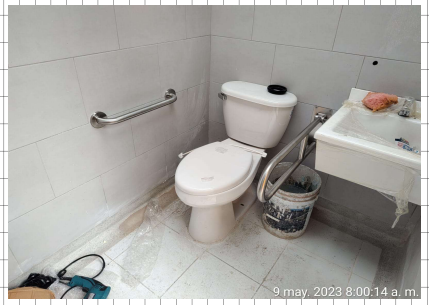AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA				1,00						1,00	
										1,00	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20	MES 7	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	13.4 PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.4.4 ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑOS	4,45	0,20	0,20	2,00						6,23	
										6,23	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 20 MES 7 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	17,1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	17.1.4 CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	ML	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑOS	4,45			1,00						4,45	
										4,45	



Observaciones	

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN — CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C - SAN VICENTE		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 20 MES 7 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	20.1 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑAS PISOS	7,25	3,58		1,00						25,96	
BAÑO NIÑAS PARED	17,68		2,13	1,00						37,66	
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA PISOS	1,85	1,80		1,00						3,33	
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA PARED	6,18		2,01	1,00						12,44	
COCINA	2,60	3,45		1,00						8,97	
BAÑO DOCENTRES	2,90	2,90		1,00						8,41	
AREAS AFERENTES	7,15	7,23		1,00						51,69	
										148,46	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR
