ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado N° I-2023-97754
Fecha: 29-08-2023 - 19:36
Folios: 1 Anexos:
Radicador: LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 70COE

Bogotá D.C. agosto 29 de 2023

MEMORANDO

PARA: **MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS**
Líder área Administrativa y financiera DCCEE

DE: **Arq. LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES**
Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría 4146310 -22
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

ASUNTO: Se remite para revisión y trámite acta parcial No. 8 Contrato de obra 4077646-22 Contratista Consorcio Constructor 2022.

Respetada Ingeniera María Ayde,

Buen día, para su revisión y trámite respectivo, adjunto los siguientes documentos para el trámite del acta parcial No. 8 del contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077646-2022, suscrito con el Contratista Consorcio Constructor 2022.

1. Oficio de solicitud de aprobación del acta interventoría.
2. Acta parcial 8 en Excel
3. Memorias de Calculo.
4. Aportes parafiscales
5. FURC
6. RUT
7. Pre Factura
8. Resolución DIAN
9. Certificación Bancaria.
10. Acta de autorización de pagos No. 8 por interventoría

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente;

Arq. LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES
Apoyo a la supervisión contrato de interventoría 4146310-22
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito

.Proyectó: Luis Enrique Campos Torres – Apoyo a la Supervisión interventoría

CONSORCIO INTERCEL

Bogotá D.C, agosto 28 de 2023

CITC-SED-379-2023

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: Arq. Carlos Rolando Arias T.
Supervisor General
rarias@educacionbogota.gov.co
Atn: Arq. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
lecampos@educacionbogota.gov.co Ciudad.

Ref: CO1.PCCNTR.4146310 cuyo objeto es INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA - GRUPO 10.

Asunto: Entrega de Acta Parcial No. 08 Contrato de Obra 4077646/2022

Por medio de la presente, se remite acta parcial No. 08 contrato 4077646/2022 correspondiente al periodo del 03/08/2023 hasta el 02/09/2023 la cual fue revisada y aprobada por la interventoría, con la siguiente documentación anexa:

1. Carta Remisoria
2. Acta Parcial No. 8 (PDF y editable)
3. Carta para autorizar el pago PDF
4. Memorias de cantidades por frente PDF
5. FURC
6. Pre Factura y Resolución de facturación DIAN
7. Certificación Bancaria
8. Soportes parafiscales
9. RUT y RIT actualizados

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGUIZAMO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCEL
Proyecto: Arq. Myriam González

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO

RADICADOR

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública					Otro, Cuál?							No.	4077646		Fecha:	19	10	2022
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022												NIT	X	C.C.		No.		901.639.619
Dirección :	CALLE 93BIS No. 19-50 OF 105												Teléfonos		6012572405				
Cesión de contrato:		→	Nombre del cedente										NIT		C.C.		No.		
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte								Entidad donde realiza el Aporte AFP					NIT No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.													Banco						

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	8	8	0	8	3	8	6	7	7					Banco	BANCO DE OCCIDENTE		Ahorros	X	Corriente

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4330
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa			Cesión de derechos económicos					Apoderado		Aplicar a todo el valor neto de giro:			Aplicar valor parcial				
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?						Valor parcial a aplicar							
Beneficiario												NIT		C.C.		No.			
Cuenta Bancaria											Banco				Ahorros		Corriente		

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total																	
Fecha Acta de Inicio	03	01	2023	Adición	→	Adición No.						Fecha				→	Valor adición		
Valor compromiso inicial	$ 11.419.923.186			→	Valor adición(es)											→	Valor total compromiso	$ 11.419.923.186	

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	8	Periodo a pagar:	De	Fecha	03	08	2023	A:	Fecha	02	09	2023							
Recibo a Satisfacción No	8	→	Fecha	02	09	2023	Anticipo		% Anticipo		→	Valor Anticipo											
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada															

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4847-22	07	O2301160113000000763802001-Adelantar diseño, construcción e	19	280.400.368		-	280.400.368			280.400.368
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				280.400.368		-	280.400.368	-	-	280.400.368

Valor en Letras	Doscientos Ochenta millones Cuatrocientos mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos M/L	Total a Pagar	280.400.368

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA					Firma del Directivo responsable del Area funcional	
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR CONSTR. CONS. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS						
Elaborado por:	FELIPE A LEON H			Vo.Bo. Interventor o profesional designado			
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEE						
Fecha elaboración	18	09	2023	Ext:	3147	Fecha aprobación	19 09 2023

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

Oficina Principal
CALLE 93 BIS 19-50 OFICINA 105
BOGOTÁ D.C.
TEL:3196088434

NIT: 901639619-0
contabilidad.picar@gmail.com

Razon Social: **SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**
NIT/CC: **899999061-9**
Contacto: LUIS CAMPOS
Direccion: AV EL DORADO 66-63
Ciudad: BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
Telefono: 601324100000 -
Email: lecampos@educacionbogota.gov.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Factura electrónica de venta #19
Fecha Generación: 15/09/2023 09:33
Fecha Vencimiento: 15/09/2023
Forma de Pago: **CONTADO**
Vendido Por: ALVARO

Lista	*Descuento*	*Precio*	*Iva*	*Total U.*	*Cant.*	*Total*
→ 000006 - **CONTRATO 4077646-2022 ACTA PARCIAL N° 8 PERIODO DESDE EL 03/08/2023 HASTA 02/09/2023**						
$217,854,376.66	$0.00	$217,854,376.66	$0.00	$217,854,376.66	1	**$217,854,376.66**
→ 000002 - **A.I.U**						
$62,545,991.54	$0.00	$62,545,991.54	$0.00	$62,545,991.54	1	**$62,545,991.54**

SUBTOTAL	$280,400,368.20
TOTAL	**$280,400,368.20**
DESCUENTO FINANCIERO	**$0.20**
TOTAL A PAGAR	**$280,400,368.00**

Notas

- CONTRATO COPCCNTR 4077646 ACTA PARCIAL N° 8 PERIODO DESDE EL 03/08/23 HASTA 02/09/23 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAM A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PROORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764043314242 valida desde 2023-01-26 hasta 2024-01-26 rangos del 1 al 50 prefijo - responsable del impuesto sobre las ventas. Esta factura de venta se asimila en sus afectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio y causa interés de mora a la máxima tasa permitida por la ley

Total articulos en factura **2**

CUFE: b09006487ea9cda12a4995031900c8308f5eba6c0ba3d642c3ad31111d88b9eb29bc7c5f698b75724ad8d135e8b59ab2
Fecha Generación: 2023-09-15 09:33:01
Fecha Expedición Electronica: 2023-09-15 09:35:18
Email Enviado el: 2023-09-15 09:38:20
Email Recibido el: 2023-09-15 09:42:01

PAGADO	$0

SALDO	$280,400,368

Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 08

CONTRATO DE OBRA No. 4077646 / 22

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA :	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	**OBJETO:**	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10		
DIRECCION :	CALLE 93 BIS No. 19-50 OFICINA 105				
C.C. ó NIT :	901639619-8	**ESTABLECIMIENTOS :**	920-844-832-904-914	**PLAZO INICIAL :**	11 MESES
TELEFONO :	257 2405	**LOCALIZACION :**	KENNEDY Y FONTIBON	**FECHA INICIACION :**	3 de enero de 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCEL	**VR. INICIAL :**	$ 11.419.923.186,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL :**	2 de diciembre de 2023
DIRECCION :	Av. 15 # 124-29 Oficina 601	**ANTICIPO :**		**PLAZO ADICIONAL(MODF.CONT :**	
C.C. ó NIT :	901649204-0	**VR. ADICIONAL :**		**TIEMPO SUSPENDIDO :**	
TELEFONO :	466 0395	**VR. FINAL :**	$ 11.419.923.186,00	**PLAZO TOTAL :**	11 MESES
				FECHA FINAL :	2 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	8-jun-22	4847	20-oct-22	$ 11.419.923.186,00	$ 9.371.771.674,00	$ 280.400.368,00	$ 9.091.371.306,00
TOTAL				$ 11.419.923.186,00	$ 9.371.771.674,00	$ 280.400.368,00	$ 9.091.371.306,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 280.400.368,00 SON: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	920 - VAN IJDEN - SEDE C SAN VICENTE						$ 1.010.797,44		$ 97.649.471,03		$ 98.660.268,47	
1.1.1	REPLANTEO	M2	20,99	$ 3.206,00	$ 67.293,94			20,99	$ 67.293,94	20,99	$ 67.293,94	100,0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	56,30	$ 35.390,00	$ 1.992.457,00			56,30	$ 1.992.457,00	56,30	$ 1.992.457,00	100,0%
1.2.6	DEMOLICION PLACA MALIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	37,59	$ 41.474,00	$ 1.559.007,66			37,59	$ 1.559.007,66	37,59	$ 1.559.007,66	100,0%
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,41	$ 20.982,00	$ 491.188,62			23,41	$ 491.188,62	23,41	$ 491.188,62	100,0%
1.2.15	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,09	$ 24.665,00	$ 569.514,85			23,09	$ 569.514,85	23,09	$ 569.514,85	100,0%
1.2.18	DEMOLICION DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53,17	$ 14.022,00	$ 745.549,74			53,17	$ 745.549,74	53,17	$ 745.549,74	100,0%
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35,73	$ 8.871,00	$ 316.960,83			35,73	$ 316.960,83	35,73	$ 316.960,83	100,0%
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 13.937,00	$ 13.937,00			1,00	$ 13.937,00	1,00	$ 13.937,00	100,0%
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METALICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,91	$ 26.218,00	$ 181.166,38			6,91	$ 181.166,38	6,91	$ 181.166,38	100,0%
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METALICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,17	$ 13.937,00	$ 44.110,61			3,17	$ 44.180,29	3,17	$ 44.180,29	100,2%
1.2.30	DESMONTE Y DESCUBRIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00	$ 14.814,00	$ 118.512,00			8,00	$ 118.512,00	8,00	$ 118.512,00	100,0%
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6 , 4 , 3 , 2 . (INCLUYE EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10,05	$ 16.801,00	$ 168.850,05			10,05	$ 168.850,05	10,05	$ 168.850,05	100,0%
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA	M2	43,05	$ 29.067,00	$ 1.251.334,35			43,05	$ 1.251.334,35	43,05	$ 1.251.334,35	100,0%
1.3.5	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACION DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS. SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS	M2		$ 68.944,00	$ -			1,25	$ 86.180,00	1,25	$ 86.180,00	
1.3.7	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES, INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO	UN		$ 90.977,00	$ -			2,00	$ 181.954,00	2,00	$ 181.954,00	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON POLICORTE, ESPESOR 0.3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,30	$ 13.299,00	$ 43.886,70			2,00	$ 26.598,00	2,00	$ 26.598,00	
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,40	$ 10.569,00	$ 67.641,60			6,40	$ 67.641,60	6,40	$ 67.641,60	
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	12,20	$ 22.906,00	$ 279.453,20			12,02	$ 275.330,12	12,02	$ 275.330,12	
2.1.3	EXCAVACION MANUAL EN RELLENO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,26	$ 103.549,00	$ 130.471,74			1,26	$ 130.471,74	1,26	$ 130.471,74	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	2,34	$ 95.471,00	$ 223.402,14			2,34	$ 223.402,14	2,34	$ 223.402,14	
2.2.20	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.12 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO)	M2		$ 124.084,00	$ -			0,30	$ 37.225,20	0,30	$ 37.225,20	
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	23,37	$ 106.558,00	$ 2.490.260,46			23,37	$ 2.490.260,46	23,37	$ 2.490.260,46	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	45,57	$ 8.667,00	$ 394.958,66			45,57	$ 394.955,19	45,57	$ 394.955,19	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	12,28	$ 44.538,00	$ 546.926,64			12,28	$ 546.926,64	12,28	$ 546.926,64	
3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	2,57	$ 115.494,00	$ 296.819,58			2,57	$ 296.819,58	2,57	$ 296.819,58	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	19,50	$ 68.451,00	$ 1.334.794,50			19,50	$ 1.334.794,50	19,50	$ 1.334.794,50	100,0%
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	4,00	$ 63.365,00	$ 253.460,00			4,00	$ 253.460,00	4,00	$ 253.460,00	100,0%
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	11,80	$ 36.887,00	$ 435.266,60			11,80	$ 435.266,60	11,80	$ 435.266,60	100,0%
4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 61.744,00	$ -			4,03	$ 248.828,32	4,03	$ 248.828,32	
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	UN	3,00	$ 69.240,00	$ 207.720,00			3,00	$ 207.720,00	3,00	$ 207.720,00	100,0%
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	27,60	$ 14.577,00	$ 402.325,20			27,60	$ 402.325,20	27,60	$ 402.325,20	100,0%
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8,00	$ 45.351,00	$ 362.808,00			8,00	$ 362.808,00	8,00	$ 362.808,00	100,0%
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8,00	$ 45.351,00	$ 362.808,00			8,00	$ 362.808,00	8,00	$ 362.808,00	100,0%
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	8,00	$ 138.022,00	$ 1.104.176,00			8,00	$ 1.104.176,00	8,00	$ 1.104.176,00	100,0%
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	8,00	$ 71.750,00	$ 574.000,00			8,00	$ 574.000,00	8,00	$ 574.000,00	100,0%
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	1,00	$ 47.536,00	$ 47.536,00			1,00	$ 47.536,00	1,00	$ 47.536,00	100,0%

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.669,00				10,00	$ 76.690,00	10,00	$ 76.690,00	
	CDI GABRIEL BETANCOURT MEJIA - FILTRACIONES RED HIDRAULICA						$ -		$ 26.269.963,91		$ 26.269.963,91	
1.2.15	DEMOLICION DE MURO EN MAMPUSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.665,00				2,00	$ 49.330,00	2,00	$ 49.330,00	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 16.160,00				216,02	$ 3.490.883,20	216,02	$ 3.490.883,20	
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 38.601,00				2,00	$ 77.202,00	2,00	$ 77.202,00	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UN		$ 18.981,00				18,00	$ 341.658,00	18,00	$ 341.658,00	
4.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 18.384,00				2,00	$ 36.768,00	2,00	$ 36.768,00	
4.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 "	UN		$ 10.899,00				4,00	$ 43.596,00	4,00	$ 43.596,00	
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 16.469,00				2,00	$ 32.938,00	2,00	$ 32.938,00	
4.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1"	UN		$ 7.451,00				3,00	$ 22.353,00	3,00	$ 22.353,00	
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 144.542,00				1,00	$ 144.542,00	1,00	$ 144.542,00	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 CM COLOR BLANCO	M2		$ 58.095,00				2,00	$ 116.190,00	2,00	$ 116.190,00	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 33.421,00				2,00	$ 66.842,00	2,00	$ 66.842,00	
15.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	M2		$ 104.556,00				1,79	$ 187.155,24	1,79	$ 187.155,24	
15.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION FIJA O MOVIL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, INC PELICULA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS POR UNA CARA. ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS	M2		$ 1.034.967,00				20,41	$ 21.123.676,47	20,41	$ 21.123.676,47	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.669,00				70,00	$ 536.830,00	70,00	$ 536.830,00	
	CDI MARSELLA - ATENCION EMERGENCIA BAÑOS						$ -		$ 7.129.988,83		$ 7.129.988,83	
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00				239,87	$ 769.023,22	239,87	$ 769.023,22	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.390,00				9,25	$ 327.357,50	9,25	$ 327.357,50	
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.613,00				4,00	$ 142.452,00	4,00	$ 142.452,00	
1.2.14	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.510,00				4,00	$ 122.040,00	4,00	$ 122.040,00	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.650,00				1,00	$ 22.650,00	1,00	$ 22.650,00	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.299,00				13,20	$ 175.546,80	13,20	$ 175.546,80	
2.1.3	EXCAVACION MANUAL EN RELLENO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 103.549,00				2,00	$ 207.098,00	2,00	$ 207.098,00	
2.1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3		$ 47.146,00				5,00	$ 235.730,00	5,00	$ 235.730,00	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 95.471,00				2,00	$ 190.942,00	2,00	$ 190.942,00	
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 122.753,00				4,00	$ 491.012,00	4,00	$ 491.012,00	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.912,00				30,69	$ 242.819,28	30,69	$ 242.819,28	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UN		$ 18.981,00				8,00	$ 151.848,00	8,00	$ 151.848,00	
4.8.2	CAJA DE INSPECCION 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UN		$ 729.577,00				1,00	$ 729.577,00	1,00	$ 729.577,00	
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 144.542,00				2,00	$ 289.084,00	2,00	$ 289.084,00	
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 3.798,00				59,00	$ 224.082,00	59,00	$ 224.082,00	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2		$ 43.798,00				4,00	$ 175.192,00	4,00	$ 175.192,00	
7.1.8	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M		$ 55.956,00				1,00	$ 55.956,00	1,00	$ 55.956,00	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2		$ 150.616,00				4,00	$ 602.464,00	4,00	$ 602.464,00	
11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 24.861,00				4,00	$ 99.444,00	4,00	$ 99.444,00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.669,00				239,87	$ 1.839.563,03	239,87	$ 1.839.563,03	
20.1.5	PROTECCION PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTON CORROGADO, PLASTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2		$ 6.018,00				6,00	$ 36.108,00	6,00	$ 36.108,00	
	CDI NUEVA CASTILLA - ATENCION EMERGENCIA INUNDACION DE CUARTO DE MAQUINA						$ -		$ 1.797.294,00		$ 1.797.294,00	
1.4.8	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 1.797.294,00				1,00	$ 1.797.294,00	1,00	$ 1.797.294,00	
	CDI DURAN DUSSAN - COCINA						$ -		$ 66.776.120,79		$ 66.776.120,79	
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00				150,00	$ 480.900,00	150,00	$ 480.900,00	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.390,00				25,00	$ 884.750,00	25,00	$ 884.750,00	
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E = 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20.982,00				135,12	$ 2.835.087,84	135,12	$ 2.835.087,84	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.299,00				57,40	$ 763.362,60	57,40	$ 763.362,60	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 36.887,00				4,00	$ 147.548,00	4,00	$ 147.548,00	
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 69.240,00				4,00	$ 276.960,00	4,00	$ 276.960,00	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M		$ 17.424,00				152,94	$ 2.664.826,56	152,94	$ 2.664.826,56	
7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO	M2		$ 181.051,00				135,12	$ 24.463.611,12	135,12	$ 24.463.611,12	
7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 52.105,00				22,20	$ 1.156.731,00	22,20	$ 1.156.731,00	
9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UN		$ 825.141,00				32,50	$ 26.817.082,50	32,50	$ 26.817.082,50	
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 10.823,00				10,12	$ 109.528,76	10,12	$ 109.528,76	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 5.453,00				25,52	$ 139.160,56	25,52	$ 139.160,56	
13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 18.544,00				10,12	$ 187.665,28	10,12	$ 187.665,28	
13.2.13	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS - AREA DE COLUMNAS - (HASTA 60 CM)	M		$ 11.477,00				6,23	$ 71.501,71	6,23	$ 71.501,71	
17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M		$ 29.887,00				152,94	$ 4.570.917,78	152,94	$ 4.570.917,78	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.669,00				157,32	$ 1.206.487,08	157,32	$ 1.206.487,08	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 11.419.923.186,00	$ 280.400.368,20	$ 2.048.151.515,01	$ 2.328.551.883,21	20,39%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	( )				
VALOR A PAGAR		$ 280.400.368,20	$ 2.048.151.515,01	$ 2.328.551.883,21	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA				
	VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO				

SALDO DEL CONTRATO	$ 9.091.371.306,00	SALDO POR AMORTIZAR	

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	-$ 0,20		-$ 3,01		-$ 3,21	
	$ 280.400.368,00		$ 2.048.151.512,00		$ 2.328.551.880,00	
PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		

NOMBRE DE CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
C.C. O NIT : 901639619-8
REP. LEGAL : ÁLVARO ENRIQUE RODRÍGUEZ PEREZ
C.C. : 72.270.722 de Barranquilla

NOMBRE DE INTERVENTORIA : CONSORCIO INTERCEL
C.C. O NIT : 901649204-0
REP. LEGAL : CARLOS ENRIQUE ESCOBAR
C.C. : 80.424.760

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 08

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077646-22 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022.

Correspondiente al periodo: 03 DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los DOS (02) días del mes de septiembre del 2023, se reunieron las siguientes personas: CARLOS ENRIQUE ESCOBAR, identificado con cedula No. 80.424.760 de Bogotá en su condición de Representante Legal de CONSORCIO INTERCEL con NIT. 901.649.204-0 en calidad de Interventor, y ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ, identificado con cedula No. 72.270.722 de Barranquilla - Atlántico, en su condición de Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022, con NIT. 901.639.619-0 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	($ 11.419.923.186) ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.
FORMA DE PAGO:	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCEL

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 08, el cual corresponde a un valor de ($ $280.400.368,00) DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 20,39%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

INTERVENTOR
CARLOS ENRIQUE ESCOBAR L
Representante Legal
CONSORCIO INTERCEL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764043314242

(415)7707212489984(8020) 001876404331424 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 9 6 1 9	0				

11. Razón social
CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 93 BIS 19 50 OF 105

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-01-26 / 06:27:29 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ PEREZ ALVARO ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 72270722 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

997. Fecha formalización 2023-01-26 18:27:29

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764043314242

(415)7707212489984(8020) 001876404331424 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 9 6 1 9	0				

11. Razón social

CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 CL 93 BIS 19 50 OF 105	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		1	50	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CERTIFICADO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Los suscritos ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ identificado con C.C. No. 72.270.722 de Barranquilla quien actual como representante legal del CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 y ASTRID DIAZ CABEZAS identificada con CC. No. 38.235.389 de Ibagué, y con tarjeta profesional No. T-84.000 de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora del CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 identificado con NIT 901.639.619-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 02 días del mes de septiembre de 2023.

ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 72.270.722 de Barranquilla

ASTRID DIAZ CABEZAS
CONTADORA
T.P. No. 84000-T C.C. No. 38.235.389 de Ibagué

Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente certificamos que el cliente **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022** identificado con NT **901639619-0** es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el día **18/10/2022** con la Cuenta Ahorros **No 880-83867-7** Denominada **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022.** La cual se Encuentra Activa y Vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022.** Es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **28** de **AGOSTO** de **2023** en la ciudad de Riohacha.

Cordialmente,


Banco de Occidente
OFICINA RIOHACHA
PAOLA ANDREA CUBILLOS GARCIA

PAOLA ANDREA CUBILLOS GARCIA
Asesor de Soporte Comercial
Oficina Riohacha

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1.PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.15 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	0,25

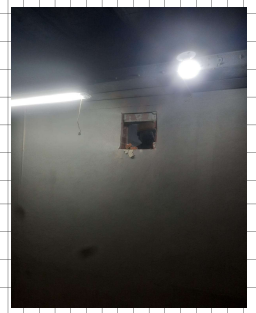AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
VENTANA EXTRACTOR	0,50	0,50	N/A	1,00						0,25	
										-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
TOTAL										0,2500	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		


CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1.PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.1 PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA	UND.	M	REF.	11,80

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
VENTANA EXTRACTOR A PATIO	0,50	0,50	N/A	4,00						2,00
VENTANA EXTRACTOR A LABORATORIO	0,50	0,50	N/A	4,00						2,00
TUBERIA LABORATORIO PARED			2,90	2,00						5,80
TUBERIA LABORATORIO PISO	1,00			2,00						2,00
TOTAL										11,8000

CROQUIS

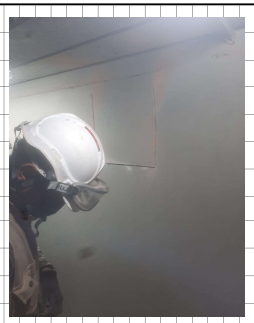

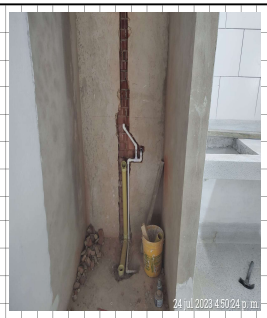

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.6 PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m2	REF.	27,61

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MESONES LABORATORIO	0,50		0,95	8,00						3,81	
MESONES LABORATORIO	5,25		0,95	4,00						19,99	
MESONES LABORATORIO	1,00		0,95	4,00						3,81	
TOTAL										27,6100	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M3	REF.	34,79

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
EXCAVACION	3,00	3,00	0,35	2,00						6,30	
EXCAVACION PARA LABORATORIOS	8,37	7,15	0,25	1,00						14,96	
EXCAVACION PARA BAÑOS	12,10	4,30	0,26	1,00						13,53	
										34,7900	

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.17 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND.	M3	REF.	28,49

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
EXC AVA	8,37	7,15	0,25	1,00						14,96	
EXCAVACION PARA BAÑOS	12,10	4,30	0,26	1,00						13,53	
										28,4900	

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	3.MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.3.4 ANCLAJES VARILLA 1/4" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO ASATISFACCIÓN)	UND.	UND	REF.	4,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MESON 1 LABORATORIO				2,00						2,00	
MESON 2 LABORATORIO				2,00						2,00	
TOTAL										4,0000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	4 RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4,2,7 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	ML	REF.	2,30

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
DESAGUE LAVA OJOS X MURO			1,10							1,10
DESAGUE LAVA OJOS X PISO			1,20							1,20
TOTAL										2,3000

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	4 RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4,3,17 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	ML	REF.	2,70

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
TUBERIA PRESION DUCHA Y LAVA OJOS			2,30	1,00						2,30	
TOTAL										2,7000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023


DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4,3,34 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO GALVANIZADO 1/2"	UND.	un	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
codo galvanizado en LAVA OJOS				1,00						1,00	
TOTAL										1,0000	

Observaciones



CONTRATISTA



Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UND.	un	REF.	2,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
punto hidrtaulico lava ojos				1,00						1,00	
punto hidrtaulico ducha emergencia				1,00						1,00	
TOTAL										2,0000	





Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22 MES 8 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	4 RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.6.6 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UND.	un	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
punto sanitartio para lava ojos				1,00						1,00	
TOTAL										1,0000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22 MES 8 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	4 RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.11.19 SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2"	UND.	un	REF.	2,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
llave manguera en baño niños				1,00						1,00
llave manguera en baño niñas				1,00						1,00
TOTAL										2,0000

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				


CAPITULO	5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5,1,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND.	UN	REF.	4,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
interruptor deposito laboratorio				1,00						1,00	
interruptor baño movilidad reducida				1,00						1,00	
bnaño niñas				2,00						2,00	
TOTAL										4,0000	



Observaciones



CONTRATISTA



Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				


CAPITULO	5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND.	UN	REF.	2,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
laboratorio					1,00					1,00	
baño niños					1,00					1,00	
TOTAL										2,0000	



Observaciones	EN LABORATORIO SE INSTALA UNO TRIPLE



CONTRATISTA



Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	5.1.14 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND.	UN	REF.	14,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
mesones laboratorio				8,00						8,00	
muros laboratorio				3,00						3,00	
deposito laboratorio				1,00						1,00	
baño niños				1,00						1,00	
baño niñas				1,00						1,00	
TOTAL										14,0000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.1.49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UND.	ML	REF.	6,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
baño niños	2,48			1,00						2,48	
baño niñas	3,52			1,00						3,52	
TOTAL										6,0000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				


CAPITULO	5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.1.56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	UND.	ML	REF.	6,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
baño niños	2,48			1,00						2,48	
baño niñas	3,52			1,00						3,52	
TOTAL										6,0000	



Observaciones	se instala tuberia emt y con la msima vcantidad de acometida



CONTRATISTA



Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.1.82 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UND.	un	REF.	2,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Deposito laboratorio				1,00						1,00	
Baño movilidad re4ducida				1,00						1,00	
TOTAL										2,0000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.1.86 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS LED T8, INCLUYE SOQUETS. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UND.	UN	REF.	7,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
laboratotio lamparas existentes				7,00						7,00	
TOTAL										7,0000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	5.1.88 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UND.	UN	REF.	12,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑOS				6,00						6,00	
BAÑO NIÑAS				6,00						6,00	
TOTAL										12,0000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	5 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	5.1.99 REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UND.	UN	REF.	6,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
labioratorio				6,00						6,00	
TOTAL										6,0000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	7.PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.1.8 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	UND.	M	REF.	3,15

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
DUCHA LABORATORIO	3,15			1,00						3,15
										-
										-
										-
TOTAL										3,1500

CROQUIS



Observaciones	ESTABA PENDIENTE LA MEDIA CAÑA DE LA DUCHE DEL LABORATORIO

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UND.	m2	REF.	0,80

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
NICHO INTERNO MEDIDOR	0,80		1,00	1,00						0,80	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										0,8000	

Observaciones

CONTRATISTA — **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	UND.	m2	REF.	4,62

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
VENTANA LABORATORIO	2,20		2,10	1,00						4,62
										-
										-
										-
TOTAL										4,6200

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.3.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	UND.	m2	REF.	0,70

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
persiana extractor		0,60	0,50	1,00						0,30
persiana ducha	0,80		0,50	1,00						0,40
										-
										-
TOTAL										0,7000

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UND.	UND	REF.	2,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
POCETA LABORATORIO				2,00						2,00	
										2,0000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UND.	UND	REF.	6,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑOS NIÑAS				3,00						3,00
BAÑOS NIÑOS				2,00						2,00
BAÑO MOVIDAD REDUCIDA				1,00						1,00
LABORATORIO				10,00						10,00
										-10,00
										6,0000

CROQUIS



Observaciones	SE PAGARON 10 UNIDADES EN ACTA 7 QUEDANO 6 UNIDADES PARA EN ACTA No.8

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO EXTENSIBLE	UND.	UND	REF.	3,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
POCETAS LABORATORIO				3,00						3,00	
										3,0000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	12 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES DE 2,10 X 0,30 M. CALIBRE 18, REF. 304, ANTIÁCIDO. INCLUYE INSTALACIÓN	UND.	un	REF.	3,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
LABORATORIO				3,00						3,00	
TOTAL										3,0000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	12 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES ELÉCTRICO DE 20X20 CM	UND.	UN	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
LABORATORIO				1,00						1,00
TOTAL										1,0000

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA


Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.1.2 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	UND.	ML	REF.	1,80

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PAÑETE CONTORNO EXTRACTOR	0,45			4,00						1,80	
TOTAL										1,8000	

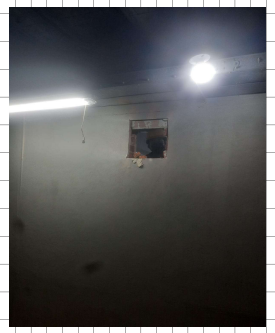

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646


INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.1.5 PAÑETE LISO 1:4 CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND.	m2	REF.	27,61

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MESONES LABORATORIO	0,50		0,95	8,00						3,81	
MESONES LABORATORIO	5,25		0,95	4,00						19,99	
MESONES LABORATORIO	1,00		0,95	4,00						3,81	
TOTAL										27,6100	



Observaciones



CONTRATISTA




Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	m2	REF.	13,93

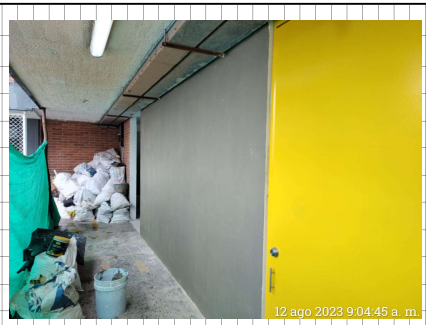AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MURO FRONTAL DE BAÑOS	5,42		2,57	1,00						13,93	
TOTAL										13,9300	

Observaciones	POR SOLICITUD SDE PINTA EN COLOR GRIS BASALTO

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND.	ML	REF.	10,28

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MURO FRONTAL DE BAÑOS			2,57	4,00						10,28	
TOTAL										10,2800	

Observaciones	POR SOLICITUD SDE PINTA EN COLOR GRIS BASALTO

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.8 PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	m2	REF.	55,22

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MESONES LABORATORIO	0,50		0,95	8,00						3,81
MESONES LABORATORIO	5,25		0,95	4,00						19,99
MESONES LABORATORIO	1,00		0,95	4,00						3,81
MESONES LABORATORIO	0,50		0,95	8,00						3,81
MESONES LABORATORIO	5,25		0,95	4,00						19,99
MESONES LABORATORIO	1,00		0,95	4,00						3,81
TOTAL										55,2200

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.9 PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	ML	REF.	8,40

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MESONES LABORATORIO			1,10	4,00						4,40	
MESONES LABORATORIO	1,00			4,00						4,00	
TOTAL										8,4000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022		FECHA	DIA	22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO			CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	15 CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	15.2.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	UND.	m2	REF.	6,78

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO NIÑOS	2,40		0,65	2,00						3,12
BAÑO NIÑAS	2,40		0,65	2,00						3,12
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	0,60		0,90	1,00						0,54
										-
TOTAL										6,7800

CROQUIS

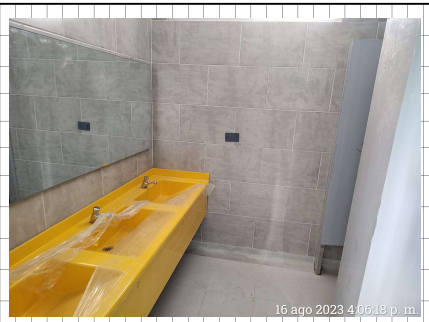

Observaciones	EN CADA BAÑO HAY 2 MESONES PARA LAVAMANOS

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	FECHA	DIA 22	MES 8	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	15 CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	15.2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	UND.	m2	REF.	13,56

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑOS	2,40		0,65	4,00						6,24	
BAÑO NIÑAS	2,40		0,65	4,00						6,24	
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	0,60		0,90	2,00						1,08	
TOTAL										13,5600	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UND.	m2	REF.	144,64

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑOS	5,32	4,30								22,88	
BAÑO NIÑAS	5,20	4,30								22,36	
BAÑOS MOVILIDAD REDUCIDA	1,80	1,80								3,24	
LABORATORIO	7,40	8,00								59,20	
HALL ACCESO A BAÑOS	12,32	3,00								36,96	
TOTAL										144,6400	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	25	MES 8 AÑO 23
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646	
DIRECTOR TECNICO					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1.1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.3 CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Zona verde AREA FRECTANGULAR	6,40	2,50	2,10	1,00						17,80	
TOTAL										17,80000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	25	MES	8	AÑO 23
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646				
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.28 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Puerta salon administrativo 2	0,92	2,15		2,00						3,96	
										-	
										-	
TOTAL										3,96000	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	25	MES 8 AÑO 23
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022	CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646	
DIRECTOR TECNICO					
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.2.29 DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h		
Salon administrativo 1 ventana 2	2,12	1,30								2,76
Salon administrativo 2 ventana 1	2,58	1,32								3,41
Salon administrativo 2 ventana 2	2,40	1,30								3,12
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										9,29000

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

			FECHA	DIA	25	MES 8	AÑO 23
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022		CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646		
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	1.4 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.6 PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Salon 5 Pared 3	6,26	2,17		1,00						13,5800	
Salon 5 Pared 3 cuchilla	4,03	1,51								3,0400	
Salon 5 Pared 3 cuchilla	4,03	1,51								3,0400	
Salon Administrativo 1 Pared 2 cuchilla	3,20	1,27								2,0300	
Salon Administrativo 1 Pared 2 cuchilla	3,20	1,27								2,0300	
Salon Administrativo 1 Pared 3 culata	2,42	0,52		2,00						2,5200	
Salon Administrativo 1 Pared 4 cuchilla	3,20	1,27								2,0300	
Salon Administrativo 1 Pared 4 cuchilla	3,20	1,27								2,0300	
Salon Administrativo 1 culata intermedia	3,76	1,16		1,00						4,3600	
Salon Administrativo 2 Pared 1	3,85	0,73		1,00						2,8100	
Salon Administrativo 2 Pared 2 cuchilla	3,20	1,27		1,00						4,0600	
Salon Administrativo 2 Pared 2 cuchilla	3,20	1,27								2,0300	
Salon Administrativo 2 Pared 3 culata	2,42	0,52		2,00						2,5200	
Salon Administrativo 2 Pared 4 cuchilla	3,20	1,27								2,0300	
Salon Administrativo 2 Pared 4 cuchilla	3,20	1,27								2,0300	
Pared externa Salon 6	5,17	3,00			15,51				3,98	11,5300	
Pared externa Baños	4,18	3,00			12,54				4,31	8,2300	
Pared externa Salon administrativo 1	3,74	3,00			11,22				4,92	6,3000	
Pared externa Salon administrativo 2	4,28	3,00			12,84				5,24	7,6000	
Pared externa Salon informatica	6,57	3,00			19,71				7,80	11,9100	
Pared externa Salon informatica culata	8,89	0,52		1,00						4,6200	
Pared externa baño niños	2,93	0,52		1,00						1,5200	
Pared externa baño niñas	2,90	0,52		1,00						1,5100	
Salon 6 Pared 2 cuchilla	3,47	1,45		1,00						2,5100	
Salon 6 Pared 2 cuchilla	3,47	1,45		2,00						5,0200	
Salon 6 Pared 4 cuchilla	3,47	1,45		2,00						5,0200	



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.4 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.6 PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
Salon 6 Pared 4 cuchilla	3,47	1,45		2,00						5,0200	
Machones salon informatica	2,20	0,25		10,00						5,5000	
									121,92		
TOTAL										126,43000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

			FECHA	DIA	25	MES 8	AÑO 23
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022		CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646		
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Excavacion nivelacion para placa enfrente de cuarto refrigerios	3,41	0,71	0,10							0,24	
Excavacion Cancha	13,55	17,10	0,05							11,59	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										11,83000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.12 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	UND.	M3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cancha	13,90	19,80	0,15							41,28
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										41,28000

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.2 CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.8 VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
VIGA MURO NUEVO SALON 5	7,05									7,05	
TOTAL										7,05	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.2 CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.13 COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE ACERO)	UND. M	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Columnetas muro nuevo	1,74			2,00						3,48
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										3,48000

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.2 CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.24 PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa enfrente de cuarto de refrigerios	3,61	0,71								2,56
Placa enfrente de baño prescolar	3,41	3,57								12,17
TOTAL										14,7300

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.4 REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	2.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	UND.	KG	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	DIAMETRO	PESO	CANTIDAD		L	a	h			
columnetas muro nuevo	1,94	1/2"	0,99	2,00						3,84	
columnetas muro nuevo	1,94	1/2"	0,99	2,00						3,84	
columnetas muro nuevo flejes	0,33	3/8"	0,56	12,00						2,22	
columnetas muro nuevo flejes	0,33	3/8"	0,56	12,00						2,22	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										12,12000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		


FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.4 REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	UND. KG	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	M2	PESO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Placa enfrente de cuarto de refrigerios	2,56	2,08								5,33
Placa enfrente de baño prescolar	12,17	2,08								25,32
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										30,6500

CROQUIS

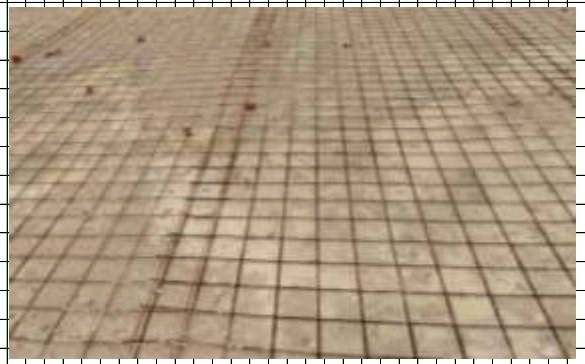

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	3.1 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.1.2 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Muros cubierta informatica	8,89	0,71								6,31
Muros cubierta salon administrativo 2	3,85	0,71								2,73
Muros cubierta salon administrativo 1	3,76	0,71								2,67
Muro nuevo	1,74	2,55								4,44
Muro nuevo	1,74	2,65								4,61
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
		-								-
										-
										-
TOTAL										20,76000

CROQUIS







Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	3.1 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.1.5 MURO BLOQUE HUECO No.4 (HASTA 30 CM)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Muro cubierta Salon administrativo 1	2,38									2,380
Muro cubierta Salon administrativo 2	2,38									2,380
Muro cubierta baños niñas	2,93									2,930
Muro cubierta salon informatica	8,89									8,890
Muro cubierta baños niños	2,90									2,900
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										19,4800

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	3.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UND. UN	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Columnetas muro nuevo salon 5	10,00									10,00	
Anclajes muros de cubierta salon informatica	10,00									10,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										20,00	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.1 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.1.1 PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Muros de cuarto de aseo y shut	2,18	1,31		1,00						2,86000	
Muros de cuarto de aseo y shut	2,18	1,86		1,00						4,05000	
Muros de cuarto de aseo y shut	2,18	1,83		1,00						3,99000	
Muros de cuarto de aseo y shut	2,18	1,87		1,00						4,08000	
Muros de cuarto de aseo y shut	2,18	0,84		1,00						1,83000	
Muros de cuarto de aseo y shut	2,18	0,94		1,00						2,05000	
Salon 5 Pared 3	6,26	2,17		1,00						13,58000	
Salon 5 Pared 3 cuchilla	4,03	1,51		0,50						3,04000	
Salon 5 Pared 3 cuchilla	4,03	1,51		0,50						3,04000	
Salon 6 Pared 2 cuchilla	3,47	1,45		0,50						2,51000	
Salon 6 Pared 2 cuchilla	3,47	1,45		2,00	DOBLE					5,02000	
Salon 6 Pared 4 cuchilla	3,47	1,45		2,00	DOBLE					5,02000	
Salon 6 Pared 4 cuchilla	3,47	1,45		2,00	DOBLE					5,02000	
Baño niños Pared 2	6,40	2,25		1,00						14,40000	
Baño niños Pared 2 cuchilla	3,20	1,45		0,50						2,32000	
Baño niños Pared 2 cuchilla	3,20	1,45		0,50						2,32000	
Baño niños Pared 3	2,90	3,02		1,00	8,76				0,54	8,22000	
Baño niños Pared 4	4,67	2,67		1,00						12,47000	
Baño niños Pared 4 cuchilla	4,67	2,67		0,50						6,23000	
Baño niños culata intermedio	2,90	1,16		1,00						3,36000	
Baño niñas Pared 2	4,67	2,67		1,00						12,47000	
Baño niñas Pared 2 cuchilla	4,67	2,67		0,50						6,23000	
Baño niñas Pared 3	2,93	3,02		1,00	8,85				0,53	8,32000	
Baño niños Pared 4	6,40	2,25		1,00						14,40000	
Baño niños Pared 4 cuchilla	3,20	1,45		0,50						2,32000	
Baño niños Pared 4 cuchilla	3,20	1,45		0,50						2,32000	
Baño niñas culata intermedio	2,93	1,16		1,00						3,40000	
Salon Administrativo 1 Pared 2 cuchilla	3,20	1,27		0,50						2,03000	
Salon Administrativo 1 Pared 2 cuchilla	3,20	1,27		0,50						2,03000	
Salon Administrativo 1 Pared 3 culata	2,42	0,52		2,00						2,52000	
Salon Administrativo 1 Pared 4 cuchilla	3,20	1,27		0,50						2,03000	
Salon Administrativo 1 Pared 4 cuchilla	3,20	1,27		0,50						2,03000	
Salon Administrativo 1 culata intermedia	3,76	1,16		1,00						4,36000	
Salon Administrativo 2 Pared 1	3,85	0,73		1,00						2,81000	
Salon Administrativo 2 Pared 2 cuchilla	3,20	1,27		0,50						2,03000	
Salon Administrativo 2 Pared 2 cuchilla	3,20	1,27		0,50						2,03000	
Salon Administrativo 2 Pared 3 culata	2,42	0,52		2,00						2,52000	










MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.1 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.1.1 PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
Salon Administrativo 2 Pared 4 cuchilla	3,20	1,27		0,50						2,03000
Salon Administrativo 2 Pared 4 cuchilla	3,20	1,27		0,50						2,03000
Pared externa Salon 6	5,17	3,00		1,00	15,51				3,98	11,53000
Pared externa Baños	4,18	3,00		1,00	12,54				4,31	8,23000
Pared externa Salon administrativo 1	3,74	3,00		1,00	11,22				4,92	6,30000
Pared externa Salon administrativo 2	4,28	3,00		1,00	12,84				5,24	7,60000
Pared externa Salon informatica	6,57	3,00		1,00	19,71				7,80	11,91000
Pared externa Salon informatica culata	8,89	0,52		1,00						4,62000
Pared externa baño niños	2,93	0,52		1,00						1,52000
Pared externa baño niñas	2,90	0,52		1,00						1,51000
TOTAL										236,54000

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.1 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.1.2 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Salon 5 Ventana 1	6,15			1,00						6,15
Salon 5 Ventana 1	0,45			1,00						0,45
Salon 5 Ventana 2	6,95			2,00						13,90
Salon 5 Ventana 2	1,30			2,00						2,60
Salon 5 Puerta	1,70			1,00						1,70
Salon 5 viga	7,05			1,00						7,05
Pasillo puerta 1	1,00			1,00						1,00
Pasillo puerta 1	2,10			2,00						4,20
Pasillo puerta 2	1,00			1,00						1,00
Pasillo puerta 2	2,10			2,00						4,20
Viga cinta Salon 3	2,00			3,00						6,00
Viga cinta Salon 3	0,25			1,00						0,25
Viga cinta enfrente Salon 6	2,25			3,00						6,75
Viga cinta enfrente Salon 6	0,25			1,00						0,25
Viga cinta enfrente Baños niños	2,25			3,00						6,75
Viga cinta enfrente Baños niños	0,25			1,00						0,25
Viga cinta atras Baños niños	2,00			3,00						6,00
Viga cinta atras Baños niños	0,25			1,00						0,25
Machones salon informatica	2,20			30,00						66,00
TOTAL										134,7500

CROQUIS






Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.2.1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Salon prescolar Pared 1	5,78	2,30		1,00	13,29				7,09	6,20	
Salon prescolar Pared 1	5,78	1,67		0,50						4,83	
Salon prescolar Pared 2	5,79	3,74		1,00						21,65	
Salon prescolar Pared 3	5,78	2,30		1,00	13,29				1,34	11,96	
Salon prescolar Pared 3	5,78	1,67		0,50						4,83	
Salon prescolar Pared 4	5,79	2,90		1,00						16,79	
Salon 1 Pared 1	7,17	3,61		1,00	25,88				4,63	21,25	
Salon 1 Pared 2	7,41	2,34		1,00						17,34	
Salon 1 Pared 2	7,41	1,42		0,50						5,26	
Salon 1 Pared 3	7,17	2,68		1,00	19,22				9,69	9,53	
Salon 1 Pared 4	7,41	2,32		1,00						17,19	
Salon 1 Pared 4	7,41	1,52		0,50						5,63	
Salon 2 Pared 1	7,03	2,71		1,00	19,05				3,25	15,80	
Salon 2 Pared 2	8,04	2,37		1,00						19,05	
Salon 2 Pared 2	4,02	1,21		0,50						2,43	
Salon 2 Pared 2	4,02	1,21		0,50						2,43	
Salon 2 Pared 3	7,03	2,95		1,00	20,74				8,84	11,90	
Salon 2 Pared 4	8,04	2,37		1,00	19,05				1,89	17,16	
Salon 2 Pared 4	4,02	1,21		0,50						2,43	
Salon 2 Pared 4	4,02	1,21		0,50						2,43	
Salon 3 Pared 1	7,03	3,00		1,00	21,09				4,59	16,50	
Salon 3 Pared 2	8,04	2,37		1,00						19,05	
Salon 3 Pared 2	4,02	1,21		0,50						2,43	
Salon 3 Pared 2	4,02	1,21		0,50						2,43	
Salon 3 Pared 3	7,03	3,00		1,00	21,09				8,74	12,35	
Salon 3 Pared 4	4,02	1,21		0,50						2,43	
Salon 3 Pared 4	4,02	1,21		0,50						2,43	
Salon 4 Pared 2	4,02	1,21		0,50						2,43	








MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
Salon 4 Pared 2	4,02	1,21		0,50						2,43	 
Salon 4 Pared 4	4,02	1,21		0,50						2,43	
TOTAL										281,0000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Salon prescolar Puerta	0,90									0,90	
Salon prescolar Puerta	2,10			2,00						4,20	
Salon 1 Puerta	0,90									0,90	
Salon 1 Puerta	2,10			2,00						4,20	
Salon 1 Puerta 2	0,90									0,90	
Salon 1 Puerta 2	2,10									2,10	
Salon 1 Puerta 2	0,67									0,67	
Salon 2 Puerta	0,90									0,90	
Salon 2 Puerta	2,10			2,00						4,20	
Salon 2 Marco	1,94									1,94	
Salon 2 Viga	7,05									7,05	
Salon 3 Puerta	0,90									0,90	
TOTAL										28,86000	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.2.4 PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Pared externa salon 2	1,75	2,83			4,95				1,90	3,05	
Pared externa salon 2	2,36	2,85								6,73	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-						
TOTAL										9,78000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.2.5 PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto primeros auxilios ventana	1,17			2,00						2,34
Cuarto primeros auxilios ventana	1,30			2,00						2,60
Salon prescolar ventana 1	1,30			2,00						2,60
Salon prescolar ventana 2	0,50			2,00						1,00
Salon prescolar ventana 2	2,67			2,00						5,34
Salon 1 ventana 1	2,11			2,00						4,22
Salon 1 ventana 1	1,30			2,00						2,60
Salon 1 ventana 2	6,00			2,00						12,00
Salon 1 ventana 2	1,30			2,00						2,60
Salon 2 ventana 1	6,78			2,00						13,56
Salon 2 ventana 1	0,48			2,00						0,96
Salon 2 ventana 2	6,80			2,00						13,60
Salon 2 ventana 2	1,30			2,00						2,60
Salon 3 ventana 1	5,62			2,00						11,24
Salon 3 ventana 1	0,48			2,00						0,96
Salon 3 ventana 2	6,72			2,00						13,44
Salon 3 ventana 2	1,30			2,00						2,60
Salon 4 ventana 1	5,75			2,00						11,50
Salon 4 ventana 1	0,48			2,00						0,96
Salon 4 ventana 2	1,30			2,00						2,60
TOTAL										109,32

CROQUIS






Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 25 MES 8 AÑO 23

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	20.1 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	20.1.2 DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	UND.	KG	REF.	560KG DE VAN UDEWN

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS M2	PESO		CANTIDAD	V. PARCIAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
TEJA TOTAL	514,00	11,03								5.669,42	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										5669,4200	





Observaciones	SE ADJUNTA EL DOCUMENTPO DONDE SE CONFIRMA 5670 KG DE EL DESCANSO Y 560 KG DE VAN UDEN

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 21 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	UND.	M2	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BUITRON DE ESCAPE	1,00	1,00		1,00						1,0	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										1,000000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA **DIA** 21 **MES** 8 **AÑO** 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	31,47

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
AULA 2	6,52	1,17		1,00						7,6	
	5,36	1,42		8,00						60,9	
	6,52	0,70		1,00						4,6	
PASILLO	2,80	1,17		1,00						3,3	
	3,60	0,70		1,00						2,5	
AULA 1	5,10	0,70		1,00						3,6	
	0,83	1,17		1,00						1,0	
	0,83	0,70		1,00						0,6	
	2,78	1,86		1,00						5,2	
	4,75	2,00		1,00						9,5	
PAGADO CORTE 6										-67,2	
TOTAL										**31,470000**	





Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 21 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND.	M2	REF.	73,73

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
AULA 2	5,30			1,00						5,3
	6,52			4,00						26,1
	2,80			1,00						2,8
PASILLO	0,83			2,00						1,7
	5,36			1,00						5,4
AULA 1	3,60			1,00						3,6
	2,63			11,00						28,9
										-
										-
										-
TOTAL										73,730000

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 21 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.1 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	UND.	UND	M	29,70

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CUBIERTA	7,10			1,00						7,1	
	6,00			1,00						6,0	
	6,50			1,00						6,5	
	8,80			1,00						8,8	
	1,30			1,00						1,3	
					-						
TOTAL										29,70000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 21 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.26 TEJA TRASLUCIDA EN FIBRA ACOPLADA A CUBIERTA TIPO SANDWICH (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO)	UND.	M	REF.	5,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
	5,00			1,00						5,0	
TOTAL										5,00000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 21 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	UND.	M2	REF.	6,42

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	DESCUENTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUBIERTA	4,70	1,00		1,00						4,70
CUBIERTA	4,70	0,15		1,00						0,71
CUBIERTA	4,70	0,15		1,00						0,71
CUBIERTA	1,00	0,15		1,00						0,15
CUBIERTA	1,00	0,15		1,00						0,15
TOTAL										6,4200

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 21 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	UND.	M2	REF.	10,35

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	DESCUENTO	CANTIDAD		L	a	h		
CUBIERTA	4,70	1,00		1,00						4,70
CUBIERTA	4,70	0,15		1,00						0,71
CUBIERTA	4,70	0,15		1,00						0,71
CUBIERTA	1,00	0,15		1,00						0,15
CUBIERTA	1,00	0,15		1,00						0,15
CUBIERTA	6,25	0,25		1,00						1,56
CUBIERTA	6,92	0,25		1,00						1,73
CUBIERTA	1,00	0,25		1,00						0,25
CUBIERTA	1,55	0,25		1,00						0,39
TOTAL										10,35000

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
904 - INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN		

FECHA DIA 21 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UND.	M2	REF.	117,84

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	DESCUENTO	CANTIDAD		L	a	h			
AULAS	7,40	6,90		1,00						51,06	
AULAS	3,00	6,90		1,00						20,70	
AULAS	7,20	6,40		1,00						46,08	
TOTAL										117,840000	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.4 DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m2	REF.	4,64

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
baño niños	3,86	0,60		1,00	2,32					2,32	
baño niñas	3,86	0,60		1,00	2,32					2,32	
TOTAL										4,6400	





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.14 DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m2	REF.	26,19

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
baño niños	1,00	2,28		1,00						2,28
	1,65	1,92		1,00						3,16
	1,34	2,90		1,00						3,89
	0,14	0,94		1,00						0,13
	2,28	3,86		1,00						8,81
baño niñas	2,49	3,75		1,00						9,34
	0,90	1,62		1,00						1,46
	0,96	1,47		1,00						1,41
	0,93	5,62		1,00						5,23
	0,90	3,86		1,00						3,47
	2,20	2,40		1,00						5,28
PAGADO CORTE 6										-18,27
TOTAL										**26,1900**

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA — **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.7 DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m2	REF.	18,63

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
baño niñas	0,22		1,80	2,00	0,79					0,79
baño niñas	1,86		1,80	1,00	3,36					3,36
baño niñas	1,87		1,80	1,00	3,37					3,37
baño niñas	0,37		1,80	1,00	0,67					0,67
baño niñas	1,80		1,80	1,00	3,24					3,24
baño niñas	2,00		1,80	2,00	7,20					7,20
TOTAL										18,6300

CROQUIS





Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		


CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.20 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m2	REF.	58,26

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MURO BAÑÓ NIÑÓS	3,13		1,80	1,00	5,63					5,63	
	0,98		1,80	1,00	1,76					1,76	
	1,34		1,80	1,00	2,41					2,41	
	0,98		1,80	1,00	1,76					1,76	
	2,65		1,80	1,00	4,77					4,77	
	2,28		1,80	1,00	4,10					4,10	
	1,00		1,80	1,00	1,80					1,80	
	2,97		1,80	1,00	5,35					5,35	
	0,98		1,80	1,00	1,76					1,76	
	0,14		1,80	1,00	0,25					0,25	
	1,34		1,80	1,00	2,41					2,41	
	3,86		1,80	1,00	6,95	3,86		0,78	3,01	6,95	
	2,28		1,80	1,00	4,10					4,10	
	3,88		1,80	1,00	6,99					6,99	
BAÑO NIÑAS	1,62		1,80	1,00	2,92					2,92	
	7,02		1,80	1,00	12,64					12,64	
	2,29		1,80	1,00	4,12					4,12	
	3,86		1,80	1,00	6,95					6,95	
	10,06		1,80	1,00	18,11	3,86		0,78	3,01	18,11	

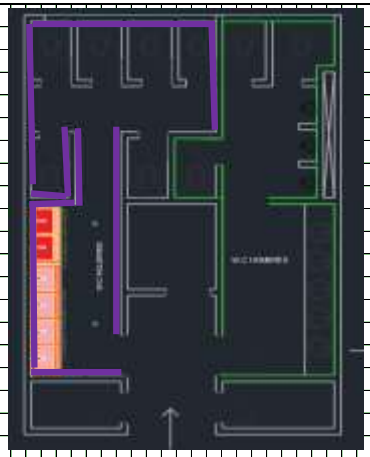





MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.20 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m2	REF.	58,26

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	4,00		1,80	1,00	7,20					7,20	
	pagado corte 7									-43,72	
TOTAL										58,2600	

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023


DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.28 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	4,86

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
baño niños	0,60		0,90	3,00	1,62					1,62
baño niños	0,60		0,90	3,00	1,62					1,62
baño niñas	0,60		0,90	6,00	3,24					3,24
PAGADO CORTE 7										-1,62
TOTAL										**4,8600**

CROQUIS

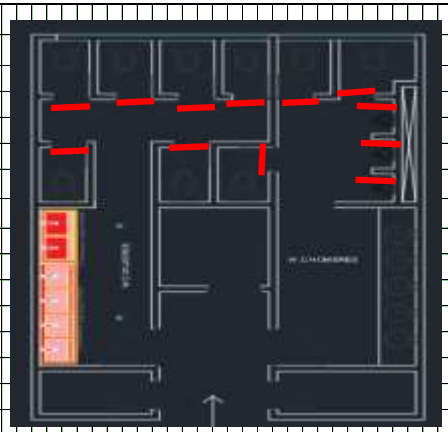

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023


DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.30 DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	un	REF.	16,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
lavamanos baño niños				5,00						5,00
sanitarios baño niños				3,00						3,00
orinal baño niños				3,00						3,00
lavamanos baño niñas				5,00						5,00
sanitarios baño niñas				6,00						6,00
PAGADO CORTE 7										-6,00
TOTAL										16,0000

CROQUIS

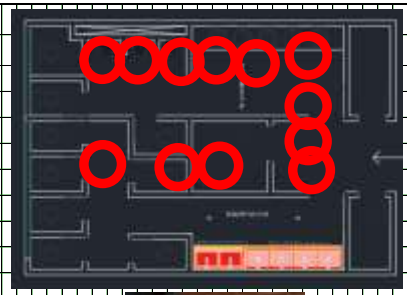



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.33 DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	un	REF.	213,69

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Aula 1	8,74	8,15		1,00						71,23	
Aula 2	8,74	8,15		1,00						71,23	
Aula 3	8,74	8,15		1,00						71,23	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										213,6900	





Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.6 PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m2	REF.	14,92

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑAS	3,97		2,54	1,00						10,08	
BAÑO NIÑAS	3,86		0,55	1,00						2,12	
BAÑO NIÑAS	2,47		0,55	2,00						2,72	
TOTAL										14,9200	

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UND.	un	REF.	4,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
COLUMNA DE AGUA FRIA PRESIUON				4,00						4,00	
TOTAL										4,0000	

Observaciones ARREGLO DE RED DE 2" CON FUGA DETECTADA

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.3.13 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1'' INCLUYE ACCESORIOS	UND.	ml	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
red en baño niños				1,00						1,00	
										-	
TOTAL										1,0000	

Observaciones para cambio de valvulas de bola

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023


DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.7.12 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UND.	un	REF.	3,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Registro de bola pvc en baño niños				2,00						2,00	
Registro de bola pvc en baño niñas				1,00						1,00	
TOTAL										3,0000	

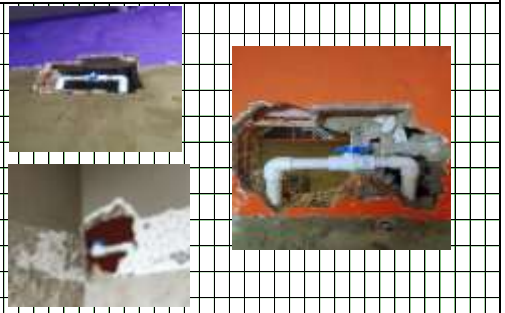

Observaciones cambio de valvulas en baños

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.1.2 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	UND.	ML	REF.	9,20

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NÑAS MURO	0,15		2,30	1,00						2,30	
BAÑO NÑAS MURO	0,15		2,30	1,00						2,30	
BAÑO NÑOS MURO	0,15		2,30	1,00						2,30	
BAÑO NÑOS MURO	0,15		2,30	1,00						2,30	
TOTAL										9,2000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO


INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL — **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.1.3 PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND.	M2	REF.	126,19

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO NÑAS MURO 1	1,84		2,18	1,00						4,01
BAÑO NÑAS MURO 2	3,83		2,57	1,00						9,84
BAÑO NÑAS MURO 3	0,92		2,18	1,00						2,01
BAÑO NÑAS MURO 4	1,63		2,18	1,00						3,55
BAÑO NÑAS MURO 5	0,15		2,18	1,00						0,33
BAÑO NÑAS MURO 6	1,46		2,18	1,00						3,18
BAÑO NÑAS MURO 7	0,77		2,18	1,00						1,68
BAÑO NÑAS MURO 8	3,94		2,57	1,00						10,13
BAÑO NÑAS MURO 9	3,75		2,18	1,00						8,18
BAÑO NÑAS MURO 10	2,48		2,18	1,00						5,41
BAÑO NÑAS MURO 11	0,95		2,18	1,00						2,07
BAÑO NÑAS MURO 12	1,47		2,18	1,00						3,20
BAÑO NÑAS MURO 13	0,84		2,18	1,00						1,83
BAÑO NÑAS MURO 14	1,47		2,18	1,00						3,20
BAÑO NÑAS MURO 15	0,15		2,18	1,00						0,33
BAÑO NÑAS MURO 16	5,44		2,18	1,00						11,86
BAÑO NÑOS MURO 1	3,72		2,18	1,00						8,11
BAÑO NÑOS MURO 2	0,15		2,18	1,00						0,33
BAÑO NÑOS MURO 3	0,70		2,18	1,00						1,53
BAÑO NÑOS MURO 4	0,83		2,18	1,00						1,81
BAÑO NÑOS MURO 5	1,32		2,18	1,00						2,88
BAÑO NÑOS MURO 6	0,97		2,18	1,00						2,11
BAÑO NÑOS MURO 7	2,62		2,18	1,00						5,71
BAÑO NÑOS MURO 8	2,26		2,18	1,00						4,93
BAÑO NÑOS MURO 9	1,00		2,18	1,00						2,18

CROQUIS

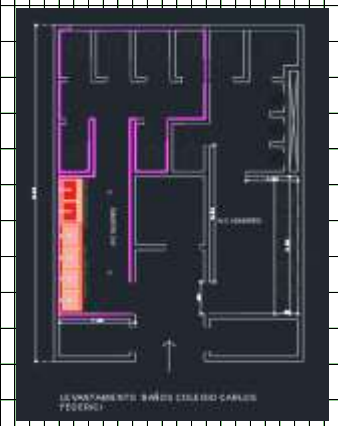





MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.1.3 PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND.	M2	REF.	126,19

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
BAÑO NÑOS MURO 10	0,38		2,18	1,00						0,83
BAÑO NÑOS MURO 11	2,96		2,18	1,00						6,45
BAÑO NÑOS MURO 12	0,96		2,18	1,00						2,09
BAÑO NÑOS MURO 13	0,15		2,18	1,00						0,33
BAÑO NÑOS MURO 14	1,34		2,18	1,00						2,92
BAÑO NÑOS MURO 15	3,78		2,18	1,00						8,24
BAÑO NÑOS MURO 16	2,26		2,18	1,00						4,93
TOTAL										126,1900

CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	17 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	UND.	M2	REF.	213,69

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
AULA 1	8,74	8,15		1,00						71,23	
AULA 2	8,74	8,15		1,00						71,23	
AULA 3	8,74	8,15		1,00						71,23	
										-	
TOTAL										213,6900	



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023
CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.1 REPLANTEO	UND.	m2	REF.	31,36

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
TERRAZA EXTERIOR	4,90	6,40	0,33	1,00						31,36	
TOTAL										31,3600	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.3 CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UND.	ML	REF.	22,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CAFETERIA TERRAZA INTERIOR	5,25	6,40		1,00						5,25	
TERRAZA EXTERIOR	6,25	6,40		1,00						6,25	
TERRAZA EXTERIOR	6,25	6,40		1,00						6,25	
TERRAZA EXTERIOR	4,25	6,40		1,00						4,25	
TOTAL										22,0000	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M3	REF.	10,35

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
TERRAZA EXTERIOR	4,90	6,40	0,33	1,00						10,35	
TOTAL										10,3500	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.5 EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	ML	REF.	6,30

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
EXCAVACION PARA RED DE 3" TERRAZA EXTERIOR	1,50									1,50	
EXCAVACION PARA RED DE 3" TERRAZA EXTERIOR	4,50									4,50	
EXCAVACION PARA RED DE 3" TERRAZA EXTERIOR	0,30									0,30	
TOTAL										6,3000	



Observaciones EXCAVACION PARA TUBERIA SANITARIA

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.9 RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	UND.	M3	REF.	10,35

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
TERRAZA EXTERIOR	4,90	6,40	0,33	1,00						10,35	
TOTAL										10,3500	

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2,2,24 PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	UND.	M3	REF.	31,36

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PLACA TERRAZA EXTERIOR	4,90	6,40	0,10	1,00						31,36	
TOTAL										31,3600	

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2,4,2 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	UND.	M3	REF.	63,97

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	PESO KG/M2	CANTIDAD		L	a	h			
PLACA TERRAZA EXTERIOR	4,90	6,40	2,04							63,97	
TOTAL										63,9700	

Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	ML	REF.	6,30

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PARA RED DE 3" TERRAZA EXTERIOR	1,50									1,50	
RED DE 3" TERRAZA EXTERIOR	4,50									4,50	
RED DE 3" TERRAZA EXTERIOR	0,30									0,30	
TOTAL										6,3000	



Observaciones

EXCAVACION PARA TUBERIA SANITARIA

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.2.15 SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	UN	REF.	2,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
SIFON EN BORDE DE CAÑUELA				2,00						2,00	
TOTAL										2,0000	

Observaciones

EXCAVACION PARA TUBERIA SANITARIA

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 925 - COLEGIO LA FELICIDAD		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.8.8 RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION	UND.	UN	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
NIVELACION DE CAJA				1,00						1,00	
TOTAL										1,0000	

Observaciones

EXCAVACION PARA TUBERIA SANITARIA

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.6 DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	


AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ZONAS DURAS ALREDEDOR TARIMA	17,60	4,10		1,00	-21,68				5.048,00	50,48
ZONAS DURAS PASILLO ALIANZA	22,10	1,84		1,00						40,66
AREA DE ANDEN 1	18,00	1,06		1,00						19,08
AREA DE ANDEN 2	17,60	1,40		1,00						24,64
TOTAL										134,86







CROQUIS

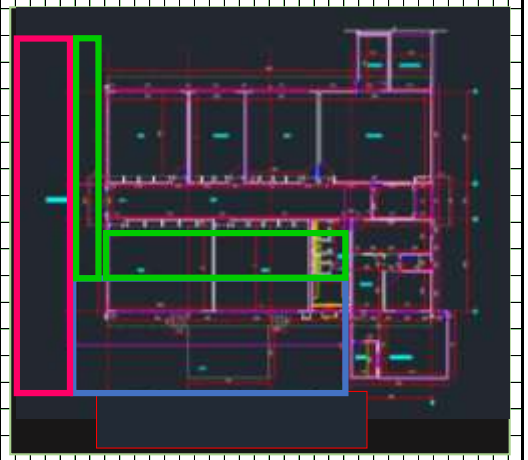

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		


FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M3	REF.	

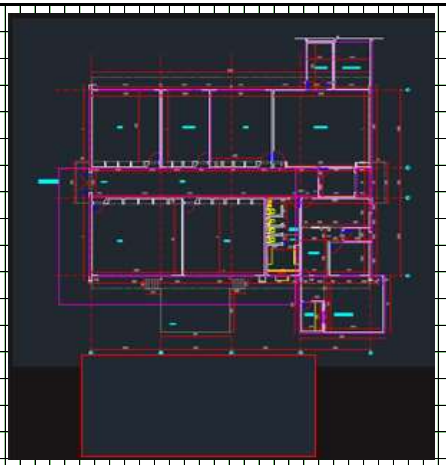AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FALTANTE CANCHA	23,45	15,55	0,04							16,04	
TOTAL										16,0400	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	8.1.5 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
OFICINA PROFESORES	4,50	3,73		1,00						12,71
DIVISION EN BAÑOS	2,83	0,31		1,00						0,86
TOTAL										13,5700

CROQUIS









Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C	

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	9.2 CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
VENTANA OFICINA PROFESORES	2,45		1,07	1,00						2,62
VENTANA BAÑO NIÑOS	2,39		1,40	1,00						3,35
TOTAL										5,9700

CROQUIS







Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UND.	UND	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ORINAL				-4,00						-4,00	
TOTAL										-4,00	



Observaciones

LOS ORINALES INSTALADOS CORRESPONDEN A ORINALES DE ADULTO TIPO PETTIT MARCA CORONA, POR LO TANTO AL NO SER ORINALES DE LINEA INFANTIL SE REALIZA EL CAMBIO AL ITEM QUE CORRESPONDE

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UND.	UND	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ORINAL BAÑO NIÑOS				4,00						4,00	
TOTAL										4,00	



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INCRUSTACIONES ACCESORIOS EN PORCELANA (CINCO PIEZAS)	UND.	UND	REF.	


AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO PROFESORES				2,00						2,00
										-
TOTAL										2,00







CROQUIS

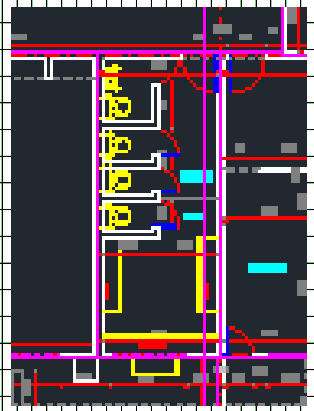

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO


INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UND.	UND	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
GRIFERIA DE LAVAMANOS				1,00						1,00	
TOTAL										1,00	





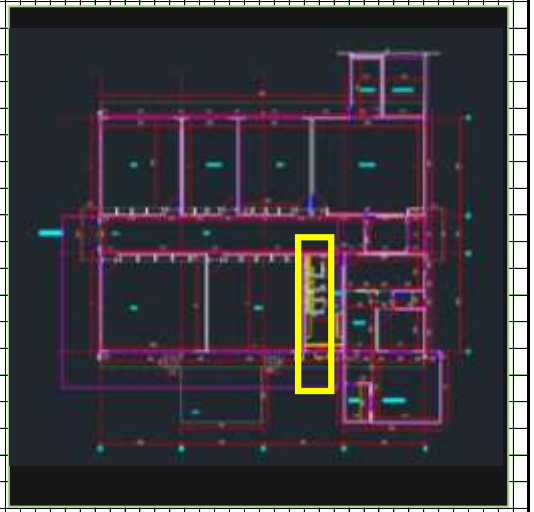

Observaciones	SON 7 LAVAMANOS SE PAGARON 6 EN ACTA ANTERIOR Y QUEDA 1 PARA EL ACTA 8

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	11.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL


ITEM:	11.1.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UND.	UND	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
GRIFERIA TANQUE DE RESERVA				1,00						1,00	
TOTAL										1,00	







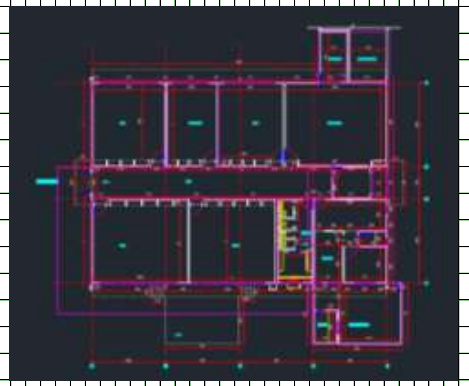

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	


AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PAREDES PASILLOS	37,42		2,20	1,00						76,61
OFICINA DRYWALL	4,50		3,73	2,00						27,86
TOTAL										104,47







CROQUIS

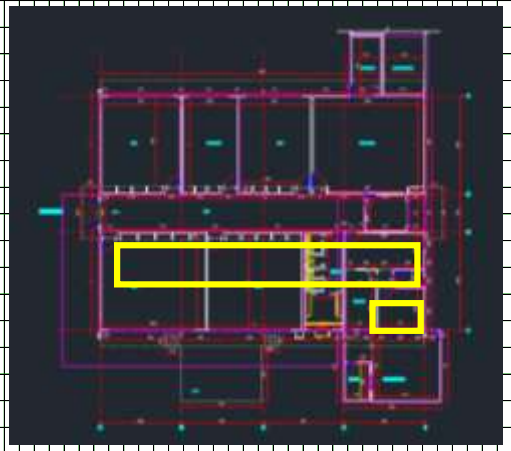

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023


CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND. M L	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
RECORTES PINTURA FILOS DE PUERTAS, FILOS DE VENTANAS, ETC	2,08	0,50		10,00						20,80	
TOTAL										20,80	

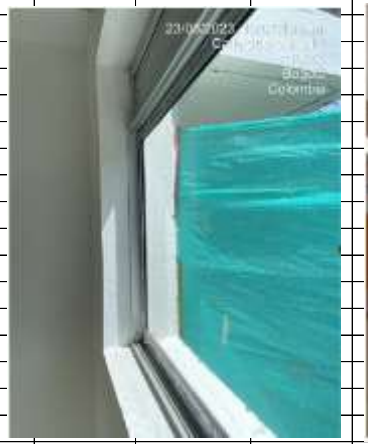





Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 832 - COLEGIO KENNEDY - LOS HEROES - SEDE C		

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	15.2 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
ESPEJO 1 BAÑO	1,82		0,65							1,18
ESPEJO 2 BAÑO	2,45		0,65							1,59
ESPEJO 1 BAÑO PROFESORES	0,70		1,00							0,70
ESPEJO 1 BAÑO PROFESORES	0,70		1,00							0,70
TOTAL										4,17



CROQUIS



Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIOCONSTRUCTOR2022
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023
DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.3 CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UND.	m	REF.	25,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Delimitacion punto de acopio	15,00		2,30	1,00						15,00	
Andamio primera zona	5,00		2,30	1,00						5,00	
Andamio segunda zona	5,00		2,30	1,00						5,00	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										25,0000	



Observaciones

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA		

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023
CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.6 DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m2	REF.	4,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Demolicion placa sobre manto	4,00	1,00		1,00						4,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										4,0000	



Observaciones	placa fundida sobre el amnto en la zona del aula de quimica para "corregir los niveles"

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
DIRECTOR TECNICO
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

FECHA **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023
CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.52RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m2	REF.	1007,81

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cubierta Aula Fisica	7,30	14,40		1,00		1,20	2,40			82,08
Cubierta Aula Quimica	7,45	14,85		1,00		4,73	4,73			88,26
Cubierta Teatro	14,50	15,40		1,00						223,30
Cubierta Baños	7,00	1,10		1,00						7,70
	5,77	3,27		1,00						18,85
	10,41	8,68		1,00						90,32
Cubierta Zona de Comedor	12,10	14,30		1,00						173,03
	10,00	12,10		1,00		2,50	2,50			114,75
	12,10	14,40		1,00						87,12
	14,40	17,00		1,00						122,40
										-
										-
										-
TOTAL										1007,8100

CROQUIS



cubierta aula de fisica, quimica, baño y teatro



cubierta zona de comedor









Observaciones en la primera zona (quimica, fisica, teatro) el manto es bicapa, mientras que en la zona de comedor, el manto consta de tres capas.

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA		CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023
CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


CAPITULO	7.1 ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.1.2 ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	UND.	m2	REF.	1007,81

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cubierta Aula Fisica	7,30	14,40		1,00		####	####			82,08
Cubierta Aula Quimica	7,45	14,85		1,00		####	####			88,26
Cubierta Teatro	14,50	15,40		1,00						223,30
Cubierta Baños	7,00	1,10		1,00						7,70
	5,77	3,27		1,00						18,85
	10,41	8,68		1,00						90,32
Cubierta Zona de Comedor	12,10	14,30		1,00						173,03
	10,00	12,10		1,00		####	####			114,75
	12,10	14,40		1,00						87,12
	14,40	17,00		1,00						122,40
										-
										-
										-
TOTAL										1.007,8100

CROQUIS



cubierta aula de fisica, quimica, baño y teatro



cubierta zona de comedor









Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIOCONSTRUCTOR2022
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023
DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	7.1 ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.1.2 MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	UND.	m	REF.	314,58

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cubierta Fisica, Quimica, Baño y Teatro	7,00			1,00						7,00
	4,80			36,00						172,80
	4,70			12,00						56,40
	10,98			1,00						10,98
	7,45			1,00						7,45
	7,30			1,00						7,30
	10,65			1,00						10,65
	1,40			1,00						1,40
	9,20			1,00						9,20
	14,40			1,00						22,40
	9,00			1,00						9,00
										-
TOTAL										314,5800

CROQUIS







Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA **Vo.Bo. INTERVENTOR**


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIOCONSTRUCTOR2022
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023
DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	16.1 OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	16.1.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DEMARCACION PELIGRO-NO PASE PARA INHABILITAR APARATOS LAVAMANOS Y ORINALES DE BAÑOS EN LAS IED	UND.	m	REF.	60,60

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Acceso punto de acopio	6,20			3,00						18,60
	2,25			2,00						4,50
	6,60			3,00						19,80
Acceso zona de comedor	5,90			3,00						17,70
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										60,6000

CROQUIS







Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA		

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

FECHA DIA 22 MES 8 AÑO 2023
CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	17.1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	UND.	m2	REF.	1081,28

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cubierta Aula Fisica	7,30	14,40		1,00		1,20	2,40			82,08
Cubierta Aula Quimica	7,45	14,85		1,00		4,73	4,73			88,26
Cubierta Teatro	14,50	15,40		1,00						223,30
Cubierta Baños	7,00	1,10		1,00						7,70
	5,77	3,27		1,00						18,85
	10,41	8,68		1,00						90,32
Cubierta Zona de Comedor	12,10	14,30		1,00						173,03
	10,00	12,10		1,00		2,50	2,50			114,75
	12,10	14,40		1,00						87,12
	14,40	17,00		1,00						122,40
Refuerzo juntas	11,52	1,00		1,00						11,52
	8,76	1,00		1,00						8,76
	7,28	1,00		1,00						7,28
	8,56	1,00		1,00						8,56
	0,77	1,00		1,00						0,77
	1,96	1,00		1,00						1,96
	1,69	1,00		1,00						1,69
	7,25	0,10		15,00						10,88
	15,40	0,10		8,00						12,32
	7,00	0,10		10,00						7,00
	2,74	0,10		10,00						2,74
TOTAL										1081,2833

CROQUIS



Observaciones	Se realizo aplicación de emulsion pura en las juntas hasta el momento en que se aprobo realizarse el cargue de alistado en la totalidad de la superficie

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
920 - COLEGIO VAN UDEN - SEDE C SAN VICENTE		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
DIRECTOR TECNICO
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

FECHA **DIA** 24 **MES** 8 **AÑO** 2023
CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


CAPITULO	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.1.2 DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	UND.	KG	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	peso		L	a	h			
CUBIERTA AREAS ACAD				12,00	30,14	AREA ACAD				361,68	
	3,75	3,86		12,00						173,70	
TOTAL										535,38	



Observaciones



CONTRATISTA



Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** **DIA** 22 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL


CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.3 CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UND.	ML	REF.	33,40

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
EN CERRAMIENTO EXTERIOR	19,00	6,40	2,50	1,00						19,00
PROTECCION DE ARBOLES CUADRADOS DE 1, 2X 1,2M DE LONG	1,20	1,20	1,20	3,00	4,80					14,40
TOTAL										33,4000

CROQUIS



Observaciones	LA PROTECCION DE ARBOLES ES DE 21,4 ML DE LONG C/U



CONTRATISTA



Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — FECHA: DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.4 CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	UND.	ML	REF.	20,50

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
EN CERRAMIENTO EXTERIOR	20,50		2,50	1,00						20,50	
TOTAL										20,5000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — FECHA: DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.1 5 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	51,25

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
EN CERRAMIENTO EXTERIOR	20,50		2,50	1,00						51,25
TOTAL										51,2500

CROQUIS



Observaciones

Pag. ____ de ____

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2 ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	UND.	ML	REF.	20,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CERRAMIENTO OCCIDENTAL (VIGILANCIA)	20,00	0,10	0,10	1,00						20,00	
TOTAL										20,0000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2 ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2,4,1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	UND.	KG	REF.	586,60

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	CANT	DIAMETRO	CANTIDAD PARALES		L	a	h			
DADO DE CONCRETO CANASTA	1,00	4,00	1/2"	80,00	1,00					318,72	
DADO DE CONCRETO ESTRIBO	0,90	5,00	0,38	80,00	0,56					200,16	
VIGA CINTA REF LONG.	40,50	1,00	3/8"	2,00	0,56					45,04	
VIGA CINTA ANCLAJE	0,20	102,00		2,00	0,56					22,68	
TOTAL										586,6000	
TOTAL										#######	

Observaciones LA CANTIDAD TOTAL ES 586,6 KG SE PAGA EL 50% DE LA CANTIDAD 293,30KG PQ SE SE ESTA INSTALANDO Y EL MATERIAL ESTA EN OBRA

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 **FECHA** DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	9 CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	9.3.14 CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40	UND.	ML	REF.	20,50

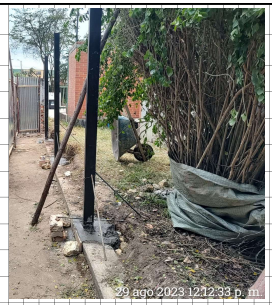AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
EN CERRAMIENTO EXTERIOR TRAMO 1 ORIENTAL	20,50		2,50	1,00						20,50	
TOTAL										20,5000	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 — FECHA: DIA 22 MES 8 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO — CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	10 CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	10.1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARMARIO DE 180 CM X 90 CM X 45 CM; ELABORADO EN MADERA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO POR DENTRO Y POR FUERA PARA MAYOR DURACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, AL CALOR Y A LOS RAYONES Y BORDES REDONDEADOS QUE BRINDAN UNA MEJOR APARIENCIA Y MAYOR SEGURIDAD, INSTALADO, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON MANIJAS METÁLICAS, CON BISAGRAS METÁLICAS, ENTREPAÑOS REGULABLES PARA MAYOR CAPACIDAD.	UND.	M2	REF.	1,59

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
SUPERFICIE 1	1,69	0,53		1,00						0,90	
SUPERFICIE 2	0,69	0,53		1,00						0,37	
SUPERFICIE 3	0,92	0,35		1,00						0,32	
TOTAL										1,5900	

Observaciones

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTOR
