

5° FASE
ESC 1:50

Desmantelamiento de placa metalica steel deck, demoliendo las vigas de apoyo y retiro de perfiles metalicos.

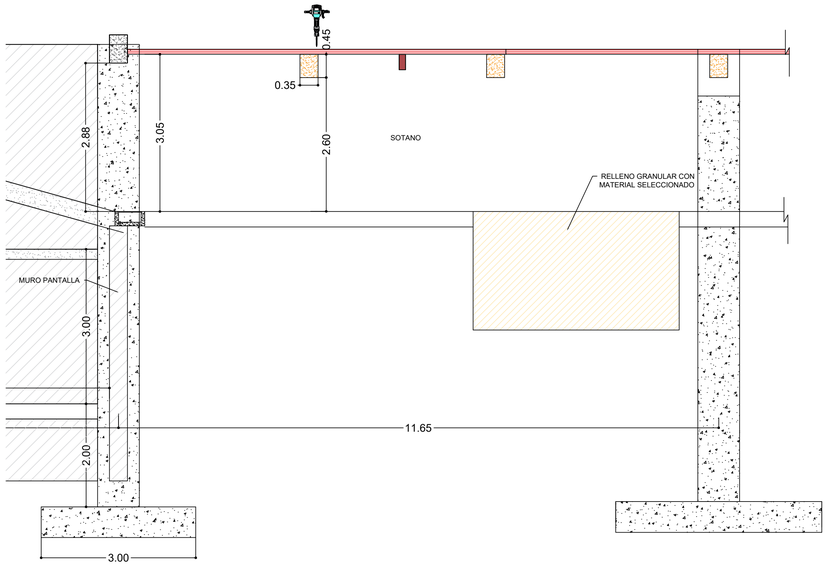

6° FASE
ESC 1:50

Se construye un muro en mamposteria doble con revoque impermeabilizado en ambos lados, dividiendo el área del parqueadero.

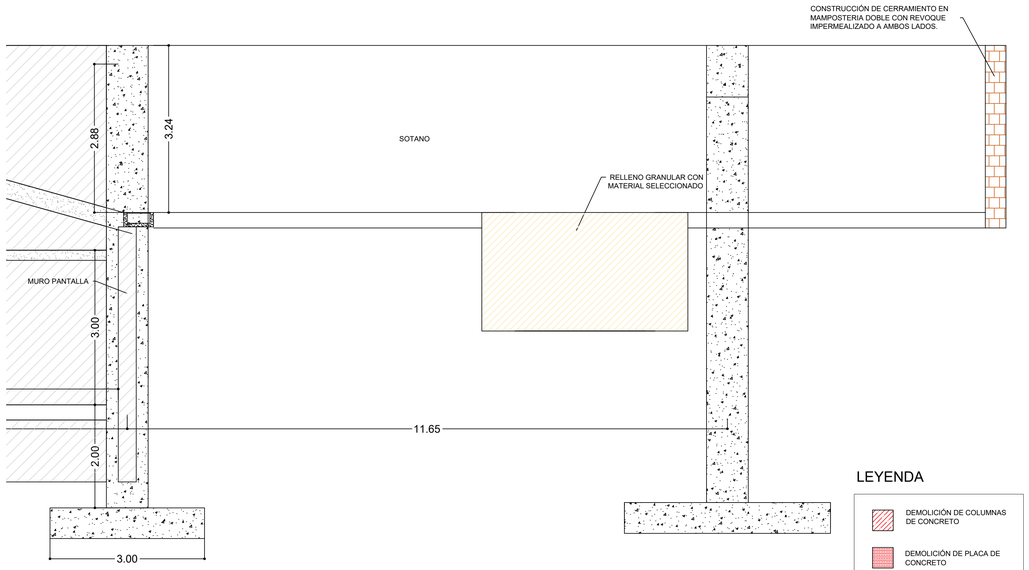


LEYENDA

- DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE PLACA CON STEEL DECK
- RETIRO DE VIGUETAS METALICAS


7° FASE
ESC 1:75

Posteriormente se rellena el área del sotano con material granular compactado al 90% del proctor, dejando una rampa temporal que permita el acceso como alternativa a la rampa y se hace la demolición de la escalera del tanque de almacenamiento.

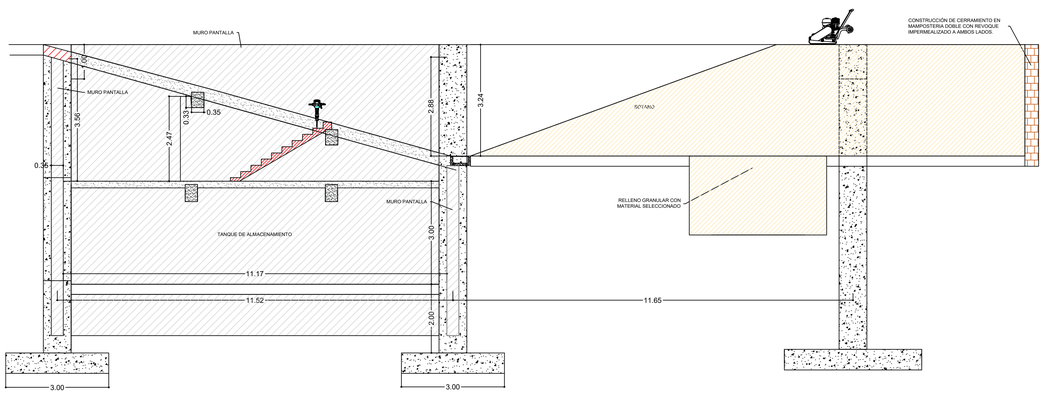

Alternativa 1
ESC 1:75

1. Se hace la demolición de la rampa de acceso, con las vigas de soporte. Iniciando la demolición desde la parte superior hacia la parte inferior de la rampa.

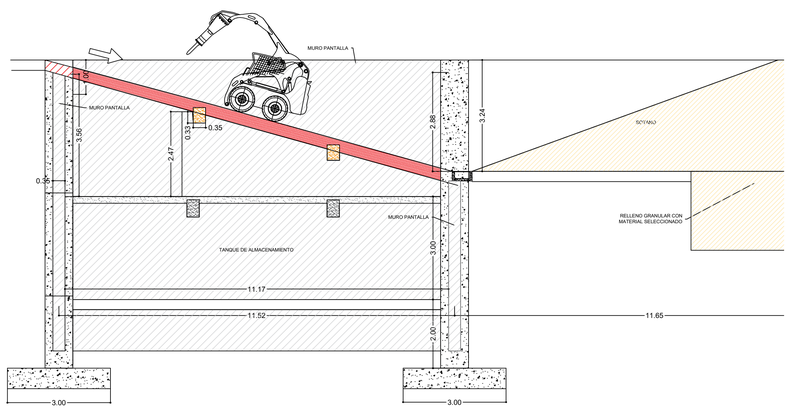

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

GOBIERNO DISTRITAL

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
DR. ALFONSO ELJACH MANRIQUE
ALCALDE DISTRITAL

CONTRATISTA

INGECONSULTA SAS
INGENIERIA CIVIL

INGECONSULTA S.A.S.
NIT: 829.000.737-7

CONTRATO N 4056-23
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA ACCION POPULAR ADELANTADA POR EL JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA RADICADO 680813333001-2015- 00159-00 DEL 20/10/2022; PROMOVIDO POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL MAGDALENA MEDIO CONTRA DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA Y LA COMERCIALIZADORA SUPERESTRELLAS S.A.S

DISEÑÓ:


Ing. HERNÁN FLÓREZ OLIVARES, Msc.
Esp. Patologia
Esp. Estructuras
TP: 25202-31164 CND

SUPERVISIÓN:

DIANA TORCOROMA
SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONTROL URBANO

UBICACIÓN:

CALLE 49 8-51
BARRANCABERMEJA / SANTANDER



CONTIENE:

PLANO DE DEMOLICIÓN

FECHA:

OCTUBRE DE 2023

ESCALA: INDICADA

ARCHIVO
CTCNT-4056.DWG

PLANO
3/4
