ASPECTOS SOCIALES:

TEMAS

1. PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS "PQR"
2. ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
3. PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD
4. % MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La profesional social de Interventoría Viviana Peña comenta que:

- No se tienen PQR abiertas al día 15/08/2023.
- Programa de empleabilidad: El contratista de obra cuenta con el mismo personal de la semana pasada cumpliendo con un 67 % de mano de obra no calificada en el proyecto, no obstante, el día 11 de agosto de 2023 se recibió por parte del contratista de obra correo electrónico con el informe semanal de mano de obra no calificada, se reitera al contratista de obra entregar los certificados de residencia de la localidad de Kennedy.
- En el comité de obra No.56 del día 15 de agosto de 2023 recibe oficio de la información del del comité de participación del mes de agosto de 2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
- Se recibió el día 15 de agosto de 2023 oficio con subsanación de observaciones a la pieza del punto satélite, se dará respuesta el día de hoy.
- Se está a la espera del envió por parte del contratista obra la pieza de socialización de PMT, ajustado a las recomendaciones que se realizaron mediante oficio.
- Se le solicita al contratista de obra enviar los documentos de manera editable o pdf para realizar las observaciones pertinentes antes de radicar para evitar reprocesos y se propone mesas de trabajo.
- Se menciona que ya se recibió link para el comité de participación ciudadana a realizar de forma virtual el 24 de agosto de 2023.

ASPECTOS SST:

Interviene John Zamora SST de EBISU SAS indicando que se tienen 17 ingresos y un nuevo proveedor de mampostería, se tiene una campaña de estilos de vida saludable el día de mañana y puede participar cualquiera que le interese. En el mes de agosto de 2023 no se tienen accidentes ni incidentes. Se van a iniciar cursos de alturas y brigadistas. Se tienen todas las charlas agendadas y se va a actualizar el inventario de los EPP ya que se han adquirido nuevos equipos. Se retiró la retroexcavadora y se vienen haciendo mantenimientos a los benitines de manera correctiva y se están actualizando las fichas. Se están mejorando los accesos y las escaleras se están retirando ya que se tiene escaleras fundidas y se tiene señalización.

Cristian López SST de la interventoría comenta que:
Personal: Administrativos 9 de EBISU SAS, operativos 66, interventoría 11

La interventoría este mes de agosto de 2023 ha recibido documentación y ha autorizado un total de 19 colaboradores de los cuales han ingresado 17, entre ellos personal de la razón social Road Building de mampostería, como mínimo se le solicita al contratista presentar afiliación a la EPS, ARL y examen ocupacional. Se remitió matriz de proveedores No 16 el 14 de agosto de 2023 con esta nueva razón social.

Continua el periodo de pago agosto de 2023 de la seguridad social correspondiente al periodo de cotización julio 2023 para reportar las novedades que sucedieron el mes pasado, se nos ha remitido las planillas vigentes de los proveedores Umba, Orr Construcciones e Inverco, sin observaciones frente a estos pagos por parte de esta interventoría.

Los proveedores del contratista EBISU SAS que tienen personal en obra esta semana son Orr Construcciones 24 colaboradores, Umba 6 colaboradores, inverco 2, Road Building 6 y el contratista EBISU SAS con 31 operativos.

Del cronograma de actividades SST aprobado para agosto 2023 (mes 14) se realizó capacitación de prevención de accidentes por partes en movimiento, uso adecuado de herramientas manuales, capacitación en prevención de silicosis generado por material particulado y capacitación exposición a vibraciones, están pendientes:

- Capacitación de orden y aseo en la obra
- Campaña de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas
- Capacitación en estilo de vida saludables
- Capacitación en actos y condiciones inseguras

Aspectos a resaltar, accesos a las diferentes áreas de trabajo, barandas de protección contra caídas, senderos peatonales delimitados y señalizados, se ha generado una cultura de seguridad en prevención de riesgos por parte del componente SST de EBISU SAS, se evidencia orden y aseo en la obra.

Continúan como condiciones inseguras que requieren de la gestión del contratista como prioridad, el talud occidental de la rampa y el talud del eje 1 entre ejes D y E, se ha solicitado realizar intervención a estos taludes, también se debe realizar el mantenimiento a los burros del acopio del acero.
Se reportó esta semana incapacidad de origen común de dos días.

ASPECTOS TÉCNICOS:

- **Actividades a ejecutar en la semana**

La interventoría manifiesta que de acuerdo con la reprogramación No 2 aprobada por interventoría el 03 de marzo de 2023, las actividades contempladas para ejecución en la presente semana son:

- ✓ 2.1.07 Escalera principal en concreto Arquitectónico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero
- ✓ 2.2.01 Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con Uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos Aux
- ✓ 2.2.04 "Anclaje hierro ,5/8""-perf. ,3/4"" 10-15c"
- ✓ 2.2.05 "Anclaje hierro ,1/2""-perf. ,5/8"" 10-15c"
- ✓ 3.01 Muro en ladrillo portante 30 terracota de 29x14.5x9. incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
- ✓ 3.02 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.

- ✓ 3.03 Muro en bloque no. 5 con perforación vertical r de 33x11.5x23 pañetado. incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
- ✓ 3.05 Alfajía concreto a=15-20cm sobre muros acabado arquitectónico a la vista color natural
- ✓ 4.01 Celosía vertical en concreto 2500 PSI. a=30-60cm Espesor 7cm acabado arquitectónico a la vista color natural. Incluye refuerzo y elementos de anclaje
- ✓ 4.02 Pérgolas en concreto 3000 PSI. a=10cm x alto 30 cm acabado arquitectónico a la vista color natural. Incluye refuerzo y elementos de anclaje
- ✓ 5.1.6 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 D=1 1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
- ✓ 5.1.7 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
- ✓ 5.1.8 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 D=1"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
- ✓ 5.1.9 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ,3/4"" INC. ACCESORIOS,SOLDADURALIMPIADOR Y MANO DE OBRA Y ANDAMIOS"
- ✓ 5.1.10 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 D=1/2""INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
- ✓ 5.1.11 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
- ✓ 5.1.17 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
- ✓ 5.1.25 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/4"" INC. CHAZOS DE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
- ✓ 5.1.26 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES TIPO CUELGA D=1"" INC. CHAZOS DE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
- ✓ 5.1.27 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA GALVANIZADA D=1/2"" INC. CHAZOS DE EXPANSIÓN,,ABRAZADERA ,TORNILLOS, ARANDELAS ANDAMIOS"
- ✓ 5.1.28 "SUMINISTRO MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 2"" HOMOLOGADO POR EAAB INCLUYE TRANSPORTE"
- ✓ 5.1.29 ACOMETIDA GENERAL E INSTALADA MEDIDOR, INCLUYE TRAMITE PAGO LIQUIDACIÓN CONSTRUCCIÓN ACOMETIDA ,CALIBRADA E INSTALACIÓN MEDIDOR
- ✓ 5.1.30 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR VOLUMÉTRICO 1"" CHORRO ÚNICO HOMOLOGADO POR EAAB INC. TRANSPORTE"
- ✓ 5.2.06 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC VENTILACIÓN D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,ANDAMIOS,MANO DE OBRA, REGATA MURO Y RESANES"
- ✓ 5.2.11 "PUNTO SANITARIO D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
- ✓ 5.2.14 "PUNTO VENTILACIÓN D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

- ✓ 7.1.1.1 Suministro, montaje y conexión de Derivación de media tensión (11,4 KV) desde circuito sencillo y poste existente, según listado de materiales y forma constructiva de Norma LA228 de CODENSA . Incluye instalación de DPS para uso exterior, puesta a tier
- ✓ 7.2.1 RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN (11.4 Kv)
- ✓ 7.2.2.1.29 Suministro e instalación de ILUMINACIONES TÉCNICAS 412203E3001 TEMPLA LENS E16 1150X58X70 SOBREPONER LED 2X2200Lm (3707 lm; 33.0 W; 2xLED LINE 1R 2FT 2200Lm) o Similar.
- ✓ 7.2.3 MALLA DE PUESTA A TIERRA DE POTENCIA Y BARRAJES DE EQUIPOTENCIALIZACION EN CENTROS DE CABLEADO DE COMUNICACIONES.
- ✓ 7.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR TRIPLEX DE 17,5 KV, CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES EQUIPOS: UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y SALIDA 17,5KV DIMENSIONES 2000X1100X1200MM ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD, SECCIONADOR DUPLEX 3X630AMP; UNA (1) CELDA DE SECCIONADOR
- ✓ 7.4.2 Suministro e instalación de Transformador 3F - 500KVA - 11.4KV - 208/120V Tipo Seco, Clase F. Conexión DYn5. Derivaciones+1-3*2.5%.
- ✓ 7.4.3 Suministro e instalación de celda para Transformador 3F - 500KVA - 11.4KV - 208/120V Tipo Seco, Clase F.
- ✓ 7.4.4 Construcción de interconexión entre el seccionador tríplex y el transformador ,mediante cables de Alumno XLPE-15 kv , 3x185mm2 al 100%., L= 5m.
- ✓ 7.4.5 CANALIZACIÓN MECÁNICA DE PISO (CÁRCAMO) PARA SECCIONADOR TRIPLEX DE 70x50 CM (LargoxAncho), EN CONCRETO. INCLUYE MATERIALES, REJILLA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
- ✓ 7.4.10 "Construcción de acometida de baja tensión entre Gabinete General de Distribución, TGD, y Tablero General de Distribución Torre A, TGD-TORRE A, a través tubería PVC de 6"" y Bandeja cortacables tipo escalera de 60x10cm , con cable de Cu, aislamiento libre d"
- ✓ 7.4.11 "Construcción de acometida de baja tensión entre Gabinete General de Distribución, TGD emergencia, TGE, y Tablero General de Emergencia Torre A, TGE-TORRE A, a través tubería PVC de 6"" y Bandeja cortacables tipo escalera de 60x10cm , con cable de Cu, aisla"
- ✓ 7.4.14 Suministro e instalación de Bandeja Portacables tipo escalera en de 60x10x240 cms Cal. 18 GC
- ✓ 7.4.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD, TRIFÁSICO, 208V-127V. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES: TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCIÓN IP20 TIPO INTERIOR. DIMENSIONES (2
- ✓ 7.4.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN NORMA CODENSA AE319 PARA MEDICIÓN PRINCIPAL. INCLUYE LOS SIGUIENTES MATERIALES Y EQUIPOS: TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCIÓN IP20 TIPO INTERIOR. DIMENSIÓN
- ✓ 7.4.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN NORMA CODENSA AE319, PARA MEDICIÓN SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO, QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES: UN (1) TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTEC
- ✓ 7.4.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA DE 1200AMP 208V, TGE-EMERGENCIA. INCLUYE LOS SIGUIENTES MATERIALES Y EQUIPOS: UN (1) TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCIÓN IP20 TI
- ✓ 7.4.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TORRE A, TGD-TORRE A 400AMP 208V. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES: UN (1)

INTERRUPTOR 3x300 A. EZC400N, Icu 85 kA/220 V. REF. EZC400N3300, SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x100 A. EZC10

- ✓ 7.4.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TORRE A, TGD-TORRE A 400AMP 208V. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES: TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCIÓN IP20 TIPO INTERIOR. DIMENSI
- ✓ 7.4.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA B.C.I 400AMP 208V M.A BOMBA CONTRA INCENDIOS . INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCIÓN IP20 TIPO I TABLERO DE SO
- ✓ 7.4.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CON BANCO DE CONDENSADORES DE 90 KVAR, 208V, . INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) TABLERO AUTO SOPORTADO DE BAJA DE TENSIÓN. FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 14-16, CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO DEPOSITAD
- ✓ 7.5.1 Suministro, anclaje y conexión de Planta de emergencia, de 363 KVA/290,4 KW A 1000 M.S.N.M. (330 KVA/264 KW A 2.600 M.S.N.M),208/120 Voltios., Motor CUMMINGS Y Generador STAMFORD, con panel de control, y cabina de insonorización. Incluye cargador de bater
- ✓ 7.5.2 "Montaje e instalación de silenciador y tubería de escape de 8""
- ✓ 7.6.1 Suministro e instalación de UPS de 10 KVA. 240V/120V, Dos fases, neutro y tierra; tecnología online, doble conversión, con tecnología del inversor PWM de alta frecuencia. Conexión dual (doble conexión a la entrada). Onda de salida: Senoidal pura, Factor d
- ✓ 7.7.1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CERRADO PARA SERVIDOR Y EQUIPOS de Unidades FLAT, Tipo V800 DE SIEMON. INCLUYE. COMPARTIMIENTO CON CIERRE SIMPLE (1), 800 MM DE ANCHO, 1000 MM DE PROFUNDIDAD, 2 PANELES LATERALES PARTE SUPERIOR E INFERIOR DIVIDIDAS DE
- ✓ 7.7.1.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE DE CONEXIÓN (PATCH PANEL MODULAR) ANGULAR, VACÍO (SIN JACKS), CAT 6A, DE 24 PUERTOS 1RU, MONOMARCA. INSTALADO. INCLUYE HERRAJE VACÍO, EN PROMEDIO 19 JACK CAT 6A F/UTP ZMAX NEGRO B POR HERRAJE , Y 19 MARQUILLAS AUTOLAMIN
- ✓ 7.7.1.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA PARA RECEPCIÓN DE TOPOLOGÍA ESTRELLA, MONOMARCA (TIPO RIC3-24-01 DE SIEMON), ACEPTA 4 PLACAS QUICK PACK, HASTA 96 FIBRAS, 2RU, INCLUYE: - UNA (1) BANDEJA DE CONEXIÓN DE F.O. (RIC3-24-01 DE SIEMON) , -
- ✓ 18,01 Mesón en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0- 8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo
- ✓ 19.1.01 Cuarto frio: Recubrimiento interior en poliuretano inyectado de densidad 40 k/m3 = 0,016kc/h m ºc suelo acero galvanizado plastificado antideslizante. Incluye los remates exteriores y los perfiles sanitarios en verticales, suelos y techos. Alarma de hombr
- ✓ 19.1.03 Canal y Rejilla de piso: Fabricado en lamina de acero inoxidable calibre 18 tipo 304, con UND punto de desagüe, presenta rejilla troquelada y fabricada en lamina de acero inoxidable calibre 16 tipo 304 removibles para facilitar el acceso y la limpieza
- ✓ 19.1.17 "Grifo de mesa 4 con ducha de pre lavado, grifo de mesa de 4"" con ducha de pre-lavado."
- ✓ 19.2.01 Grama fútbol, Monofilamento reforzado con nervio central, espesor fibra 320 a 340 um, ancho fibra 1,4 a 1,6 mm, altura 50 mm, bicolor con apariencia natural, polietileno, 12.000 DTEX, estabilización con protección U.V., peso del Hilado 1.100 gr/m2, Peso t
- ✓ 19.2.02 Portería múltiple con rodachin para microfútbol y baloncesto con tableros en acrílico; marco en ángulo de 1/12, aros pintados color blanco y estructura en tubería galvanizada de 2/12 y 1/12 calibre 14.

- ✓ 19.2.03 Cerramiento perimetral y cubierta (techo) en malla de nylon tratada #90, ojo 10x10, color negro texturizado, incluye guaya encauchetada inferior , centra y superior, grilletes, tensores, retenidas y vientos
- ✓ 20.01-1 Suministro e instalación de señalética de IDENTIFICACIÓN base: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. Acabado pintura Pintuco según paleta de colores (señalética reglamentaria). Nomenclatura: textos, puertas y cifras en vinilos autoad
- ✓ 20.01-2 Suministro e instalación de señalética de IDENTIFICACIÓN - LOGO: base: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. Acabado pintura Pintuco según paleta de colores (señalética reglamentaria). Nomenclatura: textos, puertas y cifras en vinilo
- ✓ 20.01-3 Suministro e instalación SEÑALÉTICA DE IDENTIFICACIÓN - SERVICIOS base: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática blanco mate. logotipo: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. Acabado pintura Pintuco según paleta de c
- ✓ 20.01-4 Suministro e instalación SEÑALÉTICA REGLAMENTARIA: base: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática blanco mate. logotipo: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. Acabado pintura Pintuco según paleta de colores seleccionados
- ✓ 20,04 Cinta antideslizante reflectiva 3M o similar para escaleras para escaleras, peldaños y rampas no expuestos a intemperie
- ✓ 20.05 Línea de demarcación cancha múltiple continua ancho 10cm
- ✓ 20,1 Sistema mecánico Aire Acondicionado Auditorio
- ✓ 21,03 Siembra de Prado en tapete

Marino Arce de EBISU SAS manifiesta que está ejecutando:

- Placas entrepiso edificio B
- Tuberías eléctricas
- Tuberías hidráulicas
- Armado y fundida de placas

Marino Arce de EBISU SAS menciona que como la interventoría hace mención de todas las actividades que se deben ejecutar , el hace mención que a nosotros nos tocó comprimir todas las actividades al final y por eso ya están apareciendo actividades tales como la grama y el silenciador de la planta eléctrica. Que cuando

Esta semana se inicia la mampostería y la otra semana se inicia el mejoramiento de la rampa con rajón.
En reprogramación actual las actividades tocó comprimirlas al final por eso ya aparecen actividades como la grama. Están esperando la legalización de adición de tiempo, de los 150 días otorgados por la interventoría para poder organizar la programación y hay que tener en cuenta la mayor cantidad de obra y también tener en cuenta las mayores cantidades de obra y las actividades que debemos tener pero lógicamente no se pueden hacer por proceso constructivo

Julianie Rincón de ENTerritorio comenta que se espera que planeación de respuesta a los 17 INP el día de mañana y que vio el correo donde se remitió la reprogramación.

Alexis Socha de EBISU SAS comenta que no pueden entregar los otros documentos como el flujo de caja, curva S y otros hasta no tener los INP aprobados para poder cerrar el balance. Comentan que no están de acuerdo con la reprogramación del contrato, de mantener el mismo tiempo contractual y eso va a hacer que tenga que ejecutar mucho dinero en una franja de tiempo muy pequeña, por ende, se entregó la reprogramación con los 150 días, la idea es que Planeación se manifieste con la aprobación de los 17 INP y ese mismo día o a más tardar el día siguiente se enviaría todo ajustado y se entregarían todos los documentos de soporte ya que la primera modificación contractual que se debe hacer es con el dinero y

luego tocaría hacer la adición de dinero. Se entregó un primer paquete de 10 INP el día de hoy antes de iniciar comité y la ides es entregar otro paquete de aquí al viernes ya que se están ajustando todos los INP con las indicaciones de la reunión con ENTerritorio.

La interventoría manifiesta que no hagan tener retrocesos ya que se hicieron unas mesas de trabajo entre EBISU SAS y la interventoría para revisar la reprogramación pero mandan una reprogramación diferente a la ya acordada. Pero no nos hagan tener mesas de trabajo y se pierde tiempo y genera desgaste.

Alexis Socha de EBISU SAS comenta que el ejercicio era sobre una reprogramación que pidió ENTerritorio para saber cuánto bajaba el atraso. Julianie Rincón de ENTerritorio aclara que ellos no han solicitado una programación y el ejercicio de los INP es totalmente responsabilidad de EBISU SAS. Alexis Socha de EBISU SAS comenta que el ejercicio era sobre una reprogramación para ver cómo se podía bajar el atraso.

La interventoría aclara que EBISU remitió una reprogramación mediante un oficio y a esa reprogramación se les respondió mediante oficio con unas observaciones y sobre esa reprogramación fue que se trabajó en las mesas de trabajo de revisar actividades que les marcan atraso y que ya se encuentran al 100%, mayores y menores cantidades, quitar actividades que no se van a ejecutar y los 17 INP y sobre eso fue que se trabajó con EBISU SAS y esa reprogramación está el compromiso antes de la reunión del 01-08-2023 y sobre eso fue que se trabajó.

- **Avance programado Vs avance ejecutado**:
  El avance con corte al 13 de agosto de 2023 es programado de 73.92% y ejecutado de 33.34% lo que representa un atraso del 40.58%.

- **Avance financiero**:
  Programado $ 25.862.358.055 Vs Ejecutado: $ 11.664.314.920

Interventoría comenta que el atraso mayormente corresponde a los siguientes ítems:

- ✓ Preliminares: 11 millones- **Atraso**
- ✓ Desmonte y Demoliciones: 10 millones- **Atraso**
- ✓ Descapote: 0 millones
- ✓ Excavación a cielo abierto: 6 millones- **Atraso**
- ✓ Protección taludes provisionales con concreto lanzado: 8 millones- **Atraso**
- ✓ Relleno compactado material importado: 45 millones- **Atraso**
- ✓ Trasiego interno: 5 millones - **Atraso**
- ✓ Retiro de material de excavación- 0 millones
- ✓ Pilotes 1m, 1.2m y 1.5m: 0 millones
- ✓ Demol. Cabezales de pilotes: 0 millones
- ✓ Solado limpieza espesor e=0.05m: 237 mil- **Atraso**
- ✓ Dado en concreto=210 kg/cm²: 0 millones
- ✓ Viga de cimiento en concreto f'c=210 kg/cm²: 0 millones
- ✓ Muro de contención de concreto armado: 254 millones- **Atraso**
- ✓ Losa de cimentación de concreto armado: 16 millones- **Atraso**
- ✓ Suministro e instalación de malla electrosoldada: 455 mil - **Atraso**
- ✓ Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa pilotes: 0 millones

- ✓ Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa dados, losa cim y muros: 166 millones- **Atraso**
- ✓ Columna de sección rectangular o cuadrada de concreto armado: 216 millones- **Atraso**
- ✓ Pantalla en concreto 5000 psi, con acabado arquitectónico: 287 millones- **Atraso**
- ✓ Viga confinamiento muro concreto 3000 psi 21 Mpa: 43 mil- **Atraso**
- ✓ Viga concreto aérea 4000 psi (28MPa) pórtico columnas. Acabado a la vista arquitectónico. Premezclado en planta. El precio no incluye acero: 121 millones- **Atraso**
- ✓ Losa aligerada con casetón recuperable, acabado arquitectónico a la vista. E=56-60cm concreto 4000psi, sin torta. El precio no incluye acero. Premezclado en planta: 3.173 millones- **Atraso**
- ✓ Losa concreto 4000 psi, maciza e=15cm acabado inferior a la vista arquitectónico, según diseño estructural. Premezclado en planta. El precio no incluye acero: 52 millones- **Atraso**
- ✓ Escalera principal en concreto Arquitectónico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero: 88 millones- **Atraso**
- ✓ Rampa vehicular en concreto 3000 psi. El precio no incluye acero: 6 millones- **Atraso**
- ✓ Foso de ascensor en concreto 4000 psi. Acabado a la vista: 57 millones- **Atraso**
- ✓ Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa columnas, vigas y losas: 2387 millones- **Atraso**
- ✓ Suministro e instalación de malla electrosoldada: 101 millones- **Atraso**
- ✓ 2.2. Estructura metálica: 961 millones- **Atraso**
- ✓ 3. Mampostería: 444 millones- **Atraso**
- ✓ 4. PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: 11 millones - **Atraso**
- ✓ 5. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS: 75 millones- **Atraso**
- ✓ 6. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑO: 263 millones- **Atraso**
- ✓ 7, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 1901 millones- **Atraso**
- ✓ 9, PISOS: 2145 millones- **Atraso**
- ✓ Otros: 1389 millones- **Atraso**

Julianie Rincón de ENTerritorio pregunta cuantas placas de entrepiso se tienen de atraso y la interventoría responde que se tiene 9.7 placas de atraso. Y se comenta que la placa de entrepiso estaba para terminar el 25-07-2023.

Julianie Rincón pregunta cómo va lo del voladizo, en lo que se había enviado decían que se entregaban la optimización después que la consultoría enviara la información que solicitaron y que ustedes se demoraban 8 días entregar la propuesta hecha por su Ing. estructural y la interventoría revisaba en 2 días. La interventoría aclara que esos tiempos salieron de un análisis de la interventoría por un informe que solicitó ENTerritorio a la interventoría el 2 de agosto para enviar el 3 de agosto, no se revisó y concilió con EBISU SAS.
Lo que se planteó fue que se revisaba la información y se daban propuestas, la idea es hacer esa reunión entre los especialistas de contratista de obra e interventoría esta semana para poder dar propuestas teniendo en cuenta lo que se recibió por parte del consultor.
Marino Arce comenta que toca hacer la reunión a ver que alternativas se proponen. Alexis Socha de EBISU SAS aclara que los contratos de los especialistas son por prestación de servicios y que la disponibilidad del estructural es del 25% así que toca organizar cuándo se puede hacer esa reunión.

- **Actas facturadas de obra**:
  La interventoría ha avalado 11 actas parciales de obra, de las cuales ENTerritorio ya pagó 11 actas. Las cuales suman un valor de $ 8.338.321.243,00 y representa el 23.83% del valor total del contrato.

  El cierre contable en el mes de agosto es el 24 de agosto de 2023, por lo que se recuerda que para las actas se tienen fechas de cierre por lo que deben estar más pendientes a la entrega de las actas.

- **Desembolso de anticipo**:

  La interventoría ha avalado 15 órdenes de desembolso y 14 órdenes ya han sido desembolsadas y suman un valor total de $ 6.397.476.059,64. Queda un saldo de $ 250.340.899,36

  El contratista envió Plan de inversión del Anticipo Modificación No. 5 mediante oficio EBI-ENT-BOG-853-2022 y se le dio aprobación y traslado mediante oficio CEB-974-2022 el 08-08-2023.

- **Balance:**

  El día 03 de agosto de 2023 el contratista de obra remite los 17 INP ajustados según la reunión virtual con planeación de ENTerritorio y ese mismo día la interventoría da aprobación y traslado mediante el oficio CEB-966-2022.

- **Estado del proceso de compras y llegada insumos a obra y maquinaria:**

  EBISU SAS comenta que ya no les llega material, lo que necesitan ya está en obra. Está pendiente que llegue es el rajón.

- **Revisión aclaraciones de diseños entregados**

  EBISU SAS comenta que tiene unas observaciones pendientes, sobre el ascensor del edificio A, una observación e la parte eléctrica de las rejillas, una observación de una contraflechas de 8 cm en la placa que se está armando y que se defina lo de la rampa, cortasoles y algo eléctrico. Jorge Serrano de la SED propone que lo de diseños se hable en el comité de diseño y la interventoría está de acuerdo.

- **Comunicaciones varias:**

  - ✓ CEB-606-2022: 03-03-2023 Respuesta oficio EBI-ENT-BOG-572-2022 Aprobación y Traslado solicitud de modificación No 1 balance proyecto capítulos A, B, C y 1. **Respuesta 23-08-2023**
  - ✓ CEB-801-2022: 17-5-2023 Traslado oficio EBI-ENT-BOG-730-2022 SOLICITUD DE REVISIÓN DE INCLUSIÓN DE IMPREVISTOS -PAGOS SECRETARIA DE AMBIENTE TRÁMITE MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN 04681. **Respuesta 23-08-2023**
  - ✓ CEB-819-2022: 23-05-2023 Respuesta EBI-ENT-BOG-740-2022 No conformidad demolición viga 29 eje 10 (C-D) losa de entrepiso nivel +1.85m. **Respuesta 23-08-2023**
  - ✓ CEB-877-2022: 22-06-2023 No conformidad en Viga VCim2 del eje D-E y Dado eje D-3ª en arranque de columna Nivel -3.6 Losa de cimentación Edificio B, Fundida 20 de junio de 2023 y losa edificio A Nivel +10.35 mts. **Respuesta 23-08-2023**
  - ✓ CEB-887-2022: 29-06-2023 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-796-2022, Complementación de procedimiento de fundida de losa cimentación. **Respuesta 23-08-2023**
  - ✓ CEB-898-2022: 05-07-2023 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-792-2022, andamios de carga.
  - ✓ CEB-913-2022: 07-07-2023 Remisión hojas de vida personal de interventoría. **Respuesta 23-08-2023**
  - ✓ CEB-923-2022: 14-07-2023 Traslado de Oficio EBI-ENT-BOG-821-2022- Solicitud de información presunta modificación a la licencia de construcción.

- ✓ CEB-924-2022: 14-07-2023 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-810-2022 Respuesta oficio CEB-850-2022 No conformidad nivel+1.85m edificio A y respuesta a oficio CEB-888-2022 No conformidad acabado de losa de entrepiso nivel +1.85 entre ejes E-C(6b-10) Edificio A y No conformidad losa de entrepiso nivel +6.10 desde ejes 6b al eje 9+1/3 entre ejes A'-D' Edificio A. **Respuesta 23-08-2023**
- ✓ CEB-925-2022: 17-07-2023 Remisión Hoja de Vida personal de Interventoría. **Respuesta 23-08-2023**
- ✓ CEB-931-2022: 18-07-2023 Remisión concepto especialista geotécnico interventoría en respuesta oficio EBI-ENT-BOG-809-2022 Alcance Oficio EBI-ENT-BOG-792-2022 Y presentación De Informe Geotécnico. **Respuesta 23-08-2023**
- ✓ CEB-934-2022: 19-07-2022 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-819-2022 Optimización acabados losas entrepiso. **Respuesta 23-08-2023**
- ✓ CEB-948-2022: 25-07-2023 No conformidad losa Nivel-1.75 mts entre ejes A'-C´ entre 6a-6 edificio B. **Respuesta 23-08-2023**
- ✓ CEB-960-2022: 28-07-2022 Respuesta EBI-ENT-BOG-841-2022 Respuesta a oficio CEB-930-2022.
- ✓ CEB-962-2022: 28-07-2023 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-847-2022 - Respuesta CEB-920-2022 y CEB-949-2022.
- ✓ CEB-966-2022: 03-08-2023 Aprobación y traslado de INP 01 al 17- Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-851-2022 y a oficio 20235100091063. **Pendiente de respuesta por parte de Planeación de ENTerritorio.**
- ✓ CEB-971-2022: 04-08-2023 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-844-2022- Respuesta oficio CEB-846-2022 – REMISIÓN DE REPROGRAMACIÓN.
- ✓ CEB-974-2022: 08-08-2023 Aprobación a Plan de Inversión del Anticipo Modificación No. 5 enviado bajo oficio EBI-ENT-BOG-853-2022.
- ✓ CEB-979-2022: 09-08-2023 Requerimiento de remisión de todos los INPs con soportes
- ✓ CEB-982-2022: 14-08-2023 Respuesta al comunicado EBI-ENT-BOG-856-2022
- ✓ CEB-983-2022: 14-08-2023 Respuesta al comunicado EBI-ENT-BOG-858-2022.
- ✓ CEB-985-2022: 14-08-2023 Respuesta al comunicado EBI-ENT-BOG-848-2022
- ✓ CEB-990-2022: 15-08-2023 Respuesta EBI-ENT-BOG-855-2022

- ✓ EBI-ENT-BOG-725-2022 respuesta por parte de ENTerritorio para el 23-08/2023.
- ✓ EBI-ENT-BOG-763-2022 respuesta por parte de ENTerritorio para el 23-08/2023.
- ✓ EBI-ENT-BOG-774-2022 respuesta por parte de ENTerritorio para el 23-08/2023.
- ✓ EBI-ENT-BOG-820-2022 respuesta por parte de ENTerritorio para el 23-08/2023.

EBI-ENT-BOG-861-2022 respuesta por parte de interventoría.
EBI-ENT-BOG-863-2022 respuesta por parte de interventoría.
EBI-ENT-BOG-865-2022 respuesta por parte de interventoría.
EBI-ENT-BOG-866-2022 respuesta por parte de interventoría.
EBI-ENT-BOG-867-2022 respuesta por parte de interventoría.
EBI-ENT-BOG-868-2022 respuesta por parte de interventoría.
EBI-ENT-BOG-869-2022 respuesta por parte de interventoría.

Actas de Comité

Acta de comité de obra No. 46 , 47, 48, 49, 50 , 51 y 52: Se remitieron a ENTerritorio para firmas. **Las remiten el 23-08-2023**

Acta de comité de diseño 43, 46 y 47 está pendientes de firmas por parte de ENTerritorio, SED y consultor. **Las remiten el 23-08-2023**
Actas de comité de obra 53, 54 y 55: las tiene en revisión y firmas EBISU SAS. **Las remiten el 23-08-2023**

- **Supervisión Técnica Independiente**

El profesional STI, Daniel Tique comenta que de la carpeta de agosto de 2023 se revisaron los siguientes ensayos de resistencia a la compresión:

- Numero de informe: 122-20747
  Fecha: 09/08/2023
  Y todos los resultados están dando satisfactorios.

Fundidas hechas esta semana:

- Fundida de escalera de emergencia Nivel +1.85 al +6.10 bloque A: jueves 10 de agosto de 2023
- Fundida de escalera principal Nivel +1.85 al +6.10 bloque A: jueves 10 de agosto de 2023
- Fundida de columnas ejes 3A-D 3-D Y 5A-D Nivel +3.75 bloque B: jueves 10 de agosto de 2023

- **Temas Varios**

No hay nada que tocar en temas varios.

Y se da por terminado el comité de obra No.56 y como parte integral del acta se adjunta un (1) audio.

En el proyecto se encuentran laborando <9> profesionales, <0> personas de oficina y <66> trabajadores, operarios u obreros para un total de <75> personas

Programa de Proyecto

Aspectos Administrativos

Aspectos Presupuestales:

Riesgos

Aspectos sociales y/o ambientales

3. COMPROMISOS

Nombre del Proyecto:	
Responsable por Contratista	Arq. Marino Arce
Responsable por Interventoría	Ing. Pamela Beltrán
Fecha programada cumplimiento	

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMITÉ DE OBRA No.	56					16/08/2023
COMPROMISO PACTADO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE SOLICITUD**	**FECHA PLAZO EJECUCIÓN**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**DÍAS AVANCE/ATRASO**	**OBSERVACIONES**
REMISIÓN DE ACTAS COMITÉS DE DISEÑO No. 43, 46, 47 Y 48	ENTERRITORIO	30/06/2023	23/08/2023			SE REMITIERON A ENTERRITORIO PARA FIRMAS DE ENTERRITORIO, SED Y CONSULTOR, ESTÁN EN PODER DE ENTERRITORIO NO HAN SIDO REMITIDAS
REMISIÓN DE ACTAS COMITÉ DE OBRA No. 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52	ENTERRITORIO	07/06/2023	23/08/2023			SE REMITIERON A ENTERRITORIO PARA FIRMAS DE ENTERRITORIO NO HAN SIDO REMITIDAS
REMISIÓN DE ACTA COMITÉ DE OBRA No. 53,54,55	CONTRATISTA	09/08/2023	23/08/2023			SE REMITIERON A ENTERRITORIO PARA FIRMAS DE ENTERRITORIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL MOSTRANDO EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LAS JORNADAS DE ASEO	CONTRATISTA	29/03/2023	cada semana			SOLICITUD HECHA EN OFICIO EBISU HA ENVIADO REGISTRO CADA SEMANA DEL ANTES Y DESPUÉS DE LAS JORNADAS DE ASEO SE LE SOLICITA A EBISU SAS QUE AMPLIE EL INFORME POR CADA ZONA, SE COLOQUE EL ANTES Y DESPUÉS DE CADA ZONA DE LA OBRA

OFICIO CON REQUERIMIENTO SOBRE VIÁTICOS DE PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA VISITA PRESENCIAL DEL MIÉRCOLES 19-04-2023	INTERVENTORÍA	12/04/2023	16/08/2023	23/08/2023		SE REMITIÓ SOLICITUD EN OFICIO CEB-705-2022 EL 12-04-2023 Y EL CONTRATISTA RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-663-2022 EL 13-04-2023 AL QUE SE LE DIO RESPUESTA MEDIANTE OFICIO CEB-717-2022 EL 14-04-2023 Y EBISU DIO RESPUESTA EL 15-04-2023 MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-676-2022 Y SE LE DIO RESPUESTA EL 18-04-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-730-2022 Y EBISU RESPONDIÓ EL 20-04-2023 CON EL OFICIO EBI-ENT-BOG-685-2022 EL CUAL SE RESPONDIÓ EL 20-04-2023 CON EL OFICIO CEB-740-2022 EL CUAL EBISU RESPONDIÓ EL 22-04-2023 CON OFICIO EBI-ENT-BOG-697-2022 y LA INTERVENTORÍA RESPONDIÓ CON EL OFICIO CEB-755-2022 DEL 25-4-2023, EBISU RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-710-2022 EL 05-05-2023 Y SE RESPONDIÓ EL 08-05-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-780-2022 Y EBISU RESPONDE MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-728-2022 EL 12-5-2023 Y LA INTERVENTORÍA RESPONDE EL 15-5-2023 MEDIANTE EL OFICIO CEB-791-2022, EBISU RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-752-2022 EL 25-05-2023 Y SE RESPONDIÓ EL 30-05-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-831-2022, EBISU RESPONDIÓ CON EL OFICIO EBI-ENT-BOG-764-2022 QUE SE RESPONDIÓ CON EL OFICIO CEB-849-2022 DEL 09-06-2023 QUE EL CONTRATISTA RESPONDIÓ EL 29-06-2023 MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-802-2022 Y SE RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO CEB-894-2022 EL 04-07-2023 CONTRATISTA DE OBRA RESPONDE MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-816-2022 DEL 07-07-2023, LA INTERVENTORÍA RESPONDE MEDIANTE OFICIO CEB-916-2022 11-07-2023. LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA VAN A ESPERAR RESPUESTA POR PARTE DE ENTERRITORIO PARA VER CONTRACTUALMENTE QUE SE PUEDE HACER PARA SOLVENTAR EL TEMA DE LOS VIÁTICOS DE LA CONSULTORÍA NO HA LLEGADO LA RESPUESTA POR PARTE DE ENTERRITORIO

INP nuevos del balance general con soportes	CONTRATISTA	12/04/2023	SIN FECHA	18/08/2023		EL CONTRATISTA REMITIÓ UN SEGUNDO PAQUETE CON 59 INP, SE REALIZÓ MESA DE TRABAJO EL 18-07-2023 PARA REVISAR LA FORMA, NO EL FONDO, SALIERON UNAS OBSERVACIONES QUE EL CONTRATISTA ESTÁ SUBSANANDO Y LA INTERVENTORÍA VA A REVISAR LOS APUS PARA HACER OBSERVACIONES. INTERVENTORÍA REMITE OBSERVACIONES EL 04-08-2023 VÍA EMAIL AL LOS APUS TENIENDO EN CUENTA EL OFICIO DE PLANEACIÓN Y LA MESA DE TRABAJO DEL 02-08-2023 CONTRATISTA ESTÁ AJUSTANDO LOS INP CON LAS OBSERVACIONES HECHAS EN MESA DE TRABAJO CON PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO EL 02-08-2023 PARA REMITIR TODOS LOS INP LA INTERVENTORÍA REMITIÓ OFICIO CEB-979-2022 DEL 09-08-2022 HACIENDO EL REQUERIMIENTO DE LA ENTREGA DE TODOS LOS INP EBISU REMITIÓ UN PAQUETE DE 10 INP Y VA A REMITIR OTRO EL 18-08-2023 QUE ENTRAN A REVISIÓN DE INTERVENTORÍA.
REEMBOLSO A EBISU POR CONCEPTO DE VISITA DE FORESTAL DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE	ENTERRITORIO	26/04/2023	16/08/2023	23/08/2023		contratista va a hacer una comunicación con la trazabilidad y adjuntar los 2 soportes e interventoría revisará y hará la solicitud con recomendación de pagarlo como imprevisto EBISU REMITIÓ OFICIO EBI-ENT-BOG-730-2022 EL 12-5-2023 SE TRASLADÓ A ENTERRITORIO MEDIANTE OFICIO CEB-801-2022 del 17/05/2023. ESTÁ PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DE ENTERRITORIO
ENTREGA DE SUBSANACIONES DE INP 01 AL 17	CONTRATISTA INTERVENTORÍA ENTERRITORIO	18/05/2023	SIN FECHA	18/08/2023		ESTÁN PENDIENTES LAS SUBSANACIONES POR PARTE DE EBISU PARA HACER UNA REVISIÓN CON LA INTERVENTORÍA PARA PODER HACER REVISIÓN CON ENTERRITORIO ANTES DE HACER ENTREGA FORMAL EBISU LAS ENVIÓ EL 30-5-23 MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-755A-2022 SE REVISARON Y SE DIERON APROBACIÓN Y TRASLADO A 16 INP Y SOBRE EL INP 06 SE DIO RESPUESTA AL CONTRATISTA DE OBRA EL INP 06 SE APROBÓ EL 22-06-2023 Y SE DIO TRASLADO A ENTERRITORIO MEDIANTE EL OFICIO CEB-875-2022 ESTÁ PENDIENTE QUE PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO REMITA SUS OBSERVACIONES U APROBACIÓN ENTERRITORIO REMITIÓ 1 OBSERVACIÓN SOBRE UN FORMATO QUE ESTABA DESACTUALIZADO Y EL

						CONTRATISTA YA ESTÁ SUBSANANDO. SE ENVIÓ EL 13-07-2023 ENTERRITORIO REMITIÓ OBSERVACIÓN 2 EL 17-07-2023 DONDE SE DEBE CORREGIR EL VALOR DE LA VOLQUETA EN EL ÍTEM DE TRANSPORTE EN LOS 3 ÍTEMS DE CAJAS DE INSPECCIÓN E IGUALAR EN LAS DESCRIPCIONES QUE TODAS DIGAN RETIRO DE ESCOMBROS EBISU REMITIÓ EL 19-07-2023 SUBSANACIONES Y SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA, PERO EN COMITÉ ENTERRITORIO ACLARÓ QUE PUEDEN SALIR MÁS OBSERVACIONES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO QUE LA SUPERVISORA EN AVANZADA FUE REMITIENDO LAS OBSERVACIONES QUE LE HAN IDO REALIZANDO PARA QUE EL CONTRATISTA VAYA HACIENDO AJUSTES. LLEGÓ EMAIL DE ENTERRITORIO CON RESPUESTA EL LUNES 24-07-2023 EN LA NOCHE Y SE REMITIERON AL CONTRATISTA EL 25-07-2023 EN LA MAÑANA PARA SU REVISIÓN Y AJUSTES EL CONTRATISTA REMITE OFICIO EBI-ENT-BOG-849-2022 EL 31-7-2023 Y DESPUÉS DEL OFICIO DE ENTERRITORIO CON LAS OBSERVACIONES DE PLANEACIÓN Y DE MESA DEL TRABAJO DEL 02-08-2023, EL CONTRATISTA REMITE OFICIO EBI-ENT-BOG-851-2022 EL 03-08-2023 CON AJUSTES ACORDADOS Y SE DA APROBACIÓN Y TRASLADO ESE MISMO DÍAS MEDIANTE OFICIO CEB-966-2022 ESTÁ PENDIENTE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE PLANEACIÓN
INFORMES Y SOPORTES POR TALA DE ARBOLES SEGÚN LA RESOLUCIÓN	CONTRATISTA	31/05/2023	16/08/2023	18/08/2023		EL FORESTAL DE EBISU SAS ESTÁ ELABORANDO EL INFORME Y LO ENTREGA EL LUNES 12-6-2023NO HA SIDO REMITIDO EL INFORME Y EBISU SAS COMENTA QUE NO SU ESPECIALISTA NO LES HA DADO LA NUEVA FECHA DE ENTREGA DEL INFORME.EBISU HACE UNA REVISIÓN AL INFORME Y LE REMITE OBSERVACIONES AL ESPECIALISTA Y ESTÁN ESPERANDO QUE LO SUBSANE PARA PODER REMITIRLOCONTRATISTA REMITE INFORME TALA ARBOLES MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-818-2022 DEL 10-07-2023, AL SE LE REMITEN OBSERVACIONES EL 14-07-2023 Y ESTÁ PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA SUBSANE

RESOLUCIÓN TALA 3 ARBOLES	SED	28/04/2023	SIN FECHA			PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, SE RECIBE CORREO EL DÍA 11-07-2023 POR PARTE DE ENTERRITORIO CON TRASLADO DE CORREO DE SED SOLICITANDO EL PAGO DE 225 MIL PESOS por concepto de "Permiso o autorización. Tala, poda, transreubic. Arbolado urbano" PENDIENTE PAGO DE RECIBO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENVIADO POR LA SED EBISU PAGA RECIBO EL 26-07-2023 Y VA A REMITIR A INTERVENTORÍA PARA QUE LE DE TRASLADO A LA ENTIDAD EBISU REMITE RECIBO EL 28-07-2023 Y SE LE DA TRASLADO ESE MISMO DÍA A ENTERRITORIO MEDIANTE OFICIO CEB-958-2022 LA SED DA EL RADICADO DE LA SUBSANACIÓN ENTREGADA EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE RAD 2023ER183272 10 AGOSTO
REMISIÓN DE BALANCE No. 2 CON SOPORTES	CONTRATISTA	08/06/2023	SIN FECHA			CONTRATISTA TIENE OFICIO CON OBSERVACIONES ENVIADO POR LA INTERVENTORÍA EL 08-06-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-846-2022 CONTRATISTA MANIFIESTA QUE VAN A ENVIAR REPROGRAMACIÓN PERO QUE QUEDA PENDIENTE EL BALANCE, FLUJO DE CAJA, CURVA S, PLAN DE COMPRAS Y PLAN DE RECURSO HUMANO HASTA TANTO NO SE TENGAN LOS 17 INP APROBADOS EBISU ENVÍA REPROGRAMACIÓN EL 28-07-2023 Y SE REMITE OFICIO CON OBSERVACIONES EL 04-08-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-971-2022 PARA SUBSANACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA CONTRATISTA REMITE SUBSANACIONES VÍA EMAIL Y SE ESTÁN HACIENDO MESAS DE TRABAJO PARA AJUSTAR LA PROGRAMACIÓN, EN ESTA PROGRAMACIÓN SE INCLUYEN LOS 17 INP CON 150 DÍAS DE TIEMPO
RCD JULIO 2023	CONTRATISTA	02/08/2023	SIN FECHA			SE ENVIARON OBSERVACIONES QUE ESTÁN PENDIENTES DE SUBSANACIÓN
HV RESIDENTE DE OBRA No. 2	CONTRATISTA	02/08/2023	23/08/2023			EBISU COMENTA QUE SU RESIDENTE TRABAJÓ HASTA EL 31-07-2023 Y QUE ESTÁN CONSIGUIENDO EL NUEVO PROFESIONAL A LA FECHA SE LLEVAN 16 DÍAS SIN RESIDENTE DE OBRA No. 2

HV PROFESIONAL SST	CONTRATISTA	16/08/2023	SIN FECHA			
HV MAESTRO DE OBRA	CONTRATISTA	10/07/2023	23/08/2023			EL MAESTRO APROBADO NO PUEDE ACEPTAR EL TRABAJO POR LO CUAL INICIAN LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO PROFESIONAL. YA TENEMOS 5 semanas SIN EL MAESTRO EN OBRA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12	CONTRATISTA	02/08/2023	SIN FECHA			EBISU REMITIÓ PARA REVISIÓN EL 10-08-2023, SE REVIÓ Y SE ENVIARON UNAS OBSERVACIONES EL 14-08-2023 Y YA SUBSANÓ EL MISMO DÍA Y SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Marino Arce	Firma
En Representación de	EBISU SAS	
Cargo	Director de obra	
Teléfono		
NOMBRE	Carlos Herrera	Firma
En Representación de	EBISU SAS	
Cargo	Residente de obra	
Teléfono		
NOMBRE	Julianie Paola Rincón	Firma Julianie Paola Rincon Firmado digitalmente por Julianie Paola Rincon Fecha: 2023.09.20 01:06:38 -05'00'
En Representación de	ENTerritorio	
Cargo	Supervisor	
Teléfono		
NOMBRE	Juan Pablo Vargas Quemba	Firma Juan Pablo Vargas Quemba Firmado digitalmente por Juan Pablo Vargas Quemba DN: cn=Juan Pablo Vargas Quemba gn=Juan Pablo Vargas Quemba c=Colombia l=CO Motivo:He revisado este documento Ubicación: Fecha:2023-09-20 12:11+19:00
En Representación de	ENTerritorio	
Cargo	Gerente de Convenio	
Teléfono		
NOMBRE	Marcela Celis Amado (conectada virtualmente)	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Cargo	Transversal Técnico del grupo de desarrollo de proyectos 1	
Teléfono		
NOMBRE	Pamela Beltrán	Firma
En Representación de	Consorcio Educativo Bogotá	
Cargo	Director de interventoría	
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: M[redacted]N[redacted]
DIRECTO[redacted]

Firma_____
Nombre: PAMELA BELTRÁN ESPITIA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma Julianie Paola Rincon Firmado digitalmente por Julianie Paola Rincon Fecha: 2023.09.20 01:07:15 -05'00'

Nombre: JULIANIE PAOLA RINCÓN
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

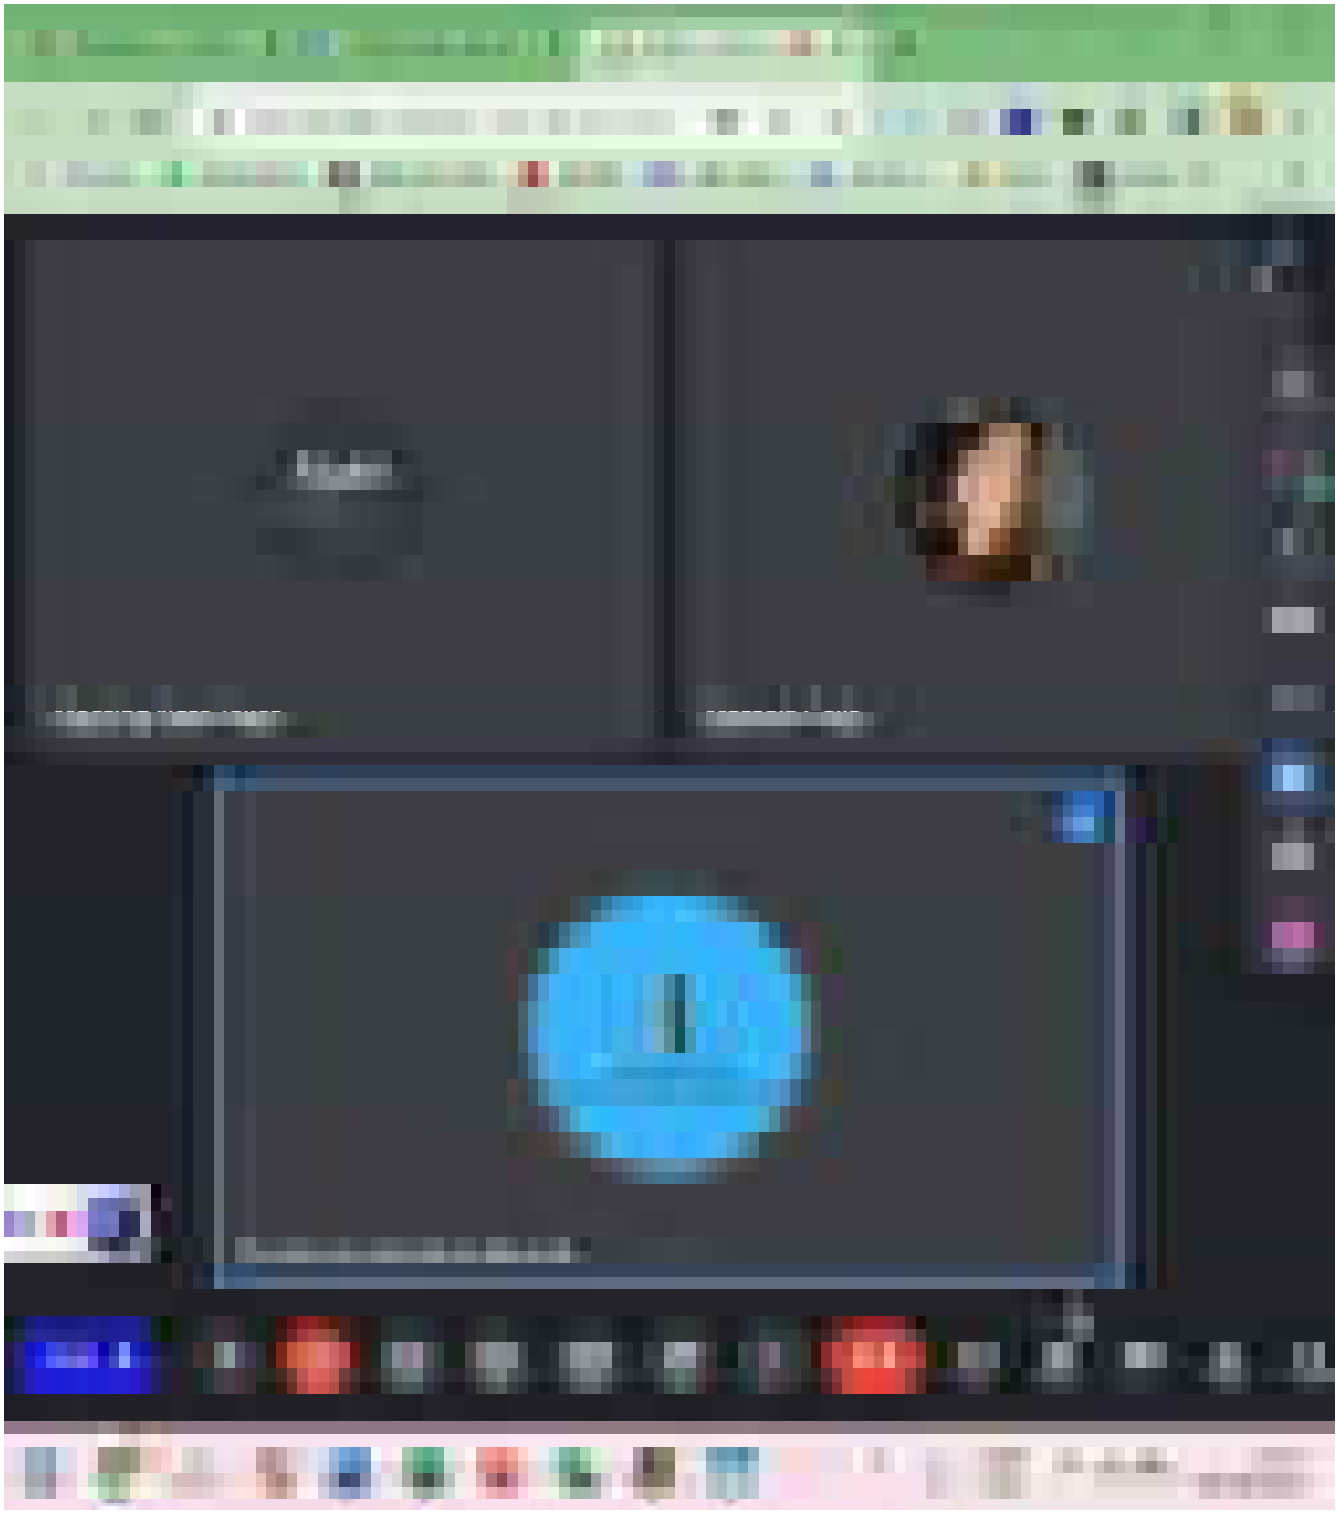

ACTA No:	57/obra		
FECHA:	24/08/2023		
CONTRATO OBRA N°:	2220555	**CONTRATO N°:**	221013
OBJETO:	Construcción De Infraestructuras Educativas En El Marco Del Contrato Interadministrativo No. 221013 - Grupo II Colegio Boitá		

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMITÉ DE OBRA No.	56					16/08/2023
COMPROMISO PACTADO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE SOLICITUD**	**FECHA PLAZO EJECUCIÓN**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**DÍAS AVANCE/ATRASO**	**OBSERVACIONES**
REMISIÓN DE ACTAS COMITÉS DE DISEÑO No. 43, 46, 47 Y 48	ENTERRITORIO	30/06/2023	23/08/2023		54	SE REMITIERON A ENTERRITORIO PARA FIRMAS DE ENTERRITORIO, SED Y CONSULTOR, ESTÁN EN PODER DE ENTERRITORIO NO HAN SIDO REMITIDAS
REMISIÓN DE ACTAS COMITÉ DE OBRA No. 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52	ENTERRITORIO	07/06/2023	23/08/2023		77	SE REMITIERON A ENTERRITORIO PARA FIRMAS DE ENTERRITORIO NO HAN SIDO REMITIDAS
REMISIÓN DE ACTA COMITÉ DE OBRA No. 53,54,55	CONTRATISTA	09/08/2023	23/08/2023	19/08/2023	-4	SE REMITIERON A ENTERRITORIO PARA FIRMAS DE ENTERRITORIO
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL MOSTRANDO EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LAS JORNADAS DE ASEO	CONTRATISTA	29/03/2023	cada semana	22/08/2023		SOLICITUD HECHA EN OFICIO EBISU HA ENVIADO REGISTRO CADA SEMANA DEL ANTES Y DESPUÉS DE LAS JORNADAS DE ASEO SE LE SOLICITA A EBISU SAS QUE AMPLIE EL INFORME POR CADA ZONA, SE COLOQUE EL ANTES Y DESPUÉS DE CADA ZONA DE LA OBRA

OFICIO CON REQUERIMIENTO SOBRE VIÁTICOS DE PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA VISITA PRESENCIAL DEL MIÉRCOLES 19-04-2023	INTERVENTORÍA	12/04/2023	16/08/2023	23/08/2023	133	SE REMITIÓ SOLICITUD EN OFICIO CEB-705-2022 EL 12-04-2023 Y EL CONTRATISTA RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-663-2022 EL 13-04-2023 AL QUE SE LE DIO RESPUESTA MEDIANTE OFICIO CEB-717-2022 EL 14-04-2023 Y EBISU DIO RESPUESTA EL 15-04-2023 MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-676-2022 Y SE LE DIO RESPUESTA EL 18-04-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-730-2022 Y EBISU RESPONDIÓ EL 20-04-2023 CON EL OFICIO EBI-ENT-BOG-685-2022 EL CUAL SE RESPONDIÓ EL 20-04-2023 CON EL OFICIO CEB-740-2022 EL CUAL EBISU RESPONDIÓ EL 22-04-2023 CON OFICIO EBI-ENT-BOG-697-2022 y LA INTERVENTORÍA RESPONDIÓ CON EL OFICIO CEB-755-2022 DEL 25-4-2023, EBISU RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-710-2022 EL 05-05-2023 Y SE RESPONDIÓ EL 08-05-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-780-2022 Y EBISU RESPONDE MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-728-2022 EL 12-5-2023 Y LA INTERVENTORÍA RESPONDE EL 15-5-2023 MEDIANTE EL OFICIO CEB-791-2022, EBISU RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-752-2022 EL 25-05-2023 Y SE RESPONDIÓ EL 30-05-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-831-2022, EBISU RESPONDIÓ CON EL OFICIO EBI-ENT-BOG-764-2022 QUE SE RESPONDIÓ CON EL OFICIO CEB-849-2022 DEL 09-06-2023 QUE EL CONTRATISTA RESPONDIÓ EL 29-06-2023 MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-802-2022 Y SE RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO CEB-894-2022 EL 04-07-2023 CONTRATISTA DE OBRA RESPONDE MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-816-2022 DEL 07-07-2023, LA INTERVENTORÍA RESPONDE MEDIANTE OFICIO CEB-916-2022 11-07-2023. LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA VAN A ESPERAR RESPUESTA POR PARTE DE ENTERRITORIO PARA VER CONTRACTUALMENTE QUE SE PUEDE HACER PARA SOLVENTAR EL TEMA DE LOS VIÁTICOS DE LA CONSULTORÍA NO HA LLEGADO LA RESPUESTA POR PARTE DE ENTERRITORIO

INP nuevos del balance general con soportes	CONTRATISTA	12/04/2023	SIN FECHA	18/08/2023		EL CONTRATISTA REMITIÓ UN SEGUNDO PAQUETE CON 59 INP, SE REALIZÓ MESA DE TRABAJO EL 18-07-2023 PARA REVISAR LA FORMA, NO EL FONDO, SALIERON UNAS OBSERVACIONES QUE EL CONTRATISTA ESTÁ SUBSANANDO Y LA INTERVENTORÍA VA A REVISAR LOS APUS PARA HACER OBSERVACIONES. INTERVENTORÍA REMITE OBSERVACIONES EL 04-08-2023 VÍA EMAIL AL LOS APUS TENIENDO EN CUENTA EL OFICIO DE PLANEACIÓN Y LA MESA DE TRABAJO DEL 02-08-2023 CONTRATISTA ESTÁ AJUSTANDO LOS INP CON LAS OBSERVACIONES HECHAS EN MESA DE TRABAJO CON PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO EL 02-08-2023 PARA REMITIR TODOS LOS INP LA INTERVENTORÍA REMITIÓ OFICIO CEB-979-2022 DEL 09-08-2022 HACIENDO EL REQUERIMIENTO DE LA ENTREGA DE TODOS LOS INP EBISU REMITIÓ UN PAQUETE DE 10 INP Y VA A REMITIR OTRO EL 18-08-2023 QUE ENTRAN A REVISIÓN DE INTERVENTORÍA. EL 22-08-2023 LLEGÓ RESPUESTA DE PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO A LOS 17 INP DONDE DEJA UNA NOTA QUE PARA LOS NUEVOS INP SÓLO VALE EL MENOR VALOR POR LO CUAL EBISU VA A VOLVER A AJUSTAR LOS INP CON ESTA DIRECTRIZ
REEMBOLSO A EBISU POR CONCEPTO DE VISITA DE FORESTAL DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE	ENTERRITORIO	26/04/2023	16/08/2023	23/08/2023	119	contratista va a hacer una comunicación con la trazabilidad y adjuntar los 2 soportes e interventoria revisará y hará la solicitud con recomendación de pagarlo como imprevisto EBISU REMITIÓ OFICIO EBI-ENT-BOG-730-2022 EL 12-5-2023 SE TRASLADÓ A ENTERRITORIO MEDIANTE OFICIO CEB-801-2022 del 17/05/2023. ESTÁ PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DE ENTERRITORIO
ENTREGA DE SUBSANACIONES DE INP 01 AL 17	CONTRATISTA INTERVENTORÍA ENTERRITORIO	18/05/2023	SIN FECHA	18/08/2023		ESTÁN PENDIENTES LAS SUBSANACIONES POR PARTE DE EBISU PARA HACER UNA REVISIÓN CON LA INTERVENTORÍA PARA PODER HACER REVISIÓN CON ENTERRITORIO ANTES DE HACER ENTREGA FORMAL EBISU LAS ENVIÓ EL 30-5-23 MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-755A-2022 SE REVISARON Y SE DIERON APROBACIÓN Y TRASLADO A 16 INP Y SOBRE EL INP 06 SE DIO RESPUESTA AL CONTRATISTA DE OBRA EL INP 06 SE APROBÓ EL 22-06-2023 Y SE DIO TRASLADO A ENTERRITORIO MEDIANTE EL OFICIO CEB-875-2022 ESTÁ PENDIENTE QUE PLANEACIÓN DE

						ENTERRITORIO REMITA SUS OBSERVACIONES U APROBACIÓN ENTERRITORIO REMITIÓ 1 OBSERVACIÓN SOBRE UN FORMATO QUE ESTABA DESACTUALIZADO Y EL CONTRATISTA YA ESTÁ SUBSANANDO. SE ENVIÓ EL 13-07-2023 ENTERRITORIO REMITIÓ OBSERVACIÓN 2 EL 17-07-2023 DONDE SE DEBE CORREGIR EL VALOR DE LA VOLQUETA EN EL ÍTEM DE TRANSPORTE EN LOS 3 ÍTEMS DE CAJAS DE INSPECCIÓN E IGUALAR EN LAS DESCRIPCIONES QUE TODAS DIGAN RETIRO DE ESCOMBROS EBISU REMITIÓ EL 19-07-2023 SUBSANACIONES Y SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA, PERO EN COMITÉ ENTERRITORIO ACLARÓ QUE PUEDEN SALIR MÁS OBSERVACIONES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO QUE LA SUPERVISORA EN AVANZADA FUE REMITIENDO LAS OBSERVACIONES QUE LE HAN IDO REALIZANDO PARA QUE EL CONTRATISTA VAYA HACIENDO AJUSTES. LLEGÓ EMAIL DE ENTERRITORIO CON RESPUESTA EL LUNES 24-07-2023 EN LA NOCHE Y SE REMITIERON AL CONTRATISTA EL 25-07-2023 EN LA MAÑANA PARA SU REVISIÓN Y AJUSTES EL CONTRATISTA REMITE OFICIO EBI-ENT-BOG-849-2022 EL 31-7-2023 Y DESPUÉS DEL OFICIO DE ENTERRITORIO CON LAS OBSERVACIONES DE PLANEACIÓN Y DE MESA DEL TRABAJO DEL 02-08-2023, EL CONTRATISTA REMITE OFICIO EBI-ENT-BOG-851-2022 EL 03-08-2023 CON AJUSTES ACORDADOS Y SE DA APROBACIÓN Y TRASLADO ESE MISMO DÍAS MEDIANTE OFICIO CEB-966-2022 EL 22-08-2023 LLEGA RESPUESTA POR PARTE DE PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO REMITIDA POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO, SE LE DA TRASLADO A EBISU SAS Y SE PROPONE MESA DE TRABAJO DE REVISIÓN DE LA RESPUESTA DE PLANEACIÓN EL MIÉRCOLES 23-08-23 EN HORAS DE LA TARDE EBISU REMITE PAQUETE SUBSANADO CON OBSERVACIONES DE PLANEACIÓN EN 14 DE 17 INP, HAY 3 QUE FALTAN POR CONCILIAR CON PLANEACIÓN.

INFORMES Y SOPORTES POR TALA DE ARBOLES SEGÚN LA RESOLUCIÓN	CONTRATISTA	31/05/2023	16/08/2023	18/08/2023	84	EL FORESTAL DE EBISU SAS ESTÁ ELABORANDO EL INFORME Y LO ENTREGA EL LUNES 12-6-2023NO HA SIDO REMITIDO EL INFORME Y EBISU SAS COMENTA QUE NO SU ESPECIALISTA NO LES HA DADO LA NUEVA FECHA DE ENTREGA DEL INFORME.EBISU HACE UNA REVISIÓN AL INFORME Y LE REMITE OBSERVACIONES AL ESPECIALISTA Y ESTÁN ESPERANDO QUE LO SUBSANE PARA PODER REMITIRLOCONTRATISTA REMITE INFORME TALA ARBOLES MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-818-2022 DEL 10-07-2023, AL SE LE REMITEN OBSERVACIONES EL 14-07-2023 Y ESTÁ PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA SUBSANENO HA SIDO REMITIDO
RESOLUCIÓN TALA 3 ARBOLES	SED	28/04/2023	SIN FECHA			PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, SE RECIBE CORREO EL DÍA 11-07-2023 POR PARTE DE ENTERRITORIO CON TRASLADO DE CORREO DE SED SOLICITANDO EL PAGO DE 225 MIL PESOS por concepto de "Permiso o autorización. Tala, poda, transreubic. Arbolado urbano" PENDIENTE PAGO DE RECIBO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENVIADO POR LA SED EBISU PAGA RECIBO EL 26-07-2023 Y VA A REMITIR A INTERVENTORÍA PARA QUE LE DE TRASLADO A LA ENTIDAD EBISU REMITE RECIBO EL 28-07-2023 Y SE LE DA TRASLADO ESE MISMO DÍA A ENTERRITORIO MEDIANTE OFICIO CEB-958-2022 LA SED DA EL RADICADO DE LA SUBSANACIÓN ENTREGADA EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE RAD 2023ER183272 10 AGOSTO DE 2023

REMISIÓN DE BALANCE No. 4 CON SOPORTES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	08/06/2023	SIN FECHA			CONTRATISTA TIENE OFICIO CON OBSERVACIONES ENVIADO POR LA INTERVENTORÍA EL 08-06-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-846-2022 CONTRATISTA MANIFIESTA QUE VAN A ENVIAR REPROGRAMACIÓN PERO QUE QUEDA PENDIENTE EL BALANCE, FLUJO DE CAJA, CURVA S, PLAN DE COMPRAS Y PLAN DE RECURSO HUMANO HASTA TANTO NO SE TENGAN LOS 17 INP APROBADOS EBISU ENVÍA REPROGRAMACIÓN EL 28-07-2023 Y SE REMITE OFICIO CON OBSERVACIONES EL 04-08-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-971-2022 PARA SUBSANACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA CONTRATISTA REMITE SUBSANACIONES VÍA EMAIL Y SE ESTÁN HACIENDO MESAS DE TRABAJO PARA AJUSTAR LA PROGRAMACIÓN, EN ESTA PROGRAMACIÓN SE INCLUYEN LOS 17 INP CON 150 DÍAS DE TIEMPO CONTRATISTA REMITE REPROGRAMACIÓN CON 17 INP, ADICIONANDO 150 DÍAS PARA REVISIÓN MEDIANTE EL OFICIO EBI-ENT-BOG-863-2022 EL 15-08-2023 Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA NUEVAMENTE YA QUE REMITEN PROGRAMACIÓN DISTINTA A LA TRABAJADA EN LAS MESAS DE TRABAJO.
RCD JULIO 2023	CONTRATISTA	02/08/2023	SIN FECHA			SE ENVIARON OBSERVACIONES el 22-08-2023 EBISU REMITE SUBSANACIONES PARA REVISIÓN DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA REMITE, SALE UNA PEQUEÑA OBSERVACIÓN QUE CORRIGE EBISU Y QUEDA APROBADO EL 24-08-2023
INFORME A ACTA DE VISITA DE LA ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA SED	CONTRATISTA	02/08/2023	SIN FECHA			SE ENVIARON OBSERVACIONES el 22-08-2023 EBISU REMITE SUBSANACIONES PARA REVISIÓN DE INTERVENTORÍA SE APRUEBA EL 23-08-2023 Y SE LE DA TRASLADO A ENTERRITORIO PARA QUE SEA REMITIDA A SED MEDIANTE OFICIO CEB-1010-2022
HV RESIDENTE DE OBRA No. 2	CONTRATISTA	02/08/2023	23/08/2023			EBISU COMENTA QUE SU RESIDENTE TRABAJÓ HASTA EL 31-07-2023 Y QUE ESTÁN CONSIGUIENDO EL NUEVO PROFESIONAL A LA FECHA SE LLEVAN 3 SEMANAS SIN RESIDENTE DE OBRA No. 2

HV PROFESIONAL SST	CONTRATISTA	16/08/2023	SIN FECHA			EBISU REMITE HV MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-874-2022 EL 18-08-2023 Y SE DA APROBACIÓN Y TRASLADO MEDIANTE OFICIO CEB-1003-2022 EL MISMO DÍA A LA FECHA SE LLEVA 1 SEMANA SIN EL PROFESIONAL SST EBISU REMITE HV DE UN PROFESIONAL SST QUE SE REVISA Y SE LE DA APROBACIÓN EL 18-08-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-1003-2022
HV MAESTRO DE OBRA	CONTRATISTA	10/07/2023	23/08/2023			YA TENEMOS 6 semanas SIN EL MAESTRO EN OBRA EBISU REMITIDO HV QUE SE REVISÓ Y APROBÓ EL 23-08-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-1014-2022
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12	CONTRATISTA	02/08/2023	SIN FECHA			EBISU REMITIÓ PARA REVISIÓN EL 10-08-2023, SE REVIÓ Y SE ENVIARON UNAS OBSERVACIONES EL 14-08-2023 Y YA SUBSANÓ EL MISMO DÍA , SE HICIERON VARIAS OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES Y EL 22-08-2023 REMITEN YA DE MANERA FORMAL EL ACTA 12 MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-878-2022 Y EL MISMO DÍA SE LE DA APROBACIÓN Y TRASLADO MEDIANTE OFICIO CEB-1007-2022

2. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:			
Responsable por Contratista	Arq Marino Arce		
Responsable por Interventoría	Ing Pamela Beltrán		
Fecha programada cumplimiento		% de avance	

TEMAS PRESENTE ACTA

Aspectos Ambientales.
- Seguimiento a actividades desarrolladas

Aspectos Sociales
- Actividades del plan de gestión social
- Estado de PQR o notificaciones en punto PAC
- HV mano de obra no calificada de la localidad de Kennedy

Aspectos SST
- Afiliaciones de Personal
- Cumplimiento estándares mínimos SG-SST

Aspectos Técnicos
- Actividades a ejecutar en la semana

- Estado de proceso de compras y llegada insumos a obra y maquinaria.
- Comunicaciones varias
- Supervisor Técnico Independiente
- Temas Varios

Aspectos Técnicos

AMPLIACIÓN DE COMPROMISOS:

- **Actas de comité de obra:** La supervisión de ENTerritorio manifiesta que se aplazan los compromisos de entrega de actas de comité firmadas para el próximo comité el 30-08-23. ENTerritorio tiene pendiente para firmas de ENTerritorio, las actas de comités de obra No. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55.

  El acta de obra 56 la tiene el contratista de obra para revisión y firmas y la remiten el 30-08-2023.

- **Actas de comité de diseño:** La supervisión de ENTerritorio manifiesta que se aplazan los compromisos de entrega de actas de comité firmadas para el próximo comité el 30-08-23. ENTerritorio tiene pendiente para firmas de ENTerritorio, SED y consultor las actas de comité de diseños No.43, 46, 47 y 48.

- **INP nuevos:** EBISU SAS remite un paquete con 10 INP para revisión de interventoría y se encuentra ajustando los otros INP con las observaciones hechas por Planeación de ENTerritorio en su último comunicado donde reitera que todo los nuevos INP que se pasen sólo valdrán la cotización de menor valor para materiales no contractuales.

- **Pago de imprevistos**: Falta el concepto de ENTerritorio con relación a la recomendación de interventoría, se corre el compromiso de respuesta para el 30-08-23.

- **Subsanaciones 17 primeros INP:** Se recibe respuesta por parte de Planeación de ENTerritorio mediante la supervisora el 22-08-2023, la cual se remite al contratista de obra para revisión. Se realiza mesa de trabajo el 23-08-2023 en la mañana entre interventoría y contratista para revisar el oficio de Planeación y el contratista concilia 14 de 17 INP y se espera una aclaración de planeación sobre el geotextil NT2500 para poder conciliar otros 2 INP y dejando sólo pendiente de conciliar 1 INP, el del concreto de muros contención.

- **Personal Mínimo:** Se recuerda al contratista de obra que a la fecha se lleva 3 semanas sin Residente de Obra No. 2.
  Se aproó un profesional SST el 18-08-2023 y está pendiente que, remitan la ARL. EBISU SAS comenta que el profesional no va a aceptar la oferta de trabajo por lo cuál deben buscar otro profesional SST, la interventoría aclara que a la fecha se lleva 1 semana sin el Profesional SST en obra. Sobre el maestro de obra, remitieron una HV que se revisó y se le dio aprobación el 23-08-2023, no han remitido documentos para el ingreso y el maestro no ha ingresado a obra y a la fecha se lleva 6 semanas sin el maestro de obra en obra.

- **Trámite tala de 3 árboles:** Jorge Serrano de la SED comenta que realizaron mesa de trabajo con la Secretaría de Ambiente y que ya radicaron el documento subsanado mediante radicado No. RAD 2023ER183272 del 10-08-2023 y que están a la espera que la Secretaría de Ambiente de respuesta.

ASPECTOS AMBIENTALES:

La especialista ambiental de la interventoría, Karen Gil comenta que:

1. El día de hoy, 24 de agosto de 2023, se aprueba el informe de RCD del mes de julio de 2023.
2. Hasta la fecha se ha recibido el reporte de aseo y orden en obra de las semanas del 27 de marzo al 19 de agosto de 2023, en donde se evidencia el acopio de material, la organización de obra, la separación de residuos. Sin embargo, se recomienda revisar el tema de los puntos ecológicos no se están usando en obra, por ejemplo, el punto de ecológico que se ubica a la salida de las oficinas, revisar si se deben reubicar y, además, instalar la respectiva señalización. Se observó durante la semana se hizo recolección de ICOPOR ubicado en el Bloque A.
3. Se solicita los ajustes del informe de tala de la Resolución 00695 de la SDA, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los manuales de silvicultura en cuanto al manejo de las talas.
4. El día 17 de agosto de 2023, desde interventoría se realizan las observaciones al informe de respuesta de la visita de la ingeniera Paula Arango, profesional ambiental de la SED el día 02 de agosto de 2023 y el día 23 de agosto de 2023 se aprueba el informe enviado mediante el oficio EBISU EBI-ENT-BOG-865A-2022 y se radica a ENTERRITORIO con No. 20234300274852.
5. Durante la semana se observó que el Talud occidental de la rampa continúa derrumbándose y no se ha hecho intervención alguna, sin embargo, se encuentran despejando el acopio de acero que se ubica sobre este talud y moviendo el burro en mal estado que se encuentra allí ubicado.
6. Se observó también la barrera de mitigación que se instaló en el sumidero de la que era la portería principal de ingreso de volqueas, con el fin de prevenir mejor el paso de material al sumidero y la saturación de tuberías.
7. Se sigue recomendando el barrido de la vía y pues recordar que igual al final del proyecto se tiene que arreglar la vía, pues que esté en condición igual como estaba mejores condiciones.

Manuel Solano profesional ambiental de EBISU SAS comenta está de acuerdo con lo que enuncia la ingeniera Karen Gil ambiental de interventoría, adicional al tema, pues realizamos esta semana la solicitud de limpieza a los individuos arbóreos y hoy en la charla que pudimos tener con la comunidad, pues le recomendamos que si veían alguna actitud negativa de algún externo o residuos que se votaran en esa zona, pues que también nos avisaran para para ayudar a dar la trazabilidad del tema, nosotros estuvimos haciendo una visita el día de ayer a obra y en la visita preliminar, efectivamente también anunciamos lo del talud y desde el componente técnico nos dieron parte de tranquilidad en que estamos tomando las medidas para desocupar la zona y estabilizar el talud y por lado, se comenta que esta semana esperamos quede lista la fumigación de la obra y la otra semana la implementación de las trampas de desratización.

ASPECTOS SOCIALES:

TEMAS

1. PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS “PQR”
2. ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
3. PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD
4. % MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La profesional social de Interventoría Viviana Peña comenta que:

- El día 22 de agosto de 2023 se realiza seguimiento al punto PAC, encontrándose este en buenas condiciones para brindar la atención adecuada a la comunidad.

- Se realiza aprobación al Punto Satélite el 22-08-2023, las cuales se instalaron el mismo día por el contratista de obra. Y el día de mañana se remite aprobación a la pieza de divulgación del PMT que ya está OK

- Se realizó el comité de participación ciudadana el día de hoy, 24-08-2023 de manera virtual de 10 am a 11am. En este se contó con la asistencia de seis (6) personas residentes del área de cercana del proyecto. La información presentada por el contratista fue clara y puntual.

- Programa de empleabilidad: El contratista de obra cuenta con el mismo personal de la semana pasada cumpliendo con un 56% de mano de obra no calificada en el proyecto. ACTUALMENTE HAY 5 HOMBRES MAYORES DE 28 AÑOS Y 1 MUJER MAYOR DE 28 AÑOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY TRABAJANDO COMO MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
- Se proyecta realizar la reunión social mensual con los profesionales del contratista de obra, SED y de ENTerritorio para el día 28-08-2023.

Angie Sánchez, profesional social de EBISU SAS deja la novedad que ni la social de la SED y ni la de ENTerritorio asistieron a la reunión virtual del día de hoy con la comunidad, entonces no saben si se pueda seguir haciendo de manera virtual o no las reuniones con la comunidad ya que a nosotros nos parece mas efectivo hacer las reuniones de manera virtual. La interventoría comenta que se hable el tema en la reunión entre sociales del día lunes 28-08-2023 y que se vaya preparando la documentación de la próxima reunión y que revisen el cronograma de actividades sociales ya que las reuniones que se tienen programadas son los días sábados por si toca hacer algún ajuste al cronograma.

ASPECTOS SST:

Cristian López SST de la interventoría comenta que:
Personal: Administrativos 9 de EBISU SAS, operativos 72, interventoría 11

La interventoría en este mes de agosto de 2023 ha recibido documentación y ha autorizado el ingreso a un total de 24 colaboradores de los cuales 20 son operativos y 4 personal de la nueva empresa de seguridad Anillos de Seguridad, razón social incluida en la matriz de proveedores No 17 del 23 de agosto de 2023, se le solicita al contratista presentar como mínimo afiliación a la EPS, ARL y examen ocupacional.

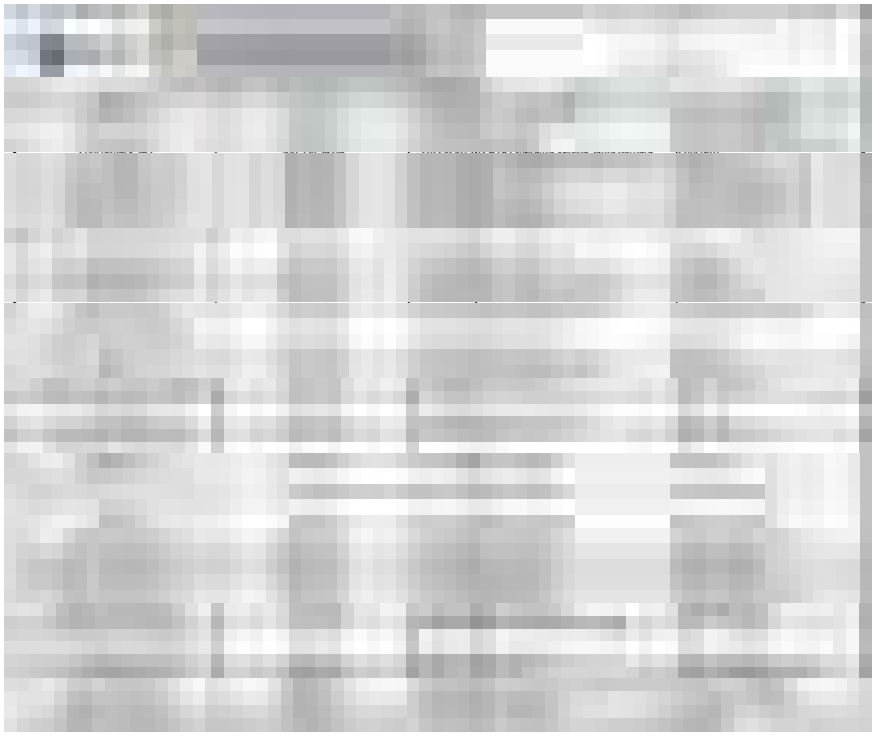

Hoy 24 de agosto de 2023 termina el periodo de pago agosto de 2023 de la seguridad social con los NIT o cedulas terminadas entre 94 y 99 correspondiente al periodo de cotización julio 2023 para reportar las novedades que sucedieron en julio 2023, se nos ha remitido las planillas vigentes de los proveedores Umba, ORR Construcciones, CONCREMACK, INVERCO y del contratista de obra EBISU SAS, está pendiente la PILA vigente de la nueva empresa de seguridad pago agosto 2023.



Los proveedores del contratista EBISU SAS que tienen personal en obra son ORR Construcciones 26 colaboradores, Umba 6 colaboradores, Road Building 7 y el contratista EBISU SAS con 33 operativos.

Del cronograma de actividades SST aprobado para agosto 2023 (mes 14) se realizó el 16 de agosto de 2023 capacitación en prevención de silicosis generado por material particulado y capacitación exposición a vibraciones y el jueves 17 de agosto de 2023 campaña estilo de vida saludables, está pendiente de ejecución:

- Campaña de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas

Continúan condiciones inseguras que requieren de la gestión inmediata del contratista, el talud y entibado occidental de la rampa continuo derrumbándose, el martes 22 de agosto de 2023 nos encontramos con un deslizamiento de proporción considerable sobre la rampa, afecta y limita el ingreso por esa zona al almacén y si no se realiza intervención al talud del eje 1 esquina entre ejes D y E también puede continuar su deterioró, desde la interventoría hemos sido insistentes en el riesgo de estos dos puntos principalmente solicitamos su pronta intervención, como medida de mitigación trasladaron el acero y quitaron el burro de esa zona externa al salón comunal para quitarle peso al talud.

John Zamora de Inspector SST de EBISU SAS comenta que ellos tienen un reporte de 24 colaboradores que han ingresado, se encuentran tomando acciones para minimizar el impacto del talud de la rampa, están retirando el acero en ese costado y están esperando que se rellene más el terreno para ingresar la retro y se está quitando todo el material que genera peso en ese costado y se habilitó otra enteada para el almacén. Ya solo queda pendiente una capacitación de prevención de alcohol, tabaco y drogas y no se han presentado ningún tipo de incidente o accidente en esta semana ni en este mes.

ASPECTOS TÉCNICOS:

- **Actividades a ejecutar en la semana**

La interventoría manifiesta que de acuerdo con la reprogramación No 2 aprobada por interventoría el 03 de marzo de 2023, las actividades contempladas para ejecución en la presente semana son:

- ✓ 2.1.07 Escalera principal en concreto Arquitectónico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero
- ✓ 2.2.01 Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con Uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos Aux
- ✓ 2.2.04 "Anclaje hierro ,5/8""-perf. ,3/4"" 10-15c"
- ✓ 2.2.05 "Anclaje hierro ,1/2""-perf. ,5/8"" 10-15c"
- ✓ 3.01 Muro en ladrillo portante 30 terracota de 29x14.5x9. incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
- ✓ 3.02 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
- ✓ 3.03 Muro en bloque no. 5 con perforación vertical r de 33x11.5x23 pañetado. incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
- ✓ 3.05 Alfajía concreto a=15-20cm sobre muros acabado arquitectónico a la vista color natural
- ✓ 4.01 Celosía vertical en concreto 2500 PSI. a=30-60cm Espesor 7cm acabado arquitectónico a la vista color natural. Incluye refuerzo y elementos de anclaje
- ✓ 4.02 Pérgolas en concreto 3000 PSI. a=10cm x alto 30 cm acabado arquitectónico a la vista color natural. Incluye refuerzo y elementos de anclaje
- ✓ 5.1.9 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ,3/4"" INC. ACCESORIOS,SOLDADURALIMPIADOR Y MANO DE OBRA Y ANDAMIOS"
- ✓ 5.1.10 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 D=1/2""INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
- ✓ 5.1.11 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
- ✓ 5.1.25 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/4"" INC. CHAZOS DE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"
- ✓ 5.1.27 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA GALVANIZADA D=1/2"" INC. CHAZOS DE EXPANSIÓN,,ABRAZADERA ,TORNILLOS, ARANDELAS ANDAMIOS"
- ✓ 5.2.14 "PUNTO VENTILACIÓN D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"
- ✓ 5.2.15 "VÁLVULA DE RE AIREACIÓN Y/O VENTILACIÓN D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

- ✓ 7.1.1.1 Suministro, montaje y conexión de Derivación de media tensión (11,4 KV) desde circuito sencillo y poste existente, según listado de materiales y forma constructiva de Norma LA228 de CODENSA . Incluye instalación de DPS para uso exterior, puesta a tierra
- ✓ 7.2.1 RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN (11.4 Kv)
- ✓ 7.2.3 MALLA DE PUESTA A TIERRA DE POTENCIA Y BARRAJES DE EQUIPOTENCIALIZACION EN CENTROS DE CABLEADO DE COMUNICACIONES.
- ✓ 7.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR TRÍPLEX DE 17,5 KV, CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES EQUIPOS: UNA (1) CELDA DE ENTRADA Y SALIDA 17,5KV DIMENSIONES 2000X1100X1200MM ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD, SECCIONADOR DÚPLEX 3X630AMP; UNA (1) CELDA DE SECCIONADOR
- ✓ 7.4.2 Suministro e instalación de Transformador 3F - 500KVA - 11.4KV - 208/120V Tipo Seco, Clase F. Conexión DYn5. Derivaciones+1-3*2.5%.
- ✓ 7.4.3 Suministro e instalación de celda para Transformador 3F - 500KVA - 11.4KV - 208/120V Tipo Seco, Clase F.
- ✓ 7.4.4 Construcción de interconexión entre el seccionador tríplex y el transformador ,mediante cables de Aluminio XLPE-15 kv , 3x185mm2 al 100%., L= 5m.
- ✓ 7.4.5 CANALIZACIÓN MECÁNICA DE PISO (CÁRCAMO) PARA SECCIONADOR TRÍPLEX DE 70x50 CM (LargoxAncho), EN CONCRETO. INCLUYE MATERIALES, REJILLA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
- ✓ 7.4.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD, TRIFÁSICO, 208V-127V. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES: TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCIÓN IP20 TIPO INTERIOR. DIMENSIONES (2
- ✓ 7.4.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN NORMA CODENSA AE319 PARA MEDICIÓN PRINCIPAL. INCLUYE LOS SIGUIENTES MATERIALES Y EQUIPOS: TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCIÓN IP20 TIPO INTERIOR. DIMENSIÓN
- ✓ 7.4.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN NORMA CODENSA AE319, PARA MEDICIÓN SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO, QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES: UN (1) TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTEC
- ✓ 7.4.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA DE 1200AMP 208V, TGE-EMERGENCIA. INCLUYE LOS SIGUIENTES MATERIALES Y EQUIPOS: UN (1) TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCIÓN IP20 TI
- ✓ 7.4.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TORRE A, TGD-TORRE A 400AMP 208V. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES: UN (1) INTERRUPTOR 3x300 A. EZC400N, Icu 85 kA/220 V. REF. EZC400N3300, SCHNEIDER. UN (1) INTERRUPTOR 3x100 A. EZC10
- ✓ 7.4.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TORRE A, TGD-TORRE A 400AMP 208V. INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES: TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCIÓN IP20 TIPO INTERIOR. DIMENSIÓN
- ✓ 7.4.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA B.C.I 400AMP 208V M.A BOMBA CONTRA INCENDIOS . INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) TABLERO AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14-16, GRADO DE PROTECCIÓN IP20 TIPO I TABLERO DE SO

- ✓ 7.4.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CON BANCO DE CONDENSADORES DE 90 KVAR, 208V, . INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) TABLERO AUTO SOPORTADO DE BAJA DE TENSIÓN. FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE 14-16, CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO DEPOSITAD
- ✓ 7.5.1 Suministro, anclaje y conexión de Planta de emergencia, de 363 KVA/290,4 KW A 1000 M.S.N.M. (330 KVA/264 KW A 2.600 M.S.N.M),208/120 Voltios., Motor CUMMINGS Y Generador STAMFORD, con panel de control, y cabina de insonorización. Incluye cargador de bater
- ✓ 7.5.2 "Montaje e instalación de silenciador y tubería de escape de 8""
- ✓ 7.6.1 Suministro e instalación de UPS de 10 KVA. 240V/120V, Dos fases, neutro y tierra; tecnología online, doble conversión, con tecnología del inversor PWM de alta frecuencia. Conexión dual (doble conexión a la entrada). Onda de salida: Senoidal pura, Factor d
- ✓ 7.7.1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CERRADO PARA SERVIDOR Y EQUIPOS de Unidades FLAT, Tipo V800 DE SIEMON. INCLUYE. COMPARTIMIENTO CON CIERRE SIMPLE (1), 800 MM DE ANCHO, 1000 MM DE PROFUNDIDAD, 2 PANELES LATERALES PARTE SUPERIOR E INFERIOR DIVIDIDAS DE
- ✓ 7.7.1.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE DE CONEXIÓN (PATCH PANEL MODULAR) ANGULAR, VACÍO (SIN JACKS), CAT 6A, DE 24 PUERTOS 1RU, MONOMARCA. INSTALADO. INCLUYE HERRAJE VACÍO, EN PROMEDIO 19 JACK CAT 6A F/UTP ZMAX NEGRO B POR HERRAJE , Y 19 MARQUILLAS AUTOLAMIN
- ✓ 7.7.1.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA PARA RECEPCIÓN DE TOPOLOGÍA ESTRELLA, MONOMARCA (TIPO RIC3-24-01 DE SIEMON), ACEPTA 4 PLACAS QUICK PACK, HASTA 96 FIBRAS, 2RU, INCLUYE: - UNA (1) BANDEJA DE CONEXIÓN DE F.O. (RIC3-24-01 DE SIEMON) , -
- ✓ 7.7.1.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK, CAT6A BLINDADO, F/UTP 10G, NEGRO/BLANCO MONOMARCA. INSTALADO EN PATCH PANEL.
- ✓ 7.7.1.1.5 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE PUESTA A TIERRA DE Cu PARA GABINETES Y RACKS . MONOMARCA. INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BARRA DE PUESTA A TIERRA DE Cu PARA RACKS Y GABINETES DE COMUNICACIONES DE 19"", Y CABLE CALIBRE 6 AWG DE 2 m DE LARGO TERMINA"
- ✓ 7.7.1.1.7 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL, DE 2 U RACK DE ALTURA, FRONTAL, PARA RACK DE 19"" . MONOMARCA."
- ✓ 7.7.1.1.8 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDA D DE ENERGÍA BÁSICA (MULITOMA NO ADMINISTRABLE), HORIZONTAL, 1UR DE ALTURA, CORRIENTE DE ENTRADA 15 A, VOLTAJE DE ENTRADA 120V, PLUG DE ENTRADA NEMA 5-15P, 8 RECEPTÁCULOS DE SALIDA , NEMA 5-15R, LONGITUD 19""."
- ✓ 7.7.1.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Patch Cord APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 1 metro, Azul, CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX), IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO, TRENSADO
- ✓ 7.7.1.1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CALIBRE 500 KCM, AISLAMIENTO HFFRLS, DEBIDAMENTE MARCADO CON CINTA VERDE, PARA CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO QUE VA DESDE LA BARRA EQUIPOTENCIAL EN LA SUBESTACIÓN, HA
- ✓ 7.7.1.2.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CERRADO PARA SERVIDOR Y EQUIPOS de Unidades FLAT, Tipo V800 DE SIEMON. INCLUYE. COMPARTIMIENTO CON CIERRE SIMPLE (1), 800 MM DE ANCHO, 1000 MM DE PROFUNDIDAD, 2 PANELES LATERALES PARTE SUPERIOR E INFERIOR DIVIDIDAS DE

- ✓ 7.7.1.2.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE DE CONEXIÓN (PATCH PANEL MODULAR) ANGULAR, VACÍO (SIN JACKS), CAT 6A, DE 24 PUERTOS 1RU, MONOMARCA. INSTALADO. INCLUYE HERRAJE VACÍO, Y 24 MARQUILLAS AUTO LAMINADAS
- ✓ 7.7.1.2.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA, DESLIZABLE, PARA RACK. INCLUYE SOPORTES DE MONTAJE, ADMINISTRADORES DE FIBRA, ETIQUETAS Y OJALES PORTA ETIQUETAS . MONOMARCA. INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - UNA (1) BANDEJA DE CONEXIÓN DE F.O. DE 7
- ✓ 7.7.1.2.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK, CAT6A BLINDADO, F/UTP 10G, NEGRO/BLANCO MONOMARCA. INSTALADO EN PATCH PANEL.
- ✓ 7.7.1.2.05 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE PUESTA A TIERRA DE Cu PARA GABINETES Y RACKS . MONOMARCA. INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -BARRA DE PUESTA A TIERRA DE Cu PARA RACKS Y GABINETES DE COMUNICACIONES DE 19"", Y CABLE CALIBRE 6 AWG DE 2 m DE LARGO TERMINA"
- ✓ 7.7.1.2.06 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL, DE 2 U RACK DE ALTURA, FRONTAL, PARA RACK DE 19"" . MONOMARCA."
- ✓ 7.7.1.2.07 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDA D DE ENERGÍA BÁSICA (MULITOMA NO ADMINISTRABLE), HORIZONTAL, 1UR DE ALTURA, CORRIENTE DE ENTRADA 15 A, VOLTAJE DE ENTRADA 120V, PLUG DE ENTRADA NEMA 5-15P, 8 RECEPTÁCULOS DE SALIDA , NEMA 5-15R, LONGITUD 19""."
- ✓ 7.7.1.2.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Patch Cord APANTALLADO, 10G, Cat 6 A F/UTP, DE 1 metro, Azul, CALIBRE DE ALAMBRE No. 26 AWG, CONECTOR MACHO RJ-45 EN CADA EXTREMO, ALIEN CROSS TALK (ATX), IGNÍFUGO, SIN HALÓGENOS, SIN PLOMO, PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO, TRENSADO
- ✓ 7.7.1.2.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CALIBRE 250 KCM, AISLAMIENTO HFFRLS, DEBIDAMENTE MARCADO CON CINTA VERDE, PARA CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO QUE VA DESDE LA BARRA EQUIPOTENCIAL EN LA SUBESTACIÓN, HA
- ✓ 7.7.1.3.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CERRADO PARA SERVIDOR Y EQUIPOS de Unidades FLAT, Tipo V800 DE SIEMON. INCLUYE. COMPARTIMIENTO CON CIERRE SIMPLE (1), 800 MM DE ANCHO, 1000 MM DE PROFUNDIDAD, 2 PANELES LATERALES PARTE SUPERIOR E INFERIOR DIVIDIDAS DE
- ✓ 7.7.1.3.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE DE CONEXIÓN (PATCH PANEL MODULAR) ANGULAR, VACÍO (SIN JACKS), CAT 6A, DE 24 PUERTOS 1RU, MONOMARCA. INSTALADO. INCLUYE HERRAJE VACÍO, Y 24 MARQUILLAS AUTO LAMINADAS
- ✓ 7.7.1.3.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA FIBRA ÓPTICA, DESLIZABLE, PARA RACK. INCLUYE SOPORTES DE MONTAJE, ADMINISTRADORES DE FIBRA, ETIQUETAS Y OJALES PORTA ETIQUETAS . MONOMARCA. INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - UNA (1) BANDEJA DE CONEXIÓN DE F.O. DE 7
- ✓ 7.9.3.1 Suministro, instalación de Paneles de control de Intrusión Marca Bosch, referencia: B9512G Incluye: BG Control Panel-32 Areas-599 Pts
- ✓ 7.9.3.2 Suministro, instalación de Transformador Marca BOSCH, referencia D1640 conectable, 16V40VA o Similar
- ✓ 7.9.3.3 Suministro, instalación de Caja universal, blanca Marca Bosch, referencia B8103 o similar
- ✓ 7.9.3.4 Suministro, instalación de FUENTE DE PODER DC CON RESPALDO DE BATERÍAS 4AMP Marca Altronix o Similar - Incluye Gabinete uy Cerradura
- ✓ 7.9.3.5 Suministro, instalación de BATERÍA 12V 7AH
- ✓ 7.9.3.6 Suministro, instalación de Llave de seguridad USB Marca Bosch, referencia D5370-USB
- ✓ 7.9.3.7 Suministro, instalación de Enclosure lock and key set marca Bosch, referencia D101 o similar

- ✓ 7.9.3.8 Suministro, instalación de 2 Line Alpha Numeric Keypad marca Bosch, Referencia (SD12) o similar
- ✓ 7.9.3.9 Suministro, instalación de BOTÓN PÁNICO, marca Secolarm, referencia SS-078Q o similar
- ✓ 7.9.3.10 Suministro, instalación de CONTACTO MAGNÉTICO LIVIANO, Marca Secolarm, referencia SM-300Q/W o similar
- ✓ 18,01 Mesón en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0- 8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo
- ✓ 19.1.01 Cuarto frio: Recubrimiento interior en poliuretano inyectado de densidad 40 k/m3 = 0,016kc/h m ºc suelo acero galvanizado plastificado antideslizante. Incluye los remates exteriores y los perfiles sanitarios en verticales, suelos y techos. Alarma de hombre
- ✓ 19.1.03 Canal y Rejilla de piso: Fabricado en lamina de acero inoxidable calibre 18 tipo 304, con UND punto de desagüe, presenta rejilla troquelada y fabricada en lamina de acero inoxidable calibre 16 tipo 304 removibles para facilitar el acceso y la limpieza
- ✓ 19.1.07 Lavamanos pedestal y válvula automática Equipo con mueble fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, flujo de agua activado con el pie, por medio de válvula de presión antirretorno con pulsador de bronce cromada.
- ✓ 19.1.17 "Grifo de mesa 4 con ducha de pre lavado, grifo de mesa de 4"" con ducha de prelavado."
- ✓ 19.2.03 Cerramiento perimetral y cubierta (techo) en malla de nylon tratada #90, ojo 10x10, color negro texturizado, incluye guaya encauchetada inferior , centra y superior, grilletes, tensores, retenidas y vientos
- ✓ 20.01-4 Suministro e instalación SEÑALÉTICA REGLAMENTARIA: base: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática blanco mate. logotipo: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. Acabado pintura Pintuco según paleta de colores selección
- ✓ 20.01-5 Suministro e instalación SEÑALÉTICA MANDATOS: Base en Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática blanco mate. logotipo: Lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. Acabado pintura Pintuco según paleta de colores seleccionad
- ✓ 20,04 Cinta antideslizante reflectiva 3M o similar para escaleras para escaleras, peldaños y rampas no expuestos a intemperie
- ✓ 20.05 Línea de demarcación cancha múltiple continua ancho 10cm
- ✓ 20,1 Sistema mecánico Aire Acondicionado Auditorio
- ✓ 21,03 Siembra de Prado en tapete

Carlos Herrera de EBISU SAS manifiesta que está ejecutando:

- ✓ Placas entrepiso edificio B, columnas y pantallas
- ✓ Excavación Rampa
- ✓ Tuberías eléctricas
- ✓ Tuberías hidráulicas
- ✓ Mampostería el replanteo y la primera hilada para la forma de los muros.
- ✓ Llenos B-400
- ✓ Escaleras en concreto edificio B

- **Avance programado Vs avance ejecutado**:
  El avance con corte al 20 de agosto de 2023 es programado de 76.12% y ejecutado de 33.90% lo que representa un atraso del 42.22%.

- **Avance financiero**:
  Programado $ 26.632.849.286 Vs Ejecutado: $ 11.860.931.007

Interventoría comenta que el atraso mayormente corresponde a los siguientes ítems:

- ✓ Preliminares: 11 millones- Atraso
- ✓ Desmonte y Demoliciones: 10 millones- Atraso
- ✓ Descapote: 0 millones
- ✓ Excavación a cielo abierto: 6 millones- Atraso
- ✓ Protección taludes provisionales con concreto lanzado: 8 millones- Atraso
- ✓ Relleno compactado material importado: 45 millones- Atraso
- ✓ Trasiego interno: 5 millones - Atraso
- ✓ Retiro de material de excavación- 0 millones
- ✓ Pilotes 1m, 1.2m y 1.5m: 0 millones
- ✓ Demol. Cabezales de pilotes: 0 millones
- ✓ Solado limpieza espesor e=0.05m: 237 mil- Atraso
- ✓ Dado en concreto=210 kg/cm²: 0 millones
- ✓ Viga de cimiento en concreto f'c=210 kg/cm²: 0 millones
- ✓ Muro de contención de concreto armado: 254 millones- Atraso
- ✓ Losa de cimentación de concreto armado: 16 millones- Atraso
- ✓ Suministro e instalación de malla electrosoldada: 455 mil - Atraso
- ✓ Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa pilotes: 0 millones
- ✓ Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa dados, losa cim y muros: 166 millones- Atraso
- ✓ Columna de sección rectangular o cuadrada de concreto armado: 198 millones- Atraso
- ✓ Pantalla en concreto 5000 psi, con acabado arquitectónico: 287 millones- Atraso
- ✓ Viga confinamiento muro concreto 3000 psi 21 Mpa: 43 mil- Atraso
- ✓ Viga concreto aérea 4000 psi (28MPa) pórtico columnas. Acabado a la vista arquitectónico. Premezclado en planta. El precio no incluye acero: 40 millones- Atraso
- ✓ Losa aligerada con casetón recuperable, acabado arquitectónico a la vista. E=56-60cm concreto 4000psi, sin torta. El precio no incluye acero. Premezclado en planta: 3.089 millones- Atraso
- ✓ Losa concreto 4000 psi, maciza e=15cm acabado inferior a la vista arquitectónico, según diseño estructural. Premezclado en planta. El precio no incluye acero: 52 millones- Atraso
- ✓ Escalera principal en concreto Arquitectónico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero: 91 millones- Atraso
- ✓ Rampa vehicular en concreto 3000 psi. El precio no incluye acero: 6 millones- Atraso
- ✓ Foso de ascensor en concreto 4000 psi. Acabado a la vista: 57 millones- Atraso
- ✓ Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa columnas, vigas y losas: 2387 millones- Atraso
- ✓ Suministro e instalación de malla electrosoldada: 97 millones- Atraso
- ✓ 2.2. Estructura metálica: 1091 millones- Atraso
- ✓ 3. Mampostería: 522 millones- Atraso
- ✓ 4. PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: 22 millones - Atraso
- ✓ 5. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS:117 millones- Atraso
- ✓ 6. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑO: 263 millones- Atraso
- ✓ 7, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 2324 millones- Atraso
- ✓ 9, PISOS: 2145 millones- Atraso
- ✓ Otros: 1462 millones- Atraso

Se tienen 9.45 placas de entrepiso de atraso.

Alexis Socha de EBISU SAS comenta que como en la mayoría de los comités digamos que hemos enunciado la necesidad de reconocimiento de pago de los INP y gracias a Dios con el ejercicio que llevamos con planeación contractual, pues ya llevamos entre comillas aprobados 14 de los 17 INP, eso nos da como una luz para la ejecución del contrato, en ese estricto sentido, pues dejar claro que en el comité varias de las actividades que nosotros hemos hecho no han sido reconocidas que hay un dinero también importante Ahí independientemente de eso lo más importante es que nosotros la próxima semana empezamos con la venia de la interventoría empezaríamos a ejecutar la rampa de acceso vehicular, toda la rampa de acceso vehiculares es INP, para que quede eso claro entonces todos sus componentes como el filtro, el concreto, el rajón y demás son INP, prácticamente, por ende, es posible que para la siguiente semana el porcentaje ejecutado que tengamos sea prácticamente el mismo, ese como primer tema.
Como segundo tema, nosotros vamos a formalizar una suspensión contractual, ¿por qué la suspensión? porque el tema de los cortasoles o de los tirantes o como lo quieran llamar, es una curva crítica para que nosotros podamos terminar la ejecución del piso 8.70 del bloque B, lo que nos implicaría que ante una falta de decisión del equipo de consultoría, nosotros tendríamos que ir cortando espacios de la losa, como lo hicimos en el bloque A, para elevarnos al nivel 12.35, en ese estricto sentido, sino tenemos un pronunciamiento claro del equipo consultor, que nos defina una solución, tanto técnica como comercial, porque también lo hemos definido formalmente y es que la solución propuesta por el equipo consultor, nos definió la imposibilidad de tener el material para ejecutar los tirantes ya que nos informaron que se demorarían 40 días, entonces, pues prácticamente, nosotros quedaríamos imposibilitados para la ejecución contractual y estaríamos pendientes de que el equipo consultor definiera una alternativa comercial y rápida que nos permita a nosotros maniobra en la ejecución del contrato, sino nosotros lo establecemos aquí en comité, formalizaríamos la suspensión del contrato cuando terminemos la ejecución de la placa 8.35 en 2 de sus terceras partes.
También es importante recalcar el tema que tampoco hemos avanzado en el tema del voladizo, pues que también nos ha imposibilitado definir la continuidad del bloque A y también, pues no sé Ahí sí, es una precisión mía, no conozco si ya tenemos respuesta por parte de la interventoría de la solicitud de prórroga, que entregamos con la reprogramación de los 150 días. Digamos que considerando todos los factores que tenemos actuales, va encaminada a la suspensión del contrato. Esperaríamos, por favor, si se puede de la mano de la supervisión, la ayuda con el equipo consultor, pues para no parar la ejecución del contrato como tal y pues que podamos terminar, digamos que no puedo, No necesariamente suspender la ejecución del contrato, entonces sí quiero dejar eso claro.

La Interventoría comenta que sobre lo de la solicitud de prórroga, ustedes solamente radicaron una reprogramación adicional de los 150 días y los 17 INP, a eso se le dio respuesta el día de hoy antes de iniciar comité y pues para solicitar el modificatorio, pues deben adjuntar el resto de los soportes

Alexis Socha de EBISU SAS responde que entonces eso lo tengo claro y hay que tener presente que los demás soportes van amarrados en la aprobación de los INP, entonces prácticamente no se sale de un manejo interno acá de obra, sino una dependencia de nuestra contratante, para poder cerrar la solicitud de prórroga como se debe, entonces claramente una vez aprobados los 17 INP con el equipo de planeación contractual, pues nosotros entregaríamos el balance final o esa reprogramación y pues obviamente entregaríamos lo que en algún momento nos pidieron el manejo de equipo y bueno cosas que nos pidieron que es lo que soporta la prórroga del contrato, pero sí con mucha preocupación nos vemos obligados a la suspensión, a la solicitud de suspensión del contrato, claramente serán validadas por ustedes como interventoría y por nuestra contratante, so pena de alguna alternativa del equipo consultor el día de mañana en el comité de diseño, que nos permita a nosotros continuar la fundida de ejecución del contrato, de nivel 8.70 del bloque B y el edificio A que también pues ha estado todavía también quieto con el tema de la andamios de carga.

La interventoría responde que se le dio traslado a la reiteración que hicieron ustedes y ya está en manos de la SED y la idea es que mañana en el comité nos den la solución respecto a los cortasoles.

Alexis Socha comenta que también hay una puntualidad y es que para nosotros no es conveniente ni para nadie, las suspensión, quiero que quede claro y más porque tenemos el inconveniente del tema del personal, si yo consigo personal para una semana para luego suspenderlo porque prácticamente yo no puedo mantener a mi equipo total, por una suspensión que no sé por cuánto tiempo vaya a dar, a partir de una solución que es a un tercero, pues me implicaría mi pues cierta logística importante en el manejo administrativo entonces por decir la premura que necesito para la definición del tema de los tirantes del Bloque B.
Julianie Rincón de ENTerritorio comenta que si es importante que tengan en cuenta dentro de su proceso constructivo y su plan de compras estos temas como lo de los tirantes que son 40 días para la entrega a partir del pago ya que estas situaciones disminuyen el riesgo que cuando se preguntan sea de manera inmediata la solución porque eso es un tema de planeación y hagan una revisión a todo lo que falta y cotícenlo y revisen los tiempos de entrega para que todo se dé con tiempo y que no se de demora en los suministros. Se da esa recomendación que planeen para que no tengan esos problemas.

Marino Arce de EBISU SAS responde que se les sale de las manos ya que los errores de los diseños no son errores de dibujos y no son cuestiones de que falta un fleje y eso se pasó en su debido tiempo y es muy fácil solucionar esto ya son errores de interventoría de diseño, son muy puntuales entonces no es que nosotros no perdamos o no planeemos la construcción, sino que en el momento en que va a iniciarse, cuando uno ve los detalles y estos errores, son errores garrafales. Julianie Rincón comenta que ese tema no lo va a tratar acá, que ese tema ya lo han debatido muchas veces.

Marino Arce de EBISU SAS responde que en esos debates los culpables somos siempre nosotros cuando hay una interventoría de diseño que es la que ha debido estar pendiente cuando se estaban haciendo los diseños, yo no entiendo que hay voladizos de ocho metros y ni el consultor ni la interventoría de diseño previeron una contra flecha tocó que los arquitectos porque fuimos nosotros los Arquitectos, no los ingenieros, porque el equipo de nosotros no tiene ingenieros y que nos hayamos dado cuenta de que oiga estos voladizos será que hay contra flecha, miremos los planos, entonces eso no nos lo pueden imputar a nosotros y decir que nosotros no revisamos, son errores de inconcebibles, es como si yo como diseñador pusiera una columna en la mitad de un salón múltiple. Eso es en función de la interventoría de diseño que me diga a mí oiga mano, mire ahí en la mitad del salón múltiple no se puede poner una columna, es el mismo caso, entonces los errores no han sido de nosotros, ni la falta de avisar antes, hay es un contratista que quiere sacar esto adelante de la mejor manera y nosotros avisamos en la medida que van saliendo. Los problemas, lo que teníamos que avisar, la revisión de diseño que se hace normalmente en un proyecto sale en la que faltaron estos flejes o que faltaron los diseños de estas vigas e inmediatamente solucionaron, pero que llegue uno a decirle al diseñador que usted no le puso una contra la flecha, eso es inconcebible en un diseño de esta magnitud, y de este valor.

- **Actas facturadas de obra**:
  La interventoría ha avalado 12 actas parciales de obra, de las cuales ENTerritorio ya pagó 11 actas. Las cuales suman un valor de $ 8.338.321.243,00 y representa el 23.83% del valor total del contrato.

  El acta parcial de obra no. 12 se le dio aprobación y traslado el 23-08-2023 mediante oficio CEB-1009-2022 y tiene un valor de $1.186.815.921 y representa un 3.39% para un acumulado total de $9,525,137,163 y un acumulado total de 27.22%.

El cierre contable en el mes de agosto es el 24 de agosto de 2023, por lo que se recuerda que para las actas se tienen fechas de cierre por lo que deben estar más pendientes a la entrega de las actas parciales de obra.

El próximo mes, el cierre contable es el 21 de septiembre de 2023.

- **Desembolso de anticipo**:

  La interventoría ha avalado 15 órdenes de desembolso y 14 órdenes ya han sido desembolsadas y suman un valor total de $ 6.397.476.059,64. Queda un saldo de $ 250.340.899,36

  El contratista envió Plan de inversión del Anticipo Modificación No. 6 mediante oficio EBI-ENT-BOG-872-2022 y se le dio aprobación y traslado mediante oficio CEB-1002-2022 el 18-08-2023, se tuvo que realizar una modificación porque Bancolombia no ha dado pago al anticipo 15 porque se hicieron un rebalanceo de las actividades que han pagado hasta el momento, y al inicio hubo un error con dos ítems que cargaron al rubro que no era, debido a eso Bancolombia, menciono que no alcanzaba y por eso se tuvo que modificar los % del plan de inversión de anticipo y para lograr hacer el desembolso 15.

- **Balance:**

  El día 03 de agosto de 2023 el contratista de obra remite los 17 INP ajustados según la reunión virtual con planeación de ENTerritorio y ese mismo día la interventoría da aprobación y traslado mediante el oficio CEB-966-2022. El 22-08-2023 se reciben las observaciones hechas por planeación a estos 17 INP y se le dan traslado al contratista de obra el mismo día y se propone una mesa de trabajo entre contratista e interventoría el 23-08-2023 en horas de la tarde para revisar esta respuesta de Planeación de ENTerritorio. El contratista remite subsanación de 14 INP y quedan 3 INP para conciliación con Planeación de ENTerritorio.

  El 16-08-2023 el contratista remite 10 INP nuevos ajustados con las observaciones hechas en mesa de trabajo con ENTerritorio el 02-08-2023 y se encuentran en revisión de interventoría los rendimientos de los APUS pero el contratista va a ajustar estos con la observación que envió Planeación de ENTerritorio en comunicado del 22-08-2023 donde aclara que para los INP nuevos sólo aceptan el menor valor de las cotizaciones de los materiales no contractuales.

- **Estado del proceso de compras y llegada insumos a obra y maquinaria:**

  EBISU SAS comenta que atendiendo el requerimiento del taludes se va a traer nuevamente la excavadora. La interventoría solicita que se remitan los documentos de la máquina con antelación para revisión, EBISU SAS comenta que en este momento tienen los insumos necesarios para ejecutar las actividades que están realizando. Y esta semana se remite el procedimiento para para hacer los resanes para dar el acabado arquitectónico a las placas

  Se entregara por parte de EBISU el procedimiento de adecuación de las placas para revisión y verificación en cambio de la interventoria para continuar con los resanes y remates en placas.

- **Comunicaciones varias:**

  - ✓ CEB-606-2022: 03-03-2023 Respuesta oficio EBI-ENT-BOG-572-2022 Aprobación y Traslado solicitud de modificación No 1 balance proyecto capítulos A, B, C y 1. **Respuesta 30-08-2023**
  - ✓ CEB-801-2022: 17-5-2023 Traslado oficio EBI-ENT-BOG-730-2022 SOLICITUD DE REVISIÓN DE INCLUSIÓN DE IMPREVISTOS -PAGOS SECRETARIA DE AMBIENTE TRÁMITE MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN 04681. **Respuesta 30-08-2023**
  - ✓ CEB-819-2022: 23-05-2023 Respuesta EBI-ENT-BOG-740-2022 No conformidad demolición viga 29 eje 10 (C-D) losa de entrepiso nivel +1.85m. **Respuesta 30-08-2023**
  - ✓ CEB-877-2022: 22-06-2023 No conformidad en Viga VCim2 del eje D-E y Dado eje D-3ª en arranque de columna Nivel -3.6 Losa de cimentación Edificio B, Fundida 20 de junio de 2023 y losa edificio A Nivel +10.35 mts. **Respuesta 30-08-2023**
  - ✓ CEB-887-2022: 29-06-2023 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-796-2022, Complementación de procedimiento de fundida de losa cimentación. **Respuesta 30-08-2023**
  - ✓ CEB-898-2022: 05-07-2023 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-792-2022, andamios de carga.
  - ✓ CEB-913-2022: 07-07-2023 Remisión hojas de vida personal de interventoría. **Respuesta 30-08-2023**
  - ✓ CEB-923-2022: 14-07-2023 Traslado de Oficio EBI-ENT-BOG-821-2022- Solicitud de información presunta modificación a la licencia de construcción. **La SED informó que apenas se tenga la licencia la van a compartir con el contratista de obra.**
  - ✓ CEB-924-2022: 14-07-2023 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-810-2022 Respuesta oficio CEB-850-2022 No conformidad nivel+1.85m edificio A y respuesta a oficio CEB-888-2022 No conformidad acabado de losa de entrepiso nivel +1.85 entre ejes E-C(6b-10) Edificio A y No conformidad losa de entrepiso nivel +6.10 desde ejes 6b al eje 9+1/3 entre ejes A'-D' Edificio A. **Respuesta 30-08-2023**
  - ✓ CEB-925-2022: 17-07-2023 Remisión Hoja de Vida personal de Interventoría. **Respuesta 30-08-2023**
  - ✓ CEB-931-2022: 18-07-2023 Remisión concepto especialista geotécnico interventoría en respuesta oficio EBI-ENT-BOG-809-2022 Alcance Oficio EBI-ENT-BOG-792-2022 Y presentación De Informe Geotécnico. **Respuesta 30-08-2023**
  - ✓ CEB-934-2022: 19-07-2022 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-819-2022 Optimización acabados losas entrepiso. **Respuesta 30-08-2023**
  - ✓ CEB-960-2022: 28-07-2022 Respuesta EBI-ENT-BOG-841-2022 Respuesta a oficio CEB-930-2022.
  - ✓ CEB-962-2022: 28-07-2023 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-847-2022 - Respuesta CEB-920-2022 y CEB-949-2022.
  - ✓ CEB-974-2022: 08-08-2023 Aprobación a Plan de Inversión del Anticipo Modificación No. 5 enviado bajo oficio EBI-ENT-BOG-853-2022. . **Respuesta 30-08-2023**
  - ✓ CEB-979-2022: 09-08-2023 Requerimiento de remisión de todos los INP con soportes
  - ✓ CEB-985-2022: 14-08-2023 Respuesta al comunicado EBI-ENT-BOG-848-2022
  - ✓ CEB-993-2022: 17-08-2023 No conformidad losa Nivel-1.75 mts entre ejes A'-C´ entre 6a-6 Edificio B
  - ✓ CEB-994-2022: 17-08-2023 Reiteración de requerimiento de cumplimiento del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato
  - ✓ CEB-995-2022: 17-08-2023 INICIO DE ACTIVIDADES MAMPOSTERÍA EN EDIFICIO A Y B
  - ✓ CEB-996-2022: 17-08-2023 Respuesta al comunicado EBI-ENT-BOG-867-2022
  - ✓ CEB-997-2022: 17-08-2023 Requerimiento para respuesta a comunicaciones pendientes

- ✓ CEB-999-2022: 17-08-2023 Traslado concepto técnico interventoría con relación a la aclaración al sobre recorrido ascensor bloque A.
- ✓ CEB-1000-2022: 17-08-2023 Respuesta a oficio enviado el día 17 de agosto a las 15:40 a través de correo electrónico con asunto Respuesta CEB-948-2022 No conformidad losa Nivel -1.75 m entre ejes A'-C' entre 6a-6 edificio B
- ✓ CEB-1002-2022: 18-08-2023 Aprobación a Plan de Inversión del Anticipo Modificación No. 6 enviado bajo oficio EBI-ENT-BOG-872-2022. . **Respuesta 30-08-2023**
- ✓ CEB-1005-2022: 18-08-2023 Respuesta a oficio ENT-BOG-876-2022 Remisión de diseño de mezcla Pega - Pañete y Grouting
- ✓ CEB-1008-2022: 22-08-2023 Instalaciones eléctricas en losa +1.85 mts parte inferior.
- ✓ CEB-1010-2022: 23-08-2023 Traslado de Oficio EBI-ENT-BOG-865A-2022- Remisión acta de visita Secretaria Distrital de Educación y acciones realizadas.
- ✓ CEB-1011-2022: 23-08-2023 Traslado de Oficio EBI-ENT-BOG-886-2022- Solicitud de audio de comité de diseño N°48.
- ✓ CEB-1015-2022: 23-08-2023 Respuesta EBI-ENT-BOG-883-2022
- ✓ CEB-1018-2022: 23-08-2023 Respuesta a oficio EBI-ENT-BOG-863-2022- Subsanación Reprogramación – Respuesta CEB-971-2022

- ✓ EBI-ENT-BOG-725-2022 respuesta por parte de ENTerritorio para el 30-08/2023.
- ✓ EBI-ENT-BOG-763-2022 respuesta por parte de ENTerritorio para el 30-08/2023.
- ✓ EBI-ENT-BOG-774-2022 respuesta por parte de ENTerritorio para el 30-08/2023.
- ✓ EBI-ENT-BOG-820-2022 respuesta por parte de ENTerritorio para el 30-08/2023.
- ✓ EBI-ENT-BOG-860-2022 respuesta por parte de ENTerritorio para el 30-08/2023
- ✓ EBI-ENT-BOG-864-2022 respuesta por parte de ENTerritorio para el 30-08/2023
- ✓ Las pólizas del acueducto
- ✓ EBI-ENT-BOG-863-2022 respuesta por parte de interventoría.
- ✓ EBI-ENT-BOG-868-2022 respuesta por parte de interventoría.
- ✓ EBI-ENT-BOG-869-2022 respuesta por parte de interventoría.
- ✓ EBI-ENT-BOG-870-2022 respuesta por parte de interventoría.
- ✓ EBI-ENT-BOG-875-2022 respuesta por parte de interventoría.
- ✓ EBI-ENT-BOG-877-2022 respuesta por parte de interventoría.
- ✓ EBI-ENT-BOG-882-2022 respuesta por parte de interventoría.
- ✓ EBI-ENT-BOG-887-2022 respuesta por parte de interventoría.

Actas de Comité

Acta de comité de obra No. 46 , 47, 48, 49, 50 , 51, 52, 53, 54 y 55: Se remitieron a ENTerritorio para firmas. **Las remiten el 30-08-2023**

Acta de comité de diseño 43, 46, 47 y 48 está pendientes de firmas por parte de ENTerritorio, SED y consultor. **Las remiten el 30-08-2023**

Acta de comité de obra 56: las tiene en revisión y firmas EBISU SAS. **Las remiten el 30-08-2023**

- **Supervisión Técnica Independiente**

De la carpeta de agosto de 2023 se revisaron los siguientes ensayos de resistencia a la compresión:

- ✓ Numero de informe: 123-20747
  Fecha: 11/08/2023

Y todos los resultados están dando satisfactorios por encima del 100%

- ✓ Numero de informe: 124-20747
  Fecha: 14/08/2023
  Y todos los resultados están dando satisfactorios.
- ✓ Numero de informe: 125-20747
  Fecha: 18/08/2023
  Y todos los resultados están dando satisfactorios.
- ✓ Numero de informe: 126-20747
  Fecha: 18/08/2023
  Y todos los resultados están dando satisfactorios

Fundidas hechas esta semana:

- ✓ Fundida de columnas ejes 6, 6', 6a Nivel +3.75 Bloque B: sábado 19 de agosto de 2023
- ✓ Fundida de escalera principal Nivel +0.00 a +3.75 Ejes 4-5 y B-C Bloque B: viernes 18 de agosto de 2023

- **Temas Varios**

Alexis Socha de EBISU SAS tiene una pequeña pregunta, nosotros cuando hicimos en la revisión del acta parcial de obra, nosotros cobramos unos imprevistos y tratamos de cobrar las pólizas del acueducto y hubo una respuesta que recibimos de ustedes, no recuerdo de quién, en donde nos decían que la póliza del Acueducto iba incluida en la obra como INP y que por ende la póliza se pagaba dentro del AIU de los mismos costos indirectos del costo directo que iba a dar la obra y a mí me genera un escozor porque es que resulta que yo ya sé cuánto me vale la póliza y estoy supeditado, a que ya me toca que la obra me valga x valor superior a una matemática simple para cubrir lo de la póliza no sé si me hago entender.

La interventoría pregunta que cuál es la administración de su contrato, qué porcentaje y de acuerdo a la carta de compromiso que pasó la EAAB era 50 millones, o sea, mínimo te va a costar 50 millones de ahí dependiendo todas las obras puede ser un poco más.

Alexis Socha de EBISU SAS comenta que por eso, es que cuando yo me pongo a analizar mi administración y mi porcentaje discriminado de la Administración en lo que es pólizas, es el 1.37% del costo directo entonces ya me tocaría prácticamente, que si la obra me vale, que me tiene que costar como 67 Millones de pesos si me cobra menos ya perdí en la garantía sabiendo que ya la pagué, si me entiendes o sea, deberías de ver si la obra me cuesta más no hay problema porque ya la póliza va cubierta sobre ese valor, pero si la obra me cuesta menos, ya perdí sobre el valor de la garantía .

La interventoría aclara que no, porque en esa instancia usted hace la observación que sí, la incluyó pero hay un costo que no está cubierto porque sobrepasa y ahí la remite para evaluación, digamos en ese momento la observación de la interventoría fue debería estar cubierto, dentro de la administración del INP y ya cuando usted pase las obras, le dan por un valor menor que no le cubra usted hace la observación, Yo la tengo contemplada sin embargo, mis obras costaron x, la administración, está luego hay un valor que no está cubierto, ahí ese valor como lo reconocemos y ahí entramos a mirar que ese valor que excede si se podría pasar por imprevistos, pero tiene que darse la circunstancias porque puede ser al revés, que le valga más y no está en el eventual caso, de que valga menos y no le cubre en esa

instancia hacer la observación se deja la trazabilidad dice Cuál es el monto que no quedó cubierto para que pase por imprevisto Alexis Socha de EBISU SAS pide que es para que lo tengan presente que nosotros ya habíamos hecho una matemática y me daba como hacer que la obra me costara x plata.
Y se da por terminado el comité de obra No.57 y como parte integral del acta se adjunta un (1) audio.
En el proyecto se encuentran laborando <9> profesionales, <0> personas de oficina y <72> trabajadores, operarios u obreros para un total de <81> personas
Programa de Proyecto
Aspectos Administrativos
Aspectos Presupuestales:
Riesgos
Aspectos sociales y/o ambientales

3. COMPROMISOS

Nombre del Proyecto:	
Responsable por Contratista	Arq. Marino Arce
Responsable por Interventoría	Ing. Pamela Beltrán
Fecha programada cumplimiento	

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMITÉ DE OBRA No.	57					24/08/2023
COMPROMISO PACTADO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE SOLICITUD**	**FECHA PLAZO EJECUCIÓN**	**FECHA CUMPLIMIENTO**	**DÍAS AVANCE/ATRASO**	**OBSERVACIONES**
REMISIÓN DE ACTAS COMITÉS DE DISEÑO No. 43, 46, 47 Y 48	ENTERRITORIO	30/06/2023	30/08/2023			SE REMITIERON A ENTERRITORIO PARA FIRMAS DE ENTERRITORIO, SED Y CONSULTOR, ESTÁN EN PODER DE ENTERRITORIO NO HAN SIDO REMITIDAS

REMISIÓN DE ACTAS COMITÉ DE OBRA No. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55	ENTERRITORIO	07/06/2023	30/08/2023			SE REMITIERON A ENTERRITORIO PARA FIRMAS DE ENTERRITORIO NO HAN SIDO REMITIDAS
REMISIÓN DE ACTA COMITÉ DE OBRA No. 56	CONTRATISTA	22/08/2023	30/08/2023			SE REMITIERON A ENTERRITORIO PARA FIRMAS DE ENTERRITORIO
REMISIÓN DE ACTAS COMITÉS DE DISEÑO No. 49	CONTRATISTA	25/08/2023	30/08/2023			
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL MOSTRANDO EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LAS JORNADAS DE ASEO	CONTRATISTA	29/03/2023	cada semana			SOLICITUD HECHA EN OFICIO EBISU HA ENVIADO REGISTRO CADA SEMANA DEL ANTES Y DESPUÉS DE LAS JORNADAS DE ASEO SE LE SOLICITA A EBISU SAS QUE AMPLIE EL INFORME POR CADA ZONA, SE COLOQUE EL ANTES Y DESPUÉS DE CADA ZONA DE LA OBRA
OFICIO CON REQUERIMIENTO SOBRE VIÁTICOS DE PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA VISITA PRESENCIAL DEL MIÉRCOLES 19-04-2023	INTERVENTORÍA	12/04/2023	30/08/2023			SE REMITIÓ SOLICITUD EN OFICIO CEB-705-2022 EL 12-04-2023 Y EL CONTRATISTA RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-663-2022 EL 13-04-2023 AL QUE SE LE DIO RESPUESTA MEDIANTE OFICIO CEB-717-2022 EL 14-04-2023 Y EBISU DIO RESPUESTA EL 15-04-2023 MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-676-2022 Y SE LE DIO RESPUESTA EL 18-04-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-730-2022 Y EBISU RESPONDIÓ EL 20-04-2023 CON EL OFICIO EBI-ENT-BOG-685-2022 EL CUAL SE RESPONDIÓ EL 20-04-2023 CON EL OFICIO CEB-740-2022 EL CUAL EBISU RESPONDIÓ EL 22-04-2023 CON OFICIO EBI-ENT-BOG-697-2022 y LA INTERVENTORÍA RESPONDIÓ CON EL OFICIO CEB-755-2022 DEL 25-4-2023, EBISU RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-710-2022 EL 05-05-2023 Y SE RESPONDIÓ EL 08-05-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-780-2022 Y EBISU RESPONDE MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-728-2022 EL 12-5-2023 Y LA INTERVENTORÍA RESPONDE EL 15-5-2023 MEDIANTE EL OFICIO CEB-791-2022, EBISU RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-752-2022 EL 25-05-2023 Y SE RESPONDIÓ EL 30-05-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-831-2022, EBISU RESPONDIÓ CON EL OFICIO EBI-ENT-BOG-764-2022 QUE SE RESPONDIÓ CON EL OFICIO CEB-849-2022 DEL 09-06-2023 QUE EL CONTRATISTA RESPONDIÓ EL 29-06-2023 MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-802-2022 Y SE RESPONDIÓ MEDIANTE OFICIO CEB-894-2022 EL 04-07-2023 CONTRATISTA DE OBRA RESPONDE MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-816-2022 DEL 07-07-2023, LA INTERVENTORÍA RESPONDE MEDIANTE OFICIO CEB-916-2022 11-07-

						2023. LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA VAN A ESPERAR RESPUESTA POR PARTE DE ENTERRITORIO PARA VER CONTRACTUALMENTE QUE SE PUEDE HACER PARA SOLVENTAR EL TEMA DE LOS VIÁTICOS DE LA CONSULTORÍA NO HA LLEGADO LA RESPUESTA POR PARTE DE ENTERRITORIO
INP nuevos del balance general con soportes	CONTRATISTA	12/04/2023	SIN FECHA			EL CONTRATISTA REMITIÓ UN SEGUNDO PAQUETE CON 59 INP, SE REALIZÓ MESA DE TRABAJO EL 18-07-2023 PARA REVISAR LA FORMA, NO EL FONDO, SALIERON UNAS OBSERVACIONES QUE EL CONTRATISTA ESTÁ SUBSANANDO Y LA INTERVENTORÍA VA A REVISAR LOS APUS PARA HACER OBSERVACIONES. INTERVENTORÍA REMITE OBSERVACIONES EL 04-08-2023 VÍA EMAIL AL LOS APUS TENIENDO EN CUENTA EL OFICIO DE PLANEACIÓN Y LA MESA DE TRABAJO DEL 02-08-2023 CONTRATISTA ESTÁ AJUSTANDO LOS INP CON LAS OBSERVACIONES HECHAS EN MESA DE TRABAJO CON PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO EL 02-08-2023 PARA REMITIR TODOS LOS INP LA INTERVENTORÍA REMITIÓ OFICIO CEB-979-2022 DEL 09-08-2022 HACIENDO EL REQUERIMIENTO DE LA ENTREGA DE TODOS LOS INP EBISU REMITIÓ UN PAQUETE DE 10 INP Y VA A REMITIR OTRO EL 18-08-2023 QUE ENTRAN A REVISIÓN DE INTERVENTORÍA. EL 22-08-2023 LLEGÓ RESPUESTA DE PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO A LOS 17 INP DONDE DEJA UNA NOTA QUE PARA LOS NUEVOS INP SÓLO VALE EL MENOR VALOR POR LO CUAL EBISU VA A VOLVER A AJUSTAR LOS INP CON ESTA DIRECTRIZ
REEMBOLSO A EBISU POR CONCEPTO DE VISITA DE FORESTAL DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE	ENTERRITORIO	26/04/2023	30/08/2023			contratista va a hacer una comunicación con la trazabilidad y adjuntar los 2 soportes e interventoria revisará y hará la solicitud con recomendación de pagarlo como imprevisto EBISU REMITIÓ OFICIO EBI-ENT-BOG-730-2022 EL 12-5-2023 SE TRASLADÓ A ENTERRITORIO MEDIANTE OFICIO CEB-801-2022 del 17/05/2023. ESTÁ PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DE ENTERRITORIO

ENTREGA DE SUBSANACIONES DE INP 01 AL 17	CONTRATISTA INTERVENTORÍA ENTERRITORIO	18/05/2023	SIN FECHA			ESTÁN PENDIENTES LAS SUBSANACIONES POR PARTE DE EBISU PARA HACER UNA REVISIÓN CON LA INTERVENTORÍA PARA PODER HACER REVISIÓN CON ENTERRITORIO ANTES DE HACER ENTREGA FORMAL EBISU LAS ENVIÓ EL 30-5-23 MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-755A-2022 SE REVISARON Y SE DIERON APROBACIÓN Y TRASLADO A 16 INP Y SOBRE EL INP 06 SE DIO RESPUESTA AL CONTRATISTA DE OBRA EL INP 06 SE APROBÓ EL 22-06-2023 Y SE DIO TRASLADO A ENTERRITORIO MEDIANTE EL OFICIO CEB-875-2022 ESTÁ PENDIENTE QUE PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO REMITA SUS OBSERVACIONES U APROBACIÓN ENTERRITORIO REMITIÓ 1 OBSERVACIÓN SOBRE UN FORMATO QUE ESTABA DESACTUALIZADO Y EL CONTRATISTA YA ESTÁ SUBSANANDO. SE ENVIÓ EL 13-07-2023 ENTERRITORIO REMITIÓ OBSERVACIÓN 2 EL 17-07-2023 DONDE SE DEBE CORREGIR EL VALOR DE LA VOLQUETA EN EL ÍTEM DE TRANSPORTE EN LOS 3 ÍTEMS DE CAJAS DE INSPECCIÓN E IGUALAR EN LAS DESCRIPCIONES QUE TODAS DIGAN RETIRO DE ESCOMBROS EBISU REMITIÓ EL 19-07-2023 SUBSANACIONES Y SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA, PERO EN COMITÉ ENTERRITORIO ACLARÓ QUE PUEDEN SALIR MÁS OBSERVACIONES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO QUE LA SUPERVISORA EN AVANZADA FUE REMITIENDO LAS OBSERVACIONES QUE LE HAN IDO REALIZANDO PARA QUE EL CONTRATISTA VAYA HACIENDO AJUSTES. LLEGÓ EMAIL DE ENTERRITORIO CON RESPUESTA EL LUNES 24-07-2023 EN LA NOCHE Y SE REMITIERON AL CONTRATISTA EL 25-07-2023 EN LA MAÑANA PARA SU REVISIÓN Y AJUSTES EL CONTRATISTA REMITE OFICIO EBI-ENT-BOG-849-2022 EL 31-7-2023 Y DESPUÉS DEL OFICIO DE ENTERRITORIO CON LAS OBSERVACIONES DE PLANEACIÓN Y DE MESA DEL TRABAJO DEL 02-08-2023, EL CONTRATISTA REMITE OFICIO EBI-ENT-BOG-851-2022 EL 03-08-2023 CON AJUSTES ACORDADOS Y SE DA APROBACIÓN Y TRASLADO ESE MISMO DÍAS MEDIANTE OFICIO CEB-966-2022 EL 22-08-2023 LLEGA RESPUESTA POR

						PARTE DE PLANEACIÓN DE ENTERRITORIO REMITIDA POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO, SE LE DA TRASLADO A EBISU SAS Y SE PROPONE MESA DE TRABAJO DE REVISIÓN DE LA RESPUESTA DE PLANEACIÓN EL MIÉRCOLES 23-08-23 EN HORAS DE LA TARDE EBISU REMITE PAQUETE SUBSANADO CON OBSERVACIONES DE PLANEACIÓN EN 14 DE 17 INP, HAY 3 QUE FALTAN POR CONCILIAR CON PLANEACIÓN.
INFORMES Y SOPORTES POR TALA DE ARBOLES SEGÚN LA RESOLUCIÓN	CONTRATISTA	31/05/2023	30/08/2023			EL FORESTAL DE EBISU SAS ESTÁ ELABORANDO EL INFORME Y LO ENTREGA EL LUNES 12-6-2023NO HA SIDO REMITIDO EL INFORME Y EBISU SAS COMENTA QUE NO SU ESPECIALISTA NO LES HA DADO LA NUEVA FECHA DE ENTREGA DEL INFORME.EBISU HACE UNA REVISIÓN AL INFORME Y LE REMITE OBSERVACIONES AL ESPECIALISTA Y ESTÁN ESPERANDO QUE LO SUBSANE PARA PODER REMITIRLOCONTRATISTA REMITE INFORME TALA ARBOLES MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-818-2022 DEL 10-07-2023, AL SE LE REMITEN OBSERVACIONES EL 14-07-2023 Y ESTÁ PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA SUBSANENO HA SIDO REMITIDO
RESOLUCIÓN TALA 3 ARBOLES	SED	28/04/2023	SIN FECHA			PENDIENTE DE RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, SE RECIBE CORREO EL DÍA 11-07-2023 POR PARTE DE ENTERRITORIO CON TRASLADO DE CORREO DE SED SOLICITANDO EL PAGO DE 225 MIL PESOS por concepto de "Permiso o autorización. Tala, poda, transreubic. Arbolado urbano" PENDIENTE PAGO DE RECIBO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, ENVIADO POR LA SED EBISU PAGA RECIBO EL 26-07-2023 Y VA A REMITIR A INTERVENTORÍA PARA QUE LE DE TRASLADO A LA ENTIDAD EBISU REMITE RECIBO EL 28-07-2023 Y SE LE DA TRASLADO ESE MISMO DÍA A ENTERRITORIO MEDIANTE OFICIO CEB-958-2022 LA SED DA EL RADICADO DE LA SUBSANACIÓN ENTREGADA EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE RAD 2023ER183272 10 AGOSTO DE 2023

REMISIÓN DE BALANCE No. 4 CON SOPORTES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	08/06/2023	SIN FECHA			CONTRATISTA TIENE OFICIO CON OBSERVACIONES ENVIADO POR LA INTERVENTORÍA EL 08-06-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-846-2022 CONTRATISTA MANIFIESTA QUE VAN A ENVIAR REPROGRAMACIÓN PERO QUE QUEDA PENDIENTE EL BALANCE, FLUJO DE CAJA, CURVA S, PLAN DE COMPRAS Y PLAN DE RECURSO HUMANO HASTA TANTO NO SE TENGAN LOS 17 INP APROBADOS EBISU ENVÍA REPROGRAMACIÓN EL 28-07-2023 Y SE REMITE OFICIO CON OBSERVACIONES EL 04-08-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-971-2022 PARA SUBSANACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA CONTRATISTA REMITE SUBSANACIONES VÍA EMAIL Y SE ESTÁN HACIENDO MESAS DE TRABAJO PARA AJUSTAR LA PROGRAMACIÓN, EN ESTA PROGRAMACIÓN SE INCLUYEN LOS 17 INP CON 150 DÍAS DE TIEMPO CONTRATISTA REMITE REPROGRAMACIÓN CON 17 INP, ADICIONANDO 150 DÍAS PARA REVISIÓN MEDIANTE EL OFICIO EBI-ENT-BOG-863-2022 EL 15-08-2023 Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA NUEVAMENTE YA QUE REMITEN PROGRAMACIÓN DISTINTA A LA TRABAJADA EN LAS MESAS DE TRABAJO.
HV RESIDENTE DE OBRA No. 2	CONTRATISTA	02/08/2023	23/08/2023			EBISU COMENTA QUE SU RESIDENTE TRABAJÓ HASTA EL 31-07-2023 Y QUE ESTÁN CONSIGUIENDO EL NUEVO PROFESIONAL A LA FECHA SE LLEVAN 3 SEMANAS SIN RESIDENTE DE OBRA No. 2
HV PROFESIONAL SST	CONTRATISTA	16/08/2023	SIN FECHA			EBISU REMITE HV MEDIANTE OFICIO EBI-ENT-BOG-874-2022 EL 18-08-2023 Y SE DA APROBACIÓN Y TRASLADO MEDIANTE OFICIO CEB-1003-2022 EL MISMO DÍA A LA FECHA SE LLEVA 1 SEMANA SIN EL PROFESIONAL SST EBISU REMITE HV DE UN PROFESIONAL SST QUE SE REVISA Y SE LE DA APROBACIÓN EL 18-08-2023 MEDIANTE OFICIO CEB-1003-2022

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Marino Arce	Firma
En Representación de	EBISU SAS	
Cargo	Director de obra	
Teléfono		
NOMBRE	Carlos Herrera	Firma
En Representación de	EBISU SAS	
Cargo	Residente de obra	
Teléfono		
NOMBRE	Julianie Paola Rincón	Firma Julianie Paola Rincon Firmado digitalmente por Julianie Paola Rincon Fecha: 2023.09.20 01:08:58 -05'00'
En Representación de	ENTerritorio	
Cargo	Supervisor	
Teléfono		
NOMBRE	Marcela Celis Amado (conectada virtualmente)	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Cargo	Transversal Técnico del grupo de desarrollo de proyectos 1	
Teléfono		
NOMBRE	Pamela Beltrán	Firma
En Representación de	Consorcio Educativo Bogotá	
Cargo	Director de interventoría	
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: MARINO ARCE
DIRECTOR

Firma_____
Nombre: PAMELA BELTRÁN ESPITIA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Julianie Paola Rincon Firmado digitalmente por Julianie Paola Rincon Fecha: 2023.09.20 01:09:16 -05'00'

Firma_____
Nombre: JULIANIE PAOLA RINCÓN
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web https://www.enterritorio.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

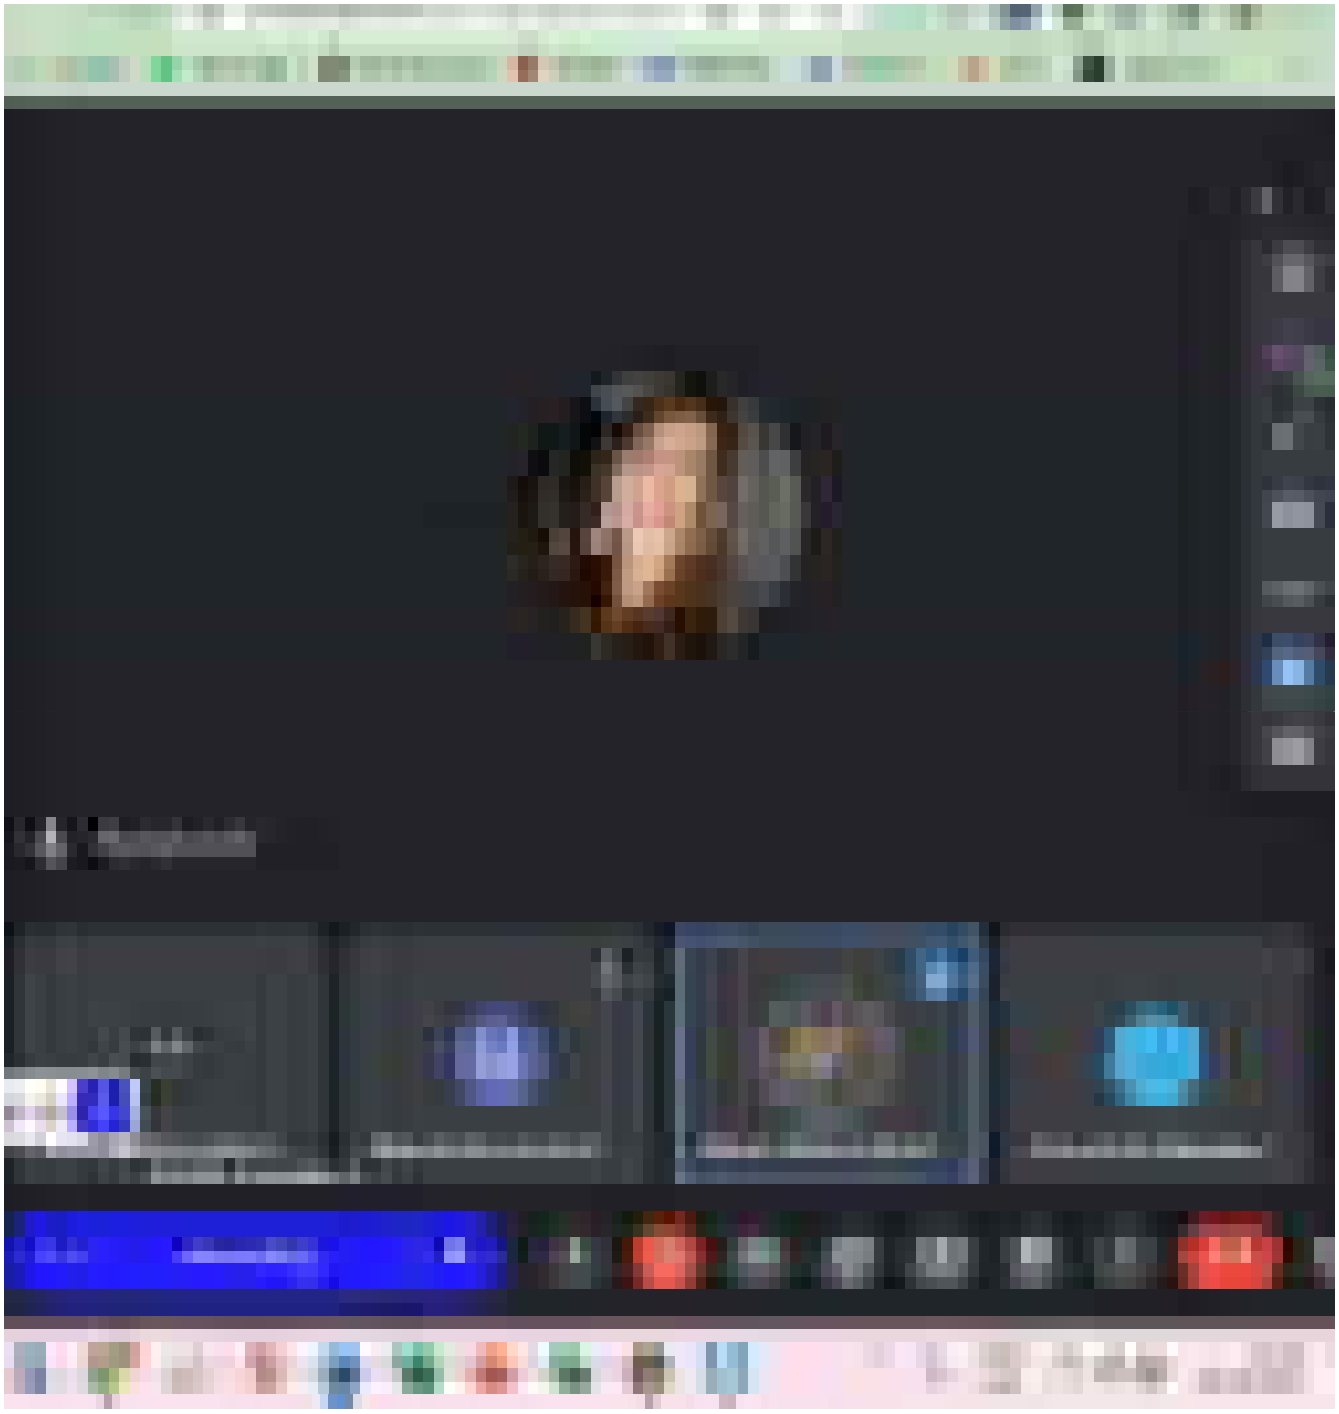

ANEXO 2. PLAN DE MANEJO DE INVERSION DE ANTICIPO Y ORDENES DE DESEMBOLSO

Bogotá D.C, 26 de septiembre de 2023

CEB-1072-2022

Señores:
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Atn. Mónica Patricia Cote Sánchez
Representante Legal
Carrera 46 No 95-71
Ciudad.

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No. 2220555 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013".**

ASUNTO: **Respuesta Oficio EBI-ENT-BOG-925-2022- Aprobación pago a terceros 016 – Plan de inversión del anticipo**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, luego de la revisión de la documentación remitida mediante comunicación del asunto la interventoría realiza aprobación de los documentos soporte para el desembolso de la orden No 16 de anticipo para que sea remitida a Fiduciaria Bancolombia para el respectivo trámite, la cual contiene los soportes de los siguientes proveedores:

Para el pago a CONCREMACK SAS (Concretos de 4000 y 5000 psi)

- OK

El pago del anticipo de esta orden de desembolso No 16 se realizará con cargo al ítem No 4 de Compra de equipos y repuestos, del plan de inversión de anticipo aprobado por interventoría por un valor total de $ 133.205.525

Se le recuerda al contratista de obra que se deben presentar informes mensuales de inversión y buen manejo del anticipo en la semana siguiente al cierre de mes, se solicita que en este informe se incluyan las facturas electrónicas con las que se cuente del periodo.

Cordialmente,

JULIO MARIO VILLAMIZAR
Representante Legal
Consorcio Educativo Bogotá

Anexos	Oficio EBI-ENT-BOG-925-2022	
Elaboró	Directora de interventoría – Pamela Beltrán	
Copia 1	Supervisión ENTerritorio – Julianie Paola Rincón	

Bogotá, 20 de septiembre de 2023

EBI-ENT-BOG-925-2022
AL CONTESTAR REFIÉRASE A ESTE CÓDIGO

Señores;
CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ
Atn- ING. PAMELA BELTRÀN
Directora de Interventoría

Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013**

Asunto: Solicitud aprobación pago a terceros No. 16

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos aprobación para el pago a terceros de conformidad al Plan de Inversión del Anticipo V6, para lo cual adjuntamos la siguiente documentación:

- Paquete CONCREMACK - Concreto Premezclado
- Formatos de aprobación desembolso 016 pago a terceros Fiduciaria
- Formato Control Fiducia 016 Ebisu
- Control Orden de Concreto

Atentamente,

ARQ. MARINO ARCE TRUJILLO
DIRECTOR DE OBRA
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

Proyectó	Coordinadora de compras – Estefany Acosta
Revisó	Director Técnico – Alexis Socha
Copia	Julianie Paola Rincón Supervisor Técnico De La Infraestructura Educativa Boitá
Anexos	Paquete de información solicitud 16

[redacted]

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Bogotá	18	9	2023	24	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 133.205.525,00	$ 0,00	$ 133.205.525,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15180	P.A. ANT EBISU SAS 002	30000001292	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
900558342-4	NIT	CONCREMACK S.A.S.	19188647083	Corriente	Bancolombia	$ 133.205.525,00	$ -	$ 133.205.525,00
							$ -	$ 0,00
							$ -	$ 0,00
							$ -	$ 0,00
							$ -	$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Meta	Guamal	FCA LA ESPERANZA VDA SANTA BARBARA	radicacion@concremack.com	3183585013	3183585013	2395	Bogota	Bogota D.C

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
4	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)

		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
[redacted]	[redacted]		
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 024

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	**FECHA : SEPTIEMBRE 18 DE 2023**
P.A. ANT EBISU SAS 004	**PAGADO A : EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS**
	N.I.T : 807008957-7

ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	Pago de salarios y jornales				
				TOTAL ITEM 1	$ 0,00
2	Compra de equipos y repuestos				
				TOTAL ITEM 2	$ 0,00
3	Transporte y alquiler de maquinaria				
				TOTAL ITEM 3	**$ 0,00**
4	Compra de materiales y accesorios		FE 12077	16/05/23	$ 8.943.954,00
			FE 11287	04/04/23	$ 13.793.843,00
			FE 12616	21/06/23	$ 46.962.416,00
			FE 12649	22/06/23	$ 55.306.689,00
			FE 12696	24/06/23	$ 8.198.623,00
				TOTAL ITEM 4	$ 133.205.525
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	**$ 133.205.525,00**

REPRESENTANTE LEGAL OBRA
Monica Patricia Cote Sanchez

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR
Julio Mario Villamizar

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

CONCREMACK
5000 PSI



CUENTA POR PAGAR 23050147

Sucursal: Principal

BOGOTÁ D.C. , 16/05/2023

EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Nit 807,008,957-7

CONCREMACK SAS - 900,558,342
Contrato No. 1630222 Acta No. 1 CONCREMACK SAS

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	14/06/2023 06:50 p.m.	**Fecha Transacción**	14/06/2023	**Consecutivo Tercero**	FE12077
Cruza a					
Observaciones	Contrato No. 1630222: FC 12077 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO 5000 PSI				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150119	CONCRETOS, MORTEROS Y CEMENTOS		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	9,131,247.00	0.00
14150195	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	60,346.00	0.00
23652503	Servicios 2%		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	9,131,247.00	0.00	182,625.00
22050101	Proveedores Varios		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	0.00	8,943,954.00
23680116	ica a la tarifa 7.12 x mil		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	9,131,247.00	0.00	65,014.00
							9,191,593.00	**9,191,593.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
jcapador			**jcapador**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

Empresa	EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT	807008957
Dirección	Cra 46 No. 95 - 71. Barrio La Castellana
Teléfono	2568829 - 2568796
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Fecha y hora de impresión: 01/08/2023 09:12 am

ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO No. 1630222

Contratista

Contratista:	CONCREMACK SAS	NIT/CC:	900558342
Dirección:	FCA LA ESP VDA STA BARBARA	Teléfono:	3185853926

Acta Por Grupos

Proyecto:	Mega Colegio Boita Kenedy - Bogota		
Tipo Contrato:	Suministro de Materiales	Vr. Contrato:	9,191,593.00
Estado:	CxP	Acumulado:	9,191,593.00
Nº Factura:	FE 12077	Saldo:	0.00
Fecha Factura:	16/05/2023	Fecha Acta:	13/06/2023
Des. Contrato:	FC 12077 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO 5000 PSI	Fecha Vcto:	15/06/2023

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI	M3	18	507,290.47	3,352.53	9,191,593.00

Total Acta 9,191,593.00

Parciales		
Subtotal		7,940,214.00
Administración	**7%**	555,815.00
Imprevistos	**4%**	317,609.00
Base/Utilidad	**4.00%**	317,609.00
IVA		60,346.00

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 9,131,247.00	IVA:60,346.00	9,191,593.00	0.00	9,191,593.00
Anticipos			0.00	0.00	0.00
Retención Anticipos		0%	0.00	0.00	0.00
Retención Garantías		0%	0.00	0.00	0.00
Retención FIC		0%	0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00

Valor cheque **9,191,593.00**

SON: NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

		Cuenta	Valor
019	**CONCRETOS, MORTEROS Y CEMENTOS**	14150119	9,191,593.00
		Total	**9,191,593.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	CONCREMACK SAS

CONCREMACK SAS

NIT 900558342 - 4

IVA REGIMÉN COMÚN Actividad económica 2395

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764047589175 de 2023-04-17 a 2024-04-17

Correo: proveedores@concremack.com

Dirección: Finca La Esperanza, Vereda Santa Barbara Km. 2 Vía Guamal-Acacias.

Teléfono: 3183585013

Ciudad: Guamal, Meta, Colombia.

FACTURADO A:

EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

NIT 807008957 - 7

Carrera 46 # 95-71. Barrio La Castellana

Bogotá D.C. - Bogotá - COLOMBIA

facturacion@ebisuconstructora.com

3123216612

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE12077 **VENCIMIENTO:** 2023-06-15

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2023-05-16 00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO . No. de despacho(s): 0.	1.000	$7,940,214.00	0	$7,940,214.00	$7,940,214.00
		A 7%	1.000	$555,815.00	0	$555,815.00	$555,815.00
		I 4%	1.000	$317,609.00	0	$317,609.00	$317,609.00
		U 4%	1.000	$317,609.00	19	$317,609.00	$377,955.00

Notas de la factura

Ciudad para aplicar retención de ICA: Bogotá D.C..

SUBTOTAL:	$9,131,247.00
IVA:	$60,346.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$60,346.00

TOTAL A PAGAR **$9,191,593.00**

Son : Nueve millones ciento noventa y un mil quinientos noventa y tres pesos.

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: 19.00 % $60,346.00



Cuida el medio ambiente

CUFE: 940a54d6d2f19eeec56d5e35a60dbd0aea5926b2006371b6a1a4d30a3be0febc5ee817b05067e0e45f823e1b52b15944

Elaborado por:

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONCREMACK SAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900558342-4
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : GUAMAL

MATRICULA – INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 238989
FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 24 DE 2012
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 16 DE 2023
ACTIVO TOTAL : 65,103,262,297.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : FCA LA ESPERANZA VDA STA BARBARA
BARRIO : CENTRO GUAMAL META
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50318 - GUAMAL
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3187350539
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3183585013
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3105617887
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : andrea.barrios@concremack.com
SITIO WEB : www.concremack.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 104 14A 45 OF 406
MUNICIPIO : 11001 - BOGOTA
TELÉFONO 1 : 3204078
TELÉFONO 2 : 3183585013
TELÉFONO 3 : 3187350539
CORREO ELECTRÓNICO : juridica@concremack.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : juridica@concremack.com

CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2395 - FABRICACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.

CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42877 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONCREMACK SAS.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42877 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONCREMACK SAS.

CERTIFICA – REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-3	20130628	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	VILLAVICENCIO	RM09-46202	20130905
CC-	20130704	CONTADOR	BOGOTA	RM09-46203	20130905
AC-3	20130628	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	VILLAVICENCIO	RM09-46202	20130905
CC-	20130704	CONTADOR	BOGOTA	RM09-46203	20130905
AC-11	20180326	ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS	BOGOTA	RM09-72006	20190123
CE-	20181221	REVISOR FISCAL	BOGOTA	RM09-72060	20190128
AC-14	20190725	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA	BOGOTA	RM09-75675	20190913
AC-20	20191223	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA	BOGOTA	RM09-76803	20191227
CE-	20191226	CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL	BOGOTA	RM09-76804	20191227
AC-23	20201120	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	BOGOTA	RM09-82156	20201228
CE-	20201120	REVISOR FISCAL	BOGOTA	RM09-82157	20201228

CERTIFICA – VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SUMINISTRAR, PROVEER, COMPRAR, VENDER Y/O COMERCIALIZAR TODO TIPO DE MATERIALES PETREOS, AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONCRETOS PREMEZCLADOS DE DIFERENTES CLASES Y RESISTENCIAS. DISEÑAR, PROYECTAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE OBRAS Y PROYECTOS EN EL CAMPO DE LAS INGENIERIAS, PRINCIPALMENTE EN LA INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL, MECANICA Y DE PETROLEOS. ELABORAR Y PRESENTAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL, MECANICA Y DE PETRÓLEOS SIN LÍMITE DE CUANTÍAIO MAGNITUD DE LAS OBRAS, CELEBRAR CONTRATOS DE CONSULTORIA, INTERVENTORIA, OBRA, DIE ASESORIA ECONOMICA Y FINANCIERA, DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE OBRAS, DE LAS QUE CORRESPONDEN A SU OBJETO PRINCIPAL. DISEÑAR, PROYECTAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ANTISÍSMICO EN CONSTRUCCIONES DE CONCRETO Y/O METALICAS, VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES, PUENTES ANTI TRATADOS Y CABLES AEREOS, SENALIZACION, CONSTRUCCIÓN Y INTERIORES PARA EDIFICACIONES. OBRAS CIVILES HIDRAULICAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE RIOS Y SISTEMAS DE IRRIGACION, DRENAJE, CONDUCCIÓN DE AGUAS, OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES, REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS, ESTACIONES DE BOMBEO, OBRAS DE GEOTECNICA, PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES, RECUPERACION AMBIENTAL, ECOLOGICA, MORFOLOGICA DE SUELOS, EMPRADIZARÍAN, REVEGETALIZACION Y FORMACIÓN DE COBERTURA VEGETAL, MANTENIMIENTO DE PRADOS, ZONAS VERDES, JARDINERIA Y ROCERIA, FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS, VECTORES Y ROEDORES, SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA. CONTENCIÓN, RECUPERACION Y DISPOSICION DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS, DISEÑAR Y REALIZAR Y EJECUTAR OBRAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN, MITIGACION, CORRECCION DE EFECTOS AMBIENTALES ADVERSOS; PLANEAR PROYECTAR O EJECUTAR OBRAS DE BIORREMEDIACION, BIODEGRADACION, TRATAMIENTO FÍSICO, QUÍMICO O BIOLÓGICOS EN CONTAMINIANTES COMO HIDROCARBUROS, METALES PESADOS, PLAGUICIDAS, PESTICIDAS Y DEMÁS ELEMENTOS. COMPUESTOS&RSQUO; Y SUSTANCIAS CONSIDERADAS COMO CONTAMINANTES, DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SOLIDOS, LIQUIDOS A NIVEL MUNICIPAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL; EJECUTAR MUESTREOS, DETERMINACION SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACION IDE CONTAMINANTES EN AGUA, AIRE Y SUELO. PODRA DEDICARSE, ADEMAS A LA DIRECCION, CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION DE TIERRAS Y DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROPIAS DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJES DE TUBERIAS DE PRESIÓN PARA SISTEMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, OBRAS PARA MINERIA E HIDROCARBUROS,PARA TRANSPORTE DE IHIDROCARBUROS, CRUCE SUBFLUVIALES DE LINEA, TANQUES Y RECIPIENTES METALICOS PARA ALMACENAMIENTO, ESTACIONES DE RECOLECCIÓN Y/O BOMBEO LÍNEAS REGULARES, OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION. EL TRANSPORTE PRIVADO DE CARGA A NIVEL NACIONAL DE TODO TIPO DE MATERIALES, ENTRE ELLOS, AGREGADOS, CONCRETO PREMEZCLADO, ARENA, GRAVA, MINERALES, Y EN GENERAL TODO TIPO DE ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ASÍ MISMO PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDADI ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL TODAS LAS

OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	11.400.000.000,00	11.400,00	1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	5.700.000.000,00	5.700,00	1.000.000,00
CAPITAL PAGADO	5.700.000.000,00	5.700,00	1.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 06 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 97052 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE ABRIL DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JARAMILLO PEÑA LUIS ENRIQUE	CC 79,791,141

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 22 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 81533 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PERDOMO BONILLA JUAN MANUEL	CC 79,787,980

POR ACTA NÚMERO 25 DEL 01 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ÚNICO ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85978 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	BARRIOS OLMOS ANDREA KARINA	CC 1,010,203,758

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 06 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 97052 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE ABRIL DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NEIRA RIVERA CARLOS PASCUAL	CC 1,026,254,265

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ 2 (DOS) SUPLENTES QUE REMPLAZARAN, AL PRINCIPAL EN SUS AUSENCIAS, FALTAS, ABSOLUTAS Y TEMPORALES CON LAS MISMAS FACULTADES Y RESTRICCIONES, LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE

LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EI REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 31 DEL 12 DE JUNIO DE 2023 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 98864 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE JUNIO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	MENESES BARRERO JENNIFER CAROLINA	CC 1,109,265,059	203162-T

POR ACTA NÚMERO 31 DEL 12 DE JUNIO DE 2023 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 98864 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE JUNIO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS	NIT 900354279-1	

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 31 DEL 12 DE JUNIO DE 2023 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 98864 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE JUNIO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	RODRIGUEZ CASTELLANOS ANA LUCIA	CC 51,666,633	175091-T

CERTIFICA - SUCURSALES Y AGENCIAS

QUE ES PROPIETARIO DE LAS SIGUIENTES SUCURSALES Y AGENCIAS EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE** : CONCREMACK_ SAS
CATEGORÍA : SUCURSAL
MATRÍCULA : 298447
FECHA DE MATRÍCULA : 20160707
FECHA DE RENOVACIÓN : 20190401
ÚLTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : VEREDA GUAYAQUIL SECTOR 4 CAMINOS
MUNICIPIO : 50313 - GRANADA
TELÉFONO 1 : 3187350546
CORREO ELECTRÓNICO : juan.perdomo@profesionalesyasociadostda.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2395 - Fabricacion de articulos de hormigon, cemento y yeso
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7110 - Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria tecnica
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
OTRAS ACTIVIDADES : F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
ACTIVOS VINCULADOS : 260,000,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN DPygPNYz4B

***** NOMBRE :** CONCREMACK SAS SUCURSAL VILLAVICENCIO
CATEGORÍA : SUCURSAL
MATRÍCULA : 429390
FECHA DE MATRÍCULA : 20221130
FECHA DE RENOVACIÓN : 20230316
ÚLTIMO AÑO RENOVADO : 2023
DIRECCION : KM 5.5 VIA VILLAVICENCIO-ACACIAS
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO 1 : 3187350539
TELÉFONO 2 : 3183585013
TELÉFONO 3 : 3105617887
CORREO ELECTRÓNICO : andrea.barrios@concremack.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2395 - Fabricacion de articulos de hormigon, cemento y yeso
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
ACTIVOS VINCULADOS : 500,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $86,425,070,394
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación DPygPNYz4B

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CODIGO DE VERIFICACIÓN DPygPNYz4B

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Certificado Bancario

Viernes, 1 de Septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONCREMACK SAS identificado(a) con NIT 900558342, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	19188647083	2012/09/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14879131599

(415)7707212489984(8020) **000001487913159 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 8 3 4 2	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONCREMACK SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Guamal 3 1 8

41. Dirección principal
FCA LA ESPERANZA VEREDA SANTA BARBARA

42. Correo electrónico radicacion@concremack.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 3 5 8 5 0 1 3	3 1 8 5 8 5 3 9 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 5	2 0 1 2 0 9 2 4	7 1 1 2	2 0 1 2 0 9 2 4	7 7 3 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 3	2 2									3	1	57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 29 / 12 : 01: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NEIRA RIVERA CARLOS PASCUAL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONCREMACK
4000 PSI

CUENTA POR PAGAR 23040131

Sucursal: Principal

BOGOTÁ D.C. , 04/04/2023

EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Nit 807,008,957-7

CONCREMACK SAS - 900,558,342
Contrato No. 1630171 Acta No. 1 CONCREMACK SAS

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	16/05/2023 06:42 p.m.	**Fecha Transacción**	16/05/2023	**Consecutivo Tercero**	FE11287
Cruza a					
Observaciones	Contrato No. 1630171: FC 11287 CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150119	CONCRETOS, MORTEROS Y CEMENTOS		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	14,082,698.00	0.00
14150195	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	93,068.00	0.00
23652503	Servicios 2%		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	14,082,698.00	0.00	281,654.00
22050101	Proveedores Varios		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	0.00	13,793,843.00
23680116	ica a la tarifa 7.12 x mil		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	14,082,698.00	0.00	100,269.00
							14,175,766.00	**14,175,766.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
jcapador			**jcapador**	**DOC. IDENTIDAD**

Empresa	EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT	807008957
Dirección	Cra 46 No. 95 - 71. Barrio La Castellana
Teléfono	2568829 - 2568796
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Fecha y hora de impresión: 01/08/2023 09:13 am

ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO No. 1630171

Contratista

Contratista:	CONCREMACK SAS	NIT/CC:	900558342
Dirección:	FCA LA ESP VDA STA BARBARA	Teléfono:	3185853926

Acta Por Grupos

Proyecto:	Mega Colegio Boita Kenedy - Bogota		
Tipo Contrato:	Suministro de Materiales	Vr. Contrato:	14,175,766.00
Estado:	CxP	Acumulado:	14,175,766.00
Nº Factura:	FE11287	Saldo:	0.00
Fecha Factura:	04/04/2023	Fecha Acta:	11/05/2023
Des. Contrato:	FC 11287 CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI	Fecha Vcto:	04/05/2023

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI	M3	30,47	462,213.59	3,054.41	14,175,766.00

Total Acta **14,175,766.00**

Parciales		
Subtotal		12,245,824.00
Administración	**7%**	857,208.00
Imprevistos	**4%**	489,833.00
Base/Utilidad	**4.00%**	489,833.00
IVA		93,068.00

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 14,082,698.00	IVA:93,068.00	14,175,766.00	0.00	14,175,766.00
Anticipos			0.00	0.00	0.00
Retención Anticipos		0%	0.00	0.00	0.00
Retención Garantías		0%	0.00	0.00	0.00
Retención FIC		0%	0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor cheque			**14,175,766.00**		

SON: CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

		Cuenta	Valor
019	**CONCRETOS, MORTEROS Y CEMENTOS**	14150119	14,175,766.00
		Total	**14,175,766.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	CONCREMACK SAS

CONCREMACK SAS
NIT 900558342 - 4
IVA REGIMÉN COMÚN Actividad económica 2395
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764041121500 de 2022-12-12 a 2023-12-12
Correo: proveedores@concremack.com
Dirección: Finca La Esperanza, Vereda Santa Barbara Km. 2 Vía Guamal-Acacias.
Teléfono: 3183585013
Ciudad: Guamal, Meta, Colombia.

FACTURADO A:

EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT 807008957 - 7
Carrera 46 # 95-71. Barrio La Castellana
Bogotá D.C. - Bogotá - COLOMBIA
facturacion@ebisuconstructora.com
3123216612

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE11287	**VENCIMIENTO:**	2023-05-04
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-04-04 00:00:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO . No. de despacho(s): 0.	1.000	$12,245,824.00	0	$12,245,824.00	$12,245,824.00
		A 7%	1.000	$857,208.00	0	$857,208.00	$857,208.00
		I 4%	1.000	$489,833.00	0	$489,833.00	$489,833.00
		U 4%	1.000	$489,833.00	19	$489,833.00	$582,901.00

Notas de la factura

Ciudad para aplicar retención de ICA: Bogotá D.C..

SUBTOTAL:	$14,082,698.00
IVA:	$93,068.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$93,068.00

TOTAL A PAGAR **$14,175,766.00**

Son : Catorce millones ciento setenta y cinco mil setecientos sesenta y seis pesos.

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: 19.00 % $93,068.00



Cuida el medio ambiente

CUFE: ee841f000c23098034f1a5f393e953e86ff35ad6eeddd03a843991d9667ea3404bd0f91ce11e5625e4e199097716073a

Elaborado por:

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

CUENTA POR PAGAR 23060170

Sucursal: Principal

BOGOTÁ D.C. , 21/06/2023

EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Nit 807,008,957-7

CONCREMACK SAS - 900,558,342
Contrato No. 1630277 Acta No. 1 CONCREMACK SAS

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	16/07/2023 05:53 p.m.	**Fecha Transacción**	16/07/2023	**Consecutivo Tercero**	FE12616
Cruza a					
Observaciones	Contrato No. 1630277: FC 12616 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150119	CONCRETOS, MORTEROS Y CEMENTOS		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	47,945,847.00	0.00
14150195	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	316,860.00	0.00
23652503	Servicios 2%		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	47,945,847.00	0.00	958,917.00
22050101	Proveedores Varios		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	0.00	46,962,416.00
23680116	ica a la tarifa 7.12 x mil		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	47,945,847.00	0.00	341,374.00
							48,262,707.00	**48,262,707.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
jcapador			**jcapador**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

CUENTA POR PAGAR 23060170

Sucursal: Principal

BOGOTÁ D.C. , 21/06/2023

EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Nit 807,008,957-7

CONCREMACK SAS - 900,558,342
Contrato No. 1630277 Acta No. 1 CONCREMACK SAS

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	16/07/2023 05:53 p.m.	**Fecha Transacción**	16/07/2023	**Consecutivo Tercero**	FE12616
Cruza a					
Observaciones	Contrato No. 1630277: FC 12616 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150119	CONCRETOS, MORTEROS Y CEMENTOS		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	47,945,847.00	0.00
14150195	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	316,860.00	0.00
23652503	Servicios 2%		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	47,945,847.00	0.00	958,917.00
22050101	Proveedores Varios		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	0.00	46,962,416.00
23680116	ica a la tarifa 7.12 x mil		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	47,945,847.00	0.00	341,374.00
							48,262,707.00	**48,262,707.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
jcapador			**jcapador**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

CONCREMACK SAS

NIT 900558342 - 4

IVA REGIMÉN COMÚN Actividad económica 2395

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764047589175 de 2023-04-17 a 2024-04-17

Correo: proveedores@concremack.com

Dirección: Finca La Esperanza, Vereda Santa Barbara Km. 2 Vía Guamal-Acacias.

Teléfono: 3183585013

Ciudad: Guamal, Meta, Colombia.

FACTURADO A:

EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

NIT 807008957 - 7

Carrera 46 # 95-71. Barrio La Castellana

Bogotá D.C. - Bogotá - COLOMBIA

facturacion@ebisuconstructora.com

3123216612

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE12616 **VENCIMIENTO:** 2023-07-21

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2023-06-21 00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO . No. de despacho(s): 0.	1.000	$41,692,040.00	0	$41,692,040.00	$41,692,040.00
		A 7%	1.000	$2,918,443.00	0	$2,918,443.00	$2,918,443.00
		I 4%	1.000	$1,667,682.00	0	$1,667,682.00	$1,667,682.00
		U 4%	1.000	$1,667,682.00	19	$1,667,682.00	$1,984,542.00

Notas de la factura

Ciudad para aplicar retención de ICA: Bogotá D.C..

SUBTOTAL:	$47,945,847.00
IVA:	$316,860.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$316,860.00

TOTAL A PAGAR **$48,262,707.00**

Son : Cuarenta y ocho millones doscientos sesenta y dos mil setecientos siete pesos.

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: 19.00 % $316,860.00





Cuida el medio ambiente

CUFE: 44f1051fbfd1b543047e11bcb3fa9d7e7d308c7a8107332614f9dc6a153987a00dff298613d9f129f4b58b3722617ada

Elaborado por:

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

CUENTA POR PAGAR 23060169

Sucursal: Principal

BOGOTÁ D.C. , 22/06/2023

EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Nit 807,008,957-7

CONCREMACK SAS - 900,558,342
Contrato No. 1630278 Acta No. 1 CONCREMACK SAS

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	16/07/2023 05:52 p.m.	**Fecha Transacción**	16/07/2023	**Consecutivo Tercero**	FE12649
Cruza a					
Observaciones	Contrato No. 1630278: FC 12649 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150119	CONCRETOS, MORTEROS Y CEMENTOS		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	56,464,857.00	0.00
14150195	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	373,159.00	0.00
23652503	Servicios 2%		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	56,464,857.00	0.00	1,129,297.00
22050101	Proveedores Varios		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	0.00	55,306,689.00
23680116	ica a la tarifa 7.12 x mil		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	56,464,857.00	0.00	402,030.00
							56,838,016.00	**56,838,016.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :
jcapador			**jcapador**

FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

DOC. IDENTIDAD

Empresa	EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT	807008957
Dirección	Cra 46 No. 95 - 71. Barrio La Castellana
Teléfono	2568829 - 2568796
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Fecha y hora de impresión: 01/08/2023 09:17 am

ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO No. 1630278

Contratista

Contratista:	CONCREMACK SAS	NIT/CC:	900558342
Dirección:	FCA LA ESP VDA STA BARBARA	Teléfono:	3185853926

Acta Por Grupos

Proyecto:	Mega Colegio Boita Kenedy - Bogota		
Tipo Contrato:	Suministro de Materiales	Vr. Contrato:	56,838,016.00
Estado:	CxP	Acumulado:	56,838,016.00
Nº Factura:	FE12649	Saldo:	0.00
Fecha Factura:	22/06/2023	Fecha Acta:	14/07/2023
Des. Contrato:	FC 12649 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Fecha Vcto:	22/07/2023

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	M3	122,16	462,213.59	3,054.41	56,838,016.00

Total Acta **56,838,016.00**

Parciales		
Subtotal		49,099,876.00
Administración	**7%**	3,436,991.00
Imprevistos	**4%**	1,963,995.00
Base/Utilidad	**4.00%**	1,963,995.00
IVA		373,159.00

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 56,464,857.00	IVA:373,159.00	56,838,016.00	0.00	56,838,016.00
Anticipos			0.00	0.00	0.00
Retención Anticipos		0%	0.00	0.00	0.00
Retención Garantías		0%	0.00	0.00	0.00
Retención FIC		0%	0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00

Valor cheque **56,838,016.00**

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

		Cuenta	Valor
019	**CONCRETOS, MORTEROS Y CEMENTOS**	14150119	56,838,016.00
		Total	**56,838,016.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	CONCREMACK SAS

CONCREMACK SAS
NIT 900558342 - 4
IVA REGIMÉN COMÚN Actividad económica 2395
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764047589175 de 2023-04-17 a 2024-04-17
Correo: proveedores@concremack.com
Dirección: Finca La Esperanza, Vereda Santa Barbara Km. 2 Vía Guamal-Acacias.
Teléfono: 3183585013
Ciudad: Guamal, Meta, Colombia.

FACTURADO A:

EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT 807008957 - 7
Carrera 46 # 95-71. Barrio La Castellana
Bogotá D.C. - Bogotá - COLOMBIA
facturacion@ebisuconstructora.com
3123216612

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE12649	**VENCIMIENTO:**	2023-07-22
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-06-22 00:00:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO . No. de despacho(s): 0.	1.000	$49,099,876.00	0	$49,099,876.00	$49,099,876.00
		A 7%	1.000	$3,436,991.00	0	$3,436,991.00	$3,436,991.00
		I 4%	1.000	$1,963,995.00	0	$1,963,995.00	$1,963,995.00
		U 4%	1.000	$1,963,995.00	19	$1,963,995.00	$2,337,154.00

Notas de la factura

Ciudad para aplicar retención de ICA: Bogotá D.C..

SUBTOTAL:	$56,464,857.00
IVA:	$373,159.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$373,159.00

TOTAL A PAGAR **$56,838,016.00**

Son : Cincuenta y seis millones ochocientos treinta y ocho mil dieciséis pesos.

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: 19.00 % $373,159.00



Cuida el medio ambiente

CUFE: 771be5a3f768e9fe6da9134d018c13d035ef756989633c5103872d3b4a1f9f107dbd010d991be45936ab81cb892ea961

Elaborado por:

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

CUENTA POR PAGAR 23060178

Sucursal: Principal

BOGOTÁ D.C. , 24/06/2023

EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Nit 807,008,957-7

CONCREMACK SAS - 900,558,342
Contrato No. 1630281 Acta No. 1 CONCREMACK SAS

Libro	Principal	**Moneda**	Peso Colombiano COP ($)	**Tasa de Cambio**	1.00
Fecha contabilizado	16/07/2023 06:03 p.m.	**Fecha Transacción**	16/07/2023	**Consecutivo Tercero**	FE12696
Cruza a					
Observaciones	Contrato No. 1630281: FC 12696 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
14150119	CONCRETOS, MORTEROS Y CEMENTOS		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	8,370,309.00	0.00
14150195	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	55,317.00	0.00
23652503	Servicios 2%		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	8,370,309.00	0.00	167,406.00
22050101	Proveedores Varios		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	0.00	0.00	8,198,623.00
23680116	ica a la tarifa 7.12 x mil		045001 COLEGIO BOITA BOGOTA	Principal	900,558,342	8,370,309.00	0.00	59,597.00
							8,425,626.00	**8,425,626.00**

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
jcapador			**jcapador**	**DOC. IDENTIDAD**

Empresa	EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT	807008957
Dirección	Cra 46 No. 95 - 71. Barrio La Castellana
Teléfono	2568829 - 2568796
Ciudad	BOGOTÁ D.C.

Fecha y hora de impresión: 01/08/2023 09:17 am

ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO No. 1630281

Contratista

Contratista:	CONCREMACK SAS	NIT/CC:	900558342
Dirección:	FCA LA ESP VDA STA BARBARA	Teléfono:	3185853926

Acta Por Grupos

Proyecto:	Mega Colegio Boita Kenedy - Bogota		
Tipo Contrato:	Suministro de Materiales	Vr. Contrato:	8,425,626.00
Estado:	CxP	Acumulado:	8,425,626.00
Nº Factura:	FE12696	Saldo:	0.00
Fecha Factura:	24/06/2023	Fecha Acta:	14/07/2023
Des. Contrato:	FC 12696 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	Fecha Vcto:	24/07/2023

Detalle de acta

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
1	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI	M3	18.11	462,213.59	3,054.41	8,425,626.00

Total Acta **8,425,626.00**

Parciales		
Subtotal		7,278,530.00
Administración	**7%**	509,497.00
Imprevistos	**4%**	291,141.00
Base/Utilidad	**4.00%**	291,141.00
IVA		55,317.00

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 8,370,309.00	IVA:55,317.00	8,425,626.00	0.00	8,425,626.00
Anticipos			0.00	0.00	0.00
Retención Anticipos		0%	0.00	0.00	0.00
Retención Garantías		0%	0.00	0.00	0.00
Retención FIC		0%	0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00

Valor cheque **8,425,626.00**

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

		Cuenta	Valor
019	**CONCRETOS, MORTEROS Y CEMENTOS**	14150119	8,425,626.00

Total **8,425,626.00**

Vo.Bo.	Contratante	Contratista
	EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	CONCREMACK SAS

CONCREMACK SAS

NIT 900558342 - 4

IVA REGIMÉN COMÚN Actividad económica 2395

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764047589175 de 2023-04-17 a 2024-04-17

Correo: proveedores@concremack.com

Dirección: Finca La Esperanza, Vereda Santa Barbara Km. 2 Vía Guamal-Acacias.

Teléfono: 3183585013

Ciudad: Guamal, Meta, Colombia.

FACTURADO A:

EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

NIT 807008957 - 7

Carrera 46 # 95-71. Barrio La Castellana

Bogotá D.C. - Bogotá - COLOMBIA

facturacion@ebisuconstructora.com

3123216612

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE12696 **VENCIMIENTO:** 2023-07-24

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2023-06-24 00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO . No. de despacho(s): 0.	1.000	$7,278,530.00	0	$7,278,530.00	$7,278,530.00
		A 7%	1.000	$509,497.00	0	$509,497.00	$509,497.00
		I 4%	1.000	$291,141.00	0	$291,141.00	$291,141.00
		U 4%	1.000	$291,141.00	19	$291,141.00	$346,458.00

Notas de la factura

Ciudad para aplicar retención de ICA: Bogotá D.C..

SUBTOTAL:	$8,370,309.00
IVA:	$55,317.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$55,317.00

TOTAL A PAGAR **$8,425,626.00**

Son : Ocho millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos veintiséis pesos.

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: 19.00 % $55,317.00



Cuida el medio ambiente

CUFE: 3246db0d33c1f67ce4222bae19fa6f527a5c06659e09d2522cd11068201428c4a732c9195445ef5961a749fdfc4678f1

Elaborado por:

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

Certificado Bancolombia

Viernes, 1 de Septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONCREMACK SAS identificado(a) con NIT 900558342, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	19188647083	2012/09/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

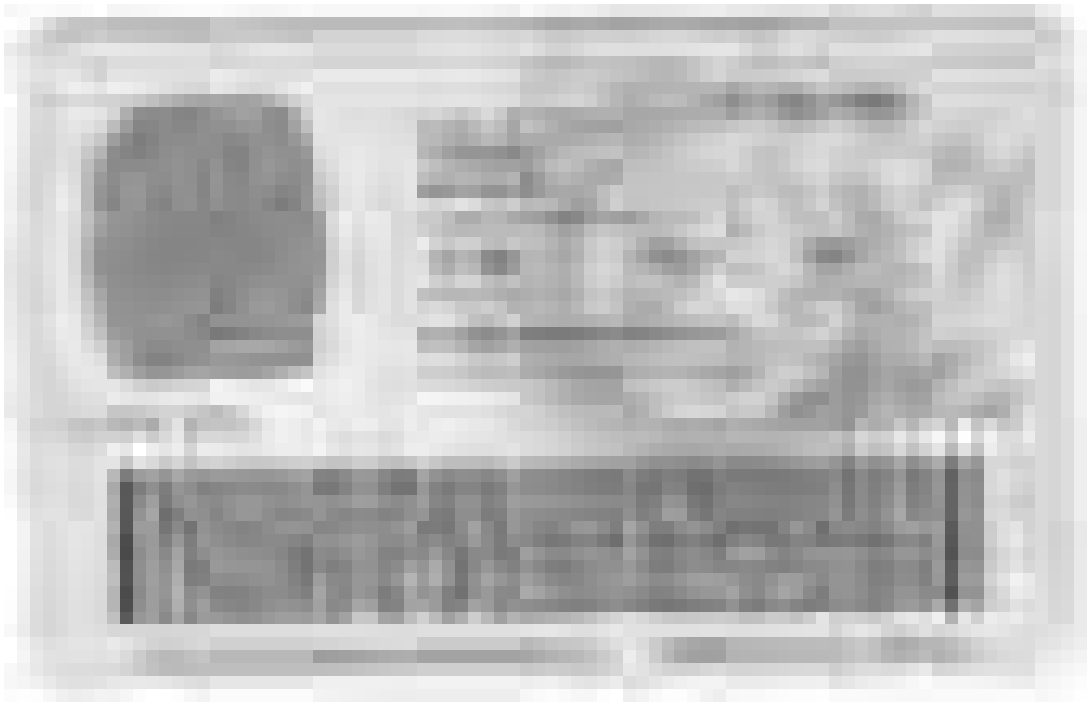

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14879131599

(415)7707212489984(8020) **000001487913159 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 8 3 4 2	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONCREMACK SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Guamal 3 1 8

41. Dirección principal
FCA LA ESPERANZA VEREDA SANTA BARBARA

42. Correo electrónico radicacion@concremack.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 3 5 8 5 0 1 3	3 1 8 5 8 5 3 9 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 5	2 0 1 2 0 9 2 4	7 1 1 2	2 0 1 2 0 9 2 4	7 7 3 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 3	2 2									3	1	57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 29 / 12 : 01: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NEIRA RIVERA CARLOS PASCUAL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONCREMACK SAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900558342-4
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : GUAMAL

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 238989
FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 24 DE 2012
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 16 DE 2023
ACTIVO TOTAL : 65,103,262,297.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : FCA LA ESPERANZA VDA STA BARBARA
BARRIO : CENTRO GUAMAL META
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50318 - GUAMAL
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3187350539
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3183585013
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3105617887
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : andrea.barrios@concremack.com
SITIO WEB : www.concremack.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 104 14A 45 OF 406
MUNICIPIO : 11001 - BOGOTA
TELÉFONO 1 : 3204078
TELÉFONO 2 : 3183585013
TELÉFONO 3 : 3187350539
CORREO ELECTRÓNICO : juridica@concremack.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : juridica@concremack.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2395 - FABRICACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42877 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONCREMACK SAS.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42877 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONCREMACK SAS.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-3	20130628	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	VILLAVICENCIO	RM09-46202	20130905
CC-	20130704	CONTADOR	BOGOTA	RM09-46203	20130905
AC-3	20130628	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	VILLAVICENCIO	RM09-46202	20130905
CC-	20130704	CONTADOR	BOGOTA	RM09-46203	20130905
AC-11	20180326	ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS	BOGOTA	RM09-72006	20190123
CE-	20181221	REVISOR FISCAL	BOGOTA	RM09-72060	20190128
AC-14	20190725	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA	BOGOTA	RM09-75675	20190913
AC-20	20191223	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA	BOGOTA	RM09-76803	20191227
CE-	20191226	CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL	BOGOTA	RM09-76804	20191227
AC-23	20201120	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	BOGOTA	RM09-82156	20201228
CE-	20201120	REVISOR FISCAL	BOGOTA	RM09-82157	20201228

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SUMINISTRAR, PROVEER, COMPRAR, VENDER Y/O COMERCIALIZAR TODO TIPO DE MATERIALES PETREOS, AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONCRETOS PREMEZCLADOS DE DIFERENTES CLASES Y RESISTENCIAS. DISEÑAR, PROYECTAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE OBRAS Y PROYECTOS EN EL CAMPO DE LAS INGENIERIAS, PRINCIPALMENTE EN LA INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL, MECANICA Y DE PETROLEOS. ELABORAR Y PRESENTAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, AMBIENTAL, MECANICA Y DE PETRÓLEOS SIN LÍMITE DE CUANTÍAIO MAGNITUD DE LAS OBRAS, CELEBRAR CONTRATOS DE CONSULTORIA, INTERVENTORIA, OBRA, DIE ASESORIA ECONOMICA Y FINANCIERA, DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE OBRAS, DE LAS QUE CORRESPONDEN A SU OBJETO PRINCIPAL. DISEÑAR, PROYECTAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ANTISÍSMICO EN CONSTRUCCIONES DE CONCRETO Y/O METALICAS, VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES, PUENTES ANTI TRATADOS Y CABLES AEREOS, SENALIZACION, CONSTRUCCIÓN Y INTERIORES PARA EDIFICACIONES. OBRAS CIVILES HIDRAULICAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE RIOS Y SISTEMAS DE IRRIGACION, DRENAJE, CONDUCCIÓN DE AGUAS, OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES, REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS, ESTACIONES DE BOMBEO, OBRAS DE GEOTECNICA, PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES, RECUPERACION AMBIENTAL, ECOLOGICA, MORFOLOGICA DE SUELOS, EMPRADIZARÍAN, REVEGETALIZACION Y FORMACIÓN DE COBERTURA VEGETAL, MANTENIMIENTO DE PRADOS, ZONAS VERDES, JARDINERIA Y ROCERIA, FUMIGACION Y CONTROL DE INSECTOS, VECTORES Y ROEDORES, SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA. CONTENCIÓN, RECUPERACION Y DISPOSICION DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS, DISEÑAR Y REALIZAR Y EJECUTAR OBRAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN, MITIGACION, CORRECCION DE EFECTOS AMBIENTALES ADVERSOS; PLANEAR PROYECTAR O EJECUTAR OBRAS DE BIORREMEDIACION, BIODEGRADACION, TRATAMIENTO FÍSICO, QUÍMICO O BIOLÓGICOS EN CONTAMINIANTES COMO HIDROCARBUROS, METALES PESADOS, PLAGUICIDAS, PESTICIDAS Y DEMÁS ELEMENTOS. COMPUESTOS&RSQUO; Y SUSTANCIAS CONSIDERADAS COMO CONTAMINANTES, DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SOLIDOS, LIQUIDOS A NIVEL MUNICIPAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL; EJECUTAR MUESTREOS, DETERMINACION SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACION IDE CONTAMINANTES EN AGUA, AIRE Y SUELO. PODRA DEDICARSE, ADEMAS A LA DIRECCION, CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION DE TIERRAS Y DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROPIAS DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJES DE TUBERIAS DE PRESIÓN PARA SISTEMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, OBRAS PARA MINERIA E HIDROCARBUROS,PARA TRANSPORTE DE IHIDROCARBUROS, CRUCE SUBFLUVIALES DE LINEA, TANQUES Y RECIPIENTES METALICOS PARA ALMACENAMIENTO, ESTACIONES DE RECOLECCIÓN Y/O BOMBEO LÍNEAS REGULARES, OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION. EL TRANSPORTE PRIVADO DE CARGA A NIVEL NACIONAL DE TODO TIPO DE MATERIALES, ENTRE ELLOS, AGREGADOS, CONCRETO PREMEZCLADO, ARENA, GRAVA, MINERALES, Y EN GENERAL TODO TIPO DE ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ASÍ MISMO PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDADI ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL TODAS LAS

OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	11.400.000.000,00	11.400,00	1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	5.700.000.000,00	5.700,00	1.000.000,00
CAPITAL PAGADO	5.700.000.000,00	5.700,00	1.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 06 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 97052 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE ABRIL DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JARAMILLO PEÑA LUIS ENRIQUE	CC 79,791,141

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 22 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 81533 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PERDOMO BONILLA JUAN MANUEL	CC 79,787,980

POR ACTA NÚMERO 25 DEL 01 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ÚNICO ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85978 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE JULIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	BARRIOS OLMOS ANDREA KARINA	CC 1,010,203,758

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 06 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 97052 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE ABRIL DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NEIRA RIVERA CARLOS PASCUAL	CC 1,026,254,265

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ 2 (DOS) SUPLENTES QUE REMPLAZARAN, AL PRINCIPAL EN SUS AUSENCIAS, FALTAS, ABSOLUTAS Y TEMPORALES CON LAS MISMAS FACULTADES Y RESTRICCIONES, LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE

LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EI REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 31 DEL 12 DE JUNIO DE 2023 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 98864 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE JUNIO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	MENESES BARRERO JENNIFER CAROLINA	CC 1,109,265,059	203162-T

POR ACTA NÚMERO 31 DEL 12 DE JUNIO DE 2023 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 98864 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE JUNIO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS	NIT 900354279-1	

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 31 DEL 12 DE JUNIO DE 2023 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 98864 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE JUNIO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	RODRIGUEZ CASTELLANOS ANA LUCIA	CC 51,666,633	175091-T

CERTIFICA - SUCURSALES Y AGENCIAS

QUE ES PROPIETARIO DE LAS SIGUIENTES SUCURSALES Y AGENCIAS EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE :** CONCREMACK_ SAS
CATEGORÍA : SUCURSAL
MATRÍCULA : 298447
FECHA DE MATRÍCULA : 20160707
FECHA DE RENOVACIÓN : 20190401
ÚLTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : VEREDA GUAYAQUIL SECTOR 4 CAMINOS
MUNICIPIO : 50313 - GRANADA
TELÉFONO 1 : 3187350546
CORREO ELECTRÓNICO : juan.perdomo@profesionalesyasociadostda.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2395 - Fabricacion de articulos de hormigon, cemento y yeso
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7110 - Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria tecnica
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
OTRAS ACTIVIDADES : F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
ACTIVOS VINCULADOS : 260,000,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN DPygPNYz4B

***** NOMBRE :** CONCREMACK SAS SUCURSAL VILLAVICENCIO
CATEGORÍA : SUCURSAL
MATRÍCULA : 429390
FECHA DE MATRÍCULA : 20221130
FECHA DE RENOVACIÓN : 20230316
ÚLTIMO AÑO RENOVADO : 2023
DIRECCION : KM 5.5 VIA VILLAVICENCIO-ACACIAS
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO 1 : 3187350539
TELÉFONO 2 : 3183585013
TELÉFONO 3 : 3105617887
CORREO ELECTRÓNICO : andrea.barrios@concremack.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2395 - Fabricacion de articulos de hormigon, cemento y yeso
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
ACTIVOS VINCULADOS : 500,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $86,425,070,394
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación DPygPNYz4B

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CODIGO DE VERIFICACIÓN DPygPNYz4B

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Egresos Generados

Desde: 01-AUG-23 **Hasta:** 30-SEP-23

Reporte: CAJR_002
Usuario: 42800078
Fecha: 11-OCT-2023

Producto: 15180 P.A. ANT EBISU SAS 002

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 30000001292 **Emisor:** BANCOLOMBIA **Cuenta Contable:** 111505510482

Tipo de Egreso: GRA GRAVAMEN TRANS.FINANCIERAS (NPA)

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
10-AUG-23		179	BANCOLOMBIA		927740362-GRA 09/08/2023 GMF (4x1000)	1,683.25	.00	Pagado		
07-SEP-23		187	BANCOLOMBIA		438441582-GRA 06/09/2023 GMF (4x1000)	341.18	.00	Pagado		
08-SEP-23		192	BANCOLOMBIA		456399933-GRA 07/09/2023 GMF (4x1000)	215,172.41	.00	Pagado		
					Total Tipo de Egreso:	217,196.84	.00			

Tipo de Egreso: GZT GIRO A TERCEROS

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
07-SEP-23	734	188	FRANCISCO ORTIZ DURAN		RAD. 1739649 FRL OP. 23 GIRO A TERCEROS	8,062,890.00	.00	Pagado		1739649
07-SEP-23	734	191	GRUPEL COLOMBIA S.A.S.		Egreso GIRO A TERCEROS generado por una orden de pago. 8062RAD. 1739649 FRL OP. 23 GIRO A TERCEROS	30,975,700.00	.00	Pagado		1739649
07-SEP-23	734	189	FRANCISCO ORTIZ DURAN		RAD. 1739649 FRL OP. 23 GIRO A TERCEROS	4,500,266.00	.00	Pagado		1739649
07-SEP-23	734	190	ALTACOL NORVENTAS SAS		RAD. 1739649 FRL OP. 23 GIRO A TERCEROS	10,254,247.00	.00	Pagado		1739649
					Total Tipo de Egreso:	53,793,103.00	.00			

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
09-AUG-23	442	178	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		Contrato de obra No . 2220555 07 de marzo de 2022 suscrito con EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, N.I.T.: 807008957 por cuenta de ENTERRITORIO GIRO DE RENDIMIENTOS DE JULIO DE 2023 PRG_2023_2520947.xlsb	420,813.35	.00	Pagado		1720084
06-SEP-23	1028	186	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		Contrato de obra No . 2220555 07 de marzo de 2022 suscrito con EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, N.I.T.: 807008957 por cuenta de ENTERRITORIO GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2023 PRG_2023_2853437.xlsb	85,295.92	.00	Pagado		1739238
					Total Tipo de Egreso:	506,109.27	.00			
					Total por Cuenta:	54,516,409.11	.00			
					Total por Moneda:	54,516,409.11	.00			

P.A. ANT EBISU SAS 002
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

2023/08/31 2023/09/30
CUENTA DE AHORROS
300-000012-92
300 SUCURSAL AUTOPISTA 98

SALDO ANTERIOR	***$***	251,644,269.01	***SALDO PROMEDIO***	***$***	208,381,796
TOTAL ABONOS	***$***	55,480.29	***CUENTAS X COBRAR***	***$***	.00
TOTAL CARGOS	***$***	54,093,912.51	***VALOR INTERESES***	***$***	55,480.29
SALDO ACTUAL	***$***	197,605,836.79	***RETEFUENTE***	***$***	.00

5/09	ABONO INTERESES AHORROS		13,754.55	251,658,023.56
6/09	ABONO INTERESES AHORROS		2,750.06	251,660,773.62
6/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000		-341.18	251,660,432.44
6/09	PAGO A PROVE EMPRESA NACIONA		-85,295.92	251,575,136.52
7/09	PAGO A PROV ALTACOL NORVENTAS		-10,254,247.00	241,320,889.52
7/09	PAGO A PROV FRANCISCO ORTIZ DU		-4,500,266.00	236,820,623.52
7/09	PAGO A PROV FRANCISCO ORTIZ DU		-8,062,890.00	228,757,733.52
7/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000		-215,172.41	228,542,561.11
7/09	PAGO A PROVE GRUPEL COLOMBIA		-30,975,700.00	197,566,861.11
30/09	ABONO INTERESES AHORROS		38,975.68	197,605,836.79

FIN ESTADO CUENTA

ANEXO 3. PLAN DE CALIDAD



NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





No. 049393

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 22/06/2023

CLIENTE	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	SZZ 772	**GRADO**	420

PEDIDO No.	22693
REMISIÓN No.	22722
FACTURA No.	70634

						ENSAYOS FÍSICOS				ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																						
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 7	12	20231529	8	504		470.8	610.2	14.3	1.30	0.28	1.02	0.0087	0.027	0.21	0.18	0.07	0.07	0.022	0.00052	0.0023	0.46	2.906	1.510	15.070	66.1	3.240
		20231524	1			483.5	620.9	14.3	1.28	0.26	1.05	0.00777	0.037	0.18	0.25	0.09	0.07	0.028	0.00063	0.0022	0.46	2.924	1.710	15.070	66.1	3.300
R - No. 8	12	20231561	7	378		474.7	637.0	13.5	1.34	0.26	1.03	0.01523	0.029	0.18	0.14	0.06	0.06	0.015	0.00051	0.0023	0.45	3.952	2.570	16.550	70.0	4.150
		20231564	2			471.6	635.8	13.6	1.35	0.27	1.01	0.01557	0.034	0.19	0.15	0.08	0.07	0.016	0.00069	0.0022	0.45	3.952	2.520	16.550	70.0	4.300
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 7						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com



NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





No. 049750

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 4/07/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA
		PLACA	SZZ 772
NORMA	NTC 2289	**PEDIDO No.**	22851
GRADO	420	**REMISIÓN No.**	22878
		FACTURA No.	71236

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 6	12	20231986	9	1368		494.1	642.9	14.8	1.30	0.27	1.04	0.011	0.034	0.19	0.20	0.07	0.12	0.020	0.00073	0.0022	0.46	2.195	1.260	13.060	69.8	2.175
		20231987	8			491.0	646.1	15.5	1.32	0.27	1.03	0.01123	0.030	0.21	0.21	0.07	0.11	0.020	0.00090	0.0021	0.46	2.196	1.320	13.060	69.8	2.218
		20231985	1			462.0	620.2	16.4	1.34	0.28	1.01	0.01037	0.036	0.19	0.22	0.07	0.07	0.017	0.00088	0.0020	0.46	2.171	1.310	13.120	69.8	2.390
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com



NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





No. 050567

FECHA DESPACHO
DD/MM/AAAA
28/07/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	WCO 976	**GRADO**	420

PEDIDO No.	23218
REMISIÓN No.	23244
FACTURA No.	72746

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 4	12	20232184	13	3024		477.6	611.5	16.0	1.28	0.24	1.16	0.01153	0.034	0.18	0.22	0.08	0.08	0.012	0.00050	0.0022	0.45	0.977	0.890	8.500	73.5	1.780
		20232191	4			468.4	613.3	16.2	1.31	0.26	1.17	0.0081	0.035	0.17	0.24	0.07	0.08	0.016	0.00063	0.0021	0.47	0.974	0.860	8.500	73.5	1.860
		20232190	1			484.2	641.9	15.4	1.33	0.27	1.17	0.01113	0.039	0.18	0.28	0.08	0.10	0.019	0.00089	0.0021	0.48	0.984	0.860	8.500	73.5	1.920
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com



NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





No. 050785

FECHA DESPACHO
DD/MM/AAAA
3/08/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	TFU 216	**GRADO**	420

PEDIDO No.	23304
REMISIÓN No.	23333
FACTURA No.	73122

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 8	**12**	20231583	13	756		490.2	637.2	13.7	1.30	0.27	1.04	0.00793	0.027	0.18	0.17	0.07	0.05	0.022	0.00023	0.0021	0.45	3.901	2.180	16.680	68.9	4.010
		20231586	5			471.4	641.5	13.7	1.36	0.28	0.98	0.00847	0.028	0.15	0.17	0.06	0.05	0.015	0.00025	0.0019	0.46	3.899	2.160	16.680	68.9	3.960
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com



NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





No. 050832

FECHA DESPACHO
DD/MM/AAAA
8/08/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	JUZ 038	**GRADO**	420

PEDIDO No.	23342
REMISIÓN No.	23371
FACTURA No.	73291

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 5	12	20232284	3	1944		491.3	622.1	15.7	1.27	0.26	1.16	0.00983	0.037	0.20	0.26	0.09	0.10	0.022	0.00070	0.0021	0.47	1.525	1.240	10.580	72.0	2.160
		20232283	4			480.3	629.2	15.3	1.31	0.26	1.14	0.01097	0.036	0.19	0.24	0.08	0.08	0.022	0.00098	0.0024	0.47	1.527	1.080	10.580	72.0	2.070
		20232285	11			487.4	620.1	15.1	1.27	0.25	1.14	0.01123	0.037	0.18	0.19	0.07	0.10	0.019	0.00084	0.0022	0.46	1.524	1.060	10.590	72.0	1.480
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com



NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





No. 050834

FECHA DESPACHO
DD/MM/AAAA
8/08/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	KUM 069	**GRADO**	420

PEDIDO No.	23343
REMISIÓN No.	23374
FACTURA No.	73293

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 8	12	20232444	2	756		505.8	654.9	13.7	1.29	0.26	1.04	0.00837	0.031	0.19	0.21	0.08	0.10	0.026	0.00067	0.0023	0.45	3.888	1.850	17.030	69.2	4.240
		20232443	8			495.9	647.9	12.9	1.31	0.27	1.11	0.0102	0.032	0.18	0.24	0.07	0.06	0.021	0.00050	0.0021	0.47	3.868	1.750	17.030	69.2	4.190
		20232445	8			501.2	651.6	13.6	1.30	0.28	1.05	0.0081	0.024	0.20	0.21	0.07	0.07	0.020	0.00068	0.0021	0.47	3.916	1.790	17.030	69.2	4.350
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com



NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





No. 051340

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 18/08/2023

CLIENTE	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	**DESTINO**	BOGOTA
		PLACA	JUZ 038

NORMA	NTC 2289
GRADO	420

PEDIDO No.	23525
REMISIÓN No.	23549
FACTURA No.	74110

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 6	12	20231966	3	1368		478.2	625.4	15.2	1.31	0.26	0.98	0.0093	0.033	0.18	0.21	0.07	0.07	0.012	0.00107	0.0020	0.44	2.169	1.190	13.070	73.3	2.600
		20231967	4			476.2	633.9	15.4	1.33	0.28	1.01	0.01083	0.034	0.18	0.22	0.08	0.07	0.018	0.00069	0.0023	0.46	2.171	1.150	13.070	73.3	2.690
		20231927	11			492.0	633.9	15.2	1.29	0.26	0.98	0.01077	0.035	0.21	0.26	0.09	0.09	0.039	0.00071	0.0021	0.45	2.163	1.160	13.070	73.3	2.720
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com



NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





No. 051410

FECHA DESPACHO
DD/MM/AAAA
22/08/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	23549
		PLACA	KUM 069	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	23576
						FACTURA No.	74203

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 8	14	20232409	6	468		499.0	659.1	13.7	1.32	0.28	1.02	0.00897	0.032	0.18	0.20	0.07	0.06	0.014	0.00046	0.0021	0.46	3.969	1.950	17.010	71.8	4.190
		20232410	5			498.2	652.1	13.7	1.31	0.26	1.13	0.00953	0.035	0.19	0.20	0.07	0.07	0.019	0.00039	0.0022	0.46	3.946	1.890	17.010	71.8	4.260
		20232399	2			491.9	648.3	14.0	1.32	0.26	1.11	0.0112	0.026	0.17	0.19	0.07	0.06	0.014	0.00058	0.0021	0.46	3.928	2.000	17.010	71.8	4.020
R - No. 7	14	20232058	2	240		469.9	622.8	14.0	1.33	0.27	0.99	0.013	0.035	0.19	0.21	0.07	0.09	0.023	0.00059	0.0022	0.45	2.944	1.510	15.090	71.0	3.530
		20232057	3			478.1	633.3	14.1	1.32	0.26	1.12	0.00947	0.028	0.18	0.20	0.08	0.08	0.033	0.00067	0.0023	0.46	2.950	1.470	15.090	71.0	3.440
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7
R - No. 7						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com



NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





No. 051653

FECHA DESPACHO
DD/MM/AAAA
28/08/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	JUZ 038	**GRADO**	420

PEDIDO No.	23631
REMISIÓN No.	23650
FACTURA No.	74549

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 6	12	20232666	9	1368		485.0	635.7	16.4	1.31	0.27	1.03	0.01003	0.031	0.19	0.21	0.07	0.07	0.022	0.00071	0.0022	0.46	2.135	1.310	12.790	70.4	2.086
		20232668	9			471.9	617.1	16.8	1.31	0.27	1.01	0.01187	0.036	0.17	0.23	0.07	0.08	0.016	0.00034	0.0023	0.46	2.132	1.240	12.790	70.4	2.114
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com



NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





No. 051714

FECHA DESPACHO
DD/MM/AAAA
29/08/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	JUZ 038	**GRADO**	420

PEDIDO No.	23652
REMISIÓN No.	23672
FACTURA No.	74649

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 8	**12**	20232431	12	756		503.9	659.4	13.0	1.31	0.27	1.02	0.0101	0.028	0.20	0.20	0.07	0.12	0.032	0.00080	0.0022	0.46	3.897	1.740	17.070	69.0	4.210
		20232432	6			490.5	643.1	13.1	1.31	0.27	0.97	0.00937	0.038	0.19	0.25	0.08	0.13	0.029	0.00066	0.0020	0.45	3.887	1.760	17.070	69.0	4.290
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com



NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289





No. 051719

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 29/08/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	KUM 069	**GRADO**	420

PEDIDO No.	23653
REMISIÓN No.	23673
FACTURA No.	74651

						ENSAYOS FÍSICOS				ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																						
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 8	**14**	20232410	8	396		498.2	652.1	13.7	1.31	0.26	1.13	0.00953	0.035	0.19	0.20	0.07	0.07	0.019	0.00039	0.0022	0.46	3.946	1.890	17.010	71.8	4.260
		20232387	3			498.1	666.8	13.4	1.34	0.26	1.10	0.0109	0.036	0.19	0.23	0.10	0.10	0.019	0.00104	0.0023	0.46	3.953	1.930	17.010	71.8	4.320
R - No. 7	**14**	20232758	5	336		478.5	615.9	18.4	1.29	0.26	1.01	0.01727	0.027	0.19	0.21	0.07	0.05	0.018	0.00097	0.0021	0.44	2.916	1.430	14.790	70.8	2.990
		20232733	2			480.3	628.9	16.3	1.31	0.26	1.06	0.01253	0.042	0.24	0.27	0.08	0.10	0.016	0.00092	0.0023	0.46	2.914	1.460	14.790	70.8	3.010
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7
R - No. 7						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

DIRECTOR CALIDAD

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

29/04/2023 Ver. 03 CCA-FOR-013

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA**
Teléfono: **7449666**

Fecha Impresión **23/08/04**
No. Remisión: **82638590**
Página: **1 de 12**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**% C**	**% Mn**	**% Si**	**% S**	**% P**	**% Nb**	**% Ce**	**% Cr**	**% Ni**	**% Cu**
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3582496	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.08	0.21	0.009	0.014	0.001	0.46	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO358829T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.06	0.20	0.006	0.013	0.000	0.45	0.01	0.01	0.02
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0101112	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.26	1.12	0.18	0.007	0.003	0.002	0.45	0.01	0.00	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY010526B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.09	0.21	0.008	0.005	0.001	0.47	0.01	0.11	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0106831	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.18	0.005	0.003	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0107184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.26	1.13	0.20	0.005	0.003	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0110725	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.09	0.19	0.008	0.004	0.001	0.47	0.01	0.00	0.00
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0110739	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.09	0.19	0.008	0.004	0.001	0.47	0.01	0.00	0.00
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187704	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.26	1.06	0.19	0.004	0.007	0.002	0.44	0.01	0.01	0.01

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA**
Teléfono: **7449666**

Fecha Impresión **23/08/04**
No. Remisión: **82638590**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**% C**	**% Mn**	**% Si**	**% S**	**% P**	**% Nb**	**% Ce**	**% Cr**	**% Ni**	**% Cu**
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187705	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.26	1.06	0.19	0.004	0.007	0.002	0.44	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY018847C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.29	1.11	0.21	0.005	0.007	0.001	0.48	0.01	0.01	0.01

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**% V**	**% Mo**
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3582496	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.000
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO358829T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.001	0.000
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0101112	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.005
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY010526B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.004
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0106831	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.005

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA**
Teléfono: **7449666**

Fecha Impresión **23/08/04**
No. Remisión: **82638590**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**% V**	**% Mo**
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0107184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.030
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0110725	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.006
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0110739	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.006
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187704	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.005
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187705	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.005
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY018847C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.004

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**Resistencia Fluencia**	**Resistencia Tracción**	**Alargamiento**	**Doblado**	**Relación RT/RF**	**Área Nominal**	**Carga Fluencia**	**Carga Tracción**
					psi	psi	**%**			**Pulg.2**	**lbf**	**lbf**

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6** Fecha Impresión **23/08/04**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA** No. Remisión: **82638590**
Teléfono: **7449666** Página: **4 de 12**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**Resistencia Fluencia**	**Resistencia Tracción**	**Alargamiento**	**Doblado**	**Relación RT/RF**	**Área Nominal**	**Carga Fluencia**	**Carga Tracción**
					psi	psi	**%**			**Pulg.2**	**lbf**	**lbf**
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3469107	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69431	99912	16	Sin Grieta	1.44	0.11	7637	10990
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3469111	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69431	99912	16	Sin Grieta	1.44	0.11	7637	10990
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3469125	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69431	99912	16	Sin Grieta	1.44	0.11	7637	10990
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3582496	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	72249	102855	16	Sin Grieta	1.42	0.11	7947	11314
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO358829T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69974	101729	16	Sin Grieta	1.45	0.11	7697	11190
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0101112	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	72265	100133	17	Sin Grieta	1.39	0.11	7949	11015
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY010526B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	67633	91979	17	Sin Grieta	1.36	0.11	7440	10118
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0106831	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69393	100102	16	Sin Grieta	1.44	0.11	7633	11011

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6** Fecha Impresión **23/08/04**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA** No. Remisión: **82638590**
Teléfono: **7449666** Página: **5 de 12**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**Resistencia Fluencia**	**Resistencia Tracción**	**Alargamiento**	**Doblado**	**Relación RT/RF**	**Área Nominal**	**Carga Fluencia**	**Carga Tracción**
					psi	psi	**%**			**Pulg.2**	**lbf**	**lbf**
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0107184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	73365	101368	15	Sin Grieta	1.38	0.11	8040	11113
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0110725	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	67867	95931	15	Sin Grieta	1.41	0.11	7465	10552
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0110739	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	67867	95931	15	Sin Grieta	1.41	0.11	7465	10552
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187704	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	70962	97704	16	Sin Grieta	1.38	0.11	7806	10747
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187705	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	70962	97704	16	Sin Grieta	1.38	0.11	7806	10747
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY018847C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	71108	99194	15	Sin Grieta	1.40	0.11	7822	10911

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**Fecha Ensayo**

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6** Fecha Impresión **23/08/04**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA** No. Remisión: **82638590**
Teléfono: **7449666** Página: **6 de 12**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**Fecha Ensayo**
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3469107	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230410
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3469111	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230410
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3469125	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230410
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3582496	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230405
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO358829T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230411
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0101112	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230518
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY010526B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230509
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0106831	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230510
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0107184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230512

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6** Fecha Impresión **23/08/04**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA** No. Remisión: **82638590**
Teléfono: **7449666** Página: **7 de 12**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES FISICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0110725	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230516
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0110739	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230516
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187704	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230609
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187705	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230609
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY018847C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230609

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)
					°	mm	mm	Kg/m
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3469107	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	52	1.9	6.2	0.563
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8"	BFO3469111	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	52	1.9	6.2	0.563

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA**
Teléfono: **7449666**

Fecha Impresión **23/08/04**
No. Remisión: **82638590**
Página: **8 de 12**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**Angulo Resalte**	**Separación Extremos**	**Espaciamiento**	**Peso Metro (Masa)**
					°	**mm**	**mm**	**Kg/m**
	NTC2289/G60							
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8"	BFO3469125	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	52	1.9	6.2	0.563
	NTC2289/G60							
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8"	BFO3582496	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	50	2.1	6.1	0.562
	NTC2289/G60							
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8"	BFO358829T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55	2.1	6.1	0.565
	NTC2289/G60							
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8"	BTY0101112	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	52	2.3	6.2	0.583
	NTC2289/G60							
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8"	BTY010526B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55	2.0	6.0	0.558
	NTC2289/G60							
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8"	BTY0106831	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55	2.1	6.0	0.566
	NTC2289/G60							
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8"	BTY0107184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	53	2.4	5.8	0.577
	NTC2289/G60							
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8"	BTY0110725	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55	2.3	6.1	0.571

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA**
Teléfono: **7449666**
Fecha Impresión **23/08/04**
No. Remisión: **82638590**
Página: **9 de 12**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**Angulo Resalte**	**Separación Extremos**	**Espaciamiento**	**Peso Metro (Masa)**
					°	**mm**	**mm**	**Kg/m**
	NTC2289/G60							
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0110739	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55	2.3	6.1	0.571
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187704	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	56	2.0	6.0	0.561
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187705	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	56	2.0	6.0	0.561
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY018847C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	55	2.2	6.1	0.566

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**Altura Resalte**
					mm
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3469107	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.54
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3469111	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.54

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6** Fecha Impresión **23/08/04**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA** No. Remisión: **82638590**
Teléfono: **7449666** Página: **10 de 12**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**Altura Resalte**
					mm
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3469125	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.54
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO3582496	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.53
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BFO358829T	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.52
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0101112	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.58
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY010526B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.53
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0106831	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.53
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0107184	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.51
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0110725	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.55
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8"	BTY0110739	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.55

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6** Fecha Impresión **23/08/04**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA** No. Remisión: **82638590**
Teléfono: **7449666** Página: **11 de 12**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
	NTC2289/G60				
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187704	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.47
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0187705	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.47
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY018847C	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018

* Doblado: NTC 1:2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 497 psi/3.427 Mpa

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.

No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **FERRETERIA ANDRES MARTINEZ AV 6** Fecha Impresión **23/08/04**
Dirección: **AV CL 6 37 A 12 BOGOTA** No. Remisión: **82638590**
Teléfono: **7449666** Página: **12 de 12**

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Tracción	± 497 psi/3.427 Mpa
Alargamiento	± 0.36%
Altura Resalte	± 0.012 mm
Separación entre extremos	± 0.013 mm
Espaciamiento	± 0.025 mm
Angulo de Resalte	± 0.11 °
Peso metro (masa)	± 0.0059 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

0391

INDUMA SCA

NIT 890.800.450-3

Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto:	Cajas para uso eléctrico
Referencia:	Ver listado de referencias especificas en anexo.
Referente reglamentario:	Numeral 20.5 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 2 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2012-05-07	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Fecha de renovación	2021-11-22	Seguimiento 1	2022-11-22
Fecha de vencimiento	2024-11-21	Seguimiento 2	2023-11-22

ISARIN PINZON GUEVARA

Firmado digitalmente por ISARIN PINZON GUEVARA
Fecha: 2021.11.22 14:49:37 -05'00'

Gerente

Dirección: km 17 vía Las Palmas, Parque Tecnológico Manantiales, Edificio QUBOX, Envigado, Antioquia, Colombia. **E-Mail:** servicioalcliente@qcert.com.co **Teléfonos:** (57 604) 444 80 87 - 301 790 90 20

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 0391 **Fecha de Renovación** 2021-11-22
Dirección Km 1 Vía Termales El Otoño, Manizales

Aspecto	Descripción
Producto	Cajas para uso eléctrico
Referente reglamentario	Numeral 20.5 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
Fabricante	INDUMA S.C.A.
Planta de fabricación	Km 1 Vía Termales El Otoño, Manizales
Marca	INDUMA
Accesorios	Tapas: Toma doble, Ciega, 2x4, 4x4, 10x10, Suplemento y Redonda
Material	Lámina CR
Espesor de lámina	Calibre 20 comercial
Acabado	Galvanizado y zincado
Puesta a tierra	Si, mediante tornillo a base de la caja
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Cajas para alojar tomacorrientes e interruptores

ANEXO CERTIFICADO

No de 0391 **Fecha de Renovación** 2021-11-22
Direcci Km 1 Vía Termales El Otoño, Manizales

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	T7101-003	CEE 4"X4", RECTANGULAR, IK 05, Lámina Cold Rolled
2	T7101-006	CEE OCTOGONAL, IK 05, Lámina Cold Rolled
3	T7402-005	CEE 2"X4", RECTANGLAR, IK 05, Lámina Cold Rolled
4	T7402-034	CEE 10X10 cm, RECTANGULAR, IK 05, Lámina Cold Rolled

ISARIN PINZON GUEVARA
Gerente

Firmado digitalmente por ISARIN PINZON GUEVARA
Fecha: 2021.11.22 14:50:09 -05'00'

Geotextiles No Tejidos

Especificaciones Técnicas

PROPIEDADES MECÁNICAS	NORMA	UNIDAD	NT1600	NT1800	NT2000	NT2500	NT3000	NT4000	NT5000	NT6000	NT7000	REPAV 400	REPAV 450
Resistencia a la tensión **Método Grab** **Elongación**	ASTM D4632	N (lb) %	450 (101) >50	540 (121) >50	580 (130) >50	750 (169) >50	830 (187) >50	1080 (243) >50	1255 (283) >50	1410 (320) >50	1720 (391) >50	510 (115) >50	600 (135) >50
Método CBR resistencia al punzonamiento	ASTM D6241	kN (lb)	1.2 (270)	1.6 (360)	1.7 (382)	2.1 (472)	2.4 (540)	3.1 (697)	3.4 (764)	4.1 (922)	5.4 (1214)	N.A	N.A
Resistencia al rasgado trapezoidal	ASTM D4533	N (lb)	190 (43)	220 (49)	240 (54)	290 (65)	315 (71)	380 (86)	420 (94)	540 (123)	600 (136)	210 (47)	250 (56)

PROPIEDADES HIDRÁULICAS	NORMA	UNIDAD	NT1600	NT1800	NT2000	NT2500	NT3000	NT4000	NT5000	NT6000	NT7000	REPAV 400	REPAV 450
Tamaño de abertura Aparente	ASTM D4751	mm (Tamiz)	0.180 (80)	0.150 (100)	0.150 (100)	0.125 (120)	0.125 (120)	0.090 (170)	0.090 (170)	0.090 (170)	0.090 (170)	N.A	N.A
Permeabilidad	ASTM D4491	cm/s	46x 10^{-2}	42x 10^{-2}	38 x 10^{-2}	38 x 10^{-2}	35 x 10^{-2}	28 x 10^{-2}	26 x 10^{-2}	22 x 10^{-2}	15 x 10^{-2}	N.A	N.A
Permitividad	ASTM D4491	s^{-1}	2.9	2.5	2.2	1.9	1.8	1.2	1.1	0.7	0.5	N.A	N.A
Tasa de flujo	ASTM D4491	l/min/m²	8109	6620	6120	5043	4890	3440	3160	2284	2060	N.A	N.A
Retención de asfalto	ASTM D6140	l/m^2	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1.0	1.0

PROPIEDADES FÍSICAS	NORMA	UNIDAD	NT1600	NT1800	NT2000	NT2500	NT3000	NT4000	NT5000	NT6000	NT7000	REPAV 400	REPAV 450
Espesor	ASTM D5199	mm	1.6	1.7	1.7	2.0	2.0	2.3	2.4	3.1	3.2	1.5	1.7
Resistencia UV @ 500 hr	ASTM D4355	%	>70	>70	>70	>70	>70	>70	>70	>70	>70	>70	>70
Punto de fusión	ASTM D276	ºC										150	150
Rollo ancho	Medido	m	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.8	3.8
Rollo largo	Medido	m	160	150	130	120	120	130	120	100	80	180	150
Rollo área	Calculado	m^2	560 • 608 • 640	525 • 570 • 600	455 • 494 • 520	420 • 456 • 480	420 • 456 • 480	455 • 494 • 520	420 • 456 • 480	350 • 380 • 400	280 • 304 • 320	684	570

FUNCIÓN DEL GEOTEXTIL	NT1600	NT1800	NT2000	NT2500	NT3000	NT4000	NT5000	NT6000	NT7000	REPAV 400	REPAV 450
Filtración	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Drenaje	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Protección	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Separación				√	√	√	√	√	√		
Estabilización						√	√	√	√		
Repavimentación										√	√

CONVENCIONES:

ASTM: American Society for Testing and Materials. • **N. A.:** No aplica.

Operamos bajo sistemas internacionales de control de calidad; Contamos con la acreditación **GAI LAP (The Geosynthetic Institute).**

PRESENTES EN TODA LATINOAMÉRICA

La presente ficha técnica está vigente a partir de abril de 2019. Nos reservamos el derecho de introducir las modificaciones de especificaciones que considere necesarias para garantizar la óptima calidad y funcionalidad de sus productos sin previo aviso. La información aquí contenida se ofrece gratis, es cierta y exacta a nuestro leal saber y entender; no obstante, todas las recomendaciones y sugerencias están hechas sin garantía, puesto que las condiciones de uso están fuera de nuestro control y es responsabilidad exclusiva del usuario. Por favor verificar los datos de esta especificación con el Departamento de Ingenieria para confirmar que la información esta vigente.

COLOMBIA: Bogotá • Tel.: (571) 782 5000 Exts: 1518 • ingenieriageosinteticos@wavin.com
PERÚ: Lima • Tels.: (511) 6276038 / 6276039 • geosperu@wavin.com
ARGENTINA: Buenos Aires • Tel.: (54 11) 4848-8484 • geosinteticos@wavin.com
www.pavcowavingeosinteticos.com

Geotextiles No Tejidos

Especificaciones Técnicas MARV

PROPIEDADES MECÁNICAS	NORMA	UNIDAD	NT1600	NT1800	NT2000	NT2500	NT3000	NT4000	NT5000	NT6000	NT7000	REPAV 400	REPAV 450
Método Grab													
Resistencia a la tensión	ASTM D4632	N (lb)	400 (90)	470 (106)	500 (113)	700 (158)	720 (162)	980 (221)	1165 (262)	1310 (295)	1530 (345)	470 (106)	550 (124)
Elongación		%	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Método CBR resistencia al punzonamiento	ASTM D6241	kN (lb)	1.1 (247)	1.3 (292)	1.5 (337)	1.9 (427)	2.1 (472)	2.8 (629)	3.3 (742)	4.0 (899)	4.6 (1034)	N.A.	N.A.
Resistencia al rasgado trapezoidal	ASTM D4533	N (lb)	164 (37)	190 (43)	210 (47)	260 (59)	295 (66)	350 (79)	400 (90)	470 (106)	570 (128)	180 (40)	230 (52)

PROPIEDADES HIDRÁULICAS	NORMA	UNIDAD	NT1600	NT1800	NT2000	NT2500	NT3000	NT4000	NT5000	NT6000	NT7000	REPAV 400	REPAV 450
Tamaño de abertura aparente	ASTM D4751	mm (Tamiz)	0.212 (70)	0.180 (80)	0.180 (80)	0.150 (100)	0.150 (100)	0.106 (140)	0.125 (120)	0.106 (140)	0.090 (170)	N.A.	N.A.
Permeabilidad	ASTM D4491	cm/s	27×10^{-2}	29×10^{-2}	25×10^{-2}	29×10^{-2}	27×10^{-2}	20×10^{-2}	22×10^{-2}	17×10^{-2}	12×10^{-2}	N.A.	N.A.
Permitividad	ASTM D4491	s^{-1}	2.1	2.1	1.7	1.7	1.5	1.0	1.0	0.6	0.4	N.A.	N.A.
Tasa de Flujo	ASTM D4491	l/min/m²	5800	6120	4750	4800	4400	2930	2700	1920	1200	N.A.	N.A.
Retención de asfalto	ASTM D6140	l/m^2	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0.9	1.0

PROPIEDADES FÍSICAS	NORMA	UNIDAD	NT1600	NT1800	NT2000	NT2500	NT3000	NT4000	NT5000	NT6000	NT7000	REPAV 400	REPAV 450
Espesor	ASTM D5199	mm	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.8	2.9	1.3	1.5
Resistencia UV @ 500 hr	ASTM D4355	%	>70	>70	>70	>70	>70	>70	>70	>70	>70	>70	>70
Punto de fusión	ASTM D276	ºC	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	150	150
Rollo ancho	Medido	m	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.5 • 3.8 • 4.0	3.8	3.8
Rollo largo	Medido	m	160	150	130	120	120	130	120	100	80	180	150
Rollo área	Calculado	m^2	560 • 608 • 640	525 • 570 • 600	455 • 494 • 520	420 • 456 • 480	420 • 456 • 480	455 • 494 • 520	420 • 456 • 480	350 • 380 • 400	280 • 304 • 320	684	570

FUNCIÓN DEL GEOTEXTIL	NT1600	NT1800	NT2000	NT2500	NT3000	NT4000	NT5000	NT6000	NT7000	REPAV 400	REPAV 450
Filtración	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Drenaje	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Protección	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Separación				√	√	√	√	√	√		
Estabilización						√	√	√	√		
Repavimentación										√	√

CONVENCIONES:

ASTM: American Society for Testing and Materials. • **N. A.:** No aplica.

Operamos bajo sistemas internacionales de control de calidad; Contamos con la acreditación **GAI LAP (The Geosynthetic Institute).**

PRESENTES EN TODA LATINOAMÉRICA

La presente ficha técnica está vigente a partir de abril de 2019. Nos reservamos el derecho de introducir las modificaciones de especificaciones que considere necesarias para garantizar la óptima calidad y funcionalidad de sus productos sin previo aviso. La información aquí contenida se ofrece gratis, es cierta y exacta a nuestro leal saber y entender; no obstante, todas las recomendaciones y sugerencias están hechas sin garantía, puesto que las condiciones de uso están fuera de nuestro control y es responsabilidad exclusiva del usuario. Por favor verificar los datos de esta especificación con el Departamento de Ingenieria para confirmar que la información esta vigente.

COLOMBIA: Bogotá • Tel.: (571) 782 5000 Exts: 1518 • ingenieriageosinteticos@wavin.com
PERÚ: Lima • Tels.: (511) 6276038 / 6276039 • geosperu@wavin.com
ARGENTINA: Buenos Aires • Tel.: (54 11) 4848-8484 • geosinteticos@wavin.com
www.pavcowavingeosinteticos.com

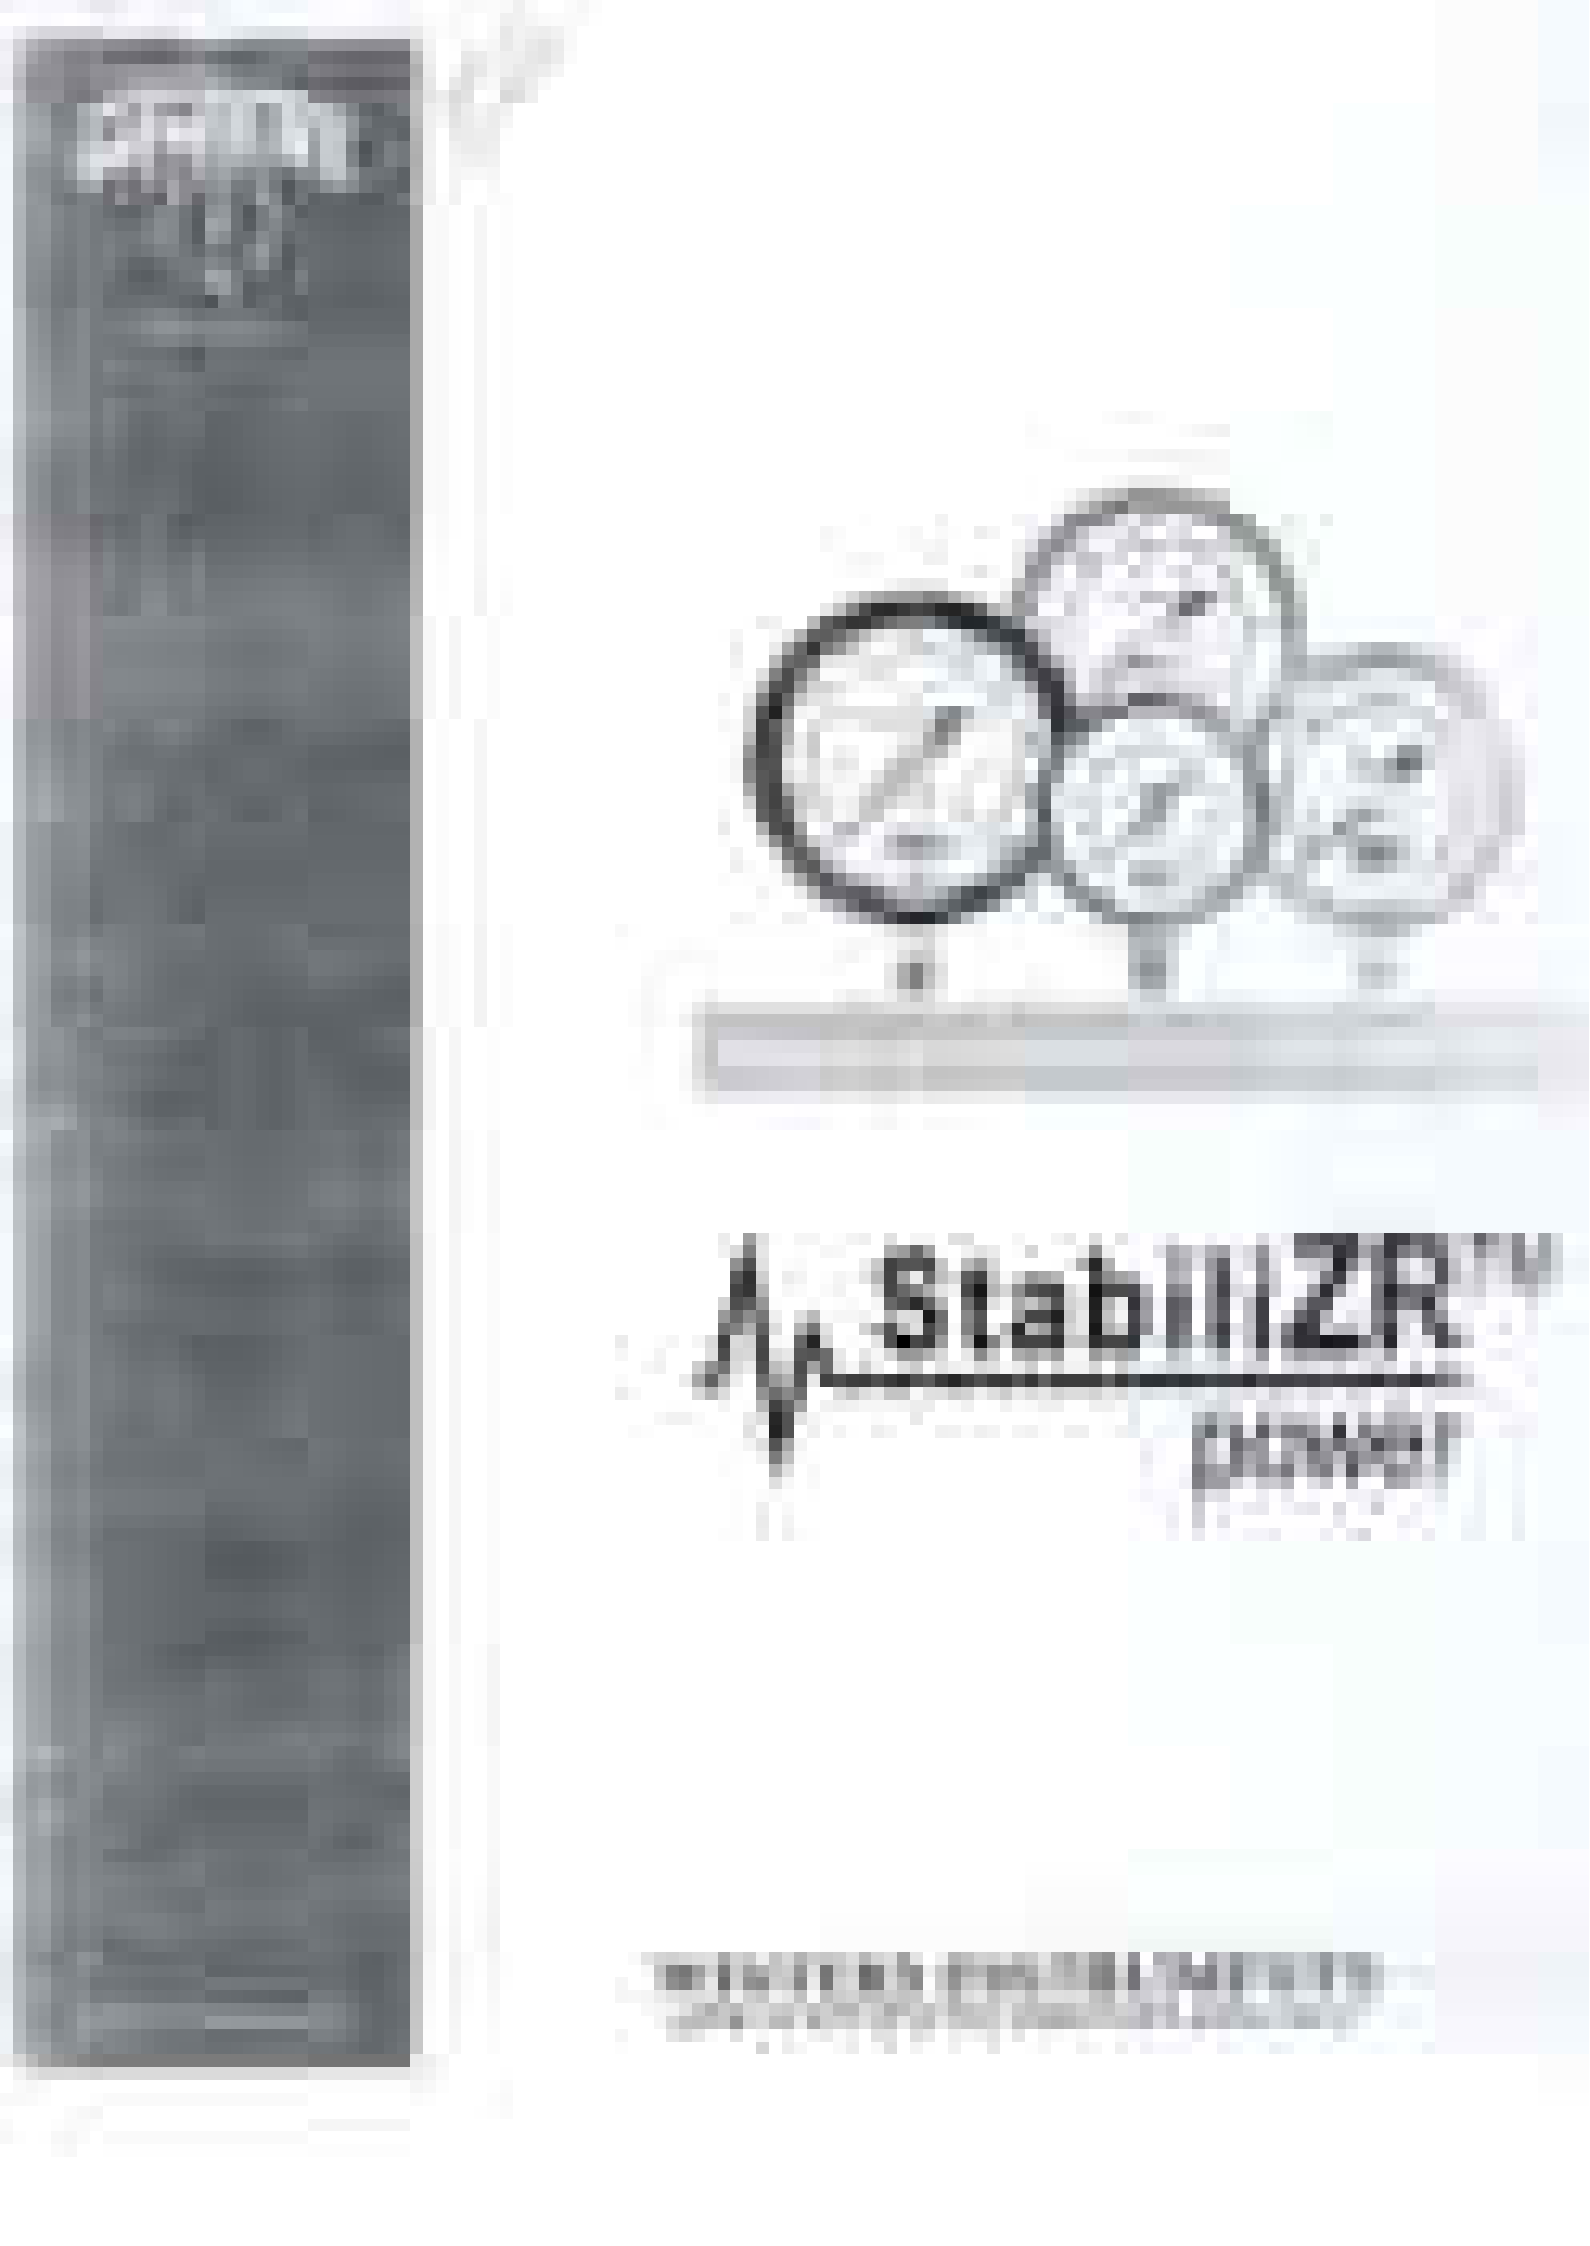
StabiliZR™
power

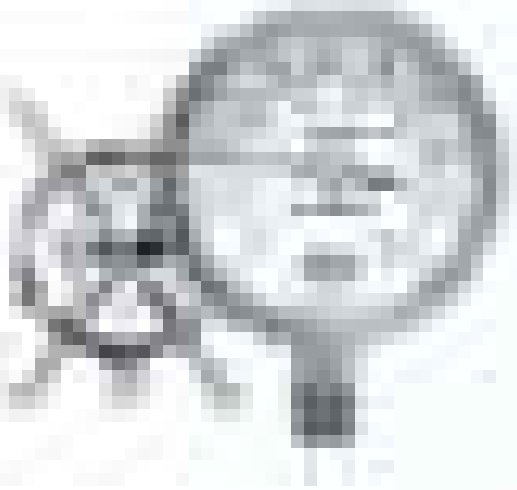

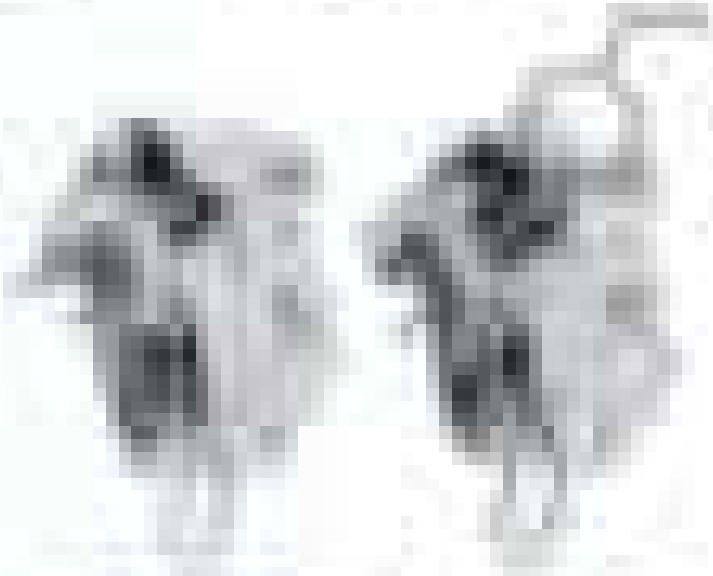

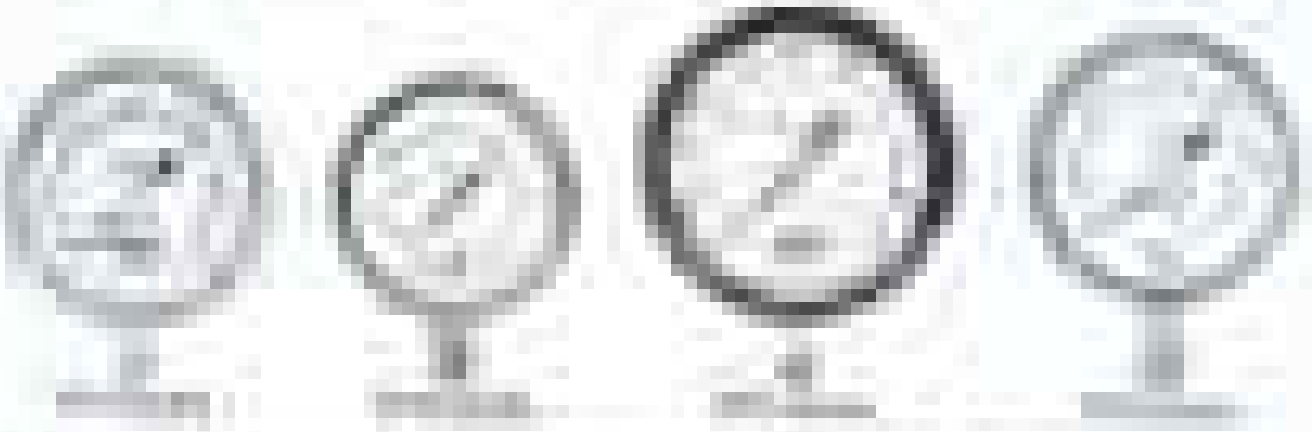

MORTEROS
TEQUENDAMA

SOMOS COLOMBIA • SOMOS COLOMBIA •

FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

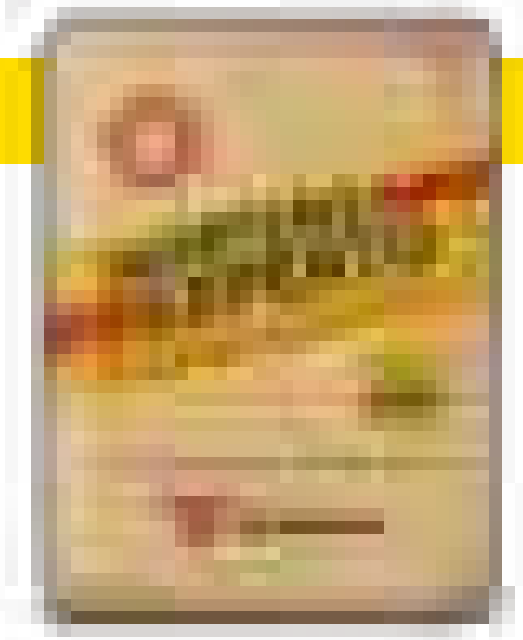

MORTERO SECO

MORTERO EXPERTO
TIPO N PEGA Y PAÑETE 75 kg/cm²

Cumplimiento de Normas:
• NTC 3356 • NTC 3546 • NSR 10

Datos Técnicos	Especificación
Densidad en estado fresco	1,9 (+/- 0,1) g/cm³
Fluidez	105-115 %
Contenido de aire	15 (+/-2) %
Retención de agua	75 %
Resistencia a la compresión a 28 días	75 Kg/cm²
Cantidad de agua - Para un saco de 40 kg	7,5+/-1 litros

Descripción:
Mezcla de cemento, arena y aditivos diseñado técnicamente para pegue de bloques, ladrillos o cualquier unidad de mampostería y para la instalación de pañetes en las paredes.

Ventajas:
- Se conoce la humedad de la arena en la elaboración del mortero.
- Control de calidad en los materiales y en las dosificaciones.
- No necesita utilizar aditivos.
- Mejores acabados.
- Control de inventarios.
- Acompañamiento técnico.

Usos:
Mortero para pega y pañete de muros no estructurales.

Presentación:
• Bolsa de 40 kg

Rendimiento:
Un saco de 40 kg equivale a 0,022 m³ (valor aproximado que corresponde a un dato teórico de pruebas realizadas en nuestra planta por lo cual puede variar según las condiciones y materiales propios de cada obra).

Preparación de la mezcla:
Agregue 7,5 +- 1 litros de agua potable por bulto. Vierta 3 litros del agua en un recipiente no absorbente, adicione los 40 kilos de MORTERO TEQUENDAMA PEGA Y PAÑETE 75 kg/cm² y comience la homogenización, con un muy buen mezclado, adicionando gradualmente el resto del agua hasta obtener la consistencia deseada, sin exceder el agua recomendada.

Recomendaciones:
- No exceder la dosis de agua recomendada, ya que esto ocasiona baja resistencia, fisuras y pérdida de adherencia.
- No mezclar con otros productos y/o aditivos ya que esto afecta la calidad del producto.
- Después de aplicado se debe regar con agua potable durante 7 días 3 veces al día.
- Utilice el producto antes de la fecha de vencimiento impresa en el empaque.

Nota: Seguir las instrucciones al respaldo del empaque.

Valor Agregado:
- Todos nuestros productos son fabricados con Cemento CERTIFICADO con sello de calidad Icontec NTC 121.
- Todos nuestros empaques cuentan con Sello Ambiental Colombiano.

Conservación:
- Conservar bajo techo, en lugar fresco seco y ventilado sobre estibas de madera o plástico, separado 10 cm del piso y paredes.
- No apile más de 10 sacos en altura.
- Una vez abierto el saco usar en el menor tiempo posible.

Precauciones:
- Este producto NO contiene sustancias nocivas o peligrosas.
- En caso de ser consumido de manera accidental acuda inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua, sin restregarse.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Este empaque está elaborado con papel para sacos, que cuenta con certificación Sello Ambiental Colombiano

MORTEROS TEQUENDAMA

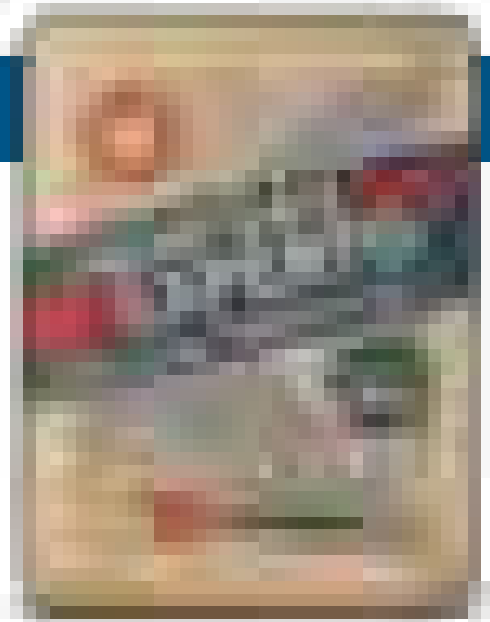

MORTERO SECO

MORTERO EXPERTO TIPO S PEGA Y PAÑETE 125 kg/cm²

Cumplimiento de Normas:
• NTC 3356 • NTC 3546 • NSR 10

Datos Técnicos	Especificación
Densidad en estado fresco	1,9 (+/- 0,1) g/cm³
Fluidez	110-120 %
Contenido de aire	15 (+/-2) %
Retención de agua	75 %
Resistencia a la compresión a 28 días	125 Kg/cm²
Cantidad de agua - Para un saco de 40 kg	7,5+/-1 litros

Descripción:

Mezcla de cemento, arena y aditivos diseñado técnicamente para pegue de bloques, ladrillos o cualquier unidad de mampostería y para la instalación de pañetes en las paredes.

Ventajas:

- Se conoce la humedad de la arena en la elaboración del mortero.
- Control de calidad en los materiales y en las dosificaciones.
- No necesita utilizar aditivos.
- Mejores acabados.
- Control de inventarios.
- Acompañamiento técnico.

Usos:

Mortero para pega y pañete de muros estructurales.

Presentación:

• Bolsa de 40 kg

Rendimiento:

Un saco de 40 kg equivale a 0,022 m³ (valor aproximado que corresponde a un dato teórico de pruebas realizadas en nuestra planta por lo cual puede variar según las condiciones y materiales propios de cada obra).

Preparación de la mezcla:

Agregue 7,5 +- 1 litros de agua potable por bulto. Vierta 3 litros del agua en un recipiente no absorbente, adicione los 40 kilos de MORTERO TEQUENDAMA PEGA Y PAÑETE 125 kg/cm² y comience la homogenización, con un muy buen mezclado, adicionando gradualmente el resto del agua hasta obtener la consistencia deseada, sin exceder el agua recomendada.

Recomendaciones:

- No exceder la dosis de agua recomendada, ya que esto ocasiona baja resistencia, fisuras y pérdida de adherencia.
- No mezclar con otros productos y/o aditivos ya que esto afecta la calidad del producto.
- Después de aplicado se debe regar con agua potable durante 7 días 3 veces al día.
- Utilice el producto antes de la fecha de vencimiento impresa en el empaque.

Nota: Seguir las instrucciones al respaldo del empaque.

Valor Agregado:

- Todos nuestros productos son fabricados con Cemento CERTIFICADO con sello de calidad Icontec NTC 121.
- Todos nuestros empaques cuentan con Sello Ambiental Colombiano.

Conservación:

- Conservar bajo techo, en lugar fresco seco y ventilado sobre estibas de madera o plástico, separado 10 cm del piso y paredes.
- No apile más de 10 sacos en altura.
- Una vez abierto el saco usar en el menor tiempo posible.

Precauciones:

- Este producto NO contiene sustancias nocivas o peligrosas.
- En caso de ser consumido de manera accidental acuda inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua, sin restregarse.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Este empaque está elaborado con papel para sacos, que cuenta con certificación Sello Ambiental Colombiano

MORTEROS TEQUENDAMA

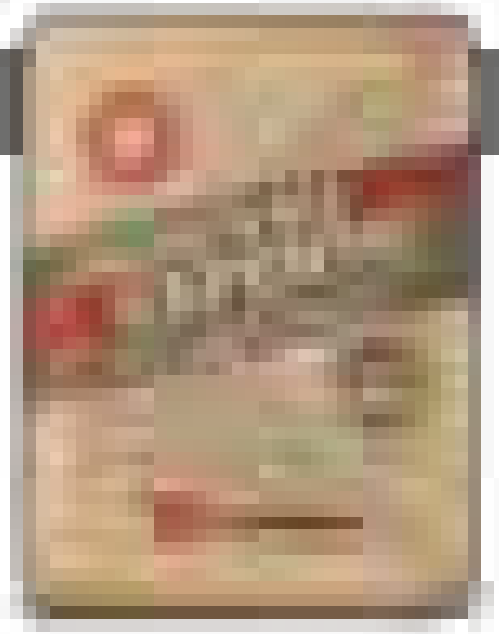

MORTERO SECO

MORTERO EXPERTO
TIPO S PISOS 125 kg/cm²

Cumplimiento de Normas:
• NTC 3356 • NTC 3546 • NSR 10

Datos Técnicos	Especificación
Densidad en estado fresco	1,9 (+/- 0,1) g/cm³
Fluidez	110-120 %
Contenido de aire	12 (+/-2) %
Retención de agua	75 %
Resistencia a la compresión a 28 días	125 Kg/cm²
Cantidad de agua - Para un saco de 40 kg	7,5+/-1 litros

Descripción:
Mezcla de cemento, arena y aditivos para la producción de pisos y contrapisos. Puede ser usado tanto en interiores como en exteriores.

Ventajas:
- Se conoce la humedad de la arena en la elaboración del mortero.
- Control de calidad en los materiales y en las dosificaciones.
- No necesita utilizar aditivos.
- Mejores acabados.
- Control de inventarios.
- Acompañamiento técnico.

Usos:
Mortero para alistamiento de pisos o nivelación de placas.

Presentación:
• Bolsa de 40 kg

Rendimiento:
Un saco de 40 kg equivale a 0,021 m³ (valor aproximado que corresponde a un dato teórico de pruebas realizadas en nuestra planta por lo cual puede variar según las condiciones y materiales propios de cada obra).

Preparación de la mezcla:
Agregue 7,5 +- 1 litros de agua potable por bulto. Vierta 3 litros del agua en un recipiente no absorbente, adicione los 40 kilos de MORTERO TEQUENDAMA PISO 125 kg/cm² y comience la homogenización, con un muy buen mezclado, adicionando gradualmente el resto del agua hasta obtener la consistencia deseada, sin exceder el agua recomendada.

Recomendaciones:
- No exceder la dosis de agua recomendada, ya que esto ocasiona baja resistencia, fisuras y pérdida de adherencia.
- No mezclar con otros productos y/o aditivos ya que esto afecta la calidad del producto.
- Después de aplicado se debe regar con agua potable durante 7 días 3 veces al día.
- Utilice el producto antes de la fecha de vencimiento impresa en el empaque.

Nota: Seguir las instrucciones al respaldo del empaque.

Valor Agregado:
- Todos nuestros productos son fabricados con Cemento CERTIFICADO con sello de calidad Icontec NTC 121.
- Todos nuestros empaques cuentan con Sello Ambiental Colombiano.

Conservación:
- Conservar bajo techo, en lugar fresco seco y ventilado sobre estibas de madera o plástico, separado 10 cm del piso y paredes.
- No apile más de 10 sacos en altura.
- Una vez abierto el saco usar en el menor tiempo posible.

Precauciones:
- Este producto NO contiene sustancias nocivas o peligrosas.
- En caso de ser consumido de manera accidental acuda inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua, sin restregarse.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Este empaque está elaborado con papel para sacos, que cuenta con certificación Sello Ambiental Colombiano

MORTEROS TEQUENDAMA

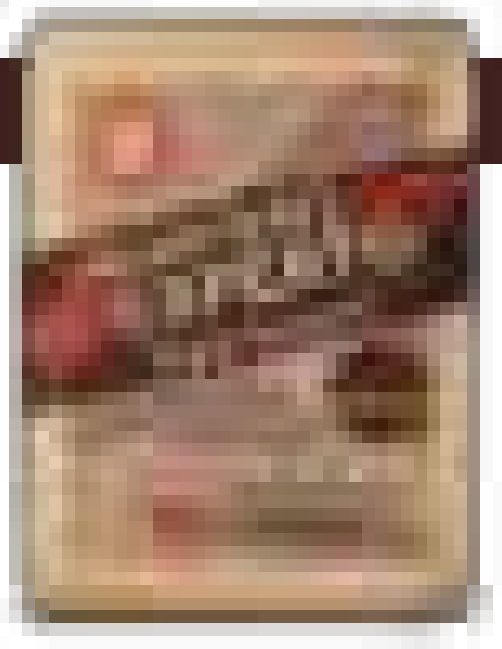

MORTERO SECO

MORTERO EXPERTO
PISOS 140 kg/cm²

Cumplimiento de Normas:
• NTC 3356 • NTC 3546 • NSR 10

Datos Técnicos	Especificación
Densidad en estado fresco	1,9 (+/- 0,1) g/cm³
Fluidez	110-120 %
Contenido de aire	12 (+/-2) %
Retención de agua	75 %
Resistencia a la compresión a 28 días	140 Kg/cm²
Cantidad de agua - Para un saco de 40 kg	7,5+/-1 litros

Descripción:
Mezcla de cemento, arena y aditivos para la producción de pisos y contrapisos. Puede ser usado tanto en interiores como en exteriores.

Ventajas:
- Se conoce la humedad de la arena en la elaboración del mortero.
- Control de calidad en los materiales y en las dosificaciones.
- No necesita utilizar aditivos.
- Mejores acabados.
- Control de inventarios.
- Acompañamiento técnico.

Usos:
Mortero para alistamiento de pisos o nivelación de placas.

Presentación:
• Bolsa de 40 kg

Rendimiento:
Un saco de 40 kg equivale a 0,022 m³ (valor aproximado que corresponde a un dato teórico de pruebas realizadas en nuestra planta por lo cual puede variar según las condiciones y materiales propios de cada obra).

Preparación de la mezcla:
Agregue 7,5 +- 1 litros de agua potable por bulto. Vierta 3 litros del agua en un recipiente no absorbente, adicione los 40 kilos de MORTERO TEQUENDAMA PISO 140 kg/cm² y comience la homogenización, con un muy buen mezclado, adicionando gradualmente el resto del agua hasta obtener la consistencia deseada, sin exceder el agua recomendada.

Recomendaciones:
- No exceder la dosis de agua recomendada, ya que esto ocasiona baja resistencia, fisuras y pérdida de adherencia.
- No mezclar con otros productos y/o aditivos ya que esto afecta la calidad del producto.
- Después de aplicado se debe regar con agua potable durante 7 días 3 veces al día.
- Utilice el producto antes de la fecha de vencimiento impresa en el empaque.

Nota: Seguir las instrucciones al respaldo del empaque.

Valor Agregado:
- Todos nuestros productos son fabricados con Cemento CERTIFICADO con sello de calidad Icontec NTC 121.
- Todos nuestros empaques cuentan con Sello Ambiental Colombiano.

Conservación:
- Conservar bajo techo, en lugar fresco seco y ventilado sobre estibas de madera o plástico, separado 10 cm del piso y paredes.
- No apile más de 10 sacos en altura.
- Una vez abierto el saco usar en el menor tiempo posible.

Precauciones:
- Este producto NO contiene sustancias nocivas o peligrosas.
- En caso de ser consumido de manera accidental acuda inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua, sin restregarse.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Este empaque está elaborado con papel para sacos, que cuenta con certificación Sello Ambiental Colombiano

MORTEROS TEQUENDAMA

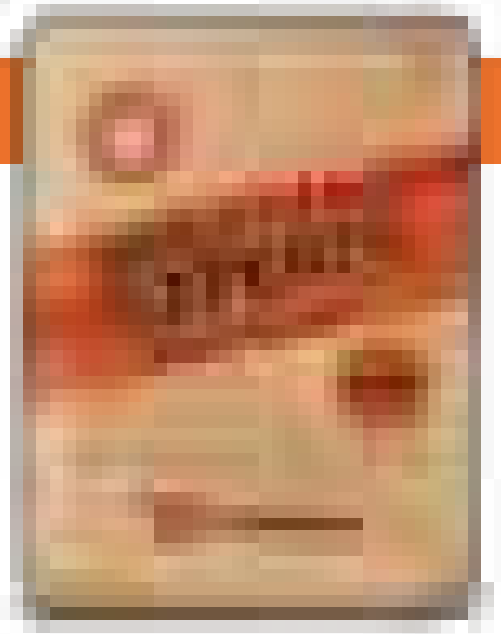

MORTERO SECO

GROUT EXPERTO
TIPO M 175 kg/cm²

Cumplimiento de Normas:
• NTC 4048 • NTC 3546 • NSR 10

Datos Técnicos	Especificación
Densidad en estado fresco	1,9 (+/- 0,1) g/cm³
Resistencia a la compresión a 28 días	175 Kg/cm²
Cantidad de agua - Para un saco de 40 kg	7,5+/-1 litros
Asentamiento	200-280 mm

Descripción:

Es una mezcla fluida con un diseño idóneo para ser aplicado en el relleno de dovelas, elaborado con materias primas de alta calidad. Cumpliendo con la norma **NTC 4048.**

Ventajas:

- Se conoce la humedad de la arena en la elaboración del mortero.
- Control de calidad en los materiales y en las dosificaciones.
- No necesita utilizar aditivos.
- Mejores acabados.
- Control de inventarios.
- Acompañamiento técnico.

Usos:

Llenado de celdas o dovelas en mampostería estructural.

Presentación:

• Bolsa de 40 kg

Rendimiento:

Un saco de 40 kg equivale a 0,020 m³ (valor aproximado que corresponde a un dato teórico de pruebas realizadas en nuestra planta por lo cual puede variar según las condiciones y materiales propios de cada obra).

Preparación de la mezcla:

Agregue 7,5 +- 1 litros de agua potable por bulto. Vierta 3 litros del agua en un recipiente no absorbente, adicione los 40 kilos de MORTERO TEQUENDAMA GROUT 175 kg/cm² y comience la homogenización, con un muy buen mezclado, adicionando gradualmente el resto del agua hasta obtener la consistencia deseada, sin exceder el agua recomendada.

Recomendaciones:

- No exceder la dosis de agua recomendada, ya que esto ocasiona baja resistencia, fisuras y pérdida de adherencia.
- No mezclar con otros productos y/o aditivos ya que esto afecta la calidad del producto.
- Utilice el producto antes de la fecha de vencimiento impresa en el empaque.

Nota: Seguir las instrucciones al respaldo del empaque.

Valor Agregado:

- Todos nuestros productos son fabricados con Cemento CERTIFICADO con sello de calidad Icontec NTC 121.
- Todos nuestros empaques cuentan con Sello Ambiental Colombiano.

Conservación:

- Conservar bajo techo, en lugar fresco seco y ventilado sobre estibas de madera o plástico, separado 10 cm del piso y paredes.
- No apile más de 10 sacos en altura.
- Una vez abierto el saco usar en el menor tiempo posible.

Precauciones:

- Este producto NO contiene sustancias nocivas o peligrosas.
- En caso de ser consumido de manera accidental acuda inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua, sin restregarse.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



Este empaque está elaborado con papel para sacos, que cuenta con certificación Sello Ambiental Colombiano

MORTEROS TEQUENDAMA

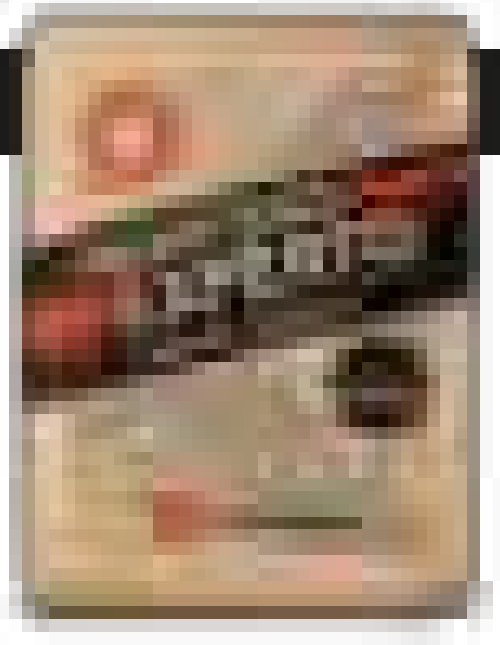

MORTERO SECO

MORTERO EXPERTO
TIPO M 175 kg/cm²
PISOS+PEGA Y PAÑETE

Cumplimiento de Normas:
• NTC 3356 • NTC 3546 • NSR 10

Datos Técnicos	Especificación
Densidad en estado fresco	1,9 (+/- 0,1) g/cm³
Fluidez	115-125 %
Contenido de aire	15 (+/-2) %
Retención de agua	75 %
Resistencia a la compresión a 28 días	175 Kg/cm²
Cantidad de agua - Para un saco de 40 kg	7,5+/-1 litros

Descripción:
Mezcla de cemento, arena y aditivos para la producción de pisos, contrapisos, pañetes y pega de ladrillos, bloques o cualquier unidad de mampostería.

Ventajas:
- Se conoce la humedad de la arena en la elaboración del mortero.
- Control de calidad en los materiales y en las dosificaciones.
- No necesita utilizar aditivos.
- Mejores acabados.
- Control de inventarios.
- Acompañamiento técnico.

Usos:
Mortero para pega y pañete de muros estructurales y nivelación de pisos.

Presentación:
• Bolsa de 40 kg

Rendimiento:
Un saco de 40 kg equivale a 0,022 m³ (valor aproximado que corresponde a un dato teórico de pruebas realizadas en nuestra planta por lo cual puede variar según las condiciones y materiales propios de cada obra).

Preparación de la mezcla:
Agregue 7,5 +- 1 litros de agua potable por bulto. Vierta 3 litros del agua en un recipiente no absorbente, adicione los 40 kilos de MORTERO TEQUENDAMA TIPO M 175 kg/cm² y comience la homogenización, con un muy buen mezclado, adicionando gradualmente el resto del agua hasta obtener la consistencia deseada, sin exceder el agua recomendada.

Recomendaciones:
- No exceder la dosis de agua recomendada, ya que esto ocasiona baja resistencia, fisuras y pérdida de adherencia.
- No mezclar con otros productos y/o aditivos ya que esto afecta la calidad del producto.
- Después de aplicado se debe regar con agua potable durante 7 días 3 veces al día.
- Utilice el producto antes de la fecha de vencimiento impresa en el empaque.

Nota: Seguir las instrucciones al respaldo del empaque.

Valor Agregado:
- Todos nuestros productos son fabricados con Cemento CERTIFICADO con sello de calidad Icontec NTC 121.
- Todos nuestros empaques cuentan con Sello Ambiental Colombiano.

Conservación:
- Conservar bajo techo, en lugar fresco seco y ventilado sobre estibas de madera o plástico, separado 10 cm del piso y paredes.
- No apile más de 10 sacos en altura.
- Una vez abierto el saco usar en el menor tiempo posible.

Precauciones:
- Este producto NO contiene sustancias nocivas o peligrosas.
- En caso de ser consumido de manera accidental acuda inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua, sin restregarse.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Este empaque está elaborado con papel para sacos, que cuenta con certificación Sello Ambiental Colombiano

MORTEROS TEQUENDAMA

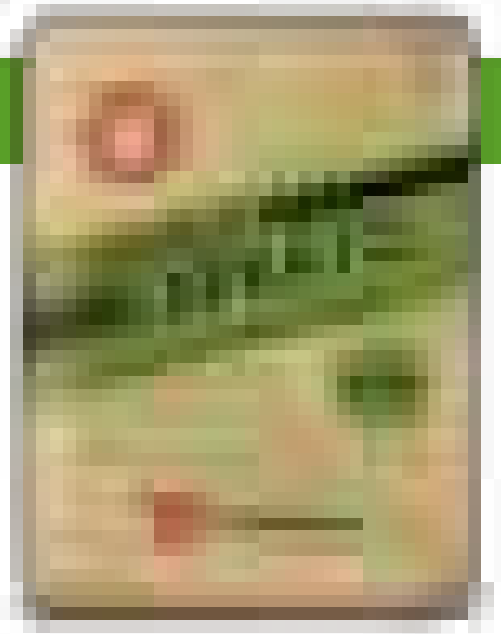

MORTERO SECO

GROUT EXPERTO
RELLENO DE CELDAS 125 kg/cm²

Cumplimiento de Normas:
• NTC 4048 • NTC 3546 • NSR 10

Datos Técnicos	Especificación
Densidad en estado fresco	2,0 (+/- 0,1) g/cm³
Resistencia a la compresión a 28 días	125 Kg/cm²
Cantidad de agua - Para un saco de 40 kg	7,5+/-1 litros
Asentamiento	200-280 mm

Descripción:

Es una mezcla fluida con una combinación de agregados gruesos con un diseño idóneo para ser aplicado en el relleno de celdas o dovelas en mampostería estructural, elaborado con materias primas de alta calidad. Cumpliendo con la norma **NTC 4048.**

Ventajas:

- Se conoce la humedad de la arena en la elaboración del mortero.
- Control de calidad en los materiales y en las dosificaciones.
- No necesita utilizar aditivos.
- Mejores acabados.
- Control de inventarios.
- Acompañamiento técnico.

Usos:

Llenado de celdas o dovelas en mampostería estructural.

Presentación:

• Bolsa de 40 kg

Rendimiento:

Un saco de 40 kg equivale a 0,020 m³ (valor aproximado que corresponde a un dato teórico de pruebas realizadas en nuestra planta por lo cual puede variar según las condiciones y materiales propios de cada obra).

Preparación de la mezcla:

Agregue 7,5 +- 1 litros de agua potable por bulto. Vierta 3 litros del agua en un recipiente no absorbente, adicione los 40 kilos de MORTERO TEQUENDAMA GROUT 125 kg/cm² y comience la homogenización, con un muy buen mezclado, adicionando gradualmente el resto del agua hasta obtener la consistencia deseada, sin exceder el agua recomendada.

Recomendaciones:

- No exceder la dosis de agua recomendada, ya que esto ocasiona baja resistencia, fisuras y pérdida de adherencia.
- No mezclar con otros productos y/o aditivos ya que esto afecta la calidad del producto.
- Utilice el producto antes de la fecha de vencimiento impresa en el empaque.

Nota: Seguir las instrucciones al respaldo del empaque.

Valor Agregado:

- Todos nuestros productos son fabricados con Cemento CERTIFICADO con sello de calidad Icontec NTC 121.
- Todos nuestros empaques cuentan con Sello Ambiental Colombiano.

Conservación:

- Conservar bajo techo, en lugar fresco seco y ventilado sobre estibas de madera o plástico, separado 10 cm del piso y paredes.
- No apile más de 10 sacos en altura.
- Una vez abierto el saco usar en el menor tiempo posible.

Precauciones:

- Este producto NO contiene sustancias nocivas o peligrosas.
- En caso de ser consumido de manera accidental acuda inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua, sin restregarse.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



Este empaque está elaborado con papel para sacos, que cuenta con certificación Sello Ambiental Colombiano

MORTEROS TEQUENDAMA

MORTEROS
TEQUENDAMA

SOMOS COLOMBIA • SOMOS COLOMBIA •

CONTÁCTANOS:

Tel. (571) 475 3251 - 475 3248
Dir. Calle 113 No. 7-45 Of. 708
Edificio Teleport Torre B
M. **ventas@morterostequendama.com**
W. **www.morterostequendama.com**

PAVCO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]







PAYCO

[redacted]





PAYCO



SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4200-33453
CERTIFICADO No. CRS17577
ORDEN CERT. No. CO-CERT210300219-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Eléctricos e Iluminación S.A.S.
Calle 79 B No. 42 F - 176, Barranquilla, Atlántico, Colombia

Certifica que el producto identificado como Tuberías y Accesorios EMT, importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Eléctricos e Iluminación S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

Resolución 90708 del 30 Agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía - por lo cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.
Numeral 20.6 CANALIZACIONES
Subnumeral 20.6.1 TUBOS O TUBERÍAS

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2021-04-06
Fecha de Vencimiento: 2024-04-06
Versión 1

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4200-33453
CERTIFICADO No. CRS17577
ORDEN CERT. No. CO-CERT210300219-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Eléctricos e Iluminación S.A.S.
Calle 79 B No. 42 F - 176, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Tuberías y Accesorios EMT
Fabricadas por Jinjiang Weiyecheng Metal Products Co., Ltd.
Wuli Industrial Zone, Jinjiang, Fujian, China

Referencia	Descripción	Diámetro	Espesor (Mm)	Longitud	Material
DK-1022	VUELTA EMT 2"	55.8 mm	1.65 mm	N/A mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1023	VUELTA EMT 3"	88.9 mm	1.82 mm	N/A mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1024	VUELTA EMT 4"	114.3 mm	2.1 mm	N/A mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1141	TUBO EMT 1/2"	17.93 mm	1.07 mm	3 mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1142	TUBO EMIT 3/4"	23.42 mm	1.24 mm	3 mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1143	TUBO EMT 1"	29.54 mm	1.45 mm	3 mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1144	TUBO EMT 1 1/4"	38.35 mm	1.65 mm	3 mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1145	TUBO EMT 1 1/2"	44.2 mm	1.65 mm	3 mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1146	TUBO EMT 2"	55.8 mm	1.65 mm	3 mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1147	TUBO EMT 3"	88.9 mm	1.83 mm	3 mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1148	TUBO EMT 4"	114.3 mm	2.11 mm	3 mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1232	CONECTOR EMT 4"	N/A	N/A	9.35 mm	ALUMINIO
DK-1249	UNION EMT 1/2"	N/A	N/A	38.3 mm	ALUMINIO
DK-1250	UNION EMT 3/4"	N/A	N/A	43 mm	ALUMINIO
DK-1251	UNION EMT 1"	N/A	N/A	51.8 mm	ALUMINIO
DK-1252	UNION EMT 1 1/4"	N/A	N/A	62 mm	ALUMINIO
DK-1253	UNION EMT 1 1/2"	N/A	N/A	72.8 mm	ALUMINIO
DK-1254	UNION EMT 2"	N/A	N/A	85.8 mm	ALUMINIO
DK-1255	UNION EMT 3"	N/A	N/A	114.2 mm	ALUMINIO
DK-1256	VUELTA EMT 1/2"	17.93 mm	1.06 mm	N/A mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1257	VUELTA EMT 3/4"	23.41 mm	1.24 mm	N/A mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1258	VUELTA EMT 1"	29.54 mm	1.44 mm	N/A mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1259	VUELTA EMT 1 1/4"	38.35 mm	1.65 mm	N/A mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1260	VUELTA EMT 1 1/2"	44.19 mm	1.65 mm	N/A mm	ACERO GALVANIZADO
DK-1261	CONECTOR EMT 1/2"	N/A	N/A	2.84 mm	ALUMINIO
DK-1262	CONECTOR EMT 3/4"	N/A	N/A	33 mm	ALUMINIO
DK-1263	CONECTOR EMT 1"	N/A	N/A	36.8 mm	ALUMINIO
DK-1264	CONECTOR EMT 1 1/4"	N/A	N/A	50 mm	ALUMINIO
DK-1265	CONECTOR EMT 1 1/2"	N/A	N/A	51.2 mm	ALUMINIO
DK-1266	CONECTOR EMT 2"	N/A	N/A	59.8 mm	ALUMINIO
DK-1267	CONECTOR EMT 3"	N/A	N/A	84.5 mm	ALUMINIO
DK-1392	UNION EMT 4"	N/A	N/A	130.2 mm	ALUMINIO

*****FIN DEL DOCUMENTO*****

Fecha de Emisión: 2021-04-06
Fecha de Vencimiento: 2024-04-06
Versión 1



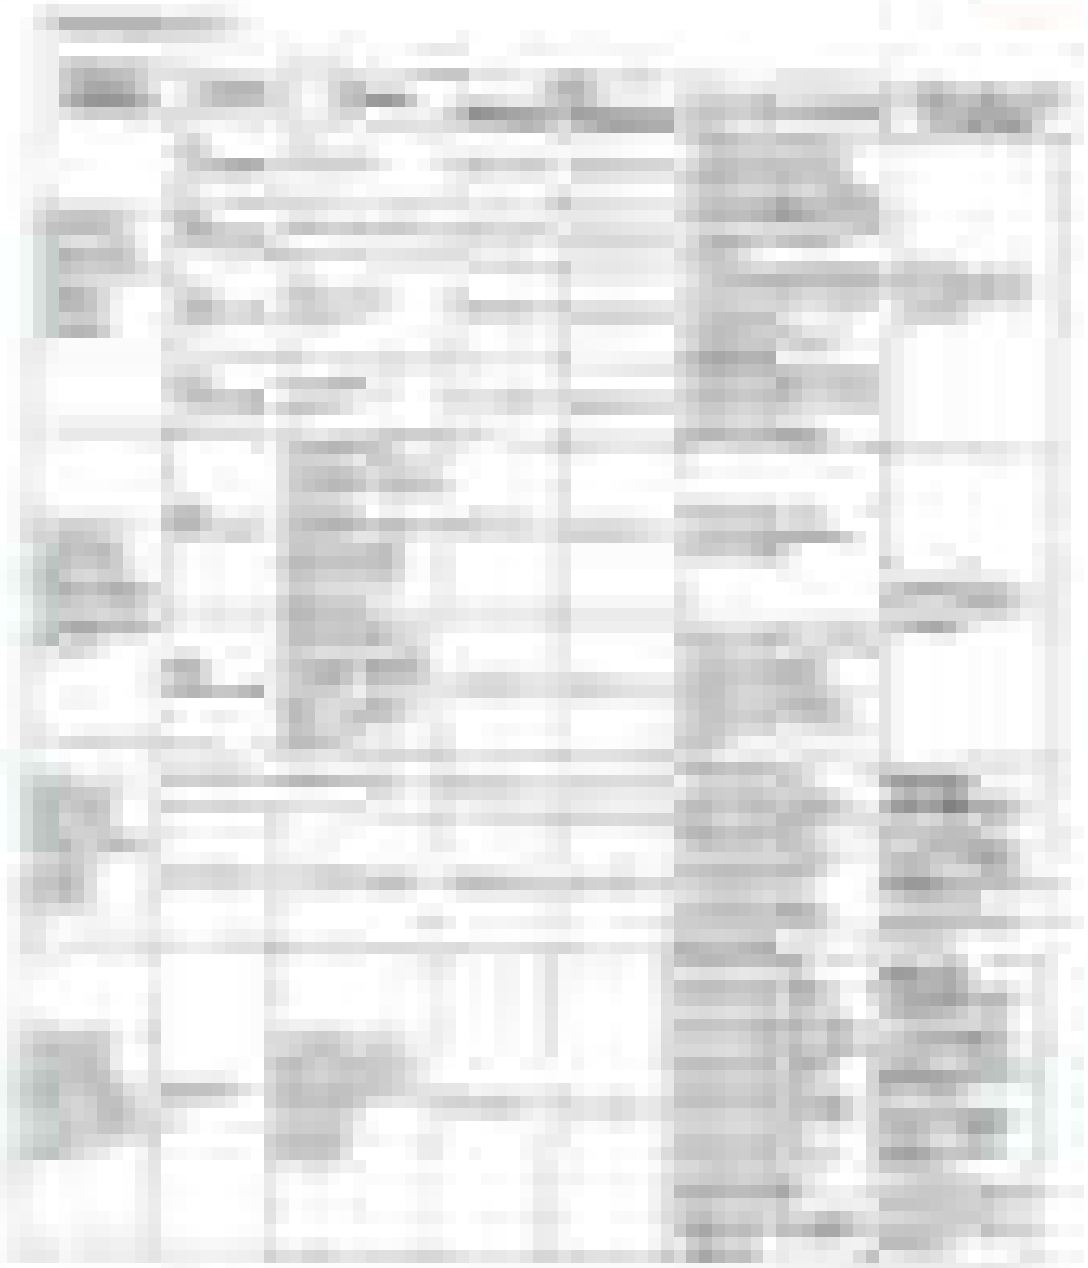



[redacted]

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 02000

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
VARILLA MACIZA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA	**ENTERA**	**CC-E de 12.7 a 25.4 mm x 2.40 m a 3.05 m (½" A 1" x 2.40 m a 3.05 m)**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

COBRES DE COLOMBIA S.A.S.

Carrera 40 No. 11-33 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 2206/2001 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 15.3)

Fecha de Certificación: 2005/10/28
Fecha de Renovación: 2023/07/18
Fecha de Vencimiento: 2026/07/17

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2024/07/17 y 2025/07/17

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2023.07.18 07:56:30 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety..

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02000

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2023/07/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/07/17

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE VARILLA MACIZA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

Tipo	Entera
Referencia	CC-E de 12.7 a 25.4 mm x 2.40 m a 3.05 m (½" A 1" x 2.40 m a 3.05 m)
Contenido de cobre (%)	> 80
Conductividad a 20°C % IACS	> 97.4
Dureza HRF	> 80
Resistencia a la tracción	> 18
Resistencia en cámara salina	1000 horas mínimo
Marcación	Las varillas de puesta a tierra llevarán la siguiente información: Razón social o marca del fabricante y sus dimensiones, dentro de los primeros 30 centímetros desde la parte superior
Referencial	NTC 2206/2001 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 15.3)

Nota: Este certificado se unifica con el 00140.

Fábrica	Planta
COBRES DE COLOMBIA S.A.S.	YUMBO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Rimorchio

Soacha, octubre 10 de 2023

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente nuestra Empresa **RUMARCO AGREGADOS Y TRANSPORTES S.A.S,** identificada con **NIT. 900.393.678 - 3, RUCOM No. 2020080317192,** Certifica que suministró y transporto para la empresa **EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS** con **NIT. 807.008.957 - 7**, la siguiente cantidad de material:

MATERIAL	CANTIDAD
RECEBO B - 400	300m3

Los materiales suministrados corresponden al mes de SEPTIEMBRE del presente año.

Atentamente,

MARCO AURELIO RUIZ
Gerente General
Cel. 321 234 75 68
e-mail: marco.ruiz@rumarcoagregados.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-1
REFERENCIA: 132-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 132-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416232	184	No especificado	Concreto	Bloque B N+3,75 muros M22-M23-M24	2023-08-4	2023-08-08	2023-09-1	28	152	18146	35	640,9	360,2	35,3	100,9	3	
416232	184	No especificado	Concreto	Bloque B N+3,75 muros M22-M23-M24	2023-08-4	2023-08-08	2023-09-1	28	152	18146	35	642,8	361,2	35,4	101,2	3	
416232	185	No especificado	Concreto	Bloque B N+3,75 muros M25-M26-M27	2023-08-4	2023-08-08	2023-09-1	28	152	18146	35	914,1	513,7	50,4	143,9	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-1
REFERENCIA: 132-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 132-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416232	185	No especificado	Concreto	Bloque B N+3,75 muros M25-M26-M27	2023-08-4	2023-08-08	2023-09-1	28	151	17908	35	918,8	523,2	51,3	146,6	5	
416237	192	No especificado	Concreto	Bloque A N-1,75 losa maciza (6a-6b)(A'-C')	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-1	14	152	18146	21	393,7	221,2	21,7	103,3	3	
416237	192	No especificado	Concreto	Bloque A N-1,75 losa maciza (6a-6b)(A'-C')	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-1	14	152	18146	21	388,1	218,1	21,4	101,8	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-1
REFERENCIA: 132-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 132-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416237	193	No especificado	Concreto	Bloque B N+0,00 - N+3,75 escalera principal	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-1	14	152	18146	21	499,8	280,9	27,5	131,2	5	
416237	193	No especificado	Concreto	Bloque B N+0,00 - N+3,75 escalera principal	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-1	14	151	17908	21	492,2	280,3	27,5	130,9	5	
416237	194	No especificado	Concreto	Bloque B N+3,75 columnas C'6;C6;6B;6A;6aA;6'C	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-1	14	152	18146	28	622,5	349,8	34,3	122,5	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-1
REFERENCIA: 132-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 132-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416237	194	No especificado	Concreto	Bloque B N+3,75 columnas C'6;C6;6B;6A;6aA;6'C	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-1	14	152	18146	28	618,9	347,8	34,1	121,8	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

concretos@concrelab.com

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-5
REFERENCIA: 133-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 133-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416238	195	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (D'-C) (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-1	7	152	18146	28	631	354,6	34,8	124,2	5	
416238	195	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (D'-C) (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-1	7	151	17908	28	635,9	362,1	35,5	126,8	5	
416238	196	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (C-B) (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-1	7	152	18146	28	436,6	245,4	24,1	85,9	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.09.05 16:43:00 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-5
REFERENCIA: 133-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 133-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416238	196	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (C-B) (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-1	7	151	17908	28	431,9	245,9	24,1	86,1	3	
416238	197	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (B-A') (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-1	7	152	18146	28	619,1	347,9	34,1	121,9	5	
416238	197	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (B-A') (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-1	7	151	17908	28	619,3	352,6	34,6	123,5	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-5
REFERENCIA: 133-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 133-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416238	1.Mort	No especificado	Mortero	Mortero pega sótano	2023-08-26	2023-08-28	2023-09-2	7	76	4536	17,5	97,9	220,1	21,6	123,3	5	
416238	1.Mort	No especificado	Mortero	Mortero pega sótano	2023-08-26	2023-08-28	2023-09-2	7	75	4418	17,5	96,6	223,0	21,9	124,9	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-5
REFERENCIA: 134-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 134-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	201	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(D'-C)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-4	3	151	17908	28	252,8	144,0	14,1	50,4	2	
416239	201	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(D'-C)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-4	3	152	18146	28	256,9	144,4	14,2	50,6	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.09.05 16:43:00 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-5
REFERENCIA: 134-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 134-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	202	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(C-B)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-4	3	151	17908	28	334,6	190,5	18,7	66,7	3	
416239	202	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(C-B)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-4	3	152	18146	28	337,1	189,4	18,6	66,3	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-5
REFERENCIA: 134-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 134-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	203	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(B-A')	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-4	3	151	17908	28	423,3	241,0	23,6	84,4	5	
416239	203	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(B-A')	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-4	3	152	18146	28	426,5	239,7	23,5	83,9	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-7
REFERENCIA: 135-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 135-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	198	No especificado	Concreto	Bloque A N + 6,10 Escalera auxiliar	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-6	7	151	17908	21	331,8	188,9	18,5	88,2	5	
416239	198	No especificado	Concreto	Bloque A N + 6,10 Escalera auxiliar	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-6	7	152	18146	21	325,6	183,0	17,9	85,4	5	
416239	199	No especificado	Concreto	Bloque B N - 1,75 Zarpa E(6A-6) D (6A-6)	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-6	7	151	17908	35	508,4	289,5	28,4	81,1	3	
416239	199	No especificado	Concreto	Bloque B N - 1,75 Zarpa E(6A-6) D (6A-6)	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-6	7	152	18146	35	505,7	284,2	27,9	79,6	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.09.07 10:28:04 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-7
REFERENCIA: 135-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 135-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	200	No especificado	Concreto	Bloque A N - 1,75 Zarpa A'(6A-6B)	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-6	7	151	17908	35	331,7	188,9	18,5	52,9	2	Bajo a 7 días.
416239	200	No especificado	Concreto	Bloque A N - 1,75 Zarpa A'(6A-6B)	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-6	7	152	18146	35	328,4	184,5	18,1	51,7	2	Bajo a 7 días.

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-8
REFERENCIA: 136-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 136-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416233	186	No especificado	Concreto	Columnas bloque B N+3,75 (5 a D)(3D)(3a D)	2023-08-10	2023-08-14	2023-09-7	28	152	18146	35	718	403,5	39,6	113,1	3	
416233	186	No especificado	Concreto	Columnas bloque B N+3,75 (5 a D)(3D)(3a D)	2023-08-10	2023-08-14	2023-09-7	28	151	17908	35	712,4	405,7	39,8	113,7	3	
416233	187	No especificado	Concreto	Escalera bloque A principal N+1,85-6,10 escalera auxiliar N+1,85-6,10	2023-08-10	2023-08-14	2023-09-7	28	152	18146	21	499	280,4	27,5	130,9	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-8
REFERENCIA: 136-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 136-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416233	187	No especificado	Concreto	Escalera bloque A principal N+1,85-6,10 escalera auxiliar N+1,85-6,10	2023-08-10	2023-08-14	2023-09-7	28	151	17908	21	502,4	286,1	28,1	133,6	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-11
REFERENCIA: 137-20747
DIGITÓ: Srodriguez
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 137-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416238	195	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (D'-C) (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-8	14	152	18146	28	695,4	390,8	38,3	136,9	5	
416238	195	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (D'-C) (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-8	14	151	17908	28	690,4	393,1	38,6	137,7	5	
416238	196	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (C-B) (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-8	14	152	18146	28	482,6	271,2	26,6	95,0	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.09.12 09:17:07 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-11
REFERENCIA: 137-20747
DIGITÓ: Srodriguez
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 137-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416238	196	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (C-B) (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-8	14	151	17908	28	490,1	279,1	27,4	97,7	3	
416238	1.Mort	No especificado	Mortero	Mortero pega sótano	2023-08-26	2023-08-28	2023-09-9	14	76	4536	17,5	112,4	252,7	24,8	141,6	5	
416238	1.Mort	No especificado	Mortero	Mortero pega sótano	2023-08-26	2023-08-28	2023-09-9	14	75	4418	17,5	110,5	255,1	25,0	142,9	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-12
REFERENCIA: 138-20747
DIGITÓ: Jramirez
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 138-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416238	197	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (B-A') (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-8	14	152	18146	28	662,4	372,2	36,5	130,4	2	
416238	197	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 Losa entrepiso (B-A') (2-3+1/3)	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-8	14	151	17908	28	668,3	380,5	37,3	133,3	2	
416239	201	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(D'-C)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-8	7	151	17908	28	436,2	248,4	24,4	87,0	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.09.12 15:59:19 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-12
REFERENCIA: 138-20747
DIGITÓ: Jramirez
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 138-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	201	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(D'-C)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-8	7	152	18146	28	430,4	241,9	23,7	84,7	5	
416239	202	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(C-B)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-8	7	151	17908	28	449,8	256,1	25,1	89,7	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-12
REFERENCIA: 138-20747
DIGITÓ: Jramirez
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 138-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	202	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(C-B)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-8	7	152	18146	28	443,1	249,0	24,4	87,2	2	
416239	203	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(B-A')	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-8	7	151	17908	28	440,3	250,7	24,6	87,8	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-12
REFERENCIA: 138-20747
DIGITÓ: Jramirez
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 138-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	203	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(B-A')	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-8	7	152	18146	28	443,5	249,2	24,4	87,3	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-12
REFERENCIA: 139-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 139-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416240	204	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (A'-B')	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-12	3	152	18146	28	521,1	292,8	28,7	102,6	3	
416240	204	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (A'-B')	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-12	3	151	17908	28	525,7	299,3	29,4	104,8	3	
416240	205	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (B'-C)	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-12	3	151	17908	28	520,1	296,2	29,0	103,7	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.09.12 16:29:29 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-12
REFERENCIA: 139-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 139-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416240	205	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (B'-C)	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-12	3	152	18146	28	524,8	294,9	28,9	103,3	5	
416240	206	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (C-D')	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-12	3	151	17908	28	523,3	298,0	29,2	104,4	3	
416240	206	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (C-D')	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-12	3	152	18146	28	526,9	296,1	29,0	103,7	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-14
REFERENCIA: 140-20747
DIGITÓ: Nicorio
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 140-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	198	No especificado	Concreto	Bloque A N + 6,10 Escalera auxiliar	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-13	14	152	18146	21	373	209,6	20,6	97,9	2	
416239	198	No especificado	Concreto	Bloque A N + 6,10 Escalera auxiliar	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-13	14	151	17908	21	370,4	210,9	20,7	98,5	5	
416239	199	No especificado	Concreto	Bloque B N - 1,75 Zarpa E(6A-6) D (6A-6)	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-13	14	151	17908	35	578,4	329,4	32,3	92,3	2	
416239	199	No especificado	Concreto	Bloque B N - 1,75 Zarpa E(6A-6) D (6A-6)	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-13	14	152	18146	35	582,6	327,4	32,1	91,7	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.09.14 17:06:17 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-14
REFERENCIA: 140-20747
DIGITÓ: Nicorio
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 140-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	200	No especificado	Concreto	Bloque A N - 1,75 Zarpa A'(6A-6B)	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-13	14	151	17908	35	394,2	224,5	22,0	62,9	2	Bajo a 14 días.
416239	200	No especificado	Concreto	Bloque A N - 1,75 Zarpa A'(6A-6B)	2023-08-30	2023-09-04	2023-09-13	14	152	18146	35	398	223,7	21,9	62,7	2	Bajo a 14 días.

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-15
REFERENCIA: 141-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 141-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416237	192	No especificado	Concreto	Bloque A N-1,75 losa maciza (6a-6b)(A'-C')	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-15	28	151	17908	21	431,8	245,9	24,1	114,8	3	
416237	192	No especificado	Concreto	Bloque A N-1,75 losa maciza (6a-6b)(A'-C')	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-15	28	152	18146	21	436,2	245,1	24,0	114,5	3	
416239	203	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(B-A')	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-15	14	151	17908	28	495,6	282,2	27,7	98,8	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.09.15 16:25:15 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-15
REFERENCIA: 141-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 141-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	203	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(B-A')	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-15	14	152	18146	28	501,3	281,7	27,6	98,7	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-19
REFERENCIA: 142-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 142-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416237	193	No especificado	Concreto	Bloque B N+0,00 - N+3,75 escalera principal	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-15	28	152	18146	21	542	304,6	29,9	142,2	5	
416237	193	No especificado	Concreto	Bloque B N+0,00 - N+3,75 escalera principal	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-15	28	152	18146	21	538,4	302,6	29,7	141,3	5	
416237	194	No especificado	Concreto	Bloque B N+3,75 columnas C'6;C6;6B;6A;6aA;6'C	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-15	28	152	18146	28	648,1	364,2	35,7	127,6	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.09.19 13:45:02 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-19
REFERENCIA: 142-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 142-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416237	194	No especificado	Concreto	Bloque B N+3,75 columnas C'6;C6;6B;6A;6aA;6'C	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-15	28	151	17908	28	653	371,8	36,5	130,2	5	
416239	201	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(D'-C)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-15	14	151	17908	28	500,7	285,1	28,0	99,9	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-19
REFERENCIA: 142-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 142-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	201	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(D'-C)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-15	14	152	18146	28	492,6	276,8	27,1	97,0	3	
416239	202	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(C-B)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-15	14	151	17908	28	492,4	280,4	27,5	98,2	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-19
REFERENCIA: 142-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 142-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416239	202	No especificado	Concreto	Bloque B N + 8,70 Losa entrepiso (3+1/3 - 5A+1/3)(C-B)	2023-09-1	2023-09-04	2023-09-15	14	152	18146	28	498	279,9	27,4	98,0	5	
416240	204	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (A'-B')	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-16	7	152	18146	28	586,8	329,8	32,3	115,5	5	
416240	204	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (A'-B')	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-16	7	151	17908	28	593,4	337,9	33,1	118,3	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-19
REFERENCIA: 142-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 142-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416240	205	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (B'-C)	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-16	7	152	18146	28	582,8	327,5	32,1	114,7	3	
416240	205	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (B'-C)	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-16	7	151	17908	28	588,3	335,0	32,9	117,3	3	
416240	206	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (C-D')	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-16	7	152	18146	28	589,8	331,4	32,5	116,1	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-19
REFERENCIA: 142-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 142-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
416240	206	No especificado	Concreto	Losa de entrepiso N+ 8,70 Ed- B ejes 5a +2/3-6a (C-D')	2023-09-9	2023-09-11	2023-09-16	7	151	17908	28	580,2	330,4	32,4	115,7	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-19
REFERENCIA: 143-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 143-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
425561	207	No especificado	Concreto	Bloque B N- 1,7J muro fachada E (6A-6) muro M53 D (6A-6) M53 A' (6B-6A)	2023-09-12	2023-09-16	2023-09-19	7	152	18146	35	580,1	326,0	32,0	91,3	5	
425561	207	No especificado	Concreto	Bloque B N- 1,7J muro fachada E (6A-6) muro M53 D (6A-6) M53 A' (6B-6A)	2023-09-12	2023-09-16	2023-09-19	7	151	17908	35	584,7	332,9	32,7	93,3	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.09.19 13:45:02 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-19
REFERENCIA: 143-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 143-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
425561	208	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 columnas C3; A3; B3; muros punto fijo M22; M23; M24; M25; M26;M27	2023-09-12	2023-09-16	2023-09-19	7	152	18146	35	577,6	324,6	31,8	90,9	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-19
REFERENCIA: 143-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 143-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
425561	208	No especificado	Concreto	Bloque B N+ 8,70 columnas C3; A3; B3; muros punto fijo M22; M23; M24; M25; M26;M27	2023-09-12	2023-09-16	2023-09-19	7	152	18146	35	574,2	322,7	31,6	90,4	3	
425561	209	No especificado	Concreto	Bloque B escalera principal N+ 3,75 – N+ 8,70 escalera parqueadero N- 3,60 N- 1,75	2023-09-12	2023-09-16	2023-09-19	7	152	18146	21	257,7	144,8	14,2	67,6	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-19
REFERENCIA: 143-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 143-20747

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
425561	209	No especificado	Concreto	Bloque B escalera principal N+ 3,75 – N+ 8,70 escalera parqueadero N- 3,60 N- 1,75	2023-09-12	2023-09-16	2023-09-19	7	151	17908	21	254,3	144,8	14,2	67,6	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida).
INV E 164:2013

CLIENTE:	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
CÓDIGO DE OBRA:	20747
OBRA:	COLEGIO BOITA
DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:	CL 45 SUR 72 Q 20
DIRIGIDO A:	ING. EDISON ROJAS
SITIO DE ENSAYO:	ENSAYO EN CAMPO
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2023-09-05
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2023-09-11
ENSAYO EJECUTADO POR:	J. VASQUEZ
ORDEN DE TRABAJO N°:	60881 - OV 101341
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (02)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

AUTORIZADO POR:

Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2023.09.12 10:02:36 -05'00'

LAURA LILIANA CUERVO G.
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida). INV E 164:2013

CLIENTE:	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	**FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:**	2023-09-05	**NÚMERO DE INFORME:**	**DGP -4527-23-1**
OBRA:	COLEGIO BOITA - 20747	**FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:**	2023-09-11	**PÁGINAS:**	**2 DE 2**

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL ENSAYO					
Marca:	HUMBOLDT	**Modelo:**	5001 C	**N° de serie:**	2173
CONTEO ESTÁNDAR					
Humedad:	458	**Densidad:**	2396		

*** Tipo de material**	*** Densidad máxima de laboratorio kg/m³**
B - 400	**2102**

Ensayo No.	Tipo de Material	Localización	Método		Profundidad cm	Humedad %	Masa unitaria húmeda kg/m³	Masa unitaria seca kg/m³	Porcentaje de compactación %	Esquema de localización
			RD	TD						
1	B - 400	A' 1 - 6A		X	20	6,4	2120	1992	94,8	
2	B - 400	A' 1 - 6A RETOMA		X	20	5,4	1998	1896	90,2	
3	B - 400	A' 1 - 6A RETOMA		X	20	8,0	2134	1976	94,0	
4	B - 400	EJE 11 ENTRE A' Y E		X	20	8,0	2159	1999	95,1	
5	B - 400	EJE E ENTRE 11 Y 6B		X	20	5,8	2021	1910	90,9	
6	B - 400	EJE E ENTRE 11 Y 6B		X	20	7,3	2024	1886	89,7	

RD: Retrodispersión, **TD**:Transmisión directa

La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Digitó: K. MERCADO

OBSERVACIONES:

EL PESO UNITARIO SECO MÁXIMO DE LABORATORIO FUE SUMINISTRADO POR LA COMPAÑÍA CONTRATANTE.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida). INV E 164:2013

NÚMERO DE INFORME: **DGP -4655-23-1**

CLIENTE:	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
CÓDIGO DE OBRA:	20747
OBRA:	COLEGIO BOITA
DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:	CL 45 SUR 72 Q 20
DIRIGIDO A:	ING. EDISON ROJAS
SITIO DE ENSAYO:	ENSAYO EN CAMPO
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2023-09-14
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2023-09-18
ENSAYO EJECUTADO POR:	A. TORRES
ORDEN DE TRABAJO N°:	58992 - OV 101926
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (02)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

AUTORIZADO POR:

Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2023.09.20 14:25:56 -05'00'

LAURA LILIANA CUERVO G.
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida). INV E 164:2013

CLIENTE:	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	**FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:**	2023-09-14	**NÚMERO DE INFORME:**	**DGP -4655-23-1**
OBRA:	COLEGIO BOITA - 20747	**FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:**	2023-09-18	**PÁGINAS:**	**2 DE 2**

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL ENSAYO					
Marca:	HUMBOLDT	**Modelo:**	5001 C	**N° de serie:**	4881
CONTEO ESTÁNDAR					
Humedad:	493	**Densidad:**	3310		

* Tipo de material	* Densidad máxima de laboratorio kg/m³
B - 400	**2102**

Ensayo No.	Tipo de Material	Localización	Método		Profundidad cm	Humedad %	Masa unitaria húmeda kg/m³	Masa unitaria seca kg/m³	Porcentaje de compactación %	Esquema de localización
			RD	TD						
1	B - 400	EJE E / 6 A - 11		X	20	6,7	2119	1986	94,5	
2	B - 400	EJE E / 6 A - 11		X	20	8,3	2158	1993	94,8	
3	B - 400	RAMPA VEHICULAR		X	20	7,7	2087	1938	92,2	
4	B - 400	RAMPA VEHICULAR		X	20	8,1	2119	1960	93,3	
5	B - 400	RAMPA VEHICULAR		X	20	5,1	1889	1797	85,5	

RD: Retrodispersión, **TD**:Transmisión directa

La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Digitó: K. MERCADO

OBSERVACIONES:

EL PESO UNITARIO SECO MÁXIMO DE LABORATORIO FUE SUMINISTRADO POR LA COMPAÑÍA CONTRATANTE.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

ANEXO 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ANEXO 4.

PMT COI PLANOS 2023

COI No. 11
MARZO 16 DE 2023
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
12234	19007372	N/A	CL 66BIS SUR DG 65A SUR	CL 66BIS SUR KR 18T	DOPPELMAYR COLOMBIA S.A.S.	2-abr-23	3-abr-23	DESDE LAS 18:00 HORAS DEL 02-ABR-23 HASTA LAS 05:00 HORAS DEL 3-ABR-22	DESDE LAS 18:00 HORAS DEL 02-ABR-23 HASTA LAS 05:00 HORAS DEL 3-ABR-22	TM-1645-2022	NOTA: 1. SE DEBEN DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO Y/O RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCION DE BUSES DE TRANSMILENIO S.A. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN EL MOBILIARIO URBANO O SEÑALIZACION VERTICAL SITUADA EN LA ZONA, EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE SU RESTITUCION. 4. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 5. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD A TODOS LOS ACTORES VIALES Y RESIDENTES DEL SECTOR 6. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYA LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES PARQUEO TEMPORAL DE VEHICULOS PESADOS PARA MANTENIMIENTO DE LA TORRE 10 DEL SISTEMA DE TRANSMICABLE. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN NI EN CALZADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. ASIMISMO, DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	CIUDAD BOLIVAR	DIEGO A. TORO C.	20236120105698 2
12235	8010734	N/A	KR 72QBIS 60m AL SUR DE LA CL 43A SUR	KR 72QBIS 20m AL SUR DE LA CL 43A SUR	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	18-mar-23	4-ene-24	05:00-22:00	05:00-22:00	PRIVADO	NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2).PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3).EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE BAHIA DEL COSTADO ORIENTE PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA Y PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS DEL PROYECTO "COLEGIO BOITA", DE CONFORMIDAD AL PLANO 1 PRESENTADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO, SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (2) VEHICULOS DE OBRA (SI ESTOS CABEN DENTRO DE LA ZONA AUTORIZADA, SIN AFECTAR INGRESO A PREDIOS O BOCACALLES). GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m . DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. NO SE AUTORIZA FORMACION DE COLAS DE VEHICULOS SOBRE LA VIA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS SE DEBEN DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS INICIALMENTE Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LAS MISMAS.	SI	KENNEDY	ANGIE M. CUAICAL T.	20236120097614 2

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

COI No. 11
MARZO 16 DE 2023
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
12236	8010421	N/A	CL 43 SUR KR 72QBIS	CL 43 SUR KR 72Q	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	18-mar-23	4-ene-24	05:00-22:00	05:00-22:00	PRIVADO	NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2).PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3).EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR, PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO "COLEGIO BOITA" Y DE CONFORMIDAD AL PLANO 2 PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL VEHICULAR LIBRE DE MINIMO DE 3,50m. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (2) VEHICULOS DE OBRA (SI ESTOS CABEN DENTRO DE LA ZONA AUTORIZADA, SIN AFECTAR INGRESO A PREDIOS O BOCACALLES). DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.	SI	KENNEDY	ANGIE M. CUAICAL T.	20236120097614 2
12237	8010658	8010785	KR 72Q CL 43 SUR	KR 72Q CL 45 SUR	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	18-mar-23	4-ene-24	05:00-22:00	05:00-22:00	PRIVADO	NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2).PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3).EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA Y PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS DEL PROYECTO "COLEGIO BOITA", DE CONFORMIDAD AL PLANO 3 PRESENTADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO, SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO TRES (3) VEHICULOS DE OBRA (SI ESTOS CABEN DENTRO DE LA ZONA AUTORIZADA, SIN AFECTAR INGRESO A PREDIOS O BOCACALLES). GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL.. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m . DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. NO SE AUTORIZA FORMACION DE COLAS DE VEHICULOS SOBRE LA VIA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS SE DEBEN DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS INICIALMENTE Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LAS MISMAS.	SI	KENNEDY	ANGIE M. CUAICAL T.	20236120097614 2
12238	2001297	N/A	CL 68 No 4A 77	N/A	FUENTTES S.A.S.	17-mar-23	14-mar-24	06:00-19:00	06:00-19:00	PRIVADO	NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. PREVIO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, SE DEBERA REALIZAR EL RETIRO DE TACHONES PARA GARANTIZAR EL TRANSITO ACORDE A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS CUALES DEBEN SER RESTITUIDOS EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS INICIALMENTE CONFORME AL ACTA DE COMPROMISO QUE HACE PARTE DEL PMT LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE PARQUE TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA, ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA Y ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR INHERENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA EN LA CL 69 No 4A 77. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m MIN COMODO Y SEGURO PARA SU USO, DEBIDAMENTE PROTEGIDO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES, NI GENERAR ZONAS DE ACOPIO FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.	SI	CHAPINERO	ANGELA M. CIFUENTES R.	20236120106204 2
12239	N/A	N/A	VARIOS CHAPINERO	N/A	GRUPO EMPRESARIAL GRODCO	-	-	-	-	IDU-1299-2020	LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE DE LA CL 79B ENTRE AK 7 Y KR 4 PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION, CONSTRUCCION Y CIERRE DE CARRIL NORTE CON CIERRE DE 1.5m PARA LA AMPLIACION DEL ANDEN Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA POR SOLICITUD EXPRESA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 15-MAR-23	NO	CHAPINERO	ANGELA M. CIFUENTES R.	20236120021318 2 20236120074102 2

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

COI No. 27
JULIO 06 DE 2023
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
30349	8010786	N/A	CL 45 SUR KR 72Q	CL 45 SUR KR 72QBIS	EBISU S.A.S.	7-jul-23	4-ene-24	05:00-22:00	05:00-22:00	PRIVADO	NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA REALIZAR PARQUEO TEMPORAL DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITA. SE DEBERA GARANTIZAR LA CANALIZACION DE 1,5m DE LA PARTE EXTERNA DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA) CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 4.0m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD, SIN OBSTACULOS, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.	SI	KENNEDY	CAROLINA GUEVARA O.	20236120204717 2
30350	9003935	N/A	AV BOYACA (AK 72) 150m AL NORTE DE LA AC 17	N/A	EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA - EUCOL S.A.S.	7-jul-23	2-nov-23	06:00-18:00	24 HORAS	DADEP-110-00129-186-0-2020	NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3.)PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (COSTADO EXTERNO) PARA INSTALACION DE MODULO M-10, DE ACUERDO CON ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 3,50m. DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN LA PARTE INTERNA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.	SI	CORREDOR	HAROL J. LOZANO T.	SDM-20236120154053 2 SDM-SPMT-20233120413766 1
30351	6001254	N/A	CL 48C SUR 30m AL ORIENTE DE LA KR 23D	N/A	EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA - EUCOL S.A.S.	7-jul-23	2-nov-23	06:00-18:00	24 HORAS	DADEP-110-00129-186-0-2020	NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION MODULO 10, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	SDM-20236120154053 2 SPMT-20233120413766 1

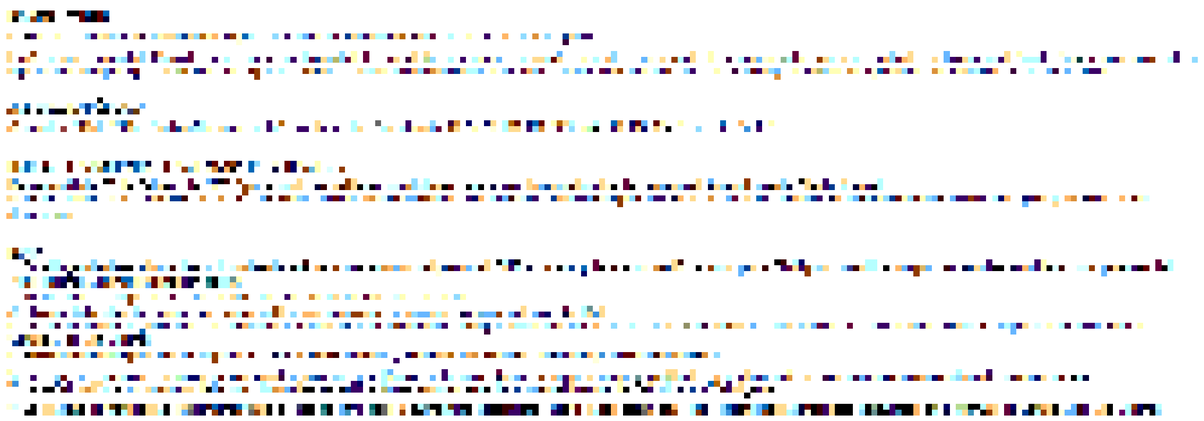

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Subdirector Técnico de Planes de Manejo de Tránsito (E)

992320.000 992400.000 992480.000 992560.000 992640.000 992720.000

1001280.000 1001200.000 1001120.000 1001040.000 1000960.000 1000880.000

992240.000 992320.000 992400.000 992480.000 992560.000 992640.000

CONVENCIONES

- SPO-03 Banderero
- SP-31 Reducción de Carril
- SIO-05 Sendero peatonal
- Boal
- SR-30 Máximo Velocidad 30 Km
- Barricada Desvio
- Conos
- Entrada y Salida de Volquetas a 50 m o 100 m
- Ruta acceso de Vehículos
- SIO 02 Inicio de obra
- SIO 03 Fin de obra
- Obra
- Arboles
- SR0 - 03 Uno a Uno

REVISIONES

Revisión	Fecha	Motivo

Revisión	Fecha	Motivo

NOTAS

NORTE

N

NAVEGADOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO
BOÍTA
LOCALIDAD
KENNEDY
DIRECCIÓN
CALLE 45 SUR No. 72Q - 20
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
0895

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISEÑO
ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
VALERIA TORRES SALAZAR
DUVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARIA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS
GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

INTERVENTORÍA
G Y G CONSTRUCCIONES SAS
NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA
ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A8232017-101802381

CONTIENE
P.M.T CALLE 45 SUR

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
PMT

FECHA MES
ESCALA 1:750
200X

PLANO A-001 **DE**

CONSECUTIVO SED

COLEGIO BOÍTA LOC 08 - KENNEDY CPF - 0895 PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO
BOÍTA
LOCALIDAD
KENNEDY
DIRECCIÓN
CALLE 45 SUR No. 72Q - 20
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
0895

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISEÑO
ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
VALERIA TORRES SALAZAR
DUVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARÍA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS
GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

INTERVENTORÍA
G Y G CONSTRUCCIONES SAS
NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA
ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A9232017-1016025781

CONTIENE
P.M.T CARRERA 72 Q BIS

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
PMT

FECHA	ESCALA
MES 200X	1:750

PLANO **DE**
A-001

CONSECUTIVO SEO

COLEGIO BOÍTA LOC 08 - KENNEDY CPF - 0895 PROYECTO: ARQUITECTÓNICO

CONVENCIONES

- SPO-03 Banderero
- SP-31 Reducción de Carril
- SIO-05 Sendero peatonal
- Boal
- SR-30 Máximo Velocidad 30 Km
- Barricada Desvío
- Conos
- Entrada y Salida de Volquetas a 50 m o 100 m
- Ruta acceso de Vehículos
- SIO 02 Inicio de obra
- SIO 03 Fin de obra
- Obra
- Arboles
- SR0 - 03 Uno a Uno

REVISIONES

Revisión	Fecha	Motivo	Revisión	Fecha	Motivo

NOTAS

NORTE
N

NAVEGADOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO
BOÍTA
LOCALIDAD
KENNEDY
DIRECCIÓN
CALLE 45 SUR No. 72Q - 20
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
0895

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISEÑO
ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
VALERIA TORRES SALAZAR
DUVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARIA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS
GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

INTERVENTORÍA
G Y G CONSTRUCCIONES SAS
NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA
ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A9232017-1016925781

CONTIENE
P.M.T CALLE 43 SUR

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
PMT

FECHA	ESCALA
MES 200X	1:750

PLANO DE
A-001

CONSECUTIVO SEO

COLEGIO BOÍTA LOC 08 - KENNEDY CPF - 0895 PROYECTO: ARQUITECTÓNICO

CONVENCIONES

- SPO-03 Banderero
- SP-31 Reducción de Carril
- SIO-05 Sendero peatonal
- Boal
- SR-30 Máximo Velocidad 30 Km
- Barricada Desvío
- Conos
- Entrada y Salida de Volquetas a 50 m o 100 m
- Ruta acceso de Vehículos
- SIO 02 Inicio de obra
- SIO 03 Fin de obra
- Obra
- Arboles
- SR0 - 03 Uno a Uno

REVISIONES

Revisión	Fecha	Motivo	Revisión	Fecha	Motivo

NOTAS

NORTE
N

NAVEGADOR

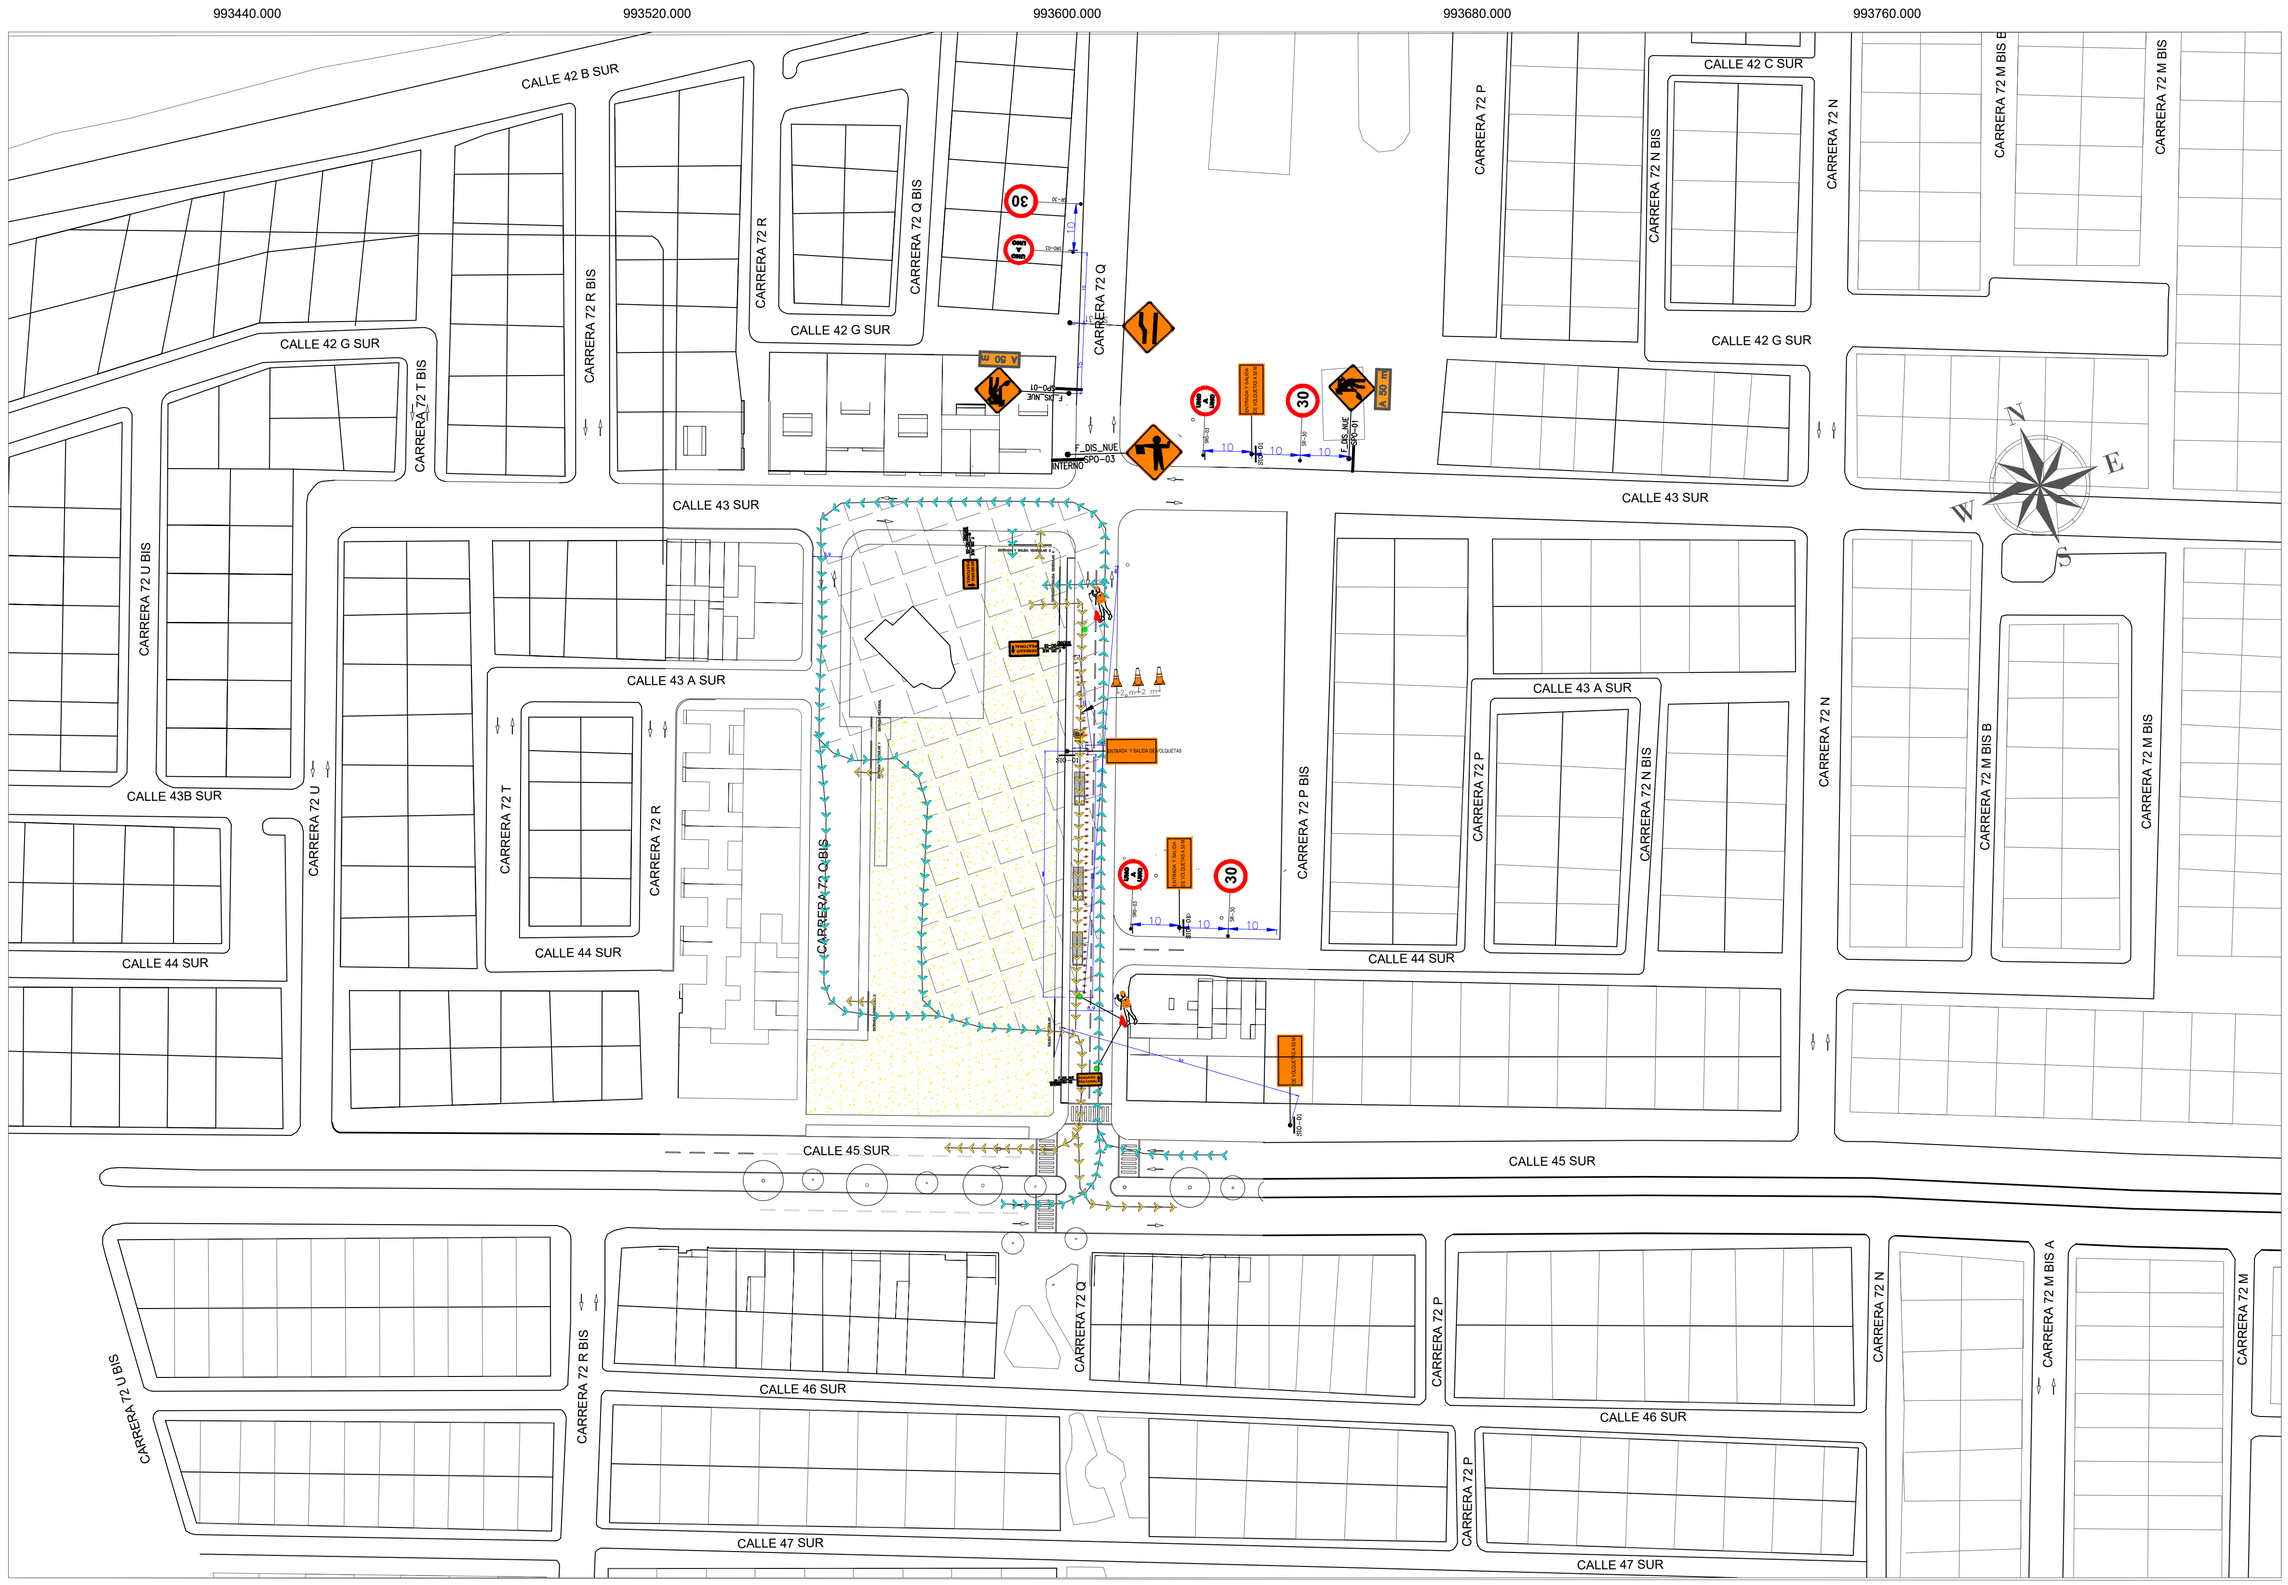

CONVENCIONES

- SPO-03 Banderero
- SP-31 Reducción de Carril
- SIO-05 Sendero peatonal
- Boal
- SR-30 Máximo Velocidad 30 Km
- Barricada Desvio
- Conos
- Entrada y Salida de Volquetas a 50 m o 100 m
- Ruta acceso de Vehículos
- SIO 02 Inicio de obra
- SIO 03 Fin de obra
- Obra
- Arboles
- SR0 - 03 Uno a Uno

REVISIONES

Revisión	Fecha	Motivo	Revisión	Fecha	Motivo

NOTAS

NORTE

N

NAVEGADOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO
BOÍTA
LOCALIDAD
KENNEDY
DIRECCIÓN
CALLE 45 SUR No. 72Q - 20
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
0895

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISEÑO
ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
VALERIA TORRES SALAZAR
DIVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARÍA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS
GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

INTERVENTORÍA
G Y G CONSTRUCCIONES SAS
NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA
ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A9232012-1016025761

CONTIENE
P.M.T CARRERA 72 Q

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
PMT

FECHA MES 200X
ESCALA 1:750

PLANO DE
A-001

CONSECUTIVO GEG

COLEGIO BOÍTA LOC 08 - KENNEDY CPF - 0895 PROYECTO ARQUITECTÓNICO

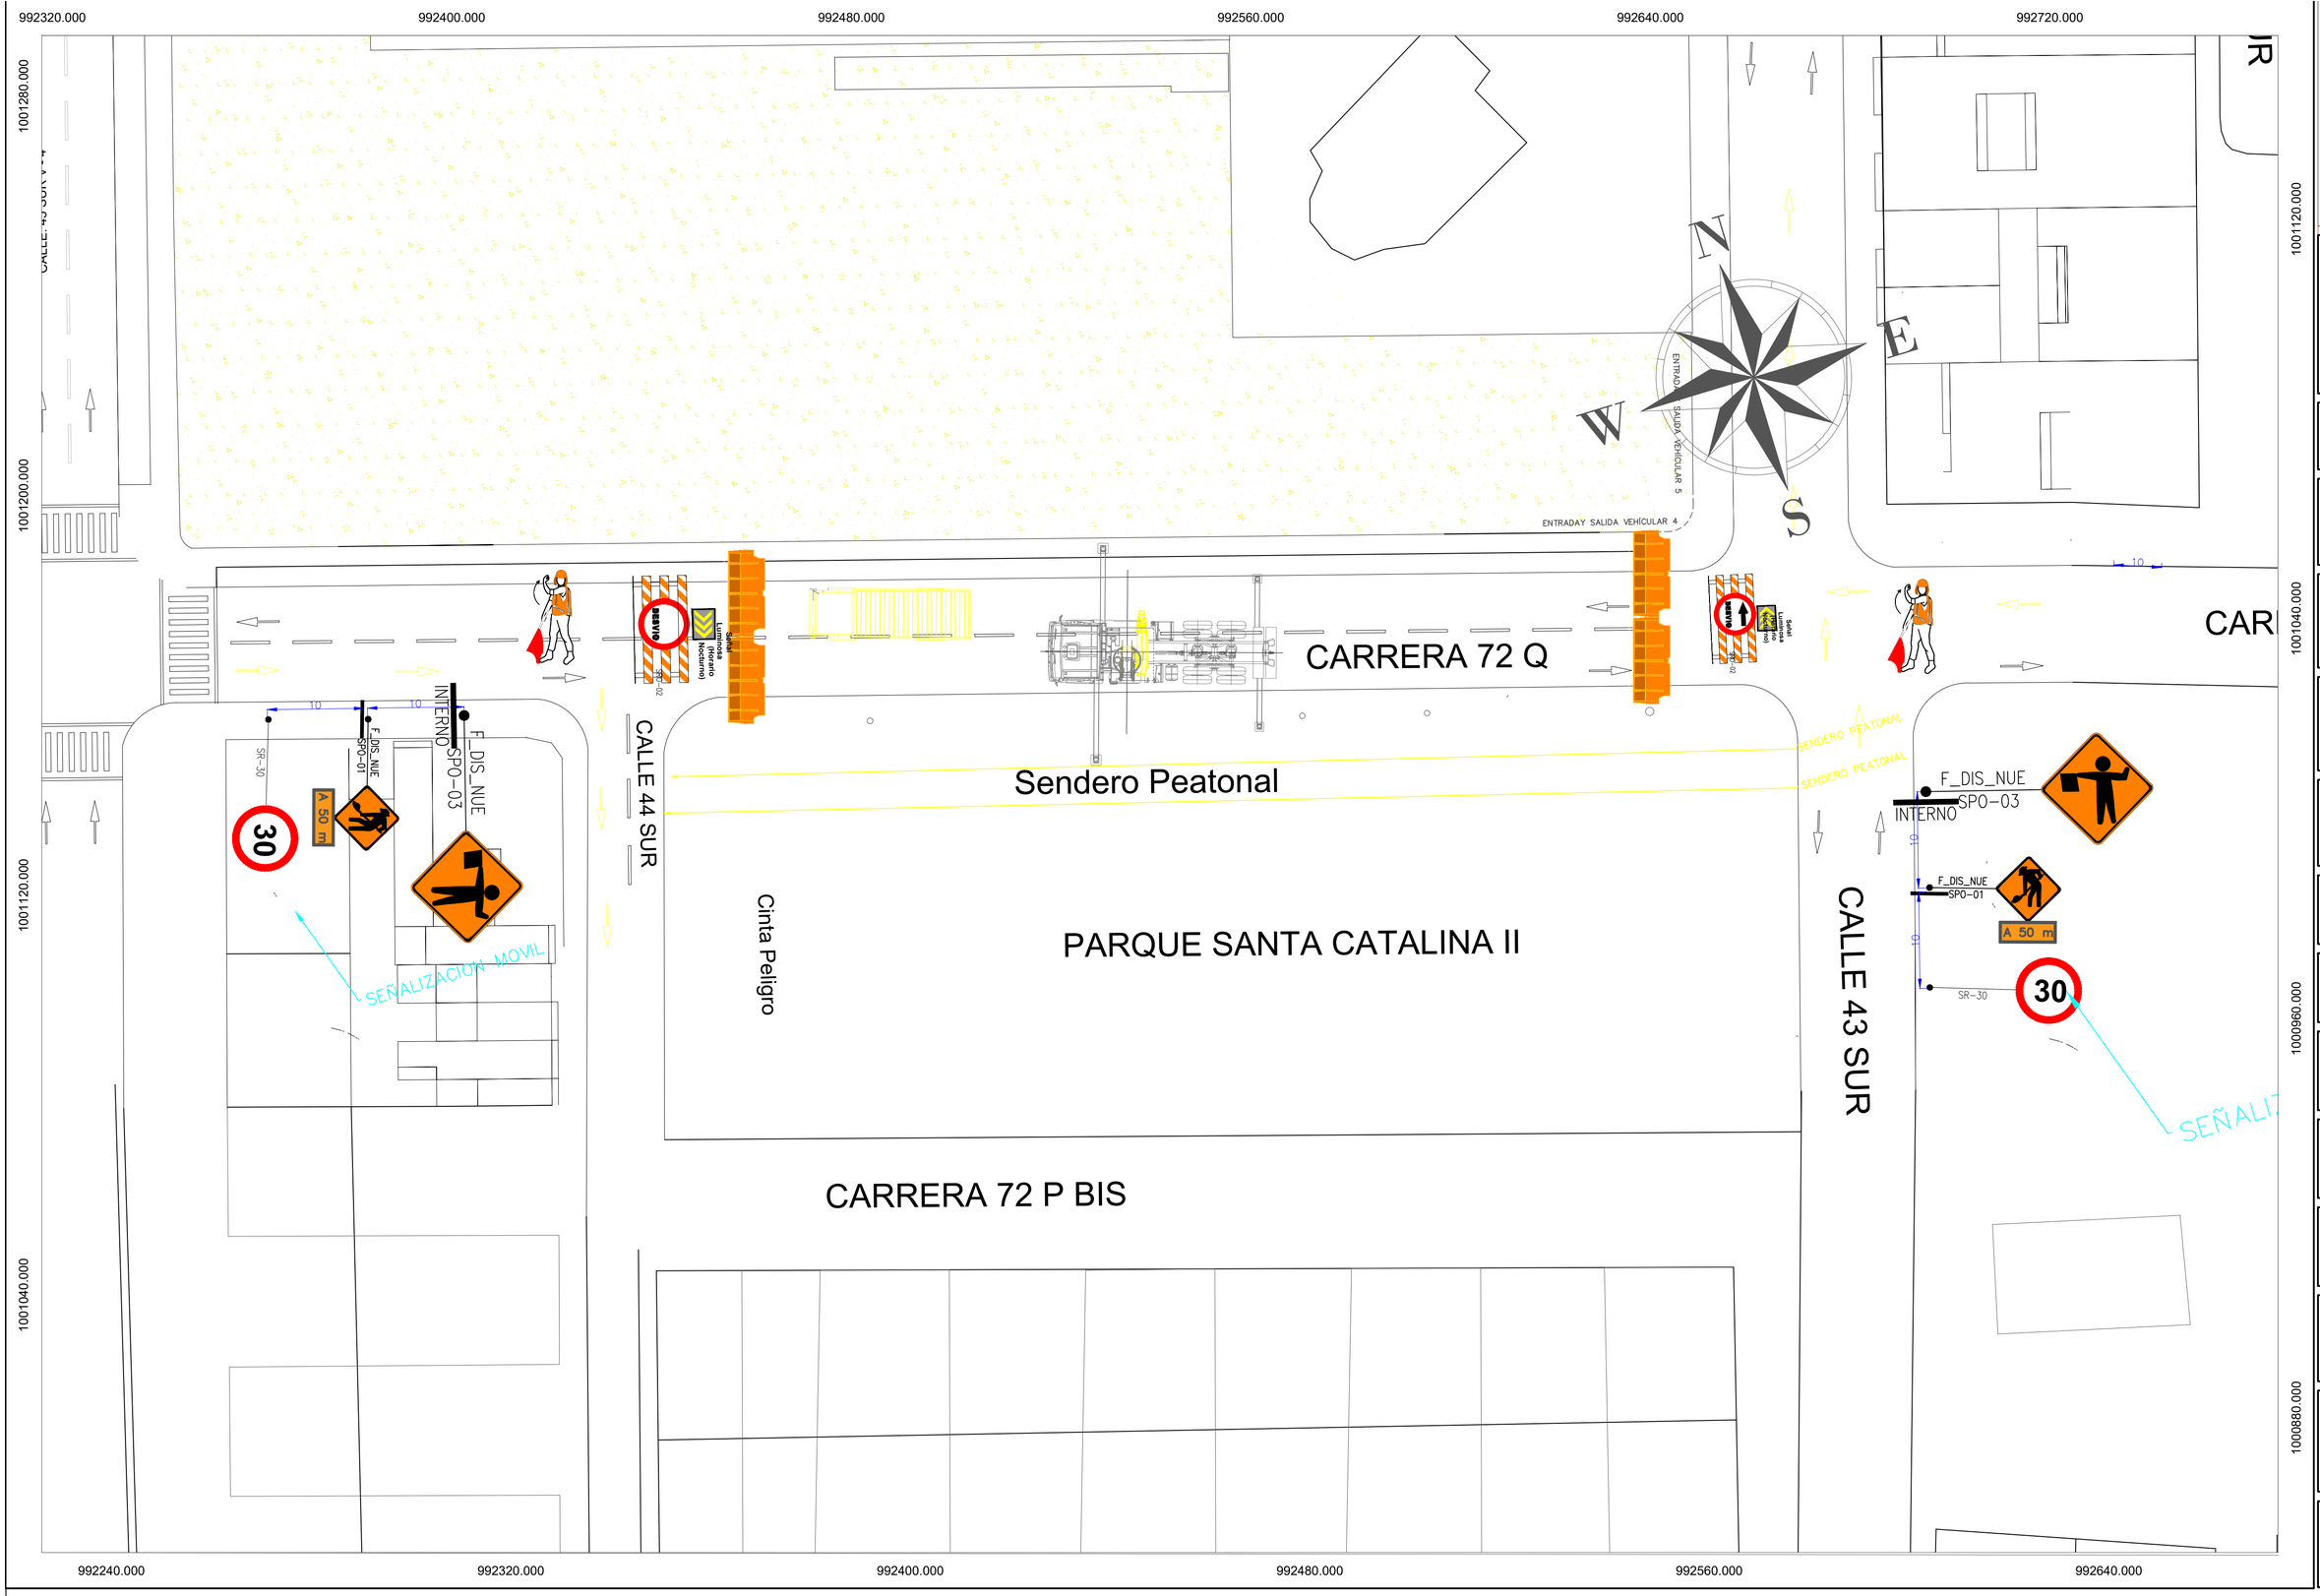

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO
BOÍTA
LOCALIDAD
KENNEDY
DIRECCIÓN
CALLE 45 SUR No. 72Q - 20
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
0895

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISEÑO
ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
VALERIA TORRES SALAZAR
DUVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARIA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS
GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

INTERVENTORÍA
G Y G CONSTRUCCIONES SAS
NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA
ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A9232017-1016825781

CONTIENE
P.M.T CIERRE CARRERA 72 Q

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
PMT

FECHA	ESCALA
MES 200X	1:750

PLANO **DE**
A-001

CONSECUTIVO SEO

COLEGIO BOÍTA LOC 08 - KENNEDY CPF - 0895 PROYECTO: ARQUITECTÓNICO

CONVENCIONES

- SPO-03 Banderero
- SP-31 Reducción de Carril
- SIO-05 Sendero peatonal
- Boal
- SR-30 Máximo Velocidad 30 Km
- Barricada Desvio
- Conos
- Entrada y Salida de Volquetas a 50 m o 100 m
- Ruta acceso de Vehículos
- SIO 02 Inicio de obra
- SIO 03 Fin de obra
- Obra
- Arboles
- SR0 - 03 Uno a Uno

REVISIONES

Revisión	Fecha	Motivo	Revisión	Fecha	Motivo

NOTAS

NORTE
N

NAVEGADOR

ANEXO 22.

LGA.CR-01

CRONOGRAMA CAPACITACION PLAN AMBIENTAL

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CODIGO:**LGC.CR-00**

VERSIÓN:**01**

FECHA:**12/10/2023**

OBJETIVO	ALCANCE	
MANTENER EL PERSONAL DE LA EMPRESA CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU TRABAJO DE UNA MANERA SEGURA Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TENDIENTES A CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA REDUCIR LOS RIESGOS , QUE SE PRESENTAN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES.	APLICA A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA , CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	INDICADOR CUMPLIMIENTO	**META**
	# DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS*100 # DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	90%

RECURSOS	RECURSOS NECESARIOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS
HUMANOS	ESPECIALISTA AMBIENTAL , PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	LISTADOS DE ASISTENCIA
TECNOLOGICOS	COMPUTADORES, VIDEO BEAN, PARLANTES, SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS (EXCEL, WORD).	EVALUACIONES
FINANCIEROS	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA EMPRESA	

Programado	P
Ejecutado	E
Reprogramado	R

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES

GESTION AMBIENTAL				MES 1			MES 2			MES 3			MES 4			MES 5			MES 6			MES 7			MES 8			MES 9			MES 10			MES 11			MES 12			MES 13			MES 14			MES 15			MES 16			MES 17			MES 18			MES 19			OBSERVACIONES
N°	CAPACITACION	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	
1	Legislacion Ambiental en Obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																																																				
2	Manuales de Impacto Urbano SDA	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																																																				
3	Plan de Manejo Ambiental	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																																																				
4	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																																																				
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y RESIDUOS CONVENCIONALES																																																													
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																								
5	Legislacion Residuos en Obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																				P	E																														
6	Plan de Gestion de Residuos de	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																				P	E																														
7	Manejo Residuos Convencionales	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																				P	E																														
8	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																				P	E																														
GESTION MANEJO SILVICULTURAL EN OBRA																																																													
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																								
9	Legislacion Ambiental Silvicultura	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																				P	E																											
10	Manejo y cubrimiento de individuos	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																				P	E																											
11	Procedimientos Aprobados	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																				P	E																											
12	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																				P	E																											

	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CODIGO:**LGC.CR-00**
		VERSIÓN:**01**
		FECHA:**12/10/2023**

OBJETIVO	ALCANCE	
MANTENER EL PERSONAL DE LA EMPRESA CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU TRABAJO DE UNA MANERA SEGURA Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TENDIENTES A CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA REDUCIR LOS RIESGOS , QUE SE PRESENTAN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES.	APLICA A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA , CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	INDICADOR CUMPLIMIENTO	META
	# DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS*100 # DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	90%

RECURSOS	RECURSOS NECESARIOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS
HUMANOS	ESPECIALISTA AMBIENTAL , PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	LISTADOS DE ASISTENCIA
TECNOLOGICOS	COMPUTADORES, VIDEO BEAN, PARLANTES, SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS (EXCEL, WORD).	EVALUACIONES
FINANCIEROS	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA EMPRESA	

Programado	P
Ejecutado	E
Reprogramado	R

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES

GESTION AMBIENTAL				MES 1			MES 2			MES 3			MES 4			MES 5			MES 6			MES 7			MES 8			MES 9			MES 10			MES 11			MES 12			MES 13			MES 14			MES 15			MES 16			MES 17			MES 18			MES 19			OBSERVACIONES
N°	CAPACITACION	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	
GESTION MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO																																																													
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
13	Legislacion ambiental Decreto 4741	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																																																		
14	Montaje Almacen	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																																																		
15	Manejo seguro de combustibles	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																																																		
16	Matriz compatibilidad	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																																																		
17	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																																																		
GESTION MANEJO DERRAMES																																																													
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
18	Legislacion ambiental Decreto 4742	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																				P	E																	P									
19	Kit de derrames y su uso	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																				P	E																	P									
20	Protocolo de contingencias y derrames	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																				P	E																	P									
21	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																				P																		P									
PLAN DE EMERGENCIAS																																																													
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
22	Plan de Emergencias	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																							P	E																							
23	Protocolos de atencion	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																							P	E																							
25	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																							P	E																							
ALMACENAMIENTO DE INSUMOS																																																													
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
26	Identificacion y clasificacion Petreos, No petreos	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo													P	E																								P	E					P	E					P						P			
27	Protocolo de almacenamiento	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo													P	E																								P	E					P	E					P						P			
28	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo													P	E																								P	E					P	E					P						P			

	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CODIGO:**LGC.CR-00**
		VERSIÓN:**01**
		FECHA:**12/10/2023**

OBJETIVO	ALCANCE	
MANTENER EL PERSONAL DE LA EMPRESA CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU TRABAJO DE UNA MANERA SEGURA Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TENDIENTES A CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA REDUCIR LOS RIESGOS , QUE SE PRESENTAN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES.	APLICA A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA , CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	INDICADOR CUMPLIMIENTO	META
	# DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS*100 # DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	90%

RECURSOS	RECURSOS NECESARIOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS
HUMANOS	ESPECIALISTA AMBIENTAL , PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	LISTADOS DE ASISTENCIA
TECNOLOGICOS	COMPUTADORES, VIDEO BEAN, PARLANTES, SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS (EXCEL, WORD).	EVALUACIONES
FINANCIEROS	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA EMPRESA	

Programado	P
Ejecutado	E
Reprogramado	R

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES

GESTION AMBIENTAL				MES 1			MES 2			MES 3			MES 4			MES 5			MES 6			MES 7			MES 8			MES 9			MES 10			MES 11			MES 12			MES 13			MES 14			MES 15			MES 16			MES 17			MES 18			MES 19			OBSERVACIONES
N°	CAPACITACION	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	
MANEJO DE SUMIDEROS																																																													
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
29	Clasificacion e identificacion de sumideros	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																P	E																								P	E		P	E		P			P			P			P			
30	Limpieza y Cubrimiento Sumideros en	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																P	E																								P	E		P	E		P			P			P			P			
31	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																P	E																								P	E		P	E		P			P			P			P			
MANEJO DE ORDEN LIMPIEZA Y ASEO																																																													
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
32	Programa de orden Limpieza y Aseo	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																			P	E																									P	E		P			P			P			P			
33	Brigada BOAL	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																			P	E																									P	E		P			P			P			P			
34	Protocolos de limpieza y aseo x areas de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																			P	E																									P	E		P			P			P			P			
35	Protocolos de limpieza y aseo x areas de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																			P	E																									P	E		P			P			P			P			
AHORRO DE AGUA Y ENERGIA																																																													
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
36	Ahorro de Agua	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																						P	E											P						P	E					P						P						
37	Ahorro de Energia	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																						P	E											P						P	E					P						P						
38	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																						P	E											P						P	E					P						P						

ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	TOTAL
ACTIVIDADES EJECUTADAS	8	8	9	7	3	3	4	3	4	4	3	3	3	6	10	0	0	0	0	78
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	8	8	9	7	3	3	4	3	4	4	4	6	3	6	10	10	14	10	10	126
ACTIVIDADES REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POIRCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL MENSUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	50	100	100	100	0	0	0	0	1425

ANEXO 3.

INDUCCIONES AMBIENTALES

{9t ¤L9a . w9 2023

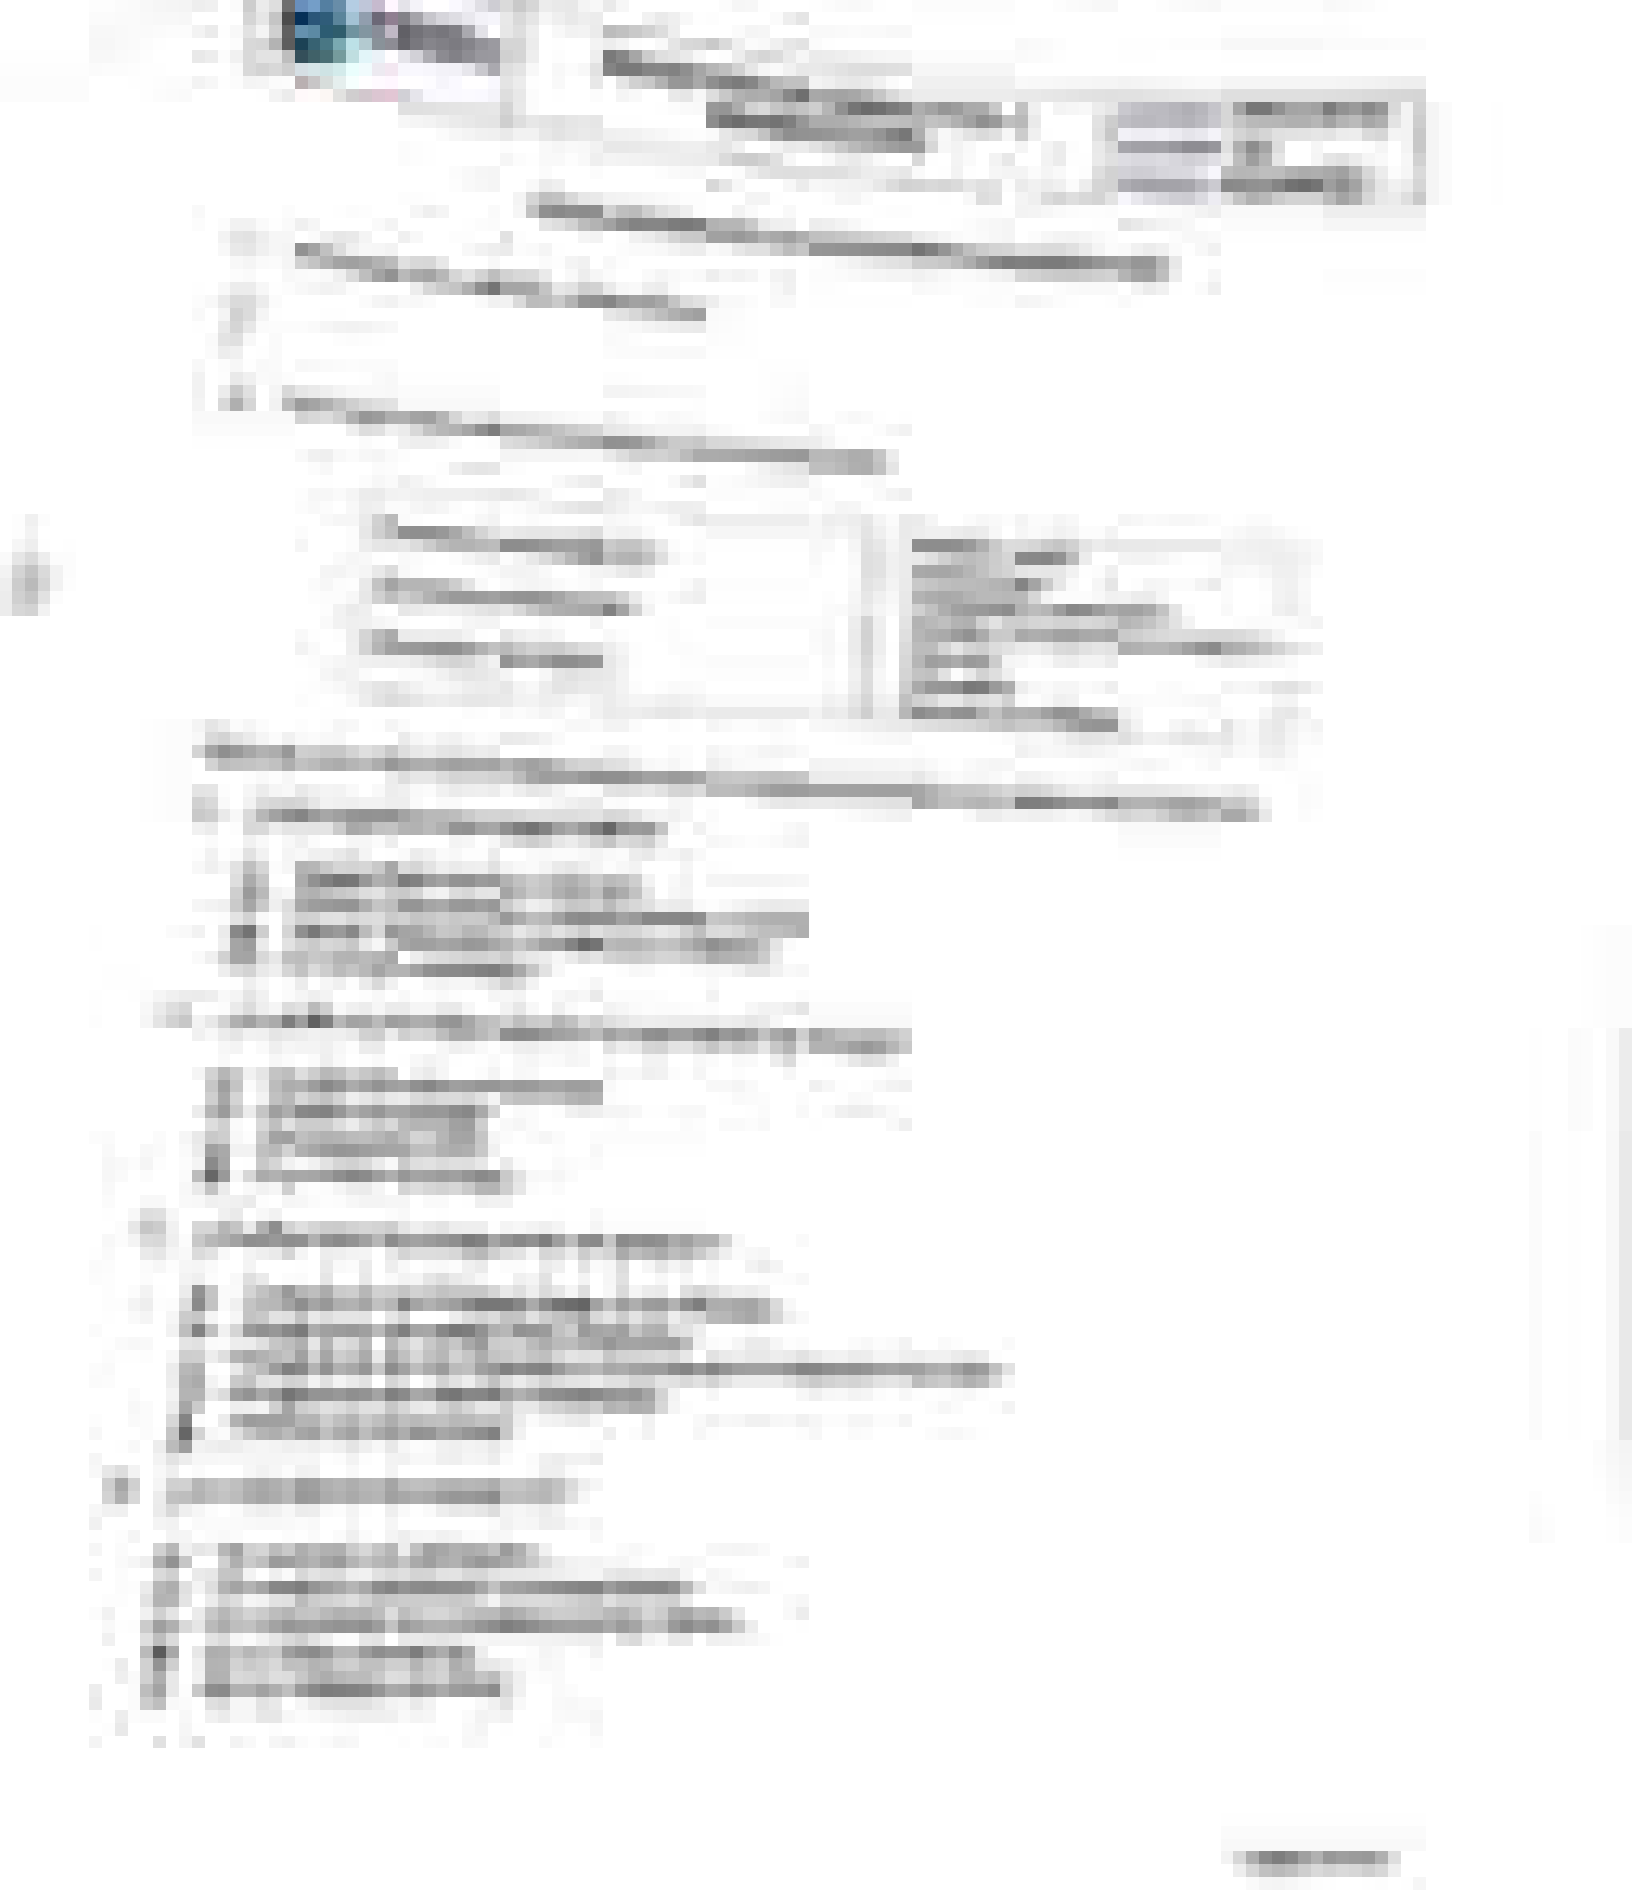

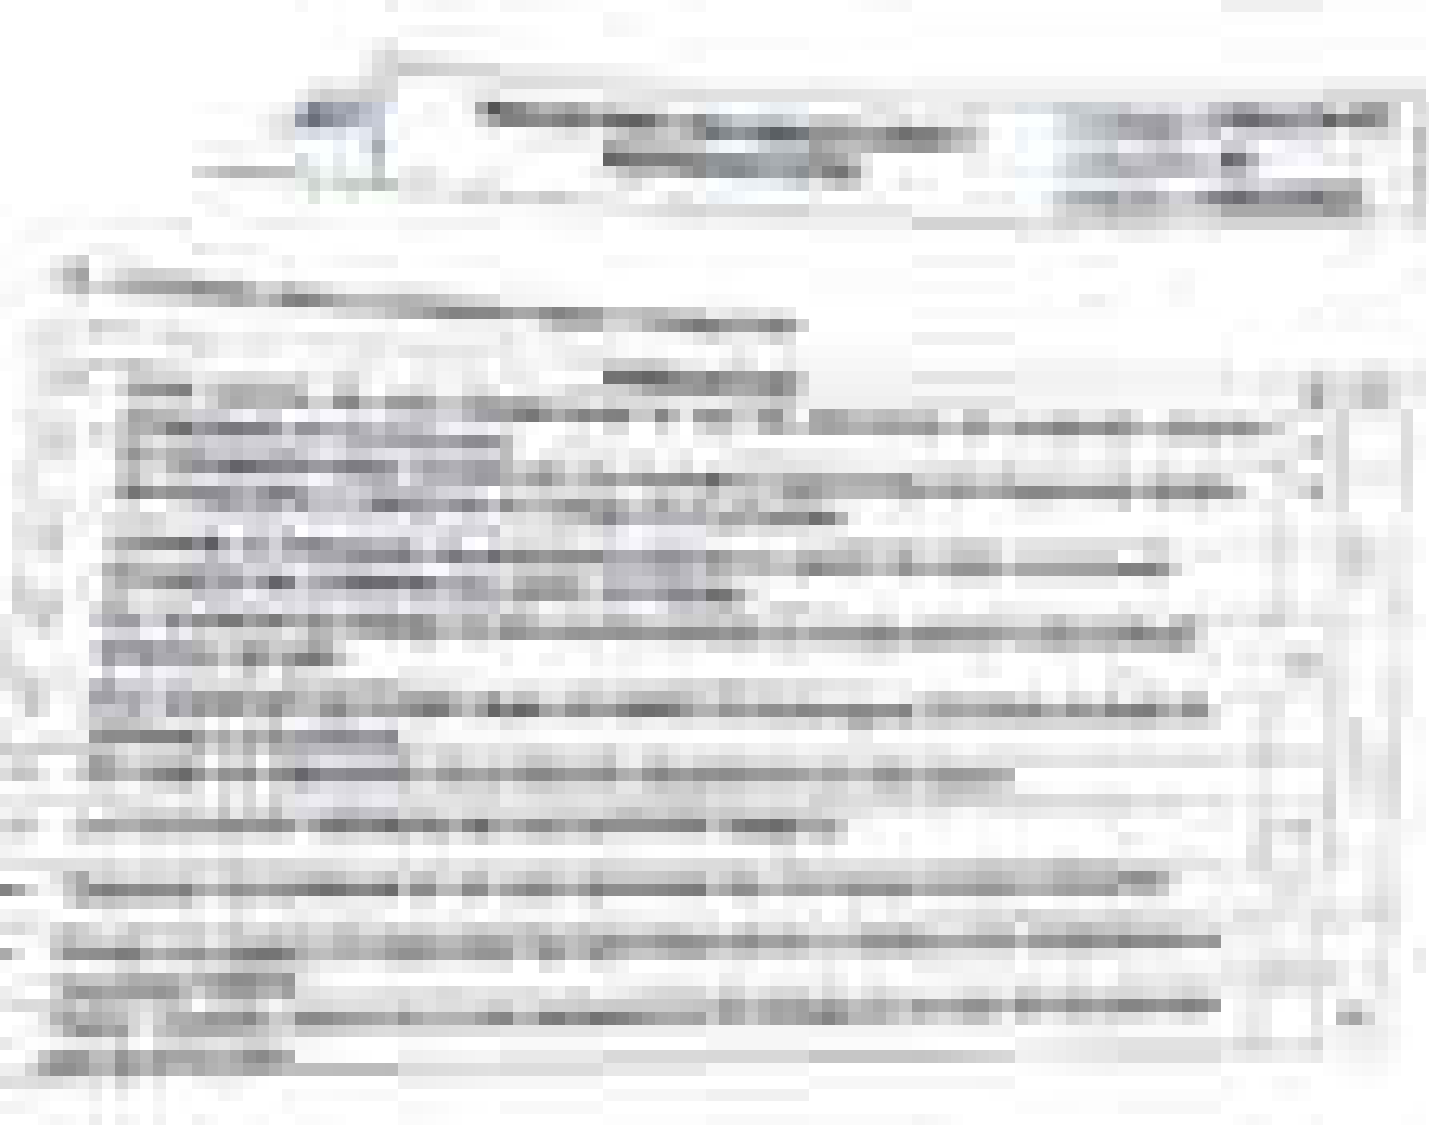

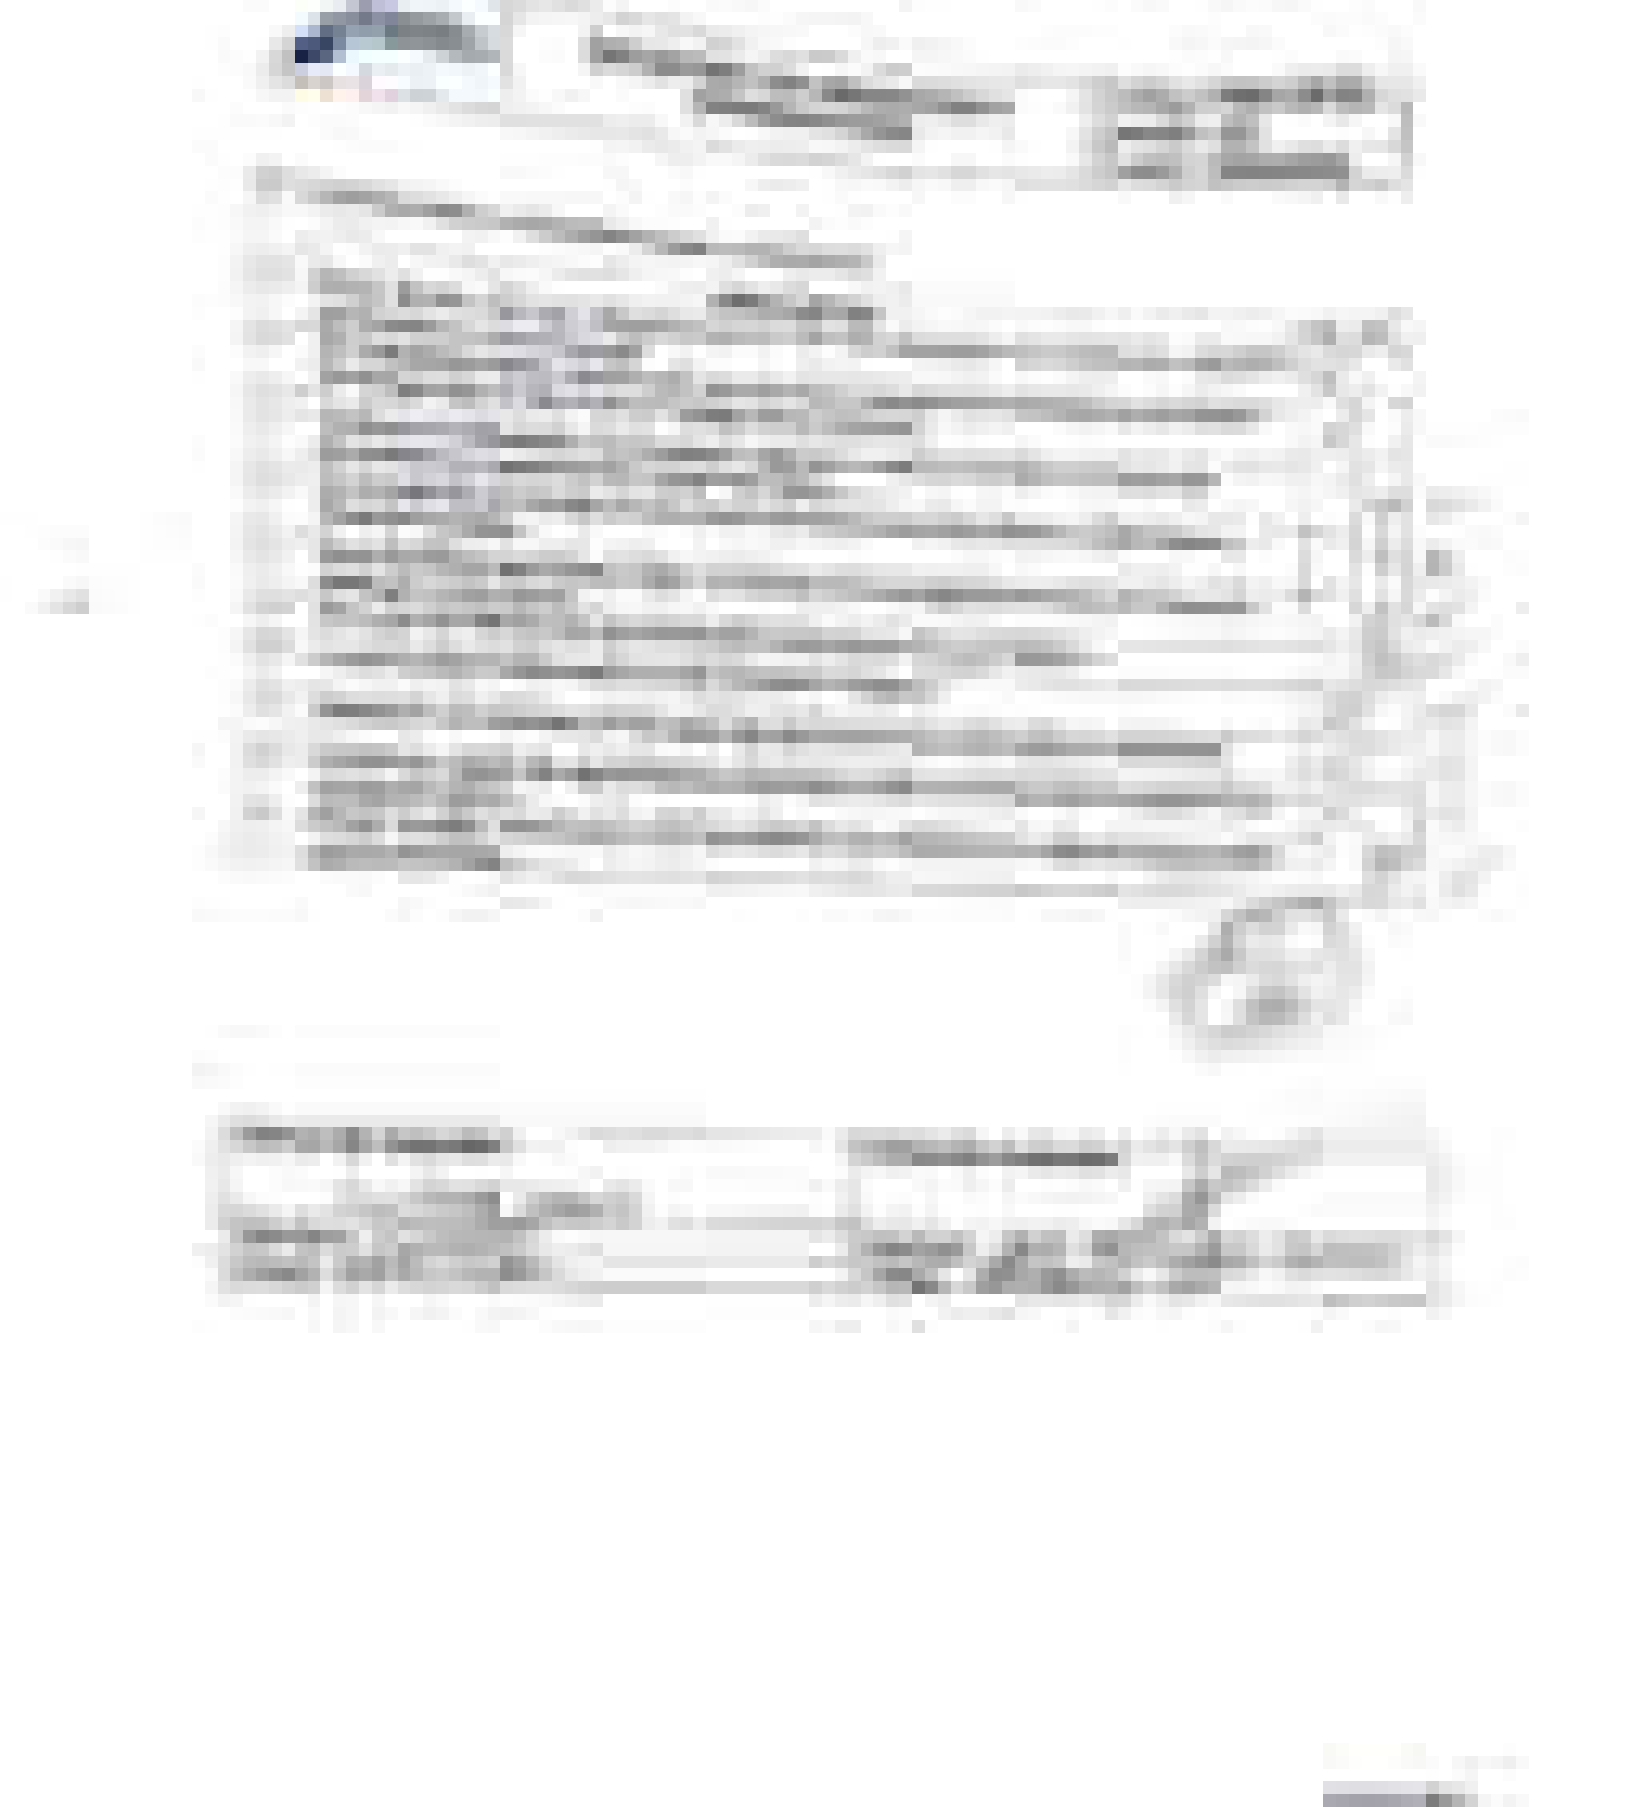

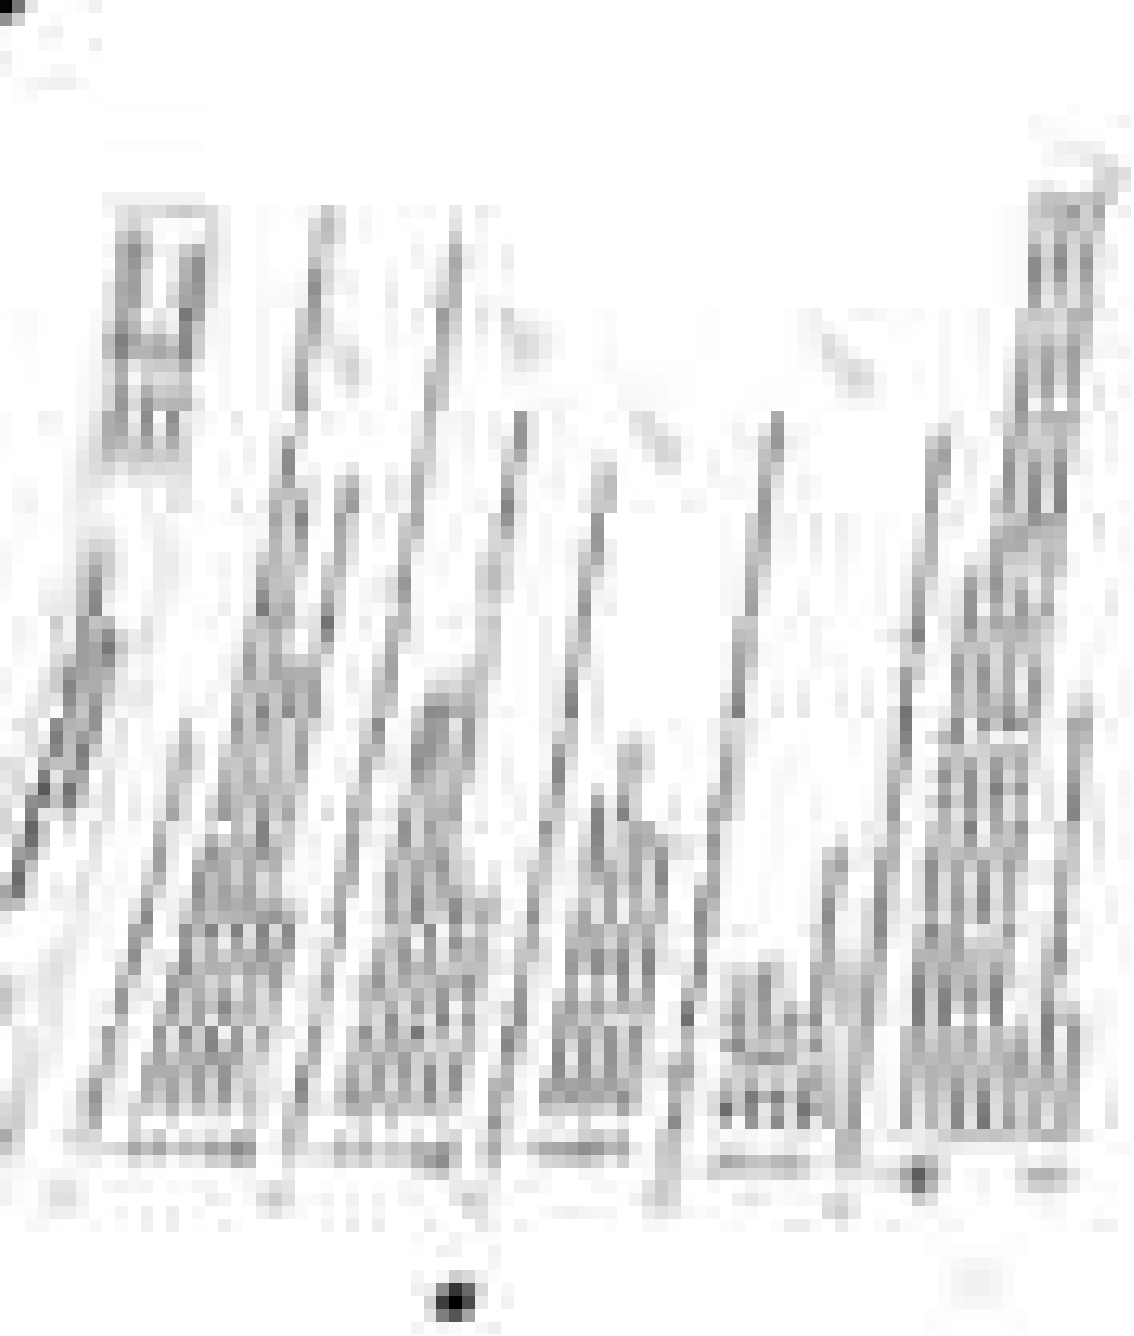

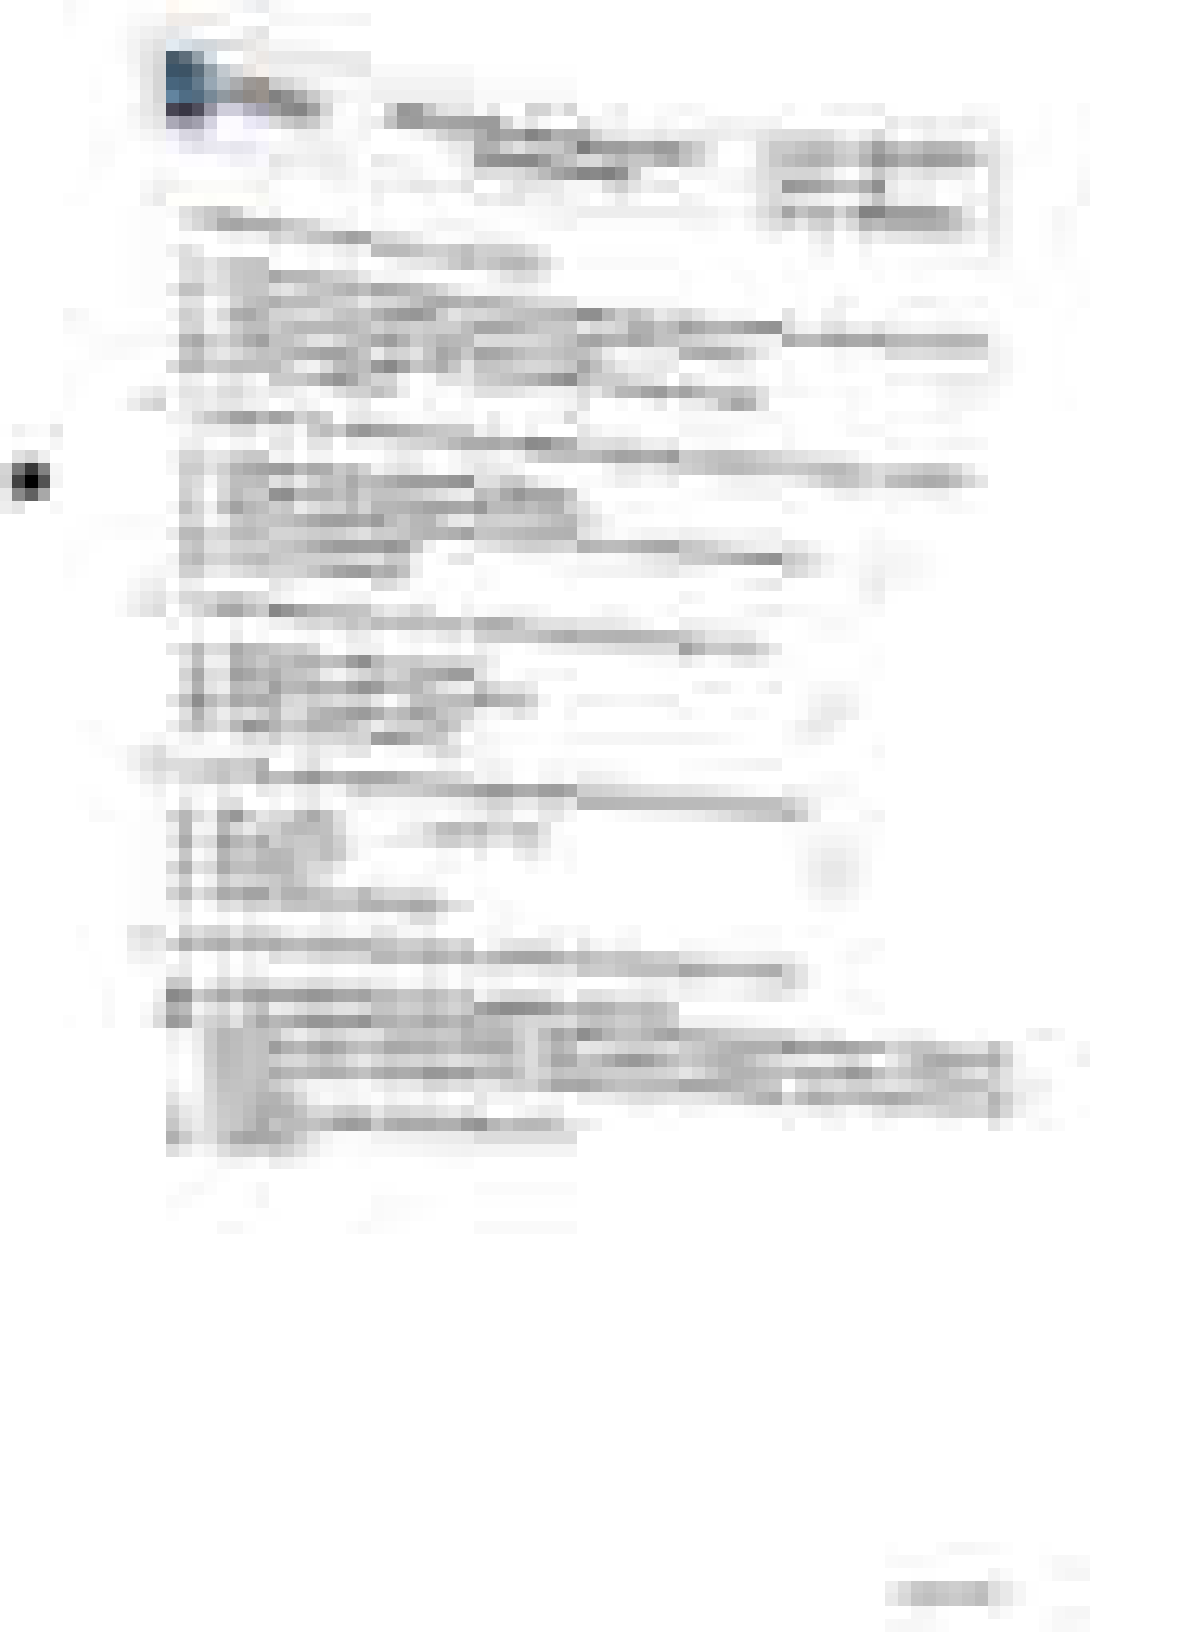

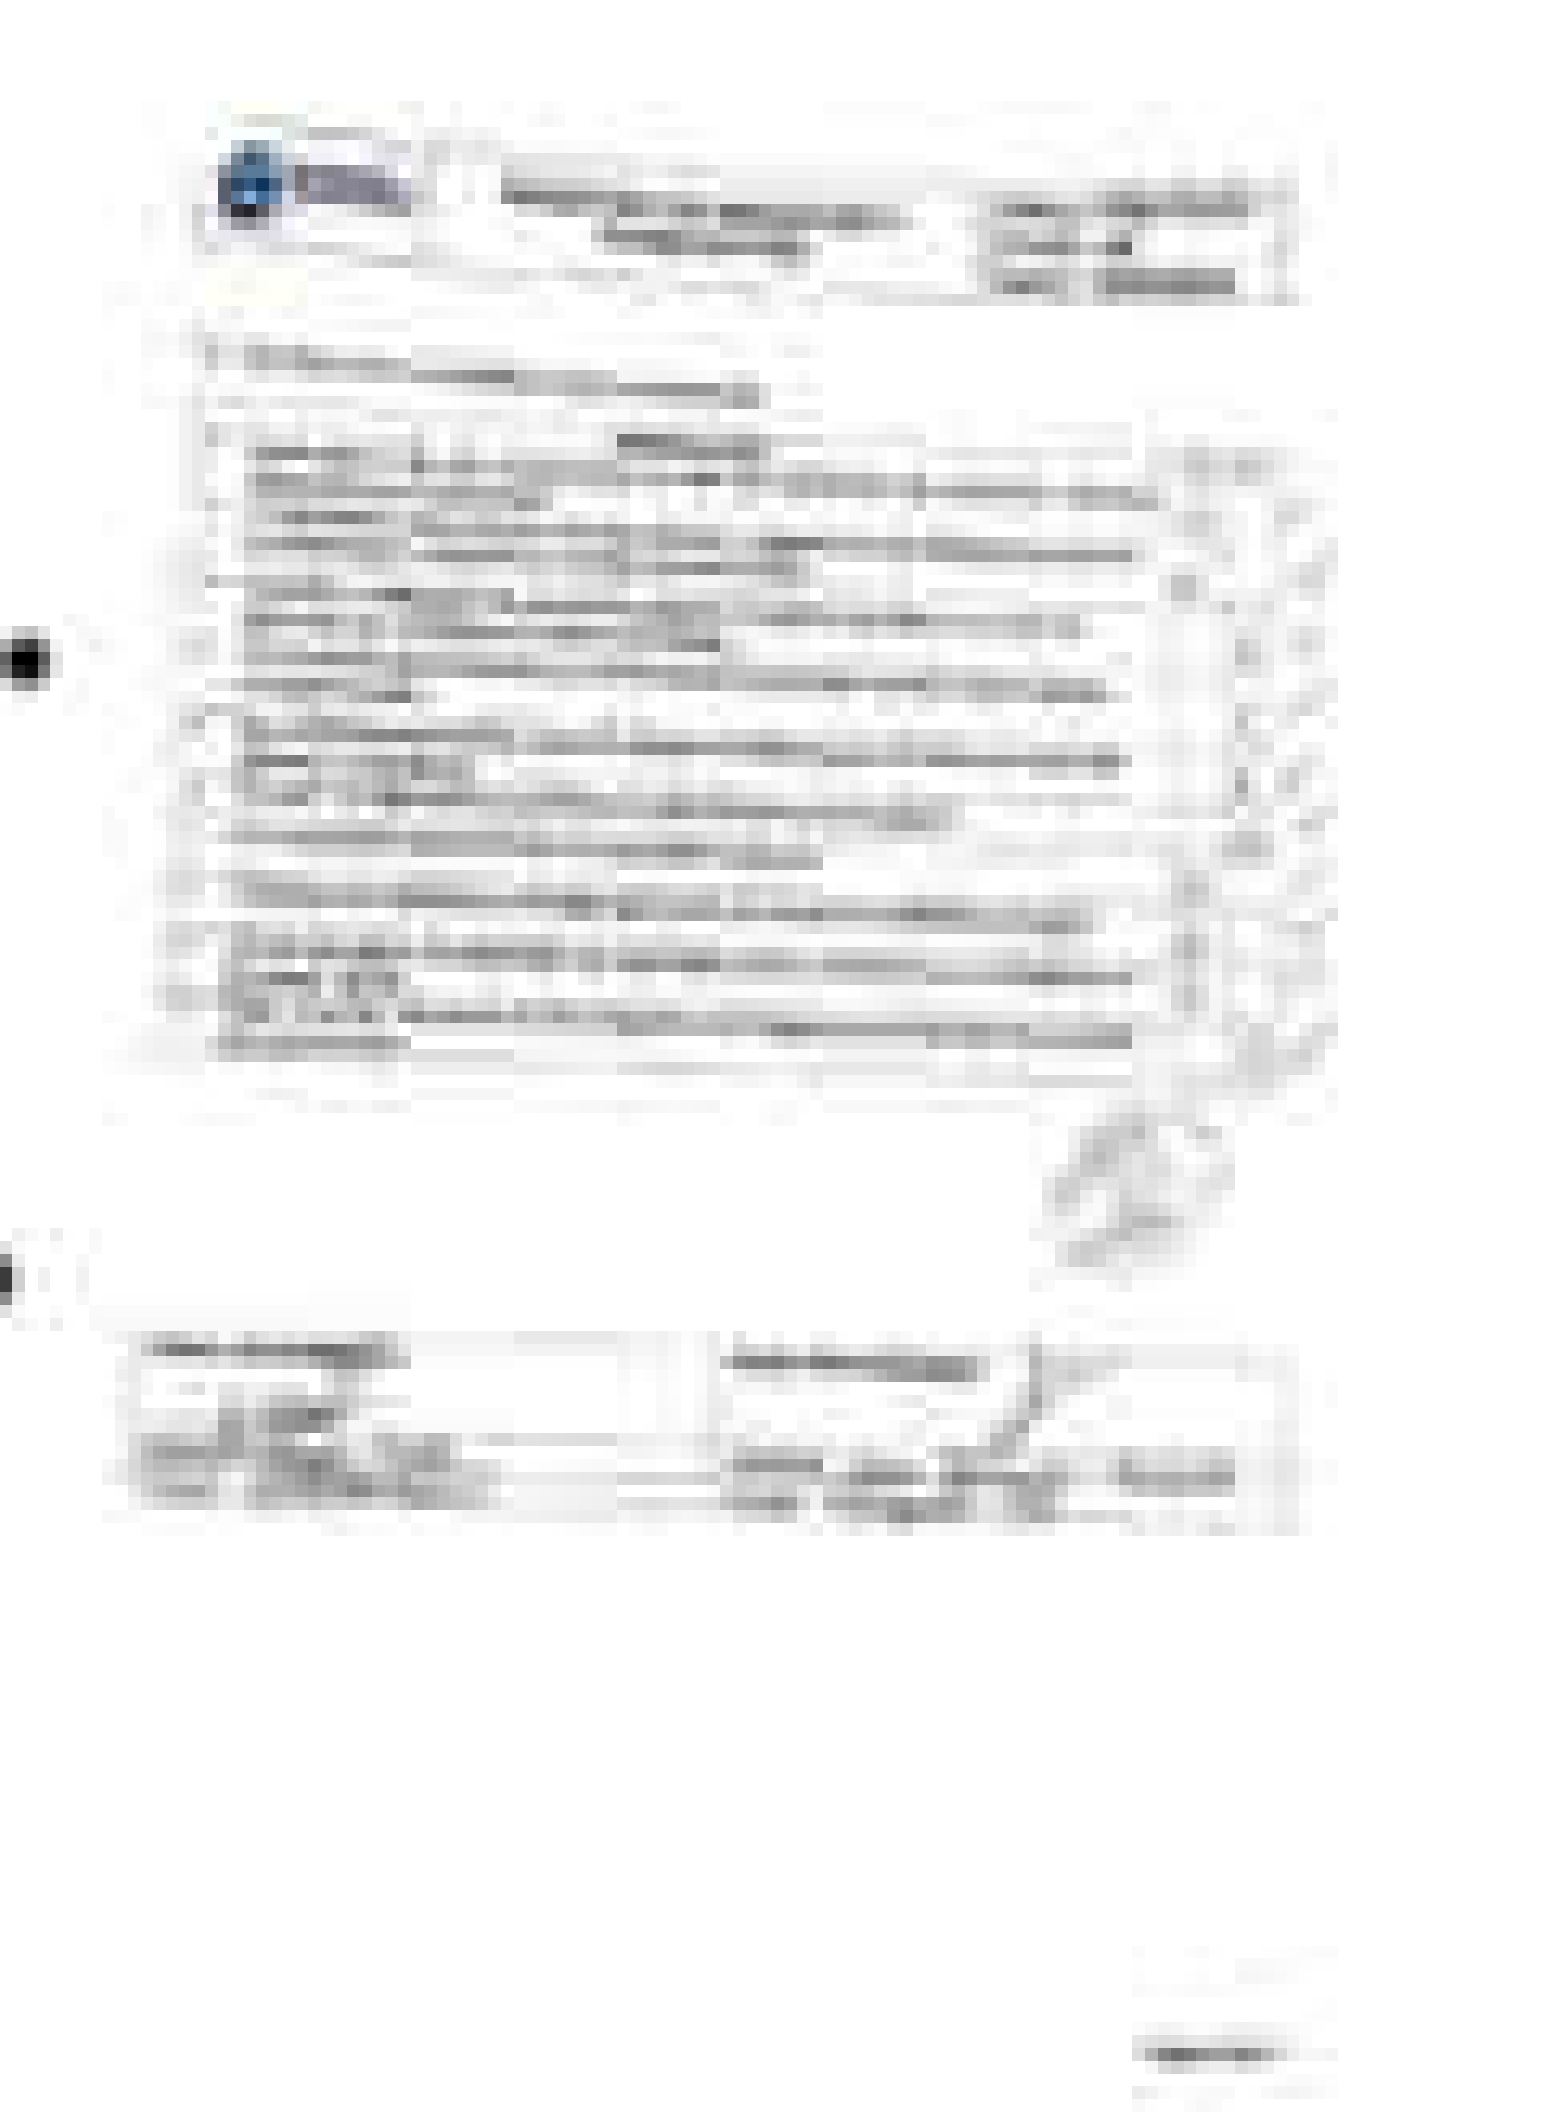

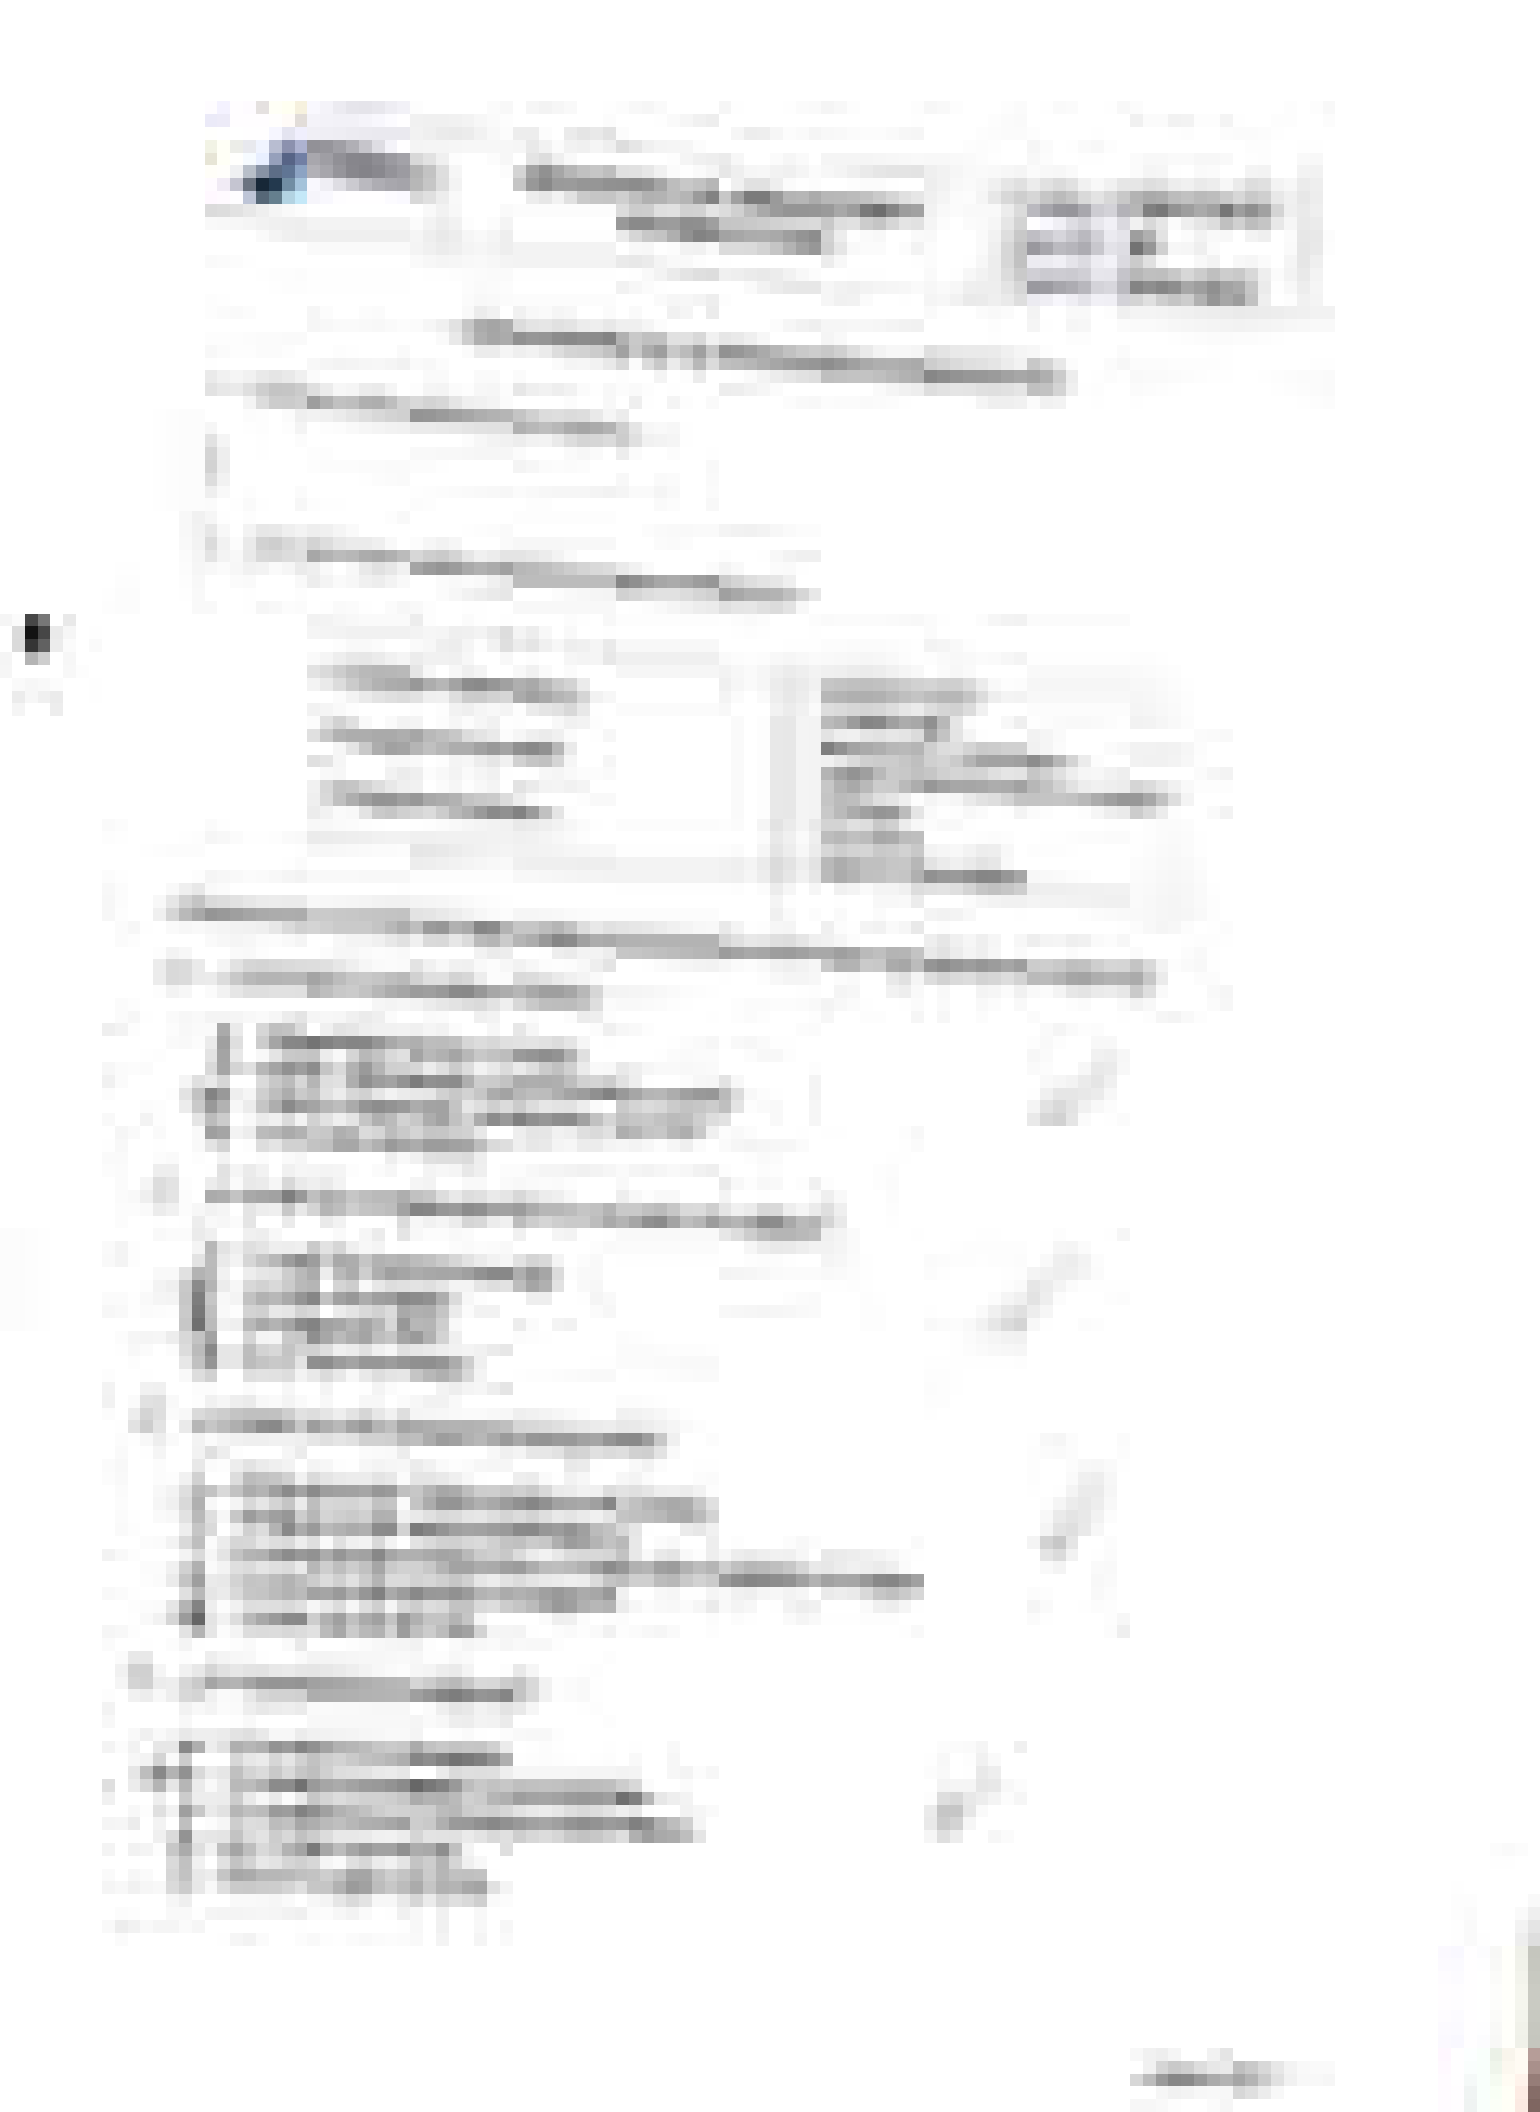

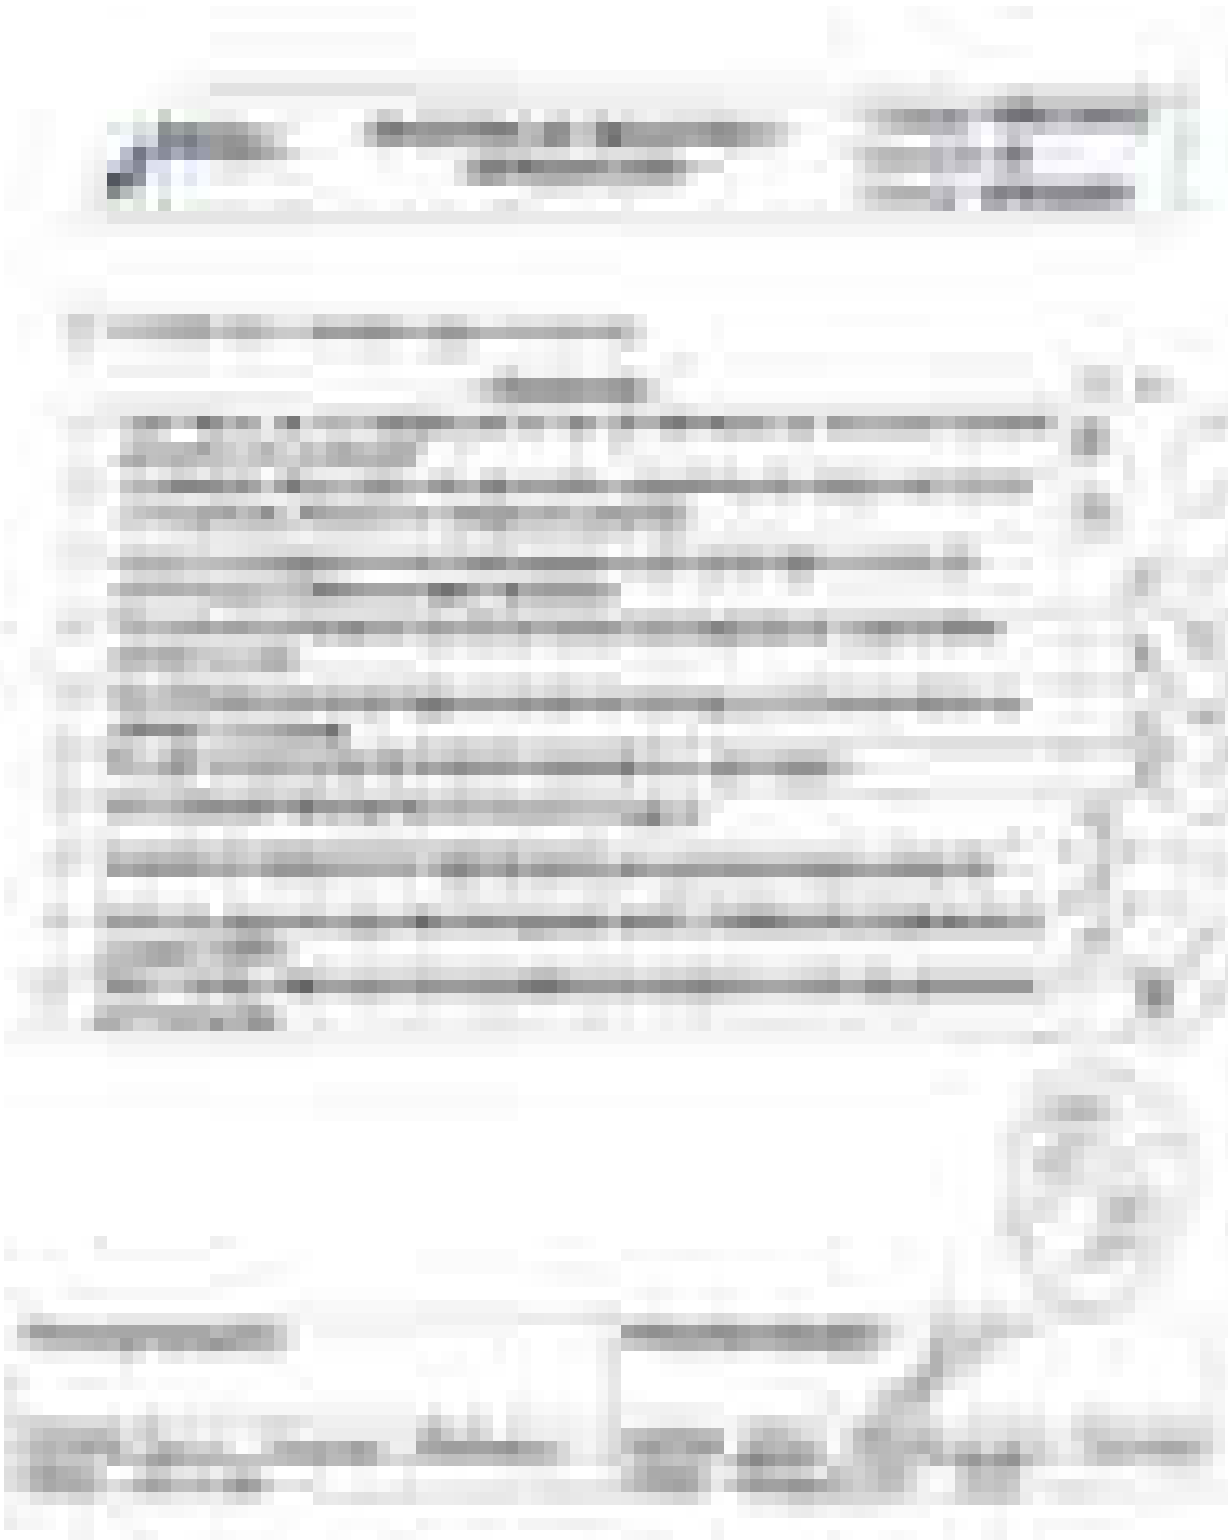



[illegible]

[redacted]

ANEXO 34.

CAPACITACIONES AMBIENTALES

{9t ¤L9a . w9

2023

ANEXO ॐ.

INSPECCIONES AMBIENTALES

{9t ¤L9a . w9

2023

ANEXO 26.

E-2023-80356

RESOLUCION 0695

MODIFICA LA RES. 04681



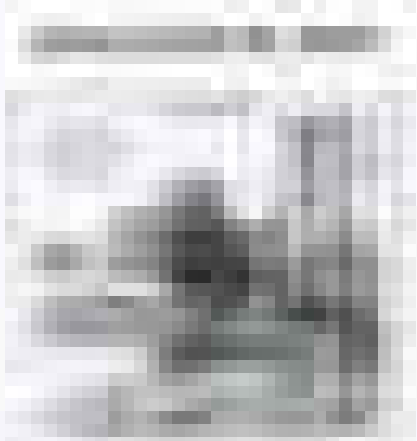

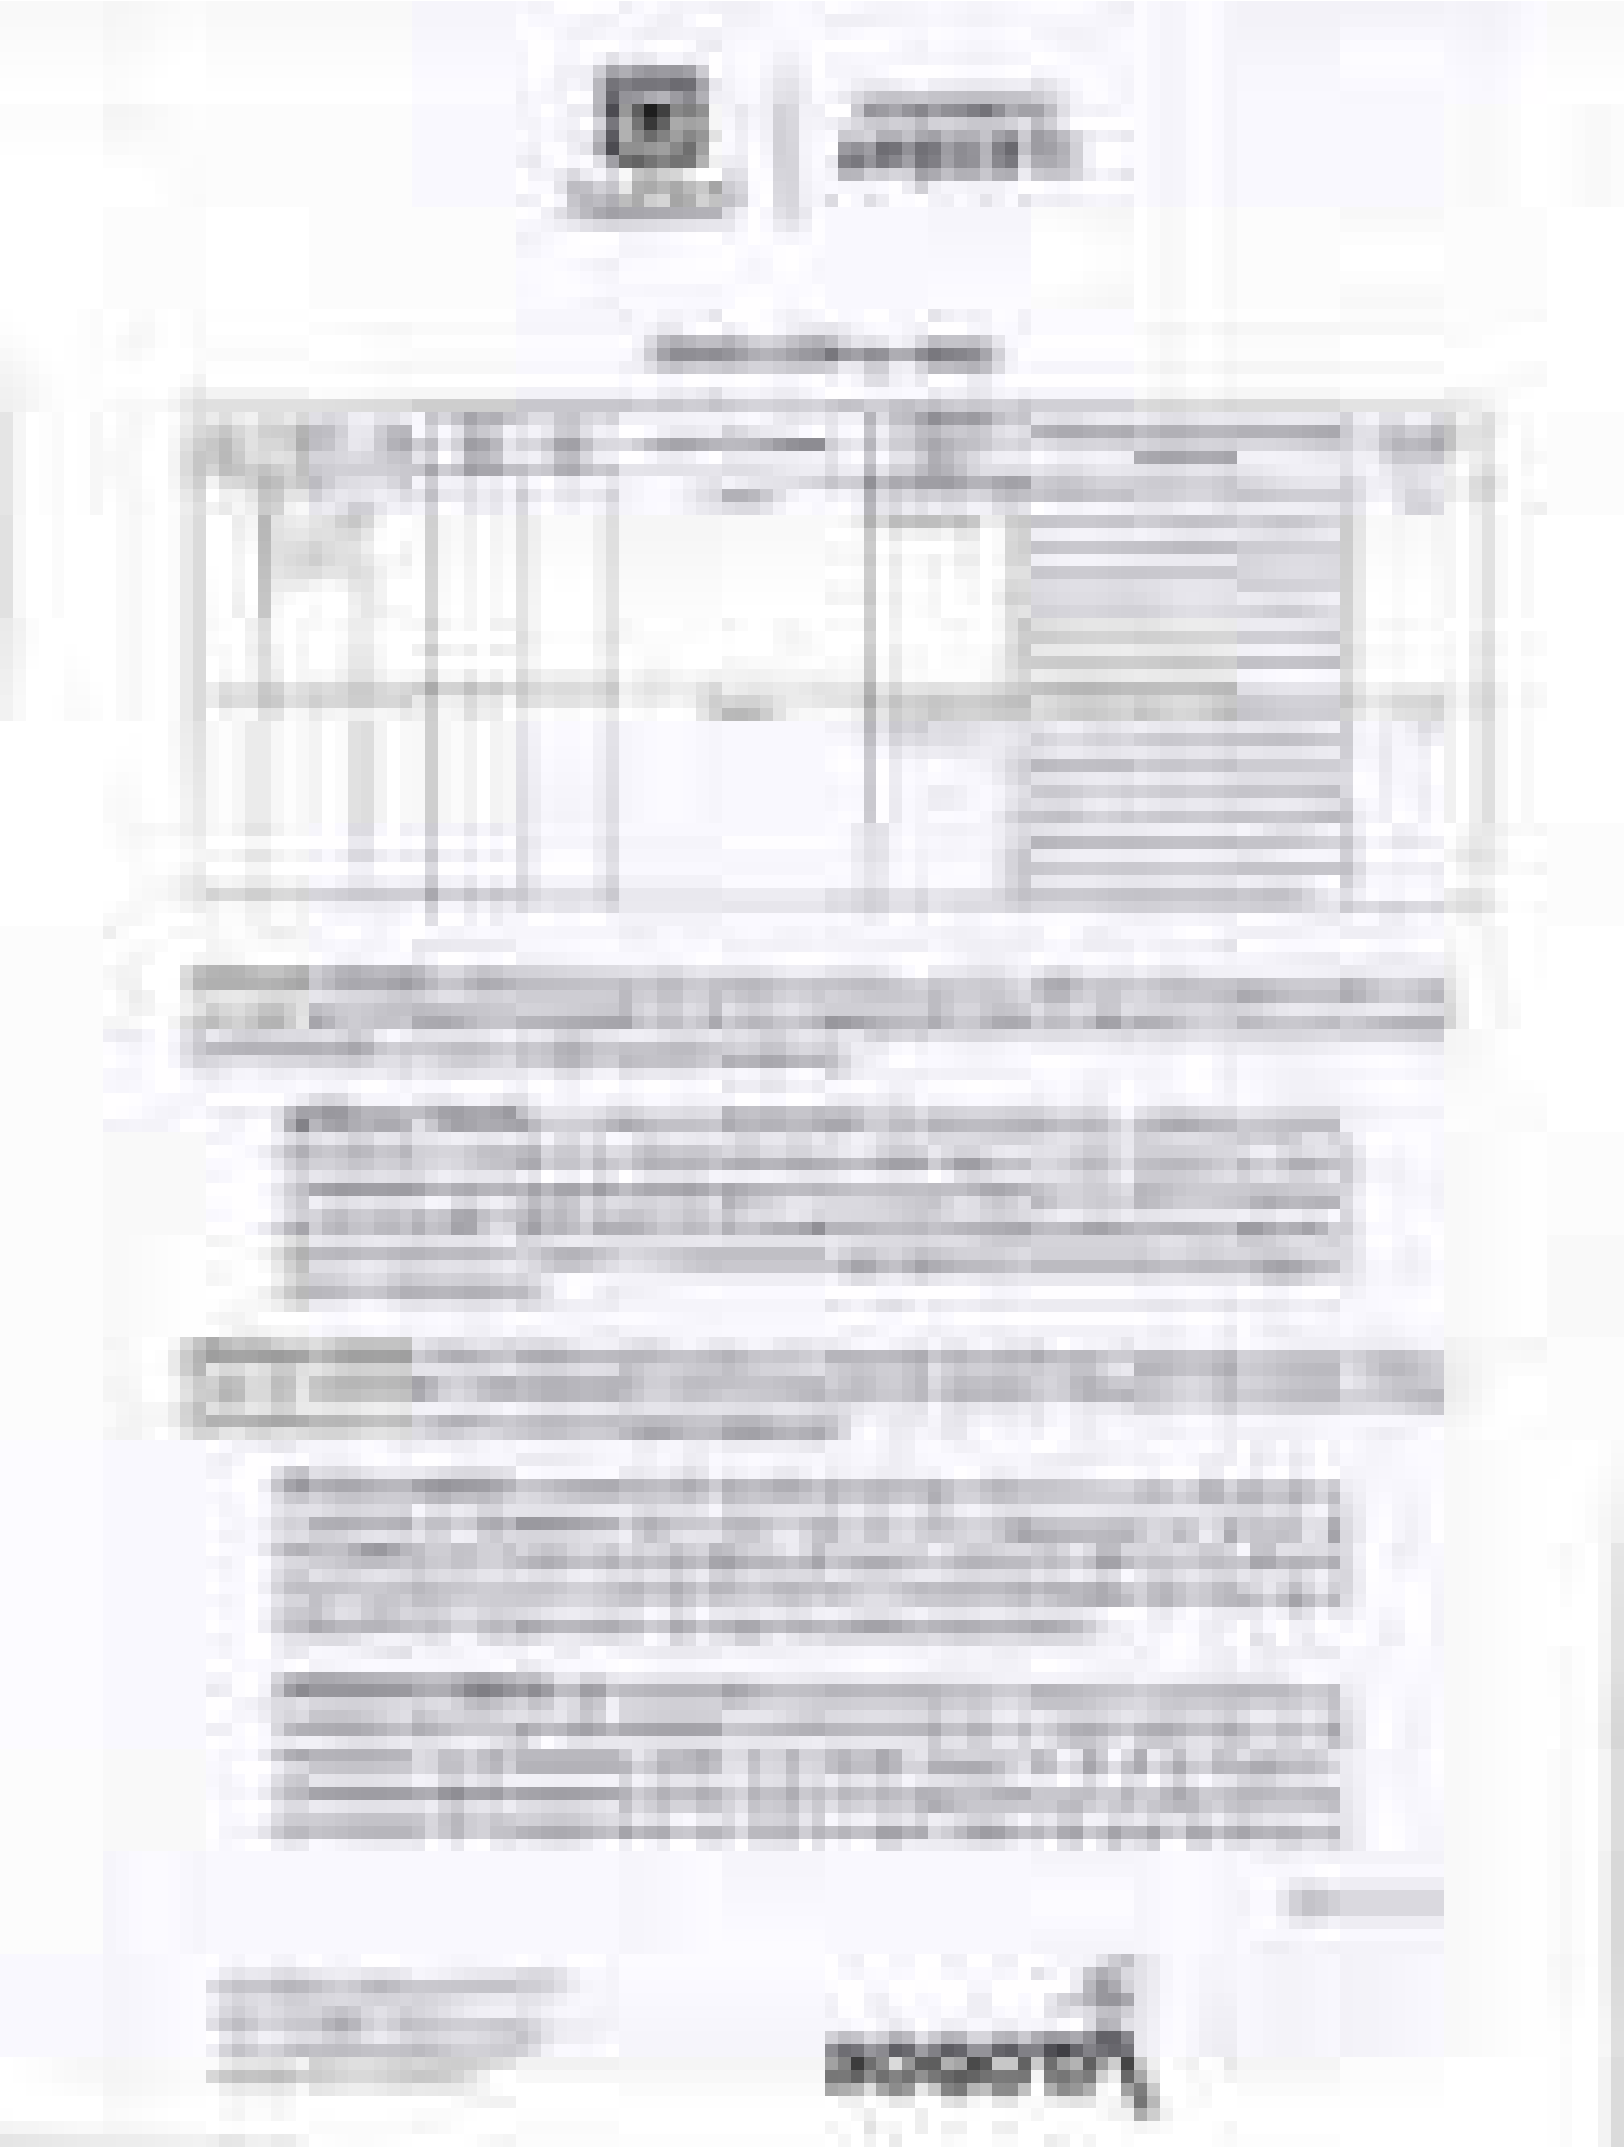

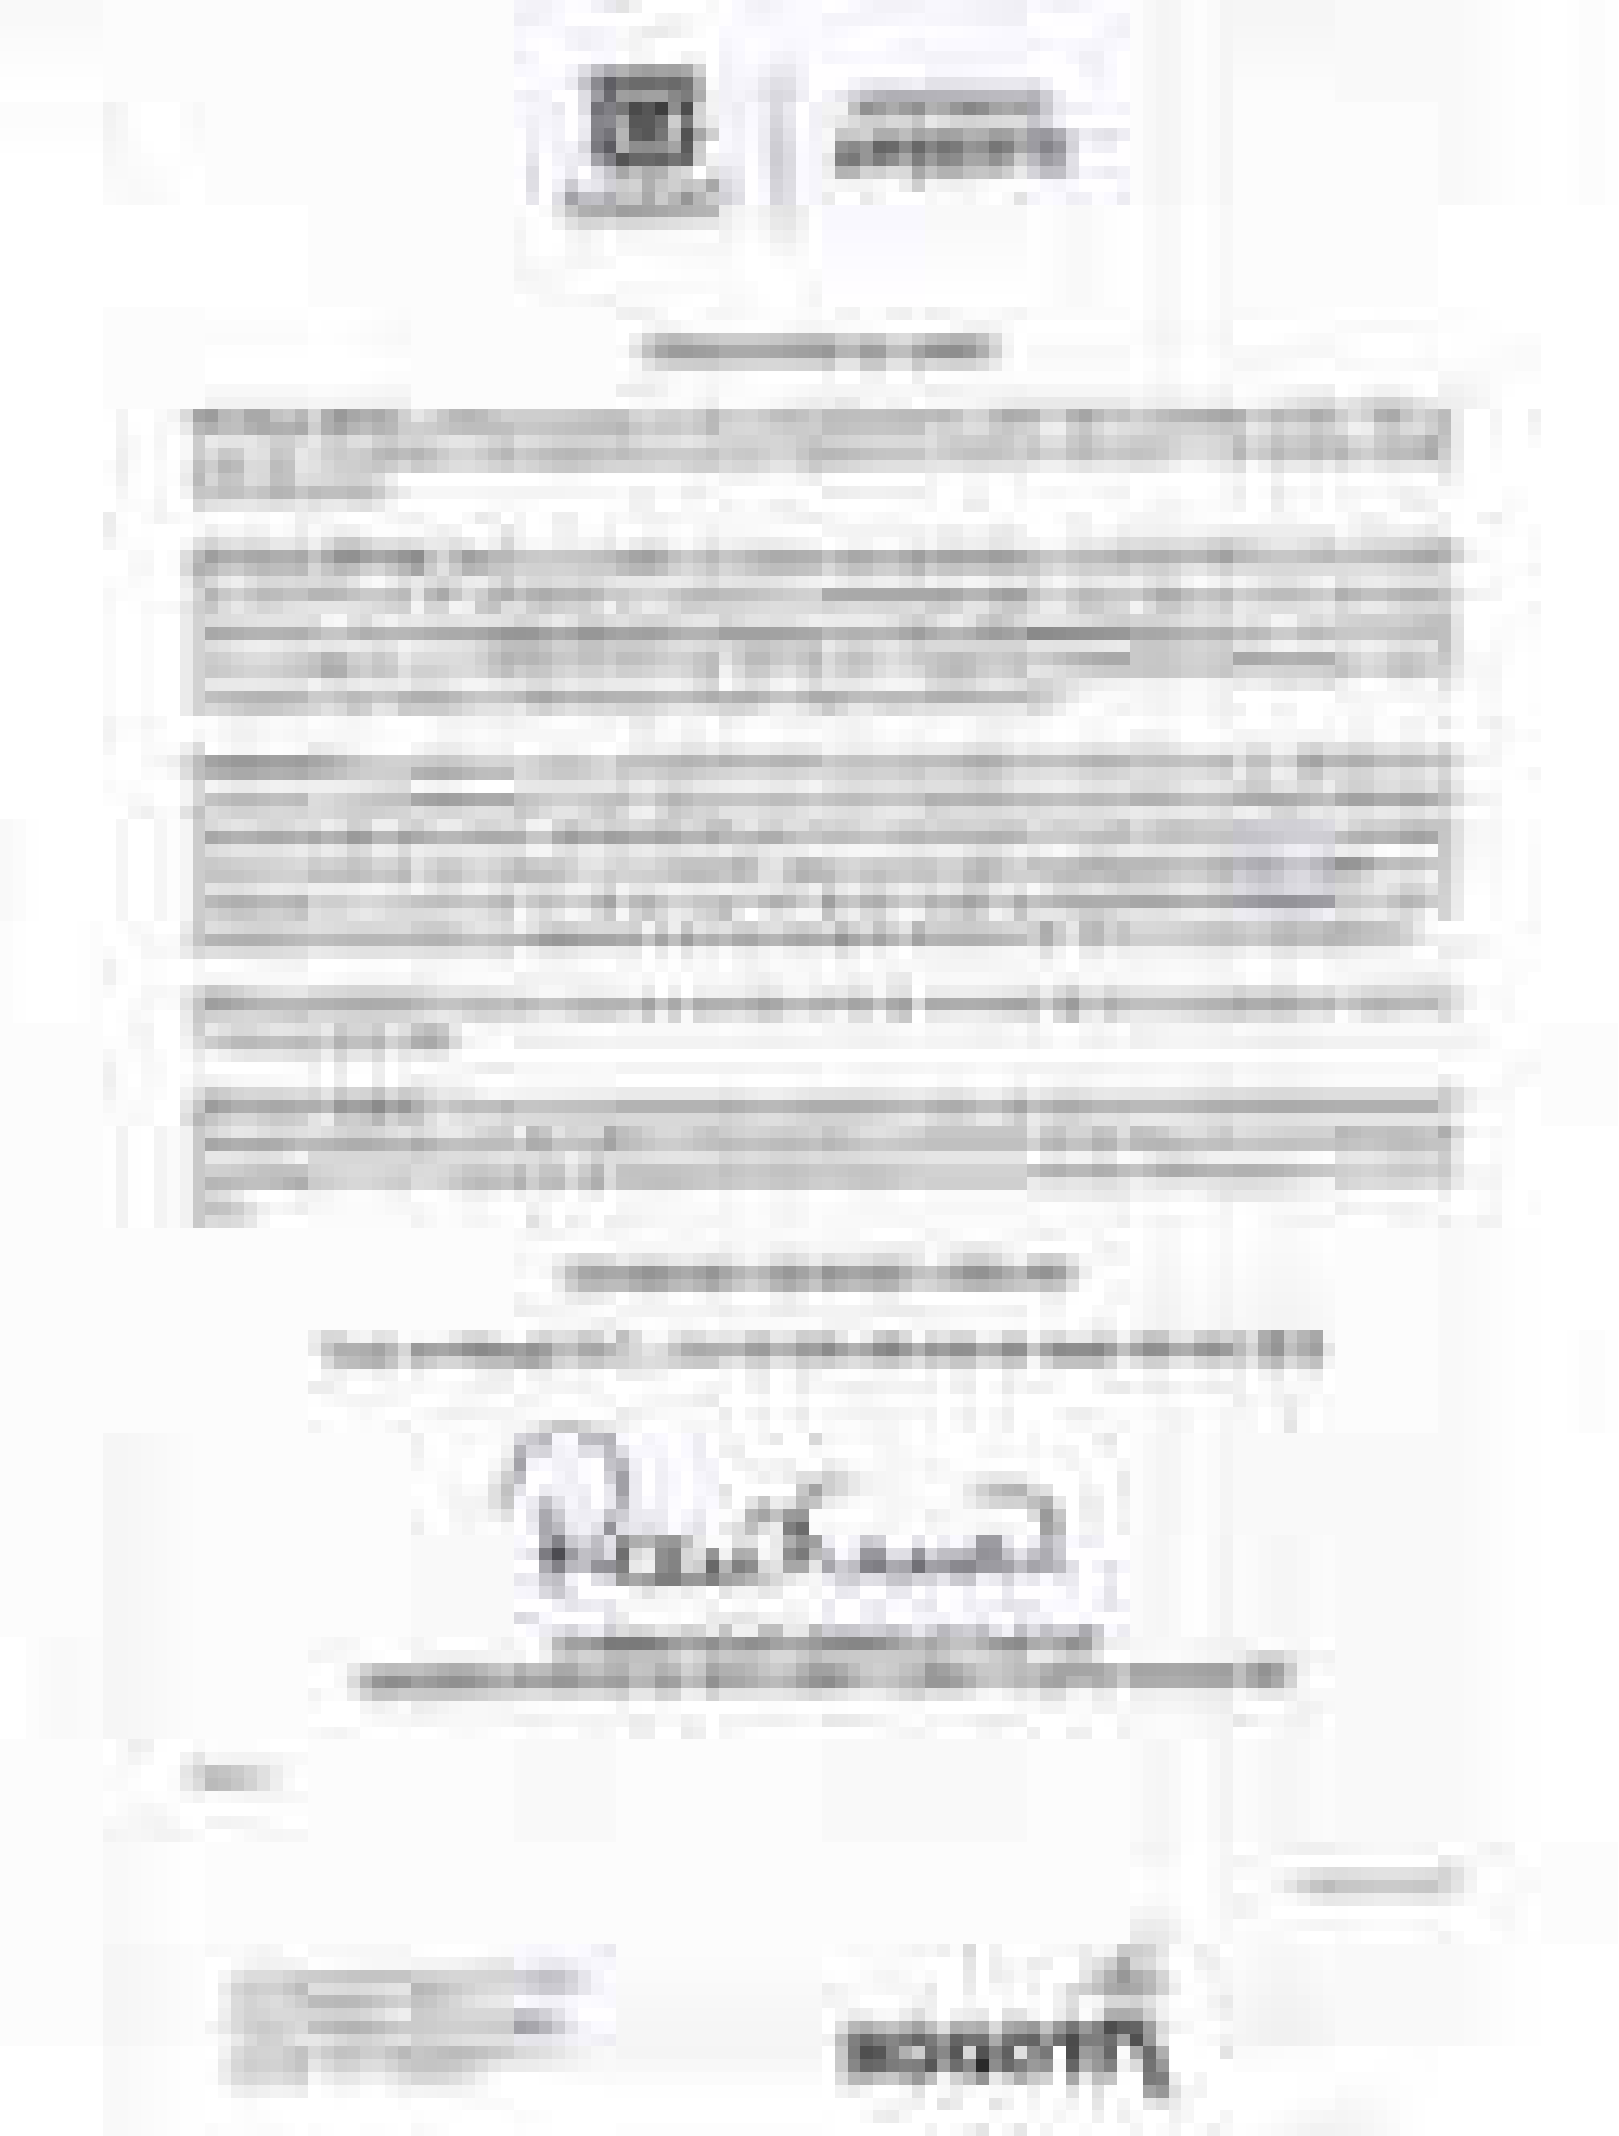

ANEXO ゐ2.

MAQUINARIA Y EQUIPOS {9t ¤L9a . w9

2023

303.5E2 CR, 304E2 CR, 305E2 CR, 305.5E2 CR

Mini Hydraulic Excavators

	303.5E2 CR	304E2 CR	305E2 CR	305.5E2 CR
Engine				
Engine Model	Cat® C1.7	Cat C2.4	Cat C2.4	Cat C2.4
Net Power (ISO 9249)	17.5 kW (23.5 hp)	30 kW (40.2 hp)	30 kW (40.2 hp)	32.9 kW (44.2 hp)
Weights				
Operating Weight with Canopy	3539 kg (7,803 lb)	3884 kg (8,564 lb)	5020 kg (11,069 lb)	5259 kg (11,596 lb)
Operating Weight with Cab	3723 kg (8,209 lb)	4039 kg (8,906 lb)	5185 kg (11,433 lb)	5423 kg (11,958 lb)
Operating Specifications				
Maximum Dig Depth	3180 mm (125 in)	3430 mm (135 in)	3670 mm (144 in)	3870 mm (152 in)

The right machine with the right power, versatility and ease of operation required for your application.

Contents

Operator Station....4
Operation and Hydraulic Control....5
Engine....5
COMPASS Control Panel....6
Compact Radius Design....8
Undercarriage....9
Dozer Blade....10
Coupler and Work Tool Options....11
Serviceability and Support....12
Specifications....13
Standard Equipment....19
Optional Equipment....19

The Cat E2 Series Mini Hydraulic Excavators are designed to carry on the solid performance of their E Series predecessors, while adding even greater value for the customer. The new High Definition Hydraulic (HDH) System, redesigned operator station and enhanced digital control panel specially designed for Cat Mini Excavators – COMPASS (Complete, Operation, Maintenance, Performance And Security System) – are all standard features that improve performance and increase value.

Operator Station

Productivity with Comfort and Quality

Comfortable Working Environment

The high quality suspension seat, 76 mm (3 in) retractable seat belt, easy to adjust armrests, and ergonomic layout provide superior comfort and reduce operator fatigue. The new interlocking front window system, updated operator interface and 100% pilot controls provide a best-in-class operator station and customer value.

Joystick Controls

The boom swing and auxiliary hydraulic functions are located at your fingertips providing smooth, easy operation. They also eliminate foot pedals and free up the floor for more room for the operator's feet. 100% pilot controls provide consistent flow and pressure throughout the life of the machine. This allows all controls to be locked out while starting the machine.

Operation and Hydraulic Control

Pushing Performance to the Limit

Powerful Digging, Precise Control

The new High Definition Hydraulic (HDH) System in the E2 machines provides a load sensing and flow sharing capability leading to operational precision, efficient performance and greater control. By combining variable pump efficiency, open center valve simplicity, and a simple architecture the valve achieves controllability. The simple valve architecture reduces heat which leads to a reduction in hydraulic instability and improved overall efficiency.

200 Degree Bucket Rotation

Industry leading bucket rotation of over 200 degrees provides greater material retention during truck loading.

It also allows for easier vertical wall digging without repositioning the machine.

Engine

Intelligent Operation

Engine

Each of the E2 models is equipped with the engine solution to best support the power and performance required based on the weight class and application. Also, standard features like auto idle offer consistent lower engine speeds to increase engine life and offer fuel savings.

Smart Technology is a new feature of the 303.5E2. Through the integration of this technology with the U.S. EPA Tier 4 Final 23.5 hp (17.6 kW) engine, the machine is able to meet and exceed performance of the previous generation 303.5E. Additionally, testing on the 303.5E2 revealed an 8% fuel economy improvement and 7% greater efficiency over the E Series.

Automatic Two Speed

With the standard automatic two speed feature, the machine will automatically balance high speed and torque travel requirements based on job site conditions to give the operator the optimum speed and control. The machine can be put in low gear if slower travel is desired while in tight conditions.

COMPASS Control Panel

Complete, Operation, Maintenance, Performance and Security System

The COMPASS control panel on the Cat E2 Series mini hydraulic excavators was specifically designed by Caterpillar for compact excavators. It adds several new features to the machines increasing the amount of customer value. All of the following features are now standard on all E2 Series models.

Complete – All of the control panel features are standard

Operation – Simple operation of the pattern changer, hydraulic quick coupler and fuel gauge visibility all at the push of a button

Maintenance – Maintenance intervals, diagnostics and work hours

Performance – Save up to 20% fuel while maintaining optimum performance levels

And

Security – Anti-theft device with individual user and master passwords

System – Ergonomically designed control panel

Passcode Protected Security System

A standard anti-theft device now comes on every E2 Series compact excavator. A five digit alphanumeric password is required to start the machine when the anti-theft feature is enabled. There is a master password and up to five user passwords can be created by the owner if desired.

Keep your machine safe on a busy job site by locking it when you are not around

Adjustable Auxiliary Work Tool Flow Control

The E2 Series machines now have simple adjustability of the flow going down the boom and stick to the work tool. Both the standard main line and optional secondary auxiliary hydraulics can be adjusted on a scale of 1–15 through a few buttons on the control panel.

Adjust the flow to your different tools with a simple push of a button

UNLOCK the new features and experience the value of the exclusive COMPASS control panel on the E2 Series compact excavators

Continuous Flow

Once this feature is enabled through a button on the monitor, the E2 Series machines can run in continuous flow mode. With the auxiliary hydraulics on the right hand joystick, just hold the roller switch at the desired flow rate and direction for 2.5 seconds and the machine will maintain that flow rate until it is turned off.

Maintain hydraulic flow to your tools at any flow and in any direction with the simple push of a button

Pattern Changer

Change the operating pattern between excavator and backhoe with a simple press of a button from the comfort of the cab.

Exclusive push button pattern changer is safe and easy

Maintenance and Performance Information

Easily keep track of various maintenance and performance parameters of your machine.

Reset the maintenance intervals and ensure the machine is receiving proper care maximizing the life of the machine

Compact Radius Design

Ease of Transport, Access and Operation

Compact Radius

The compact radius design gives greater machine versatility and the capability to work within confined areas. This allows the operator to concentrate on the work being done without having to worry about damaging the back of the machine or other job site obstacles. On the 305E2 CR and the 305.5E2 CR, the upper body stays within 140 mm (5.5 in) of the undercarriage.

Zero Tail Swing

The 303.5E2 CR and the 304E2 CR models feature a zero tail swing design. On these models, the radius of the upper body stays entirely within the width of the undercarriage.

Rubber Track – The standard rubber track lets you work on multiple surfaces such as grass, pavement or stone without damaging the surface or machine.

Steel Track Option – Optional steel track is available for harsh conditions such as demolition. The extra weight of the steel tracks generally provides better stability when digging over the side of the machine.

Rubber Pads – Optional rubber pads can be attached to the steel track to prevent damage to paved surfaces and minimize noise and vibration during travel with the steel track system. This option provides the maximum overall stability. (Not available on the 303.5E2 CR and 304E2 CR.)

Undercarriage
A Strong Foundation

Dozer Blade

Maximize your productivity

Simple Dozer Control with Float Function

The dozer function is pilot controlled from inside the cab, providing smooth, proportional operation. The standard float function is enabled by pushing the lever fully forward into the detent position. Cleanup and backfilling is easier since the operator does not have to adjust the blade height during travel.

Excellent Blade Visibility

Visibility to the blade is excellent in any position, allowing the blade to be positioned behind the operator and away from the front linkage for better access when back dragging and finishing in tight areas.

Angle Blade Option

Increase machine versatility with the Cat angle dozer blade. Built for strength and durability, the hydraulic angle blade features a hardened steel wear edge and good protection to cylinders and hydraulic lines. The angle blade can be positioned straight ahead or angled up to 25 degrees to the left or right. This reduces the number of times required to back up and reposition when backfilling so you can finish the job faster. All functions of the blade are controlled with one joystick using a proportional roller switch for the angle function.

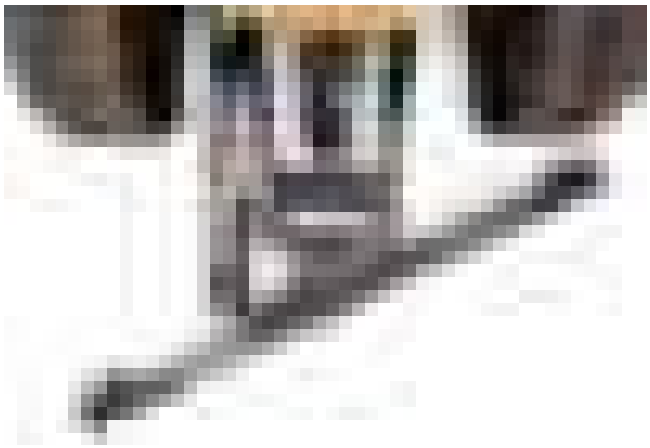

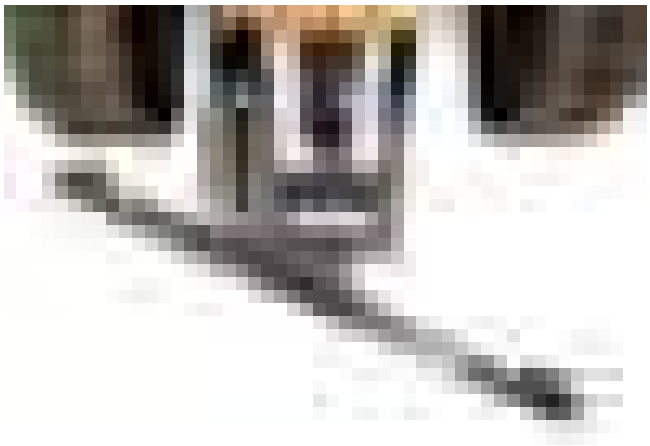

Coupler and Work Tool Options

Versatility for Any Application

Couplers

The E2 Series is available with a mechanical pin-grabber or a hydraulic pin-grabber quick coupler option. The coupler design uses a wedge to keep the tool secure to the coupler, reducing wear and maintaining a tight fit through the life of the coupler.

The hydraulic coupler allows the operator to change tools without leaving the comfort of the cab.

Wide Range of Work Tools

A wide range of Cat Work Tools have been designed specifically for the Cat Mini Hydraulic Excavators to maximize machine performance. Available work tools include:

- Buckets (heavy duty and heavy duty capacity)
- Tilting, Ditch Cleaning Buckets
- Hydraulic Hammers
- Augers
- Thumbs (not available in all regions)
- Vibratory Compactors
- Shears (boom mounted on 305E2 CR/305.5E2 CR only)
- Quick Coupler

Standard Thumb Ready Sticks

Machines come standard with stick mounted brackets, ready to fit a hydraulic thumb for even greater machine versatility.

A factory installed bracket and relief valve make hydraulic thumb installation simple and cost-effective.

Standard Auxiliary Lines and Accumulator

One-way and two-way auxiliary lines (combined function), including quick connections, are fitted as standard equipment so the machine comes ready to work. A standard accumulator allows for auxiliary pressure to be released, making connecting and disconnecting work tools safer and easier.

Serviceability and Support

Maximized Uptime and Ease of Service

Easy Service

Extended service intervals, durable components, and ease of service access points decrease your owning and operating costs while increasing your long-term value.

- Lifting side hood allows access to air filter, main implement valve, 1-way/2-way auxiliary flow selector, accumulator, fuel filter and hydraulic tank. This eliminates the need to lift the cab when maintaining and servicing the machine.
- Swing open door provides access to major components and service points including engine oil check and fill, vertically mounted engine oil filter, starter motor and alternator.
- Easy access to the radiator and oil cooler results in simplified cleaning and reduced maintenance times.
- S·O·S℠ oil sampling valve allows easy sampling of the hydraulic fluid for preventative maintenance.
- 500 hour engine oil and filter change period reduces operating costs and machine downtime.

Customer Support You Can Count On

Your Cat dealer is ready to assist you with your purchase decision and everything after.

- Financing packages are flexible to meet your needs.
- Unmatched parts availability keeps you working.
- Make comparisons of machines, with estimates of component life, preventative maintenance and cost of production.
- Your Cat dealer can evaluate the cost to repair, rebuild and replace your machine.
- For more information on Cat products, dealer services and industry solutions, visit *www.cat.com*.

Engine

Engine Model		
303.5E2 CR	Cat C1.7*	
304E2 CR/305E2 CR/305.5E2 CR	Cat C2.4**	
Rated Net Power (ISO 9249)		
303.5E2 CR	17.5 kW	23.5 hp
304E2 CR/305E2 CR	30 kW	40.2 hp
305.5E2 CR	32.9 kW	44.1 hp
Gross Power		
303.5E2 CR	18.5 kW	24.8 hp
304E2 CR/305E2 CR	31.2 kW	41.8 hp
305.5E2 CR	34.1 kW	45.7 hp
Bore	87 mm	3.4 in
Stroke		
303.5E2 CR	92.4 mm	3.6 in
304E2 CR/305E2 CR/305.5E2 CR	102.4 mm	4 in
Displacement		
303.5E2 CR	1.7 L	104 in^3
304E2 CR/305E2 CR/305.5E2 CR	2.4 L	146 in^3

* Cat C1.7 engine meets U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB emission standards.
** Cat C2.4 engine meets U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIA emission standards.

Weights*

Operating Weight with Canopy		
303.5E2 CR	3539 kg	7,803 lb
304E2 CR	3884 kg	8,564 lb
305E2 CR	5020 kg	11,069 lb
305E2 CR	5259 kg	11,596 lb
Operating Weight with Cab		
303.5E2 CR	3723 kg	8,209 lb
304E2 CR	4039 kg	8,906 lb
305E2 CR	5185 kg	11,433 lb
305E2 CR	5423 kg	11,958 lb

* Weight includes rubber tracks, bucket, operator, full fuel and auxiliary lines.

Travel System

Travel Speed – High		
303.5E2 CR	4.6 km/h	2.9 mph
304E2 CR	5.2 km/h	3.2 mph
305E2 CR	4.4 km/h	2.7 mph
305.5E2 CR	4.5 km/h	2.8 mph
Travel Speed – Low		
303.5E2 CR	3.2 km/h	2.0 mph
304E2 CR	3.3 km/h	2.1 mph
305E2 CR/305.5E2 CR	2.8 km/h	1.7 mph
Maximum Traction Force – High Speed		
303.5E2 CR	17.0 kN	3,822 lbf
304E2 CR	16.9 kN	3,799 lbf
305E2 CR	24.1 kN	5,418 lbf
305.5E2 CR	26.8 kN	6,025 lbf
Maximum Traction Force – Low Speed		
303.5E2 CR	31.1 kN	6,992 lbf
304E2 CR	31.0 kN	6,969 lbf
305E2 CR	45.2 kN	10,161 lbf
305.5E2 CR	47.8 kN	10,745 lbf
Ground Pressure		
303.5E2 CR	31.7 kPa	4.6 psi
304E2 CR	29.5 kPa	4.3 psi
305E2 CR	30.8 kPa	4.5 psi
305.5E2 CR	32.2 kPa	4.7 psi

Service Refill Capacities

Cooling System		
303.5E2 CR/304E2 CR	5.5 L	1.5 gal
305E2 CR/305.5E2 CR	10.5 L	2.8 gal
Engine Oil		
303.5E2 CR/304E2 CR	7.0 L	1.8 gal
305E2 CR/305.5E2 CR	9.5 L	2.5 gal
Fuel Tank		
303.5E2 CR/304E2 CR	46 L	12.2 gal
305E2 CR/305.5E2 CR	63 L	16.6 gal
Hydraulic Tank		
303.5E2 CR/304E2 CR	42.3 L	11.2 gal
305E2 CR/305.5E2 CR	68.3 L	18 gal
Hydraulic System		
303.5E2 CR/304E2 CR	65 L	17.2 gal
305E2 CR/305.5E2 CR	78 L	20.6 gal

303.5E2 CR, 304E2 CR, 305E2 CR, 305.5E2 CR Specifications

Hydraulic System*

Pump Flow		
303.5E2 CR/304E2 CR	100 L/min	26.4 gal/min
305E2 CR	150 L/min	39.6 gal/min
305.5E2 CR	163 L/min	43.1 gal/min
Operating Pressure – Equipment	245 bar	3,553 psi
Operating Pressure – Travel	245 bar	3,553 psi
Operating Pressure – Swing	216 bar	3,132 psi
Auxiliary Circuit – Primary		
303.5E2 CR/304E2 CR	70 L/min	18.5 gal/min
305E2 CR/305.5E2 CR	80 L/min	21.1 gal/min
Auxiliary Circuit – Secondary	25 L/min	6.6 gal/min
Digging Force = Stick (standard)		
303.5E2 CR	18.9 kN	4,249 lbf
304E2 CR	21.6 kN	4,856 lbf
305E2 CR	24.7 kN	5,553 lbf
305.5E2 CR	28.9 kN	6,497 lbf
Digging Force = Stick (long)		
303.5E2 CR	16.9 kN	3,799 lbf
304E2 CR	19.5 kN	4,384 lbf
305E2 CR	21.3 kN	4,788 lbf
305.5E2 CR	24.8 kN	5,575 lbf
Digging Force = Bucket		
303.5E2 CR	33.0 kN	7,419 lbf
304E2 CR	37.8 kN	8,498 lbf
305E2 CR	44.7 kN	10,049 lbf
305.5E2 CR	50.9 kN	11,443 lbf

* Load sensing hydraulics with variable displacement piston pump.

Swing System

Machine Swing Speed	10 rpm
Boom Swing – Left (without stop)	
303.5E2 CR/305E2 CR/305.5E2 CR	80°
304E2 CR	70°
Boom Swing – Left (with stop)	
303.5E2 CR/304E2 CR	55°
305E2 CR/305.5E2 CR	60°
Swing – Right	50°

Blade

Width		
303.5E2 CR	1780 mm	70 in
304E2 CR	1950 mm	77 in
305E2 CR/305.5E2 CR	1980 mm	78 in
Height		
303.5E2 CR/304E2 CR	325 mm	13 in
305E2 CR/305.5E2 CR	375 mm	14.8 in
Dig Depth		
303.5E2 CR/304E2 CR	470 mm	19 in
305E2 CR/305.5E2 CR	555 mm	21.9 in
Lift Height		
303.5E2 CR/304E2 CR	400 mm	16 in
305E2 CR/305.5E2 CR	405 mm	15.9 in

303.5E2 CR Dimensions

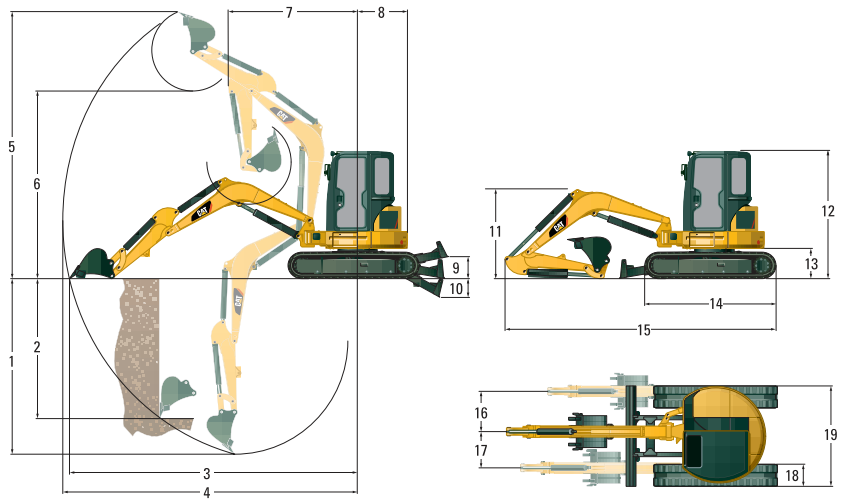

		Standard Stick		Long Stick	
1	Dig Depth	2880 mm	113 in	3180 mm	125 in
2	Vertical Wall	2320 mm	91 in	2470 mm	97 in
3	Maximum Reach at Ground Level	5060 mm	199 in	5320 mm	209 in
4	Maximum Reach	5200 mm	205 in	5440 mm	214 in
5	Maximum Dig Height	4920 mm	194 in	5030 mm	198 in
6	Maximum Dump Clearance	3520 mm	139 in	3640 mm	143 in
7	Boom In Reach	2060 mm	81 in	2180 mm	86 in
8	Tail Swing	890 mm	35 in	890 mm	35 in
9	Maximum Blade Height	400 mm	16 in	400 mm	16 in
10	Maximum Blade Depth	470 mm	19 in	470 mm	19 in
11	Boom Height in Shipping Position	1420 mm	56 in	1650 mm	65 in
12	O/A Shipping Height	2500 mm	98 in	2500 mm	98 in
13	Swing Bearing Height	565 mm	22 in	565 mm	22 in
14	O/A Undercarriage Length	2220 mm	87 in	2220 mm	87 in
15	O/A Shipping Length	4730 mm	186 in	4790 mm	189 in
16	Boom Swing Right	765 mm	30 in	765 mm	30 in
17	Boom Swing Left	670 mm	26 in	670 mm	26 in
18	Track Belt/Shoe Width	300 mm	12 in	300 mm	12 in
19	O/A Track Width	1780 mm	70 in	1780 mm	70 in

303.5E2 CR Lift Capacities at Ground Level*

Lift Point Radius		**3000 mm (9'8")**		**4000 mm (13'1")**	
		Front	**Side**	**Front**	**Side**
Blade Down	**kg**	1340	720	850	460
	lb	2,955	1,588	1,874	1,014
Blade Up	**kg**	750	660	470	420
	lb	1,654	1,455	1,036	926

* The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity rating standard ISO 10567:2007 and they do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping capacity. The excavator bucket weight is not included on this chart. Lifting capacities are for long stick.

304E2 CR Dimensions

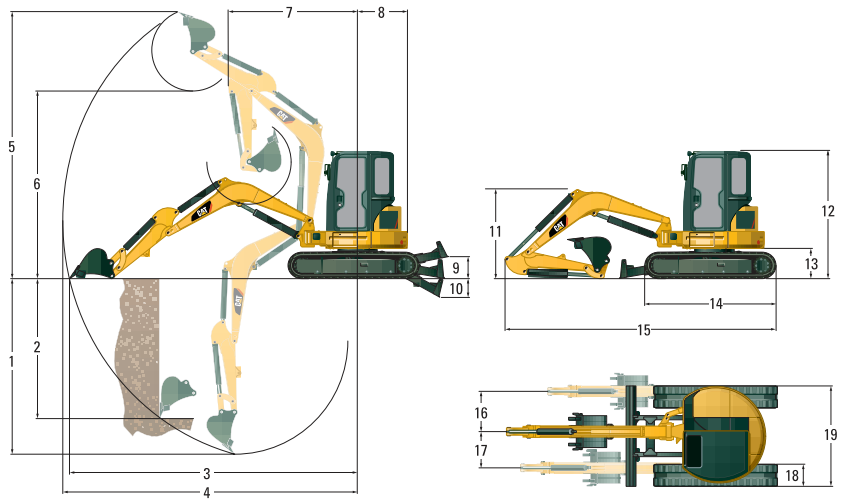

		Standard Stick		Long Stick	
1	Dig Depth	3130 mm	123 in	3430 mm	135 in
2	Vertical Wall	2420 mm	95 in	2560 mm	101 in
3	Maximum Reach at Ground Level	5220 mm	206 in	5470 mm	215 in
4	Maximum Reach	5350 mm	211 in	5590 mm	220 in
5	Maximum Dig Height	4980 mm	196 in	5070 mm	200 in
6	Maximum Dump Clearance	3590 mm	141 in	3690 mm	145 in
7	Boom In Reach	2110 mm	83 in	2220 mm	87 in
8	Tail Swing	975 mm	38 in	975 mm	38 in
9	Maximum Blade Height	400 mm	16 in	400 mm	16 in
10	Maximum Blade Depth	470 mm	19 in	470 mm	19 in
11	Boom Height in Shipping Position	1480 mm	58 in	1770 mm	70 in
12	O/A Shipping Height	2500 mm	98 in	2500 mm	98 in
13	Swing Bearing Height	565 mm	22 in	565 mm	22 in
14	O/A Undercarriage Length	2220 mm	87 in	2220 mm	87 in
15	O/A Shipping Length	4820 mm	190 in	4930 mm	194 in
16	Boom Swing Right	735 mm	29 in	735 mm	29 in
17	Boom Swing Left	670 mm	26 in	670 mm	26 in
18	Track Belt/Shoe Width	350 mm	14 in	350 mm	14 in
19	O/A Track Width	1950 mm	77 in	1950 mm	77 in

304E2 CR Lift Capacities at Ground Level*

Lift Point Radius		**3000 mm (9'8")**		**4500 mm (14'9")**	
		Front	**Side**	**Front**	**Side**
Blade Down	**kg**	1570	910	860	480
	lb	3,462	2,007	1,896	1,058
Blade Up	**kg**	820	820	430	430
	lb	1,808	1,808	948	948

* The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity rating standard ISO 10567:2007 and they do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping capacity. The excavator bucket weight is not included on this chart. Lifting capacities are for long stick.

305E2 CR Dimensions

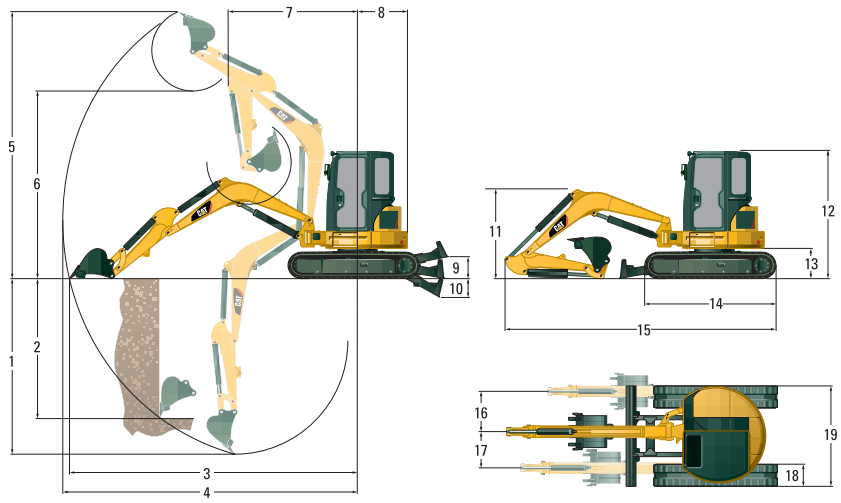

	Standard Stick		Long Stick	
1 Dig Depth	3280 mm	129 in	3670 mm	144 in
2 Vertical Wall	2320 mm	91 in	2630 mm	104 in
3 Maximum Reach at Ground Level	5430 mm	210 in	5810 mm	229 in
4 Maximum Reach	5600 mm	220 in	5960 mm	235 in
5 Maximum Dig Height	5250 mm	207 in	5440 mm	214 in
6 Maximum Dump Clearance	3720 mm	129 in	3920 mm	154 in
7 Boom In Reach	2350 mm	93 in	2530 mm	100 in
8 Tail Swing	1100 mm	43 in	1100 mm	43 in
9 Maximum Blade Height	405 mm	16 in	405 mm	16 in
10 Maximum Blade Depth	555 mm	22 in	555 mm	22 in
11 Boom Height in Shipping Position	1750 mm	69 in	2150 mm	85 in
12 O/A Shipping Height	2550 mm	100 in	2550 mm	100 in
13 Swing Bearing Height	615 mm	24 in	615 mm	24 in
14 O/A Undercarriage Length	2580 mm	102 in	2580 mm	102 in
15 O/A Shipping Length	5180 mm	204 in	5290 mm	208 in
16 Boom Swing Right	785 mm	31 in	785 mm	31 in
17 Boom Swing Left	695 mm	27 in	695 mm	27 in
18 Track Belt/Shoe Width	400 mm	16 in	400 mm	16 in
19 O/A Track Width	1980 mm	78 in	1980 mm	78 in

305E2 CR Lift Capacities at Ground Level*

Lift Point Radius		3000 mm (9'8")		4500 mm (14'9")	
		Front	**Side**	**Front**	**Side**
Blade Down	**kg**	2340	1200	1260	640
	lb	5,159	2,646	2,778	1,411
Blade Up	**kg**	1450	1070	760	570
	lb	3,197	2,359	1,676	1,257

* The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity rating standard ISO 10567:2007 and they do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping capacity. The excavator bucket weight is not included on this chart. Lifting capacities are for standard stick.

305.5E2 CR Dimensions

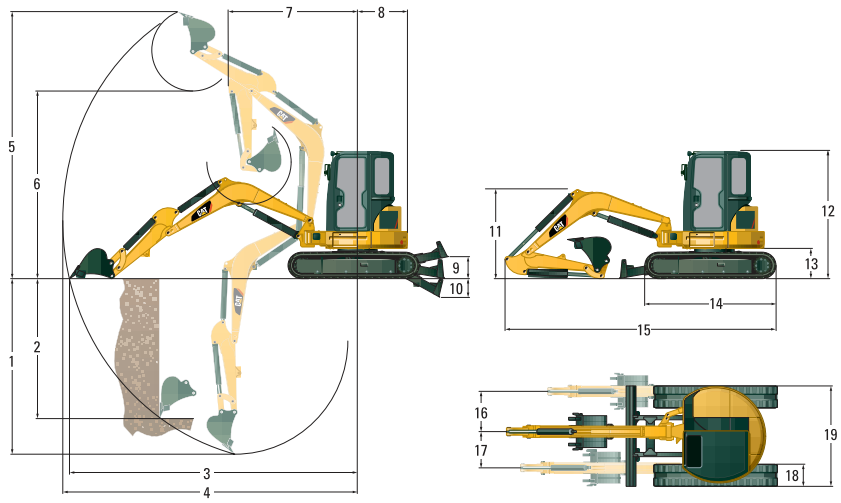

		Standard Stick		Long Stick	
1	Dig Depth	3470 mm	137 in	3870 mm	152 in
2	Vertical Wall	2330 mm	92 in	2730 mm	107 in
3	Maximum Reach at Ground Level	5630 mm	222 in	6020 mm	237 in
4	Maximum Reach	5790 mm	228 in	6170 mm	243 in
5	Maximum Dig Height	5330 mm	210 in	5590 mm	220 in
6	Maximum Dump Clearance	3820 mm	150 in	4080 mm	161 in
7	Boom In Reach	2400 mm	94 in	2530 mm	100 in
8	Tail Swing	1130 mm	44 in	1130 mm	44 in
9	Maximum Blade Height	405 mm	16 in	405 mm	16 in
10	Maximum Blade Depth	555 mm	22 in	555 mm	22 in
11	Boom Height in Shipping Position	1740 mm	69 in	2150 mm	85 in
12	O/A Shipping Height	2550 mm	100 in	2550 mm	100 in
13	Swing Bearing Height	615 mm	24 in	615 mm	24 in
14	O/A Undercarriage Length	2580 mm	102 in	2580 mm	102 in
15	O/A Shipping Length	5330 mm	210 in	5460 mm	215 in
16	Boom Swing Right	785 mm	31 in	785 mm	31 in
17	Boom Swing Left	695 mm	27 in	695 mm	27 in
18	Track Belt/Shoe Width	400 mm	16 in	400 mm	16 in
19	O/A Track Width	1980 mm	78 in	1980 mm	78 in

305.5E2 CR Lift Capacities at Ground Level*

Lift Point Radius		**3000 mm (9'8")**		**4500 mm (14'9")**	
		Front	**Side**	**Front**	**Side**
Blade Down	**kg**	2590	1290	1380	690
	lb	5,710	2,844	3,042	1,521
Blade Up	**kg**	1550	1150	820	620
	lb	3,417	2,535	1,808	1,367

* The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity rating standard ISO 10567:2007 and they do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping capacity. The excavator bucket weight is not included on this chart. Lifting capacities are for standard stick.

303.5E2 CR, 304E2 CR, 305E2 CR, 305.5E2 CR Standard Equipment

Standard Equipment

Standard equipment may vary. Consult your Cat dealer for details.

- 1-way and 2-way (combined function) auxiliary hydraulic lines
- Adjustable auxiliary flow control for work tools
- Adjustable wrist rests
- Alternator
- Anti-theft security system
- Automatic engine idle
- Automatic swing park brake
- Automatic two speed travel
- Auxiliary line quick disconnects
- Boom cylinder guard
- Cab mounted work light
- Canopy with Top Guard ISO 10262 (Level 1), ROPS ISO 12117-2 and TOPS ISO 12117
- Coat hook
- COMPASS display panel
- Cup holder
- Continuous flow
- Control pattern changer (not available in Europe)
- Dozer blade with float function
- Floor mat
- Foot travel pedals
- Horn
- Hydraulic oil cooler
- Lifting eye on bucket linkage (standard equipment for all regions except Europe)
- Lockable storage box
- Low maintenance linkage pin joints
- Maintenance free battery
- Rubber track
- Retractable seatbelt
- Stick
  - 303.5E2 CR/304E2 CR – Long stick (optional in Europe)
  - 305E2 CR/305.5E2 CR – Standard stick
- Suspension seat, vinyl covered
- Thumb Ready sticks (standard equipment for all regions except Europe)
- Travel alarm (optional in Europe)

303.5E2 CR, 304E2 CR, 305E2 CR, 305.5E2 CR Optional Equipment

Optional Equipment

Optional equipment may vary. Consult your Cat dealer for details.

- Air conditioning
- Angle dozer blade with float function
- Beacon socket for canopy machines
- Boom check valve (Europe only)
- Boom mounted light
- Cab, radio ready with Top Guard ISO 10262 (Level 1), ROPS ISO 12117-2 and TOPS ISO 12117 with heater/defroster, interior light and windshield wiper/washer
- Ecology drain valve for hydraulic tank
- High back suspension seat, fabric covered
- Hydraulic quick coupler lines
- Lifting eye on bucket linkage (optional in Europe, standard for all other regions)
- Stick
  - 303.5E2 CR/304E2 CR – Standard stick (Europe only)
  - 305E2 CR/305.5E2 CR – Long stick
- Mechanical quick coupler
- Mirrors for cab and canopy
- Seatbelt, 75 mm (3 in) wide (optional in Europe, standard in all other regions)
- Secondary auxiliary hydraulic lines
- Steel track and steel track with rubber pads

For more complete information on Cat products, dealer services, and industry solutions, visit us on the web at **www.cat.com**

AEHQ7365 (12-2014)

© 2014 Caterpillar
All rights reserved

Materials and specifications are subject to change without notice. Featured machines in photos may include additional equipment. See your Cat dealer for available options.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, their respective logos, "Caterpillar Yellow" and the "Power Edge" trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Certificado de Aportes

Se certifica que GL TRANSPORTES SUMINISTROS Y AGREGADOS SAS identificado(a) con NI 900647082 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PEDRO PABLO DIAZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 79918811

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30																		$1,160,000		$0
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30																		$1,160,000		$0
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30																		$0	0%	$0
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30																		$0	0%	$0
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		$1,160,000	6.96%	$80,800
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		$1,160,000	4%	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-03-21 a las 09:27.

GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO

Código:	Versión:	Páginas:
FO-SST-26	2	1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA/ SERIAL	MODELO	TIPO:	MARCA:	COLOR:
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA

SERIE	No MOTOR:	CILINDRAJE:	USO DE LA MAQUINARIA	No INTERNO UPN
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
10070	7-may-22	10270

MOTOR

Cant. válvulas por cilindro:	Cantidad de cilindros:	Turbo:	Orientación:
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -

Tipo de dirección:	Tipo de transmisión:	Numero de velocidades:	Tipo de	Suspensión delantera:
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		

Suspensión trasera:	Número llantas:	Dimensión de Rines:	Material de rines:

FRENOS

Tipo de frenos delanteros :	Tipo de frenos traseros:
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA

Numero de Serie:	Número de ventanas:	Capacidad de carga
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
07-MAY-2022	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
07-MAY-2022	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
07-MAY-2022	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
07-MAY-2022	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
07-MAY-2022	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO

Código:	Versión:	Páginas:
FO-SST-26	2	1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA/ SERIAL	MODELO	TIPO:	MARCA:	COLOR:
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA

SERIE	No MOTOR:	CILINDRAJE:	USO DE LA MAQUINARIA	No INTERNO UPN
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
10270	9-jul-22	10470

MOTOR

Cant. válvulas por cilindro:	Cantidad de cilindros:	Turbo:	Orientación:
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -

Tipo de dirección:	Tipo de transmisión:	Numero de velocidades:	Tipo de	Suspensión delantera:
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		

Suspensión trasera:	Número llantas:	Dimensión de Rines:	Material de rines:

FRENOS

Tipo de frenos delanteros :	Tipo de frenos traseros:
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA

Numero de Serie:	Número de ventanas:	Capacidad de carga
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
09-jul-2022	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
09-jul-2022	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
09-jul-2022	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
09-jul-2022	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
09-jul-2022	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO

Código:	Versión:	Páginas:
FO-SST-26	2	1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA/ SERIAL	MODELO	TIPO:	MARCA:	COLOR:
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA

SERIE	No MOTOR:	CILINDRAJE:	USO DE LA MAQUINARIA	No INTERNO UPN
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
10470	10-sep-22	10670

MOTOR

Cant. válvulas por cilindro:	Cantidad de cilindros:	Turbo:	Orientación:
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -

Tipo de dirección:	Tipo de transmisión:	Numero de velocidades:	Tipo de	Suspensión delantera:
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		

Suspensión trasera:	Número llantas:	Dimensión de Rines:	Material de rines:

FRENOS

Tipo de frenos delanteros :	Tipo de frenos traseros:
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA

Numero de Serie:	Número de ventanas:	Capacidad de carga
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
10-sep-2022	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
10-sep-2022	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
10-sep-2022	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
10-sep-2022	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
10-sep-2022	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO

Código:	Versión:	Páginas:
FO-SST-26	2	1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA/ SERIAL	MODELO	TIPO:	MARCA:	COLOR:
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA

SERIE	No MOTOR:	CILINDRAJE:	USO DE LA MAQUINARIA	No INTERNO UPN
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
10670	12-nov-22	10870

MOTOR

Cant. válvulas por cilindro:	Cantidad de cilindros:	Turbo:	Orientación:
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -

Tipo de dirección:	Tipo de transmisión:	Numero de velocidades:	Tipo de	Suspensión delantera:
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		

Suspensión trasera:	Número llantas:	Dimensión de Rines:	Material de rines:

FRENOS

Tipo de frenos delanteros :	Tipo de frenos traseros:
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA

Numero de Serie:	Número de ventanas:	Capacidad de carga
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
12-nov-2022	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
12-nov-2022	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
12-nov-2022	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
12-nov-2022	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
12-nov-2022	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO

Código:	Versión:	Páginas:
FO-SST-26	2	1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA/ SERIAL	MODELO	TIPO:	MARCA:	COLOR:
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA

SERIE	No MOTOR:	CILINDRAJE:	USO DE LA MAQUINARIA	No INTERNO UPN
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
10870	14-ene-23	11070

MOTOR

Cant. válvulas por cilindro:	Cantidad de cilindros:	Turbo:	Orientación:
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -

Tipo de dirección:	Tipo de transmisión:	Numero de velocidades:	Tipo de	Suspensión delantera:
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		

Suspensión trasera:	Número llantas:	Dimensión de Rines:	Material de rines:

FRENOS

Tipo de frenos delanteros :	Tipo de frenos traseros:
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA

Numero de Serie:	Número de ventanas:	Capacidad de carga
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
14-enr-2023	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
14-enr-2023	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
14-enr-2023	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
14-enr-2023	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
14-enr-2023	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO

Código:	Versión:	Páginas:
FO-SST-26	2	1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA/ SERIAL	MODELO	TIPO:	MARCA:	COLOR:
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA

SERIE	No MOTOR:	CILINDRAJE:	USO DE LA MAQUINARIA	No INTERNO UPN
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
11070	6-mar-23	11270

MOTOR

Cant. válvulas por cilindro:	Cantidad de cilindros:	Turbo:	Orientación:
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -

Tipo de dirección:	Tipo de transmisión:	Numero de velocidades:	Tipo de	Suspensión delantera:
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		

Suspensión trasera:	Número llantas:	Dimensión de Rines:	Material de rines:

FRENOS

Tipo de frenos delanteros :	Tipo de frenos traseros:
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA

Numero de Serie:	Número de ventanas:	Capacidad de carga
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
06/03/23	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
06/03/23	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
06/03/23	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
06/03/23	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
06/03/23	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

INFORMACION DEL EQUIPO O MAQUINARIA				
NOMBRE DEL EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**N° INTERNO**	**SEDE ACTUAL**
APISONADOR TIPO CANGURO	DINKIN	2022	135	BOGOTA



	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Frecuencia Mantenimiento						
		7 dias	**15 dias**	**30 días**	**60 días**			
1	Verifique estado de escobillas. remplace si es necesario			X				
2	Verifique estado de grasa. cambie si es necesario			X				
3	Verifique el correcto funcionamiento switch on/off. repare o remplace lo que sea necesaro			X				
4	Verifique el estado del inducido. remplace si es necesario			X				
5	Verifique el estado de los piñones. repare o remplace lo que sea necesario			X				
6	Revise la mango de agarre. repare o remplace si es necesaro			X				
7	Verifique el correcto funcionamiento del sistema de sujecion del disco de corte. repare o remplace lo que sea necesario			X				
8	Verifique estado del campo. repare o remplace lo que sea necesario			X				
9	Verifique el estado de los rodamientos y ajustes de rodamientos. repare o remplace lo que sea necesario			X				
10	Verifique el correcto funcionamiento de la guarda de seguridad. repare o remplace lo que sea necesario			X				
11	Revise el estado de la base de apoyo. repare o remplace lo que sea necesario			X				
12	Revise el estado y el corrrecto funcionamiento del colector. remplace si es necesario			X				
13	Revise estado y ajuste de tornillos. repare o remplace lo que sea necesario			X				
14	Revise el estado del cable de poder. remplace lo que sea necesario			X				
15	Revise el estado y verifique el correcto funcionamiento de sistema de sujecion y angulo. remplace si esnecesario			X				
16	Verifique el estado de la guarda de seguridad del disco. repare o remplace lo que sea necesario			X				
17	Verifique el correcto funcionamiento y operacion del equipo			X				
18	Realice limpieza y restaure el equipo si es necesario			X				
19	Compruebe marcacion y adhesivos de seguridad. Marque nuevamente si esten estropeadas o gastadas			X				

TIPO MTTO **MP = PREVENTIVO** **MC = CORRECTIVO**

ITEM	**FECHA MTTO**	**TOMA HOROMETRO**	**TOMA KILOMETRAJE**	**ACTIVIDAD/TAREA REALIZADA**	**TIPO MTTO**	**PIEZA INSTALADA**	**MARCA PIEZA**	**SERVICIO REALIZADO**	**HORAS**	**COSTO $**	**NOMBRE MECANICO**	**PROVEEDOR**
1	08/07/2022	N/A	N/A	ALISTAMIENTO	PREVENTIVO	NO	NO	SI	1 H	0	SISNEY RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS SAS
1	18/07/2023	N/A	N/A	CAMBIO DE ACEITE-LIMPIEZA A CARBURADOR-LIMPIEZA FILTROS DE AIRE-AJUSTE GENERAL	PREVENTIVO	NO	N/A	SI	1,5H	0	ALEX RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS SAS

INFORMACION DEL EQUIPO O MAQUINARIA				
NOMBRE DEL EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**N° INTERNO**	**SEDE ACTUAL**
APISONADOR TIPO CANGURO	DINKIN	2022	151	BOGOTA



	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Frecuencia Mantenimiento						
		7 dias	**15 dias**	**30 días**	**60 días**			
1	Verifique estado de escobillas. remplace si es necesario			X				
2	Verifique estado de grasa. cambie si es necesario			X				
3	Verifique el correcto funcionamiento switch on/off. repare o remplace lo que sea necesaro			X				
4	Verifique el estado del inducido. remplace si es necesario			X				
5	Verifique el estado de los piñones. repare o remplace lo que sea necesario			X				
6	Revise la mango de agarre. repare o remplace si es necesaro			X				
7	Verifique el correcto funcionamiento del sistema de sujecion del disco de corte. repare o remplace lo que sea necesario			X				
8	Verifique estado del campo. repare o remplace lo que sea necesario			X				
9	Verifique el estado de los rodamientos y ajustes de rodamientos. repare o remplace lo que sea necesario			X				
10	Verifique el correcto funcionamiento de la guarda de seguridad. repare o remplace lo que sea necesario			X				
11	Revise el estado de la base de apoyo. repare o remplace lo que sea necesario			X				
12	Revise el estado y el corrrecto funcionamiento del colector. remplace si es necesario			X				
13	Revise estado y ajuste de tornillos. repare o remplace lo que sea necesario			X				
14	Revise el estado del cable de poder. remplace lo que sea necesario			X				
15	Revise el estado y verifique el correcto funcionamiento de sistema de sujecion y angulo. remplace si esnecesario			X				
16	Verifique el estado de la guarda de seguridad del disco. repare o remplace lo que sea necesario			X				
17	Verifique el correcto funcionamiento y operacion del equipo			X				
18	Realice limpieza y restaure el equipo si es necesario			X				
19	Compruebe marcacion y adhesivos de seguridad. Marque nuevamente si esten estropeadas o gastadas			X				

TIPO MTTO **MP = PREVENTIVO** **MC = CORRECTIVO**

ITEM	**FECHA MTTO**	**TOMA HOROMETRO**	**TOMA KILOMETRAJE**	**ACTIVIDAD/TAREA REALIZADA**	**TIPO MTTO**	**PIEZA INSTALADA**	**MARCA PIEZA**	**SERVICIO REALIZADO**	**HORAS**	**COSTO $**	**NOMBRE MECANICO**	**PROVEEDOR**
1	08/07/2022	N/A	N/A	ALISTAMIENTO	PREVENTIVO	NO	NO	SI	1 H	0	SISNEY RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS SAS
2	18/07/2023	N/A	N/A	CAMBIO DE ACEITE-CAMBIO FILTRO D AIRE-LIMPIEZA PREFILTROS DE AIRE-LIMPIEZA GEMERAL-AJUSTE	PREVENTIVO	SI	TPM	SI	1H	0	ALEX RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS SAS

Fecha Técnica

APISONADOR
Tipo Canguro

ESPECIFICACIONES	VALORES
Frecuencia de Impacto	10 Hz (600 Rpm)
Fuerza de Impacto	15 Kn (1500 Kg)
Velocidad de Desplazamiento	820 mt / h
Salto	60 mm
Motor Honda GX 120 Gasolina	4 HP
Dimensiones Zapata	280x 330mm
Dimensiones Globales	450 x 780 x 1020 mm
Capacidad del Tanque	2,8L
Peso	85 Kg

DESCRIPCIÓN

El Apisonador tipo Canguro es un mecanismo de impacto vibratorio para la compactación de pequeñas zonas, su sistema de impacto vibratorio es consecutivo y de forma vertical apasionando uniformemente la superficie. Contiene un resorte resistente y lubricado de manera que su fuerza e impacto se combinan para crear mayor compactación. Se recomienda llevar un óptimo manejo del manual ya que esta máquina emite altos niveles de vibración que pueden afectar la salud del usuario.

MANEJO Y OPERACIÓN SEGURA

USE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL OPERAR ESTA MÁQUINA:

- ✓ Vestimenta ajustada que no impida el movimiento ▪ Gafas de seguridad con protectores laterales
- ✓ Protectores auditivos
- ✓ Zapatos o botas con punta de seguridad

SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN MIENTRAS EL MOTOR FUNCIONE:

- ✓ Mantenga la zona alrededor del tubo de escape libre de materiales inflamables.
- ✓ Revise las líneas y el tanque de combustible en busca de fugas y grietas antes de poner en marcha el motor.
- ✓ No haga funcionar la máquina si hay fugas presentes o si las líneas de combustible están sueltas.

MIENTRAS EL MOTOR FUNCIONE:

- ✓ No opere el motor cerca de chispas ni llamas.
- ✓ No toque el motor ni el silenciador mientras el motor está encendido, ni inmediatamente después de haberlo apagado.

SEGURIDAD EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL MOTOR:

- ✓ Limpie de inmediato el combustible que se derrame.
- ✓ Recargue el tanque de combustible en un área bien ventilada.
- ✓ Vuelva a colocar la tapa del tanque de combustible tras la recarga.
- ✓ No suministre combustible a un motor caliente o en marcha.
- ✓ La electricidad estática puede encender el combustible o sus vapores.

MONOCILINDRO RL600 21



TIPO DE EQUIPO:	MONOCILINDRO RL600	**MODELO:**	RL-600B	**MARCA:**	ROLLER	**LINEA:**	COMPACTACION	**CHASIS:**	N/A
SERIAL MOTOR No:	T0560021090015	**CILINDRAJE**	200CC	**CAPACIDAD**	1TND	**CARROCERIA**	N/A	**SERIE**	BP22040706
MARCA:	ROLLER	**FECHA INH INV:**	**N/A**	**PLACA:**	N/A	**No. INTERNO:**	21	**SUCURSAL:**	BOGOTA

Responsable del registro: **SISNEY RODRIGUEZ**

DATOS TECNICOS		
CAMBIO	**FRECUENCIA**	**REFERENCIA**
FILTRO AIRE	50h	160/200
FILTRO ACPM	n/a	n/a
FILTRO ACPM TRAMPA	n/a	n/a
FILTRO ACEITE	n/a	n/a

ITEM	FECHA	KILOMETRAJE	ACTIVIDAD REALIZADA	TIPO MTTO	PIEZA INSTALADA	MARCA PIEZA	SERVICIO REALIZADO	HORAS	COSTO $	NOMBRE MECANICO	PROVEEDOR
1	09/12/22	N/A	REVISION A FLUIDOS-REVISION Y AJUSTE TORNILLERIA-REVISION A MOTOR- LIMPIEZA GENERAL- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	MP	NO	N/A	SI	1.5	N/A	ALEX RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS
2	22/03/23	N/A	REVISION ACEITE DE MOTOR-CAMBIO FILTRO DE AIRE-REVISION A CORREAS-LIMPIEZA GENERAL-PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	MP	SI	TPM	SI	1	N/A	SISNEY RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS

MONOCILINDRO 250

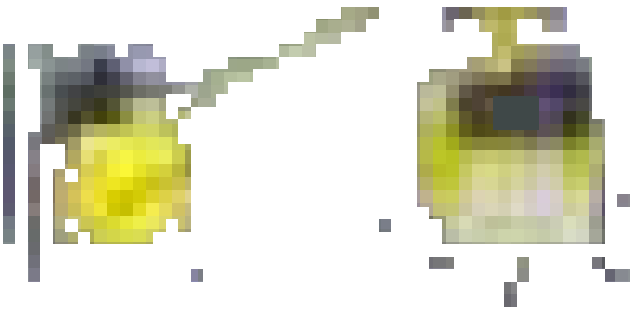

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	VALORES
Peso	250 Kg
Fuerza Centrífuga	10 KN
Frecuencia Vibratoria	77 HZ
Velocidad de Marcha	19 - 25 m/min
Potencia Motor	5.5 HP
Combustible	Gasolina
Ángulo de Ascenso	20 - 25°

DIMENSIONES	VALORES
Ancho Total (B)	67,8 cm
Ancho del Rodillo	56 cm
Diámetro del Rodillo	40 cm
C_1	12,5 cm
C_2	33 cm
H	90 cm
L	110 cm
O_1	10 cm

ANEXO

PLAN GESTION VECTORES

GUIA DE MANEJO DE PLAGAS Y ROEDORES

PROYECTO CONSTRUCCION COLEGIO MARIA BETSABE ESPINAL

EBISU EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

1. OBJETIVO

Desarrollar e implementar las actividades de prevención, control y eliminación de plagas y roedores, a ejecutar en los diferentes frentes de obra con el fin de evitar la infestación de estos.

2. ALCANCE

Aplica para las instalaciones de los diferentes frentes de obra.

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

- **Control de insectos:** El procedimiento de manejo y control de plagas deberá estar diseñado para controlar los insectos que generan contaminación cruzada por acarreo pasivo como Moscas, mosquitos, Cucarachas y Hormigas.

- **Control de roedores:** Desde el punto de vista sanitario, de protección de alimentos y otros bienes, sólo revisten importancia los roedores comensales, es decir, aquellos que viven en estrecho contacto con el hombre. Esto animales Pueden ser vectores de importantes enfermedades para el hombre con la Contaminación de los alimentos.

- **Des infestación:** Es la acción de eliminar insectos por medios químicos, mecánicos o con la aplicación de medidas de saneamiento básico.

- **Desratización:** Es la acción destinada a eliminar roedores mediante métodos de saneamiento básico, mecánicos o químicos.

- **ETA:** Enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada, o se cree que es causada por el consumo de alimentos o agua contaminada.

- **Plaga:** Son todos aquellos animales que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas. Su presencia resulta molesta y desagradable, pudiendo dañar estructuras o bienes, y constituyen uno de los más importantes vectores para la propagación de enfermedades, entre las que se destacan las **enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).**

- **Roedor:** Orden de mamíferos caracterizados por poseer un único par de dientes incisivos de gran tamaño, de crecimiento continuo; son generalmente de pequeña envergadura, con el cuerpo cubierto de pelo y vegetarianos. Los roedores (ratas, ratones) pueden transmitir enfermedades si tienen acceso a los lugares donde se almacenan comestibles, siendo la aparición de excremento señal de su presencia. Estos animales llevan gérmenes patógenos, causantes de enfermedades, en sus patas, piel y aparato intestinal, ya que suelen andar y alimentarse en basureros y cloacas, constituyendo así un importante foco de infección.

- **Vector:** Se denomina vector a todo organismo que actúa como mecanismo trasmisor de un agente patógeno entre el medio ambiente y el hombre o de un organismo a otr

4. CONTENIDO DE LA GUÍA

4.1 Marco teórico

Las plagas representan una gran amenaza a la salud de las personas, inocuidad y aptitud del alimento.

Se pueden reducir al mínimo las probabilidades de infestación mediante un buen saneamiento, la inspección de los materiales introducidos y una buena vigilancia, limitando así la necesidad del uso de productos químicos.

El plan de mantenimiento e higiene y el de plagas y roedores debe ser integral e incluir todas las estrategias para lograr un adecuado manejo de plagas. Se entiende por integral a la implementación del conjunto de operaciones físicas, químicas y de gestión para minimizar la presencia de plagas.

Recordemos que los insectos y roedores necesitan ambientes que les provean:

- Aire
- Humedad
- Alimento
- Refugio

Para evitar su desarrollo, se deben generar acciones teniendo en cuenta las siguientes medidas, que deben realizarse en forma continua.

- No dejar alimentos o desechos al interior de las oficinas.
- Alimentos de animales en empaques cerrados o canecas con tapa.
- Limpiar todos los restos de comidas en superficies o áreas al finalizar cada día.
- Limpiar la grasa retenida en las zonas de cocina.
- Barrer los suelos, inclusive debajo de las mesas y las máquinas, especialmente cerca de las paredes.
- Limpiar los desagües.
- Limpiar toda el agua estancada y derrames de bebidas cada noche.
- Recoger trapos, delantales, servilletas y manteles sucios. Lavar los elementos de tela con frecuencia.
- No guardar cosas en cajas de cartón y en el suelo.
- Depositar alimentos sobre estibas y retirados de la pared.
- No depositar la basura en cercanías de la zona de elaboración.
- No depositar la basura por largos periodos de tiempo.

Con la aplicación de estas acciones se crean condiciones adversas lo cual dificulta el desarrollo de las distintas plagas.

4.1.1. Clasificación e identificación

En general las plagas urbanas se pueden clasificar como:

Salud Pública	Industriales	Circunstanciales
Vectores- Roedores: Cuando son habituales vectores de enfermedades y/o portadores de gérmenes patógenos, (roedores, moscas, mosquitos, cucarachas, pulgas, piojos) o cuando son parásitos internos o externos de los seres humanos	De productos almacenados o actividades agrarias como producción de alimentos o comunes de jardines y zonas verdes.	Murciélagos, palomas, arañas, escorpiones, víboras y fauna salvaje que coinciden con lugares rurales o cercas de Ecosistemas naturales, al estar en una zona provista de buena Vegetación (Zona rural).

4.1.2. Tipos de controles

- **Barreras físicas y dispositivos mecánicos**.

Además de las acciones de prevención son importantes las medidas de control físico. Este consiste en acciones de exclusión de las plagas en las zonas de manipulación y de elaboración.

El uso de distintos elementos no químicos para la captura de insectos, como por ejemplo las trampas de luz UV para insectos voladores, las trampas adhesivas o de pegamentos para insectos o roedores y las cortinas de aire, son consideradas acciones físicas.

Otro tipo de barreras es el control de malezas en áreas peri-domiciliarias o caminos de acceso. Los agujeros de los desagües, sifones y otros lugares por los que puedan penetrar las plagas deberán mantenerse cerrados herméticamente.

Mediante barreras protectores como redes metálicas o mosquiteros, colocadas por ejemplo en las ventanas abiertas, las puertas y aberturas de ventilación, se reducirá el problema de la entrada de plagas.

Se prestará atención especial a la actividad de las aves. Se debe evitar que aniden cerca del servicio de alimentación.

- **Control químico.**

El tratamiento con productos químicos (cebos, insecticidas) debe realizarse de manera que no presente una amenaza para las personas y la inocuidad o aptitud del alimento.

La aplicación de productos químicos debe ser realizada por personal idóneo y capacitado para tal fin.

Hay que recordar que la inadecuada manipulación y/o aplicación de estos productos puede traer aparejados problemas de intoxicaciones.

Las medidas de lucha que comprendan el tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos sólo se deben aplicar bajo la supervisión directa del profesional responsable y autorizado por la autoridad competente.

Se deben mantener registros apropiados de la utilización de plaguicidas.

4.2. Recomendaciones generales

- Los equipos y utensilios deben estar protegidos de la contaminación, conservándolos siempre en condiciones sanitarias adecuadas.
- Mantener herméticos y apartados del suelo sobre estibas, todos los alimentos envasados y no envasados. El sector destinado al almacenamiento de substancias alimenticias debe estar herméticamente cerrado.
- Procurar que las áreas estén ordenadas de modo que la visibilidad sea completa, evitando los recovecos.
- Inspeccionar todas las materias primas, canastillas que llegan al servicio de alimentación para asegurarse de que no transporten ninguna plaga.
- Verificar el estado general de pisos, techos y paredes: si encuentra agujeros o grietas, séllelos.
- Asegurarse de que los pisos se encuentren libres de restos de comida, fundamentalmente en los sectores más críticos, tales como cocina, depósitos y baños.
- Mantener las áreas de lavado y residuos libres de trabas o recovecos. En la cocina, higienice periódicamente los azulejos, bajo mesadas, hornos, utensilios, refrigeradores.
- Disponer de entretechos o falsos techos emplazados, revise periódicamente su estado: estos sitios pueden servir de refugio a roedores e insectos.
- Poner el mayor cuidado en evitar la contaminación de los alimentos. No se deben utilizar envases de alimentos, nuevos o ya usados para medir, diluir, utilizar o almacenar plaguicidas u otras sustancias no alimentarias.

4.3. Descripción del proceso

4.3.1 Diagnóstico para control de plagas en las instalaciones de los diferentes frentes de obra.

Diagnóstico de las locaciones ubicadas en los diferentes frentes de obra que nos permita determinar qué pasos debemos seguir para obtener los resultados esperados (impedir la proliferación por malos hábitos y la contaminación del producto por la presencia de plagas).

4.3.2 Manejo y control de artrópodos – plagas

Detección de las especies presentes en las diferentes sedes (Oficinas, Bodegas, Puntos Ecológicos)

Nombre	Descripción	Fotografía
Cucaracha Americana (Periplaneta americana).	Es conocida como cucaracha voladora, es la de mayor tamaño, pude llegar hasta 37 mm y tiene un color rojizo, las dos especies, tanto machos como hembras tienen alas, se las diferencia por el largo de estas, en la primera las alas le sobrepasan el abdomen y en la segunda tienen prácticamente la misma longitud. Se las suele ver en lugares húmedos y oscuros como son: cimientos, drenajes, pozos ciegos, cañerías y ángulos superiores de techos de sótanos. Generalmente se alimentan de materiales en descomposición, pegamentos, papeles, telas, jarabes y dulces entre otros. Las especies adultas pueden vivir de 2 a 3 meses sin alimentos y 1 mes sin tomaragua.	
Cucaracha Alemana	Habitad: Generalmente asociada a las viviendas y edificios, se refugia en lugares estrechos, húmedos y oscuros, donde los individuos esperan la oscuridad de la noche para iniciar su actividad. Se reproducen sexualmente, las hembras llevan en el abdomen una ooteca durante varios días o semanas y la abandonan poco antes de la eclosión de los huevos. Las Ninfas pasan por un proceso de mudas que puede llegar a tener de 5 a 7 estadios. Comportamiento: son insectos gregarios, si lo necesitan practican el canibalismo ante la falta de alimento, hecho que aprovechan los insecticidas de última **generación** para su control, pero generalmente se alimentan de restos y residuos alimentarios generados por las personas. Tienen especial predilección por los alimentos ricos en fécula como patatas, pan, harina, etc.	
Mosquito del Dengue Hemorrágico (Aedes aegipty).	Son dípteros de la familia Culícido, con géneros como Culle, Aedes y Anopheles, todos presentes en México. Son importantes transmisores de enfermedades como el paludismo y la fiebre amarilla, sus larvas son acuáticas por lo que los mosquitos son muy comunes en temporada de lluvias constantes o poco después de ella, donde existe agua estancada y en zonas donde existen contenedores permanentes, artificiales o naturales. Únicamente las hembras son hematófagas. Los mosquitos experimentan una metamorfosis completa. Las larvas atraviesan por cuatro estados ninfales, es un período que varía de 4 a 10 días, a fin de formar la pupa. Esta etapa puede durar entre un día y varias semanas. Cuando está lista para la adultez, se eleva a la superficie del agua y abandona la piel pupal. Casi todas las especies se mueven activamente en el agua.	
Mosca Doméstica (Musca común).	Su ciclo de vida tiene 4 estadios: huevo, larva, pupa y adulto, y tarda en completarse unas 3 semanas en condiciones favorables. Transmite mecánicamente disentería, diarrea, fiebre tifoidea, cólera, lepra, poliomelitis y lombrices parásitas; también puede causar infecciones cutáneas. Deja sobre los alimentos y los platos excrementos que pueden contaminar la comida.	

Nombre	Descripción	Fotografía
Cucaracha Americana (Periplaneta americana).	Es conocida como cucaracha voladora, es la de mayor tamaño, pude llegar hasta 37 mm y tiene un color rojizo, las dos especies, tanto machos como hembras tienen alas, se las diferencia por el largo de estas, en la primera las alas le sobrepasan el abdomen y en la segunda tienen prácticamente la misma longitud. Se las suele ver en lugares húmedos y oscuros como son: cimientos, drenajes, pozos ciegos, cañerías y ángulos superiores de techos de sótanos. Generalmente se alimentan de materiales en descomposición, pegamentos, papeles, telas, jarabes y dulces entre otros. Las especies adultas pueden vivir de 2 a 3 meses sin alimentos y 1 mes sin tomaragua.	
Cucaracha Alemana	Habitad: Generalmente asociada a las viviendas y edificios, se refugia en lugares estrechos, húmedos y oscuros, donde los individuos esperan la oscuridad de la noche para iniciar su actividad. Se reproducen sexualmente, las hembras llevan en el abdomen una ooteca durante varios días o semanas y la abandonan poco antes de la eclosión de los huevos. Las Ninfas pasan por un proceso de mudas que puede llegar a tener de 5 a 7 estadios. Comportamiento: son insectos gregarios, si lo necesitan practican el canibalismo ante la falta de alimento, hecho que aprovechan los insecticidas de última **generación** para su control, pero generalmente se alimentan de restos y residuos alimentarios generados por las personas. Tienen especial predilección por los alimentos ricos en fécula como patatas, pan, harina, etc.	
Hormigas	Las hormigas prefieren los alimentos dulces, azucares, jarabes, jugos de frutas, etc. Se caracterizan por sus antenas y por un exoesqueleto que cubre y protege sus cuerpos. Como todo insecto, no poseen pulmones y respiran a través de espiráculos ubicados	
Garrapatas	Se encuentran frecuentemente en pastos, son transportadas fácilmente, hasta que encuentran un lugar cálido para anidarse. Las garrapatas son ácaros macroscópicos caracterizados por poseer cuatro pares de patas y un cuerpo globoso, aplanado dorsoventralmente y no segmentado, que la diferencia de otros arácnidos, cuyo cuerpo está dividido en dos partes (el cefalotórax y el abdomen). Las garrapatas son ectoparásitos obligados que se alimentan de la sangre de sus hospedadores (hematófagos).	

- **Formas de aplicación y control**

Aspersión	Para aplicaciones de superficies efecto residual, con equipo manual apropiado para fumigaciones contra insectos rastreros, en áreas donde la fumigación tenga que ser localizada.
Nebulización	Sistema intermedio, equipo motor, sistema que emana partículas micronizadas en forma de vapor en la cual la partícula queda suspendida en el ambiente, controlando plagas tanto voladoras como rastreras, especial para usarse en campo abierto.
Aplicación de feromonas:	Nuevo sistema para el control de mosca, se aplica con brocha a nivel de marcos de puertas, ventanas y paredes no porosas que no tengan contacto con el agua. Producto a base de feromonas siendo un atrayente sexual, es muy efectivo para controlar la mosca. Es importante implementar este sistema a la entrada de cada proceso para formar una barra protectora.
Gel cucarachicida	Cebo de excelente palatabilidad para cucarachas, no necesita desocupar instalaciones, es inodoro y tiene efecto dominó. Especial para aplicar en aparatos eléctricos y electrónicos con presencia de cucarachas como: computadores, básculas, horno microondas, cocinas, etc.
Insecticidas Químicos	SUSTANCIAS ACTIVAS: DELTAMETRINA – ALFAMETRINA – CIPERMETRINA (Cada insecticida debe ser cambiado después de seis aplicaciones para evitar inmunidad de las plagas a controlar y es importante revisar la originalidad del insecticida, que sea de salud pública y la fecha de vencimiento).

4.3.3 Manejo y control de roedores

- **Detección de las especies presentes (Oficinas, comedores, puntos ecológicos, bodegas)**
  - **Rata de alcantarilla (Ratus norvegicus).**

Roedor de gran tamaño, pesa 560 gr vive en el alcantarillado en un sistema de madrigueras que siempre es perimetral a las edificaciones, especialmente en aquellos lugares que manejan o almacenan alimentos. Es responsable del deterioro de las instalaciones, consume diariamente 25 gr de alimento y portadora de una importante carga patológica que suele transmitir por medio de su saliva.

Se presenta infestación de ratas y ratones por el manejo de ambientes que genera condiciones propicias para proliferación como es el desorden en las instalaciones, inadecuadas condiciones de limpieza y aseo, malezas circundantes alojando escombros de elementos en desuso a la intemperie. Su pelaje, orín, saliva y materia fecal son altamente contaminantes.

Por vivir en zonas sucias como alcantarillas transportan grandes cantidades de microorganismos patógenos.

- **Rata Negra o de los Tejados (Rattus rattus)**

Los roedores de los tejados se pueden encontrar en entretechos, árboles, anida en bodegas, graneros. Apariencia: de 16 a 24 Cm de longitud, cola más larga que la cabeza y el cuerpo, de 150 a 200 gramos de peso, hocico puntiagudo, orejas grandes y cuerpo pequeño si se compara con el guaren (Rattus norvegicus).

Ciclo de vida, de 5 a 10 crías por camada, de 3 a 6 camadas por año, el periodo de gestación es de unas tres semanas, tardan de 12 a 16 semanas desde su nacimiento hasta la madurez sexual.

Son ágiles y pueden escalar paredes, casi nunca escarban y no se las suele ver al aire libre, su alimento preferido son las frutas frescas o alimentos con alto contenido en agua, comen una medida de 15 gramos de comida al día, beben 15 ml.

- **Ratón doméstico (Mus musculus).**

Pequeño y delgado, pesan de 10 a 21 gr, orejas largas, cola semidesnuda y larga; mide de 7 a 11 cm de largo, coloración muy variable, desde café grisáceo hasta gris claro en el dorso y desde gris a blanco en el vientre.

Son muy curiosos ante objetos nuevos en lugares comunes para ellos, prefiriendo la mayoría de las veces alimentos nuevos a los ya conocidos. Por lo general, buscan establecerse cerca de áreas de almacenamiento de alimentos.

Son territoriales. Comen de una manera intermitente, son básicamente omnívoros; los adultos consumen entre 3 y 4 gr de alimento diario. Los cereales y las semillas diversas son su alimento preferido.

Formas de aplicación

La desratización se realiza de la siguiente forma:

- **Medidas Toxicas (Estaciones de Cebadero).**

Recipiente porta-cebo removible, Elemento fundamental para el cumplimiento de normas **HACCP, BPM, AIB** etc. Puede ser utilizada como trampa adhesiva, dispositivo cocodrilo y cebadero.

Además, los roedores encuentran en la trampa una especie de refugio oscuro que es lo que ellos prefieren.

- **Ubicación de estaciones de cebado.**

Se colocarán cebos anticoagulantes de segunda generación, los cuales producen hemorragias internas, progresivas hasta causar la muerte sin alterar a la camada de roedores del motivo de la muerte masiva, estos serán ubicados en sitios estratégicos.

Las estaciones de cebado son distribuidas por todas las áreas para evaluar las posibles entradas y su presencia en determinados sitios de infestación y su posible sectorización. Se harán controles semanales en los que se evalúa el cebo en estado intacto para cambiarlo de sitio y hacer reposiciones en el cebo consumido.

Instalación de cebos colgantes en alcantarillas, en caso de ser necesario.

Cada estación de cebadero tendrá su respectiva señalización, que indique el tipo de Cebo aplicado, Antídoto y fecha de aplicación.

Periodicidad. Se realizan inspecciones semanales a las estaciones de cebado de roedores.

- **Productos para utilizar.** Bromadiolona y brodifacoum, los cuales se deben usar en presentaciones paletizadas y parafinadas.

La importancia de diferenciar las plagas consiste en establecer diversos mecanismos de prevención y control, porque cada una de ellas tiene diferentes niveles de comportamiento social y biológico.

4.4. Funciones del proceso

4.4.1. Residente Ambiental

Realiza la programación con el equipo BOAL con la cual se realiza el control de plagas y roedores en acompañamiento con el componente SST se programan capacitaciones.

4.4.2. Componente SST

Ejecuta las reuniones y/o capacitaciones planeadas para el personal de obra.



5. BIBLIOGRAFÍA

- Guía Científica de Truman para Operaciones de Control de Plagas. Bennett, G.W., Owens, J. M., Corrigan, R.

  M. Cuarta Edición. 1996.

- **Decreto 3075 de 1997:** De obligatorio cumplimiento en todas las plantas donde se fabrique, procese, envase, almacene y expenda alimentos.

  Artículo 29. El Plan de Saneamiento debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente e incluirá como mínimo los siguientes programas: Programa de Limpieza y desinfección, Programa de Desechos Sólidos y Programa de Control de Plagas.

  Las plagas entendidas como artrópodos y roedores deberán ser objeto de un programa de control específico, el cual debe involucrar un concepto de control integral, esto apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas de control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo.



6. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó
01	25/08/2023	Documento nuevo.	Residente Ambiental Manuel Solano Silva

Anexo 01: Cronograma de control integrado de plagas

ACTIVIDAD DE CONTROL DE VECTORES	SEDES	EMPRESA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Zancudos														
Moscas														
Hormigas														
Roedores (ratas y ratones)														

OBSERVACION:

INFORME 1. FUMIGACION

PROYECTO CONSTRUCCION COLEGIO MARIA BETSABE ESPINAL

EBISU EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

1. ALCANCE DE ACTIVIDADE DE FUMIGACION

- **VECTORES PLAGA**

Los vectores son animales que transmiten organismos patógenos a las personas y ocasionan enfermedades, a veces graves, en el ser humano.

- **AFECTACIÓN EN SALUD PÚBLICA**

Los Mosquitos, moscas, piojos, cucarachas, roedores, pulgas, caracoles acuáticos, flebótomos, chinches triatomineas, garrapatas son ejemplos de vectores de plagas más o menos conocidos, que provocan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas.

Los mosquitos son los vectores más importantes de enfermedades, pero no son, en absoluto, los únicos. Existen enfermedades que se transmiten por picaduras de moscas, por garrapatas, por pulgas, por piojos y por chinches, aunque en general son enfermedades menos frecuentes y más localizadas geográficamente.

2. QUE ENFERMEDADES SON TRANSMITIDAS POR INSECTOS

Los insectos chupadores de sangre que infectan a los humanos cuando pican causan las enfermedades. Su riesgo de ser infectado por un insecto aumenta cuando usted se encuentra en áreas donde ellos se juntan. Esto incluiría la hierba alta, los arbustos, los lugares cercanos al agua estancada (estanques), la arena, los bosques, basureros, áreas de obra y/o construcción, lotes baldíos y otros.

El animal que mayor causa de muertes humanas genera en el mundo, son los mosquitos.

- **Mosquito o zancudo**

Las palabras "zancudo" y "mosquito" se refieren al mismo insecto. Los mosquitos vuelan de un lugar a otro, por lo que es difícil mantenerlos fuera de ciertas áreas cuando hay una gran población en su comunidad

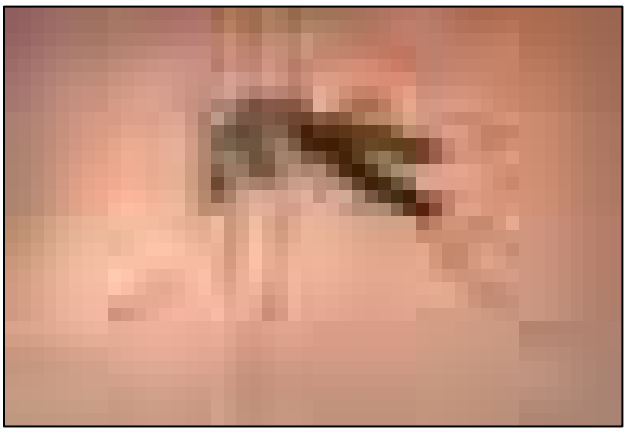

- **Pulga**

Este tipo de insecto también muy comunes puede generar algunas enfermedades y afectaciones en la salud de las personas.

Las pulgas son insectos holometábolos, es decir, tienen metamorfosis completa y pasan por un completo ciclo vital con estadios de huevo, larva, pupa y adulto.

- **Cucarachas**

Los blatodeos incluye a las cucarachas, cutias o baratas y a las termitas. Es un orden de insectos hemimetábolos paurometábolos de cuerpo aplanado. Se conocen más de 4500 especies de cucarachas en cerca de 500 géneros.Suelen ser de color castaño, rojo u oscuro y de cuerpo aplanado.

Estos tres tipos de insectos son los más comunes, dentro de los otros insectos que habitan en Bogotá.

3. CONTROL VECTORIAL PÓR MEDIO DE ASPERSIÓN O FUMIGACIÓN

JS AMBIENTE CONSTRUCCION CONSULTORES SAS, dentro de sus múltiples unidades de negocios cuenta con el servicio de fumigación a través de Colombiana de Intervenciones Ambientales, realiza controles mediante distintos métodos de aspersión manual y a motor, para el control de vectores plaga.

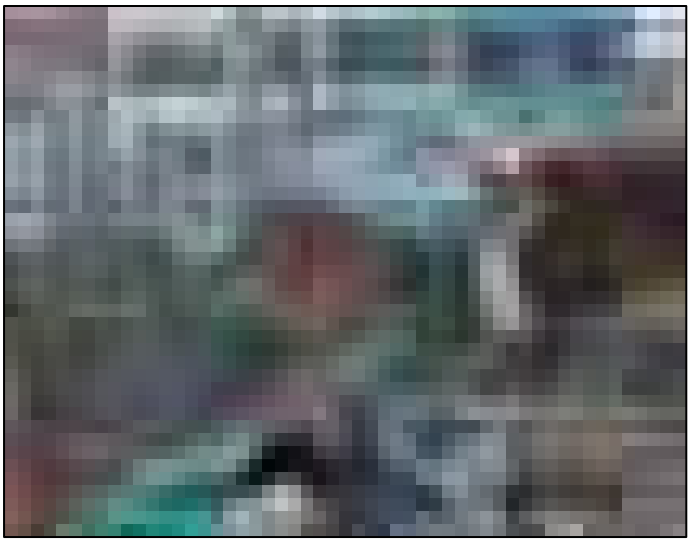

4. AREAS A TRATAR

El proceso de control vectorial se realizó por medio de aspersión química en todas las áreas al interior de la obra del Proyecto Colegio Boíta o Colegio María Betsabé Espinal.

- Puntos o zonas de almacenamiento de materiales de construcción

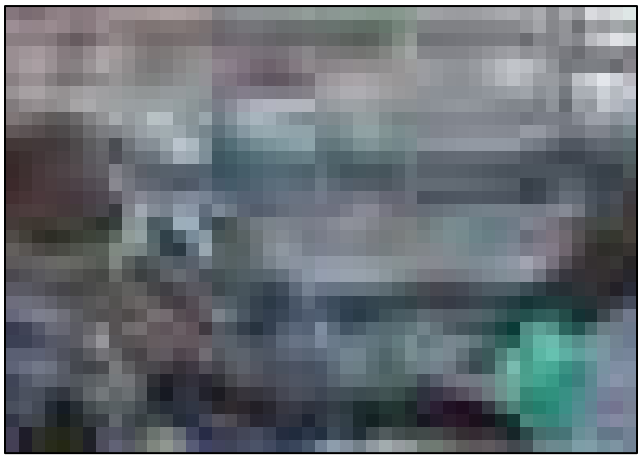

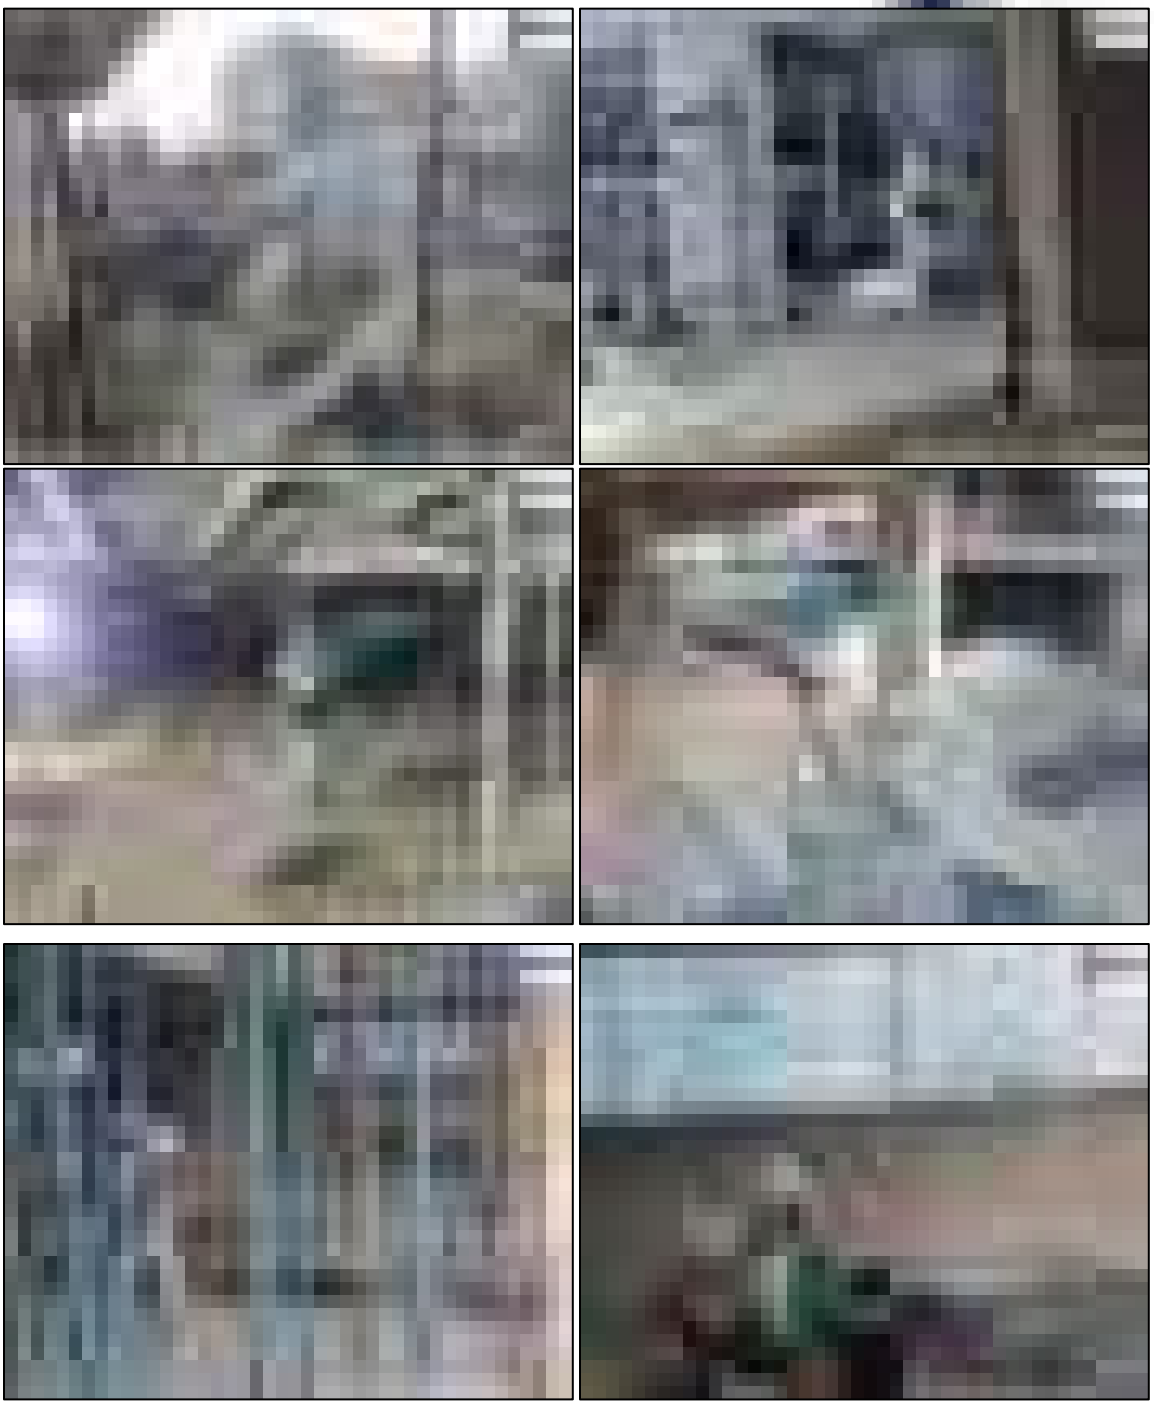

- Zonas de estancamiento de aguas lluvias

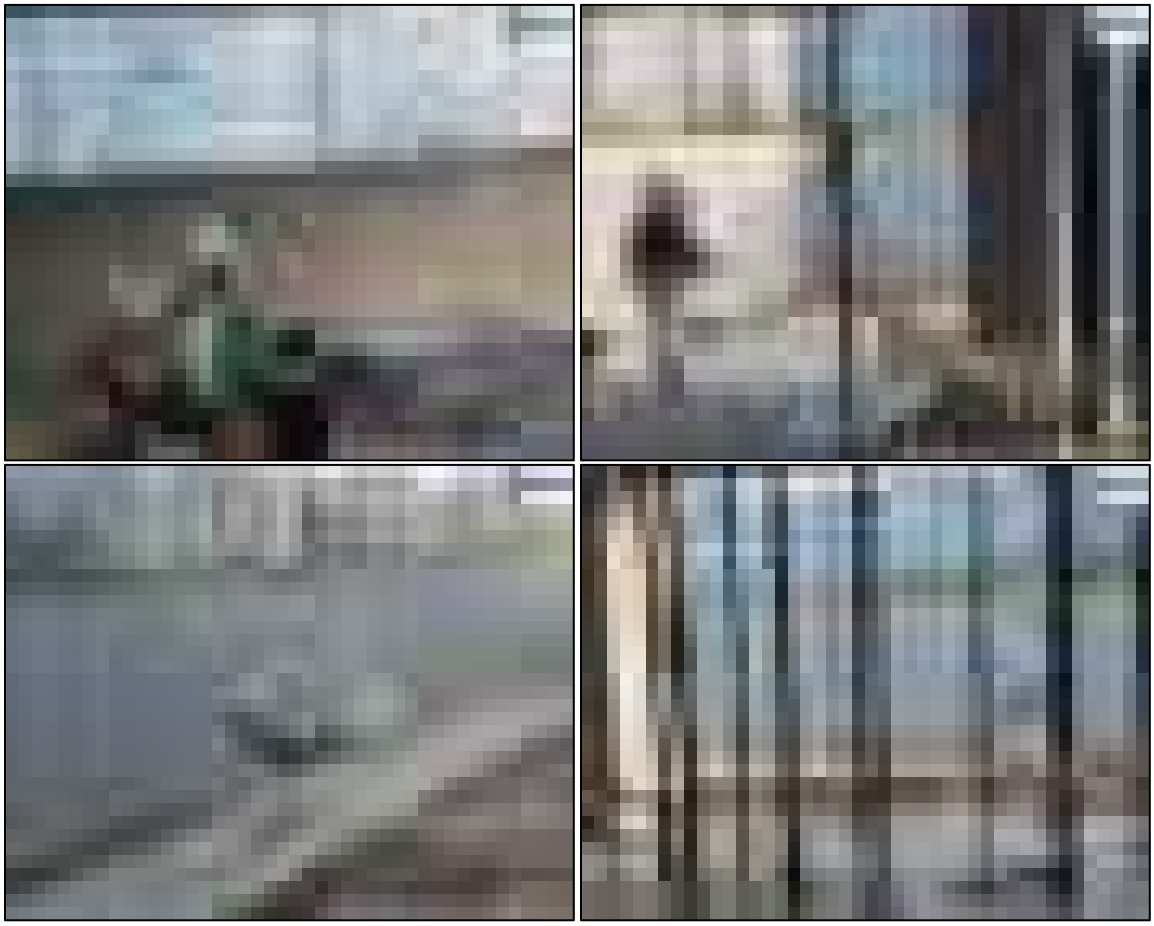

- Zonas verdes

- Al Interior de sótanos e instalaciones

5. PROCESOS Y PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS

JS AMBIENTE CONSTRUCCION CONSULTORE SAS a través de su unidad de negocio debidamente conformada, Colombiana de Intervenciones Ambientales está facultada y capacitada con personal calificado y con los permisos Sanitario establecidos para prestar servicios para el control y manejo Ambiental en distintas actividades como: desinsectación (fumigación), Limpieza y Desinfección de tanques de agua potable, Trampas de Grasa, Tanques de Aguas Lluvias, pozos sépticos y tanques de aguas negras, Control de roedores plaga (ratas y ratones), cumpliendo con los estándares en el cuidado del Ambiente y Manejo adecuado de fauna.

6. FICHAS Y HOJAS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD

HAWKER PLUS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1.- Identificación del producto químico y de la empresa.

- Identificación del producto químico: Tiametoxam 10% + Tricosene 0,5% WP

-

Usos recomendados: Insecticida

- Restricciones de uso: Utilizar de acuerdo con las recomendaciones señaladas en la etiqueta del producto.

- N° ISP: P-1004/17

- Nombre de Proveedor: ANASAC AMBIENTAL S.A.

-Dirección del Proveedor: Camino Noviciado Norte, Lote 73-B, Lampa.

- Número de teléfono del proveedor: (56-2) 2 470 6900

- Número de teléfono de emergencia en Chile:

- Número de teléfono de información toxicológica en Chile: (56-2) 2 470 6900 (56-2) 2 777 1994 Corporación RITA

- Información del fabricante: ANASAC AMBIENTAL S.A.

- Dirección electrónica del proveedor: www.anasac.cl

2.- Identificación de los peligros.

- Clasificación según NCh 382: NU2588- Plaguicidatóxico,sólido,n.e.p.(conti eneTiametoxam + Tricosene)

-Distintivo según NCh 2190: 6.1 TÓXICO

- Clasificación según GHS rev 6: CATEGORIA TOXICOLOGICA 4

- Etiqueta GHS:
- Indicaciones de peligro:

H302 : Nocivo en caso de ingestión.

H312: Puede ser nocivo en contacto con la piel. H333 : Puede ser nocivo si se inhala.

-Consejos de prudencia: P101:Sisenecesitaconsejomédico,tener el envase la etiqueta a la mano.

P102: Mantener alejado del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes de utilizar.

- **EQUIPO UTILIZADO**

- Fumigadora de espalda SR430
- Ficha técnica SR430
-

Atomizador universal de gran alcance. Cómodo sistema de dosificación y amplio depósito. De fácil manejo. Arranque fácil, rápido y prácticamente sin tirones.

	STIHL SR 430
Cilindrada (cm3)	**63.3**
Potencia (Kw/HP)	**2.9/3.89**
Peso (kg)*	**12,2**
Capacidad depósito combustible	**1,7 lts**

7. RECOMENDACIONES

Debido al fenómeno de cambio climático así mismo como las dinámicas de obra es recomendable realizar la actividad cada tres meses.

Esto para controlar y minimizar la proliferación de insectos en las áreas de trabajo.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Guía Científica de Truman para Operaciones de Control de Plagas. Bennett, G.W., Owens, J. M., Corrigan, R.

  M. Cuarta Edición. 1996.

- **Decreto 3075 de 1997:** De obligatorio cumplimiento en todas las plantas donde se fabrique, procese, envase, almacene y expenda alimentos.

  Artículo 29. El Plan de Saneamiento debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente e incluirá como mínimo los siguientes programas: Programa de Limpieza y desinfección, Programa de Desechos Sólidos y Programa de Control de Plagas.

  Las plagas entendidas como artrópodos y roedores deberán ser objeto de un programa de control específico, el cual debe involucrar un concepto de control integral, esto apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas de control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo.



9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó
01	25/10/2023	Documento nuevo.	Residente Ambiental Manuel Solano Silva

Anexo 01: Cronograma de control integrado de plagas

ACTIVIDAD DE CONTROL DE VECTORES	SEDES	EMPRESA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Zancudos										X				X
Moscas										X				X
Hormigas										X				X
Roedores (ratas y ratones)												X		X

OBSERVACION:
Se realiza seguimiento Trimestral.

ANEXO 5. PLAN DE GESTION SST

BASE DE DATOS SST (MEDEVAC) PERSONAL

EBISU S.A.S CONTRATISTAS

BASE DE DATOS MEDEVAC

Código: F.ST- 01
Versión: 05
Fecha: 01/04/2021

CC	Nombre del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Estado en Obra	Fecha retiro (cuando aplique)	Contratista / Subcontratista	Dirección de residencia	Grupo sanguíneo	Trabajo Alturas	Trabajo Electrico	Libreta Militar	Trabajo con Sustancias Quimicas	Otro	EPS	AFP	ARL	Fecha de concepto medico	Fecha Inducción SST	Fecha de Constancia de entrega Inicial de EPP	Fecha Concepto aptitud para trabajo en Alturas	Nivel del certificado / Entidad que emite el certificado	Nombre de persona en caso de emergencia - Parentesco	Numero de contacto	Observaciones
3,840,356	MARINO ARCE TRUJILLO	DIRECTOR DE OBRA	TECNICA	SI	28/03/2022	ACTIVO		EBISU SAS	PENDIENTE	O+	No	No aplica	Si	No aplica		FAMISANAR	N.A	BOLIVAR	4/04/2022	28/03/2022	8/09/2022	No aplica	No aplica	OFICINA	6012568829	
52,498,658	JENNY PAOLA SILVA ROZO	RESIDENTE DE OBRA	TECNICA	NO	28/03/2022	INACTIVO	29.10.2023	EBISU SAS	Cra 8H N° 166 -72	A+	Si	No aplica	No aplica	No aplica		SANITAS	COLPENSIONES	BOLIVAR	18/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	28/03/2022	AVANZADO - ANSAR	MARINA ROZO - MAMA	3118064318	
79,617,937	MAURICIO ACOSTA	RESIDENTE DE OBRA	TECNICA	NO	28/03/2022	INACTIVO	08.10.2023	EBISU SAS	Calle 40F SUR N° 74D - 16 INT 9 APTO303	O+	Si	No aplica	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	22/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	28/03/2022	AVANZADO - ANSAR	SANDRA BELTRAN - ESPOSA	3138814469	
1,026,297,800	BRIGUITTE NATALIA ARIAS PULIDO	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	TECNICA	SI	28/03/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Calle 22sur#51d-71 apto 401	A+	No	No aplica	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	16/03/2022	28/03/2022	No aplica	No aplica	No aplica	SANDRA PULIDO - MAMA	3142664164	
1,020,761,157	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	INSPECTOR DE OBRA	TECNICA	SI	28/03/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Cra 17 N° 186 A - 03	O+	Si	No aplica	Si	No aplica		FAMISANAR	COLFONDOS	BOLIVAR	22/09/2021	28/03/2022	23/03/2022	28/03/2022	AVANZADO	CESAR CARREÑO - PAPA	3125851430	
1,033,789,318	JEYMI TATIANA GARCIA MENDEZ	TECNICO SST	TECNICA	NO	28/03/2022	INACTIVO	31/01/2023	EBISU SAS	Cra 23 a 48 a 22 sur	O+	Si	No aplica	No	No aplica		SURA	COLFONDOS	BOLIVAR	18/03/2022	28/03/2022	4/03/2022	28/03/2022	AVANZADO-COORDINADOR - ANSAR	DIANA MENDEZ - MAMA	3204725012	
1,233,691,250	JHON ALEXANDER ZAMORA QUINTERO	TECNICO SST	TECNICA	SI	28/03/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Calle 66A N° 113F -96	AB+	Si	No aplica	No	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	3/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	AVANZADO-COORDINADOR - ANSAR	YOLANDA ZAMORA / MAMA	3102027241	
70,466,669	HERNAN PAMPLONA	OFICIAL - EJERO	OPERATIVO	SI	16/09/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Calle 43 AC 15A - 23E	A+	Si	No	No	No aplica		SURA	PORVENIR	BOLIVAR	8/09/2022	16/09/2022	8/09/2022	19/11/2022	AVANZADO - Alturas y seguridad industrial SAS	LUZDARY ROJAS - ESPOSA	3229026690	
19,290,094	VICENTE CASTELLANOS	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	NO	8/65/2022	INACTIVO	26/01/2023	EBISU SAS	Cra92 N° 73-19	A+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	COLPENSIONES	BOLIVAR	18/03/2022	8/05/2022	6/05/2022	No aplica	No aplica	LUZDARY ORTIZ- ESPOSA	3218504636	
80,362,362	EDILBERTO AMADO	TECNICO ELECTRICISTA	OPERATIVO	SI	9/02/2022	TRABLAJO DE OBRA		EBISU SAS	Trav. 12G bis A N°. 42 - 65	O+	No	Si	Si	No aplica		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	22/02/2022	9/02/2022	PENDIENTE ENTREGA	18/07/2020	SOS SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD S.A.S	LORENA AMADO / HIJA	3204585041 - 6017977212	
74,325,097	MARIO BARRETO	ALMACENISTA	OPERATIVO	SI	16/09/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Calle 75 N° 85-77	O+	Si	No	No	No aplica		SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	15/09/2022	16/09/2022	15/09/2022	3/09/2020	AVANZADO - ANSAR	NIDIA RADA / ESPOSA	3133422736	
1,013,656,672	JORGE MEJIA	AYUDANTE ELECTRICO	OPERATIVO	NO	8/08/2022	INACTIVO	12.12.2022	EBISU SAS	Calle 48B sur N°BA 65 ESTE	O+	Si	Si	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	5/08/2022	8/08/2022	8/08/2022	23/05/2022	AVANZADO - PREVENCION TECNICA EN ALTURAS	CONSUELO GARZON - MAMA	3212382515	
1,001,273,118	HENRY ESTEBAN GOMEZ	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	16/09/2022	INACTIVO	17.01.2023	EBISU SAS	Calle 105 sur N° 7H - 30 ESTE	O+	No	No	No	No aplica		SURA	PROTECCION	BOLIVAR	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	No aplica	No aplica	SANDRA TIRANO - MAMA	3208115064	
37,292,403	ERIKA LORENA ZUÑIGA PARADA	PROFESIONAL AMBIENTAL - SST	OPERATIVO	SI	22/09/2022	ACTIVO		EBISU SAS	AV Cra 68 N° 1A - 55	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	BOLIVAR	21/09/2022	22/09/2022	PENDIENTE ENTREGA	No aplica	No aplica	MILSE PARADA - MAMA	3143960432	
1,010,228,105	ELTON JOHN GALLEGO GALLEGO	TOPOGRAFO	OPERATIVO	SI	26/09/2022	ACTIVO		SAESTOPOGRAFIA SAS	Cra 103 N° 74 - 74	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	23/09/2022	26/09/2022	ENTREGADO POR CONTRATISTA	No aplica	No aplica	DAYANNA RAMIREZ-NOVIA	3212384292	
1,032,429,393	ANDRES DAVID MARTINEZ MARTINEZ	CADENERO	OPERATIVO	NO	26/09/2022	INACTIVO		SAESTOPOGRAFIA SAS	Calle 69L N° 30-81	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	23/09/2022	26/09/2022	ENTREGADO POR CONTRATISTA	No aplica	No aplica	NUBIA MARTINEZ - MAMA	3005768709	
9,102,637	JAIRO ENRIQUE DIAZ	VIGILANCIA	OPERATIVO	NO	1/08/2022	INACTIVO	22.11.2022	VISEGUR	Cra 98A N° 53G - 45 sur	A+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	1/08/2022	26/09/2022	ENTREGADO POR CONTRATISTA	No aplica	No aplica	RAFAEL CHANCON-AMIGO	3041150377	
1,012,413,543	ANGIE SANCHEZ PABON	PROFESIONAL SOCIAL	OPERATIVO	SI	26/09/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Car 82F N° 60A -10 Sur	A+	No	No	No	No aplica		NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	6/04/2021	27/09/2022	PENDIENTE ENTREGA	No aplica	No aplica	MAURICIO BELLO - PAREJA	3142618307	
80895045	EDISON ANTONIO ROJAS TORO	INSPECTOR DE OBRA	OPERATIVO	SI	28/09/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Diag. 50 N° 53B -27	A+	Si	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	27/09/2022	29/09/2022	PENDIENTE ENTREGA	28/01/2022	AVANZADO - COLOMBIANO TAREAS DE ALTO RIESGO	LUCERO TORRES - MAMA	3134134258	
80,816,884	JORGE ALONSO BAUTISTA MARTINEZ	OPERARIO FLEJADORA	OPERATIVO	NO	28/09/2022	INACTIVO	30.11.2022	FERRETERIA LATINA	Calle 10 N° 03- 84	O+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR	28/09/2022	29/09/2022	28/09/2022	No aplica	No aplica	LUZDARY GOYENEYO - ESPOSA	3125409459	
12,627,639	ALFONSO CANTILLO VERTUZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	28/09/2022	INACTIVO	21.11.2022	HIERROS ARMAR SAS	Diag. 42F N°80G - 13 sur	O+	Si	No	No	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	27/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	21/05/2022	AVANZADO - ASESORES INTEGRALES S.O	WENDY GUTIERREZ - PAREJA	3004702190	
1,221,961,734	YEISON ALFONSO CANTILLO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	28/09/2022	INACTIVO	29.11.2022	HIERROS ARMAR SAS	Diag. 42F N°80G - 13 sur	O+	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	27/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	No aplica	No aplica	WENDY GUTIERREZ - HERMANA	3004702190	
1,065,374,165	OSCAR DAVID RAMOS THERAN	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	29/09/2022	INACTIVO	21.11.2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 113 Cra20 D25	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	31/03/2022	3/10/2022	27/09/2022	No aplica	No aplica	MABEL FUENTES - HERMANA	3108731108	
1,052,990,470	JHON CARLOS MORALES MERCADO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	29/09/2022	INACTIVO	21.11.2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 5 - 36A N° 152a-69	A+	Si	No	No	No aplica	CURSO DE SOLDADOR	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA	20/08/2022	3/10/2022	27/09/2022	25/08/2022	AVANZADO/MMI ALTURAS CENTRO DE FORMACIÓN	PATRICIA GARZON - ESPOSA	3122876525	
80,040,668	JULIO ENRIQUE CALDERON	SOLDADOR	OPERATIVO	NO	4/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 183A - 049	O+	Si	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	28/07/2022	5/10/2022	12/08/2022	21/02/2022	AVANZADO/MMI ALTURAS CENTRO DE FORMACIÓN	DIANA GONZALEZ - ESPOSA	3204564390	
1,022,949,453	LEIDY TATIANA GRANADOS OVIEDO	INSPECTOR SST	OPERATIVO	NO	29/09/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	Cra 11A bis A N° 49a - 52 Sur	O+	Si	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	24/09/2022	3/10/2022	29/10/2022	Coordinador 15/03/2022 - Avanzado 31/01/2022	AVANZADO-COORDINADOR - HSEQ ASESORIAS	WILLIAM SUAREZ - ESPOSO	3233231059	
1,018,467,334	DIEGO NICOLAS MARTIN GARCIA	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	29/09/2022	INACTIVO	21.11.2022	CONDIAL LTDA	Cra 11Bis N° 77-76	O+	Si	No	No	No aplica		FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR	27/04/2022	3/10/2022	30/09/2022	15/05/2022	AVANZADO / AYE OCUPACIONALES SAS	GIRALDO MARTIN - PAPA	3112709307	
19,640,800	EDWIN ARLETH VIZCAINO VIZCAINO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	03.10.2022	INACTIVO	18.10.2022	CONDIAL LTDA	Cra 2 N° 19a 09	O+	No	No	No	No aplica		NUEVA EPS	COLFONDOS	BOLIVAR	23.06.2022	14/10/2022	29/09/2022	No aplica	No aplica	ANGELA VIZCANO - HIJA	3126067950	
80,871,129	AZAEL VARGAS GARZON	OPERADOR DE LA MAQUINA	OPERATIVO	NO	5/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	CONDIAL LTDA	Calle 5 N° 9 -99	O+	No	No	No	No aplica	CARTA DE IDONEIDAD OPERADOR	SANITAS	COLPENSIONES	BOLIVAR	1/10/2022	14/10/2022	3/10/2022	No aplica	No aplica	LEONARDO VARGAS - HERMANO	3204262876	
79,445,660	FERNEY MELENDEZ VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	8/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 49F N° 13 -71	O+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	10/10/2022	18/10/2022	27/09/2022	No aplica	No aplica	SONIA MIREYA NIÑO - ESPOSA	3053645018	
1,033,815,517	NEYDER JAIR CORTEZ VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	5/10/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	Calle 72B sur N° 35 -28	B+	No	No	Si	No aplica		SANITAS	COLPENSIONES	BOLIVAR	4/10/2022	6/10/2022	4/10/2022	No aplica	No aplica	ANDREA VARGAS - MAMA	3507945675	
80,197,799	LUIS PALACIOS CARDENAS	SOLDADOR	OPERATIVO	NO	18/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	FIGURADOS ELG SAS	Cra 4 este N° 66B -40	O+	Si	No	Si	No aplica	CURSO DE SOLDADOR	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	13/10/2022	18/10/2022	30/09/2022	16/02/2022	AVANZADO/MMI ALTURAS CENTRO DE FORMACIÓN	PATRICIA CETINA - ESPOSA	6016735534	
79,982,990	LUIS ERNESTO CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	18/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 161A N° 1A-15	O+	Si	No	Si	No aplica		SANITAS	PORVENIR	SURA	13/10/2022	18/10/2022	30/09/2022	16/02/2022	AVANZADO/MMI ALTURAS CENTRO DE FORMACIÓN	ISABEL RODRIQUEZ - MAMA	6019336283	
80,085,969	LUIS GIOVANNY CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	18/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 161A N° 3A -10 este	O+	Si	No	Si	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	13/10/2022	18/10/2022	30/09/2022	16/02/2022	AVANZADO/MMI ALTURAS CENTRO DE FORMACIÓN	ISABEL RODRIQUEZ - MAMA	6019336283	
80,408,204	JAIRO OLAYA NEIRA	OPERADOR DE LA MAQUINA	OPERATIVO	NO	11/10/2022	INACTIVO	12.11.2022	TRANSPORTES JUNIOR SAS	Calle 187 N° 15A-08	A+	No	No	No	No aplica	CARTA DE IDONEIDAD OPERADOR	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	17/05/2022	11/10/2022	11/10/2022	No aplica	No aplica	ANGIE LOPEZ - ESPOSA	3502609410	
88,001,181	CARLOS ARMANDO OSORIO QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	10/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	ALCANO SA	Calle 42F N°89-14	O-	No	No	Si	No aplica		SANITAS	PROTECCION	AXXA COLPATRIA	6/10/2022	10/10/2022	5/10/2022	No aplica	No aplica	SANDRA CARCAMO - AMIGA	3124387157	
1,046,403,298	PEDRO PABLO POLANCO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	11/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	ALCANO SA	Cra. 108 N° 22- 61	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	AXXA COLPATRIA	7/10/2022	18/10/2022	5/10/2022	No aplica	No aplica	JORGE POLANCO - PADRE	3112740680	
1,003,393,508	JUAN CAMILO PEREIRA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	5/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	ALCANO SA	Cra 111 N° 64 - 22	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	AXXA COLPATRIA	5/08/2022	6/10/2022	3/10/2022	No aplica	No aplica	SANDRA VERGARA - ESPOSA	3014784857	
1,057,215,017	NICOLAS RODRIGUEZ	OPERADOR DE LA MAQUINA	OPERATIVO	NO	5/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	ALCANO SA	Calle 5 N° 9 -99	A+	No	No	No	No aplica	CARTA DE IDONEIDAD OPERADOR	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXXA COLPATRIA	1/10/2022	5/10/2022	3/10/2022	No aplica	No aplica	ERMELINDA VARGAS - TIA	3118420904	
1,052,704,022	JESUS EDUARDO LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	5/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	ALCANO SA	Calle 60 bis A sur N° 75 - 05	O+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	AXXA COLPATRIA	21/06/2022	14/10/2022	3/10/2022	No aplica	No aplica	ALDAIR GOMEZ- PRIMO	3214675564	
1,192,747,123	LEIBER JOSE LARA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	10/10/2022	INACTIVO	20.11.2022	ALCANO SA	Cra 111 N° 64 - 22	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	AXXA COLPATRIA	3/10/2022	6/10/2022	5/10/2022	No aplica	No aplica	SANDRA VERGARA - ESPOSA	3014784857	
1,026,585,125	DARWIN MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	20/10/2022	INACTIVO	23.12.2022	EBISU SAS	CARRERA 91 N129D89	A+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	3/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	No aplica	No aplica	MICHELIS GONZALESZ - ESPOSA	3134848200	
1,048,807,980	CRISTIAN JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	20/10/2022	INACTIVO	01.12.2022	EBISU SAS	CARRERA 91 D N 63 CON 39	O-	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	4/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	No aplica	No aplica	YAGUBIS ESCOBAR - MADRE	3014488600	
16,114,982	FABIO SAAVEDRA	OPERARIO PILOTEADORA	OPERATIVO	NO	3/10/2022	INACTIVO	21.11.2022	ALCANO SA	CARRERA 72 QB N 42 G 54	A+	No	No	No	No aplica	CARTA DE IDONEIDAD OPERADOR	FAMISANAR	PORVENIR	AXXA COLPATRIA	21/06/2022	6/10/2022	6/10/2022	No aplica	No aplica	RUBY IMBAJOBA - ESPOSA	3222168441	
79,923,719	MILTON YESID BARRETO AGUILERA	GUARDA DE SEGURIDAD	OPERATIVO	SI	22/10/2022	ACTIVO		VISEGUR	Trav. 63G N° 68A -45	AB+	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	21/10/2022	22/10/2022	20/10/2022	No aplica	No aplica	ESTER AGUILERA - MAMA	3108069970	
79,895,630	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	26/10/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Calle 10 N° 80-41	A+	No	No	Si	No aplica		SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	22/10/2022	27/10/2022	26/10/2022	No aplica	No aplica	CAROLINA CAICEDO - ESPOSA	3102322584	

BASE DE DATOS MEDEVAC

Código: F.ST- 01
Versión: 05
Fecha: 01/04/2021

CC	Nombre del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Estado en Obra	Fecha retiro (cuando aplique)	Contratista / Subcontratista	Dirección de residencia	Grupo sanguíneo	Trabajo Alturas	Trabajo Electrico	Libreta Militar	Trabajo con Sustancias Quimicas	Otro	EPS	AFP	ARL	Fecha de concepto medico	Fecha Inducción SST	Fecha de Constancia de entrega Inicial de EPP	Fecha Concepto aptitud para trabajo en Alturas	Nivel del certificado / Entidad que emite el certificado	Nombre de persona en caso de emergencia - Parentesco	Numero de contacto	Observaciones
80,357,706	JUAQUIN EMILIO DUQUE CORTES	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	27/10/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	Cra 73B 44- 16 sur	O+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	COLFONDOS	BOLIVAR	25/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	No aplica	No aplica	DIANA DUQUE - HERMANA	3167255379	
80.002.245	OSCAR DAVID BUITRAGO	OPERADOR DE LA MAQUINA	OPERATIVO	NO	4/11/2022	INACTIVO	21.11.2022	CONDIAL LTDA	Cra 2 Nº 19a 09	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	3/12/2021	11/11/2022	1/09/2022	No aplica	No aplica	FERNANDO TELLEZ - JEFE	3144892329	
5,964,731	JORGE BOTACHE AGUJA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	4/11/2022	INACTIVO	21.11.2022	CONDIAL LTDA	Cra 116a Nº 3A -33	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	5/01/2022	6/11/2022	06111/2022	No aplica	No aplica	LUISA BOTACHE - HIJA	3005897689	
1,030,578,709	JESSICA ANDRADE FLOREZ	INSPECTOR SST	OPERATIVO	NO	10/11/2022	INACTIVO	10/03/2023	JH COMPANY	Tranv 15B Nº 3 -07	O+	Si	No	No	No aplica		SURA	COLFONDOS	POSITIVA	15/07/2022	11/11/2022	10/10/2022	11/11/2022	AVANZADO- COORDINADOR - HSEQ DE COLOMBIA	MARIA ANDRADE - HERMANA	3147169032	
79,607,407	CARLOS JULIO MELO ESPITIA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	10/11/2022	INACTIVO	10/03/2023	JH COMPANY	CALLE108AN°5A -28	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	10/02/2022	11/11/2022	10/10/2022	No aplica	No aplica	ERNESTINA BUSTOS - ESPOSA	3138802404	
79.905.077	LUIS ENRIQUE FANDIÑO GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	10/11/2022	INACTIVO	10/03/2023	JH COMPANY	CRA 1A ESTE 1C - 02	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	15/02/2022	11/11/2022	10/10/2022	No aplica	No aplica	LAURA BARRERA - ESPOSA	3203143223	
79,963,893	EDISSON TRIANA CASTRO	OPERADOR DE LA MAQUINA	OPERATIVO	NO	10/11/2022	INACTIVO		JH COMPANY	CRA 8 ESTE # 25 A 22	O+	No	No	Si	No aplica	CARTA DE (CONDEVAD OPERADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	18/07/2022	11/11/2022	10/10/2022	No aplica	No aplica	LUZ VENEGAS - ESPOSA	3014533575	
80.926.534	HERNANDO RATIVAS CIFUENTES	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	16/11/2022	INACTIVO	10/03/2023	JH COMPANY	CARERERA 112 B 71-61	O+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	16/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	No aplica	No aplica	ARNULFO RATIVA CIFUENTES HERMANO	3219835308	
1.014.240.462	JUAN SEBASTIAN VILLATE	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	17/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CRA 111N° 76 -25	B+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	12/1/2022	23/11/2022	12/11/2022	No aplica	No aplica	ESPERANZA URREGO - MADRE	3205665054	
1.024.481.766	EDISON ANDRES CARABANTE	ALMACENISTA	OPERATIVO	NO	17/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	DIAG. 73 A BIS SUR N° 36 D 31	O+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	PROTECCIÓN	BOLIVAR	12/11/2022	23/11/2022	12/11/2022	No aplica	No aplica	LUZ HERNANDEZ - ESPOSA	3193709300	
1.481.855.51	NORGE URGANETA	HERRERO	OPERATIVO	NO	17/11/2022	INACTIVO	03.12.2022	CONDIAL LTDA	CALLE 6A 89 - 42	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	12/1/2022	23/11/2022	12/11/2022	No aplica	No aplica	DIANA CEPEDA- ESPOSA	32160311190	
79.220.930	FREDY FAIBER VELAZQUEZ ORTEGA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	21/11/2022	INACTIVO	10/03/2023	JH COMPANY	CALLE 72-43-72 SUR	O+	No	No	Si	No aplica		COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	16/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	No aplica	No aplica	ROSA HELENA ORTEGA MADRE	3228106098	
1,095,484,178	ALEXIS JUNIOR PEDROZO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO	01.12.2022	CONDIAL LTDA	CALLE 75C SUR N°54 -67	O+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	19/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	No aplica	No aplica	ANA PEDROZO - MAMA	3135207906	
1,023,930,085	JONATHAN SEBASTIAN HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO	03.12.2022	CONDIAL LTDA	CRA 7A N° 43 - 45 SUR	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	22/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	No aplica	No aplica	ORFA GONZALEZ - MAMA	3194100822	
393,762	WILSON RATIVA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 82A SUR N°46A - 15	O+	No	No	Si	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	BOLIVAR	18/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	No aplica	No aplica	NELVIS MARTINEZ - ESPOSA	3003618569	
80,265,071	LUIS EDUARDO CARDENAS	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO	03.12.2022	CONDIAL LTDA	TRAV 68J N°39-52	A+	Si	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	22/11/2022	24/11/2022	21/11/2022	16/01/2022	AVANZADO - SOLUCIONES Y ASESORIAS	LUIS DANIEL - HIJO	3106885652	
7,490,364	ISRAEL BARBOSA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 33F N° 13 - 28	A+	Si	No	Si	No aplica		COMPENSAR	COLPENSIONES	BOLIVAR	18/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	7/10/2022	AVANZADO- SAFETY SYSTEMS	MARIA ROCHA - ESPOSA	3108729393 - 3214015937	
79,985,208	SAUL OLARTE	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 30 SUR N°5 - 19 ESTE	O+	No	No	Si	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	BOLIVAR	18/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	No aplica	No aplica	ANA OLARTE - HERMANA	3114575640	
4,243,153	HERNANDO PARADA BELLO	OFICIAL - EJERO	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CRA 108 N° 67 -04	O+	Si	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PENSIONADO	BOLIVAR	19/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	11/01/2022	AVANADO - TECNICA DE SEGURIDAD SAS	LUCIANA PARADA - ESPOSA	3212285360	
6,653,515	JOSE JAVIER CAMARGO VENTURA	GUARDA DE SEGURIDAD	OPERATIVO	NO	25/11/2022	INACTIVO		VISEGUR	Calle 46 SUR 72K - 10	AB-	No	Si	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	23/11/2022	28/11/2022	27/10/2022	No aplica	No aplica	MARIA CAMARGO - SOBRINA	3214303797	
80,242,975	CARLOS ALBERTO HUERTAS	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	NO	28/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 81A N°44-62 SUR	AB+	Si	No	Si	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	BOLIVAR	26/04/2022	28/11/2022	23/12/2022	No aplica	No aplica	SOFIA ORRECHA - ESPOSA	3213136001	
1,007,101,914	IVAN CAMILO HERNANDEZ AGUIRRE	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	30/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 28 A ·· 10 - 17 ESTE SUR	A+	Si	No	No	No aplica		COMPENSAR	COLFONDOS	BOLIVAR	12/05/2022	30/11/2022	30/12/2022	No aplica	No aplica	MARTA AGUIRRE HERMANA	3227431810	
82,392,781	MARIO MONCADA	TECNICO ELECTRICO	OPERATIVO	SI	1/12/2022	TRASLADO DE OBRA		EBISU SAS	CARRERA 166· 49-08	A+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	27/08/2022	5/12/022	5/12/022	No aplica	No aplica	ANDREA RODRIGUEZ - ESPOSA	3194422512	
79,816,600	UBEIMAR CANGREJO PEÑUELA	TECNICO ELECTRICO	OPERATIVO	NO	5/12/2022	INACTIVO	1/04/2023	EBISU SAS	CALLE 63 SUR N° 78J - 38	B+	Si	No	Si	No aplica		FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR	10/12/2022	5/12/2022	5/12/022	No aplica	No aplica	IRIS SANABRIA - ESPOSA	6017575882	
80,801,383	JHON MARIO RIVERA BAUTISTA	OFICIAL DE PLOMERIA	OPERATIVO	SI	5/12/2022	TRASLADO DE OBRA		INVERCO	CRA135 N° 17F - 66	O+	No	No	No	No aplica		SURA	PORVENIR	SURA	14/02/2022	28/12/2022	5/12/2022	No aplica	No aplica	SEGUNDO RIVERA - HERMANO	3133305792	
14,273,479	JOSE RAUL MORALES	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	6/12/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 43 SUR N°72 Q 42	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	30/1/2022	6/12/2022	6/12/2022	No aplica	No aplica	RUGELI ANDRADE - ESPOSA	3222868095	
1,072,975,446	YEFERSON ESCOBAR	COMPRAS	OPERATIVO	SI	6/12/2022	TRASLADO DE OBRA		EBISU SAS	CALLE 16F N° 99 - 72	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	COFONDOS	BOLIVAR	30/09/2022	6/12/2022	No aplica	No aplica	No aplica	LEIDY ESCOBAR - MADRE	3107935635	
1,085,267,324	CARLOS ALBERTO MAYORGA	AYUDANTE ELECTRICO	OPERATIVO	SI	6/12/2022	TRASLADO DE OBRA		EBISU SAS	CRA13 N° 11 -48	O+	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	24/09/2022	6/12/2022	24/09/2022	No aplica	No aplica	DIEGO MAYORGA - HERMANO	3024867263	
45,690,870	LUISA CATALINA VASQUEZ BARRIOS	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	9/12/2022	INACTIVO	11.01.2023	EBISU SAS	CRA 77B - 74 - 81	O+	No	No	No	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	7/12/2022	19.12.2022	PENDIENTE ENTREGA	No aplica	No aplica	HECTOR VIANCHI - ESPOSO	3144448567	
1,012,389,565	JOSE DAVID SUAREZ PINZON	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	10/12/2022	TRASLADO DE OBRA		INVERCO	CALLE 58 SUR N°99B - 87	A-	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	2/11/2022	12/12/2022	10/12/2022	No aplica	No aplica	HERMIRA PINZON - MADRE	3208844362	
1,000,124,313	BRAYAN DAVID ORTIZ GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	13/04/2023	TRASLADO DE OBRA		INVERCO	CALLE 58A N°99B - 58	O+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	28/11/2022	12/12/2022	5/12/2022	No aplica	No aplica	JUDITH GARCIA - MADRE	3057826478	
1024465767	FIDEL ANTONIO MORENO MORENO	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	SI	14/12/2022	ACTIVO		ORR CONTRUCCIONES	CRA 1 N° 30 SUR - 62	B+	Si	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	16/11/2022	14/12/2022	16/11/2022	20/11/2022	AVANZADO - CEPAR SAS	CAROLINA PINTO - ESPOSA	3124651706	
7,937,803	FRANCISCO JAVIER CACEDO ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	12/04/2023	ACTIVO		ORR CONTRUCCIONES	CRA 27 P N°71 K - 56	O+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	24/11/2022	14/12/2022	2/12/2022	29/11/2022	AVANZADO - PSM SAS	SONIAM PEREZ - ESPOSA	3004843214	
1,102,867,915	ANDRES GOMEZ MARTINEZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	11/03/2023	ORR CONTRUCCIONES	CRA 141 AN° 137 - 30	O+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	16/11/2022	14/12/2022	16/11/2022	20/11/2022	AVANZADO - CEPAR SAS	JOLEISIS DOMINGUEZ - ESPOSA	3023497485	
1,103,115,419	JOSE MIGUEL NAVARRO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	9/08/2023	ORR CONTRUCCIONES	CRA 93D N° 130A -65	O+	Si	No	No	No aplica		SANITAS	PORVENIR	SURA	2/08/2022	14/12/2022	3/08/2022	1/08/2022	A&E OCUPACIONALES	JESSICA MADERA - ESPOSA	3125951331	
1,073,511,850	CRISTHIAN CUERVO	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	14/12/2022	ACTIVO		ORR CONTRUCCIONES	CRA 1 AN° 18- 20	A+	Si	No	SI	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	22/11/2022	14/12/2022	22/11/2022	27/11/2022	AVANZADO - CEPAR SAS	TATIANA CUERVO - HERMANA	3208195271	
79,759,825	EDWIN ALBERTO QUICERO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 52 SUR N°93B - 98	O+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	30/08/2022	14/12/2022	30/08/2022	20/11/2022	AVANZADO - CEPAR SAS	MARIA CHAPARRO - ESPOSA	3125316509	
1,020,795,200	ESTEBAN CARABALLO OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 81 b # 9a 15	O+	Si	No	No	No aplica		SANITAS	PORVENIR	SURA	10/12/2022	14/12/2022	12/12/2022	No aplica	No aplica	MARIA - ABUELA	3133859915	
1,122,126,761	ALFREDO CARANTON	AYUDANTE HIDRAULICO	OPERATIVO	SI	14/12/2022	ACTIVO		INVERCO	CALLE 133AN° 110 A 14	O+	Si	No	No	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	No aplica	No aplica	NAYIBE VER - ESPOSA	3108824411	
11,636,594	MIGUEL ANGEL OREJUELA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	10.01.2023	CONDIAL LTDA	CRA 18B N° 70 - 28	O+	No	No	SI	No aplica		NUEVA EPS	COLFONDOS	BOLIVAR	13/12/2022	14/12/2022	13/12/2022	15/03/2022	AVANZADO- ANSAR	MARCELA MORENO - NOVIA	3203547630	
1,024,536,923	DIEGO MANUEL BUSTACARA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	10.01.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 57B SUR N°62 -74	O+	No	No	SI	No aplica		CAPITAL SALUD	PROTECCION	BOLIVAR	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	No aplica	No aplica	LIDIA MUÑOZ - ARRENDATARIA	3208229874	
80,209,441	WILMER ALEXANDER OLARTE VEGA	INSPECTOR SST	OPERATIVO	SI	14/12/2022	ACTIVO		INVERCO	CRA 20A N° 9 - 34	O+	No	No	SI	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	25/04/2022	14/12/2022	20/10/2022	24/03/2022	AVANZADO - ALT&SI	MELBA VEGA - MADRE	3172674991	
1.033.730.878	WILSON GOMEZ SALAMANCA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	15/12/2022	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 66 SUR N° 18N - 60	O+	No	No	SI	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	14/12/2022	15/12/2022	13/12/2022	No aplica	No aplica	MILTON SALAMANCA - HERMANO	3102202750	
1.023.934.402	MARIA TERESA TORRES SOTO	ALMACENISTA	OPERATIVO	NO	19.12.2022	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE2AN° 5 - 53	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	16/12/2022	20/12/2022	17/12/2022	No aplica	No aplica	LUZ TORRES - MAMA	3108685590	
1.193.538.258	EMERSON DAVID CUCHIMBA	AYUDANTE HERAULICO	OPERATIVO	NO	16.12.2022	INACTIVO	26.07.2023	EBISU SAS	CRA 28D N° 72B- 52	O+	No	No	SI	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15/12/2022	20/12/2022	16/12/2022	No aplica	No aplica	MARIA NOHEMIL - MAMA	3217766346	
19.790.278	VICTOR HERRERA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO		INACTIVO	24.07.2023	EBISU SAS	CALLE 60 B - 45 N° 17 -24	O+	No	No	No	No aplica		SURA		BOLIVAR	10/06/2022	20/12/2022	15/12/2022	No aplica	No aplica	VICTOR HERRERA - HIJO	3146619195	
1.127.386.330	LUIS ALBERTO PEDROZO	OFICIAL DE PLOMERIA	OPERATIVO	NO	20.12.2022	INACTIVO	04.07.2023	INVERCO	CRA 104B N° 128C -11	A+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	16/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	No aplica	No aplica	DEISY MEJIA - AMIGA	3209015780	
73.563.865	ENOC CENTENO VIDALES	HERRERO	OPERATIVO	SI	25/04/2023	ACTIVO	15.07.2023	ORR CONTRUCCIONES	CRA 51 N° 31 - 66	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA	30/09/2022	20/12/2022	30/09/2022	16/09/2022	AVANZADO - CEPAR SAS	ROSALBA VIDALES - HERMANA	3213211487	
1.050.068.165	JESUS DAVID SERPA GIL	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	NO	15.12.2022	INACTIVO	05.01.2023	ORR CONTRUCCIONES	DIAG. 63C SUR N° 73F- 51	A+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	14/12/2022	20/12/2022	14/12/2022	No aplica	No aplica	LINA MARCELA SERPA - HERMANA	3106747244	
1,010,088,503	JULIAN STEVEN PULIDO	INSPECTOR SST	OPERATIVO	NO	15.12.2022	INACTIVO	19.01.2023	ORR CONTRUCCIONES	CALLE 76A BIS SUR N° 14-11	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	15/12/2022	20/12/2022	15/12/2022	17/07.2021 - 11/08/2022	COORD. - ALS SAS / AVANZADO - PMS SAS	ANA ALVARADO - ABUELA	3118087752	
15.609.820	JESUS MARIA ORTEGA	OPERADOR DE LA MAQUINA	OPERATIVO	NO	12.12.2022	INACTIVO	20.12.2022	JH COMPANY	CALLE 187C N°5D-05	O+	No	No	No	No aplica	CARTA DE (CONDEVAD OPERADOR	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	26/07/2022	20/12/2022	15/12/2022	No aplica	No aplica	ADRIANA POSADA - ESPOSA	3124939768	

BASE DE DATOS MEDEVAC

Código: F.ST- 01
Versión: 05
Fecha: 01/04/2021

CC	Nombre del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Estado en Obra	Fecha retiro (cuando aplique)	Contratista / Subcontratista	Dirección de residencia	Grupo sanguíneo	Trabajo Alturas	Trabajo Electrico	Libreta Militar	Trabajo con Sustancias Quimicas	Otro	EPS	AFP	ARL	Fecha de concepto medico	Fecha Inducción SST	Fecha de Constancia de entrega Inicial de EPP	Fecha Concepto aptitud para trabajo en Alturas	Nivel del certificado / Entidad que emite el certificado	Nombre de persona en caso de emergencia - Parentesco	Numero de contacto	Observaciones
1,066,516,451	LUIS DAVID DIAZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	18/04/2023	ACTIVO		ORR CONTRUCCIONES	CRA 2A.- 48R 35 SUR	A+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	19/12/2022	26.12.2022	19/12/2022	20/12/2022	AVANZADO CUMBRE COLOMBIA	GINNA MARCELA - ESPOSA	3206376173	
1,062,604,420	ALVARO JAIME MARQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	22.12.2022	INACTIVO	3/06/2023	ORR CONTRUCCIONES	CALLE 72B SUR Nº 14-64	B+	SI	No	No	No aplica		MUTUA SER	PORVENIR	SURA	21/12/2022	26.12.2022	22/12/2022	4/04/2022	AVANZADO - ALTURAS SERVICIOS SAS	KATHERIN MORALES - PAREJA	3024051148	
1,050,065,781	OSCAR JAVIER SILVERA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	21.11.2022	INACTIVO	07.01.2023	ORR CONTRUCCIONES	DIAG 50A SUR Nº 28 - 87	B+	SI	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	30/08/2022	26.12.2022	21/12/2022	20/11/2022	AVANZADO - CEPAR SAS	GINNA VASQUEZ - ESPOSA	3045550027	
1,066,510,362	VICTOR ANTONIO DIAZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/04/2023	ACTIVO		ORR CONTRUCCIONES	CRA 2A.- 48R 35 SUR	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	19/12/2022	26.12.2022	19/12/2022	No aplica	No aplica	OSIRIS MENDEZ - ESPOSA	3134325164	
1,030,624,221	CRISTIAN CAMILO MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	22.12.2022	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 54C Nº 77E - 17	O+	No	No	SI	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	21/12/2022	26.12.2022	21/12/2022	No aplica	No aplica	MARTHA MONTOYA - MAMA	3213687563	
1,012,378,678	JOHAN ESTIVEN RAMIREZ GUTIERREZ	OPERARIO DE MAQUINA	OPERATIVO	NO	20.12.2022	INACTIVO		JH COMPANY	CALLE 73C SUR Nº 81D-25	O+	No	No	SI	No aplica	CARTA DE IDONEIDAD OPERADOR	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	16/12/2022	26.12.2022	23.12.2022	No aplica	No aplica	JENNY SOTO - PAREJA	3022833111	
39,545,608	ALEIDA FERNANDA MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	23.12.2022	TRASLADO DE OBRA		INVERCO	CALLE 74 Nº 97 -12	A+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	20.12.2022	27.12.2022	23.12.2022	No aplica	No aplica	CLAUDIA FERNANDEZ - HERMANA	3182623530	
11,685,774	JOSE GUILLERMO MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	27.12.2022	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	DIAG 65B BIS Nº 18 D - 87	O+	No	No	No	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	26.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	No aplica	No aplica	VICTOR MURILLO- HERMANO	3152519587	
1,050,064,722	JHON VALLES RANGEL	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	27.12.2022	INACTIVO	15.07.2022	ORR CONTRUCCIONES	CALLE 50B Nº35-17	O+	Si	No	No	No aplica		NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	26.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	16.11.2022	AVANZADO - CEPAR SAS	CAROLINA MARIMON - ESPOSA	3227920391	
1,193,517,160	JEFFERSON ALEXANDER DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	27.12.2022	INACTIVO	18/02/2023	INVERCO	CALLE 63 Nº73D - 30	O+	No	No	SI	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	26.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	No aplica	No aplica	DORIS FONSECA - MAMA	3219297211	
1,024,527,549	JHON EDWARD CETINA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	23.12.2022	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CRA 72 - 53 - 53	O+	No	No	SI	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	22.12.2022	27.12.2022	23.12.2022	No aplica	No aplica	FLOR CETINA - MAMA	3132527879	
1,082,067,519	JESUS POLO VARGAS	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	27.12.2022	INACTIVO	18.01.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 46 Nº26A	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	26.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	No aplica	No aplica	RUBY VARGAS - MAMA	3227085285	
1,050,067,946	NEIVER YESID BENITEZ TOLOZA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	22.12.2022	INACTIVO	05.01.2023	ORR CONTRUCCIONES	CRA 81C #42-47 sur	B+	Si	No	No	No aplica		NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	20.12.2022	27.12.2022	22.12.2022	22.01.2022	AVANZADO- SERPROI	MARIA ILIRIS - NOVIA	3114486433	
1,193,437,452	JESUS MIGUEL MEJIA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	27.12.2022	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 36 Nº 26F - 40	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	26.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	No aplica	No aplica	CARMEN ORTEGA - MAMA	3122006030	
6,030,864	JORGE ALIRIO MORENO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	27.12.2022	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 42I Nº 76F -72	O+	No	No	SI	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	BOLIVAR	20.12.2022	29.12.2022	27.12.2022	No aplica	No aplica	FELIZ MORENO - HERMANO	3205958999	
1,085,184,338	DEYBIS CAICEDO JULIO	ALMACENISTA	OPERATIVO	NO	28.12.2022	INACTIVO	15/03/2023	ORR CONTRUCCIONES	CALLE 49 SUR Nº 5F -31	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	27.12.2022	29.12.2022	28.12.2022	No aplica	No aplica	ESTELA SANCHEZ - ESPOSA	3224520953	
11,520,640	JORGE IGNACIO MORENO	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	SI	03.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CARRERA 142 #137-47	O+	Si	No	Si	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	BOLIVAR	26.12.2022	03.01.2023	03.01.2023	20.02.2022	AVANZADO- ALTURAS SEGURIDAD SAS	MARIA ISABEL LESMIS ESPOSA	3138349540	
14,011,919	ANSELMO CAICEDO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	03.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 62 G SUR - 75 C 21	O+	Si	No	No	No aplica		SURA	COLFONDOS	BOLIVAR	26.12.2022	03.01.2023	03.01.2023	28.09.2022	AVANZADO - INNOVA	ALEXANSDER CAICEDO HERMANO	3203077977	
1,050,838,379	LEONARDO AVILA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	03.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 69 SUR 95 A 41	A+	Si	No	No	No aplica		MUTUAL SER	PORVENIR	BOLIVAR	23.12.2022	03.01.2023	03.01.2023	27.06.2022	AVANZADO INNOVA	MANUEL AVILA HERMANO	3142701107	
1,051,859,950	JARVIS FONSECA	OFIAL HERRERO	OPERATIVO	NO	03.01.2023	INACTIVO	20.02.2023	EBISU SAS	DIAGONAL 38 F SUR 11 08	O+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	26.12.2022	03.01.2023	03.01.2023	01.12.2022	AVANZADO- FUERZAS INTEGRALES	DIAGOBERTO FONSECA HERMANO	3115452508	
1,102,868,238	ANDRES DAVID MONTALVO	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	SI	03.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 127 BF -93 44	A+	Si	No	No	No aplica		SANITAS	COLFONDOS	BOLIVAR	26.12.2022	03.01.2023	03.01.2023	05.10.2022	AVANZADO- PREVENIR	MAROLI MEZA ESPOSA	3017765976	
73,015,026	DAVID CORDERO	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	SI	03.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 44 A - 24 C 06	O+	Si	No	No	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	BOLIVAR	26.12.2022	03.01.2023	03.01.2023	29.04.2022	AVANZADO- D.E.M.A ALTURAS SAS.	KELLY LOPEZ ESPOSA	3228674805	
1,050,064,758	MARTIN JOSE BELEÑO	OFICAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	03.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 46 C SUR - 27 -65	A+	Si	No	No	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	23.12.2022	03.01.2023	03.01.2023	30.06.2022	AVANZADO - AYE OCUPACIONALES	LIZETH PAOLA CARO ESPOSA	3229324188	
1,067,712,584	LEVINSON VASQUEZ	OFICAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	03.01.2023	INACTIVO	29/04/2023	EBISU SAS	CALLE 76 A- 24 -32	O+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	23.12.2022	03.01.2023	03.01.2023	10.11.2022	AVANZADO - PREVENIR	GERAL SANCHEZ ESPOSA	3114738090	
1,098,709,655	SANTIAGO DIAZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	03.01.2023	INACTIVO	29/04/2023	EBISU SAS	CALLE 75 A - 23- 24 SUR	A+	SI	No	SI	No aplica		NUEVA EPS	COLFONDOS	BOLIVAR	23.12.2022	03.01.2023	03.01.2023	14.02.2022	AVANZADO - AYE OCUPACIONALES	PAULA SANCHEZ ESPOSA	3213409173	
1,143,440,570	ERICK REINALDO FLOREZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	04.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CRA 94B - 15 SUR	B+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	26.12.2022	04.01.2023	04.01.2022	No aplica	No aplica	ALISSON CARVAJAL - HIJASTRA	3026475872	
1,193,251,017	CANDELARIO JOSE JIMENEZ MOLA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	02.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CR46 9 Nº 76A-44	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	23.12.2022	02.01.2023	02.01.2023	No aplica	No aplica	LINA MENDOZA - ESPOSA	3044989028	
1,065,836,155	DALGER MIGUEL URRUCHURTO	AYUDANTE HERRERO	OPERATIVO	SI	02.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 87G Nº 42-26	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	26.12.2022	02.01.2023	02.01.2023	No aplica	No aplica	BREDER DAVID - HERMANO	3128360091	
13,563,241	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	HERRERO	OPERATIVO	SI	02.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CRA 69 Nº 29I SUR	A-	No	No	SI	No aplica		FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR	26.12.2022	02.01.2023	02.01.2023	No aplica	No aplica	ROSALBA MEDINA - PAREJA	3002945229	
1,022,990,713	JHON WILMER VIUCHE CHAPARRO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	02.03.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 78A SUR Nº 3 - 19 ESTE	O+	No	No	SI	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	26.12.2022	02.01.2023	02.01.2023	No aplica	No aplica	LIONEL VIUCHE - PAPA	3132733309	
1,046,426,822	WALBERTO DURAN	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	02.03.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 47B SUR Nº 28-87	O+	No	No	No	No aplica		SURA	COLFONDOS	BOLIVAR	26.12.2022	02.01.2023	02.01.2023	No aplica	No aplica			
5,122,996	FAUSTO SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	02.03.2023	ACTIVO		EBISU SAS	Cra 87L BIS N°59C SUR	O-	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	BOLIVAR	26.12.2022	02.01.2023	02.01.2023	No aplica	No aplica	YUBE SANCHEZ - HIJO	3157939168	
1,023,006,449	JESUS ALFONSO CORREA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	02.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	DIAG 100 A SUR Nº 2 -40	O+	No	No	No	No aplica		SURA	PORVENIR	BOLIVAR	21.12.2022	04.01.2023	02.01.2023	No aplica	No aplica	ANGELA CORREA - HERMANA	3204586963	
1,004,148,305	ANDRES FELIPE MARIN	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	02.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 70BIS SUR Nº78C - 59	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	26.12.2022	02.01.2023	02.01.2023	No aplica	No aplica	MARIA TRUJILLO - MADRE	3145924231	
79,894,873	BRYAN RAFAEL GARCIA RAMIREZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	02.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CARRERA 24 C - 41 SUR	O+	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	26.12.2022	05.01.2023	2/01/2023	09.09.2022	AVANZADO - CONSTRUALMANZA	BIBIANA BENAOVIDEZ ESPOSA	3016825383	
1,024,591,629	JUAN DE JESUS AREVALO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	07.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 136A -07	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	03.01.2023	07.01.2023	07.01.2023	No aplica	No aplica	ANA MILENA - HERMANA	3008927660	
79,968,629	FREDY ALEXANDER GODOY LEON	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	NO	06.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 64 Nº 71D -31	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR	05.01.2023	07.01.2023	06.01.2023	No aplica	No aplica	MILTON GODOY - HERMANO	3204341519	
1,033,694,813	JUAN CARLOS AMADO	AUX. ELECTRICO	OPERATIVO	SI	10.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	TRAV. 14 BIS Nº 42A-65 SUR	A+	No	No	No	No aplica		SANITAS	COLFONDOS	BOLIVAR	03.01.2023	16.01.2023	10.01.2023	No aplica	No aplica	EDILBERTO AMADO - PAPA	3125667454	
1,193,386,917	MANUEL AVILA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	10.01.2023	INACTIVO	13/03/2023	EBISU SAS	CRA 91 SUR Nº 70S -16	A+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	03.01.2023	16.01.2023	10.01.2023	05.07.2022	AVANZADO - INNOVA	CARMEN CHACON - ESPOSA	3009744586	
73,015,402	LIBARDO CANTILLO LEON	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	SI	10.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CRA 4 ESTE Nº30B-04-05	A+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	03.01.2023	16.01.2023	10.01.2023	21.08.2022	AVANZADO - LECIMAC	MARISOL PEÑA - ESPOSA	3232290761	
79,993,656	JOSE ANIBAL NOVOA GOMEZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	11.01.2023	INACTIVO	15.07.2023	ORR CONTRUCCIONES	CRA77B Nº62G -56 SUR	O+	Si	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	10.01.2023	16.01.2023	11.01.2023	No aplica	No aplica	ELIZABETH CULMA - ESPOSA	3103455755	
1,012,427,767	EDWIN ALEXANDER GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	06.01.2023	ACTIVO		INVERCO	CALLE 56G Nº 97B - 12 SUR	A+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05.01.2023	16.01.2023	06.01.2023	No aplica	No aplica	ANA SABOGAL - MAMA	3105580970	
9,197,046	RAMIRO ACUÑA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	13.01.2023	TRASLADO DE OBRA		ORR CONTRUCCIONES	CALLE 136A -07	AB+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA	04.01.2023	16.01.2023	13.01.2023	No aplica	No aplica	BLANCA RODRIGUEZ - ESPOSA	3142009295	
1,040,351,186	JULIO CESAR BETANCURT MOSQUERA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	12.01.2023	INACTIVO	11/03/2023	ORR CONTRUCCIONES	CRA 38N° 73- 64 SUR	B+	No	No	No	No aplica		NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	10.01.2023	16.01.2023	12.01.2023	No aplica	No aplica	GINNA TORRES - ESPOSA	3144280572	
13,686,463	NELSON EDUARDO RUIZ QUIROGA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	06.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CRA 105 - 56F 44 SUR	O+	No	No	No	No aplica		NUEVA EPS	PROTECCION	BOLIVAR	05.01.2023	16.01.2023	06.01.2023	No aplica	No aplica	MARGARITA OVIEDO - ESPOSA	1112431198	
1,124,036,283	MAIKO MANUEL SANCHEZ	HERRERO DE OBRA	OPERATIVO	SI	13.01.2023	ACTIVO		ORR CONTRUCCIONES	CALLE 51 SUR Nº52- 17	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	04.01.2023	16.01.2023	13.01.2023	No aplica	No aplica	DARIO GOMEZ - AMIGO	3016573294	
1,026,557,281	ANGEL RODRIQUEZ LOPEZ	HERRERO DE OBRA	OPERATIVO	SI	13.01.2023	ACTIVO		ORR CONTRUCCIONES	CRA 141 Nº 136-21 SUR	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	06.01.2023	16.01.2023	13.01.2023	No aplica	No aplica	GENOVEVA LOPEZ - MAMA	3208504693	
79,272,571	ORLANDO PEREZ CORREDOR	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	12.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	DIAG 46 B SUR 31 - 67	O+	No	No	Si	No aplica		SANITAS	COLFONDOS	BOLIVAR	11.01.2023	16.01.2023	12.01.2023	No aplica	No aplica	LUDIS PEREZ - ESPOSA	3108360353	
79,723,703	NELSON ENRIQUE JIMENEZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	16.01.2023	TRASLADO DE OBRA		INVERCO	CRA 75L Nº 62D -30	A+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	17.03.2022	16.01.2023	16.01.2023	No aplica	No aplica	CLAUDIA MUÑOZ - HERMANA	3108117461	
73,205,911	OSWALDO GIRALDO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	12.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 32 Nº 23A	A+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	11.01.2023	16.01.2023	12.01.2023	No aplica	No aplica	LINA MARQUEZ - ESPOSA	3209868266	
1,082,067,530	LUIS MIGUEL CERPA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	11.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 35A SUR Nº 26F -14	A+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	11.01.2023	16.01.2024	11.01.2023	No aplica	No aplica	AURI ESTELA - ESPOSA	3024354262	
1,082,570,009	EDWIN RIVERA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	06.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 35A SUR Nº 26F -14	O+	No	No	No	No aplica		COPSALUD	PORVENIR	BOLIVAR	06.01.2023	16.01.2025	06.01.2023	No aplica	No aplica	MILENA FONSECA - SUEGRA	3046606742	
1,023,887,849	ANGEL ALBEIRO AREVALO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	11.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 33F SUR Nº 13-28	A+	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	10.01.2023	16.01.2026	11.01.2023	No aplica	No aplica	MARIA RIVERA - HERMANA	3201459875	
1,105,873,732	EDISON MOLINA CORTES	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	10.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 32 Nº 23A	AB+	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	05.01.2023	16.01.2027	10.01.2023	No aplica	No aplica	LEIDY VALDEZ - ESPOSA	3505158687	
1,005,780,454	SEBASTIAN RAMIREZ PRIETO	ALMACENISTA	OPERATIVO	SI	17.01.2023	TRASLADO DE OBRA		EBISU SAS	CALLE 39C BIS SUR Nº 68D -66	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	12.01.2023	24.01.2023	19.01.2023	No aplica	No aplica	DIANA RONCANCIO - ESPOSA	3125064676	
1,075,627,959	JAVIER FELIPE MORENO	GUARDA DE SEGURIDAD	OPERATIVO	NO	23.01.2023	INACTIVO	1/05/2023	VIGEGUR	CRA68 Nº45G - 43 SUR	O+	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	13.01.2023	13.01.2023	04.01.2023	No aplica	No aplica	LUIS MORENO - PAPA	3107934049	
1,131,354,187	CAMILO ANDRES FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	24.10.2023	INACTIVO	3/04/2023	EBISU SAS	CRA72M BIS A Nº 4B-22	B+	No	No	No	No aplica		COLSALUD	PORVENIR	BOLIVAR	20.01.2023	24.01.2023	24.01.2022	No aplica	No aplica	GERLDINE MESA - COMPAÑERA	3227472962	
1,080,362,664	CAMILO EDUARDO RIVERA	HERRERO	OPERATIVO	NO	13.01.2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL LTDA	CALLE 38N°24B-32	O+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	12.01.2023	24.01.2023	13.01.2023	No aplica	No aplica	LEIDY ALMANZA - ESPOSA	3123630916	

BASE DE DATOS MEDEVAC

Código: F.ST- 01
Versión: 05
Fecha: 01/04/2021

CC	Nombre del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Estado en Obra	Fecha retiro (cuando aplique)	Contratista / Subcontratista	Dirección de residencia	Grupo sanguíneo	Trabajo Alturas	Trabajo Electrico	Libreta Militar	Trabajo con Sustancias Quimicas	Otro	EPS	AFP	ARL	Fecha de concepto medico	Fecha Inducción SST	Fecha de Constancia de entrega Inicial de EPP	Fecha Concepto aptitud para trabajo en Alturas	Nivel del certificado / Entidad que emite el certificado	Nombre de persona en caso de emergencia - Parentesco	Numero de contacto	Observaciones
1,050,067,648	JHON ENRIQUE GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	19.01.2023	INACTIVO	11/03/2023	ORR CONTRUCCIONES	CALLE47B 25A 12	O+	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	18.01.2023	24.01.2023	19.01.2023	No aplica	No aplica	JACKE GONZALEZ - HERMANA	3106880155	
1,032,456,836	JHAN CARLOS VILLALOBOS	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	19.01.2023	TRASLADO DE OBRA		ORR CONTRUCCIONES	CRA98 N°2 -20	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	19.01.2023	24.01.2023	19.01.2023	No aplica	No aplica	LUZ MUÑOZ - MAMA	3176198752	
1,084,221,784	SEGUNDO ARVEY SACANAMBUY	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	23.01.2023	INACTIVO	08.10.2023	CONDIAL LTDA	PENDIENTE	O+	Si	No	No	No aplica		COMPENSAR	COLFONDOS	BOLIVAR	20.01.2023	24.01.2023	23.01.2023	08.01.2023	AVANZADO - TITANIES	LUISA GARCIA - COMPAÑERA	3215275736	
1,101,445,179	MARIO ZUÑIGA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	20.01.2023	INACTIVO	08.10.2023	CONDIAL LTDA	PENDIENTE	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	17.01.2023	24.01.2023	20.01.2023	No aplica	No aplica	KATY TAPIAS - COMPAÑERA	3206095725	
1,032,464,598	JENIFER LOPEZ	INSPECTOR SST	OPERATIVO	NO	19.01.2023	INACTIVO	2/05/2023	ORR CONTRUCCIONES	CALLE65 B N°88 - 59	A+	Si	No	No	No aplica		SANITAS	PORVENIR	SURA	19.01.2023	24.01.2023	19.01.2023	20.11.20	COORDINADOR - AVANZADO-	CONSTANZA CAMACHO - MAMA	3184665074	
1,003,660,988	CRISTIAN PINEDA MEDINA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	13/04/2023	INACTIVO	24/07/2023	INVERCO	TRAV 4A N°392	A+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	20.01.2023	24.01.2023	23.01.2023	No aplica	No aplica	ERIKA MEDINA - MAMA	3133899339	
1,085,042,990	CARLOS RODRIQUEZ FUENTES	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	20.01.2023	INACTIVO	18/03/2023	INVERCO	PENDIENTE	O+	No	No	No	No aplica		MUTUA SER	PORVENIR	SURA	19.01.2023	24.01.2023	20.01.2023	No aplica	No aplica	ELSY ROBLEDO - ESPOSA	3157819331	
50,989,201	IRINA LUZ ALTAMIRANDA GUERRA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	30.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CARRERA 78F N° 54A-10 SUR	B+	No	No	No aplica	No aplica		MUTUAL SER	PORVENIR	BOLIVAR	25/01/2023	31/01/2023	30/01/2023	No aplica	No aplica	JEMI PAOLA GUERRA	3028121850	
1,049,316,799	JHON FREDIS CARO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25.01.2023	ACTIVO		EBISU SAS	CARRERA 81 D N° 42-46	O+	No	No	No	No aplica		MUTUAL SER	PORVENIR	BOLIVAR	19/01/2023	31/01/2023	20/01/2023	No aplica	No aplica	YEINIS CARO NAVARRO	3006036198	
1,051,670,620	DAVID JOSE JIMENEZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	2/01/2023	ACTIVO		EBISU SAS								FAMISANAR										
1,024,531,585	CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	7/01/2023	INACTIVO	10/01/2023	CONDIAL								NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR								
8,115,695	YAMIL CHAVERRA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	3/01/2023	ACTIVO		UMBA								SANITAS	PORVENIR	SURA								
1,022,322,715	JHON MASMELA	SUPERVISOR	OPERATIVO	SI		ACTIVO		INVERCO																		
80,072,136	DEIVI JOAN QUICENO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/01/2023	INACTIVO	08.02.2023	CONDIAL								SALUDTOTAL	PROTECCION	BOLIVAR								
91,136,364	FABIO NELSON RENTERIA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	26/01/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES																		
11,038,749	ARGEMIRO ARGEL	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	24/01/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES																		
91,325,748	HERMAN DARIO CASTAÑO BELTRAN	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	21/12/2022	INACTIVO	6/01/2023	CONDIAL LTDA																		
1,081,922,548	EDWIN MANUEL PALACIOS	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	3/01/2023	INACTIVO	30/01/2023	CONDIAL LTDA																		
1,026,293,095	JEISSON STEVE MEDIVELSO TORRES	OPERADOR RETROEXCAVADORA	OPERATIVO	NO	2/02/2023	INACTIVO	4/04/2023	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES ESPEJO	calle 2A No. 88 B 04	O+	NO	No aplica	no	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	1/02/2023	2/02/2023	2/02/2023	1/02/2023	NO APLICA	JHON ESPEJO - JEFE	3142587281	
11,206,662	JUAN CARLOS BOHORQUEZ	OFICIAL	OPERATIVO	NO	1/02/2023	INACTIVO	31/03/2023	HIDRAULICAS JCB SAS	K71J - 62D 21 SUR	A+	NO	No aplica	no	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	14/07/2022	2/02/2023	2/02/2023	14/07/2022	NO APLICA			
80,825,939	RAUL NAVARRO GOMEZ	OFICIAL	OPERATIVO	NO	1/02/2023	INACTIVO	31/03/2023	HIDRAULICAS JCB SAS		O+	NO	No aplica	NO	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	3/09/2022	2/02/2023	2/02/2023	3/09/2022	NO APLICA			
1,007,560,182	YULIETH FERNANDA RAMOS VARGAS	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	3/02/2023	INACTIVO	31/03/2023	HIDRAULICAS JCB SAS	CALLE 73 SUR N° 92-85	O+	NO	No aplica	NO	No aplica		SANITAS	PROTECCION	SURA	16/01/2023	3/02/2023	3/02/2023		NO APLICA			
1,033,756,287	ANGEL EDUARDO ALFARO	OFICIAL-HERRERO	OPERATIVO	SI	21/02/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES		O+	Si	No aplica	No	No aplica		SURA	PROTECCION	SURA	17/02/2023	21/02/2023	21/02/2023		NO APLICA	LILIANA PRIETO - ESPOSA	3228452180	
1,002,493,113	JOSE ALFREDO ADAD VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	21/02/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES		O+	Si	No aplica	No	No aplica		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	17/02/2023	21/02/2023	21/02/2023		NO APLICA	EDUARDO ALFARO-PRIMO	3133764573	
1,002,700,611	ANDRES FELIPE SALSEDO	AYUDANTE DE HERRERO	OPERATIVO	SI	21/02/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES		AB+	Si	No aplica	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	17/02/2023	21/02/2023	21/02/2023		NO APLICA	SANDRA PERA-PRIMA	3223293958	
1,047,475,558	LUIS DANIEL VERGARA PEREZ	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	NO	27/02/2023	INACTIVO	11/03/2023	ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 30 A SUR 2-35	O+	No	No aplica	No	No aplica		SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	22/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	22/02/2023	NO APLICA	MIRYAM VERGARA - HERMANA	3157044425	
1,104,421,341	JORGE ELIAS CALY PALENCIA	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	NO	28/02/2023	INACTIVO	22/03/2023	ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 12A 164 B-15	A+	Si	No aplica	Si	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	27/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	27/02/2023	NO APLICA	ELVIS CALY-HERMANO	3218061331	
3,237,424	JEREMIAS MORENO MORENO	OFICIAL	OPERATIVO	SI	5/06/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	SOACHA	O+	Si	No aplica	No	No aplica		FAMISANAR	COLFONDOS	SURA	2/03/2023	3/03/2023	4/03/2023					
1,131,110,868	JOSE DAVID MATOS BLANCO	OFICIAL	OPERATIVO	SI	17/03/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 52 A SUR 78 G -16	O+	Si	No aplica	No	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	16/03/2023	17/03/2023	NO APLICA	16/03/2023				
1,069,899,439	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	AYUDANTE	OPERATIVO	SI	15/03/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 78 H BIS 59A-37 SUR BOSA CENTRO	A+	Si	No aplica	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	10.03/2023	17/03/2023				YINEIDY URREA - ESPOSA	3132421968	
1,002,474,704	OSCAR DAVID MIRANDA HERNANDEZ	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	10/03/2023	INACTIVO	22/04/2023	W	CARRERA 21 A N°63-90 SUR SAN FRANCISCO	O+	Si		No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	8/03/2023	17/03/2023				NICOLE MULETH - ESPOSA	3216940803	
73,541,469	MARIO ALBERTO ROJAS MENDOZA	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	SI	11/04/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 80 BIS SUR 16 P-25 DIVINO NIÑO	O+	Si		Si	No aplica		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	7/03/2023	17/03/2023				SONIA YAMILE SUAREZ - ESPOSA	3134095754	
1,052,998,071	CRISTIAN DAVID POVEDA GUTIERREZ	HERRERO	OPERATIVO	NO	15/03/2023	INACTIVO	26/08/2023	ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 135 N° 126 F-08 LA GAITANA	O+	No	No aplica	No	No aplica		NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	6/03/2023	17/03/2023				PATRICIA RODRIGUEZ - ESPOSA	3103697677	
10,966,104	ANDRES GREGORIO CAICEDO MASS	AYUDANTE HERRERA	OPERATIVO	SI	16/03/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 49 C SUR N° 93D-90	A+	Si	No aplica	Si	No aplica		CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	10.03/2023	17/03/2023				MARIA EUGENIA CAICEDO - MAMA	3126161300	
1,052,993,710	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	OFICIAL	OPERATIVO	SI	9/03/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 162 Q BIS 40 I SUR -09 GRANJA SAN PABLO	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	7/03/2023	17/03/2023				YURANIS HERNANDEZ - ESPOSA	3227539931	
13852230	FERNEL CORTES SANTANA	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	SI	13/03/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 47 B SUR 28-87	O+	NO	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	6/03/2023	17/03/2023				TERESA HERNANDEZ - HERMANA	3203692223	
73563613	MILTON ENRIQUE CERPA	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	SI	9/03/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 128 C 93-03 SUBA RINCON	O+	SI	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	7/03/2023	17/03/2023				OSCARINA CENTENO - HERMANA	3104225827	
93132250	DIEGO FERNANDO MARQUEZ GUTIERREZ	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	NO	16/03/2023	INACTIVO	14.07.2023	EBISU SAS	carrera 90 a 42 f - 65 sur	O-	SI	NO	SI	No aplica		SURA	PROTECCION	BOLIVAR						YUDI ANDREA MORENO - ESPOSA	3206602919	
1100543793	JEFREY DAVID CARDOZO	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	SI	22/03/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 19 D 83-55 SUR SAN FRANCISCO	O+	SI	NO	SI	No aplica		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	17/03/2023	22/03/2023	22/03/2023			ELY CARDOZO - HERMANA	3222324457	
79.645.240	JAIR JOHANNY BERNAL GUTIERREZ	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	21/03/2023	INACTIVO	03.08.2023	EBISU SAS	calle 39 sur N° 72 M-85 Kennedy	B+	SI	NO APLICA	SI	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	15/03/2023	28/03/2023	28/03/2023			KAREN QUINTERO - ESPOSA	3158711436	
1068667747	CARLOS MARIO GUERRA CASARRUBIA	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	22/03/2023	INACTIVO	31/08/2023	HECTOR UMBA		A+	SI	NO APLICA	NO	NO APLICA		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	15/03/2023	22/03/2023	NO APLICA	15/03/2023		HECTOR UMBA - JEFE	3103070058	
1068659068	NESTOR LUIS DIAZ GUZMAN	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	22/03/2023	INACTIVO	05.07.2023	HECTOR UMBA		B+	SI	NO APLICA	NO	NO APLICA		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	15/03/2023	22/03/2023	NO APLICA	15/03/2023		HECTOR UMBA - JEFE	3103070058	
7255287	VICTOR ANDRES RODRIGUEZ TAPASCO	SOLDADOR	OPERATIVO	SI	23/03/2023	ACTIVO		CIVILTECH		O+	NO	NO APLICA	NO	No aplica		COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	24/06/2022	23/03/2023	NO APLICA					
1016038450	LUIS EDUARDO ZIPA SALAMANCA	GERENTE	OPERATIVO	SI	23/03/2023	ACTIVO		CIVILTECH		A+	No	No aplica	NO	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	20/10/2022	23/03/2023	NO APLICA					
1076649346	OSCAR EDUARDO MARROQUIN	TECNICO ELECTRICISTA	OPERATIVO	NO	28/03/2023	INACTIVO	8.052023	EBISU SAS	CARRERA 25 A ESTE N° 22-04 SUR	O+	SI	SI	SI	No aplica		SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	25/03/2023	28/03/2023	28/03/2023			ALEJANDRA CONDE - ESPOSA	3227599379	
1026587356	IVAN MATEO MONSALVE CRUZ	AYUDANTE ELECTRICISTA	OPERATIVO	NO	28/03/2023	INACTIVO	19.04.2023	EBISU SAS	CALLE 48 B SUR N°8A-74 ESTE	O-	SI	SI	SI	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	25/03/2023	28/03/2023	28/03/2023			NICOLAS MONSALVE - HERMANO	3214520741	
1110577553	JHONATHAN GRANADOS MORENO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	31/03/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CARRERA 14 F 136 SUR	B+	SI	SI	NO	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	29/03/2023	31/03/2023	31/03/2023			JAKELINE GARZON - ESPOSA	3212527240	
1050064004	FERNEY BELEÑO PEINADO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	31/03/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 46 C SUR N° 27-65	O+	SI	SI	NO	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	28/03/2023	31-mar	31/03/2023			MARTIN BELEÑO - TIO	3118018893	
79829346	ARISMENDI TORRES GUZMAN	OFICIAL PLOMERIA	OPERATIVO	SI	3/04/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 56 B 98 C - 27 SUR BOSA	O+	NO	NO	SI	No aplica		FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR	29/03/2023	3/04/2023	3/04/2023			BLANCA MIREYA FORERO - ESPOSA	3138432393	
1000128491	DAVID SANTIAGO TORRES FORERO	AYUDANTE PLOMERIA	OPERATIVO	SI	3/04/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 57B SUR98 C -27	O+	NO	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	29/03/2023	3/04/2023	3/04/2023			MARISOL TORRES - HERMANA	3005929774	
80728996	LUIS FERNANDO GIRON PUENTES	ALMACENISTA	OPERATIVO	SI	3/04/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 10 B SUR 20 A 35	O+	NO	NO	SI	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR		3/04/2023	3/04/2023			MARIA ALEJANDRA LOPEZ - ESPOSA	3043509164	
1007857829	VICTOR ALFONSO DURAN VELOT	HERRERO	OPERATIVO	SI	11/04/2023	ACTIVO		EBISU SAS		O+	SI	SI	NO	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	1/04/2023	11/04/2023	11/04/2023			WALBERTO DURAN - HERMANO	3103677778	
80856529	ADALBERTO MARIN	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	11/04/2023	ACTIVO		EBISU SAS		A+	SI	SI	NO	No aplica		SURA	PORVENIR	BOLIVAR	1/04/2023	11/04/2023	11/04/2023			DEYANIRE GUILLOSO - ESPOSA	3025964777	
1106785842	MARIO ANDRES AGUDELO CAICEDO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	11/04/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 62 SUR 75 J - 08 CIUDAD BOLIVAR	B+	SI	SI	SI	No aplica		NUEVA EPS	PROTECCION	BOLIVAR	1/04/2023	11/04/2023	11/04/2023			FLOR DELI CASTILLO - ESPOSA	3126092355	
1049317952	IVAN DARIO GIL GARCIA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	11/04/2023	ACTIVO		EBISU SAS	DIAGONAL 52 C 28-35 SUR TUNJUELITO	B+	SI	SI	SI	No aplica		SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	1/04/2023	11/04/2023	11/04/2023			EDUAR GIL - HERMANO	3229496614	
1043964742	SAMIR DAVID BLANCO URBINA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	12/04/2023	INACTIVO	6/05/2023	ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 69 ABIS SUR 77 I - 23 BOSA	A+	SI	SI	NO	No aplica		MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	8/04/2023	12/04/2023	12/04/2023			MARIA ANGELICA LUNA - ESPOSA	3003158892	
92450398	AGUSTIN ANTONIO BERRIO HERRERA	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	SI	11/04/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CARRERA 13 D 42-35 SUR URIBE URIBE	A+	SI	SI	NO	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	BOLIVAR	1/04/2023	12/04/2023	12/04/2023			YARICN BERRIO - HERMANA	3209510998	
1002489385	LUIS FERNANDO JEREZ	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	NO	12 04/2023	INACTIVO	22/05/2023	ORR	CALLE 129A 94 C 12	O+	SI	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11/04/2023	18/04/2023	14/04/2023			YULIZA PINEDA ESPOSA	3017397847	
1101205082	HUBER ANTONIO BAYONA	OFICIAL ESTRUCTURA	OPERATIVO	NO	18/04/2023	INACTIVO	14.07.2027	EBISU SAS	CALLE 712 SUR 27 I 10	A+	SI	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	COLFONDOS	BOLIVAR	12/04/2023	18/04/2023	18/04/2023			SIRLETY ROLDAN ESPOSA	3208999252	
1051741667	DARLEY HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	11/04/2023	INACTIVO	9/08/2023	ORR	RAFAEL URIBBE	O+	SI	NO	NO	NO APLICA		MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	10/04/2023	18/04/2023	18/04/2023			YURANI HERNANDES HERMANA	3227539931	
110082624	CARLOS DARIO NARANJO CUADRADO	AYUDANTE HERRERO	OPERATIVO	NO	12/04/2023	INACTIVO	6/05/2023	ORR	AV CALLE 3 - 66 21 KENNEDY	O+	SI	NO	SI	No aplica		COMPENSAR	PROTECCIÓN	SURA	10/04/2023	18/04/2023	11/04/2023			ENANDIS NARANJO HERMANA	3104723824	
1033761625	LUIS ALBERTO GENEZ MEDINA	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	NO	14/04/2023	INACTIVO	19/04/2023	ORR	DIAGONAL 45 B SUR 13 I 20	O+	SI	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	13/04/2023	18/04/2023	14/04/2023			LISBET PAOLA PACHECO ESPOSA	3208911100	
15618583	WILLIAN ALVARES	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	NO	10/04/2023	INACTIVO	6/05/2023	ORR	CALLE D 41 81 51 KENNEDY	O+	SI	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	10/04/2023	18/04/2023	10/04/2023			MARTIAN TERAN ESPOSA	3122818070	
1108766669	GEAOVARYS GARIZAO	ATYUDANTE HERRERO	OPERATIVO	NO	12/04/2023	INACTIVO	6/05/2023	ORR	CALLE 136 A 153 - 56	O+	SI	NO	NO	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	10/04/2023	18/04/2023	11/04/2023			KAREN GARZA HERMANA	3229010307	

BASE DE DATOS MEDEVAC

Código: F.ST- 01
Versión: 05
Fecha: 01/04/2021

CC	Nombre del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Estado en Obra	Fecha retiro (cuando aplique)	Contratista / Subcontratista	Dirección de residencia	Grupo sanguíneo	Trabajo Alturas	Trabajo Electrico	Libreta Militar	Trabajo con Sustancias Quimicas	Otro	EPS	AFP	ARL	Fecha de concepto medico	Fecha Inducción SST	Fecha de Constancia de entrega Inicial de EPP	Fecha Concepto aptitud para trabajo en Alturas	Nivel del certificado / Entidad que emite el certificado	Nombre de persona en caso de emergencia - Parentesco	Numero de contacto	Observaciones
1052985273	ALEXIS SIERRA MARTINES	AYUDANTE HERRERO	OPERATIVO	NO	11/04/2023	INACTIVO	20/05/2023	ORR	SUBA	O+	SI	NO	NO	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	10/04/2023	18/04/2023	11/04/2023			LEIDYS MEDINA ESPOSA	3115326428	
1100547827	GABRIEL ANDRES DIAZ ORDOÑES	AYUDANTE HERRERO	OPERATIVO	NO	17/04/2023	INACTIVO	19/04/2023	ORR	SUBA	A+	SI	NO	NO	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	14/04/2023	18/04/2023	15/04/2023			VICTOR GARCIA PRIMO	3113222176	
1192779870	ALVARO ALFONSO BALDOVINO BENITES	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	NO	17/04/2023	INACTIVO	6/05/2023	ORR	CRA 5 45 CALLE 115-4	B+	SI	NO	NO	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	14/04/2023	18/04/2023	15/04/2023			VICTOR GARCIA PRIMO	3113222176	
15076162	JOSE MANUEL ALMANZA	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	SI	12/04/2023	ACTIVO		ORR	CRA 49B SUR NUMERO 9A 44 MOLINOS	O+	SI	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	10/04/2023	18/04/2023	12/04/2023			RUBIO ORTIZ ESPOSA	3133841445	
1002421016	RICARDO JAVIER MULETH REVUELTAS	AYUDANTE HERRERO	OPERATIVO	NO	17/04/2023	INACTIVO	22/04/2023	ORR	CRA 21A NUMERO 63-90 SUR	A+	SI	NO	NO	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	15/04/2023	18/04/2023	17/04/2023			DOINIS REVUELTAS MADRE	3147673985	
1052704103	JOSE GREGORIO MIRANDA	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	NO	17/04/2023	INACTIVO	22/04/2023	ORR	CRA 21A NUMERO 63-90	O+	SI	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	15/04/2023	18/04/2023	17/04/2023			MEIVIS GOMEZ ESPOSA	3196650450	
1006147184	TATIANA CARDONA GARZON	INSPECTOR SST	OPERATIVO	SI	14/04/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CRA 18L NUMERO 70H-08 SUR	O+	SI	NO	NO	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	13/04/2023	18/04/2023	18/04/2023			MARIBEL GARZON MADRE	3214870920	
1049937343	ANDERSON ZUÑIGA CORTES	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	26/04/2023	INACTIVO	3.06.2023	ORR	CRA 51 SUR NUMERO 80-J 15	B+	SI	NO	NO	No aplica		SANITAS	PORVENIR	SURA	25/04/2023	27/04/2023	26/04/2023			ANGELICA MARIA BOTTET	3144781479	
1103108333	JOSE CARLOS PEREZ GARAY	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	3/04/2023	INACTIVO	15.07.2023	ORR	LUCERO BAJO	A+	SI	NO	NO	No aplica		SANITAS	PORVENIR	SURA	30/03/2023	27/04/2023	3/04/2023			ALBA GARAY MADRE	3127652784	
1010079581	WILDER JAIR CASTILLO TRIANA	OFICIAL	OPERATIVO	NO	24/04/2023	INACTIVO	6/05/2023	ORR	CRA 88 H NUMERO 40 16 SUR	A+	SI	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	22/04/2023	27/04/2023	24/04/2023			MARIA FERNANDA PRESENTA	3013117463	
3256261	NOLVERTO CASTILLO RUBIO	OFICIAL	OPERATIVO	NO	24/04/2023	INACTIVO	6/05/2023	ORR	CRA 88 H NUMERO 40 16 SUR	AB+	SI	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	22/04/2023	27/04/2023	24/04/2023			ASTRID VEGA ESPOSA	3123608178	
1033791035	MAICOL JAVIER CUCHIMBA PACHONGO	AYUDANTE	OPERATIVO	SI	13/04/2023	ACTIVO		INVERCO	CARRERA 28D NUMERO 71 Q SUR 55	O+	SI	NO	NO	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	12/04/2023	27/04/2023	13/04/2023			MARIA NOEMI PACHONGO	3217766346	
3188024957	JUAN CARLOS VADEL TOBAR	HERRERO	OPERATIVO	NO	28/04/2023	INACTIVO	17/06/2023	ORR	LUCERO ALTO BARRIO CEDRITO	O+	SI	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			LILIANA BRIZUELA ESPOSA	3222863919	
1030525167	JESUS ALBERTO MEDINA	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	28/04/2023	INACTIVO	6/05/2023	ORR	CRA 97 A BIS NUMERO 42A 60 SUR	O+	SI	NO	NO	No aplica		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023			FANNY ALVARADO MADRE	3208804039	
79918811	PEDRO PABLO DÍAZ RODRIGUEZ	OPERADOR RETROEXCAVADORA	OPERATIVO	NO	26/04/2023	INACTIVO	28.07.2023	GL TRANSPORTE, SUMINISTRO AGREGADOS			NO	NO	NO	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	11/03/2023	2/05/2023	26/04/2023					
1005649186	JEISON HERAZO	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	27/04/2023	INACTIVO	11.07.2023	UMBA																		
1003713942	EDGAR DIAZ	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	27/04/2023	INACTIVO	19/08/2023	UMBA																		
79267637	RICARDO ELIAS BALLEN GUTIERREZ	VIGILANTE	OPERATIVO	SI	28/04/2023	ACTIVO		VISEGUR	CARRERA 24 Nº 44A-04	O+	NO	NO	NO	No aplica		FAMISANAR		SURA	20/04/2023	2/05/2023	28/04/2023			ELISA BALLEN - HERMANA	3012312730	
1192790327	JAROL ALEMAN	VIGILANTE	OPERATIVO	SI	5/05/2023	ACTIVO		VISEGUR																		
1128324456	JORGE LUIS VALERA OSORIO	VIGILANTE	OPERATIVO	SI	5/05/2023	ACTIVO		VISEGUR																		
1049944933	YAN CARLOS ZUÑIGA CORDERO	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	3/05/2023	INACTIVO	3.06.2023	ORR CONSTRUCCIONES		O+	NO	NO	NO	NO		COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	2/05/2023	3/02/2023	3/02/2023			MAYRA GONZALEZ - HERMANA	3205881808	
1129807779	YOBAN DE JESUS CIPRIANO MANCHEGO	OFICIAL	OPERATIVO	NO	4/05/2023	INACTIVO	3.06.2023	ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 4 65 - 35 SUR BARRIO DANUBIO SUR	O+	SI	SI	NO	NO		FAMISANAR	COLFONDOS	COLMENA	3/05/2023	4/05/2023	4/05/2023			YINI MARTINEZ - ESPOSA	3236930535	
80819604	JULIAN FELIPE FRAVITOBA GOMEZAQUIRA	OFICIAL	OPERATIVO	NO	4/05/2023	INACTIVO	20/05/5023	ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 110 132B-18 SUBA	O+	SI	NO	NO	NO		SURA	PROTECCION	COLMENA	2/05/2023	4/05/2023	4/05/2023			LUZ MARINA - HERMANA	3118854363	
1114090795	DIEGO FERNANADO GONZALEZ OSPINA	AYUDANTE EJERO	OPERATIVO	NO	4/05/2023	INACTIVO	20/05/5023	ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 72K 49-18 SUR KENNDY	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PROTECCION	COLMENA	3/02/2023	4/05/2023	4/05/2023			SANDRA CONSUELO - ESPOSA	3196351739	
19499339	ELBER DARIO LOPEZ DELGADO	OFICIAL DE REMATES	OPERATIVO	SI	4/05/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 7 35B-33 SUR SAN CRISTOBAL	O+	SI	NO	SI	NO		FAMISANAR	COLPENSIONES	COLMENA	3/04/2023	4/05/2023	4/05/2023			DARWIN LOPEZ - HIJO	3227772013	
1037483684	LUIS CARLOS OSORIO ZURIQUE	OFICIAL DE REMATES	OPERATIVO	NO	4/05/2023	INACTIVO	3.06.2023	ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 4 C 57-35 SUR USME	O+	SI	NO	SI	NO		FAMISANAR	PORVENIR	COLMENA	3/04/2023	4/05/2023	4/05/2023			YESENIA MIRANDA - MAMA	3155488734	
1082479758	CARLOS ALBERTO JIMENEZ RANGEL	HERRERO	OPERATIVO	SI	8/05/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 54 C SUR 100-25 BOSA	A+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	COLMENA	4/05/2023	8/05/2023	8/05/2023			TOMASA RANGEL - MMA	3163028918	
1043325320	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	OFICIAL	OPERATIVO	SI	8/05/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 54 C SUR 100-25 BOSA	O+	SI	NO	NO	NO		SALUDTOTAL	PORVENIR	COLMENA	04/05/25023	9/05/2023	8/05/2023			MARIA FERNANDA JIMENEZ - ESPOSA	3223349748	
1068584880	MAURY DE JESUS MONTEROZA MUÑOZ	HERRERO	OPERATIVO	SI	8/05/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 94 B 132 - 35 INT 7 SUBA	O+	SI	NO	SI	NO		SANITAS	PORVENIR	COLMENA	4/05/2023	9/05/2023	8/05/2023			MAYERLI MONTEROZA - HERMANA	3113343395	
1052242672	JUAN MANUEL ROJAS CARDEÑO	AYUDANTE	OPERATIVO	SI	11/05/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 80 BIS SUR 16 B - 25 DIVINO NIÑO	A+	NO	NO	NO	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	20/04/2023	11/05/2023	11/05/2023			SONIA SUAREZ - MADRASTA	3134995754	
1030685569	XIMENA OSORIO	INSPECTORA SST	OPERATIVO	NO	3/05/2023	INACTIVO	16.09.2023	ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 79 # 51 SUR 16 KNEDEY	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANRA	PORVENIR	COLMENA	4/05/2023	4/05/2023	4/05/2023			EDWIN ORTIZ ESPOSO	3010616825	
1010095666	EDUAR JOSE BUELVAS	AYUDANTE	OPERATIVO	SI	5/05/2023	ACTIVO		UMBA																		
1003713940	LUIS ALFREDO DIAZ	AYUDANTE	OPERATIVO	SI	7/05/2023	ACTIVO		UMBA																		
1193557343	WALNER CHAVERRA	AYUDANTE	OPERATIVO	SI	7/05/2023	ACTIVO		UMBA																		
1.063.164.092.	ELIECER OSORIO	TECNICO ELECTRICO	OPERATIVO	SI	10/05/2023	ACTIVO		EBISU																		
1068669238	OCTAVIO SALGADO	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	20/05/2023	INACTIVO	31.08.2023	UMBA																		
1127939824	KRISS LIRUZCA NOGUERA	INSPECTORA SST	OPERATIVO	NO	12/05/2023	INACTIVO	21.06.2023	UMBA																		
1000182035	JOSE ALEJANDRO UMBA	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	24/05/2023	INACTIVO	31.08.2023	UMBA																		
11116485	DARWIN JAIR BULA	OFICIAL	OPERATIVO	NO	1/06/2023	INACTIVO	9.09.2023	ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 1133#111-38	A+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	COLPENSIONES	COLMENA	1/06/2023	2/06/2023	2/06/2023			LUISA FERNANDA ESPOSA	3008311662	
1122126761	ALFREDO CARANTON	AYUDANTE PLOMERIA	OPERATIVO	SI	16/06/2023	ACTIVO		EBISU SAS		O+	SI	NO	NO	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	9/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	NO APLICA	NO APLICA	MAYBER RAMIREZ ESPOSA	3108824411	
1001045259	FRANK AREVALO	AYUDANTE PLOMERIA	OPERATIVO	SI	16/06/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CRA 2 -74 46 SUR	O+	SI	NO	NO	NO		SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	9/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	NO APLICA	NO APLICA	LUZ FORERO MADRE	3112009572	
1032486745	ANDRES CAMILO CARBAJAL PULIDO	COORDINADOR SST	OPERATIVO	NO	20/06/2023	INACTIVO	28.07.2023	ICOPORES HECTOR JULIO UMBA	CALLE 10D 18Q 53 SOACHA	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	15/06/2023	28/06/2023	20/06/2023	25/08/2022	REENTRENAMIENTO AVANZADO	MICAL PULIDO MADRE	3105717072	
10003335802	OSCAR MAURICIO GARCIA	OPERADOR DE MAQUINA	OPERATIVO	NO	22/06/2023	INACTIVO	11.07.2023	GL TRANSPORTE, SUMINISTRO AGREGADOS	CRA 18L #69-47	O+	NO	NO	NO	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	15/06/2023	28/06/2023	22/06/2023	NO APLICA	NO APLICA	KELLY JOHANA ESPOSA	3182194213	
1085174866	JUAN ALBERTO DIAZ	AYUDANTE ELECTRICO	OPERATIVO	SI	26/06/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 182 CON CARRERA 7B BIS-40 SAN ANOTNIO	O+	NO	SI	NO	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	20/02/2023	28/06/2023	26/06/2023	NO APLICA	NO APLICA	JUAN DIAZ PADRE	3106001965	
1033744000	EDWIN MAURICIO MOYANO	AYUDANTE ELECTRICO	OPERATIVO	si	24/07/2023	ACTIVO		EBISU SAS		O+	NO	SI	NO	NO		NUEVA EPS	PORTECCION	BOLIVAR	19/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	NO APLICA	NO APLICA	LUZ MARI MOYANO MADRE	3213847734	
1047452240	JHON JAVIER SIERRA GONZALES	AYUDANTE	OPERATIVO	SI	24/07/2023	ACTIVO		HECTOR UMBA	CARRE 91 # 127 35 SUBA	O+	NO	NO	NO	NO		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	22/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	NO APLICA	NO APLICA	MAYURI MARISCADOS ESPOSA	3246839194	
1005474062	LUIS GUILLERMO CUADRO BANQUEZ	HERRERO	OPERATIVO	SI	11/07/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 61 B SUR #19 B - 71	B+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	COLMENA	10/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	16/07/2023				
1079990693	DARIO JOSE PINEDO	HERRERO	OPERATIVO	SI	11/07/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 36 # 68 A 48	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	COLMENA	10/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	16/07/2023				
52878557	WENDY PAOLA PERDOMO MORA	PROFESIONAL SST	OPERATIVA	NO	4/07/2023	INACTIVO	12/08/2023	EBISU SAS	CARERRA 73 H 71 A *52 SUR*	O+	SI	NO	NO	NO		SURA	COLFONDOS	BOLIVAR	30/06/2023	4/07/2023	4/07/2023		NO APLICA	NELSY MORA FLOREZ MADRE	3172266161	
1006865637	CRISTIAN DAVID REAL	AYUDANTE HIDRAULICO	OPERATIVO	NO	8/07/2023	INACTIVO	24/07/2023	INVERCO		A-	NO	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	5/07/2023	8/07/2023	8/07/2023		NO APLICA			
1024589722	FRANKI ARCOS	GUARDA DE SEGURIDAD	OPERATIVO	SI	18/07/2023	ACTIVO		VISEGUR			NO	NO	SI	NO		CAPITAL SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	17.07.2023							
1047452240	JOHAN SIERRA	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	19/07/2023	INACTIVO	12/08/2023	UMBA			NO	NO	NO	NO		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	22.07.2023							
8870628	VICTOR ALFONSO VALENCIA SANTOS	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	SI	14/08/2023	ACTIVO		ORR CONTRUCCIONES	CALLE 33 B SUR *13 - 53 RAFAEL URIBE URIBE*	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	COLMENA	10.08.2023	14/08/2023	14/08/2023	11/08/2023	AVANZADO	JANEBYS HERRERO - ESPOSA	3102334685	
1064994108	JORGE MARIO AVILES	GUARDA DE SEGURIDAD	OPERATIVO	SI	3/08/2023	ACTIVO		VISEGUR	SOACHA	O+	NO	NO	SI	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	5/08/2023	14/08/2023	3/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	ARLEIDIS ALVAREZ ESPOSA	3168032832	
1024469602	FERNEY DARIO MEDINA CIFUENTES	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	OPERATIVO	SI	15/08/2023	ACTIVO		ROAD BUILDING S.A.S	CALLE 69A #18 B SUR	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	10/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	JENNI VIVIANA MADRE	3212473720	
73164643	JOSE GREGORIO HERNANDEZ	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	OPERATIVO	SI	15/08/2023	ACTIVO		ROAD BUILDING S.A.S	CARRERA 145 #145-46	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	10/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	LILIBET MARRUGO ESPOSA	3143481913	
15821639	CARLOS DIDIER PADILLA LOPEZ	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	OPERATIVO	SI	15/08/2023	ACTIVO		ROAD BUILDING S.A.S	CALLE 126 B BIS #128-18	A+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	10/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	PAOLA VILLA TOBAR ESPOSA	3214530871	
1010029137	JHON MAURICIO CIFUENTES GUTIERREZ	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	OPERATIVO	SI	15/08/2023	ACTIVO		ROAD BUILDING S.A.S	CALLE 69 A #28	O+	SI	NO	No	NO		FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	10/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	LEIDY VARGAS ESPOSA	3143167219	
1000722787	IVAN SEBASTIAN CIFUENTES GUTIERREZ	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	OPERATIVO	SI	15/08/2023	ACTIVO		ROAD BUILDING S.A.S	DIAGONAL 69 N°18-47 SUR	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	10/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	YEIMI CAMARGO ESPOSA	3155538085	
1032371887	JHON JAIRO HERNANDEZ HERNANDEZ	INSPECTOR SST	OPERATIVO	NO	15/08/2023	INACTIVO	20.09.2023	ROAD BUILDING S.A.S	CALLE 10 N° 14A-85 SUR	O-	SI	NO	NO	NO		SURA	PROTECCION	POSITIVA	10/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	VICTOR HERNANDEZ HERMANO	3008656115	
9431464	EDER MIGUEL MORA MEZA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 32 # 26 -08 SAN CRISTOBAL SUR	O+	SI	NO	NO	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	15/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	ARSENIO MORA HERMANO	3227903332	
1023931435	YEIBER ENRIQUE CENTENO SAYAS	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 91 SUR # 38 B - 04 B SUR KENNEDY	A+	SI	NO	SI	NO		COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	15/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	YISENIA CENTENO HERMANA	3214982189	
1000129593	BENJAMIN ANTONILES QUINTERO	OFICIAL HIDRAULICO	OPERATIVO	SI	23/08/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CARRERA 11B B 23 D 42 FONTIBON	A+	NO	NO	NO	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	15/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	NO APLICA		WILMER JIMENEZ PRIMO	3102640646	
19768600	ELIO DE JESUS DELGADO	OFICIAL HERRERO	OPERATIVO	SI	24/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	DIAGONAL 34 68 A 17 SUR KENNEDY	A+	SI	NO	SI	NO		SANITAS	PROTECCIÓN	COLMENA	22/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	22/08/2023	AVANZADO	DALILA BETANCUR OSORIO ESPOSA	3193676752	
1233904549	DARIO OSORIO CASTRO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	2/08/2023	INACTIVO	9.09.2023	ORR CONSTRUCCIONES		A+	SI	NO	NO	NO		CAPITAL SALUD	PROTECCION	COLMENA	13/07/2023	2/08/2023	2/08/2023	2/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	SANDRA MILENA MADRE	3213583976	
73577362	OVIDIO ROCHA GARCIA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	9/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES		A+	SI	NO	NO	NO		SALUD TOTAL	PORVENIR	COLMENA	31/07/2023	9/08/2023	9/08/2023	9/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	YENIFER ROCHA HIJA	3053671568	
1051739751	NEMESIO SANTANA ARRIETA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	3/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES		B+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PROTECCION	COLMENA	1/08/2023	3/08/2023	3/08/2023	3/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	JEIDY JIMENEZ ESPOSA	3204896184	
1033761628	JORGE LUIS ROCHA CASTRO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	2/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES		O+	SI	NO	NO	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	31/07/2023	2/08/2023	2/08/2023	2/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	JOSE DAVID HERMANO	3227356038	
79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	15/08/2023	ACTIVO		ROAD BUILDING S.A.S		O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	8/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	MARIA LUISA DIAZ ESPOSA	3214857726	
1216968625	FRANEISON RODRIGUEZ CAMARGO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	9/08/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 41F SUR N°81B-16		SI	NO	NO	NO		COOSALUD	PORVENIR	BOLIVAR	4/08/2023	9/08/2023	9/08/2023	4/08/2023	NO APLICA	JHON CARO HERMANO	322 6676956	
1072531464	FERNEIS DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	10/08/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CARRERA 78F Nº 54A-10 SUR		SI	NO	NO	NO		MUTUALSER	PORVENIR	BOLIVAR	4/08/2023	9/08/2023	9/08/2023	4/08/2023	NO APLICA	YEIMIS ALTAMIRANDA AMIGA	3225481310	
1044616563	ARNOLDO JOSE ORTEGA NOGERA	CELADOR	OPERATIVO	SI	17/08/2023	ACTIVO		ANILLOS DE SEGURIDAD LTDA		O+	NO	NO	SI	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	22/08/2023	22/08/2023	17/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	ROSANA TOVAR ESPOSA	3046651127	
1003505380	CARLOS DAVID RIAÑO RODRIGUEZ	CELADOR	OPERATIVO	SI	24/08/2023	ACTIVO		ANILLOS DE SEGURIDAD LTDA		A+	NO	NO	SI	NO		FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	18/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	CLAUDIA RODRIGUEZ HERMANA	3217264270	
1005824808	DAVID ALEXANDER ALVAREZ GUALTERO	CELADOR	OPERATIVO	SI	17/08/2023	ACTIVO		ANILLOS DE SEGURIDAD LTDA		A+	NO	NO	SI	NO		COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	15/08/2023	24/08/2023	17/08/2023	NO APLICA	NO APLICA			
PT 6422720	JOSE DE JESUS ROMERO PORRAS	CELADOR	OPERTIVO	SI	17/08/2023	ACTIVO		ANILLOS DE SEGURIDAD LTDA		A+	NO	NO	SI	NO		COOSALUD	PORVENIR	AXA COLPATRIA	21/12/2023	23/08/2023	17/08/2023	NO APLICA	NO APLICA	PAOLA ESPOSA	3208234743	

BASE DE DATOS MEDEVAC

Código: F.ST- 01
Versión: 00
Fecha: 01/04/2021

CC	Nombre del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Estado en Obra	Fecha retiro (cuando aplique)	Contratista / Subcontratista	Dirección de residencia	Grupo sanguíneo	Trabajo Alturas	Trabajo Electrico	Libreta Militar	Trabajo con Sustancias Quimicas	Otro	EPS	AFP	ARL	Fecha de concepto medico	Fecha Inducción SST	Fecha de Constancia de entrega Inicial de EPP	Fecha Concepto aptitud para trabajo en Alturas	Nivel del certificado / Entidad que emite el certificado	Nombre de persona en caso de emergencia - Parentesco	Numero de contacto	Observaciones
1051743928	JOSE LUIS CENTENO POLO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 5C N°87F-28	O+	SI	NO	NO	NO		SALUD TOTAL	PROTECCION	COLMENA	22/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	24/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	ELICETH CENTENO POLO - HERMANA	3108871651	
1002424363	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	AVENIDA BOYACA 44D SUR 52	B+	SI	NO	NO	NO		SALUD TOTAL	PORVENIR	COLMENA	22/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	24/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	BEATRIZ JIMENEZ MUJER	3125202600	
79113529	JOSE MIGUEL PEREZ RAMIREZ	MAESTRO GENERAL	OPERATIVO	SI	28/08/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 26J BIS N°196-14	O+	NO	NO	SI	NO		COMPENSAR	COLPENSIONES	BOLIVAR	23/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	23/08/2023	NO APLICA	NOEMI FRANCO ESPOSA	3125187097	
13379653	EMIR ANTONIO VARGAS FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	28/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 132B N°152-40 SUBA	O+	SI	NO	NI	NO		SALUD TOTAL	PROTECCION	COLMENA	25/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	27/08/2023	AVANZADO	ARNOLI BUSTAMANTE ESPOSA	3219843053	
1019019872	JOSE ALEJANDRO CACERES	AYUDANTE PLOMERO	OPERATIVO	SI	29/08/2023	ACTIVO		INVERCO	CARRERA 15 BIS N°188-40	O+	NO	NO	SI	NO		SANITAS	PORVENIR	SURA	6/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	6/07/2023	NO APLICA	ROSA MAYBER ESPOSA	3167557215	
1079186249	DUVAN SEBASTIAN FOREZ	AYUDANTE PLOMERO	OPERATIVO	SI	29/08/2023	ACTIVO		INVERCO	CARRERA 110 BIS N°70F-21	O+	NO	NO	SI	NO		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	21/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	21/07/2023	NO APLICA	YENNI CABALLERO ESPOSA	3209092202	
1007734507	RAUL MANUEL SUAREZ BRUNO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	28/08/2023	ACTIVO		ICOPORES HECTOR JULIO UMBA	CALE 58BIS N°98A-34	O+	SI	NO	NO	NO		MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	28/08/2023	29/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	NO APLICA	JAQUELIN SUAREZ HERMANA	3106378377	
79702000	ANTONIO JIMENEZ CASTELLANO	CORTADOR DE LADRILLO	OPERATIVO	SI	29/08/2023	ACTIVO		ROAD BUILDING S.A.S	CARRERA 86B BIS N°42F SUR 04	A+	SI	NO	NO	NO		SURA	PORVENIR	POSITIVA	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	17/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	JHON SARATE HERMINO	3133948583	
1101125306	FRANCISCO JAVIER RAMOS VERGARA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	30/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CALLE 158 N°101 A -23	O+	SI	NO	NO	NO		COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	28/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	JOHANA OCHOA ESPOSA	3206693744	
1050067613	JHON LEHDER MOLINA	AYUDANTE	OPERATIVO	SI	30/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	USME VIRREY	A+	SI	NO	NO	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	25/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	25/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	MARTA AGUILAR MADRE	3124286303	
1049319429	SANTOS FERNEY CHACON	AYUDANTE	OPERATIVO	SI	30/08/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	USME VIRREY	O+	SI	NO	NO	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	28/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	ELIABETH GONZALEZ SOBRINA	3133803305	
1033813401	JHON SEBASTIAN FORERO GARCÍA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	4/09/2023	ACTIVO		ROAD BUILDING S.A.S	CARRERA 25 # 76 A 11 SUR CIUDAD BOLIVAR	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	31/08/2023	4/09/2023	4/09/2023	1/09/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	MARTA PATRICIA CUEVAS ESPOSA	3024103924	
12361870	CRISTIAN ALEXANDER CAMELO ROZO	AYUDANTE D EOBRA	OPERATIVO	SI	4/09/2023	ACTIVO		ROAD BUILDING S.A.S	CARRERA 98 # 58 A 36 SUR BOSA	A+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1/09/2023	4/09/2023	4/09/2023	15/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	CRISTINA ROZO MADRE	3203166581	
93421345	NELSON RICAURTE MAYORGA	OFICIAL DE OBRA	OPERATUVO	SI	4/09/2023	ACTIVO		ROAD BUILDING S.A.S	CARRERA 25 # 76 A 11 SUR CIUDAD BOLIVAR	O+	SI	NO	SI	NO		FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	31/08/2023	4/09/2023	4/09/2023	31/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	MARCIA JURADO ESPOSA	3107667053	
1051742133	RICHARD GIL GARCIA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	5/09/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 52 # 37 E 14 SUR TUNJUELITO	B+	SI	NO	SI	NO		NUEVA EPS	PROTECCIÓN	BOLIVAR	1/09/2023	5/09/2023	5/09/2023	N/A	REENTRENAMIENTO AVANZADO	YESSICA PATRICIA CONTERAS ESPOSA	3229540969	
12446653	JULIO CESAR CONTERAS FLOREZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	5/09/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CARRERA 28 B BIS G 76 B 07 SUR CIUDAD BOLIVAR	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PROTECCIÓN	BOLIVAR	1/09/2023	5/09/2023	5/09/2023	N/A	REENTRENAMIENTO AVANZADO	NATALIA VANEGA VALDES ESPOSA	31438358902	
72008131	ROBERTO CARLOS VASQUEZ RIVERO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	5/09/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CARRERA 81 J 57 C SUR 20 BOSA	O+	SI	NO	SI	NO		COMPENSAR	COLFONDOS	BOLIVAR	1/09/2023	5/09/2023	5/09/2023	N/A	REENTRENAMIENTO AVANZADO	ERIKA CONTERAS ESPOSA	3203530903	
1010052146	JHONATAN ALEXANDER FORERO GARCIA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	7/09/2023	ACTIVO		ROAD BULDING S.A.S	ALPES CIUDAD BOLIVAR	A+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4/09/2023	7/09/2023	7/09/2023	4/09/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	MAGDALENA VASCO MADRE	3142125434	
93295380	NELSON GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	7/09/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CRA 4B N°3-75 SOACHA	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	COLFONDOS	COLMENA	5/09/2023	7/09/2023	7/09/2023	5/09/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	ELIZABETH FERNANDEZ ESPOSA	3208738584	
1022407937	JOSE WVALDO BLANDON ESPITIA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	18/09/2023	ACTIVO		ROAD BULDING S.A.S	CARREA 18 B BIS # 69 14 SUR CIUDAD BOLIVAR	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	13/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	17/09/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	ANYELA PAOLA BLANDON HERMANA	3219248274	
1007665319	LUIS DAVID PEDROZO GOMEZ	REMATADOR	OPERATIVP	SI	18/09/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	DIAGONAL 73 B SUR # 87 M 21 BOSA	O+	SI	NO	NO	NO		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COLMENA	15/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	17/09/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	OLEYMA GOMEZ MADRE	3208768348	
1111042459	ANDRES MAURICIO CAICEDO RODRIGUEZ	AYUDANTE ELECTRICO	OPERATIVO	SI	26/09/2023	ACTIVO		EBISU SAS	CALLE 62 G SUR # 21	O+	SI	SI	NO	NO		SURA	PORVENIR	BOLIVAR	23/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	NO APLICA	LIGIA RODRIGUEZ MADRE	3133480054	
1123423279	EDWIN ROPERO ASCANIA	OFICIAL PLOMERIA	OPERATIVO	SI	11/09/2023	ACTIVO		INVERCO	CALLE 62I SUR N° 78D-1D	O+	SI	NO	NO	NO		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	4/08/2023	11/09/2023	11/09/2023	4/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	MIRIAM ROPERO MADRE	3207520817	
1023027240	BRANDON JAIR GONZALEZ DURAN	OFICIAL DE MAMPOSTERIA	OPERATIVO	SI	18/09/2023	ACTIVO		ROAD BULDING S.A.S	CRA 18 C N°6B SUR -25	O+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	14/08/2023	18/09/2023	18/09/2023	14/08/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	FABURY RICAURTE ESPOSA	3208495443	
1007648264	LESLI VALENTINA DAZA CASTILLO	INSPECTORA SST	OPERATIVO	SI	2/10/2023	ACTIVO		ORR CONSTRUCCIONES	CARRERA 18C N°28-25 SUR	0+	SI	NO	NO	NO		SALUD TOTAL	PROTECION	COLMENA	29/09/2023	2/10/2023	2/10/2023	29/09/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	JULIAN LEAL - PAREJA	3243583542	
1048872241	JUAN SEBASTIAN LOPEZ OSPINA	REMATADOR	OPERATIVO	SI	2/10/2023	ACTIVO		ROAD BULDING S.A.S	CALLE 41 SUR 12J 04	0+	SI	NO	NO	NO		FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	28/09/2023	2/10/2023	2/10/2023	28/09/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	DAVID LOPEZ HERMANO	3226107134	
1022428647	ALVARON ANDRES BLANDON ESPITIA	AYUDANTE DE MAMPOSTERIA	OPERATIVO	SI	2/10/2023	ACTIVO		ROAD BULDING S.A.S	CARRERA 8 B BS #69-14 SUR	O+	SI	NO	NO	NO		NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	28/09/2023	2/10/2023	2/10/2023	28/09/2023	REENTRENAMIENTO AVANZADO	JOSE BLANDON PADRE	3202901593	

REGISTRO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL

EBISU S.A.S

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Identificada con NT No. 807008957

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505773035908, a partir del 01 de Diciembre del año 2015.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	80149151	MILTON JAVIER JIMENEZ SOSA	BOGOTA OPERATIVO CLASE V	5	6.96%	05/09/2023	31/12/2023	IND CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYOR A 1MES	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 4 de Septiembre del año 2023.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Identificada con NT No. 807008957

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505773035908, a partir del 01 de Diciembre del año 2015.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1012363273	YURY ANDREA ROA RODRIGUEZ	BOGOTA OPERATIVO CLASE V	5	6.96%	21/09/2023	19/01/2024	IND CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYOR A 1MES	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 21 de Septiembre del año 2023.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Identificada con NT No. 807008957

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505773035908, a partir del 01 de Diciembre del año 2022.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1111042459	ANDRES MAURICIO CAICEDO RODRIGUEZ	PROYECTO BOITA	5	6.96%	26/09/2023		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 25 de Septiembre del año 2023.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6l_1946546

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 807008957 EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Afiliado	CC 1111042459 ANDRES MAURICIO CAICEDO RODRIGUEZ
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,160,000
Cargo	OTRO
Sucursal	BOGOTA D.C. CR 46 # 95 71
Fecha de ingreso	26/09/2023
Fecha de radicación	26/09/2023 08:48:29 a.m.
Código de Transacción	165207537
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 10/2023

Fecha de generación 26/09/2023

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Identificada con NT No. 807008957

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505773035908, a partir del 01 de Diciembre del año 2022.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	12446653	JULIO CESAR CONTRERAS FLOREZ	PROYECTO BOITA	5	6.96%	05/09/2023		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 04 de Septiembre del año 2023.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

9010377393

9010377393

26751303

05 09 2023

X X X X

X

CONTRERAS FLOREZ JULIO CESAR

CC 12446653 X 12 07 1963

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A

$2.250.000

EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y NT 807008957

AVENIDA 19 N 118 95 OFICINA 2130360 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

X

05 09 2023

CARGO: MAESTRO DE OBRA

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Identificada con NT No. 807008957

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505773035908, a partir del 01 de Diciembre del año 2022.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1051742133	RICHART GIL GARCIA	PROYECTO BOITA	5	6.96%	05/09/2023		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 04 de Septiembre del año 2023.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Scanned with AnyScanner

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Identificada con NT No. 807008957

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 1505773035908, a partir del 01 de Diciembre del año 2015.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	72008131	ROBERTO CARLOS VASQUEZ RIVERA	PROYECTO BOITA	5	6.96%	05/09/2023		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 4 de Septiembre del año 2023.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

05/09/2023

X

01

28/08/1978

NR

NR

7

1015

X

05/09/2023

X

X

X

X

[redacted]

APORTE 10/2023

CORREO NO REPORTA

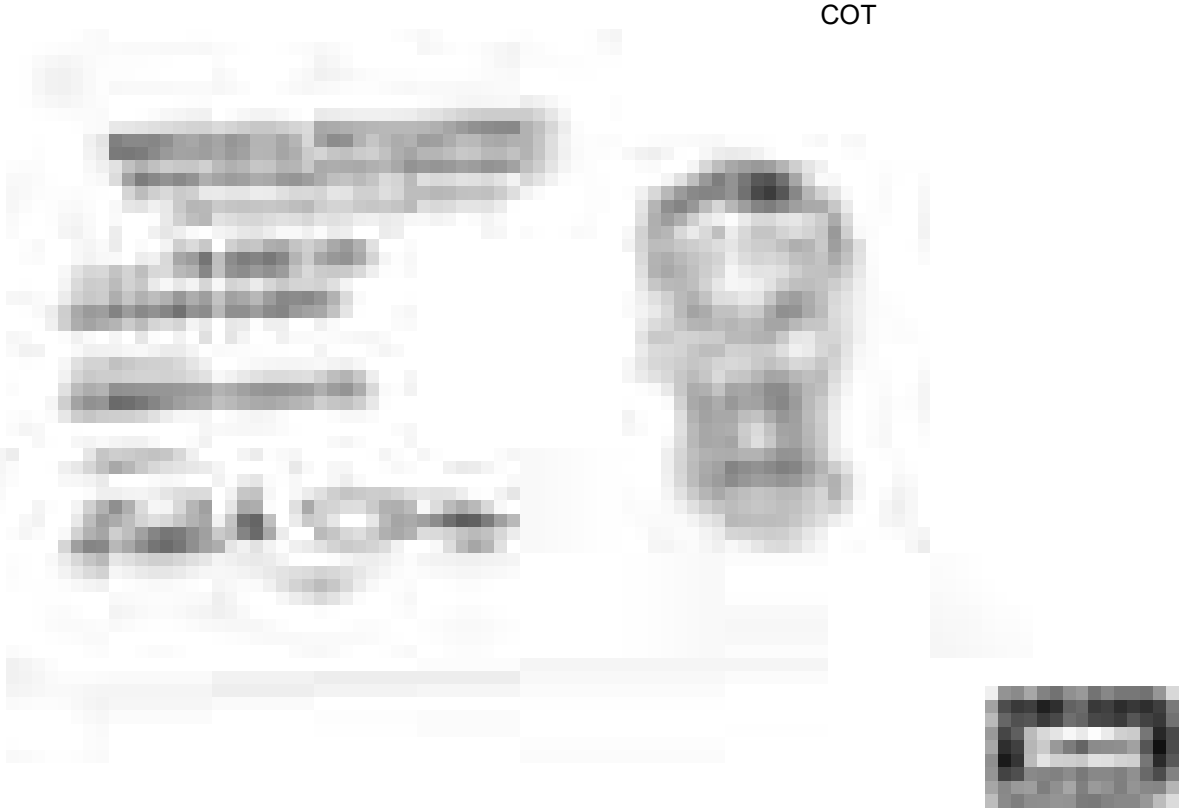

AFILIACIONES PERSONAL SUBCONTRATISTA

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**, se identificó que **JHON SEBASTIAN FORERO GARCIA** con **CC** No. **1033813401**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información:

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
Empleador: N 900821078 - ROAD BUILDING SAS	**Fecha de última cobertura:** 31/08/2023 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5 **Cargo :** AYUDANTE DE OBRA **Fecha fin de Retiro:** SIN FECHA DE RETIRO

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301018537223.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 30 días del mes de agosto de 2023.

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

9010361282

9010361282

26725558

30 08 2023

X X X X X

FORERO GARCIA JHON SEBASTIAN

CC 1033813401 X 17 01 1999

6 0 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. PORVENIR S. A.

$1.160.000 CRA 25 76 A 11 SUR NT 3024103924

BOGOTA X DISTRITO CAPITAL

CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1

ROAD BUILDING SAS NT 900821078

CL 65 S 92 50 CS 5 3560908 ROADBUILDING.S.A. BOGOTA DISTRITO CAPITAL

X

SALUD TOTAL S.A. 3

30 08 2023

X

X

X

X

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

9010361282

9010361282

X

X

X

X

X

X

JHON SEBASTIAN FORERO GARCIA
CC 1033813401

X

JHON SEBASTIAN FORERO GARCIA
CC 1033813401

9010361236

9010361236

26725447

30 08 2023

X X X X X

RICAURTE MAYORGA NELSON

CC 93421345 X 15 07 1971

6 0 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. PORVENIR S. A.

$1.160.000 CRA 27 A 76 29 SUR NT 3107671382

BOGOTA X DISTRITO CAPITAL

CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1

ROAD BUILDING SAS NT 900821078

CL 65 S 92 50 CS 5 3560908 ROADBUILDING.S.A. BOGOTA DISTRITO CAPITAL

X

SALUD TOTAL S.A. 29 08 2023

3

X
X
X
X

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

9010361236

9010361236

X

X

X

X

X

X

NELSON RICAURTE MAYORGA
CC 93421345

X

NELSON RICAURTE MAYORGA
CC 93421345

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/08/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	470	31/08/2023	CC 93421345	RICAURTE MAYORGA NELSON	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

BA04DF3D957DF40D85526AB9625596CE Certificado impreso el día 8/30/2023 5:37:55 PM por el portal de empresas Edesk

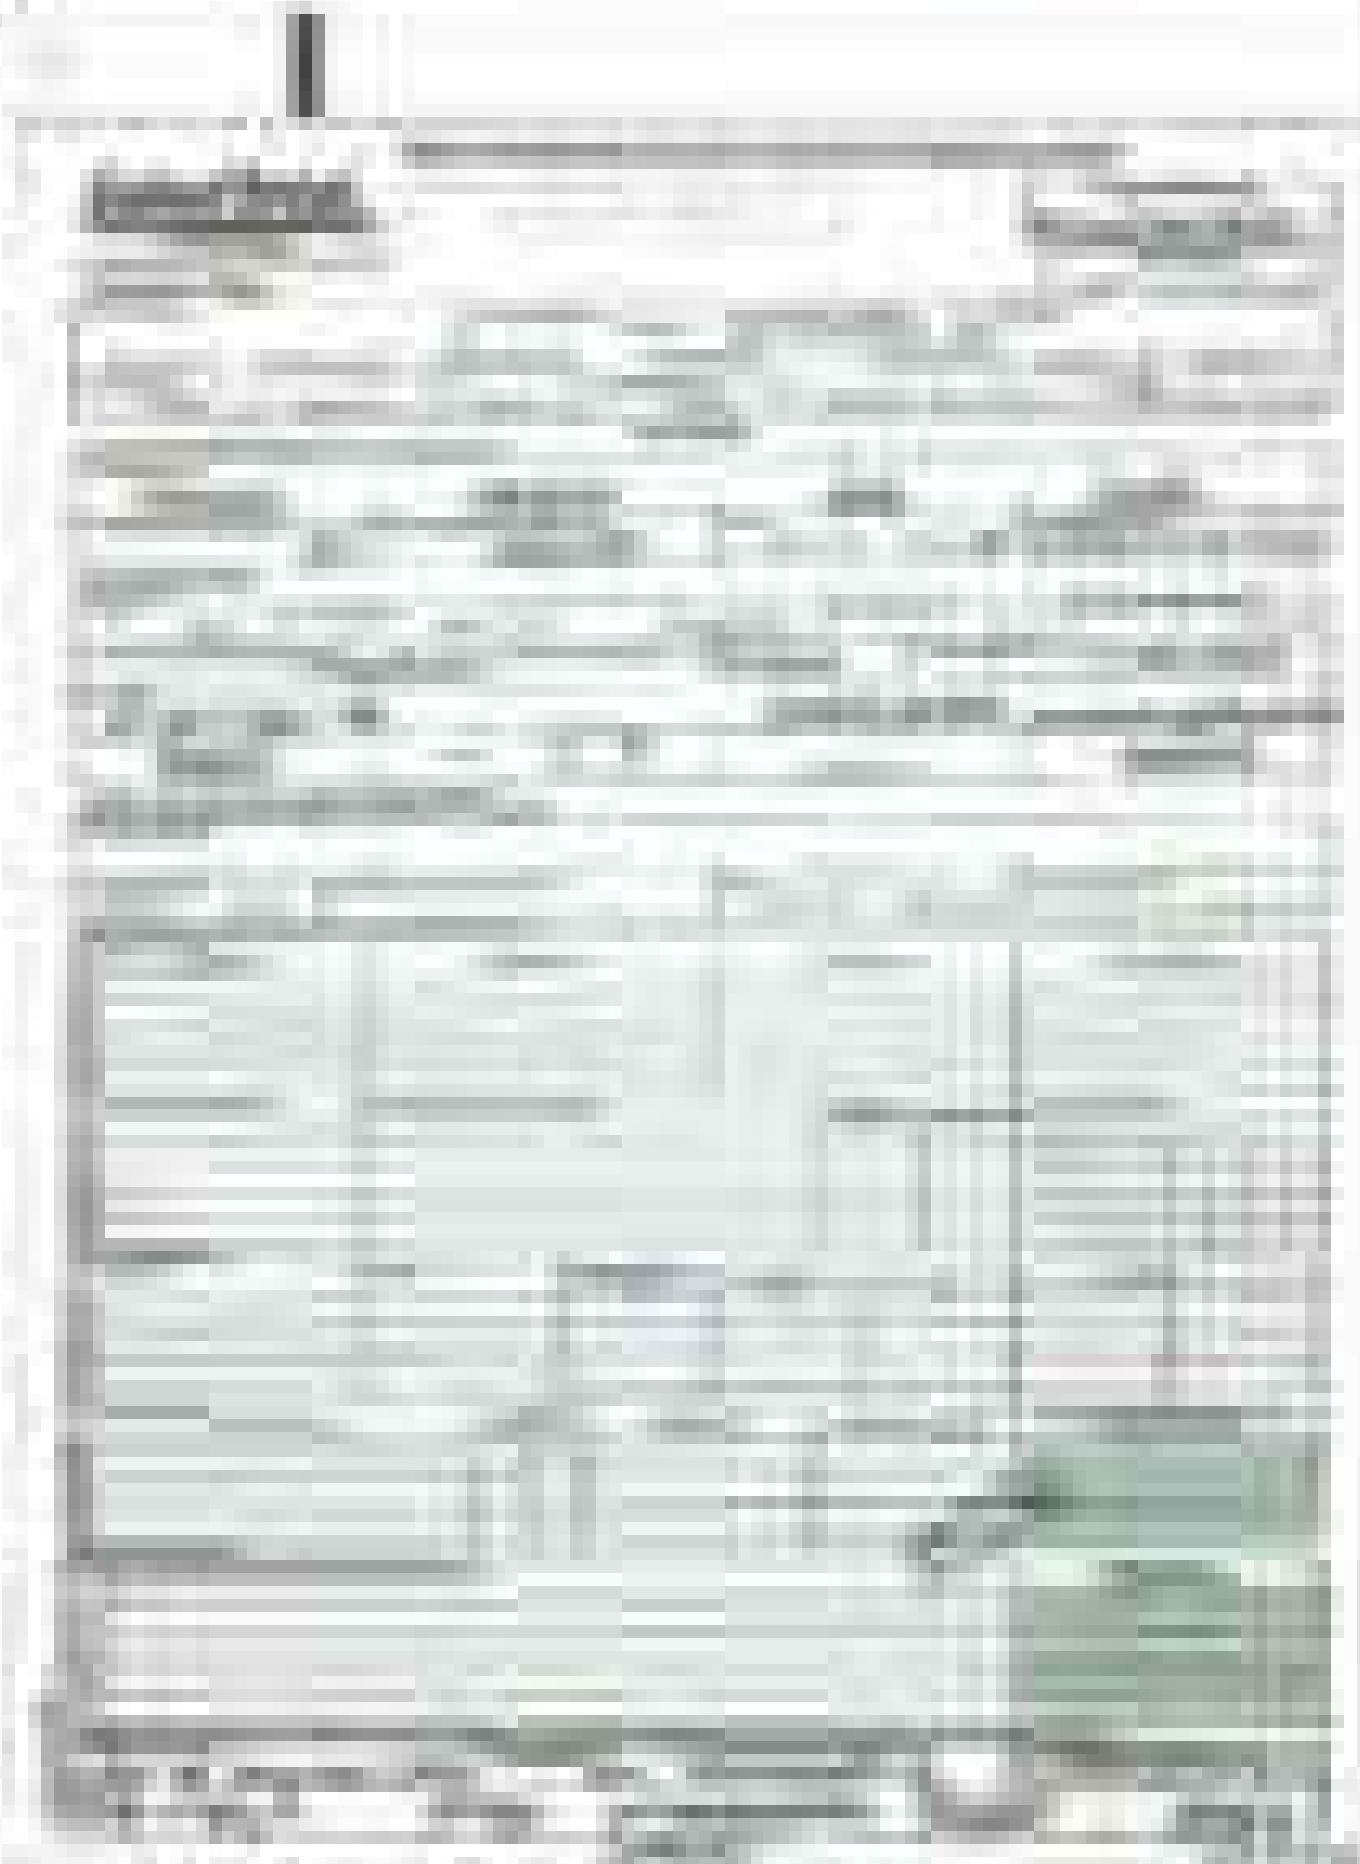

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 02/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	474	03/09/2023	CC 1010052146	FORERO GARCIA JHONATAN	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

9E5528FBDF6D4A055DAAD8B761D6A514 Certificado impreso el día 9/2/2023 6:26:24 AM por el portal de empresas Edesk

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

O.P. 280235 04/16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Código Únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

FORMULARIO VÍA WEB

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [✔]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [✔] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: C. Contributivo [✔] S. Subsidiado [ ]
4. TIPO DE AFILIADO: CO Cotizante [✔] CF Cabeza de Familia [ ] BE Beneficiario [ ]
5. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [✔] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
CÓDIGO:
FECHA DE LA SOLICITUD: DÍA 05 MES 09 AÑO 2023

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO: FORERO | SEGUNDO APELLIDO: GARCIA | PRIMER NOMBRE: JONATHAN | SEGUNDO NOMBRE: ALEXANDER

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: R.C. [ ] T.I. [ ] C.C. [✔] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] S.C. [ ]
8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1010052146
9. SEXO: F [ ] M [✔]
10. FECHA NACIMIENTO: DÍA 06 MES 02 AÑO 2000

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN ETNICO: Código
12. DISCAPACIDAD: Tipo F [ ] N [ ] M [ ] Condición T [ ] P [ ]
13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN
14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL
15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: POSITIVA
16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES: PORVENIR
17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC: 1160000
18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: CRA 26 A BIS D 76 SUR 22
ZONA: U. [✔] R. [ ]
LOCALIDAD / COMUNA:
BARRIO:
CIUDAD / MUNICIPIO: BOGOTA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO MÓVIL: 3028492251
CORREO ELECTRÓNICO: jhonatanforerogarcia06@gmail.com
CÓDIGO IPS:

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ]
21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
22. SEXO: F [ ] M [ ]
23. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO
CÓDIGO IPS

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27. SEXO F	27. SEXO M	28.. FECHA DE NACIMIENTO DÍA	MES	AÑO	29. PARENTESCO	30. ETNIA	31. DISCAPACIDAD Tipo F. N. M.	31. DISCAPACIDAD Condición T. P.
1		CN RC TI CC CE PA SC									F. [ ] N. [ ] M. [ ]	T. [ ] P. [ ]
2		CN RC TI CC CE PA SC									F. [ ] N. [ ] M. [ ]	T. [ ] P. [ ]
3		CN RC TI CC CE PA SC									F. [ ] N. [ ] M. [ ]	T. [ ] P. [ ]
4		CN RC TI CC CE PA SC									F. [ ] N. [ ] M. [ ]	T. [ ] P. [ ]

	32. DATOS DE RESIDENCIA Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona R. U.	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil	33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL (Lo diligencia la EPS)	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud (IPS)	NIVEL DE SISBÉN I. II.	GRUPO POBLACIONAL
1			R. [ ] U. [ ]					I. [ ] II. [ ]	
2			R. [ ] U. [ ]					I. [ ] II. [ ]	
3			R. [ ] U. [ ]					I. [ ] II. [ ]	
4			R. [ ] U. [ ]					I. [ ] II. [ ]	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social: ROAD BUILDING SAS
36. Tipo documento de identidad: C.C. [ ] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] N.I. [✔]
37. Número documento de identidad: 900821078
DV:
38. Tipo de aportante o pagador de pensiones

39. UBICACIÓN O DIRECCIÓN: CL 65 S NRO 92 50 CS 5
CIUDAD / MUNICIPIO: BOGOTA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELÉFONO FIJO: 3560908
TELÉFONO MÓVIL: 3005625341
CORREO ELECTRÓNICO: roadbuilding.s.a.s@gmail.com

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL: DÍA 02 MES 09 AÑO 2023
CARGO: AYUDANTE DE OBRA
SALARIO: 1160000

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ] Código [ ]
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [ ]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. MOVILIDAD A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [ ] B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [ ]
14. TRASLADO A) MISMO RÉGIMEN [ ] B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
15. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
16. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
17. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: R.C. [ ] T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] S.C. [ ]
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
SEXO: F [ ] M [ ]
FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO
42. FECHA (a partir de): DÍA 02 MES 09 AÑO 2023
43. EPS ANTERIOR Código
44. MOTIVO DE TRASLADO Código
45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(la) Señor(a)_____ Identificado(a) con _____ No. _____ [ ]
desde el día _____ del mes _____ del año _____

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:									

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio [ ] Código del departamento [ ]
67. Datos del SISBÉN: Número de ficha [ ] Puntaje [ ] Nivel [ ]
68. Fecha de radicación: DÍA | MES | AÑO
69. Fecha de validación: DÍA | MES | AÑO
70. Datos del funcionario que realiza la validación
Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre
Tipo documento de identidad [ ] | Número del documento de identidad
71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud

IMPRESO POR CAYMAR EDICIONES Y FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 432 2110

6007000 ENERO / 2016

Recuerde que con la firma del formulario,el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

01-01-F-009

- 2a. COPIA: AFILIADO -

O.P. 280235 04/16

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

FORMULARIO VÍA WEB

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, JONATHAN ALEXANDER FORERO GARCIA identificado (a) con R.C. T.I. ✔ C.C. C.E. Otro: _____
número 1010052146 de BOGOTA, certifico que:

1. He recibido la carta de derechos y deberes SÍ ☑ No ☐
2. He recibido la carta de desempeño con el ranking de NUEVA EPS SÍ ☑ No ☐
3. Leí el contenido de la carta de derechos y deberes SÍ ☑ No ☐
4. Leí el contenido de la carta de desempeño SÍ ☑ No ☐
5. Me fueron resueltas las dudas sobre el contenido de las cartas de derechos y deberes y la carta de desempeño SÍ ☑ No ☐
6. Entendí y comprendí lo enunciado en la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño SÍ ☑ No ☐
7. NUEVA EPS cuenta con canales disponibles y eficaces para resolver las dudas sobre el contenido de las cartas SÍ ☑ No ☐

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. _____
y/o correo electrónico: _____
SÍ ☐ No ☐

Cordialmente,

Firma: _____
Tipo ID: CC No. ID: 1010052146
Fecha (dd/mm/aaaa): 05/09/2023
Dirección: CRA 26 A BIS D 76 SUR 22
Tel: 3028492251 Municipio BOGOTA
Departamento: CUNDINAMARCA
Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha (dd/mm/aaaa): _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio _____
Departamento: _____
Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. consúltela al reverso de este documento.

Información de NUEVA EPS
Asesor: ESTRATEGIA EMPRESARIAL AS LTDA
Código N0076 Oficina _____

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. Para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.
Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
• solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.S., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.com.co
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Línea Gratuita: 01 8000 954400
Línea de atención en Bogotá: 307 7022
Conmutador: (57 + 1) 4193000
Dirección Administrativa: Carrera 85k No. 46A – 66 Piso 2.

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 ‘‘Hábeas Data’’; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA		PRODUCTOR AGROPECUARIO	
			$	SÍ		Sí	
				NO		NO	

Nivel de Escolaridad: Ninguno ☐ Preescolar ☐ Básico Primaria ☐ Secundaria ☐ Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐ Media técnica (bachillerato básico) ☐ Normalista ☐ Técnica Profesional ☐ Tecnológica ☐ Profesional ☐ Especialización ☐ Maestría ☐ Doctorado ☐ Último Grado ☐ Aprobado _____

Posición Ocupacional: Patrón/Empleador ☐ Contratista ☐ Trabaja por su Cuenta ☐

Inicio Contrato | Fin Contrato

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación						Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV
		NIT	C.C.	C.E.	P.A.	T.I.	C.D.		

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del GESTOR o PROMOTOR	CÓDIGO GESTOR o PROMOTOR	Nombre DIRECTOR COMERCIAL	CÓDIGO DIRECTOR	Causal Inconsistencia y/o Observaciones	
					CIUDAD Y FECHA

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO		
CONTRATO:	1198117	
RAZON SOCIAL	ORR CONSTRUCCIONES S.A.S.	
IDENTIFICACION:	NI 900435908	

INGRESO DE TRABAJADOR		
Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
94139908	2023-9-6	CC 93395380
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
GONZALEZ ENCISO	NELSON	1972-5-14
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
TV 4B N 3 - 75	SAN VICENTE	Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
SOACHA - Cundinamarca	auxafiliacionesgruposer@gmail.com	8053379
Celular	**Sexo**	
3016170843	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
aux de obra	$1,160,000.00	E.P.S. Famisanar Ltda.
AFP	**Centro de Trabajo**	
Porvenir	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2023-9-6	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

9010379276

9010379276

26754231

05 09 2023

X X X X

X

GONZALEZ ENCISO NELSON

CC 93395380 X 14 05 1972

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A

$1.160.000

ORR CONSTRUCCIONES NT 900435908

CL 56 85I 06 INT 6 APTO 302 4295960 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

X

05 09 2023

CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION

Cambio Empleo



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 04/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	477	05/09/2023	CC 1033764892	CASTILLO VELASQUEZ JEISSON	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A67E822DEBFAFE6E3038E79CDFDD6A71 Certificado impreso el día 9/4/2023 5:25:24 PM por el portal de empresas Edesk

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas

Castillo

Velasquez (?)

Susan (?)

David

1022 964 892

Pasteur (?)

Manuela (?)

1.100.000

Cra 42 D 69 40

3171132412

David Velasquez …com

Bogotá

Bogotá

Scanned by CamScanner

Powered by

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 04/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	475	05/09/2023	CC 79365345	RIVEROS LOVERA JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A67E822DEBFAFE6E3038E79CDFDD6A71 Certificado impreso el día 9/4/2023 5:19:03 PM por el portal de empresas Edesk

9010372393

9010372393

26743907

04 09 2023

X X X X

X

RIVEROS LOVERA JOSE ALFREDO

CC 79365345 X 05 01 1965

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

$1.160.000

ROAD BUILDING SAS NT 900821078

CL 65 S 92 50 CS 5 3005625341 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

X

04 09 2023

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

Cambio Empleo

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 04/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	476	05/09/2023	CC 1030612737	RIVEROS MORENO JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A67E822DEBFAFE6E3038E79CDFDD6A71 Certificado impreso el día 9/4/2023 5:22:04 PM por el portal de empresas Edesk

9010372384

9010372384

26743886

04 09 2023

X X X X

X

RIVEROS MORENO JOSE JAIR

CC 1030612737 X 17 05 1992

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

$1.160.000

ROAD BUILDING SAS NT 900821078

CL 65 S 92 50 CS 5 3005625341 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

X

04 09 2023

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

Cambio Empleo

Medellín, 14 de September de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GRIFFON DE RUPELL SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C79252881	DAVILA GALEANO RICARDO RAFAEL	15/09/2023		29kM1661	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/09/2023 14:45:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.237.181.62, 192.230.104.6, 172.16.42.57

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) RICARDO RAFAEL DAVILA GALEANO identificado(a) con cedula ciudadania 79252881, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar en calidad de DEPENDIENTE según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20230914	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 14 días del mes de Julio de 2.023

Observaciones:

Con destino a:
A QUIEN INTERESE

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: Portal corporativo Compensar EPS
CER-AFI 22406478

Medellín, 14 de September de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GRIFFON DE RUPELL SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C80060063	GORDILLO BAYONA CRISTOFER	15/09/2023		14314363	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/09/2023 13:48:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.237.181.62, 192.230.104.6, 172.16.42.57

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 13/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	478	14/09/2023	CC 1022407937	BLANDON ESPITIA JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

770C8D1924D95B7BB46CD336A5E95283 Certificado impreso el día 9/13/2023 4:47:35 PM por el portal de empresas Edesk

9010405334

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	481	15/09/2023	CC 1107081502	SANCHEZ LUZ	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CFCE1D2E77EDB7B69D34668CE0BACDD0 Certificado impreso el día 9/14/2023 5:16:06 PM por el portal de empresas Edesk

9010415830

9010415830

26813004

16 09 2023

X X X X

X

SANCHEZ LUZ ADRIANA

CC 1107081502 X 02 11 1993

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

$1.160.000

ROAD BUILDING SAS NT 900821078

CL 65 S 92 50 CS 5 3005625341 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

X

15 09 2023

CARGO: AYUDANTE DE OBRA



REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

CONTRATO:	1198117	
RAZON SOCIAL	ORR CONSTRUCCIONES S.A.S.	
IDENTIFICACION:	NI 900435908	

INGRESO DE TRABAJADOR

Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
94224226	2023-9-16	CC 1007665319
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
PEDROZO GOMEZ	LUIS DAVID	1966-11-11
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
Diagonal 73 # 87 21	San Cristóbal	Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
BOGOTA D.C. - Bogota D. C.	Luispedrogomez66@gmail.com	6107678
Celular	**Sexo**	
3138165145	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
Auxiliar de obra	$1,160,000.00	CAPITAL SALUD
AFP	**Centro de Trabajo**	
Porvenir	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2023-9-16	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

1 5 0 9 2 0 2 3

X

X X

X X

PEDROZO GOMEZ LUIS DAVID

CC 1007665319 X 1 1 1 1 1 9 9 6

COLMENA SA PORVENIR 1160000

CL 31 A NO. 2A-18 SUR 3625061 IVANGRUPOSER@GMAIL.COM

BOGOTA X BOGOTÁ D.C., BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

UNICA

ORR CONSTRUCCIONES S A S N I T 900435908

CALLE 40 # 22 - 17 6018053379 AUXAFILIACIONESGRUPOSER@GMAIL.COM BOGOTA BOGOTA D.C.

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO		
CONTRATO:	1198117	
RAZON SOCIAL	ORR CONSTRUCCIONES S.A.S.	
IDENTIFICACION:	NI 900435908	

INGRESO DE TRABAJADOR		
Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
94227766	2023-9-16	CC 1014212357
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
CRUZ LASPRILLA	KATERIN JULIETH	1990-7-13
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
calle 131 bis #95B-31	Cedula de ciudadania	Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
BOGOTA D.C. - Bogota D. C.	ivangruposer@gmail.com	6170843
Celular	**Sexo**	
3016170843	Femenino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
aux de obra	$1,160,000.00	EPS Sura
AFP	**Centro de Trabajo**	
Porvenir	RIESGO 5	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2023-9-16	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud **6l_1892986**

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 900435908 ORR CONSTRUCCIONES SAS
Afiliado	CC 1014212357 KATERIN JULIETH CRUZ LASPRILLA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,160,000
Cargo	OTRO
Sucursal	BOGOTA D.C. CL 73 # 20 A 80
Fecha de ingreso	15/09/2023
Fecha de radicación	15/09/2023 01:49:33 p.m.
Código de Transacción	164832631
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 10/2023

Fecha de generación 15/09/2023

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	480	15/09/2023	CC 1023027240	GONZALEZ DURAN BRANDON	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CFCE1D2E77EDB7B69D34668CE0BACDD0 Certificado impreso el día 9/14/2023 5:12:44 PM por el portal de empresas Edesk

9010405498

9010405498

26795684

13 09 2023

X X X X

X

GONZALEZ DURAN BRANDON JAIR

CC 1023027240 X 29 04 1998

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

$1.160.000

ROAD BUILDING SAS NT 900821078

CL 65 S 92 50 CS 5 3005625341 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

X

13 09 2023

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

Cambio Empleo

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	484	17/09/2023	CC 73591071	LOPEZ MUÑOZ EINER	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

65D89020CDDB620C333A3FE8147FCC5E Certificado impreso el día 9/16/2023 7:44:10 AM por el portal de empresas Edesk

9010415835

9010415835

26813009

16 09 2023

X X X X

X

LOPEZ MUÑOZ EINER

CC 73591071 X 11 03 1979

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

$1.160.000

ROAD BUILDING SAS NT 900821078

CL 65 S 92 50 CS 5 3005625341 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

X

16 09 2023

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

Cambio Empleo

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	483	17/09/2023	CC 1014220127	VANEGAS CUERVO EDUARD	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

65D89020CDDB620C333A3FE8147FCC5E Certificado impreso el día 9/16/2023 7:41:38 AM por el portal de empresas Edesk

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 19/09/2023

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	486	20/09/2023	CC 1000726379	LOZANO GARZO JUAN	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

83CC2DEE1C697AFF945EB76833034937 Certificado impreso el día 9/19/2023 5:05:35 PM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

"Código Únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

CLICK PARA REINICIAR TODO

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

Versión 1.0 del 06 de diciembre 2022

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [✔] B. REPORTE DE NOVEDADES [ ]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [✔] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: C. Contributivo [✔] S. Subsidiado [ ]
4. TIPO DE AFILIADO: CO Cotizante [✔] CF Cabeza de Familia [ ] BE Beneficiario [ ]
5. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [✔] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ] D. Independiente por prestación de servicio [ ] E. Contribución Solidaria [ ]
CÓDIGO:
FECHA DE LA SOLICITUD: 20 | SEPTIEMBRE | 2023

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO: LOZANO | SEGUNDO APELLIDO: GARSON | PRIMER NOMBRE: JUAN | SEGUNDO NOMBRE: SEBASTIAN

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC - Cédula de Ciudadanía
8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1000726379
9. SEXO BIOLÓGICO: F [✔] M [ ]
SEXO DE IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ]
10. FECHA NACIMIENTO: 29 | MAYO | 1996
PAÍS DE NACIMIENTO:
11. NACIONALIDAD: COLOMBIANO

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

12. ETNIA:
13. COMUNIDAD INDIGENA:
14. DISCAPACIDAD: SI [ ] NO [✔]
CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD:
15. CLASIFICACIÓN DEL SISBEN:
NIVEL:
GRUPO:
16. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL:
17. ARL: POSITIVA
18. AFP: PORVENIR
19. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: cafam
TIPO DE NOMENCLATURA: URBANA [ ] RURAL [ ]
20. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Carrera 26 A # 76 49 Sur
COMPLEMENTO DIRECCIÓN:
LOCALIDAD / COMUNA:
BARRIO:
CIUDAD / MUNICIPIO: BOGOTA
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
ZONA: CENTRO POBLADO
TELÉFONO MÓVIL: 3223301402
TELÉFONO FIJO:
Ext.:
CORREO ELECTRÓNICO: juanseweed42@gmail.com
IPS:
IPS ODONTOLÓGICA:

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR – Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

21. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
22. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
23. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
24. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
SEXO DE IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ]
IPS | IPS ODONTOLÓGICA
25. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO
PAÍS DE NACIMIENTO:
26. NACIONALIDAD:

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	27. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	28. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	29. NÚMERO DE IDENTIDAD	30. NACIONALIDAD	COMUNIDAD INDIGENA	31. SEXO F	31. SEXO M	32. FECHA DE NACIMIENTO DÍA	32. FECHA DE NACIMIENTO MES	32. FECHA DE NACIMIENTO AÑO	33. PARENTESCO	34. ETNIA	35. DISCAPACIDAD SI	35. DISCAPACIDAD NO	CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD
1															
2															
3															
4															
5															

	36. DATOS DE RESIDENCIA Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona U	Zona R	Teléfono	37. VALOR UPC	38. CÓDIGO IPS	CÓDIGO IPS ODONTOLÓGICA	EXCEPCIÓN DEL TRASLADO	SISBÉN NIVEL	SISBÉN GRUPO	GRUPO POBLACIONAL
1												
2												
3												
4												
5												

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

39. Nombre o Razón Social: ROAD BUILDING SAS
40. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NI - Número Identificación Tributaria
41. Número documento de identidad: 900821078
DV:
42. Tipo de aportante o pagador de pensiones:
TIPO DE NOMENCLATURA: URBANA [ ] RURAL [ ]
43. UBICACIÓN O DIRECCIÓN:
COMPLEMENTO DIRECCIÓN:
CIUDAD / MUNICIPIO: BOGOTA
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
CORREO ELECTRÓNICO: roadbuilding.s.a.s@gmail.com
TELÉFONO MÓVIL: 3005625341
TELÉFONO FIJO:
EXT:
FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL: 19 | SEPTIEMBRE | 2023
CARGO: ayudante
OCUPACIÓN: empleado
SALARIO: $ 1.160.000

B. REPORTE DE NOVEDADES

44. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código [ ]
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [ ]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. MOVILIDAD A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [ ] B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [ ]
14. TRASLADO A) MISMO RÉGIMEN [ ] B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
15. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
16. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
17. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]
19. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA [ ]
20. REPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE UN TERCERO [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

45. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
46. FECHA (a partir de): 19 | SEPTIEMBRE | 2023
47. EPS ANTERIOR Código: CAPITAL SALUD
48. EXCEPCIÓN DEL TRASLADO:
49. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES:

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(la) Señor(a)_____ Identificado(a) con _____ No. _____
desde el día _____ del mes _____ del año 1996

50. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi. [ ]
51. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
52. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad [ ]
53. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
54. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
55. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
56. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
57. Autorizo mi consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos. [ ]
58. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes. [ ]
59. Aceptación de la actualización del grupo familiar en Contribución Solidaria. [ ]

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

60. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
24. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO

IX. FIRMAS

61. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique
62. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

X. ANEXOS

63. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] MS [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] SC [ ] PA [ ] CD [ ] PE [ ] AS [ ] PT [ ]
Cantidad:
Total: 0

64. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
65. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
66. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación [ ]
67. de la unión marital. [ ]
Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
68. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
69. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
70. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016 [ ]
71. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
72. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]
Total Anexos: 0

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

73. Identificación de la Entidad Territorial
Código del Municipio | Código del departamento
74. Datos del SISBÉN: SI [ ] NO [ ] Clasificación
75. Pertenece a Grupo de población especial artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016: SI [ ] NO [ ] CÓDIGO

XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN.

76. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Número del documento de identidad
77. Firma del funcionario
78. Fecha de radicación: DÍA | MES | AÑO
79. Fecha De Validación: DÍA | MES | AÑO
OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

- ORIGINAL: E.P.S. -

VIGILADO Supersalud
IMPRESO POR SUMIMAS SAS NIT: 830001338-1 20 - OCT - 2022

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, JUAN SEBASTIAN LOZANO GARZON identificado (a) con CC - Cédula de Ciudadanía número 1000726379 de BOGOTA, certifico que:

1	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ ☑ No ☐
2	¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	SÍ ☑ No ☐
3	¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ ☑ No ☐
4	¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	SÍ ☑ No ☐
5	¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?	SÍ ☑ No ☐

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. _____
y/o correo electrónico: _____
SÍ ☐ No ☐

Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SÍ ☐ No ☐

Consulte la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño en el micrositio Web: https://www.nuevaeps.com.co/carta-derechos-deberes, Evitando impresiones para ser amigable con el planeta. SÍ ☐ No ☐

Cordialmente,

Firma: _____
Tipo ID: CC No. ID: 1000726379
Fecha de Solicitud: 20 SEPTIEMBRE 2023
Dirección: Carrera 26 A # 76-49 sur
Tel: 3223301402 Municipio BOGOTA
Departamento: BOGOTÁ D.C.

Huella obligatoria para usuarios que no saben firmar y/o tutores. Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio _____
Departamento: _____

Huella obligatoria para usuarios que no saben firmar y/o tutores. Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A..

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.
Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
• Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.co

Régimen Contributivo:
Línea Gratuita: **01 8000 954400**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7022**

Régimen Subsidiado:
Línea Gratuita: **01 8000 95 2000**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7051**

Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Conmutador: **(601) 419 3000**
Dirección Administrativa: Carrera 85k No 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 ''Hábeas Data''; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA	SÍ / NO	PRODUCTOR AGROPECUARIO	SÍ / NO

Nivel de Escolaridad: Ninguno ☐ Preescolar ☐ Básico Primaria ☐ Secundaria ☐ Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐ Media técnica (bachillerato básico) ☐ Normalista ☐ Técnica Profesional ☐ Tecnológica ☐ Profesional ☐ Especialización ☐ Maestría ☐ Doctorado ☐ Último Grado ☐ Aprobado _____

Posición Ocupacional: Patrón/Empleador ☐ Contratista ☐ Trabaja por su Cuenta ☐

Inicio Contrato DÍA MES 1996 AÑO — Fin Contrato DÍA MES AÑO

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación	Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del ASESOR o PROMOTOR	CÓDIGO ASESOR o PROMOTOR	Nombre de OFICINA	BOGOTA DÍA MES AÑO
			CIUDAD Y FECHA

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)

Diligencie el formulario en letra imprenta, legible, sin borrones ni tachones Loa datos de identificación se deben diligenciar como aparece en el Documento de identidad vigente. Los espacios sombreados son para el diligenciamiento por la EPS o la Entidad Territorial correspondiente. Los trámites de afiliación o novedades, puede realizarlos solamente el Cotizante, el cabeza de familia, el representante institucional o el Representante autorizado en afiliaciones se ofició.

DATOS DEL TRAMITE.

1. Tipo de trámite. Marque con una X el tipo de trámite que va a realizar

A. Afiliación. Si la persona se va a registrar por primera vez al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Si ha estado antes en una EPS, el Trámite no corresponde a una afiliación, sino una novedad.

B. Reporte de Novedades. Si usted va a comunicar algún cambio de datos, ya sean suyos, de sus beneficiarios, o de la condición en el aseguramiento.

2.Tipo de Afiliación

A. Individual: La opción de afiliación individual amplia cuando el cotizanteo el cabeza de familia realizan directamente la afiliación y el reporte de novedades, y no a través de otras personas, entidades o instituciones. Se debe colocar una X en la opción que corresponda: cotizante, cabeza de familia o beneficiario.

a) Cotizante o cabeza de familia

b) Beneficiario o afiliado adicional

B. Colectiva: La opción aplica cuando un trabajador independiente o un Miembro de una comunidad o congregación religiosa realiza afiliación, reporte de novedades y pago de aportes al SGSSS a través de asociaciones, agremiaciones o congregaciones religiosas autorizadas para realizar afiliaciones colectivas.

C. Institucional: La opción Institucional aplica cuando la persona que se va a afiliar se encuentra a cargo de una institución de protección y la institución es responsable de hacer el trámite.

D. De oficio: La opción de oficio aplica cuando la afiliación es realizada por La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, el empleador o la entidad Administradora de pensiones cuando el afiliado no ha hecho la selección, la entidad territorial cuando la persona cumpla los requisitos para pertenecer al régimen subsidiado y se rehúse a ello, y los prestadores de servicios de salud en el caso del recién nacido de padres no afiliados. También aplica cuando la afiliación de los beneficiarios es realizada por las Comisarías de Familia, los defensores de familia, las Personerías Municipales.

3. Régimen

C. Contributivo. Cuando la operación que se va a realizar afecta a este régimen, es decir, la afiliación, la movilidad o la novedad es en el R. Contributivo.

S: Subsidiado. Cuando la operación que se va a realizar afecta a este régimen, es decir, la afiliación, la movilidad o la novedad es en el R. Subsidiado

4.Tipo de Afiliado

CO: Cotizante. Es el afiliado que paga aportes al Sistema en el Régimen Contributivo, y es el cabeza del grupo familiar.

CF: Cabeza de familia. Es el afiliado que recibe el subsidio de SGSSS, y es el cabeza de su grupo familiar.

BE: Beneficiario. Es la persona que integra el núcleo familiar y reúne las Condiciones para ser inscrito como beneficiario de un cotizante en el Régimen Contributivo o de un cabeza de:familia en el Régimen Subsidiado.

5. Tipo de cotizante. Corresponde a las opciones de condición del cotizante, al momento de su afiliación.

Marque con una X la opción que corresponda:

Dependiente: Si el cotizante tiene un empleador mediante una relación laboral y comparte con éste el pago de los aportes a salud y pensiones.

Independiente: Si el cotizante no está vinculado a un empleador mediante una relación laboral y, por tanto, no comparte el pago de sus aportes, sino que lo asume en la totalidad.

Pensionado: Si el cotizante goza de una pensión y el pago del aporte a salud se encuentra a su cargo.

Independiente por prestación de servicio: Seleccione este tipo de cotizante, si tiene un contrato por prestaciones de servicio y la empresa con la cual tiene el contrato realizará el pago de las cotizaciones; en este caso debe diligenciar la información contenida en el Capítulo V.

Contribución Solidaria: Si el cotizante se hará responsable del pago de la Contribución Solidaria. En este caso deberá diligenciar la información contenida en el Capítulo VIII.

Código. Este espacio debe ser diligenciado por la EPS, y corresponde al código del cotizante establecido en la base de datos de afiliados vigente.

Fecha de la solicitud. Debe escribir la fecha en la que se está haciendo el trámite, colocando, día, mes y año.

A. AFILIACIÓN

Si la afiliación es individual o colectiva, se debe: -Diligenciar los espacios de los capítulos II y III, correspondiente a los datos básicos de identificación y complementarios del cotizante o del cabeza de familia. – Diligenciar los datos del capítulo IV si el cotizante o cabeza de familia tiene beneficiarios, en el mismo trámite de afiliación. Diligenciar los datos del capítulo V, relativos al empleador si el afiliado es dependiente, y si es un trabajador independiente vinculado a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas, registrar los datos de la asociación, agremiación o congregación religiosa. Marcar con una X, en el capítulo VII, las declaraciones y autorizaciones que correspondan. Diligenciar en el capítulo VIII Firmas, los campos 54 y/o 55 según el caso. – Marcar con una X, es el capítulo IX, los documentos de identidad de las personas que se afilian y los anexos que acreditan la condición de sus beneficiarios, según corresponda.

Si la afiliación es institucional o de oficio, la institución o entidad debe: -Diligenciar los espacios de los capítulos II y III con los datos de la persona que se va a afiliar, en condición de cotizante o cabeza de familia. Los niños de padres no afiliados que afilia la IPS lo hacen en condición de cabeza de familia hasta tanto sus padres realicen la afiliación.

-Diligenciar los datos del capítulo IV si tiene información de los beneficiarios de la persona que se va a afiliar, o si la persona que se va a afiliar tiene la calidad de beneficiario de un cotizante en el casi de la afiliación de oficio en los términos del artículo del Decreto 2353 del 2015.

-Diligenciar los datos del capítulo V relativos a la entidad responsable de la afiliación institucional o de oficio. En el caso de entidades territoriales estas deberán registrar los datos del capítulo X.

-Marcar con una X en el capítulo VII las declaraciones y autorizaciones que correspondan. En el caso de las afiliaciones del oficio solo podrán marcar los numerales 51, 52 y 53.

-Diligenciar el capítulo VIII Firmas, firmando en el campo 55 “Empleador, Aportante o Entidad responsable para afiliación colectiva, institucional o de oficio”.

-Marcar con una X, en el capítulo IX, el documento de identidad de la(s) persona(s) que se va(n) a afiliar y los anexos que correspondan.

-Diligenciar los datos del capítulo X con la Entidad Territorial es la que realiza la afiliación.

CAPÍTULO II: DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o de la cabeza de familia)

Los datos básicos de identificación son aquellos que permite la plena identificación del cotizante o cabeza de familia y deben coincidir con los del documento expedido por la entidad competente. Estos son:

6. Apellidos y Nombres: Estos datos deben ser registrados en las casillas correspondientes, en forma idéntica a como aparecen en el documento de identidad.- Primer apellido – Segundo apellido - Primer nombre - Segundo nombre.

7. Tipo de documento de identidad: Debe colocar en el espacio el código que corresponde Obserbacioneal documento con el cual se va a identificar, según la siguiente tabla:

CÓDIGO	Descripcion de Tipo de Documento
CN	Certificado De Nacido Vivo - DANE
MS	Menor sin documento de Identificación
RC	Registro civil de nacimiento expedido por RNEC.
TI	Tarjeta de identidad expedida por RNEC.
CC	Cédula de ciudadanía expedida por RNEC.
CE	Cédula de extranjería
SC	Salvoconducto de permanencia.
PA	Pasaporte expedido por el país de origen sólo para extranjeros.
CD	Expedidos por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia o la entidad que haga sus veces
PE	Permiso Especial de Permanencia
AS	Adulto sin documento de identificación.
PT	Permiso de Protección Temporal

8. Número del documento de identidad: Es el número con el cual se identifica como persona única y debe registrarlo exactamente como figura en el documento de identidad. Sí se trata del registro escriba el número NUIP que aparece en la parte superior izquierda del documento, no el indicativo serial. Verifique que lo ha registrado completo.

9. Sexo: Marque con una X, la opción: femenino o masculino, como parece en su documento de identidad.

10. Fecha de nacimiento: Registre la fecha de nacimiento como figura en el documento de identidad: día, mes y año.

11. Nacionalidad: Para los tipos de documentos CN, RC, TI y CC reporte la nacionalidad colombiana. Para el caso de los extranjeros registre la nacionalidad contenida en el documento de identidad que debe corresponder a los códigos ubicados en la Resolución número 974 del 2022 Capítulo II tabla 11.

CAPÍTULO III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales:

Estos datos deben registrarse para el cotizante en el Régimen Contributivo y para el cabeza de familia en el Régimen Subsidiado, según corresponda.

12. Etnia: En este espacio debe registrar el código correspondiente a la etnia, en caso de pertenecer a alguna de ellas, tal como aparece en la tabla.

CÓDIGO	ÉTNIA
01	Indígena
02	Rom (gitano)
03	Raizal (San Andrés y Providencia).
04	Palenquero (San Basilio de Palenque).
05	Negro(a), Afrocolombiano(a).
06	Sin Etnia

13. Comunidad: Cuando se trate de poblaciones indígenas las cuales serán las debidamente certificadas por el Ministerio del Interior.

14. Discapacidad: Este espacio debe diligenciarse solo en el caso de que el cotizante o cabeza de familia tenga una discapacidad reconocida y calificada médicamente.

Categoría de discapacidad:

Diligencie la casilla con base a la siguiente tabla:

CÓDIGO	CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
D1	Discapacidad Física temporal S C
D2	Discapacidad Neuro-sensorial temporal S C
D3	Discapacidad Mental temporal S C
D4	Discapacidad Física Permanente S C
D5	Discapacidad Neuro-sensorial permanente S C
D6	Discapacidad Mental permanente

15. Puntaje SISBÉN: Este dato aplica solo para el Régimen Subsidiado. Deben registrar el puntaje obtenido en la encuesta Sisbén

CLASIFICACIÓN METODOLOGÍA IV SISBÉN	
NIVEL	GRUPO
1	A1-B7
2	C1-C18

16. Grupo poblacional o población especial, corresponde a la clasificación de la población que ha sido elegible para el subsidio de salud mediante el mecanismo de listado censal como lo establecen las distintas normas vigentes sobre el particular. Debe escribir el código numérico en el espacio que corresponda, según la siguiente tabla:

Tipo Población	Nombre Población
1	Habitante de la calle
2	Población infantil abandonada a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
6	Menores desvinculados del conflicto armado bajo la protección del ICBF
8	Población desmovilizada y/o miembros del grupo armado ilegal que celebren acuerdos de paz con el Gobierno Nacional
9	Víctimas del conflicto armado interno
10	Población infantil vulnerable bajo protección de instituciones diferentes al ICBF
11	Programa en protección a testigos
14	Población reclusa a cargo de la entidad territorial
16	Adulto mayor en centros de protección
17	Comunidades indígenas
18	Rrom (Gitano)
22	Personas en prisión domiciliaria a cargo del INPEC
23	Personas que dejen de ser madres comunitarias
24	Migrantes colombianos repatriados que han retornado voluntariamente al país o han sido deportados o expulsados de territorio extranjero
25	Adolescentes y jóvenes a cargo del ICBF en el penal para adolescentes
26	Miembros de los grupos armados al margen de la ley que celebren acuerdos de paz con el Gobierno Nacional
27	Recién nacidos y menores de edad de padres no afiliados
28	Los voluntarios acreditados y activos de la Defensa Civil, Cruz Roja y Cuerpos de Bomberos y su núcleo familiar
29	Personas con discapacidad de escasos recursos y en condición de abandono en centros de protección
30	Migrante venezolano con PEP e hijos menores de edad con documento válido
32	Personas que se encuentren detenidas sin condena o cumpliendo medida de aseguramiento en centros de detención transitoria
33	Veteranos de la Fuerza Pública

Si la afiliación es individual o de oficio seleccione uno de los siguientes códigos: 08, 09, 11, 17, 18, 23, 24.

Si la afiliación es institucional seleccione uno de los siguientes códigos:
02, 06, 10, 16, 22.

17. Administradora de Riesgos Laborales – ARL: Este dato aplica sólo para la afiliación en el Régimen Contributivo de los trabajadores dependientes. Registre el nombre de la Entidad Administradora de Riesgos Laborales donde se encuentra afiliado.

18. Administradora de Pensiones: Este dato aplica solo para la afiliación en el Régimen Contributivo. Registre el nombre de la Entidad Administradora de Pensiones donde se encuentra afiliado.

19. Caja de compensación Familiar: Debe colocar el nombre de la Caja de Compensación Familiar donde se encuentra afiliado el cotizante.

20. Residencia: Registre su dirección de residencia actual, de acuerdo a la nomenclatura de la DIAN o Registro Municipal.

-Teléfono (fijo o celular, o ambos)
-Barrio
-Departamento
-Zona: urbana o rural donde se ubica su residencia
-Localidad / comuna si existen en su ciudad, municipio o distrito
-Correo electrónico: Registro importante para comunicarte su estado de afiliación y otras novedades
-Código de IPS
-Código de IPS Odontológica

CAPÍTULO IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante.

Estos datos deben ser registrados solo cuando el cónyuge o compañero (a) permanente también cotiza al SGSSS. Si este no cotiza debe registrarse en los espacios de “Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar” en el capítulo IV en la fila de primer beneficiario (B1). Si al momento de la afiliación del cotizante el cónyuge o compañero (a) permanente está afiliado y cotiza, solo debe diligenciar sus datos básicos de identificación de estos espacios.

21. Apellidos y nombres: Estos datos deben ser registrados en forma idéntica como figuran en el documento de identidad.

-Primer apellido
-Segundo apellido
-Primer nombre
-Segundo nombre

22. Tipo de documento de identidad: Registre el código que corresponde al documento con el cual se va a identificar, según la tabla de tipos de documentos de identidad que se encuentra en el numeral 7 del capitulo II de este instructivo.

23. Número del documento de identidad: Registre el número exactamente como aparece en el documento de identidad. Verifique que lo ha registrado completo.
Si se trata del registro civil escriba el número NUIP que aparece en la parte superior izquierda del documento, no el indicativo serial. Verifique que lo ha registrado completo.
24. Sexo: Marque con una X, la opción: femenino o masculino, como aparece en su documento de identidad.
25. Fecha de nacimiento: Registre la fecha de nacimiento como aparece en el documento de identidad: día, mes y año.
Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales.
En las filas identificadas con los códigos 1, 2, 3, 4 y 5 registre los datos de cada uno de los beneficiarios o afiliados adicionales que vaya a incluir en el trámite.
26. Nacionalidad: Para los tipos de documentos CN, RC, TI y CC reporte la nacionalidad colombiana. Para el caso de los extranjeros registre la nacionalidad contenida en el documento de identidad que debe corresponder a los códigos ubicados en la Resolución número 974 del 2022 Capítulo II tabla 11.
27. Apellidos y nombres: Estos datos deben ser registrados en forma idéntica como figuran en el documento de identidad.
28. Tipo de documento de identidad: Coloque en el espacio el código que corresponde al documento con el cual se va a identificar, según la tabla de tipos de documentos de identidad que se encuentra en el numeral 7 del capítulo II.
29. Número del documento de identidad: Registre el numero exactamente como figura en el documento de identidad. Verifique que lo ha registrado completo. Si se trata del registro civil escriba el número NUIP que figura en la parte superior izquierda del documento no el indicativo serial.
30. Nacionalidad: Para los tipos de documentos CN, RC, TI y CC reporte la nacionalidad colombiana, Para el caso de los extranjeros registre la nacionalidad contenida en el documento de identidad debe responder a los códigos ubicados en la Resolución número 974 del 2022 capitulo II tabla 11.
31. Sexo: Marque con una X, la opción femenino o masculino, como aparece en su documento de identidad.
32. Fecha de nacimiento: Registre la fecha de nacimiento como aparece en el documento de identidad: día, mes y año.
Datos complementarios
33. Parentesco: En este espacio debe colocar el código que corresponde al tipo de parentesco con el cotizante o cabeza de familia y que lo identifica como beneficiario o afiliado adicional como aparece en la siguiente tabla:

CÓDIGO	PARENTESCO	DESCRIPCIÓN PARENTESCO
CP	Compañera(o) permanente incluyendo las parejas del mismo sexo.	Con unión marital de hecho.
HI	Hijos menores de veinticinco(25) años de edad.	Que dependan económicamente del cotizante.
HD	Los hijos de cualquier edad.	Si tienen incapacidad permanente y dependen económicamente del cotizante.
HC	Los hijos del cónyuge o compañera o compañero permanente del afiliado, incluyendo los de las parejas del mismo sexo.	Si son menores de 25 años y dependen económicamente del cotizante, o de cualquier edad si presentan incapacidad permanente y dependen económicamente del cotizante.
HB	Los hijos de los beneficiarios.	Son los nietos del cotizante cuyo padre o madre es beneficiario del cotizante.
MD	Los menores de veinticinco(25) años o de cualquier edad , con incapacidad permanente.	Que dependan económicamente del cotizante y se encuentren hasta el tercer grado de consanguinidad, como consecuencia del fallecimiento de los padres, la pérdida de la patria potestad o la ausencia de éstos.
PD	Padres del cotizante.	Que no estén pensionados y dependan económicamente del cotizante, cuando este no inscribe como beneficiarios al cónyuge o compañera (o) permanente o a los hijos.
MC	Menores de dieciocho(18) años en custodia.	Entregados en custodia legal al cotizante o cabeza de familia, por autoridad competente.
AA	Persona de cualquier edad como afiliada adicional.	Persona de cualquier edad que depende económicamente del cotizante y se encuentra en el 4° grado de consanguinidad o 2° de afinidad, respecto de este.

34. Etnia
Registre el código que aparece en el numeral 12 de este instructivo, correspondiente a la etnia en caso de pertenecer a alguna de ellas.
35. Discapacidad: Este espacio debe diligenciarse solo en el caso de que el cotizante o cabeza de familia tenga una discapacidad reconocida y calificada médicamente, registre el código de la tabla ubicada en el numeral 14 de este instructivo.
36. Datos de residencia: Estos datos aplican sólo para el Régimen Contributivo cuando los beneficiarios y afiliados adicionales residan en un municipio diferente al del cotizante.
Ciudad/ Municipio
Departamento
Zona: urbana, rural
Teléfono (fijo y/o celular)
37. Valor de la UPC del afiliado adicional: Este dato debe ser diligenciado por la EPS para lo cual debe colocar el valor mensual del aporte (en números) correspondiente a cada afiliado adicional que se haya registrado.
Selección de la institución Prestadora de Servicios de Salud – IPS primaria
38. Nombre de la Institución Prestadora de Servicio de Salud – IPS:
Registre el nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud primaria que ha sido seleccionada por el cotizante o cabeza de familia, dentro del listado de la Red de Prestadores que le presente la EPS.
NIVEL SÍSBEN Y GRUPO POBLACIONAL:
Verificar numeral 15 y tabla correspondiente al numeral 16.
CAPITULO V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.
Estos datos aplican a:
El Empleador cuando el afiliado que hace el trámite es un trabajador dependiente y la afiliación o el reporte de la novedad lo exige.
Las entidades autorizadas para realizar la afiliación colectiva de trabajadores o miembros de comunidades o congregaciones religiosas entidades administradoras o pagadoras de pensiones, Cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado Cajas de Compensación y Familiar cuando se trate de cotizantes que no tienes la calidad de dependientes y la afiliación o el reporte de la novedad lo exige .
Las instituciones o entidades responsables de hacer la afiliación reportar las novedades de las personas que se encuentran bajo su protección, o los empleadores, entidades e instituciones que tienen la competencia para realizar la afiliación o el reporte de novedades.
39. Nombre o Razón Social: Escriba el nombre o razón social del empleador, otro tipo de aportante, pagador de pensiones o de las entidades responsables de la afiliación colectiva, institucional o de oficio.
40. Tipo de documento de identificaciones: Escriba el tipo de documento con el cual se identifica como empleador, otro tipo de aportante, pagador de pensiones o como entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio, así:
-NIT (Número de identificación tributaria), cuando se trate de personas jurídicas, públicas o privadas.
-CC (cédula de ciudadanía), TI (Tarjeta de Identidad), PA (Pasaporte), CE (Cédula de extranjería), CD (Carné diplomático), PE (Permiso Especial de Permanencia), PT(Permiso de permiso temporal) cuando se trate de personas naturales.
41. Número del documento de identificación: Escriba el número del documento de identificación.
42. Tipo de aportante o Pagador de Pensiones: Este debe ser diligenciado por la EPS para lo cual debe registrar el código del tipo de aportante o pagador de pensiones que corresponda según la tabla de aportantes establecida para la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes-PILA.
43. Ubicación o Dirección
-Ciudad o Municipio
-Departamento
-Teléfono (fijo o celular)
-Correo electrónico
En el caso de Bogotá D.C., Debe escribir como departamento Bogotá D.C
B. REPORTE DE NOVEDADES
El reporte de novedades no puede realizarse simultáneamente con la afiliación. La novedad es la modificación de los datos reportados en la afiliación o de la condición de la afiliación.
El reporte de novedades solo puede ser realizado por los cotizantes y cabezas de familia.
Los beneficiarios únicamente pueden reportar las novedades que expresamente se autorizan en este instructivo.
Las EPS no pueden reportar a la base de datos de afiliados vigente novedades que no hayan sido reportadas por los cotizantes cabezas de familia o beneficiarios mediante las suscripción del Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades
44. Tipos de novedad: Marque con una X la casilla que corresponda al tipo de novedad que va a reportar, según la siguiente tabla:
CAPITULO VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD
45. Datos básicos de identificación: Registre en el numeral 46t del capitulo VI, los datos básicos (Primer apellido, Segundo apellido, Primer nombre, Segundo nombre, Tipo de documento de Identidad, Número del documento de Identidad, Sexo y Fecha de nacimiento) del afiliado, únicamente para las siguientes novedades:
46. Fecha: Registre en el numeral 47 del capítulo VI, la fecha únicamente para las siguientes novedades:
Novedad 9: Inicio de la relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
Novedad 10: Terminación de la relación laboral.
Novedad 11: Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
Novedad 12: Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
Novedad 15: Reporte de fallecimiento, la que figura en el certificado de defunción.
47. EPS Anterior: Este dato solo se diligencia para la novedad 14 cuando se solicita traslado y corresponde el nombre de la EPS en el cual se encuentra inscrito.
48. Excepción del traslado: Este campo debe seleccionarse cuando esta reportando la novedad 14. Seleccione según corresponda: **Unificación de grupo familiar:** si va a realizar una inclusión a su grupo familiar, su cónyuge y/o compañero(a). **Cobertura geográfica:** si la EPS de donde se traslada no tiene cobertura en su nuevo municipio de residencia.
Cumplimiento tiempo de Cesión: cuando fue cedido a otra Eps y cumple los 90 días para poder trasladarse de acuerdo al Decreto 780 Art 2.1.7.3.
49. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones: Este dato se registra únicamente en la novedad 16: "Reporte del trámite de protección al cesante" o en la novedad 18: "Reporte de la calidad de pensionado". Debe colocar el nombre de la Caja de Compensación Familiar o del Pagador de Pensiones, según el caso.
CAPITULO VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
50. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
52. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
53. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicio de Salud.
54. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia ay de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
55. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
56. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
57. De acuerdo a los términos y condiciones de canales digitales de Nueva EPS, autorizo mi consentimiento explícito para que Nueva EPS pueda establecer una comunicación directa a través de los diferentes medios y canales de comunicación dispuestos para tal fin, tales como SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, Chat y WhatsApp entre otros; sobre los cuales el usuario puede recibir mensajes informativos, notificaciones, respuesta a solicitudes, entre otros.
58. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
59. Aceptación de la actualización del grupo familiar en Contribución Solidaria.
CAPITULO VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA
Afiliación a régimen subsidiado por Contribución Solidaria
Con la expedición del Decreto 616 de 2022, el Gobierno nacional incorporó la Contribución Solidaria como un mecanismo de afiliación al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, para la población no pobre y no vulnerable correspondiente al Grupo D según la clasificación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -Sisbén IV, que por sus características socioeconómicas no cumple con los requisitos para estar en el régimen subsidiado pleno y que no cumple los requisitos para ser cotizante o beneficiario en el Régimen Contributivo. Este instrumento permite que esta población pueda afiliarse al régimen subsidiado a través del pago de la tarifa establecida, de acuerdo con su capacidad de pago parcial; contribuyendo con la universalización del aseguramiento.
En este mecanismo los afiliados podrán realizar aportes de acuerdo a su subgrupo dentro del grupo D, el pago se realiza mensual por cada uno de los integrantes del grupo familiar que sean mayores de 18 años.
60. En caso de ausencia o fallecimiento de cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria.
Apellidos y nombres: Estos datos deben ser registrados en forma idéntica como figuran en el documento de identidad.
-Primer apellido
-Segundo apellido
-Primer nombre
-Segundo nombre
Tipo de documento de identidad: Registre el código que corresponde al documento con el cual se va a identificar, según la tabla de tipos de documentos de identidad que se encuentra en el numeral 7 del capítulo II de este instructivo.
Número del documento de identidad: Registre el número exactamente como aparece en el documento de identidad. Verifique que lo ha registrado completo.
Sexo: Marque con una X, la opción: femenino o masculino, como aparece en su documento de identidad.
Fecha de nacimiento: Registre la fecha de nacimiento como aparece en el documento de identidad: día, mes y año.
CAPITULO IX. FIRMAS
Este formulario debe suscribirse por el cotizante, cabeza de familia, empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio, en los casos establecidos en este instructivo y que, conforme a la normativa vigente, tenga a su cargo la afiliación y el reporte de novedades. También será suscrito por el beneficiario solo en el evento del reporte de fallecimiento del cotizante o cabeza de familia.
En el espacio correspondiente debe ir la firma de:
61. El cotizante cabeza de familia o beneficiario cuando aplique.
62. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio.
Con la firma contenida en el numeral 62 el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.
CAPITULO X. ANEXOS
Marque con una X la casilla correspondiente al/los documento(s) que se anexe(n), según lo requiera el trámite que realiza.
63. Documento de identidad: CN, MS, RC, TI, CC, CE, SC, PA, CD, PE, AS ,PT.
64. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
65. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
66. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
67. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
68. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
69. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
70. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
71. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
72. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.
CAPITULO XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL
Estos datos aplican solo en el Régimen Subsidiado y deben diligenciarse por la entidad territorial cuando se trate de afiliación o reporte de novedades en el régimen subsidiado, cuando la respectiva novedad lo exige.
73. Identificación de la Entidad Territorial:
Registre el código del municipio o distrito y del departamento según la codificación DANE, que corresponde a la Entidad Territorial.
74. Datos del Sisben
El funcionario de la Entidad Territorial debe consultar en la base de datos Sisbén y registrar:
-Si o No
-Clasificación
75. Pertenece a Grupo de población especial articulo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016
Debe escribir el código numérico en el espacio que corresponda, según la tabla del numeral 16 del capítulo II
76. Nombre De La Institución:
Corresponde al nombre de la institución que valida la información reportada en el formulario por el cotizante, cabeza de familia, o beneficiario según corresponda.
El funcionario de la Institución debe registrar sus datos personales.
– Primer apellido
– Segundo apellido
– Primer nombre
– Segundo Nombre
– Tipo de documento de identidad
– Número del documento de identidad
77. Firma del funcionario:
El funcionario de la Entidad Territorial debe colocar su firma, como responsable de los datos registrados sobre la información y validación del Sisbén.
78. Fecha de radiación:
El funcionario de la Entidad Territorial debe registrar la fecha en que la EPS entrega el formulario para validación.
79. Fecha de validación:
El funcionario de la Entidad Territorial debe registrar la fecha en que consultó la base de datos del Sisbén e hizo las validaciones correspondientes.
Observaciones:
En este espacio puede escribir las observaciones que considere necesarias respecto del trámite, la información solicitada o el trato recibido.

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL EBISU S.A.S

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807008957	7	EBISU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 46 95 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2568829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	159510629	9456265633	E	2023/09/14	2023/09/14	BANCOLOMBIA	0	$64,299,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (19 Afiliados)																						$60,696,209	$9,981,500			$60,696,209	$3,278,000			$60,696,209	$2,428,000			$60,696,209		$2,939,700		$10,000,000	$500,000		$19,127,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)																						$19,200,000	$3,122,000			$19,200,000	$768,000			$19,200,000	$768,000			$19,200,000		$100,100		$0	$0		$4,758,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$19,200,000	$3,122,000			$19,200,000	$768,000			$19,200,000	$768,000			$19,200,000		$100,100		$0	$0		$4,758,100
1	CC	1072655070	ACOSTA ESTEFANY																	23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
2	CC	1070975446	AVILA YEFERSON																	23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
3	CC	1015399081	CAPADOR JUDITH																	23100 1	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,276,100
4	CC	1030639027	OSORIO PAULA																	23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
5	CC	1032399345	PEÑA LORENA																	23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
6	CC	52277740	POVEDA MARIA												X					23100 1	2	$80,000	$12,800	EPS037	2	$80,000	$3,200	CCF24	2	$80,000	$3,200	14-7	2	$80,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,200
7	CC	52277740	POVEDA MARIA																	23100 1	28	$1,120,000	$179,200	EPS037	28	$1,120,000	$44,800	CCF24	28	$1,120,000	$44,800	14-7	28	$1,120,000	0.522%	$5,900	28	$0	$0	Si	$274,700
8	CE	685755	RAMIREZ NERIO																	23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (2 Afiliados)																						$826,000	$132,200			$826,000	$33,100			$826,000	$33,100			$826,000		$8,700		$0	$0		$207,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$826,000	$132,200			$826,000	$33,100			$826,000	$33,100			$826,000		$8,700		$0	$0		$207,100
9	CC	52209240	CHAGUALA SANDRA		X															23020 1	18	$696,000	$111,400	EPS005	18	$696,000	$27,900	CCF24	18	$696,000	$27,900	14-7	18	$696,000	1.044%	$7,300	18	$0	$0	Si	$174,500
10	CC	1087111789	VALENCIA MONICA	X																25-14	3	$130,000	$20,800	EPS008	3	$130,000	$5,200	CCF24	3	$130,000	$5,200	14-7	3	$130,000	1.044%	$1,400	3	$0	$0	Si	$32,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (10 Afiliados)																						$40,670,209	$6,727,300			$40,670,209	$2,476,900			$40,670,209	$1,626,900			$40,670,209		$2,830,900		$10,000,000	$500,000		$14,162,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																						$40,670,209	$6,727,300			$40,670,209	$2,476,900			$40,670,209	$1,626,900			$40,670,209		$2,830,900		$10,000,000	$500,000		$14,162,000
11	CC	1026297800	ARIAS BRIGITTE																	23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
12	CC	1013662097	CELIS DAYANA																	23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
13	CC	88263079	COTE CARLOS																	23030 1	30	$5,000,000	$850,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,598,000
14	CC	60356576	COTE MONICA																	25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS010	30	$10,000,000	$1,250,000	CCF24	30	$10,000,000	$400,000	14-7	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$10,000,000	$500,000	No	$4,546,000
15	CC	1085174866	DIAZ JUAN								X									23030 1	30	$2,448,334	$391,800	EPS037	30	$2,448,334	$98,000	CCF24	30	$2,448,334	$98,000	14-7	30	$2,448,334	6.960%	$170,500	30	$0	$0	Si	$758,300
16	CC	1234646208	FLOREZ DANIEL																	23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
17	CC	1010188418	MARCIALES FABIAN																	23030 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
18	CC	1054253600	OJEDA OSCAR																	23100 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-7	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
19	CC	1014204230	SANCHEZ YAMIL							X		X								25-14	30	$2,221,875	$355,500	EPS017	30	$2,221,875	$88,900	CCF24	30	$2,221,875	$88,900	14-7	30	$2,221,875	6.960%	$154,700	30	$0	$0	Si	$688,000
20	CC	1090457336	SOCHA ALEXIS																	23090 1	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS008	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-7	30	$7,000,000	6.960%	$487,200	30	$0	$0	Si	$2,237,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HELIOS (7 Afiliados)																						$11,681,846	$1,869,500			$11,681,846	$467,700			$11,681,846	$467,700			$11,681,846		$813,400		$0	$0		$3,618,300

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: BOGOTA (7 Afiliados)																							$11,681,846	$1,869,500			$11,681,846	$467,700			$11,681,846	$467,700			$11,681,846		$813,400		$0	$0		$3,618,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$11,681,846	$1,869,500			$11,681,846	$467,700			$11,681,846	$467,700			$11,681,846		$813,400		$0	$0		$3,618,300
21	CC	80362362	AMADO JOSE									X									25-14	30	$2,342,813	$374,900	EPS002	30	$2,342,813	$93,800	CCF24	30	$2,342,813	$93,800	14-7	30	$2,342,813	6.960%	$163,100	30	$0	$0	Si	$725,600
22	CC	74325097	BARRETO MARIO									X									230301	30	$2,360,677	$377,800	EPS005	30	$2,360,677	$94,500	CCF24	30	$2,360,677	$94,500	14-7	30	$2,360,677	6.960%	$164,400	30	$0	$0	Si	$731,200
23	CC	4053213	CACERES PASTOR									X									25-14	30	$1,172,083	$187,600	EPS041	30	$1,172,083	$46,900	CCF24	30	$1,172,083	$46,900	14-7	30	$1,172,083	6.960%	$81,600	30	$0	$0	Si	$363,000
24	CC	1020785106	CONTRERAS SERGIO									X									230301	30	$1,578,126	$252,600	EPS017	30	$1,578,126	$63,200	CCF24	30	$1,578,126	$63,200	14-7	30	$1,578,126	6.960%	$109,900	30	$0	$0	Si	$488,900
25	CC	82392781	MONCADA MARIO									X									230301	30	$2,407,813	$385,300	EPS037	30	$2,407,813	$96,400	CCF24	30	$2,407,813	$96,400	14-7	30	$2,407,813	6.960%	$167,600	30	$0	$0	Si	$745,700
26	CC	1093770519	VILLAMIL BREYNER									X									230301	30	$1,781,667	$285,100	EPS005	30	$1,781,667	$71,300	CCF24	30	$1,781,667	$71,300	14-7	30	$1,781,667	6.960%	$124,100	30	$0	$0	Si	$551,800
27	CC	1193081451	VILLARREAL ZORAIDA	X																	230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROYECTO BOITA (50 Afiliados)																							$88,887,780	$13,966,400			$94,387,780	$3,520,000			$94,387,780	$3,520,000			$94,387,780		$6,113,000		$0	$0		$27,119,400
Centro de Trabajo: PROYECTO BOITA (50 Afiliados)																							$88,887,780	$13,966,400			$94,387,780	$3,520,000			$94,387,780	$3,520,000			$94,387,780		$6,113,000		$0	$0		$27,119,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (50 Afiliados)																							$88,887,780	$13,966,400			$94,387,780	$3,520,000			$94,387,780	$3,520,000			$94,387,780		$6,113,000		$0	$0		$27,119,400
28	CC	1106785842	AGUDELO MARIO										X								230201	1	$75,000	$9,000	EPS037	1	$75,000	$0	CCF24	1	$75,000	$0	14-7	1	$75,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,000
29	CC	1106785842	AGUDELO MARIO										X								230201	3	$225,000	$27,000	EPS037	3	$225,000	$0	CCF24	3	$225,000	$0	14-7	3	$225,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$27,000
30	CC	1106785842	AGUDELO MARIO									X									230201	26	$2,020,313	$323,300	EPS037	26	$2,020,313	$80,900	CCF24	26	$2,020,313	$80,900	14-7	26	$2,020,313	6.960%	$140,700	26	$0	$0	Si	$625,800
31	CC	1033756287	ALFARO ANGEL										X								230201	2	$180,000	$21,600	EPS010	2	$180,000	$0	CCF24	2	$180,000	$0	14-7	2	$180,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$21,600
32	CC	1033756287	ALFARO ANGEL		X							X									230201	12	$1,260,000	$201,600	EPS010	12	$1,260,000	$50,400	CCF24	12	$1,260,000	$50,400	14-7	12	$1,260,000	6.960%	$87,700	12	$0	$0	Si	$390,100
33	CC	50989201	ALTAMIRANDA IRINA									X									230201	30	$1,268,750	$203,000	EPS037	30	$1,268,750	$50,800	CCF24	30	$1,268,750	$50,800	14-7	30	$1,268,750	6.960%	$88,400	30	$0	$0	Si	$393,000
34	CC	1033694813	AMADO JUAN									X									231001	30	$1,893,750	$303,000	EPS005	30	$1,893,750	$75,800	CCF24	30	$1,893,750	$75,800	14-7	30	$1,893,750	6.960%	$131,900	30	$0	$0	Si	$586,500
35	CC	1129593	ANTOLINEZ BENJAMIN	X																	230301	8	$453,334	$72,600	EPS037	8	$453,334	$18,200	CCF24	8	$453,334	$18,200	14-7	8	$453,334	6.960%	$31,600	8	$0	$0	Si	$140,600
36	CC	13840356	ARCE MARINO																			0	$0	$0	EPS017	30	$5,500,000	$220,000	CCF24	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	6.960%	$382,800	30	$0	$0	Si	$822,800
37	CC	1001045259	AREVALO FRANK																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
38	CC	9736343	ARIAS ANDRES	X	X																230301	1	$66,667	$10,700	EPS037	1	$66,667	$2,700	CCF24	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$66,667	6.960%	$4,700	1	$0	$0	Si	$20,800
39	CC	1050838379	AVILA LEONARDO										X								230301	3	$165,000	$19,800	ESSC07	3	$165,000	$0	CCF24	3	$165,000	$0	14-7	3	$165,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$19,800
40	CC	1050838379	AVILA LEONARDO									X									230301	27	$1,553,751	$248,700	ESSC07	27	$1,553,751	$62,200	CCF24	27	$1,553,751	$62,200	14-7	27	$1,553,751	6.960%	$108,200	27	$0	$0	Si	$481,300
41	CC	1050064758	BELEÑO MARTIN										X								230301	3	$234,000	$28,100	EPS008	3	$234,000	$0	CCF24	3	$234,000	$0	14-7	3	$234,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,100
42	CC	1050064758	BELEÑO MARTIN									X									230301	27	$2,179,125	$348,700	EPS008	27	$2,179,125	$87,200	CCF24	27	$2,179,125	$87,200	14-7	27	$2,179,125	6.960%	$151,700	27	$0	$0	Si	$674,800
43	CC	92450398	BERRIO AGUSTIN										X								230201	3	$234,000	$28,100	EPS002	3	$234,000	$0	CCF24	3	$234,000	$0	14-7	3	$234,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,100
44	CC	92450398	BERRIO AGUSTIN									X									230201	27	$2,215,688	$354,600	EPS002	27	$2,215,688	$88,700	CCF24	27	$2,215,688	$88,700	14-7	27	$2,215,688	6.960%	$154,300	27	$0	$0	Si	$686,300
45	CC	14011919	CAICEDO ANSELMO										X								231001	5	$375,000	$45,000	EPS010	5	$375,000	$0	CCF24	5	$375,000	$0	14-7	5	$375,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$45,000
46	CC	14011919	CAICEDO ANSELMO									X									231001	25	$1,945,313	$311,300	EPS010	25	$1,945,313	$77,900	CCF24	25	$1,945,313	$77,900	14-7	25	$1,945,313	6.960%	$135,400	25	$0	$0	Si	$602,500
47	CC	73015402	CANTILLO LIBARDO										X								231001	3	$234,000	$28,100	EPS002	3	$234,000	$0	CCF24	3	$234,000	$0	14-7	3	$234,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,100
48	CC	73015402	CANTILLO LIBARDO									X									231001	27	$2,191,313	$350,700	EPS002	27	$2,191,313	$87,700	CCF24	27	$2,191,313	$87,700	14-7	27	$2,191,313	6.960%	$152,600	27	$0	$0	Si	$678,700
49	CC	1122126761	CARANTON ALFREDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
50	CC	1006147184	CARDONA TATIANA									X									230301	30	$1,884,375	$301,500	EPS002	30	$1,884,375	$75,400	CCF24	30	$1,884,375	$75,400	14-7	30	$1,884,375	6.960%	$131,200	30	$0	$0	Si	$583,500
51	CC	1100543793	CARDOZO JEFRY										X								230201	2	$180,000	$21,600	EPS017	2	$180,000	$0	CCF24	2	$180,000	$0	14-7	2	$180,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$21,600
52	CC	1100543793	CARDOZO JEFRY		X							X									230201	12	$1,260,000	$201,600	EPS017	12	$1,260,000	$50,400	CCF24	12	$1,260,000	$50,400	14-7	12	$1,260,000	6.960%	$87,700	12	$0	$0	Si	$390,100
53	CC	1049316799	CARO JHON									X									230301	30	$1,268,750	$203,000	EPS002	30	$1,268,750	$50,800	CCF24	30	$1,268,750	$50,800	14-7	30	$1,268,750	6.960%	$88,400	30	$0	$0	Si	$393,000

54	CC	1020761157	CARREÑO CESAR																		23100 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS017	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
55	CC	73015206	CORDERO DAVID										X								23020 1	3	$234,000	$28,100	EPS008	3	$234,000	$0	CCF24	3	$234,000	$0	14-7	3	$234,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,100
56	CC	73015206	CORDERO DAVID									X									23020 1	27	$2,142,563	$342,900	EPS008	27	$2,142,563	$85,800	CCF24	27	$2,142,563	$85,800	14-7	27	$2,142,563	6.960%	$149,200	27	$0	$0	Si	$663,700
57	CC	13852230	CORTES FERNEL											X							23030 1	2	$104,000	$16,700	EPS017	2	$104,000	$4,200	CCF24	2	$104,000	$4,200	14-7	2	$104,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,100
58	CC	13852230	CORTES FERNEL										X								23030 1	4	$312,000	$37,500	EPS017	4	$312,000	$0	CCF24	4	$312,000	$0	14-7	4	$312,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$37,500
59	CC	13852230	CORTES FERNEL									X									23030 1	24	$1,908,563	$305,400	EPS017	24	$1,908,563	$76,400	CCF24	24	$1,908,563	$76,400	14-7	24	$1,908,563	6.960%	$132,900	24	$0	$0	Si	$591,100
60	CC	1007857829	DURAN VICTOR										X								23030 1	4	$312,000	$37,500	EPS037	4	$312,000	$0	CCF24	4	$312,000	$0	14-7	4	$312,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$37,500
61	CC	1007857829	DURAN VICTOR									X									23030 1	26	$2,101,125	$336,200	EPS037	26	$2,101,125	$84,100	CCF24	26	$2,101,125	$84,100	14-7	26	$2,101,125	6.960%	$146,300	26	$0	$0	Si	$650,700
62	CC	1046426822	DURAN WALBERTO										X								23100 1	1	$90,000	$10,800	EPS010	1	$90,000	$0	CCF24	1	$90,000	$0	14-7	1	$90,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,800
63	CC	1046426822	DURAN WALBERTO										X								23100 1	1	$90,000	$10,800	EPS010	1	$90,000	$0	CCF24	1	$90,000	$0	14-7	1	$90,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,800
64	CC	1046426822	DURAN WALBERTO										X								23100 1	2	$180,000	$21,600	EPS010	2	$180,000	$0	CCF24	2	$180,000	$0	14-7	2	$180,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$21,600
65	CC	1046426822	DURAN WALBERTO										X								23100 1	3	$270,000	$32,400	EPS010	3	$270,000	$0	CCF24	3	$270,000	$0	14-7	3	$270,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$32,400
66	CC	1046426822	DURAN WALBERTO									X									23100 1	23	$2,112,188	$338,000	EPS010	23	$2,112,188	$84,500	CCF24	23	$2,112,188	$84,500	14-7	23	$2,112,188	6.960%	$147,100	23	$0	$0	Si	$654,100
67	CC	1049317952	GIL IVAN										X								23030 1	3	$234,000	$28,100	EPS005	3	$234,000	$0	CCF24	3	$234,000	$0	14-7	3	$234,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,100
68	CC	1049317952	GIL IVAN																		23030 1	27	$2,106,000	$337,000	EPS005	27	$2,106,000	$84,300	CCF24	27	$2,106,000	$84,300	14-7	27	$2,106,000	6.960%	$146,600	27	$0	$0	Si	$652,200
69	CC	80728996	GIRON LUIS									X									23030 1	30	$1,850,521	$296,100	EPS008	30	$1,850,521	$74,100	CCF24	30	$1,850,521	$74,100	14-7	30	$1,850,521	6.960%	$128,800	30	$0	$0	Si	$573,100
70	CC	1110577553	GRANADOS JONNATAN										X								25-14	1	$60,000	$7,200	EPS002	1	$60,000	$0	CCF24	1	$60,000	$0	14-7	1	$60,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,200
71	CC	1110577553	GRANADOS JONNATAN										X								25-14	3	$180,000	$21,600	EPS002	3	$180,000	$0	CCF24	3	$180,000	$0	14-7	3	$180,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$21,600
72	CC	1110577553	GRANADOS JONNATAN									X									25-14	26	$1,578,750	$252,600	EPS002	26	$1,578,750	$63,200	CCF24	26	$1,578,750	$63,200	14-7	26	$1,578,750	6.960%	$109,900	26	$0	$0	Si	$488,900
73	CC	1072531464	HERNANDEZ FERNEIS	X								X									23030 1	22	$917,126	$146,800	ESSC07	22	$917,126	$36,700	CCF24	22	$917,126	$36,700	14-7	22	$917,126	6.960%	$63,900	22	$0	$0	Si	$284,100
74	CC	79895630	HERRERA CARLOS																		23030 1	30	$4,180,000	$668,800	EPS005	30	$4,180,000	$167,200	CCF24	30	$4,180,000	$167,200	14-7	30	$4,180,000	6.960%	$291,000	30	$0	$0	Si	$1,294,200
75	CC	1051670620	JIMENEZ DAVID										X								23030 1	3	$225,000	$27,000	EPS017	3	$225,000	$0	CCF24	3	$225,000	$0	14-7	3	$225,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$27,000
76	CC	1051670620	JIMENEZ DAVID									X									23030 1	27	$2,095,313	$335,300	EPS017	27	$2,095,313	$83,900	CCF24	27	$2,095,313	$83,900	14-7	27	$2,095,313	6.960%	$145,900	27	$0	$0	Si	$649,000
77	CC	13563241	LOPEZ ALEXANDER										X								23020 1	3	$225,000	$27,000	EPS017	3	$225,000	$0	CCF24	3	$225,000	$0	14-7	3	$225,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$27,000
78	CC	13563241	LOPEZ ALEXANDER									X									23020 1	27	$2,048,438	$327,800	EPS017	27	$2,048,438	$82,000	CCF24	27	$2,048,438	$82,000	14-7	27	$2,048,438	6.960%	$142,600	27	$0	$0	Si	$634,400
79	CC	80856529	MARIN ADALBERTO										X								23030 1	3	$174,000	$20,900	EPS010	3	$174,000	$0	CCF24	3	$174,000	$0	14-7	3	$174,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$20,900
80	CC	80856529	MARIN ADALBERTO									X									23030 1	27	$1,584,125	$253,500	EPS010	27	$1,584,125	$63,400	CCF24	27	$1,584,125	$63,400	14-7	27	$1,584,125	6.960%	$110,300	27	$0	$0	Si	$490,600
81	CC	1004148305	MARIN ANDRES										X								23030 1	3	$180,000	$21,600	EPS002	3	$180,000	$0	CCF24	3	$180,000	$0	14-7	3	$180,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$21,600
82	CC	1004148305	MARIN ANDRES									X									23030 1	27	$1,704,375	$272,700	EPS002	27	$1,704,375	$68,200	CCF24	27	$1,704,375	$68,200	14-7	27	$1,704,375	6.960%	$118,700	27	$0	$0	Si	$527,800
83	CC	1131110868	MATOS JOSE										X								23020 1	1	$70,000	$8,400	EPS002	1	$70,000	$0	CCF24	1	$70,000	$0	14-7	1	$70,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,400
84	CC	1131110868	MATOS JOSE										X								23020 1	2	$140,000	$16,800	EPS002	2	$140,000	$0	CCF24	2	$140,000	$0	14-7	2	$140,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$16,800
85	CC	1131110868	MATOS JOSE		X																23020 1	11	$770,000	$123,200	EPS002	11	$770,000	$30,800	CCF24	11	$770,000	$30,800	14-7	11	$770,000	6.960%	$53,600	11	$0	$0	Si	$238,400
86	CC	1102868238	MONTALVO ANDRES										X								23100 1	5	$290,000	$34,800	EPS005	5	$290,000	$0	CCF24	5	$290,000	$0	14-7	5	$290,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$34,800
87	CC	1102868238	MONTALVO ANDRES									X									23100 1	25	$1,468,125	$234,900	EPS005	25	$1,468,125	$58,800	CCF24	25	$1,468,125	$58,800	14-7	25	$1,468,125	6.960%	$102,200	25	$0	$0	Si	$454,700
88	CC	11520640	MORENO JORGE										X								23020 1	3	$330,000	$39,600	EPS008	3	$330,000	$0	CCF24	3	$330,000	$0	14-7	3	$330,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$39,600
89	CC	11520640	MORENO JORGE									X									23020 1	27	$3,124,688	$500,000	EPS008	27	$3,124,688	$125,000	CCF24	27	$3,124,688	$125,000	14-7	27	$3,124,688	6.960%	$217,500	27	$0	$0	Si	$967,500
90	CC	1033744000	MOYANO EDWIN																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
91	CC	1063164092	OSORIO ELIEZER																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500

92	CC	70466659	PAMPLONA HERNAN													X					230301	1	$60,000	$9,600	EPS010	1	$60,000	$2,400	CCF24	1	$60,000	$2,400	14-7	1	$60,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,400
93	CC	70466659	PAMPLONA HERNAN									X									230301	29	$1,871,250	$299,400	EPS010	29	$1,871,250	$74,900	CCF24	29	$1,871,250	$74,900	14-7	29	$1,871,250	6.960%	$130,300	29	$0	$0	Si	$579,500
94	CC	52878576	PERDOMO WENDY		X																231001	12	$660,000	$105,600	EPS010	12	$660,000	$26,400	CCF24	12	$660,000	$26,400	14-7	12	$660,000	6.960%	$46,000	12	$0	$0	Si	$204,400
95	CC	79113529	PEREZ JOSE	X																	25-14	3	$200,000	$32,000	EPS008	3	$200,000	$8,000	CCF24	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$200,000	6.960%	$14,000	3	$0	$0	Si	$62,000
96	CC	1005780454	RAMIREZ SEBASTIAN																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
97	CC	1216968625	RODRIGUEZ FRANEISON	X								X									25-14	22	$880,875	$141,000	ESSC24	22	$880,875	$35,300	CCF24	22	$880,875	$35,300	14-7	22	$880,875	6.960%	$61,400	22	$0	$0	Si	$273,000
98	CC	80895045	ROJAS EDISON									X									230301	30	$1,987,500	$318,000	EPS002	30	$1,987,500	$79,500	CCF24	30	$1,987,500	$79,500	14-7	30	$1,987,500	6.960%	$138,400	30	$0	$0	Si	$615,400
99	CC	73541469	ROJAS MARIO										X								25-14	3	$234,000	$28,100	EPS002	3	$234,000	$0	CCF24	3	$234,000	$0	14-7	3	$234,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,100
100	CC	73541469	ROJAS MARIO									X									25-14	27	$2,215,688	$354,600	EPS002	27	$2,215,688	$88,700	CCF24	27	$2,215,688	$88,700	14-7	27	$2,215,688	6.960%	$154,300	27	$0	$0	Si	$686,300
101	CC	1002700611	SALCEDO ANDRES										X								230301	2	$180,000	$21,600	EPS002	2	$180,000	$0	CCF24	2	$180,000	$0	14-7	2	$180,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$21,600
102	CC	1002700611	SALCEDO ANDRES		X																230301	12	$1,080,000	$172,800	EPS002	12	$1,080,000	$43,200	CCF24	12	$1,080,000	$43,200	14-7	12	$1,080,000	6.960%	$75,200	12	$0	$0	Si	$334,400
103	PT	5122996	SANCHEZ FAUSTO										X								230201	3	$165,000	$19,800	EPS002	3	$165,000	$0	CCF24	3	$165,000	$0	14-7	3	$165,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$19,800
104	PT	5122996	SANCHEZ FAUSTO									X									230201	27	$1,639,688	$262,400	EPS002	27	$1,639,688	$65,600	CCF24	27	$1,639,688	$65,600	14-7	27	$1,639,688	6.960%	$114,200	27	$0	$0	Si	$507,800
105	CC	79829346	TORRES ARISMENDI																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
106	CC	1000128491	TORRES DAVID																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
107	CC	1065836155	URRUCHURTO DALJER										X								231001	3	$174,000	$20,900	EPS002	3	$174,000	$0	CCF24	3	$174,000	$0	14-7	3	$174,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$20,900
108	CC	1065836155	URRUCHURTO DALJER									X									231001	27	$1,638,500	$262,200	EPS002	27	$1,638,500	$65,600	CCF24	27	$1,638,500	$65,600	14-7	27	$1,638,500	6.960%	$114,100	27	$0	$0	Si	$507,500
109	CC	1022990713	VIUCHE JOHN										X								230301	3	$180,000	$21,600	EPS002	3	$180,000	$0	CCF24	3	$180,000	$0	14-7	3	$180,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$21,600
110	CC	1022990713	VIUCHE JOHN									X									230301	27	$1,704,375	$272,700	EPS002	27	$1,704,375	$68,200	CCF24	27	$1,704,375	$68,200	14-7	27	$1,704,375	6.960%	$118,700	27	$0	$0	Si	$527,800
111	CC	1233691250	ZAMORA JHON									X									230301	30	$1,921,875	$307,500	EPS008	30	$1,921,875	$76,900	CCF24	30	$1,921,875	$76,900	14-7	30	$1,921,875	6.960%	$133,800	30	$0	$0	Si	$595,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROYECTO SALADA (27 Afiliados)																							$45,444,725	$7,264,600			$48,095,975	$1,917,100			$48,095,975	$1,917,100			$48,095,975		$3,335,300		$0	$0		$14,434,100

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: PROYECTO SENA SALADA (27 Afiliados)																						$45,444,725	$7,264,600			$48,095,975	$1,917,100			$48,095,975	$1,917,100			$48,095,975		$3,335,300		$0	$0		$14,434,100
Ciudad: CALDAS Depto: ANTIOQUIA (27 Afiliados)																						$45,444,725	$7,264,600			$48,095,975	$1,917,100			$48,095,975	$1,917,100			$48,095,975		$3,335,300		$0	$0		$14,434,100
112	CC	70519822	ALVAREZ HERNAN									X								25-14	30	$2,796,146	$447,400	EPS010	30	$2,796,146	$111,900	CCF04	30	$2,796,146	$111,900	14-7	30	$2,796,146	6.960%	$194,700	30	$0	$0	Si	$865,900
113	CC	1098776287	ALVAREZ JAVIER									X								230301	30	$2,287,500	$366,000	EPS005	30	$2,287,500	$91,500	CCF04	30	$2,287,500	$91,500	14-7	30	$2,287,500	6.960%	$159,300	30	$0	$0	Si	$708,300
114	CC	98479912	ARBOLEDA JORGE																	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF04	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
115	CC	1146434469	BERRIO CESAR									X								230201	30	$2,375,000	$380,000	EPS010	30	$2,375,000	$95,000	CCF04	30	$2,375,000	$95,000	14-7	30	$2,375,000	6.960%	$165,300	30	$0	$0	Si	$735,300
116	CC	98494692	CADAVID DIEGO									X								25-14	30	$1,925,000	$308,000	EPS002	30	$1,925,000	$77,000	CCF04	30	$1,925,000	$77,000	14-7	30	$1,925,000	6.960%	$134,000	30	$0	$0	Si	$596,000
117	CC	1001510311	CASTRILLON DAVINSON									X								230301	30	$1,582,917	$253,300	EPS040	30	$1,582,917	$63,400	CCF04	30	$1,582,917	$63,400	14-7	30	$1,582,917	6.960%	$110,200	30	$0	$0	Si	$490,300
118	CC	70582836	CHAVARRIA VICTOR									X								25-14	30	$2,290,000	$366,400	EPS010	30	$2,290,000	$91,600	CCF04	30	$2,290,000	$91,600	14-7	30	$2,290,000	6.960%	$159,400	30	$0	$0	Si	$709,000
119	CC	70003896	CHICA PEDRO		X							X								230301	14	$577,584	$92,500	EPS002	14	$577,584	$23,200	CCF04	14	$577,584	$23,200	14-7	14	$577,584	6.960%	$40,200	14	$0	$0	Si	$179,100
120	CC	1026130764	COLORADO JORGE										X							231001	1	$53,334	$6,500	EPS002	1	$53,334	$0	CCF04	1	$53,334	$0	14-7	1	$53,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,500
121	CC	1026130764	COLORADO JORGE									X								231001	29	$1,621,667	$259,500	EPS002	29	$1,621,667	$64,900	CCF04	29	$1,621,667	$64,900	14-7	29	$1,621,667	6.960%	$112,900	29	$0	$0	Si	$502,200
122	CC	8060689	DURANGO JOHN		X															231001	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF04	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	Si	$24,000
123	CC	71601081	GALEANO ELKIN									X									0	$0	$0	EPS037	30	$2,651,250	$106,100	CCF04	30	$2,651,250	$106,100	14-7	30	$2,651,250	6.960%	$184,600	30	$0	$0	Si	$396,800
124	CC	1007110797	MAZO WILTON									X								230301	30	$1,660,250	$265,700	EPS005	30	$1,660,250	$66,500	CCF04	30	$1,660,250	$66,500	14-7	30	$1,660,250	6.960%	$115,600	30	$0	$0	Si	$514,300
125	CC	1100397575	MORENO ANTONIO									X								230201	30	$2,481,667	$397,100	EPS002	30	$2,481,667	$99,300	CCF04	30	$2,481,667	$99,300	14-7	30	$2,481,667	6.960%	$172,800	30	$0	$0	Si	$768,500
126	CC	98651896	MORENO JUAN		X							X								230201	30	$2,253,906	$360,700	EPS002	30	$2,253,906	$90,200	CCF04	30	$2,253,906	$90,200	14-7	30	$2,253,906	6.960%	$156,900	30	$0	$0	Si	$698,000
127	CC	1035855744	MUÑOZ MAYRA																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
128	CC	1085177394	NARVAEZ ADONIS										X							230301	1	$43,334	$5,300	ESSC07	1	$43,334	$0	CCF04	1	$43,334	$0	14-7	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,300
129	CC	1085177394	NARVAEZ ADONIS										X							230301	1	$43,334	$5,300	ESSC07	1	$43,334	$0	CCF04	1	$43,334	$0	14-7	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,300
130	CC	1085177394	NARVAEZ ADONIS									X								230301	28	$1,736,042	$277,800	ESSC07	28	$1,736,042	$69,500	CCF04	28	$1,736,042	$69,500	14-7	28	$1,736,042	6.960%	$120,900	28	$0	$0	Si	$537,700
131	PT	3470237	NAVA JESUS		X							X								230201	30	$1,494,708	$239,200	EPS040	30	$1,494,708	$59,800	CCF04	30	$1,494,708	$59,800	14-7	30	$1,494,708	6.960%	$104,100	30	$0	$0	Si	$462,900
132	CC	71186101	QUERUBIN URIEL									X								231001	30	$1,511,625	$241,900	EPS037	30	$1,511,625	$60,500	CCF04	30	$1,511,625	$60,500	14-7	30	$1,511,625	6.960%	$105,300	30	$0	$0	Si	$468,200
133	CC	1102120990	QUINTANA DEYVIS									X								230301	30	$1,344,875	$215,200	EPS037	30	$1,344,875	$53,800	CCF04	30	$1,344,875	$53,800	14-7	30	$1,344,875	6.960%	$93,700	30	$0	$0	Si	$416,500
134	CC	71399794	ROMAN LUIS									X								230301	30	$1,511,625	$241,900	EPS010	30	$1,511,625	$60,500	CCF04	30	$1,511,625	$60,500	14-7	30	$1,511,625	6.960%	$105,300	30	$0	$0	Si	$468,200
135	CC	8037016	RUA CARLOS									X								25-14	30	$1,654,209	$264,700	EPS002	30	$1,654,209	$66,200	CCF04	30	$1,654,209	$66,200	14-7	30	$1,654,209	6.960%	$115,200	30	$0	$0	Si	$512,300
136	CC	1037623648	SANCHEZ MARIBEL									X								25-14	30	$2,305,625	$368,900	EPS010	30	$2,305,625	$92,300	CCF04	30	$2,305,625	$92,300	14-7	30	$2,305,625	6.960%	$160,500	30	$0	$0	Si	$714,000
137	CC	1115063332	SIERRA JUAN									X								230201	30	$1,553,917	$248,700	EPS010	30	$1,553,917	$62,200	CCF04	30	$1,553,917	$62,200	14-7	30	$1,553,917	6.960%	$108,200	30	$0	$0	Si	$481,300
138	CC	15458098	TABARES JORGE									X								230301	30	$1,547,875	$247,700	EPS037	30	$1,547,875	$62,000	CCF04	30	$1,547,875	$62,000	14-7	30	$1,547,875	6.960%	$107,800	30	$0	$0	Si	$479,500
139	CC	1128447142	URIBE CARLOS										X							25-14	1	$53,334	$6,500	EPS002	1	$53,334	$0	CCF04	1	$53,334	$0	14-7	1	$53,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,500
140	CC	1128447142	URIBE CARLOS		X							X								25-14	29	$1,801,667	$288,300	EPS002	29	$1,801,667	$72,100	CCF04	29	$1,801,667	$72,100	14-7	29	$1,801,667	6.960%	$125,400	29	$0	$0	Si	$557,900
141	CC	1037269807	VERA ARBEY									X								230301	30	$1,660,250	$265,700	EPS040	30	$1,660,250	$66,500	CCF04	30	$1,660,250	$66,500	14-7	30	$1,660,250	6.960%	$115,600	30	$0	$0	Si	$514,300
142	CC	88240139	VILLAMIZAR NELSON																	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF04	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
Total	**Afiliados(103)**																					$206,710,560	$33,082,000			$214,861,810	$9,182,800			$214,861,810	$8,332,800			$214,861,810		$13,201,400		$10,000,000	$500,000		$64,299,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807008957	7	EBISU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 46 95 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2568829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	159510629	9456265633	E	2023/09/14	2023/09/14	BANCOLOMBIA	0	$64,299,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				101	$33,082,000	$0	$0	$33,082,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$5,560,400	$0	$0	$5,560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$5,846,100	$0	$0	$5,846,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$14,925,200	$0	$0	$14,925,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$5,560,300	$0	$0	$5,560,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,190,000	$0	$0	$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				103	$13,201,400	$0	$0	$13,201,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	103	$13,201,400	$0	$0	$13,201,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				103	$8,332,800	$0	$0	$8,332,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	27	$1,917,100	$0	$0	$1,917,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	76	$6,415,700	$0	$0	$6,415,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				103	$9,182,800	$0	$0	$9,182,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$890,200	$0	$0	$890,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$35,300	$0	$0	$35,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$2,668,100	$0	$0	$2,668,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,047,400	$0	$0	$1,047,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$168,400	$0	$0	$168,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$918,300	$0	$0	$918,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,900	$0	$0	$46,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	$1,582,300	$0	$0	$1,582,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,636,200	$0	$0	$1,636,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$189,700	$0	$0	$189,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$300,000	$0	$0	$300,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**103**	**$64,299,000**	**$0**	**$0**	**$64,299,000**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807008957	7	EBISU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 46 95 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2568829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	162093789	9456300730	Y	2023/09/14	2023/09/15	BANCOLOMBIA	1	$566,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROYECTO BOITA (7 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,120,000		$565,600		$0	$0		$565,600
Centro de Trabajo: PROYECTO BOITA (7 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,120,000		$565,600		$0	$0		$565,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,120,000		$565,600		$0	$0		$565,600
1	CC	5820626	BERNAL CARLOS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1010228105	GALLEGO ELTON																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	80035331	SANABRIA OSCAR																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	1012413543	SANCHEZ ANGIE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	1010175874	SOLANO MANUEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
6	CC	79797289	VASQUEZ CARLOS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	11188061	VELANDIA FRANK																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	**Afiliados(7)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,120,000		$565,600		$0	$0		$565,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807008957	7	EBISU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 46 95 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2568829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	162093789	9456300730	Y	2023/09/14	2023/09/15	BANCOLOMBIA	1	$566,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$565,600	$700	$0	$566,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	7	$565,600	$700	$0	$566,300
TOTAL				**7**	**$565,600**	**$700**	**$0**	**$566,300**

Certificado de Aportes

Se certifica que FRANK LEANDRO VELANDIA BARRIOS identificado(a) con CC 11188061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RYM FERRO ILUMINACIONES SAS NI 900142510

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9455959075	141285494	E	2023-09-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9455959075	141285494	E	2023-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	
9455959075	141285494	E	2023-09-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	
9455959075	141285494	E	2023-09-05	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	
9455959075	141285494	E	2023-09-05	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30																	
9455959075	141285494	E	2023-09-05	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30																	

Este certificado se expide el día 2023-09-29 a las 12:09.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900078105-5	IGNACIO COTTE Y CIA SAS	AV. 20 # 86-48 OFICINA 104	8012106	ignaciocotte@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70537749	$4.336.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	502.800	0		0		0	0	0	0	502.800	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	24.300	0		0		0	0	0	0	24.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	24.300	0		0		0	0	0	0	24.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	730.700	0	0	0	0	0	0		730.700	4
231001	Colfondos	800227940-6	928.000	0	0	0	0	0	0		928.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	809.100	0	0	0	0	0	0		809.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	542.000				542.000	0	0	542.000			5.420	542.000	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	663.400	0	0	663.400	12

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900078105-5	IGNACIO COTTE Y CIA SAS		AV. 20 # 86-48 OFICINA 104	8012106	ignaciocotte@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70537749	$4.336.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	663.400	663.400
Pensión	3	2.467.800	2.467.800
Riesgos Laborales	1	542.000	542.000
CCF	1	663.400	663.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.336.600	4.336.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900078105-5	IGNACIO COTTE Y CIA SAS		AV. 20 # 86-48 OFICINA 104	8012106	ignaciocotte@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70537749	$4.336.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020783922	COTTE MARIN JULIAN DAVID	1	0			S																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	11336117	COTTE AVENDAÑO SEGUNDO IGNACIO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	25453375	MARIN ALFARO ARCELIA	1	0			S																	25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-23	1.650.000	1	8.700	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
4	CC	34943853	LOPEZ GOEZ ENIT DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	80149151	JIMENEZ SOSA MILTON JAVIER	1	0			S																	231001	2.350.000	376.000	0	0	0	0	EPS008	2.350.000	94.000	14-23	2.350.000	1	12.300	CCF24	2.350.000	94.000	0	0	0	0	0
6	CC	80212051	GARNICA GUTIERREZ MANUEL ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
7	CC	93061962	LEON AVILA YAMID	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
8	CC	79973795	BARRERA BERNAL PABLO EMILIO	1	0			S																	231001	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-23	1.650.000	5	114.900	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
9	CC	1010119693	COTTE MARIN MARIA CAMILA	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
10	CC	79698480	BARRERA BERNAL JAVIER	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
11	CC	79218594	MEDRANDA RODRIGUEZ FERNANDO	1	0			S		X															25-14	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS017	606.667	24.300	14-23	606.667	5	42.300	CCF24	606.667	24.300	0	0	0	0	0
12	CC	1007510891	GUATIVA BOHORQUEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S	X	X															230301	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS037	606.667	24.300	14-23	606.667	5	42.300	CCF24	606.667	24.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010228105	ELTON JOHN GALLEGO GALLEGO	carrera 103 #74 74 sur	4238184	elton.jhongallego@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	I	13/09/2023	70209834	$439.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	9	1.500	0	146.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	9	1.900	0	187.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	80.800				80.800	9	800	81.600			808	81.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	23.200	9	300	23.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	146.500
Pensión	1	185.600	187.500
Riesgos Laborales	1	80.800	81.600
CCF	1	23.200	23.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	434.600	439.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010228105	ELTON JOHN GALLEGO GALLEGO		carrera 103 #74 74 sur	4238184	elton.jhongallego@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	I	13/09/2023	70209834	$439.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010228105	GALLEGO GALLEGO ELTON JOHN	57	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	5820626	CARLOS ALBERTO BERNAL ESCOBAR	CARRERA 32A 25B-38	7927845	carlos_bernal28@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	11/09/2023	70837556	$913.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	368.900	0		0		0	0	0	0	368.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	472.200	0	0	0	0	0	0		472.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	71.900				71.900	0	0	71.900			719	71.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	368.900	368.900
Pensión	1	472.200	472.200
Riesgos Laborales	1	71.900	71.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	913.000	913.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	5820626	CARLOS ALBERTO BERNAL ESCOBAR	CARRERA 32A 25B-38	7927845	carlos_bernal28@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	11/09/2023	70837556	$913.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	5820626	BERNAL ESCOBAR CARLOS ALBERTO	57	0			N																	230301	2.950.744	472.200	0	0	0	0	EPS005	2.950.744	368.900	14-23	2.950.744	3	71.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1012413543
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGIE HASBLEIDY SANCHEZ PABON
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 82 F 60 A 10 SUR	TELÉFONO:	7964597
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2009 - SDIS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7891621142**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		85905698

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 300.800
SUBTOTAL:			1	**$ 300.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 235.000
SUBTOTAL:			1	**$ 235.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 9.900
SUBTOTAL:			1	**$ 9.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 545.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 545.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1012363273
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YURY ANDREA ROA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 88C # 69C-20 SUR	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**2330400577**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/10/18	0	$ 0	$ 121.300
2023/10/19	1	$ 200	$ 121.500
2023/10/20	2	$ 400	$ 121.700
2023/10/23	5	$ 700	$ 122.000
2023/10/24	6	$ 900	$ 122.200
2023/10/25	7	$ 1.100	$ 122.400

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 68.100
SUBTOTAL:			1	**$ 68.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 53.200
SUBTOTAL:			1	**$ 53.200**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 121.300**

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900078105-5	IGNACIO COTTE Y CIA SAS	AV. 20 # 86-48 OFICINA 104	8012106	ignaciocotte@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70537749	$4.336.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	502.800	0		0		0	0	0	0	502.800	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	24.300	0		0		0	0	0	0	24.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	24.300	0		0		0	0	0	0	24.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	730.700	0	0	0	0	0	0		730.700	4
231001	Colfondos	800227940-6	928.000	0	0	0	0	0	0		928.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	809.100	0	0	0	0	0	0		809.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	542.000				542.000	0	0	542.000			5.420	542.000	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	663.400	0	0	663.400	12

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900078105-5	IGNACIO COTTE Y CIA SAS		AV. 20 # 86-48 OFICINA 104	8012106	ignaciocotte@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70537749	$4.336.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	663.400	663.400
Pensión	3	2.467.800	2.467.800
Riesgos Laborales	1	542.000	542.000
CCF	1	663.400	663.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.336.600	4.336.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900078105-5	IGNACIO COTTE Y CIA SAS		AV. 20 # 86-48 OFICINA 104	8012106	ignaciocotte@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70537749	$4.336.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020783922	COTTE MARIN JULIAN DAVID	1	0			S																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	11336117	COTTE AVENDAÑO SEGUNDO IGNACIO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	25453375	MARIN ALFARO ARCELIA	1	0			S																	25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-23	1.650.000	1	8.700	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
4	CC	34943853	LOPEZ GOEZ ENIT DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	80149151	JIMENEZ SOSA MILTON JAVIER	1	0			S																	231001	2.350.000	376.000	0	0	0	0	EPS008	2.350.000	94.000	14-23	2.350.000	1	12.300	CCF24	2.350.000	94.000	0	0	0	0	0
6	CC	80212051	GARNICA GUTIERREZ MANUEL ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
7	CC	93061962	LEON AVILA YAMID	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
8	CC	79973795	BARRERA BERNAL PABLO EMILIO	1	0			S																	231001	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-23	1.650.000	5	114.900	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
9	CC	1010119693	COTTE MARIN MARIA CAMILA	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
10	CC	79698480	BARRERA BERNAL JAVIER	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
11	CC	79218594	MEDRANDA RODRIGUEZ FERNANDO	1	0			S		X															25-14	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS017	606.667	24.300	14-23	606.667	5	42.300	CCF24	606.667	24.300	0	0	0	0	0
12	CC	1007510891	GUATIVA BOHORQUEZ DIEGO ALEXANDER	1	0			S	X	X															230301	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS037	606.667	24.300	14-23	606.667	5	42.300	CCF24	606.667	24.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que ALFONSO URIBE S. Y CIA S.A. identificado con NI 830066664 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para ALFONSO URIBE SARDIÑA identificado con CC 79154597:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9455954444	E	2023/08	2023/09/06	143532387	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$4,359,600	$121,100	$363,300
9455954444	E	2023/08	2023/09/06	143532387	ARP	14-7	SEGUROS BOLIVAR								X								30	6.96%	$1,685,800	$121,100	$363,300
9455954444	E	2023/08	2023/09/06	143532387	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO								X								30	4%	$968,800	$121,100	$363,300
9455954444	E	2023/08	2023/09/06	143532387	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								X								30	3%	$726,600	$121,100	$363,300
9455954444	E	2023/08	2023/09/06	143532387	SENA	PASENA	SENA								X								30	2%	$484,400	$121,100	$363,300
9455954444	E	2023/09	2023/09/06	143532387	EPS	EPS005	SANITAS								X								30	12.5%	$3,027,500	$121,100	$363,300

Certificado generado el 2023-09-06 a las 02:10

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79797289	CARLOS ANDRES VASQUEZ QUINTERO	CALLE 128 B 77 31 APT 702 SOTILEZA	3061783	cavqarquitectura@outlook.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	05/10/2023	71477327	$812.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	350.000	0		0		0	0	0	0	350.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	448.000	0	0	0	0	0	0		448.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350.000	350.000
Pensión	1	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	812.700	812.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	79797289	CARLOS ANDRES VASQUEZ QUINTERO	CALLE 128 B 77 31 APT 702 SOTILEZA	3061783	cavqarquitectura@outlook.es	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-09	2023-09	I	05/10/2023	71477327	$812.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	79797289	VASQUEZ QUINTERO CARLOS ANDRES	59	0			N																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	350.000	14-23	2.800.000	1	14.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	OSCAR ARTURO SANABRIA GALINDO	**NIT:**	80035331
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2023
Número de Radicación:	71034062	**Total a pagar:**	$337,900
Fecha de vencimiento:	08/09/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	28/09/2023	**Número de Administradoras:**	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	2012822765
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$189,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$148,200
						$337,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 71034062, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SOPORTE DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTAS

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900435908-4	ORR CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 73 NO 20A - 80	3016170843	auxafiliacionesgruposer@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADRIANA GOMEZ / 005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	06/09/2023	70687687	$8.104.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	371.600	0		0		0	1	500	0	372.100	14
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	62.000	0		0		0	1	100	0	62.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	6.300	0		0		0	1	100	0	6.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	48.000	0		0		0	1	100	0	48.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	510.300	0		0		0	1	600	0	510.900	14
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.600	0		0		0	1	100	0	1.700	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.101.400	0	0	0	0	1	1.300	0	1.102.700	12
230301	Porvenir	800224808-8	2.882.100	0	0	0	0	1	3.200	0	2.885.300	22
231001	Colfondos	800227940-6	12.400	0	0	0	0	1	100	0	12.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	1	300	0	185.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.820.500				1.820.500	1	2.000	1.822.500			18.205	1.822.500	37

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.046.200	1	1.200	1.047.400	37

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900435908-4	ORR CONSTRUCCIONES SAS		CALLE 73 NO 20A - 80	3016170843	auxafiliacionesgruposer@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADRIANA GOMEZ	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	06/09/2023	70687687	$8.104.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.046.200	1.047.800
Pensión	4	4.181.500	4.186.400
Riesgos Laborales	1	1.820.500	1.822.500
CCF	1	1.046.200	1.047.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	8.094.400	8.104.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900435908-4	ORR CONSTRUCCIONES SAS		CALLE 73 NO 20A - 80	3016170843	auxafiliacionesgruposer@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADRIANA GOMEZ	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	06/09/2023	70687687	$8.104.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cdenc. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014215912	CANTILLO CAMARGO EDUARDO SEGUNDO	1	0			S		X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
2	CC	1024465767	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1030685569	OSORIO SANTOFIMIO XIMENA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-25	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	1031157984	PARRA LEON WILFER ALEXANDER	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
5	CC	1033761628	ROCHA CASTRO JORGE LUIS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1068584880	MONTEROZA MUÑOZ MAURY DE JESUS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1026557281	RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL MARIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	1066516451	DIAZ LOPEZ LUIS DAVID	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	1070822717	GONZALEZ BENITEZ JOHN ALEX	1	0			S		X															231001	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
10	CC	1073511850	CUERVO GUERRERO CHRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
11	CC	11038749	ARGEL CONDE ARGEMIRO JOSE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	1104426517	ALEAN HERNANDEZ ALEXIS DE JESUS	1	0			S		X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
13	CC	19499339	LOPEZ DELGADO ELVER DARIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	1051737892	SANTANA OBREGON CARLOS	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
15	CC	91136364	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	1052993710	PAYARES PEÑA LEONEL FARID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	1069899439	BELTRAN BERNAL CRISTIAN FABIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	15076162	ALMANZA GUTIERREZ JOSE MANUEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	7937803	CAICEDO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
20	CC	9431464	MORA MEZA EDER MIGUEL	1	0			S	X																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS017	657.334	26.300	14-25	657.334	5	45.800	CCF24	657.334	26.300	0	0	0	0	0
21	CC	1066510362	DIAZ LOPEZ VICTOR ANTONIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
22	CC	1043325320	HERRERA PEREZ RAFAEL ALBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23	CC	1082479758	JIMENEZ RANGEL CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
24	CC	1005474062	CUADRO BANQUEZ LUIS GUILLERMO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
25	CC	1079990693	PINEDO MORALES DAIRO JOSE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
26	CC	1101125306	RAMOS VERGARA FRANCISCO JAVIER	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS008	116.000	4.700	14-25	116.000	5	8.100	CCF24	116.000	4.700	0	0	0	0	0
27	CC	1051739751	SANTANA ARRIETA NEMESIO	1	0			S		X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
28	CC	73577362	ROCHA GARCIA OVIDIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
29	CC	1007713132	VEGA ACOSTA YOISER ANTONIO	1	0			S	X	X															231001	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
30	CC	1101881536	GARCIA JULIO JHONATAN	1	0			S	X	X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
31	CC	1023931435	CENTENO SAYAS YEIVER ENRIQUE	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
32	CC	19612422	OSORIO GONZALEZ JORGE ELIECER	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS010	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
33	CC	1002424363	RODRIGUEZ CORREA CARLOS JULIO	1	0			S	X																230301	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS002	348.000	14.000	14-25	348.000	5	24.300	CCF24	348.000	14.000	0	0	0	0	0
34	CC	1051743928	CENTENO POLO JOSE LUIS	1	0			S	X																230201	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS002	348.000	14.000	14-25	348.000	5	24.300	CCF24	348.000	14.000	0	0	0	0	0
35	CC	19768600	DELGADO RAAD ELIO DE JESUS	1	0			S	X																230201	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS005	348.000	14.000	14-25	348.000	5	24.300	CCF24	348.000	14.000	0	0	0	0	0
36	CC	7379653	VARGAS FLOREZ EMIRO ANTONIO	1	0			S	X																230201	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS002	232.000	9.300	14-25	232.000	5	16.200	CCF24	232.000	9.300	0	0	0	0	0
37	CC	1049319429	CHACON DE HOYOS SANTOS FERMIN	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	4.700	14-25	116.000	5	8.100	CCF24	116.000	4.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79109506	2	HECTOR JULIO UMBA FUQUENE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 186 D N 19 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6087976	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	140041794	9455940190	E	2023/09/04	2023/09/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,838,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010095666	BUELVAS DE LA ROSA EDUAR JOSE																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1193557343	CHAVERRA VALOYES WALNER ANDRES																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	8115695	CHAVERRA CUESTA YAMIL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1003713942	DIAZ GUZMAN EDGAR JOSE		X																230301	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF21	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0	Si	$179,600
5	CC	1003713943	DIAZ GUZMAN JOSE ANGEL	X	X																230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF21	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
6	CC	1003713940	DIAZ GUZMAN LUIS ALFREDO	X	X																230301	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF21	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	Si	$72,000
7	CC	1068659068	DIAZ GUZMAN NESTOR LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	1068667747	GUERRA CASARRUBIA CARLOS MARIO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	1193150966	IBAÑEZ JIMENEZ YORLIS ALBERTO	X	X																230301	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF21	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	Si	$72,000
10	CC	1068669238	SALGADO SALLA OCTAVIO SEGUNDO		X																230301	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF21	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
11	CC	1047452240	SIERRA GONZALEZ JOHAN XAVIER		X																230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF21	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
12	CC	1007734507	SUAREZ BRUNO RAUL MANUEL	X																	230301	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF21	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	Si	$60,100
13	CC	1000182035	UMBA DELGADILLO JOSE ALEJANDRO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(13)**																					$9,164,002	$1,466,600			$9,164,002	$366,800			$9,164,002	$366,800			$9,164,002	$638,600		$0	$0		$2,838,800

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79109506	2	HECTOR JULIO UMBA FUQUENE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 186 D N 19 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6087976	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	140041794	9455940190	E	2023/09/04	2023/09/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,838,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$1,466,600	$0	$0	$1,466,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,281,000	$0	$0	$1,281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$638,600	$0	$0	$638,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$638,600	$0	$0	$638,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$366,800	$0	$0	$366,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	13	$366,800	$0	$0	$366,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$366,800	$0	$0	$366,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$116,100	$0	$0	$116,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$156,300	$0	$0	$156,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$94,400	$0	$0	$94,400
TOTAL				**13**	**$2,838,800**	**$0**	**$0**	**$2,838,800**

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	820003639-4	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES ESPECIALES CAC	CARRERA 73 A No. 3-22	3183514704	inconstruespeciales@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70819561	$5.595.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	182.600	0		0		0	0	0	0	182.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	214.400	0		0		0	0	0	0	214.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	134.000	0		0		0	0	0	0	134.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	163.800	0		0		0	0	0	0	163.800	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.399.800	0	0	0	0	0	0		1.399.800	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.083.200	0	0	0	0	0	0		1.083.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.261.300				1.261.300	0	0	1.261.300			12.613	1.261.300	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	724.800	0	0	724.800	15

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	820003639-4	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES ESPECIALES	CARRERA 73 A No. 3-22	3183514704	inconstruespeciales@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70819561	$5.595.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	754.800	754.800
Pensión	3	2.854.200	2.854.200
Riesgos Laborales	1	1.261.300	1.261.300
CCF	1	724.800	724.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.595.100	5.595.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	820003639-4	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES ESPECIALES SAS		CARRERA 73 A No. 3-22	3183514704	inconstruespeciales@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					15	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70819561	$5.595.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1010177705	CUBILLOS PINZON CARLOS JULIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1012389565	SUAREZ PINZON JOSE DAVID	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1019019872	CACERES ALBARRACIN JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1022322715	MASMELA MOYA JOHN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
5	CC	79723703	JIMENEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE	1	0			S							X										25-14	1.410.000	225.600	0	0	0	0	EPS017	1.410.000	56.400	14-11	1.410.000	5	98.200	CCF24	1.410.000	56.400	0	0	0	0	0
6	CC	79827629	MASMELA MOYA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
7	CC	1079186249	FLOREZ ORTIZ DUVAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
8	CC	1079186249	FLOREZ ORTIZ DUVAN SEBASTIAN	1	0			S										X							230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS017	77.334	0	14-11	77.334	5	0	CCF24	77.334	0	0	0	0	0	0
9	CC	11252638	UBAQUE CASTILLO JOSE BENJAMIN	1	1			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
10	CC	1126423279	ROPERO ASCANIO EDWIN	1	0			S	X																230301	889.334	142.300	0	0	0	0	EPS008	889.334	35.600	14-11	889.334	5	61.900	CCF24	889.334	35.600	0	0	0	0	0
11	CC	80209441	OLARTE VEGA WILMER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	80801383	RIVERA BAUTISTA JHON MARIO	1	0			S																	230301	750.000	120.000	0	0	0	0	EPS010	750.000	30.000	14-11	750.000	5	52.200	CCF24	750.000	30.000	0	0	0	0	0
13	CC	80801383	RIVERA BAUTISTA JHON MARIO	1	0			S											X						230301	750.000	120.000	0	0	0	0	EPS010	750.000	30.000	14-11	750.000	5	0	CCF24	750.000	0	0	0	0	0	0
14	CC	1022930774	ROMERO FRANCO MILTON DAVID	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	1033791035	CUCHIMBA PACHONGO MAICOL JAVIER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	1006865637	REAL CRISTIAN DAVID	1	0			S		X															230301	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS017	348.000	14.000	14-11	348.000	5	24.300	CCF24	348.000	14.000	0	0	0	0	0
17	CC	1018447354	LEIVA RAGUA ANDRES CAMILO	1	0			S							X										230301	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS017	1.250.000	50.000	14-11	1.250.000	5	87.000	CCF24	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900558342	4	CONCREMACK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONCREMACK	CRA 15 NO 106- 52	VILLAVICENCIO-META	2150482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	34363337	9456069957	E	2023/09/11	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$41,718,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CONCREMACK (37 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																														
1	CC	80761291	CASTRO JULIO										X								25-14	2	EPS010	2	CCF21	2	14-7	2	0.000%	2	Si
2	CC	1073504363	QUINTERO DIEGO											X							230301	1	EPS017	1	CCF21	1	14-7	1	0.000%	1	Si
3	CC	1073504363	QUINTERO DIEGO													L					230301	5	EPS017	5	CCF21	5	14-7	5	0.000%	5	Si
4	CC	1016005356	RINCON WILBER											X							231001	2	EPS005	2	CCF21	2	14-7	2	0.000%	2	Si
5	CC	1010180178	RIVAS YAMID										X								230201	2	EPS010	2	CCF21	2	14-7	2	0.000%	2	Si

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (37 Afiliados)																															
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)																															
6	CC	19446625	ROBLES SEVERO		X							X									230201	26	EPS037	26	CCF34	26	14-7	26	6.960%	26	Si
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																															
7	CC	79817270	TRUJILLO FERNANDO									X									230201	30	EPS017	30	CCF43	30	14-7	30	6.960%	30	Si
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (35 Afiliados)																															
8	CC	79247512	ALVAREZ JOSE									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
9	CC	1000363280	ARIZA YENI									X									231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
10	CC	11221131	BARRIOS ELBER									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
11	CC	1016075940	BERNAL EDGAR	X								X									230301	28	EPS008	28	CCF21	28	14-7	28	6.960%	28	Si
12	CC	1101440097	CAMACHO HUGO									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
13	CC	1032396339	CARDENAS JOSE									X									230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	No
14	CC	80761291	CASTRO JULIO									X									25-14	28	EPS010	28	CCF21	28	14-7	28	6.960%	28	Si
15	CC	1023872560	CRISTANCHO YEIMMY	X	X																230301	1	EPS010	1	CCF21	1	14-7	1	6.960%	1	Si
16	CC	93411742	ECHEVERRY JENSON									X									231001	30	EPS002	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
17	CC	79503267	ESCOBAR DIEGO									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
18	CC	1085036838	GARCIA CRISTIAN									X									230301	30	EPS041	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
19	CC	1121915917	GUALTEROS ARLEY									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
20	CC	1070918387	HURTADO ESDRUAL									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
21	CC	1013676598	LIZ LUIS									X									230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
22	CC	80664090	LOPEZ WILINTON									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
23	CC	1000121633	MARTINEZ MAIKY									X									230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
24	CC	79515469	MEJIA HENRY									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
25	CC	52382760	MONSALVE NIDIA																		25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
26	CC	1094243274	MONTAÑEZ MIGUEL									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
27	CC	80426137	MUÑOZ JOSE									X									25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
28	CC	1016022406	MURGAS EDER									X									230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
29	CC	1078579880	MURILLO JUAN									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
30	CC	1121913025	PALACIO JOSE									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
31	CC	1067963574	PERNETT ANDRES									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
32	CC	1054555990	PRIETO ANGELO									X									230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
33	CC	79698411	PRIETO LUIS									X									25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
34	CC	1073504363	QUINTERO DIEGO									X									230301	24	EPS017	24	CCF21	24	14-7	24	6.960%	24	Si
35	CC	80208304	QUIROGA JOSE									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
36	CC	1016005356	RINCON WILBER									X									231001	28	EPS005	28	CCF21	28	14-7	28	6.960%	28	Si
37	CC	1010180178	RIVAS YAMID									X									230201	28	EPS010	28	CCF21	28	14-7	28	6.960%	28	Si
38	CC	1116795611	RODRIGUEZ ALEXANDER									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
39	CC	80778043	ROJAS DUVIER									X									230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
40	CC	1098723063	SANCHEZ CARLOS									X									231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
41	CC	79787443	SOSA LUIS									X									230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
42	CC	80010509	VENEGAS JORGE									X									230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
Total	**Afiliados(37)**																														

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900558342	4	CONCREMACK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONCREMACK	CRA 15 NO 106- 52	VILLAVICENCIO-META	2150482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	34363337	9456069957	E	2023/09/11	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$41,718,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$20,886,800	$0	$0	$20,886,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$2,184,000	$0	$0	$2,184,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$4,522,400	$0	$0	$4,522,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$7,510,900	$0	$0	$7,510,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$6,669,500	$0	$0	$6,669,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$8,885,700	$0	$0	$8,885,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	37	$8,885,700	$0	$0	$8,885,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				37	$5,203,300	$0	$0	$5,203,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	35	$4,912,000	$0	$0	$4,912,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$195,100	$0	$0	$195,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$96,200	$0	$0	$96,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				37	$6,147,400	$0	$0	$6,147,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$1,101,300	$0	$0	$1,101,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$1,907,200	$0	$0	$1,907,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$772,900	$0	$0	$772,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$225,400	$0	$0	$225,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$81,500	$0	$0	$81,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$419,600	$0	$0	$419,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,639,500	$0	$0	$1,639,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$357,100	$0	$0	$357,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$357,100	$0	$0	$357,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$238,100	$0	$0	$238,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$238,100	$0	$0	$238,100
TOTAL				**37**	**$41,718,400**	**$0**	**$0**	**$41,718,400**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-19, 07:11:34 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1057657136

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 19/09/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ROAD BUILDING SAS	**Nombre Sucursal**	11	**Código Sucursal**	1
Documento	NI900821078	**Dirección**	CL 65 SUR #92 - 50 CASA 05 ALICANTE 3		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8060670		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	RODRIGUEZ ROJAS JUAN RENE	**Identificación**	CC 79546356		
Total Afiliados	23	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000722787	IVAN SEBASTIAN CIFUENTES GUTIERREZ	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.082.667	$ 173.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.082.667	$ 43.400	6,960	$ 1.082.667	$ 75.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.082.667	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.500
CC 1010029137	JHON MAURICIO CIFUENTES GUTIERREZ	01	00	X																0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.082.667	$ 173.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.082.667	$ 43.400	6,960	$ 1.082.667	$ 75.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.082.667	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.500
CC 1012361870	CRISTIAN ALEXANDER CAMELO ROSSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1012436533	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1013669495	JOHAN FERNANDO VERA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1018485351	DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1024469602	FERNEY DARIO MEDINA CIFUENTES	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	6,960	$ 850.667	$ 59.300	(CCF21) CAFAM	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 1024516278	DEYBY ALEXANDER TORRES SAIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1026580632	JUAN MANUEL CABALLERO TIQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032371887	JOHN JAIRO HERNANDEZ HERNANDEZ	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 464.000	$ 74.300	(EPS010) EPS SURA	$ 464.000	$ 18.600	6,960	$ 464.000	$ 32.300	(CCF21) CAFAM	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 1033813401	JHON SEBASTIAN FORERO GARCIA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF21) CAFAM	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1110588583	CHAYANE JURADO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF21) CAFAM	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 15621639	CARLOS DIDIER PADILLA LOPEZ	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.082.667	$ 173.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.082.667	$ 43.400	6,960	$ 1.082.667	$ 75.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.082.667	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.500
CC 73164643	JOSE GREGORIO HERNANDEZ VELOZA	01	00	X																0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.082.667	$ 173.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.082.667	$ 43.400	6,960	$ 1.082.667	$ 75.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.082.667	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.500
CC 79255905	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669982	LUIS ARTURO CASAS	01	00		X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF21) CAFAM	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 79702000	ANTONIO JIMENEZ CASTELLANOS	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	(EPS010) EPS SURA	$ 502.667	$ 20.200	6,960	$ 502.667	$ 35.000	(CCF21) CAFAM	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 79767980	JESUS DAVID RICAURTE MAYORGA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF21) CAFAM	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 19/09/2023 **Empresa NI900821078 ROAD BUILDING SAS** **Planilla Nro: 1057657136** **Periodo Cotización: agosto de 2023** **Periodo Servicio: septiembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79811781	WILLIAN GIOVANNI PEÑA PINILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79812948	GONZALO ROA SOLER	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79910706	JAIRO ALBERTO BUITRAGO REYES	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93421345	NELSON RICAURTE MAYORGA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF21) CAFAM	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 19.178.670	$ 19.178.670	$ 19.178.670	$ 19.178.670	$ 3.069.200	$ 768.000	$ 1.335.900	$ 768.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.941.100	$ 7.100	$ 5.948.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901564636-2	PROBOMBAS DE COLOMBIA SAS	CL 60 SUR 68 B 39 TO 4 OF 2002	3209127898	probombasdecolombia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70419057	$1.703.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	188.800	0		0		0	0	0	0	188.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	563.200	0	0	0	0	0	0		563.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	377.600	0	0	0	0	0	0		377.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	409.600				409.600	0	0	409.600			4.096	409.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	117.600	0	0	117.600	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	235.200	235.200
Pensión	2	940.800	940.800
Riesgos Laborales	1	409.600	409.600
CCF	1	117.600	117.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.703.200	1.703.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901564636-2	PROBOMBAS DE COLOMBIA SAS		CL 60 SUR 68 B 39 TO 4 OF 2002	3209127898	probombasdecolombia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					5	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70419057	$1.703.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1002142741	PADILLA PALMA DEYKER ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0
2	CC	1075222197	MURCIA SALCEDO CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0
3	CC	1140840551	AVILA DELGADO NEIDER	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF22	1.200.000	24.000	0	0	0	0	0
4	PT	4251121	ZAPATA FARFAN EFREN JESUS	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF22	1.200.000	24.000	0	0	0	0	0
5	PT	6679291	GONZALEZ GONZALEZ ABRAHAM JOSE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830109368	6	ANILLOS DE SEGURIDAD LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PILA 10 OBRA BOITA	CARRERA 21 A 159 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8131137	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	169983028	9456424286	E	2023/09/15	2023/09/19	BANCO AV VILLAS	4	$1,191,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1005824808	ALVAREZ DAVID	X																	230301	13	$502,667	$80,500	EPS008	13	$502,667	$20,200	CCF22	13	$502,667	$20,200	14-4	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0	Si	$155,900
2	CC	80129885	MUÑOZ WILLIAM																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1044616563	ORTEGA ARNOLDO	X																	230301	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF22	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0	Si	$167,800
4	CC	1003505380	RIAÑO CARLOS	X																	230301	12	$464,000	$74,300	EPS037	12	$464,000	$18,600	CCF22	12	$464,000	$18,600	14-4	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
5	PT	6422720	ROMERO JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(5)**																						$3,828,001	$612,700			$3,828,001	$153,300			$3,828,001	$153,300			$3,828,001	$266,600		$0	$0		$1,185,900

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830109368	6	ANILLOS DE SEGURIDAD LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PILA 10 OBRA BOITA	CARRERA 21 A 159 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8131137	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	169983028	9456424286	E	2023/09/15	2023/09/19	BANCO AV VILLAS	4	$1,191,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$612,700	$2,700	$0	$615,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$612,700	$2,700	$0	$615,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$266,600	$1,200	$0	$267,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$266,600	$1,200	$0	$267,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$153,300	$700	$0	$154,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$153,300	$700	$0	$154,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$153,300	$900	$0	$154,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$20,200	$100	$0	$20,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$300	$0	$46,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$40,300	$200	$0	$40,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTAL				**5**	**$1,185,900**	**$5,500**	**$0**	**$1,191,400**

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900454423-5	SEBCO SAS	TV 42 #6 - 39	3244887239	sebcosas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	06/09/2023	70690494	$17.213.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	396.800	0		0		0	0	0	0	396.800	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	323.600	0		0		0	0	0	0	323.600	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	248.000	0		0		0	0	0	0	248.000	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	429.000	0		0		0	0	0	0	429.000	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	418.000	0		0		0	0	0	0	418.000	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	100.900	0		0		0	0	0	0	100.900	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	232.000	0		0		0	0	0	0	232.000	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.515.500	0	0	0	0	0	0		1.515.500	8
230301	Porvenir	800224808-8	5.364.500	0	0	0	0	0	0		5.364.500	30
231001	Colfondos	800227940-6	556.900	0	0	0	0	0	0		556.900	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.612.800	0	0	0	0	0	0		1.612.800	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.748.000				3.748.000	0	0	3.748.000			37.480	3.748.000	49

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	441.400	0	0	441.400	10
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.733.000	0	0	1.733.000	39

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900454423-5	SEBCO SAS		TV 42 #6 - 39	3244887239	sebcosas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	06/09/2023	70690494	$17.213.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	2.241.100	2.241.100
Pensión	4	9.049.700	9.049.700
Riesgos Laborales	1	3.748.000	3.748.000
CCF	2	2.174.400	2.174.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	17.213.200	17.213.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	900454423-5	SEBCO SAS		TV 42 #6 - 39	3244887239	sebcosas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					49	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-09	2023-08	E	06/09/2023	70690494	$17.213.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000118050	DELGADO OLIVEROS MARLON DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1003000320	VALERIO SUAREZ JOSE TOMAS	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1003005192	PEREZ BUELVAS ALEXIS JOSE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1017136714	NUÑEZ MURGAS EDUARDO JOSE	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1030579521	MONCAYO MEJIA ALVARO RICARDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1067849781	GONZALEZ PEREZ JORGE ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	18615903	PEREZ GARCIA JOSE EDUVIER	1	0			S	X																230301	135.940	21.800	0	0	0	0	EPS002	135.940	5.500	14-11	135.940	5	9.500	CCF22	135.940	5.500	0	0	0	0	0
8	CC	1063161811	MARTINEZ LUGO WILBER ENRIQUE	1	0			S																	230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS041	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF22	116.000	4.700	0	0	0	0	0
9	CC	1063161811	MARTINEZ LUGO WILBER ENRIQUE	1	0			S															27		230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS041	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	0	CCF22	1.044.000	0	0	0	0	0	0
10	CC	1103738784	PATERNINA DEL TORO SEBASTIAN	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	1065009760	TIRADO PEREZ ANDREY DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	9877122	CARRILLO BORNACELLY FARID JOSE	1	0			S																	230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	72.700	CCF22	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
13	CC	9877122	CARRILLO BORNACELLY FARID JOSE	1	0			S									X								230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS037	116.000	0	14-11	116.000	5	0	CCF22	116.000	0	0	0	0	0	0
14	CC	1002303814	PADILLA ARAUJO JESUS DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	79978332	COLMENARES JHON FREDY	1	0			S	X																230201	951.576	152.300	0	0	0	0	EPS002	951.576	38.100	14-11	951.576	5	66.300	CCF22	951.576	38.100	0	0	0	0	0
16	CC	1006095350	ACEVEDO RIVERA MAURICIO	1	0			S																	230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS017	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	72.700	CCF22	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
17	CC	1006095350	ACEVEDO RIVERA MAURICIO	1	0			S									X								230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS017	116.000	0	14-11	116.000	5	0	CCF22	116.000	0	0	0	0	0	0
18	CC	73561755	CONEO ALTAMAR EVERTO	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS002	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
19	CC	1099209176	RUIZ FRANCO ALEXSANDER	1	0			S																	230301	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS041	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
20	CC	1005703426	ROJAS SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
21	CC	1106893017	VILLALBA DIAZ EISENHOWER JOSUE LEONARDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
22	CC	1052997999	BURGOS DIAZ LIBARDO ANTONIO	1	0			S		X															230301	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS002	309.334	12.400	14-11	309.334	5	21.600	CCF07	393.112	15.800	0	0	0	0	0
23	CC	19955051	CARMONA PEREZ MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
24	CC	70421565	GALEANO VELASQUEZ JAIME ALBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
25	CC	1005703431	ROJAS JUAN CAMILO	1	0			S																	231001	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS037	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF22	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
26	CC	1005703431	ROJAS JUAN CAMILO	1	0			S									X								231001	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS037	77.334	0	14-11	77.334	5	0	CCF22	77.334	0	0	0	0	0	0
27	CC	1001344536	INFANTE TIGA ROSO ALDRUBAL	1	0			S																	230301	928.000	148.500	0	0	0	0	EPS005	928.000	37.200	14-11	928.000	5	64.600	CCF22	928.000	37.200	0	0	0	0	0
28	CC	1001344536	INFANTE TIGA ROSO ALDRUBAL	1	0			S									X								230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS005	232.000	0	14-11	232.000	5	0	CCF22	232.000	0	0	0	0	0	0
29	CC	79005631	FERNANDEZ TORO LEONARDO	1	0			S																	230201	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS005	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
30	CC	1048937098	VENECIA FIGUEROA JOSE MIGUEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
31	CC	1087130570	BARREIRO DAJOME ARLI	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
32	CC	93116513	RAMIREZ BRIÑEZ NELSON	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
33	CC	1003000340	VALERIO SUAREZ EDUARDO ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
34	CC	1032402501	LOPEZ VALDERRAMA JONATAN RAUL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
35	CC	19480175	IZQUIERDO CRUZ MARCO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
36	CC	1003140493	PEREZ FLOREZ JULIO CESAR	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
37	CC	1048942178	SUAREZ FIGUEROA JOSE DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
38	CC	1055333248	RODRIGUEZ ALBA DEISON ALEXANDER	1	0			S										X							230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	0	CCF22	1.160.000	0	0	0	0	0	0
39	CC	1055690183	RIVERA REYES DEIVIS ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900454423-5	SEBCO SAS		TV 42 #6 - 39	3244887239	sebcosas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	06/09/2023	70690494	$17.213.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	6774049	LA ROTA PARRA VICENTE	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
41	CC	80256456	PARRA REINOSO CHARLES MOISES	1	0			S																	230301	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS037	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
42	CC	84091875	VILLEGAS PERALTA EDGAR MANUEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
43	CC	1010015615	BORJA SANABRIA JUAN PABLO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
44	CC	1050458254	ESCOBAR LEON DAIRO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
45	CC	52759913	TORRES GIL MARIA CLAUDIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
46	CC	79835047	MENDEZ LOPEZ JORGE EDUARDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
47	CC	93396520	GUAYARA MENDEZ LUIS ERNESTO	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS002	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
48	CC	79603701	SUAREZ SUAREZ GEIVER	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
49	CC	12970571	MONCAYO JURADO ALVARO RICARDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
50	CC	14325233	PRIETO MEDINA HECTOR FABIO	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS010	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF07	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
51	CC	73291133	TORRES CARO JOSE GREGORIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
52	CC	1030561852	SANCHEZ URIBES LEIDY KATHERINE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
53	CC	1022349589	SANCHEZ URIBES NEIL ALFONSO	1	0			S	X																230201	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS010	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.812.252	72.500	0	0	0	0	0
54	CC	1000972900	CANTOR LADINO INGRID DAYANNA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado de Aportes

Se certifica que GL TRANSPORTES SUMINISTROS Y AGREGADOS SAS identificado(a) con NI 900647082 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OSCAR MAURICIO GARCIA MEJIA identificado(a) con CC 1003335802

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9456362237	169116925	E	2023-09-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9456362237	169116925	E	2023-09-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9456362237	169116925	E	2023-09-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30																		$1,160,000		$0
9456362237	169116925	E	2023-09-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30																		$1,160,000		$0
9456362237	169116925	E	2023-09-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30																		$0	0%	$0
9456362237	169116925	E	2023-09-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30																		$0	0%	$0
9456362237	169116925	E	2023-09-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$1,160,000	6.96%	$80,800
9456362237	169116925	E	2023-09-19	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9455016588	110143633	E	2023-08-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9455016588	110143633	E	2023-08-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9455016588	110143633	E	2023-08-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30																		$1,160,000		$0
9455016588	110143633	E	2023-08-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30																		$1,160,000		$0
9455016588	110143633	E	2023-08-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30																		$0	0%	$0
9455016588	110143633	E	2023-08-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30																		$0	0%	$0
9455016588	110143633	E	2023-08-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	6.96%	$80,800
9455016588	110143633	E	2023-08-18	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9453829206	58210253	E	2023-07-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	15	X																	$580,000	4%	$23,200
9453829206	58210253	E	2023-07-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	15	X																	$580,000	16%	$92,800
9453829206	58210253	E	2023-07-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	15	X																	$580,000		$0
9453829206	58210253	E	2023-07-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	15	X																	$580,000		$0

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9453829206	58210253	E	2023-07-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	15	X																$0	0%	$0
9453829206	58210253	E	2023-07-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	15	X																$0	0%	$0
9453829206	58210253	E	2023-07-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	15	X																$580,000	6.96%	$40,400
9453829206	58210253	E	2023-07-21	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	15	X																$580,000	4%	$23,200

Este certificado se expide el día 2023-09-19 a las 09:50.

DOCUMENTOS DE EGRESO DEL PERSONAL

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

Referencia: **Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013**

Asunto: Paz y salvo

Yo **CARLOS MARIO GUERRA CASARRUBIA** identificado con CC número **1.068.667.747** y actuando en representación de la empresa ICOPORES HECTOR JULIO UMBA identificada con Nit 79.109.506-2, certifico que EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS identificada con Nit. 807.008.957-7, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto, del proyecto en mención en la referencia El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los (31) días del mes de agosto del año 2023.

Cordialmente.

_____

Firma
Nombre **CARLOS MARIO GUERRA CASARRUBIA**
Cargo Oficia de obra
C.C. 1.068.667.747

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

Referencia: **Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013**

Asunto: Paz y salvo

Yo **OCTAVIO SEGUNDO SALGADO** identificado con CC número **1.068.669.238** y actuando en representación de la empresa ICOPORES HECTOR JULIO UMBA identificada con Nit 79.109.506-2, certifico que EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS identificada con Nit. 807.008.957-7, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto, del proyecto en mención en la referencia El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los (31) días del mes de agosto del año 2023.

Cordialmente.



Firma
Nombre OCTAVIO SEGUNDO SALGADO
Cargo Ayudante de obra
C.C. 1.068.669.238

[illegible]

[illegible]

[redacted]

ACTA DE REUNIÓN COPASST

	ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: **FMC-01** Versión: **00** Fecha: **21/02/2020**

No. DE ACTA: 20

Fecha de reunión: 18 de Septiembre de 2023	**Lugar:** Bogotá
Responsable de la reunión: Carlos Cote	**Cargo:** director HSEQ
Asunto de la reunión: Reunión mensual COPAST	
Objetivo de la reunión: Reunión ordinaria del COPASST.	

PARTICIPANTES			
Empresa	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
EBISU	**VICTOR MIGUEL JULIO**	**Presidente**	
EBISU	**CESAR IVAN CARREÑO**	**Principal del empleador**	
EBISU	**WILLIAM NOGUERA**	**Secretario**	
EBISU	**CAMILA ACOSTA**	**Principal de trabajadores**	
EBISU	**CARLOS COTE**	**Suplente del presidente/ invitado**	

Nota: el campo “Empresa” aplica para los participantes externos.

DESARROLLO DE LAREUNIÓN

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación Quorum.
2. Lectura de compromisos y aprobación de acta anterior.
3. Análisis de Accidentes de trabajo, incidentes y Enfermedad Laboral (Administrativos – Proyectos) Casos- sede causas- plan de acción – seguimiento.
4. c
5. Recomendaciones adicionales y/o comentarios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se hizo verificación del quorum cumplimiento con el número personas requeridas para dar inicio a la reunión ordinaria del COPASST correspondiente al mes de julio de 2023. En la presenta acta se anexa el control de asistencia COPASST.

2. El principal del empleador del COPASST procede a mencionar el orden del día de la reunión ordinaria, el Ing. Carlos Cote verifica el cumplimiento del quorum de la reunión.

3. Se hizo lectura de compromisos y se aprueba por parte de los integrantes del COPASST el acta anterior donde está el compromiso presentación de las obras.
4.Se realiza cierre de investigación de accidente sin presentar novedades del mismo.
5. Se informo el mecanismo para el desarrollo de esta actividad para la promoción y prevención e integración de subcontratistas con colaboradores de Ebisu

COMPROMISOS

Ítem	Compromiso	Responsable	Fecha	Cumplido
1	Conformación de brigadas de emergencia	Carlos Cote	18 SEPTIE MBRE	Se da cumplimiento
1	Realizar socialización sobre simulacro de evacuación que se realizará en 5 de octubre de 2023	Inspector SST Ebisu	29 de septiembre	Se da cumplimiento

OBSERVACIONES

Se sugiere al personal SST de las obras siempre realizar inspecciones realizando recorrido general a cada uno de los proyectos para generar los hallazgos, estos deben ser muy descriptivos.

. Dando cumplimiento a la jornada de armonización se hará el correspondiente acompañamiento de área de seguridad y salud en el trabajo con representante de Copasst

Durante este periodo no se reportaron incidentes y accidentes laborales por parte de los trabajadores de EBISU y subcontratistas. se presentó ausentismo por causa médica. La ocurrencia es por cambio climático, se sugiere sensibilizar a personal del autocuidado

Se realizaron inspecciones ambientales y SST a los EPPs, dotaciones, maquinaria, equipos y elementos de seguridad.

	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Codigo**OST.CR-00** Versión:**01** Fecha:**15/05/2023**

OBJETIVO	ALCANCE	
DESARROLLAR ACTIVIDADES TENDIENTES A CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA REDUCIR LOS RIESGOS , QUE SE PRESENTAN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES.	APLICA A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	
	RESPONSABLES	
	AREA ADMINISTRATIVA, ARL, DIRECCIÓN SST, PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	
	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META
	# DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS*100 # DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	90%

RECURSOS	RECUROS NECESARIOS	DOCUMENTOS REQUERIDOS
HUMANOS	AREA ADMINISTRATIVA,ARL,DIRECCIÓN SST,PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	LISTAS DE VERIFICACIÓN
TECNOLOGICOS	COMPUTADORES, VIDEO BEAN, PARLANTES, SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS (EXCEL, WORD).	
FINANCIEROS	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA EMPRESA	

CONVENCIONES		
	Programado	P
	Ejecutado	E
	Reprogramado	R

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PROYECTO BOITA

Each month has sub-columns P / E / R.

N°	MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO – CAPACITACION	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	OBSERVACIONES
1	Examenes de ingreso	Area administrativa	Todos los trabajadores	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E							
2	Examenes periodicos	Area administrativa	Todos los trabajadores	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E							
3	Examenes de egreso	Area administrativa	Todos los trabajadores	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E							Cada vez que el trabajador se retire de la organización
4	Campaña de salud visual	ARL	Todos los trabajadores																				Segun la disponibilidad de la ARL
5	Campaña de acticidad fisica(rumbaterapia)	ARL	Todos los trabajadores																				Segun la disponibilidad de la ARL
6	Campaña medicina preventiva toma de talla, peso	ARL	Todos los trabajadores																				Segun la disponibilidad de la ARL
7	Campaña de nutrición	ARL	Todos los trabajadores																				Segun la disponibilidad de la ARL
8	Verificacion de documentos del personal	Area administrativa,Director HSEQ,Inspector SST	Todos los trabajadores	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	
9	Capacitación sobre manejo adecuado de tiempo	Trabajador social	Todos los trabajadores			P E							P										
10	Capacitación de liderazgo y trabajo en equipo	Trabajador social	Todos los trabajadores		P E									P E						P			
11	Jornadas de Pausas Activas con énfasis en columna lumbar, miembros superiores e inferiores	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E						P E					P E					P		
12	Capacitación de orden y aseo en la obra	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E		P E		P E		P E		P E		P E			P E		P			P	
13	Capacitación de prevención de accidentes y enfermedades laborales	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E		P E		P E		P E		P E			P E		P			P	
14	Capacitación en manejo del estrés	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E						P E							P				
15	Fomento de estilos de vida saludables	Inspector SST	Todos los trabajadores						P E						P E					P			
16	Campaña de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E						P E						P E				P		
17	Campaña de medicina preventiva para riesgo Cardiovascular	Inspector SST	Todos los trabajadores				P E																
18	Capacitación moviento repetitivo por transtornos musculoesqueleticos	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E						P E							P E					
19	Capacitación en levantamiento de cargas y ergonomía	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E				P E				P E			P E				P			
20	Campaña de prevención de accidentes en manos.	Inspector SST	Todos los trabajadores					P E										P E					
21	Capacitación en riesgo eléctrico por lluvias y tormentas eléctricas	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E																	
22	Socialización del protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio por Covid-19	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E									P E										
23	Socialización sobre acoso laboral	Inspector SST	Todos los trabajadores												P E						P		
24	Capacitación en comunicación asertiva	Trabajador social	Todos los trabajadores			P E						P E										P	
25	Capacitación en uso adecuado de tapabocas para la prevención del contagio con Covid-19	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E	P E																		
	HIGIENE INDUSTRIAL																						
N°	**ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**	**DIRIGIDO A:**																				
1	Capacitacion de promoción y prevención de hipoacusia neurosensorial (sordera) a causa de sobre exposicion a ruidos	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E		P E		P E		P E		P E		P E		P E		P E		P		P	
2	Capacitación exposición a vibraciones	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E		P E		P E		P E		P E		p E		p E		p		p		
3	Capacitaciones en estilo de vida saludable	Inspector SST	Todos los trabajadores				P E				P E						p E						
5	Capacitación niveles de iluminacion para tareas en las áreas de trabajo	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E						P E							p E					
7	Socialización manejo integral de residuos	Inspector sST y Especialista Ambiental	Todos los trabajadores	P E			P E			P E			P E			P E			P			P	
8	Entrenamiento en primeros auxilios basicos	ARL	Todos los trabajadores																				
10	Capacitación en prevención de silicosis generada por exposición a material particulado	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E		P E		P E		P E		P E					P E			P			
	SEGURIDAD INDUSTRIAL																						
N°	**ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**	**DIRIGIDO A:**																				
1	inducción y reinducción del personal	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E																			
2	Campaña de autocuidado	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E							P E					P E					
3	Señalización de rutas de evacuación	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E				P E				P E				P E			P			P	
4	Señalización de áreas con riesgo	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E				P E				P E				P E			P			P	
5	implementación y señalización de punto ecológico,.	InspectorSST,Ingeniero ambiental	Todos los trabajadores		P E										P E					P			
6	Socializar puntos de encuentro y rutas de evacuación	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E							P E								P			
7	Capacitación en trabajo seguro en alturas	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E				P E													
8	Capacitación en señalización y uso de colores	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E					P E					P E						P	
11	Capacitacion de uso adecuado de prevención de accidentes en partes en movimiento	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E		P E		P E		P E		P E		P E		P E		P		P		

	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo**OST.CR-00**
		Versión:**01**
		Fecha:**15/05/2023**

OBJETIVO	ALCANCE	
DESARROLLAR ACTIVIDADES TENDIENTES A CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA REDUCIR LOS RIESGOS , QUE SE PRESENTAN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES.	APLICA A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	
	RESPONSABLES	
	AREA ADMINISTRATIVA, ARL, DIRECCIÓN SST, PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	
	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META
	# DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS*100 # DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	90%

RECURSOS	RECUROS NECESARIOS	DOCUMENTOS REQUERIDOS
HUMANOS	AREA ADMINISTRATIVA,ARL,DIRECCIÓN SST,PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	LISTAS DE VERIFICACIÓN
TECNOLOGICOS	COMPUTADORES, VIDEO BEAN, PARLANTES, SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS (EXCEL, WORD).	
FINANCIEROS	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA EMPRESA	

CONVENCIONES		
	Programado	P
	Ejecutado	E
	Reprogramado	R

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PROYECTO BOITA

MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO				Mes 1			Mes 2			Mes 3			Mes 4			Mes 5			Mes 6		
Nº	CAPACITACION	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R
12	Capacitación uso adecuado de herramientes manuales	Inspector SST	Todos los trabajadores				P	E					P	E					P	E	
13	Publicación y Socialización de la Política de SST y Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas	Director HSEQ, Inspector SST	Todos los trabajadores	P	E																
14	Elaboración del Plan de Emergencias	Director HSEQ, Inspector SST	Todos los trabajadores	P	E																
15	Capacitación en evacuación y rescate	Inspector SST	Todos los trabajadores																		
16	Capacitación en manejo de extintores y control de incendios	Inspector SST	Todos los trabajadores																		
17	Conformar las Brigadas de Emergencias	Director HSEQ, Inspector SST	Todos los trabajadores							P	E										
18	Elaboración de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos para el proyecto.	Director HSEQ, Inspector SST	Todos los trabajadores				P	E													
19	Capacitación en el uso adecuado de elementos de protección personal (EPP)	Inspector SST	Todos los trabajadores										P	E							
20	Capacitación en actos y condiciones inseguras	Inspector SST	Todos los trabajadores	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E	
21	Inspección de seguridad	Inspector SST	Todos los trabajadores	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E	
22	Socialización puntos de hidratación para prevención de insolación y golpes de calor por trabajos en ambiente caluroso	Inspector SST	Todos los trabajadores																		
23	Capacitación sobre el manejo de herramientas manuales	Inspector SST	Todos los trabajadores	P	E																
24	Capacitación de atrapamiento por energias peligrosas	Inspector SST	Todos los trabajadores	P	E														P	E	
25	Inspección de equipos de trabajo de alturas	Inspector SST	Todos los trabajadores	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E	
26	Simulacro de emergencia	Inspector SST	Todos los trabajadores																		
27	Capacitación en prevención y control del fuego	Inspector SST	Todos los trabajadores																		
28	Socialización de reportes de actos y condiciones inseguras	Inspector SST	Todos los trabajadores										P	E							

	Mes 7			Mes 8			Mes 9			Mes 10			Mes 11			Mes 12			Mes 13		
Nº	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R
12				P	E					P	E					P	E				
13																					
14																					
15				P	E																
16				P	E																
17																					
18																					
19				P	E														P	E	
20	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E	
21	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E	
22																					
23	P	E																			
24																					
25	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E	
26				P	E																
27				P	E																
28							P	E													

	Mes 14			Mes 15			Mes 16			Mes 17			Mes 18			Mes 19			OBSERVACIONES
Nº	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	
12	P	E					P						P						
13																			
14																			
15																			
16				P	E														
17																			
18																			
19										P									
20	P	E		P	E		P			P			P			P			
21	P	E		P	E		P			P			P			P			
22																			
23							P												
24																			
25	P	E		P	E		P			P			P			P			
26																			
27				P	E														
28							P												

Nota: Lo **PROYECTADO** debe marcar con la letra **P.**

Lo **EJECUTADO** se debe marcar con la letra **E.**

Lo **REPROGRAMADO** se debe marcar con la letra **R** e insertar un comentario justificando.

Nota: Esta programación puede estar sujeta a cambios estos se marcaran con la letra R (reprogramado)

ACTIVIDADES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	TOTAL
ACTIVIDADES EJECUTADAS	20	20	19	15	14	13	14	21	17	14	11	13	15	12	11	0	0	0	0	229
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	20	20	19	15	14	13	14	21	17	15	11	13	15	12	11	15	12	10	12	279
ACTIVIDADES REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POIRCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL MENSUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93.33333333	100	100	100	100	100	0	0	0	0	1493.333333

REGISTRO DE CAPACITACIONES SST

EBISU S.A.S

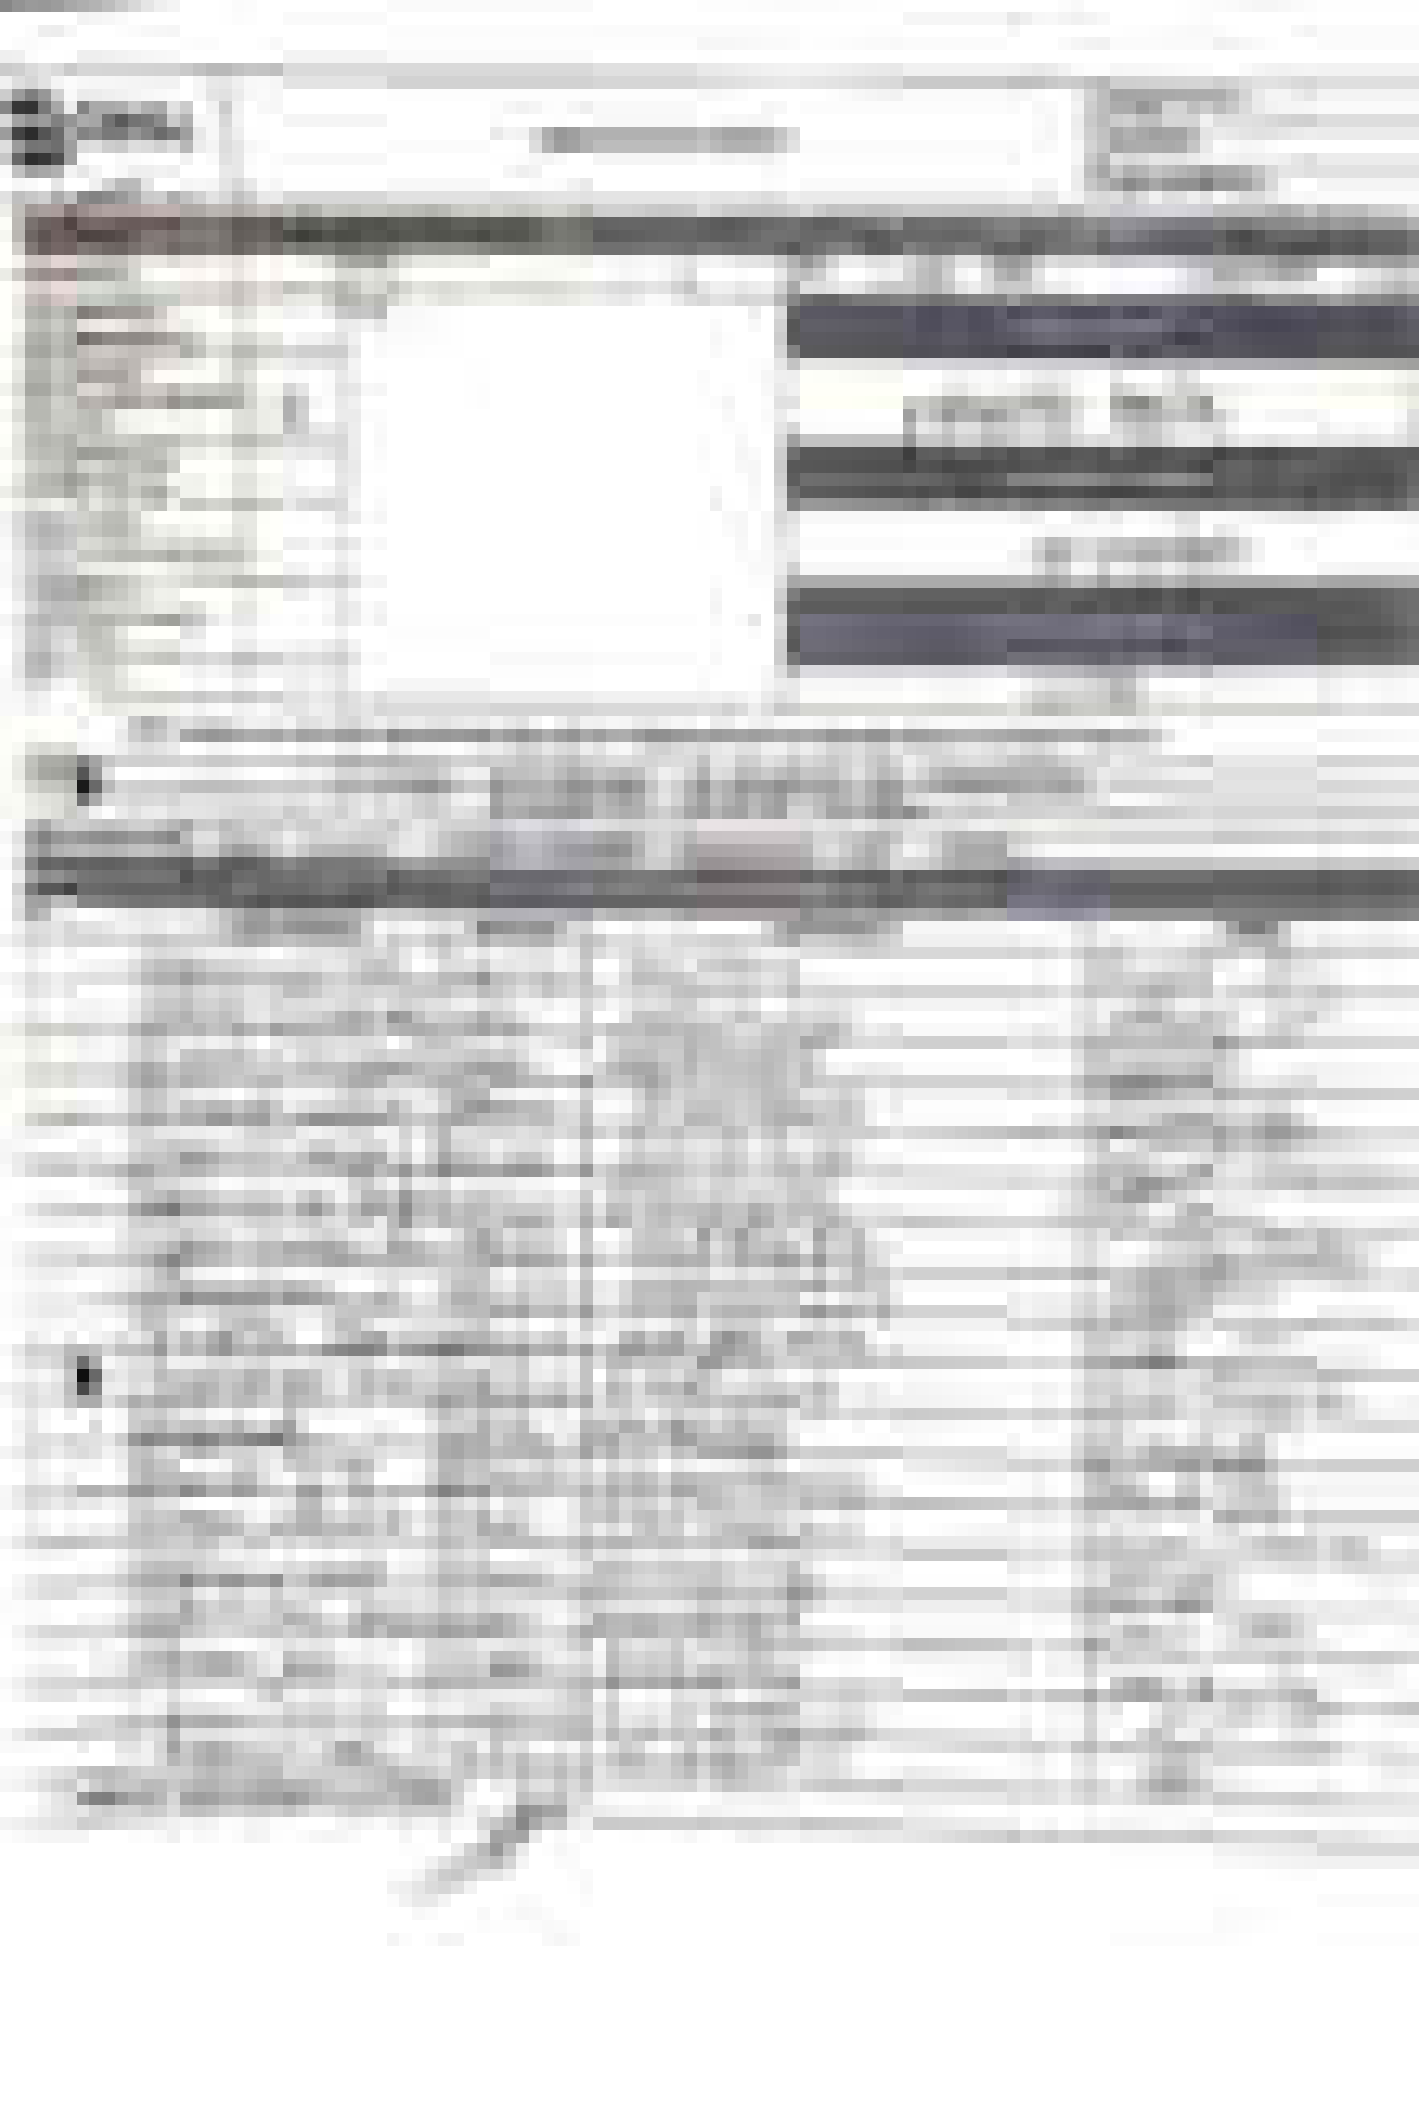

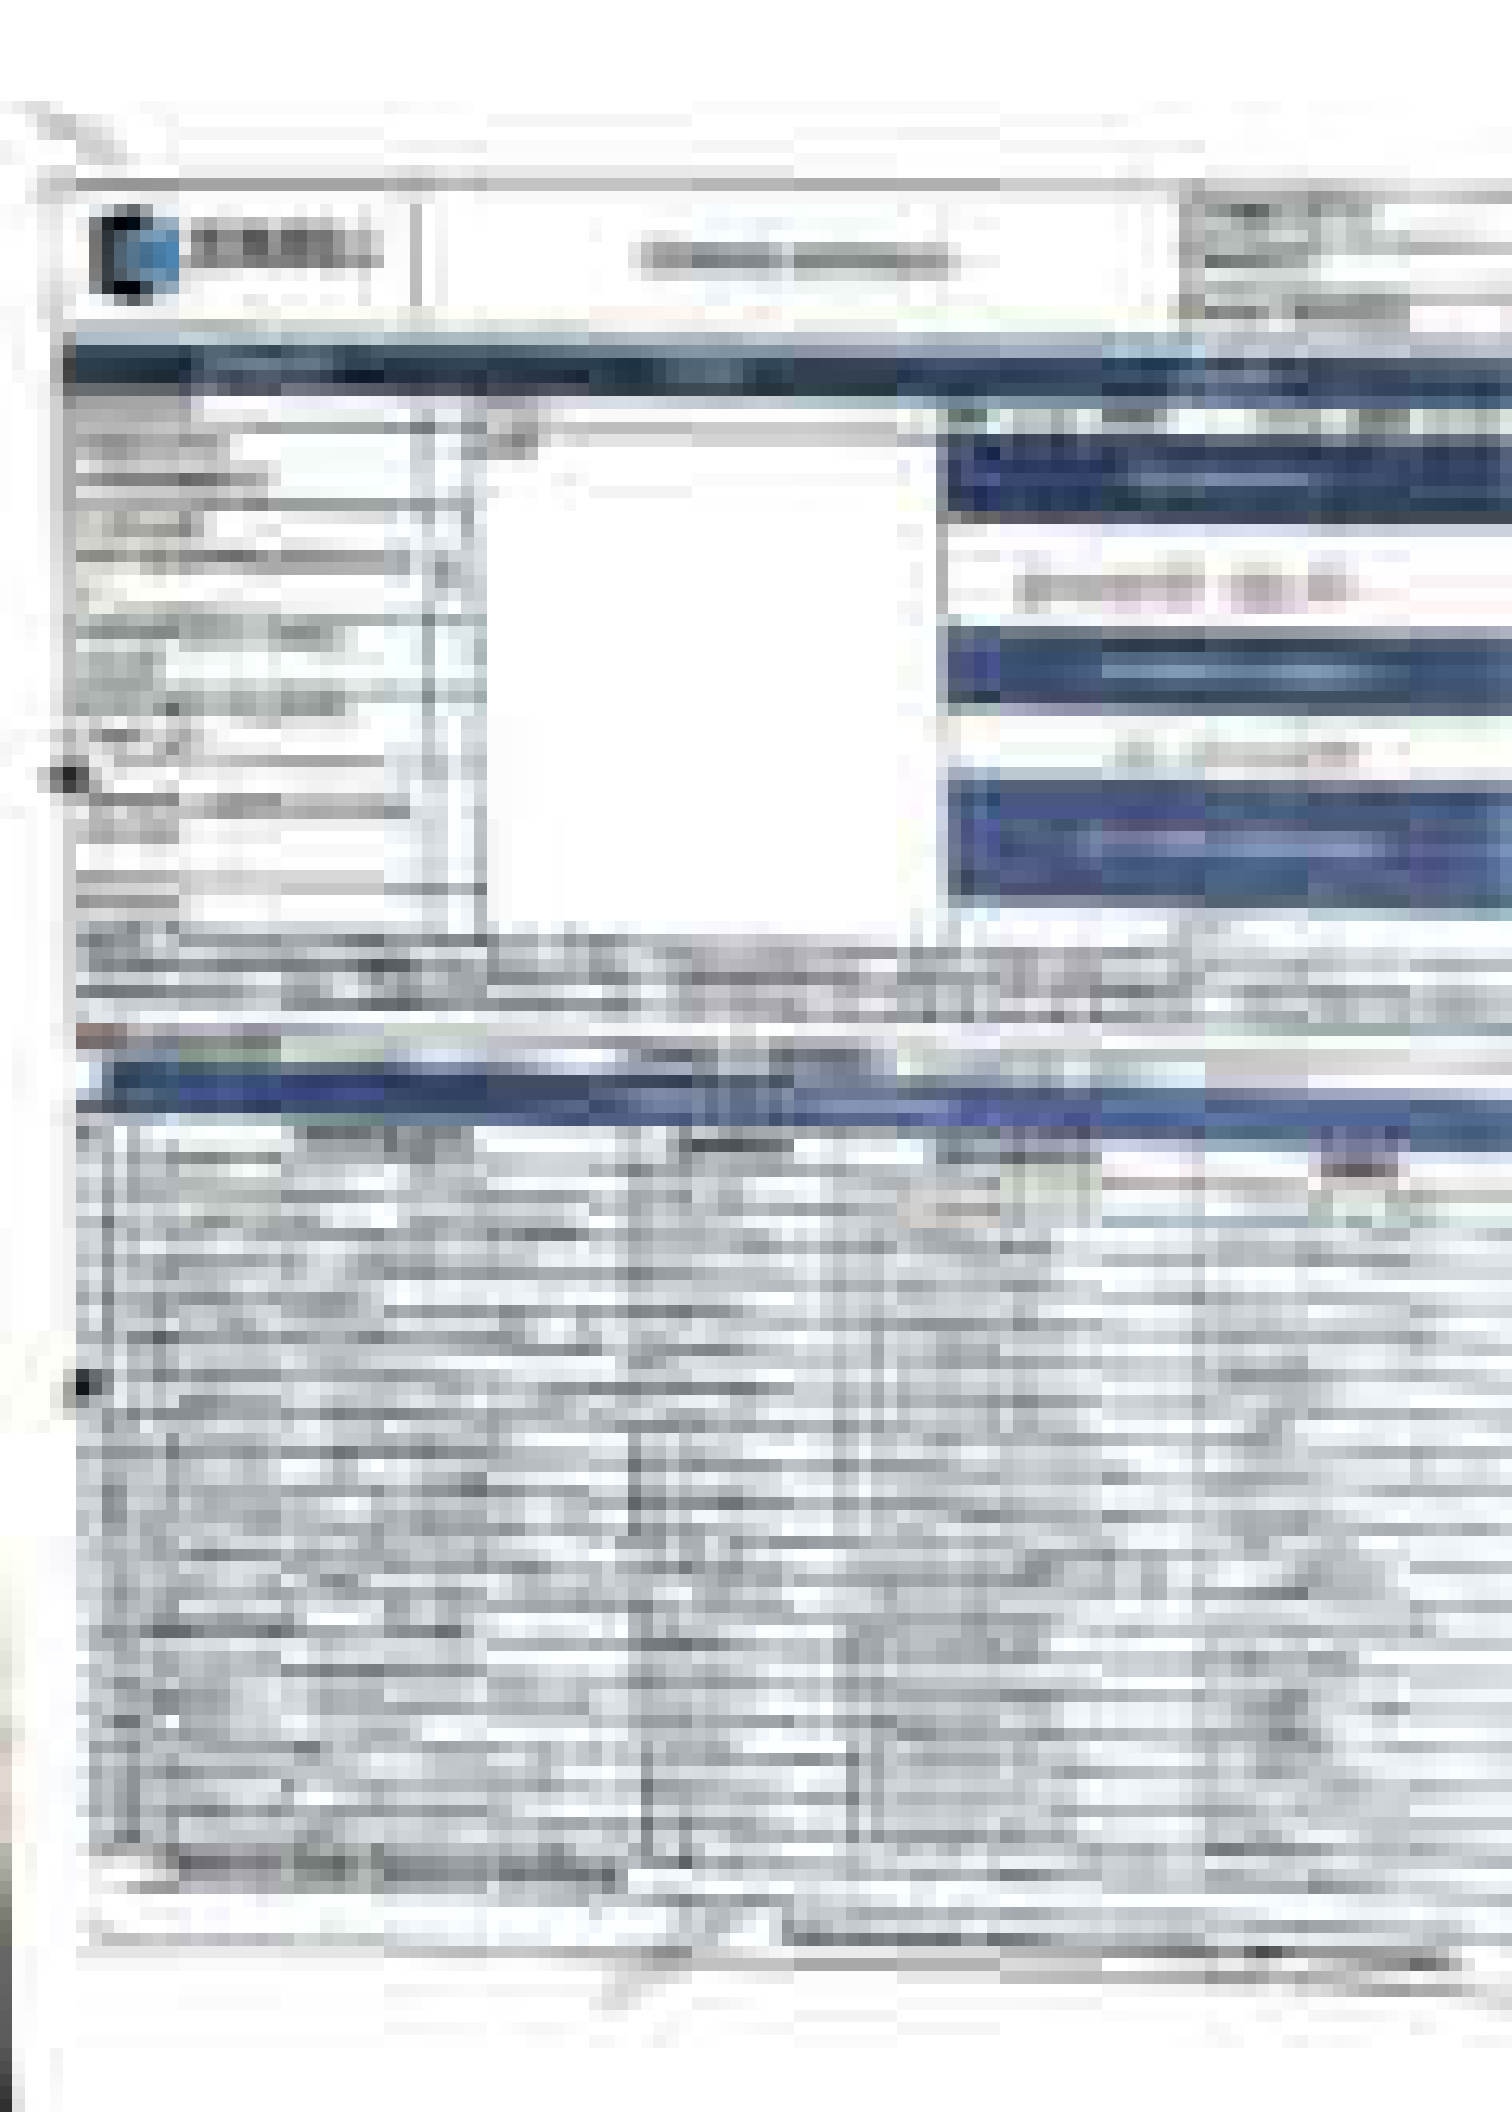

REGISTRO DE CAPACITACIONES SST SUBCONTRATISTAS

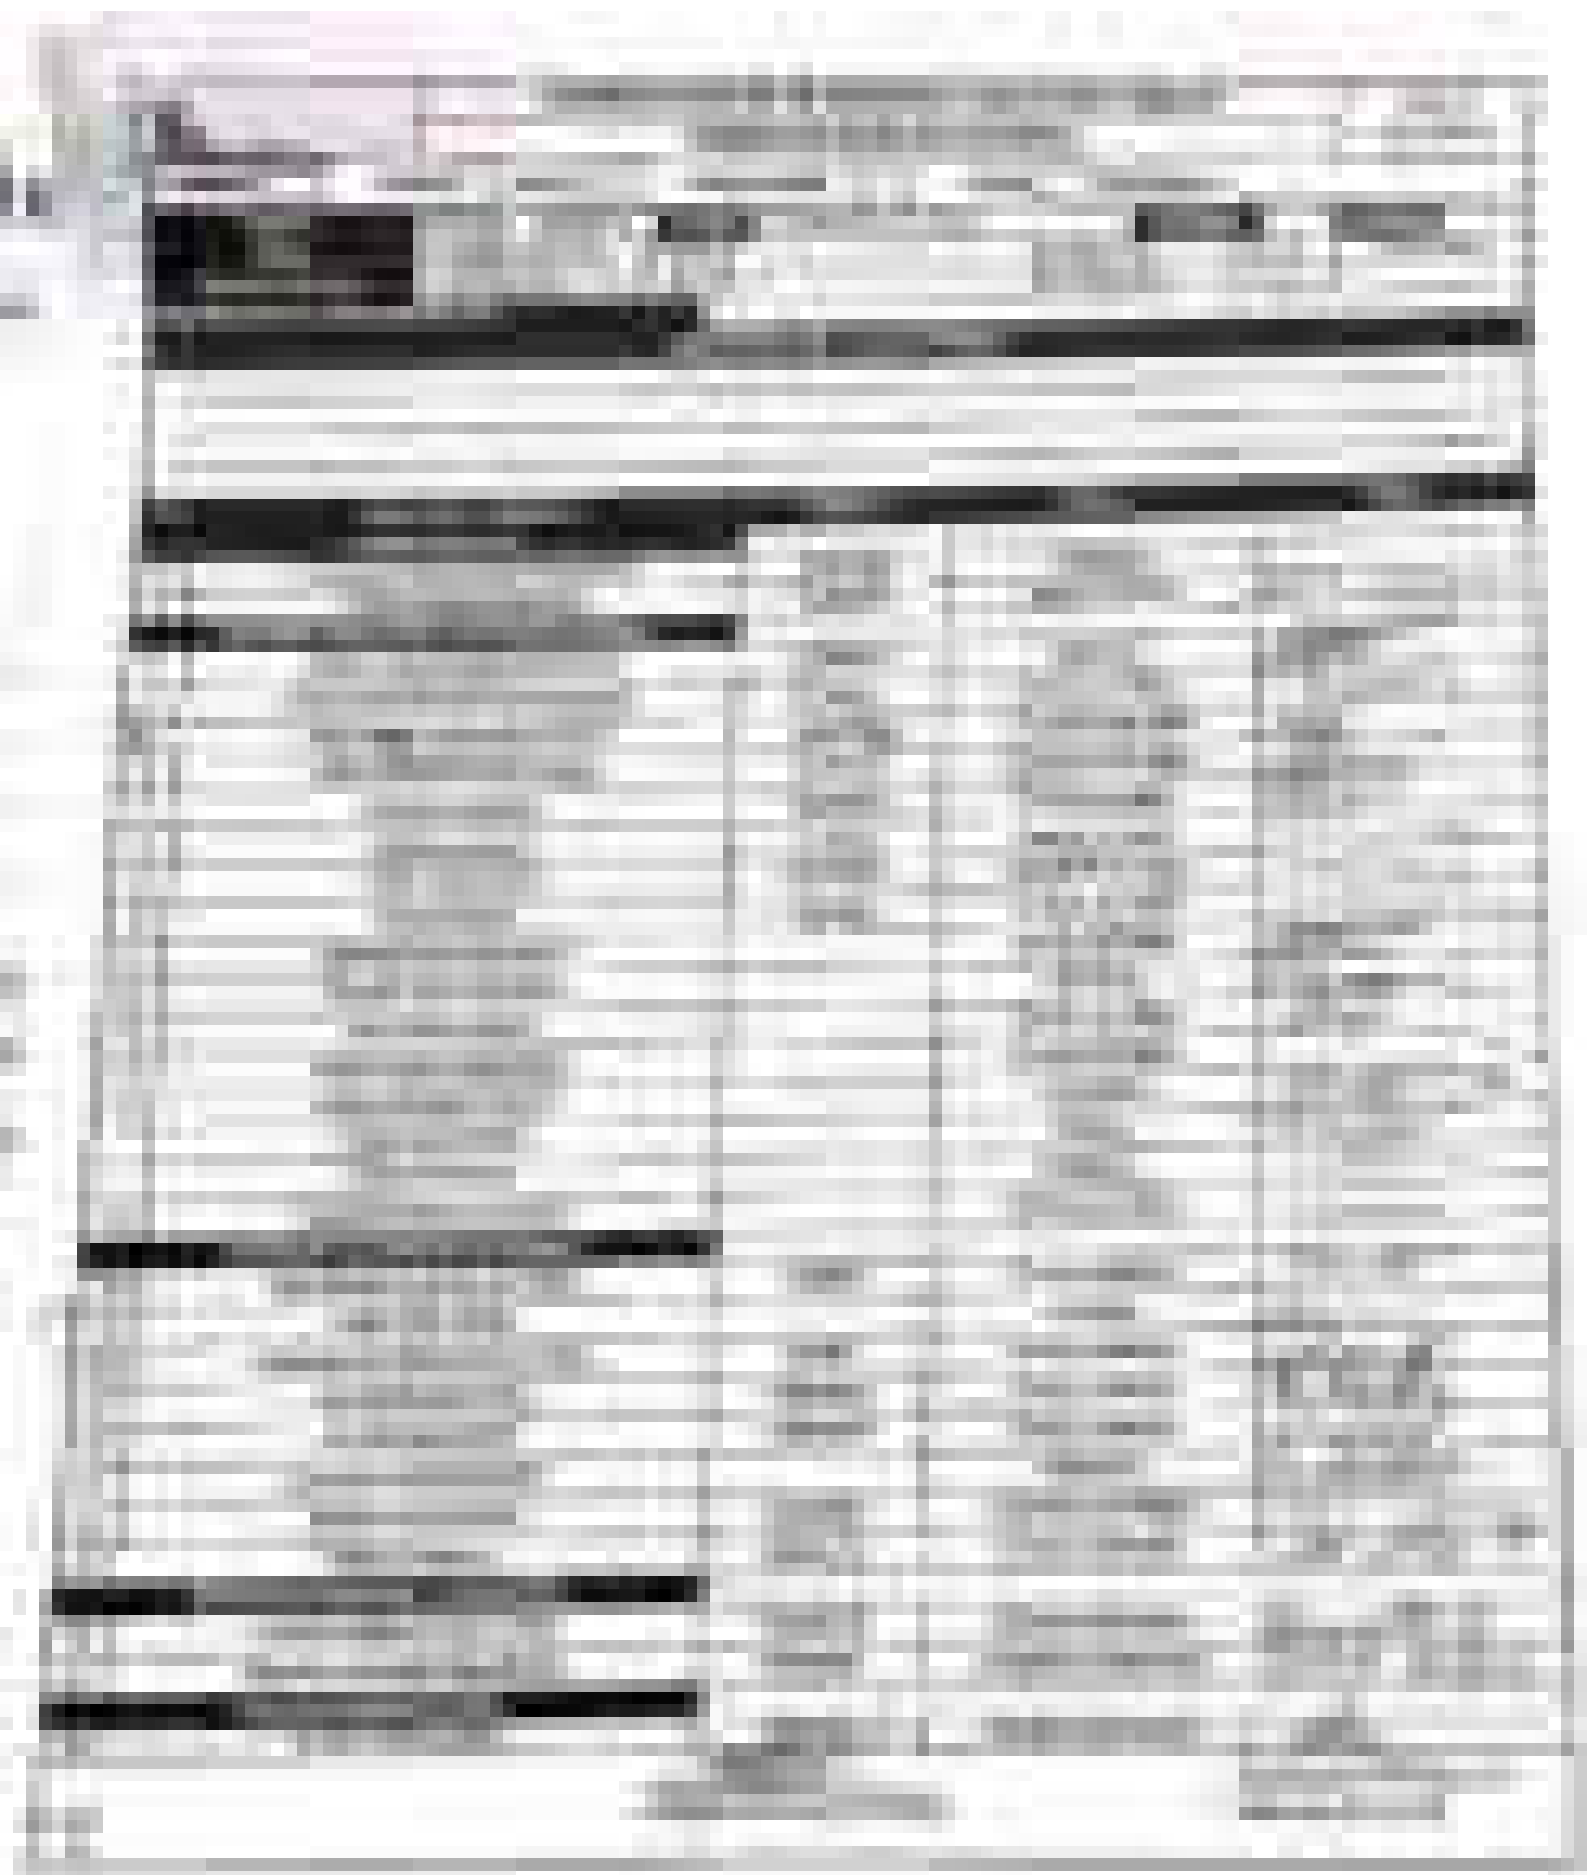

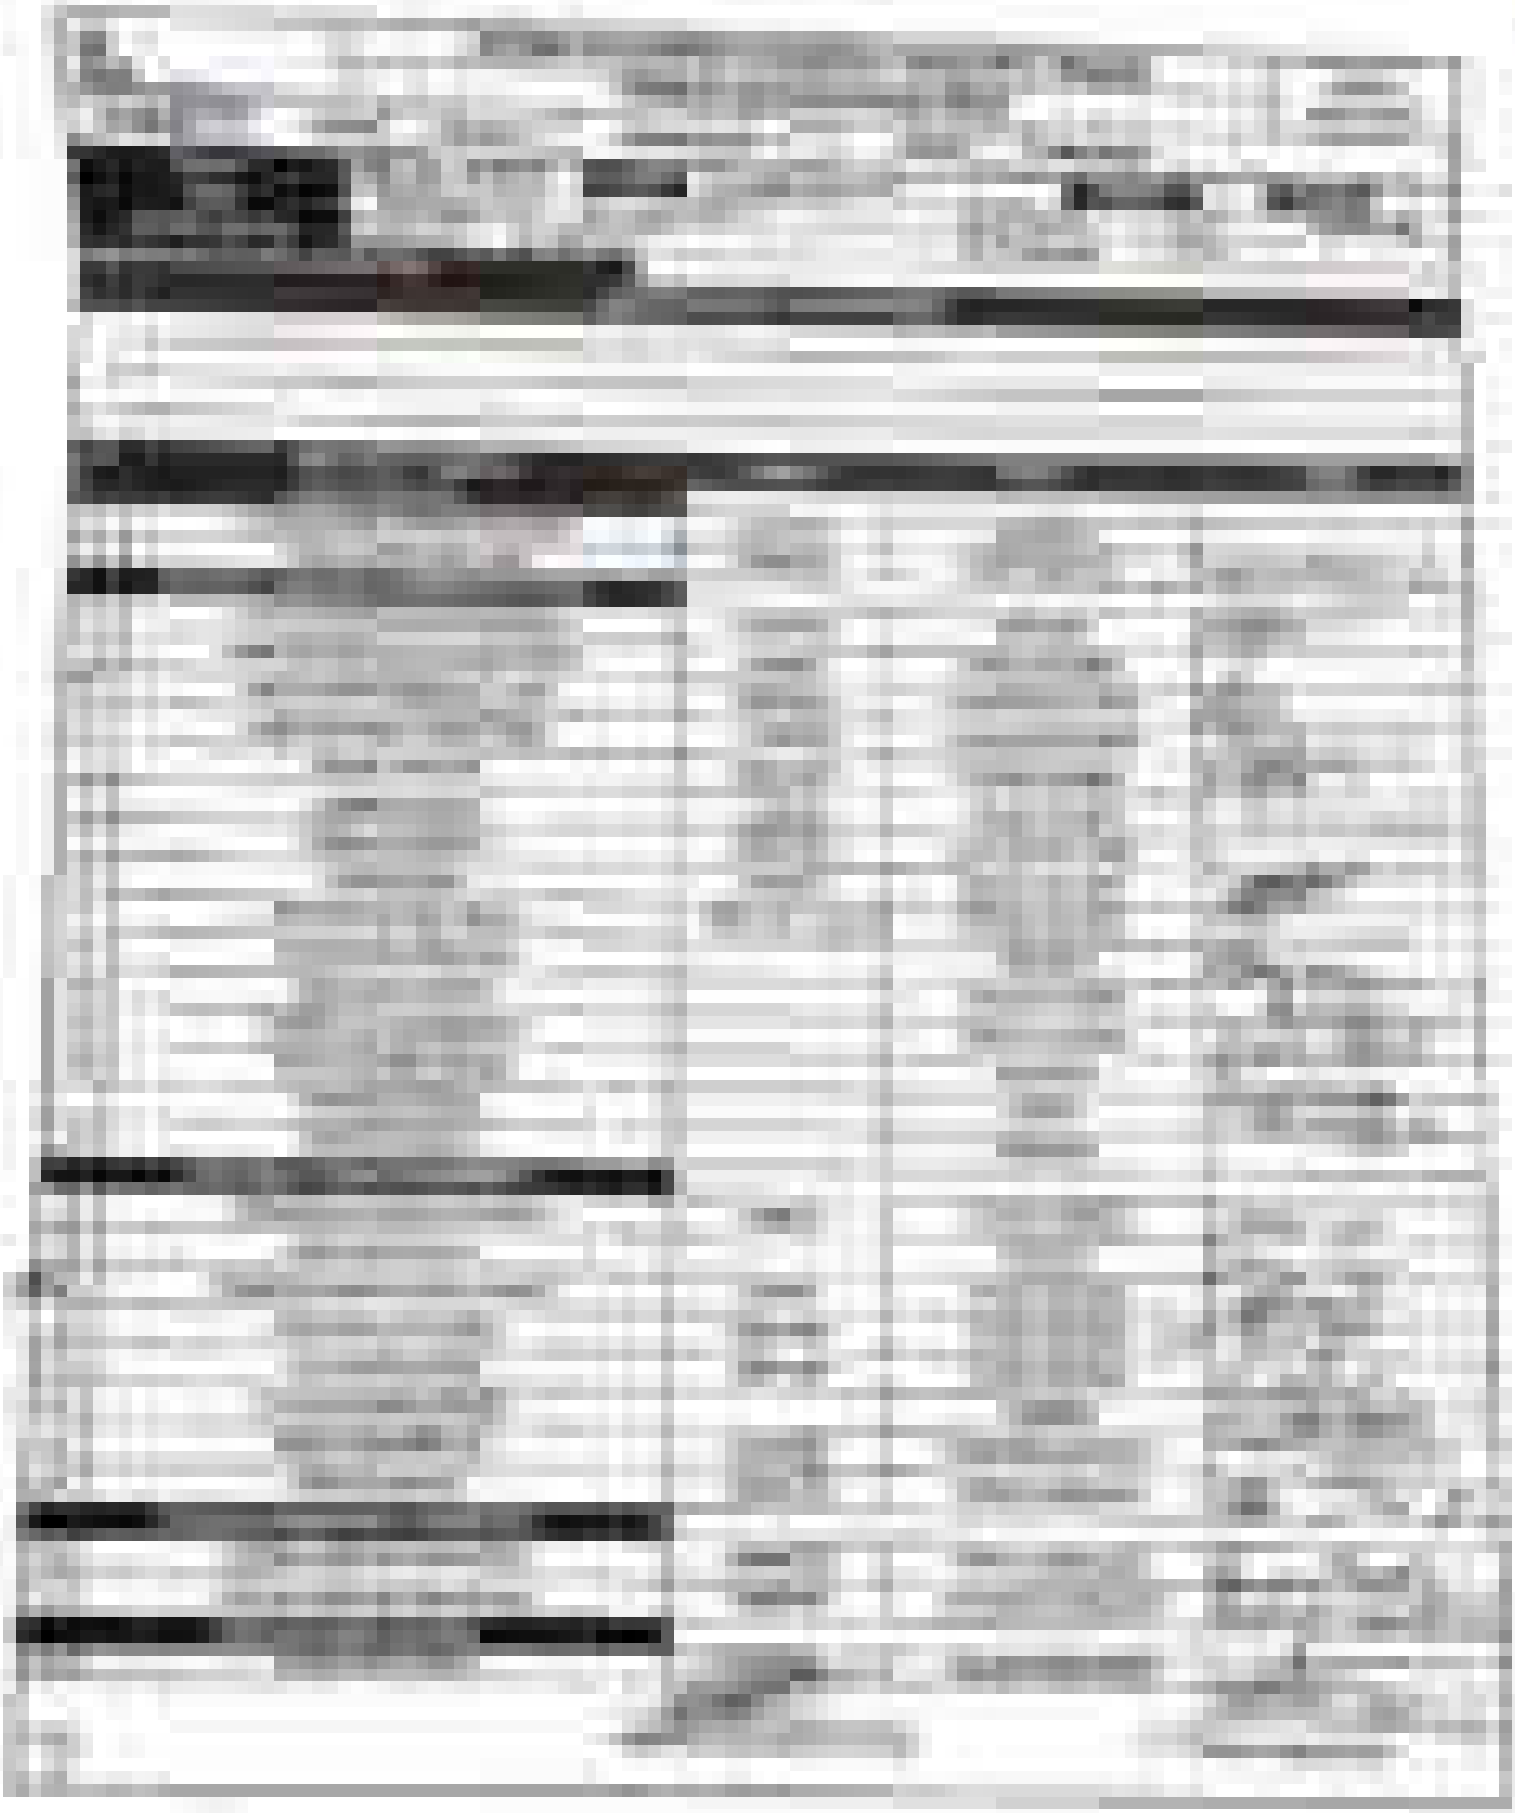

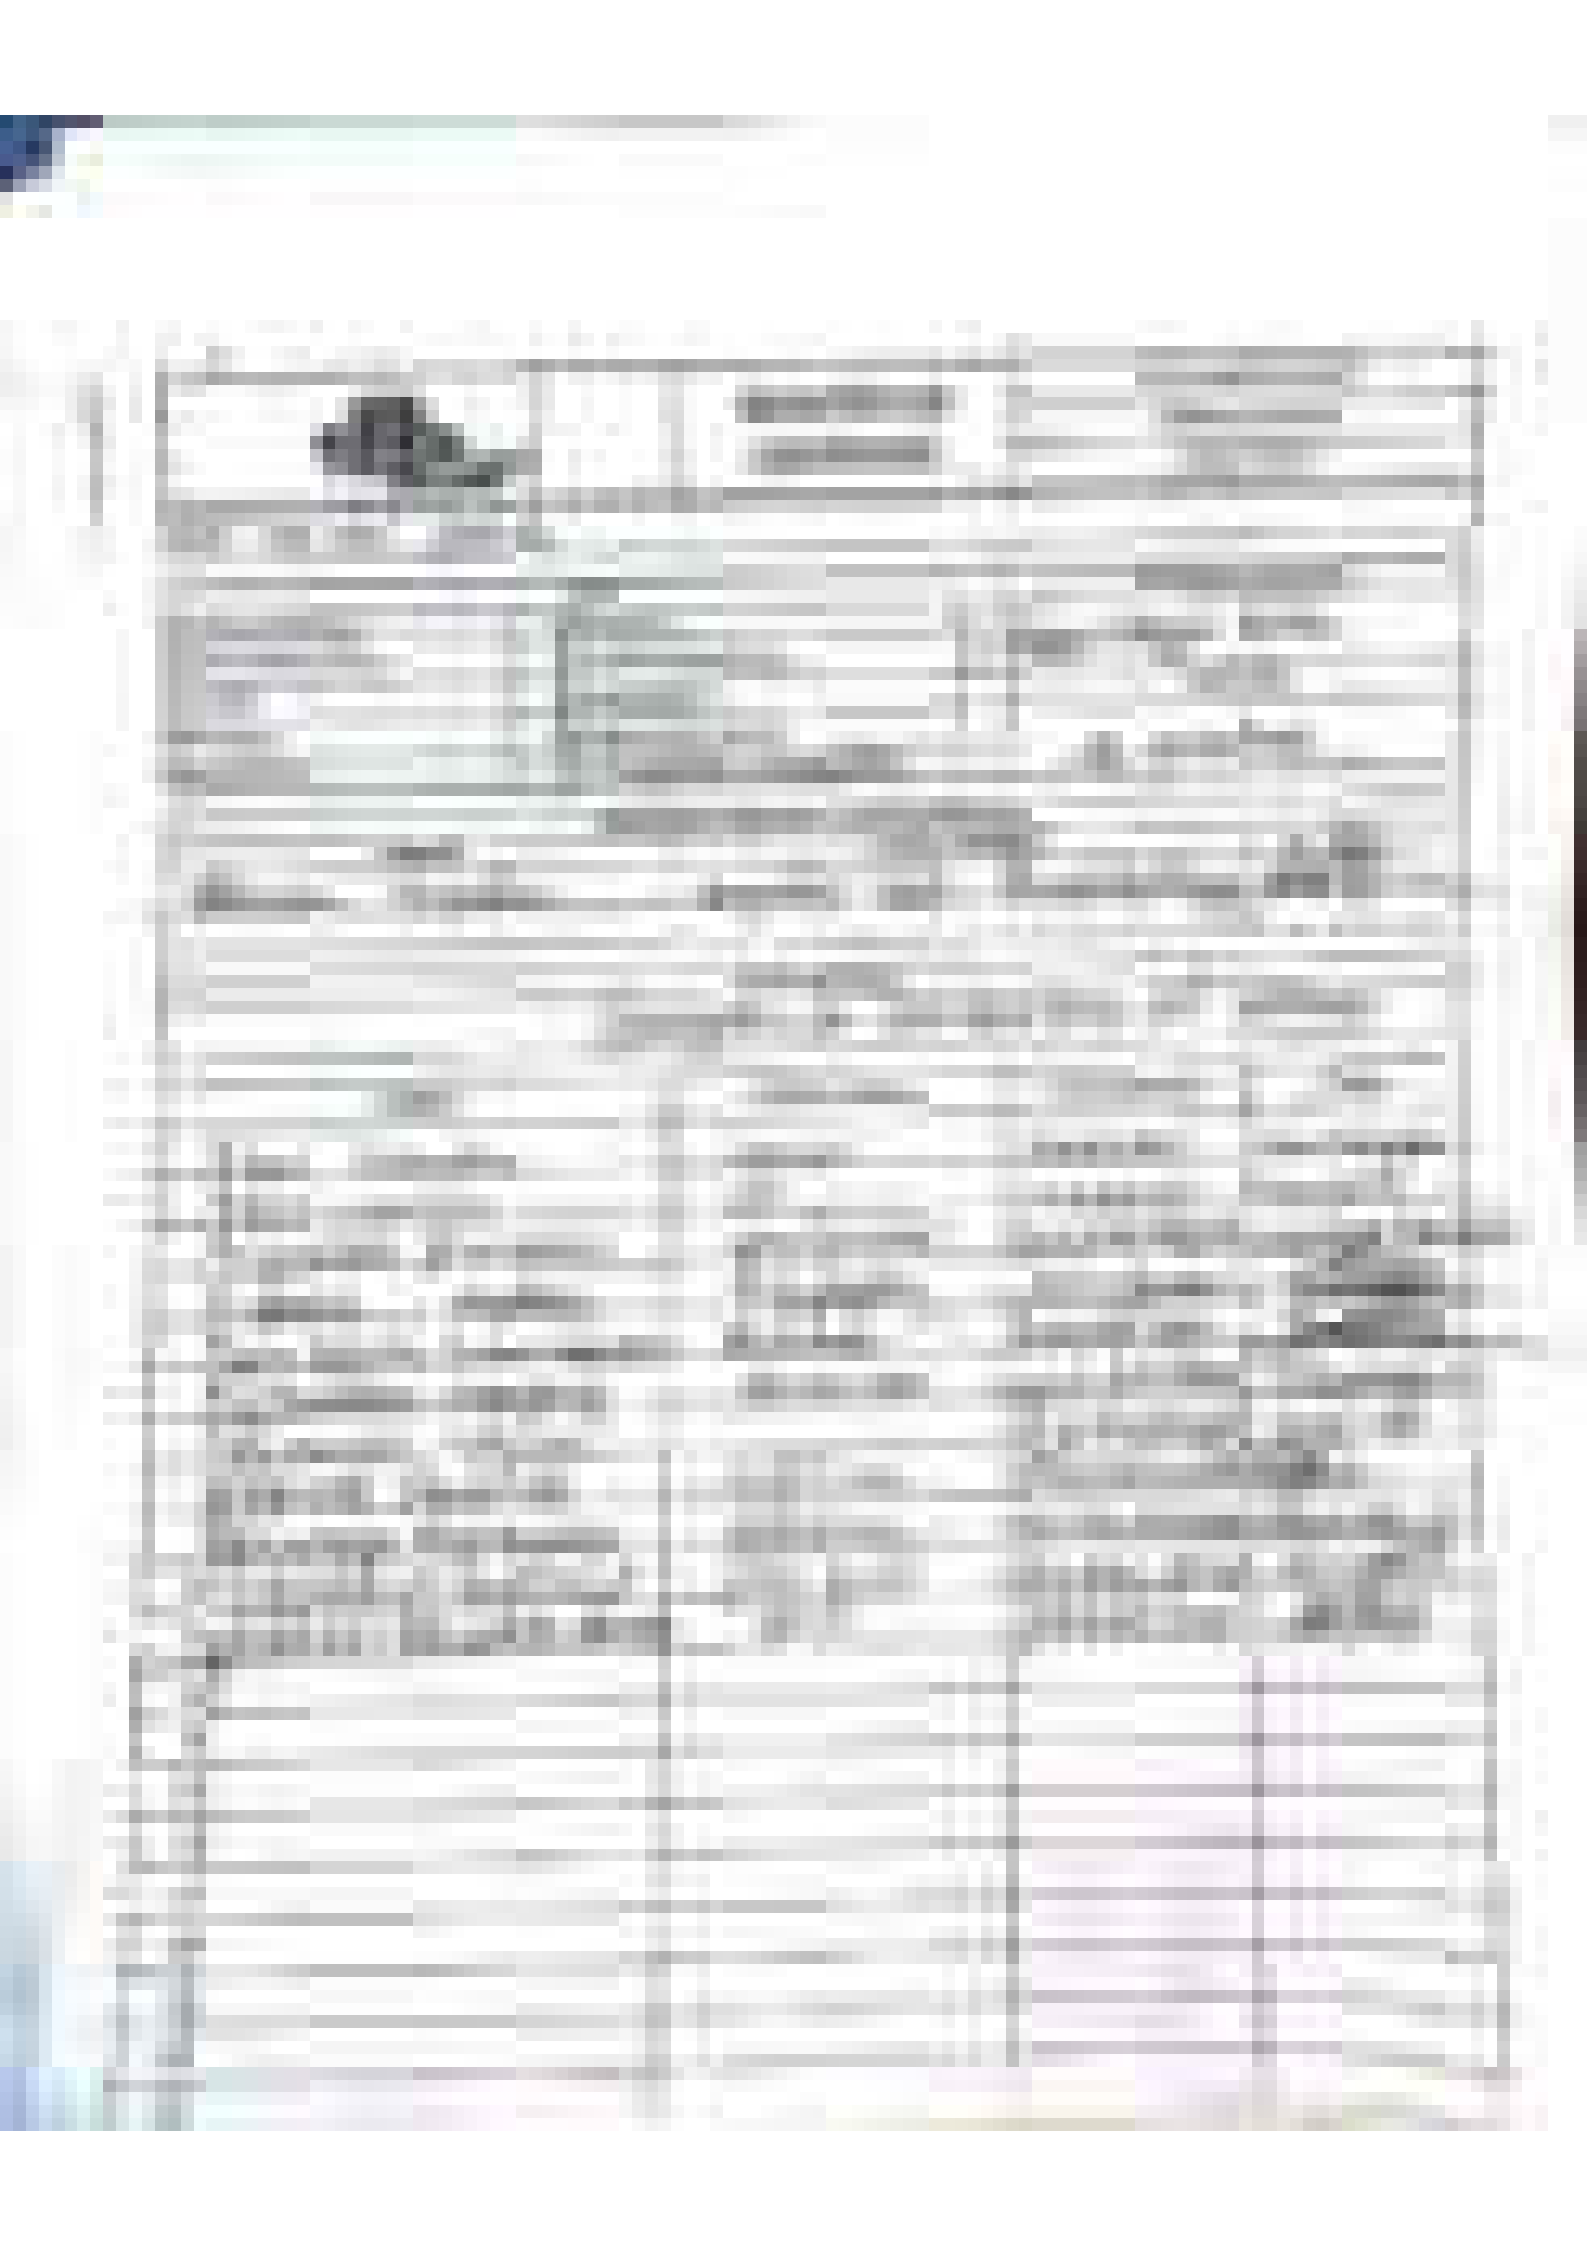

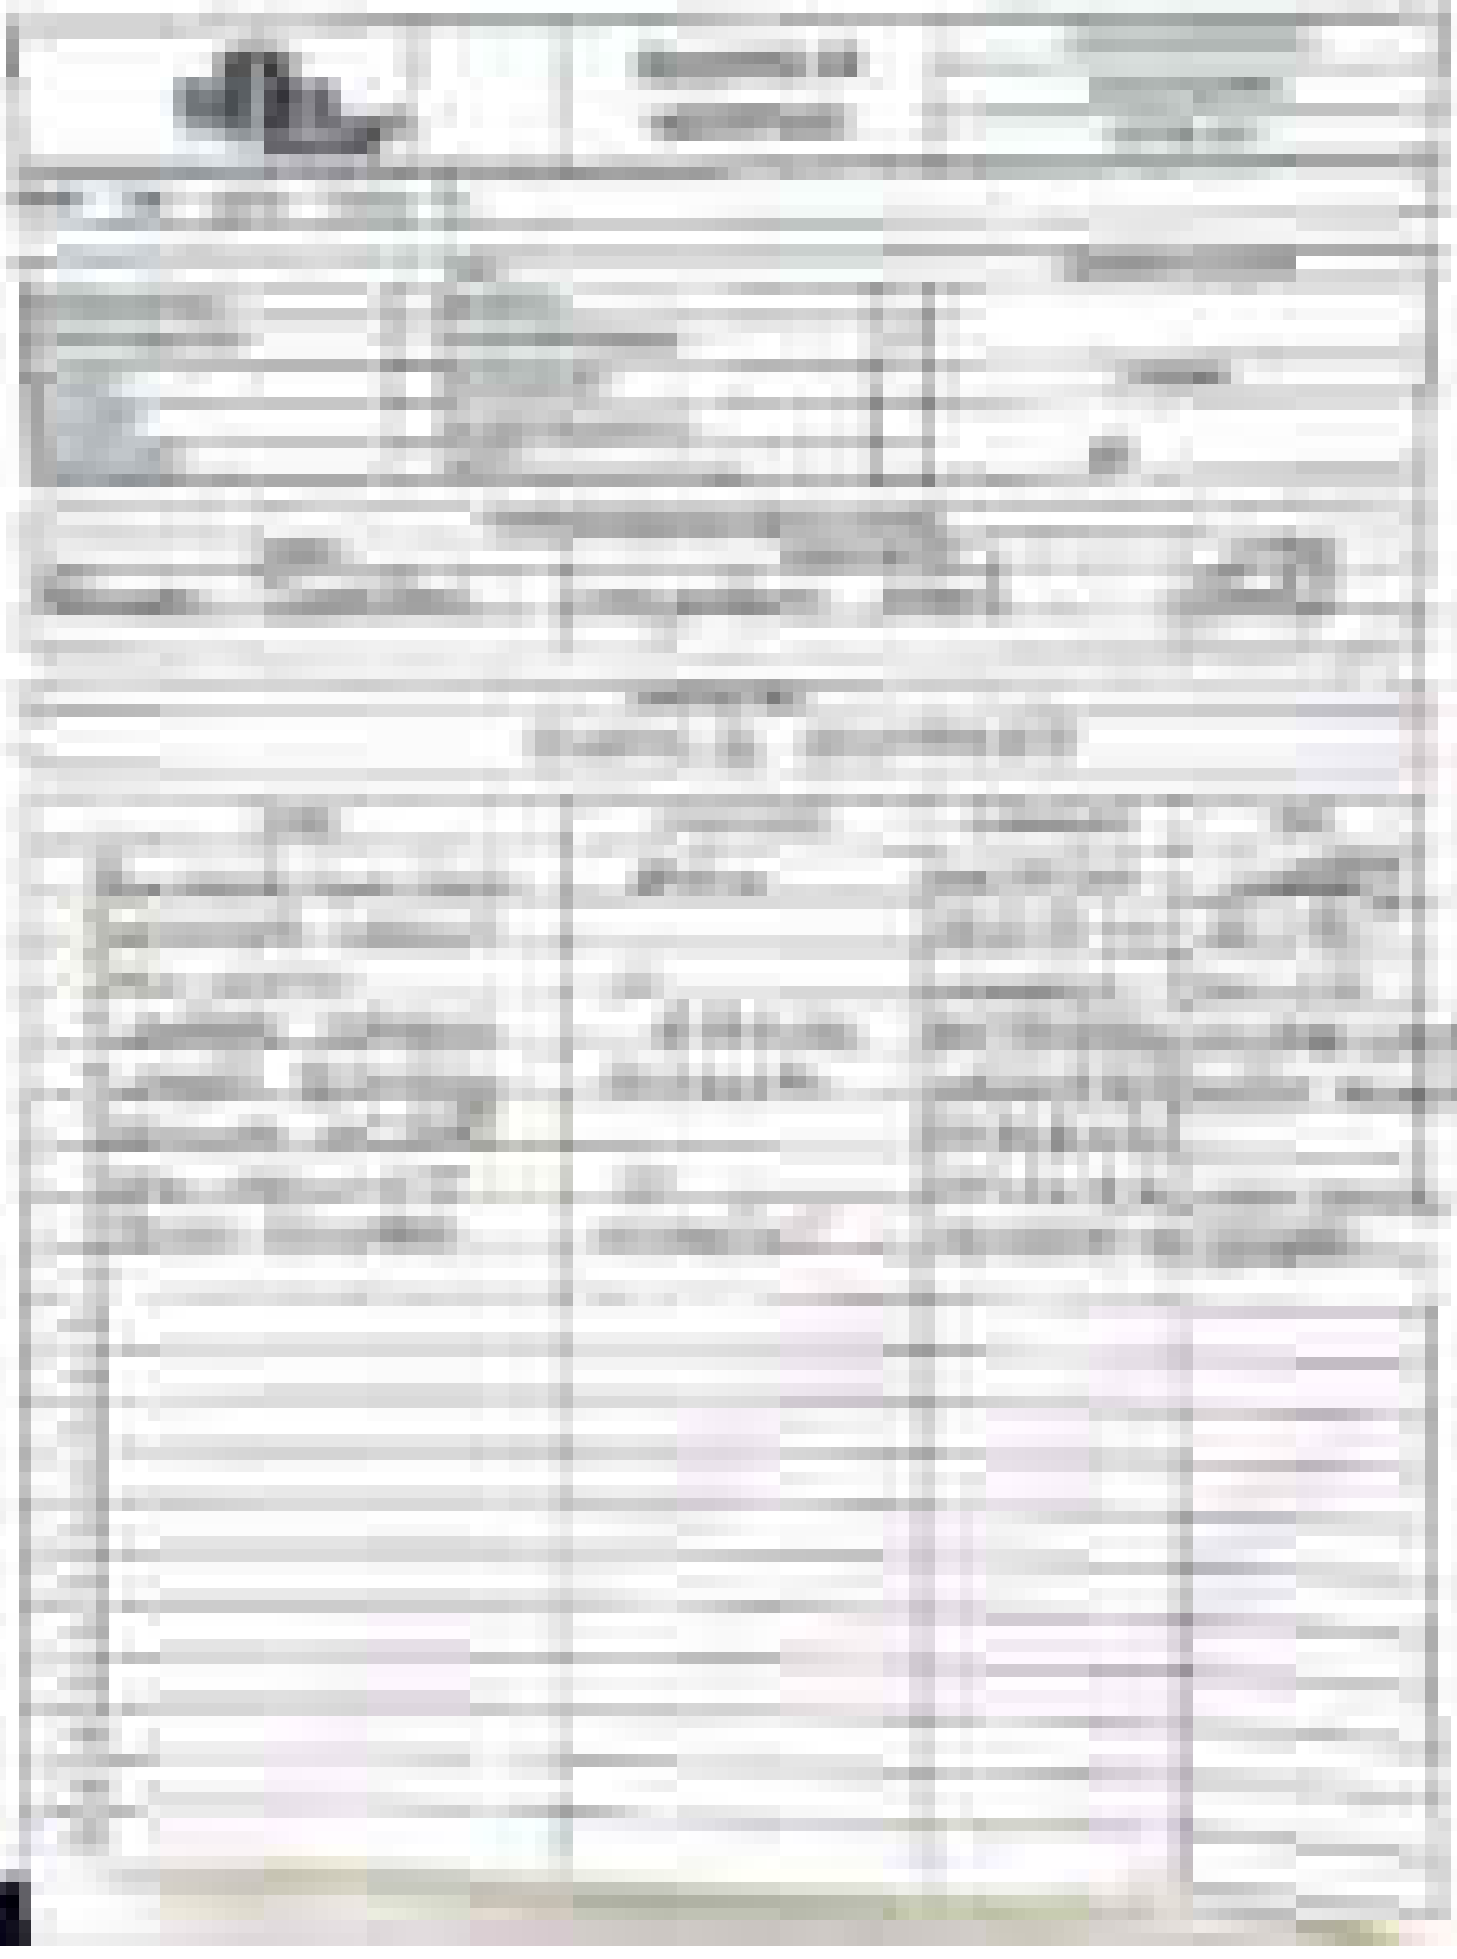

REGISTRO DE INDUCCIONES
