INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

INFORME FINAL
(Diciembre 21- Abril 07 de 2023)

CONTRATO 0253-SG-2022, REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

ADRIANA RODRIGUEZ
INGENIERIA

VILLAVICENCIO

CONTENIDO

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 4
3. CONDICIONES DEL CONTRATO 5
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
3.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 5
4. RELACION DEL PERSONAL, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 6
5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO 6
6. AVANCE FÍSICO. 7
7. PÓLIZAS 23
8. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES 40

ADRIANA RODRIGUEZ
INGENIERIA

1. INTRODUCCION.

Este informe tiene como finalidad presentar la información general y especifica del contrato de obra "**CONTRATO 0253-SG-2022, REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"** y presentar detalladamente el desarrollo de cada actividaden cumplimiento de las condiciones contractuales. La información contenida incluye aspectos como antecedentes, finalidad, localización del proyecto y condiciones del contrato.

Estas obras se realizaron bajo estándares de calidad generados mediante la experiencia y control del proceso constructivo, como la inspección de materiales, utilización de mano de obra calificada, equipos y herramientas de buena calidad. etc.; las actividades desarrolladas cumplen todos los parámetros de las normas establecidas por los entes correspondientes.

La información consignada en el presente informe está acompañada de los registros fotográficos de las actividades que se mencionan, para dar validez a cada una de ellas.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra N° 0253-SG-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES", fue asignado en culminación del Proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía Número SAMC-0009-SG-2022, adjudicado mediante resolución N° 0000190 del 28 de noviembre de 2022, , el cual fue celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA el día 01 de diciembre de 2022 y con acta de inicio del 21 de diciembre de 2022.

El día 02 de marzo de 2023 se radica la solicitud de las condiciones iniciales contractuales ya que una vez se da inicio a las actividades contratadas se evidencia que estas no estaban acorde a lo encontrado en obra, el 07 de marzo de 2023 se realiza la aprobación del acta modificatoria y adicional para continuar con la ejecución y finalización del contrato N° 0253-SG-2022.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°	0253-SG-2022
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
CONTRATISTA	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE FEBRERO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$174.479.287,85
PRORROGA 1 (OTRO SI 1)	14 DIAS CALENDARIO
NUEVA FECHA TERMINACION	07 DE MARZO DE 2023
PRORROGA 2 (OTRO SI 2)	30 DIAS CALENDARIO
NUEVA FECHA TERMINACION	07 DE ABRIL DE 2023
ADICIONAL 1	$89.450.096,29
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 268.929.384,14

3.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 268.929.384,14
AVANCE %	100%

4. RELACION PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLA	MES	VALOR
1052056210	DICIEMBRE	$83.000
1052083472	ENERO	$928.200
1053520105	ENERO	$16.800
1053059447	FEBRERO	$658.200
1053521037	FEBRERO	$80.900
1053285559	MARZO	$599.000
1053521037	MARZO	$80.900
1053854075	ABRIL	$252.300
1053870925	ABRIL	$18.900

5. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

Se conto con el siguiente equipo en la obra para la ejecución de las actividades:

1. Equipos y herramienta menor

- Picas
- Palas
- Carretillas
- Pulidoras
- Discos de corte
- Taladro
- Rotomartillos
- Andamios
- Mezcladora
- Rana compactadora
- Pisón
- Malacate

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRTATO.

En el periodo correspondiente al 21 de diciembre de 2022 al 07 de abril se realizaron las siguientes actividades, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la supervisión. Se anexan memorias de calculo de las actividades ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
	PRELIMINARES			
1.3	Desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios (lavamanos, lavamanos quirúrgico, sanitario orinales etc.). Incluye taponamiento provisional de puntos hidráulicos y sanitarios, traslado hasta lugar de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto, reinstalación, conexión a puntos hidráulicos y sanitarios, suministro de elementos de conexión, (sifones, accesorios, acoples) y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	3,00	Se realiza el desmonte y reinstalación de 3 lavamanos quirúrgicos a los cuales se le realiza la instalación de accesorios y sellado con sikaflex en espacios del elemento y muro. actividad al 100%.
1.4	Desmonte y reinstalación de mesas de necropsias. Incluye retiro hasta sitio de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto. Incluye taponamiento temporal de puntos hidráulicos y sanitarios, chazos expansivos de acero inoxidable 3/8" x 2", conexiones a puntos hidráulicos y sanitarios, elementos de conexión (sifones, canastillas de acero inoxidable, accesorios de PVC, tornillos) y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	7,00	Se realiza el desmonte y reinstalación de 7 mesas de necropsias, las cuales se nivelaron y anclaron al piso, se realiza la instalación de accesorios de pvc y sellado con sikaflex en espacios entre el elemento y muro. actividad al 100%.
1.5	Desmonte y reinstalación de superficies de trabajo en acero inoxidable (1,20 m. x 0,60 m.). Incluye desmonte, traslado hasta sitio de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto, elementos de instalación, tornillos, sellado de juntas y demás elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6,00	Se realiza el desmonte y reinstalación y anclaje a muro de 6 mesas de trabajo en acero inoxidable, con su respectivo sellado de juntas con sikaflex. actividad al 100%.
1.6	Demolición de cárcamos en concreto de 0,40 m. de ancho por 0,30 m. de profundidad. Incluye retiro de rejilla y su traslado hasta lugar de depósito temporal indicado por el Instituto. Incluye	ML	9.55	Se realiza la demolición de cárcamos divididos en 3 estructuras existentes. Actividad ejecutada al 100%

	desmonte de marco metálico. Incluye cargue y retiro de escombros de demolición a botadero autorizado. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución.			
1.7	Demolición de sobre piso en concreto, espesor existente 0,12 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución. (Bajo mesas de necropsia).	M2	6,60	Se realizo la demolición de sobrepisos localizados bajo las mesas de necropsias, con una cantidad final de 4,20 m2.
1.8	Pase de viga de cimentación longitud 0,40 m. y diámetro 4 pulgadas. Incluye retiro de escombros a botadero autorizado. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución.	UN	11,00	Se realizo demolición para 11 pase de vigas para instalación de tubería sanitaria.
1.10	Desmonte de cielorraso en PVC, dry wall o fibra mineral, incluye retiro de material a botadero autorizado	M2	161,62	Se realizo el desmonte de 142,56 m2 de cielo raso, 131,80 m2 de cielo raso en pvc en la sala de necropsias y servicios y anexos y 10,76 m2 en drywall o fibra mineral en cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos, cuarto de almacenamiento de sustancias químicas y auditorio del edificio administrativo.
1.11	Desmonte y posterior reinstalación de lámparas de iluminación ubicadas en cielorraso. Incluye retiro hasta el sitio de depósito temporal dentro de la sede del Instituto.	UN	6,00	Se realizo el desmonte de 21 luminarias, pero dentro de la modificación de condiciones contractuales iniciales solo se debe realizar la reinstalación de 6 luminarias, debido a que se realizo la reposición de lámparas en sala de necropsias y servicios anexos.
	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
2.1	Excavaciones en tierra, recebo o cualquier material para instalaciones sanitarias. Incluye cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución.	M2	31,62	Se realizo excavación en toda el área de la sala de necropsias y sala auxiliar de necropsias con el fin de reemplazar el material existente, en los cuartos anexos se realiza excavación de zanjas para instalación

				de tubería, con un total de actividad ejecutada de 34,38 m2.
2.2	Base en recebo compactado B200 para soporte o base de tubería sanitaria, de 15 cm. de espesor y 15 cm de espesor sobre cota clave de tubería. Incluye disposición y apisonamiento manual de material, nivelación o pendientado y todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	M2	28,70	Se realizo el relleno con material debidamente compactado en toda el área de la sala de necropsias y sala auxiliar de necropsias y en los cuartos anexos donde se realizó la excavación en zanjas para instalación de tubería., con un total de actividad ejecutada final de 33,70 m2
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
3.1	Placa de contrapiso espesor de 12 a 15 cm. en concreto de 3000 PSI, para reposición de placa en sitios de demolición. Incluye refuerzo en varilla corrugada de 1/2" cada 30 cm en ambos costados, malla electro soldada de 4mm (0.15*0.15), puente de adherencia epóxico Sikadur 32 o similar mínimo cada 30 cm. en ambos costados. Incluye todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	M2	5,91	Se realizo la construcción de placa de contrapiso en las secciones de servicios anexos de la morgue, en donde se llevó a cabo la excavación de zanjas para reposición de tubería, con un total de actividad ejecutada final de 7,45 m2.
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
4.1	Caja de inspección en mampostería, dimensiones de 0,70 m. x 0,70 m. x 0,70 m, medidas internas, placa de piso en concreto 3000 psi e= 0.15 m con refuerzo 60000 psi en varillas de 1/2" cada 15 cm en ambos sentidos, muros en ladrillo tolete cocido, tapa en lámina alfajor de 1/8" (doblada en C de 1") de 0.76 x 0.76 m en dos hojas de 0.76 x 0.36 m con contramarco de 1,1/4" espesor 3/16"embebido con uñas de anclaje , bisagras de pistón laterales de apertura 180° cada hoja, dos manijas retractiles cada tapa, tapa luz en platina de 1" de 1/8", anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte. Incluye retiro de sobrantes a botadero autorizado. Incluye todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	UN	3,00	Se realizo la construcción de 3 cajas de inspección localizadas en la parte externa de la sala de necropsias, de acuerdo a las condiciones contractuales.
4.3	Construcción de cárcamo en concreto reforzado con malla eletrosoldada m 84, de 0,40 m. de ancho x 0,15 m. de profundidad (medidas internas), muros en ladrillo= 0.15 m. incluye, pañete impermeabilizado esmaltado 1:3, mediacañas en todos sus vértices. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ML	10,55	Se realizo la construcción de 4 cárcamos, con una cantidad total ejecutada de 10,45 ml.

4.4	Construcción de red hidráulica en tubería PVC RDE 9, de ½". Incluye accesorios, limpiador, soldadura PVC, abrazaderas tipo pera o trapecio (para tramos descolgados) y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento	ML	15,00	Se realizo la construcción de 15 ml de red hidráulica de ½" en la parte externa para conexión de llave de jardín.
4.5	Construcción de punto hidráulico AF de 1/2". Incluye tubería PVCP, RDE 9, accesorios, limpiador, soldadura, regatas, resanes, cargue y retiro escombros a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	UN	23,00	Se realizo la construcción de 23 puntos hidráulicos acordes a la revisión y ajustes al diseño hidrosanitario previamente aprobado por la supervisión.
4.6	Suministro e instalación llave de jardín 1/2" x 3/4". Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	14,00	Se realizo la instalación de 6 llaves de jardín, 5 unidades en la parte interna, 1 en la zona externa.
4.7	Suministro e instalación de registro de corte hidráulico (Válvula de bola de 1/2 "), metálico tipo Grival. Incluye instalación en muro, conexiones, regata para instalación de tapa, tapa registro plástica 15 x 15 cm., cinta teflón, pruebas de presión, accesorios PVC, limpiadores, soldadura y demás elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento.	UN	7,00	Se realizo la instalación de 9 registros de corte hidráulico de ½", distribuidos en la sala de necropsias y servicios anexos.
4.8	Punto Sanitario de 2" (codo o sifón). Incluye tubería PVCS, accesorios, limpiador, soldadura PVC y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	UN	6,00	Se realizo la instalación de 6 puntos sanitarios, distribuidos en la sala de necropsias, sala de necropsias auxiliar, cuarto de aseo y cuarto RX
4.9	Punto Sanitario de 3" (sifón). Incluye tubería PVCS, accesorios, limpiador, soldadura PVC y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	UN	13,00	Se realizo la construcción de 13 puntos sanitarios
4.10	Punto sanitario de 4" (tapón de inspección roscado). Incluye tubería PVCS, accesorios, limpiador, soldadura PVC, Tapón de inspección de aluminio tipo colregilla o similar, y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. (Según diseño)	UN	5,00	Se realizo la construcción de 5 puntos de sanitarios (tapones de inspección) localizados, 3 en la sala de necropsias, 1 en la sala de necropsias auxiliar y 1 en el pasillo de aseo, con sus respectivas tapas de

				inspección en aluminio según diseño presentado por la entidad.
4.11	Punto Sanitario de 4" (codo). Incluye tubería PVCS, accesorios, limpiador, soldadura y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	UN	7,00	Se realizo la construcción de 7 puntos sanitarios localizados bajo cada mesa de necropsias, acorde a la revisión y ajustes del diseño previamente presentados a la entidad y aprobados por la supervisión.
4.12	Red sanitaria en tubería PVCS 2". Incluye tubería, instalación y nivelación o pendientado, accesorios, limpiador, soldadura PVC, retiro de sobrantes a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ML	2,00	Se realizo la construcción de 4,10 ml de red sanitaria, acorde a la revisión y ajustes del diseño previamente presentados a la entidad y aprobados por la supervisión aumentando en 2,10 ml las condiciones iniciales.
4.13	Red de reventilación en tubería PVC de 2" incluye regatas en muros, tubería, accesorios, limpiador, soldadura PVC, protección tipo cuello de ganso sobre cubierta, retiro de sobrantes a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ML	21,10	Se realizo la construcción de 21,10 ml de red de ventilación en la sala de necropsias.
4.14	Red sanitaria en tubería PVCS 3", incluye tubería, instalación y nivelación o pendientado, accesorios, limpiador, soldadura PVC. Incluye retiro de sobrantes a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ML	12,22	Se realizo la instalación de 10,22 Ml de red sanitaria PVCS 3", acorde a la revisión y ajustes del diseño previamente presentados a la entidad y aprobados por la supervisión ejecutando menor cantidad contractual.
4.15	Red sanitaria en tubería PVCS 4", incluye tubería, instalación y nivelación o pendientado, accesorios, limpiador, soldadura PVC. Incluye retiro de sobrantes a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ML	47,35	Se realiza la instalación de 47,35 ml de red sanitaria en tubería PVCS 4", acorde a la revisión y ajustes del diseño previamente presentados a la entidad y aprobados por la supervisión ejecutando menor cantidad contractual.
4.16	Red sanitaria en tubería PVCS 6", incluye tubería, instalación y nivelación o pendientado, accesorios, limpiador, soldadura PVC. Incluye retiro de sobrantes a botadero autorizado y	ML	2,96	Se realizo la instalación de 2,12 ml de red sanitaria PVCS 6", localizada en la parte

	todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.			externa para conexión entre cajas, ejecutando menor cantidad contractual.
	PAÑETES			
5.1	Pañete impermeabilizado 1:3 para recubrimiento de muros o en zonas afectadas por humedad o deterioradas. Incluye filos, dilataciones, medidas inferiores a un metro, carteras de vanos, puertas y ventanas, resanes de regatas. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	M2	96,41	Se ejecuto una cantidad final de 94,41 m2 de pañete impermeabilizado, actividad que se realizo en muros externos, se debió aplicar pañete en el cuarto de almacenamiento de sustancias peligrosas debido al alto grado de afectación que tenían las paredes y debió incluirse el pañete para las cajas de inspección.
	BASES Y PISOS			
6.1	Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. x 0.30 m. ó 0.33 m. 0.33 m. a junta perdida, color blanco Huila Grano 1. Incluye corte con pulidora, juntas en PVA con cemento blanco concretero y marmolina blanca o carbonato de calcio, destrocado, pulido, sellado, brillado y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado	M2	131,8	Se realizo la instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0,30x0,30 en 119,52 m2, cubriendo así el área total de la sala de necropsias y servicios anexos.
6.2	Construcción de guarda escoba media caña en granito pulido de 0,10 m. x 0,10 m., R=0,02 m. embebida en muros y piso, con terminado a ras de muro y piso, espesor mínimo de 2.5 cm. color igual o similar al color del piso. Incluye dilatación en PVC, cortes con pulidora, pulida, sellada y brillada y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado.	ML	105,18	Se realizo la instalación de guarda escoba media caña según especificaciones, en un área total de 91,11 ml, cubriendo así el área total de la sala de necropsias y servicios anexos.
6.3	Suministro e instalación de piso tablón de gres grafilado, color y tamaño igual al existente (para andén). Incluye dilataciones o franjas en granito lavado, de grano, medidas y color iguales a las existentes. Incluye material de pega, boquilla y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado. Se deben homologar las características del piso existente en apariencia e instalación.	M2	14,00	Se realizo la instalación de tablón de gres grafilado en 13,62 m2, distribuidos en la zona externa donde debió demolerse para la salida de la tubería sanitaria para conexión con las cajas de inspección y a solicitud de la entidad en la zona de ingreso

				(portería) y zona de ingreso a la bahía de recepción de cadáveres.
	ESTUCO Y PINTURA			
9.3	Suministro e instalación de pintura Koraza 5 años para exteriores, dos manos, color a escoger, incluye filos y dilataciones. Incluye medidas inferiores a 1.00 m (portería)	M2	364,21	Se realizo la aplicación de pintura tipo koraza en la zona externa del bloque de la morgue, en un área de 294,07, y en el área de ingreso a las instalaciones de medicina legal, dando cantidad total ejecutada 358,50m2, con una cantidad menor a la contractual.
9.6	Mantenimiento de marcos y puertas metálicas. Incluye anticorrosivo, lijada y pintura en esmalte semimate a dos manos, color a escoger. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	M2	45,00	Se realiza el mantenimiento al portón de ingreso a la bahía de descargue de cadáveres y el portón de ingreso al parqueadero, con un área total trabajada de 53,56 m2.
	VARIOS			
10.1	Suministro e instalación de rejilla metálica de 0,20 m. de ancho para cárcamo, en tubo cuadrado de acero inoxidable de 1" x 1" y marco en ángulo de acero inoxidable en 1,1/4", con uñas de anclaje en el mismo material, incluye instalación de marco en placa de contrapiso, y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ML	1,00	Se realizo la instalación de rejilla metálica con su respectivo marco en acero inoxidable de 0,20 m de ancho en cárcamo localizado al ingreso de la sala de necropsias.
10.2	Suministro e instalación de marco para rejillas de cárcamos, de 40 cm. de ancho, en ángulo de acero inoxidable de 1,1/4" x 1,1/4" x 1/4", con uñas de anclaje, incluye nivelación y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ML	10,55	Se realiza la instalación de 9,55 ml de marco para rejillas de cárcamos en acero inoxidable.
10.3	Suministro e instalación de protectores guarda camillas para áreas de circulación de la sala de necropsias: guarda camillas IPC. Ref 700, con estructura de soporte en aluminio completa y plástico de alto impacto y jumper interior para amortiguar golpes, dimensiones de 7 3/4" (197 mm) ancho x 1 " (25mm), color igual o similar a existente, anclaje de soporte de aluminio a muro, con chazos expansivos de 1,1/2" de largo x 5/8" mínimo 8 unidades por metro lineal y máximo cada 34 cm de distancia y con tornillo de 3/16". Incluye todos los materiales,	ML	12,80	Se realizo la instalación de 5,94 ml guarda camillas como cantidad final.

	accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en sitio.			
10.4	Suministro e instalación terminales para guardacamillas IPC Ref. 700, color a escoger, ancladas a riel en aluminio con mínimo dos (2) tornillos. Incluye todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	16,00	En concordancia con los guardas camillas se instaló un total de 8 unidades de terminales para guarda camillas.
10.5	Suministro e instalación de tragante metálica - aluminio tipo cúpula de 5" x 3"para instalación en sifones de cárcamos. Incluye todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6,00	Se realizo la instalación de 6 tragantes metálicas tipo cúpula, distribuidos en los 4 cárcamos construidos. %.
10.6	Suministro e instalación de rejilla de ventilación plana 20 x 20 cm aluminio, incluye cortes con pulidora, regatas, remates estucado y pintura de los resanes	UN	2,00	Se realizo la instalación de 2 rejillas de ventilación en los cuartos de aseo ubicados en la zona de recepción de cadáveres.
10.7	Suministro e instalación de esquineros en ángulo de aluminio cepillado color natural 2"x 2", espesor 3/16" H=1.0 m, anclados a los muros mediante chazos expansivos ¼, "tornillo avellanado 8X2". Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	9,00	Se realizo la instalación de 1 unidad de esquinero en ángulo de aluminio, puesto que de acuerdo a la existencia de otros elementos en los muros no permitía la instalación y tampoco se requería la protección del muro.
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP 01	Placa de contrapiso espesor de 10 cm. en concreto de 3000 PSI, para reposición de placa en sitios de demolición. Incluye refuerzo en, malla electro soldada de 4mm (0.15*0.15), Incluye todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	M2	81,13	Se realizo la construcción de 81,13 m2 de placa de contrapiso en el área de la sala de necropsias y sala auxiliar de necropsias, , previa instalación de malla electrosoldada se realiza el uso de sikaset L, acelerante para concreto.
NP 02	Construcción de red hidráulica en tubería PVC RDE 21, de 1". Incluye accesorios, limpiador, soldadura PVC, abrazaderas tipo pera o trapecio (para tramos descolgados) y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento	ML	27,00	Se realizo la construcción de 29 ml de red hidráulica PVC RDE 21 de 1", ejecutando una mayor cantidad de 2 ml de acuerdo a la necesidad existente.

NP 03	Suministro e instalación de Cielo Raso en PVC sistema GSP plano - tipo decorline E=9 mm de altura y ancho lámina 30 cm incluye claraboyas de inspección de 60 x 60 en PVC con marco y contramarco en aluminio blanco cada 3 metros aproximadamente en los dos sentidos; se debe instalar seccionado en tramos no superiores a 3 metros. Incluye claraboyas de inspección, remates laterales, uniones y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento. (Sala de necropsias y cuartos anexos)	M2	131,63	Se realizo la instalación de 131,63 m2 de cielo raso en PVC en la sala de necropsias y servicios anexos con sus respectivos elementos para su correcta instalación y funcionamiento.
NP 04	Suministro y aplicación de Pintura Supe Lavable Tipo 1 a tres manos para muros (color blanco). Incluye medidas menores a 1.00 m., incluye filos y dilataciones y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución.	M2	266,81	Se realizo la aplicación de pintura super lavable tipo 1 en las zonas donde funcionan el área administrativa del bloque de la morgue, dando una cantidad total aplicada de 328,26 m2, siendo una cantidad mayor a la contractual.
NP 05	Reparación de humedades en mampostería existente, con sika Imper Mur (Resina acuosa de impregnación) a dos manos, previa aplicación de ácido aceito para el control de moho en muros y paredes, en área completa desde el nivel de guarda escoba con presencia de humedades. Incluye retiro de pintura y estuco dañados con espátula y grata metálica. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado y todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	M2	498,88	Debido al avanzado estado de deterioro presentado en muros se realiza la reparación de humedades con resina acuosa en 526,19 m2, previa aplicación de ácido acético, ejecutando una mayor cantidad de 27,31 m2.
NP 06	Suministro y aplicación de Estuco Zócalo en muros. (Incluir área completa con presencia de humedades desde el nivel de guarda escoba, incluye lijado, filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado)	M2	384,54	Debido al avanzado estado de deterioro por la presencia de humedad y paso del tiempo presentado en muros se debió realizar la actividad en 471,56 m2, aumentando las cantidades contractuales en 87,12 m2.
NP 07	Suministro e instalación de Pintura Epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros interiores en zonas asépticas, de dos componentes (componente A, pintura epóxica, componente B catalizador poliamídico, acabado semibrillante, tres manos, color blanco (área morgue y servicios anexos).	M2	436,45	Se realizo la aplicación de pintura epoxica poliamida de doble componente en un área total de 426,17 m2.
NP 08	Revisión, ajuste y diseño final de Redes Sanitarias y Filtro de Drenaje, incluye el diseño de desagües de mesas de necropsias, desagües a cajas, red principal incluyendo ubicación de redes sanitarias existentes de acuerdo con los niveles encontrados en la excavación, al diseño propuesto por la entidad y a las características del lugar.	UN	1,00	Se realizo la revisión y ajuste final del diseño de redes sanitarias y filtro de drenaje tipo francés, el cual es presentado previo al inicio de actividades correspondientes a la

				instalación de tubería a la supervisión para revisión y aprobación.
NP 09	Demolición de afinado de piso en concreto simple, espesor hasta 11 cm. incluye demolición de afinado, terminado de piso (en cualquier material), demolición de mediacaña y/o guarda escoba, cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado, trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. (Sala de necropsias y servicios anexos)	M2	131,8	Se realizo la demolición de afinado en concreto simple el cual tiene espesores que van hasta los 11cm, la actividad se llevó a cabo en morgue y servicios anexos.
NP 10	Demolición de Placa de Contrapiso en concreto espesor hasta10 cm. Incluye cortes con pulidora, cargue, retiro, disposición final de escombros en botadero autorizado, trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. (Sala de necropsias y servicios anexos)	M2	87,04	Se realizo la demolición de toda la placa de contrapiso en la sala de necropsias, sala de necropsias auxiliar. En las zonas de servicios anexos se realiza el corte con pulidora y demolición de las secciones a excavar para desmonte e instalación de tubería.
NP 11	Demolición de los Terminados de Piso en tablón de gres grafiado, Incluye dilataciones o franjas en granito lavado, cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado	M2	14,00	Se realizo la demolición de 10,13 m2 de tablón en la parte externa en los puntos de salida de la tubería a las cajas de inspección y 3,50 m2 en diferentes puntos donde el tablón se encontraba deteriorado.
NP 12	Demolición Cajas de Inspección de cualquier dimensión, con espesores de muros hasta 15 cm, incluye la demolición del elemento completo, pañetes, acabados, tapas en concreto, cargue y retiro escombros hasta botadero autorizado.	UN	8,00	Se realizo la demolición de 6 cajas de inspección ubicadas al interior de la sala de necropsias, 1 en la sala de necropsias auxiliar y 1 en la zona externa.
NP 13	Desactivación y Vaciado de Material Biológico encontrado en cajas de inspección de sala de necropsias, Incluye retiro y disposición final de lodos y material biológico en sitio autorizado	UN	7,00	Las cajas de inspección localizadas en la parte interna se encontraban colmatadas por lo cual se hizo necesario realizar la desactivación y vaciado debido al tipo de residuos líquidos hallados allí.
NP 14	Desmonte y reinstalación de Guarda Camillas. existentes en PVC. Incluye todos los materiales, accesorios y herramientas para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	42,91	Se realizo el desmonte y reinstalación de guardacamillas, los cuales son lavados previa instalación.
NP1 5	Desmonte y reinstalación de Muebles y Elementos anclados a muros o a piso (estantería metálica, gabinetes, mesas, puestos de trabajo) - Incluye embalaje y traslado a sitio de almacenamiento indicado por la Entidad.	UN	27,00	Se realiza el desmonte y reinstalación de 27 muebles para poder ejecutar las actividades

				de aplicación de resina acuosa, estuco y pintura.
NP 16	Construcción Canal Aguas Lluvias para dar continuidad al existente, en concreto 3000 psi, homologando características y espesores del elemento existente.	ML	2,55	Se realizo la construcción de 2,40 ml de construcción de canal aguas lluvias para dar continuidad al existente, toda vez que se encontraba interrumpida la sección por la existencia de una caja de inspección.
NP 17	Suministro e instalación Grifería Cuello de Ganso Sencilla para mesas de necropsias, incluye desmonte, elementos necesarios para su correcta instalación y disposición de sobrantes en sitio autorizado.	UN	7,00	Se realizo la instalación de 7 grifos tipo cuello de ganso en cada mesa de necropsias. actividad al
NP 20	Suministro e instalación de Granito Lavado para bordillo de 0,40x,0,30 m, en rampa de acceso a sede administrativa, incluye dilataciones plásticas cada 1,5 metros.	ML	23,40	Previa demolición del granito existente se procedió a realizar la instalación de 22,74 ml de granito lavado con sus respectivas dilataciones plásticas en el muro de acceso a la sede administrativa.
NP 21	Construcción Filtro Tipo Francés, en tubería PVCS 2" (0,30*0,30 m y pendiente de 2%) con perforaciones de 1/2" cada 10 cm en el 75% de la superficie del tubo (3 filas de perforaciones en la periferia), con batea constante de 1/4 de la periferia (90°), (Incluye tubería, accesorios PVC, grava 1", geotextil NT1600s traslapado 0,30m y demás accesorios para su correcta instalación) (Sala de necropsias y cuarto de sépticos)	ML	55,20	Se realizo la instalación de tubería previamente perforada según indicaciones de la supervisión y diseño aprobado, en área perimetral interna de la sala de necropsias y sala de necropsias auxiliar, dando un total ejecutado de 57,20 ml.
NP 22	Suministro e instalación de Registro de Corte Hidráulico, PVC 1", (Válvula Bola 1pulg PVC Soldar tipo pesada PCP) Incluye instalación en muro, conexiones, regatas para instalación de tapa, tapa registro plástica 20 x 20 cm, pruebas de presión, accesorios PVC, limpiadores, soldadura y demás elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento.	UN	1,00	Se realizo la instalación de registro de paso PVC de 1" en la sala de necropsias.
NP 23	Conexión de Poceta de Mesa de Necropsias en tubería PVCS de 2" de diámetro, desmontable, incluye tubería PVCS hasta 2 ml, accesorios PVC, unión universal roscada, conexiones a sosco metálico existente, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución	UN	7,00	Se realizo la instalación de conexión de poceta en las 7 mesas de necropsias, según ajuste al diseño presentado y aprobado por la supervisión.

NP 24	Desmonte de Instalaciones Eléctricas (normal, regulado, iluminación, voz y datos) de áreas de sala necropsias y áreas anexas; (incluye retiro de tuberías, cajas de paso, cableado desde salidas eléctricas hasta tablero de distribución, aparatos eléctricos retiro y disposición final en botadero autorizado o sitio donde la Entidad indique, identificación y marcación de circuitos y demás elementos eléctricos.	UN	1,00	Se realizo el desmonte de instalaciones eléctricas en piso y en techo. La tubería retirada y cables son entregados a la entidad.
NP 25	Desmonte, retiro de Acometida Eléctrica en cable de cobre calibre 3x4F+4N+6T AWG de interconexión entre tablero de distribución general TSG cuarto de subestación y tablero TBP - 1E Bloque patología; (incluye desconexión, corte visible y efectivo, bloqueo y señalización, marcación y traslado al sitio indicado por la Entidad y demás elementos consumibles para su correcta ejecución)	ML	43,00	A solicitud de la necesidad presentada por la entidad y previa aprobación de modificación de condiciones contractuales iniciales se realizó el desmonte de la acometida eléctrica existente, para lo cual se debió hacer uso de herramientas como malacate. Se desmonta un total de 46 ml, aumentando en 3 ml de mayor cantidad a la contractual; el cable desmontado fue entregado a la entidad.
NP 26	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Salida a 120V para tomacorriente GFCI empotrada, 2P+T 15A 120V, circuito compartido; (incluye cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH, conectores para empalme, tapa protección Waterproff, tapa, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	19,00	Se realizo la instalación para 19 puntos de salida 120V para tomacorriente GFCI con sus respectivas tapas Waterproff, la localización se realiza de acuerdo a las indicaciones de la supervisión.
NP 27	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada color naranja en canaleta, grado hospitalario 2P+T 15A 120V, circuito compartido; (incluye cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH, caja de superficie dexson para canaleta 100x45 sobreponer, conectores auto desforre, tapa, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	3,00	Se realizo la instalación de 3 salidas para toma corriente naranja, distribuidos en 1 sala de necropsias, 1 cuarto RX y 1 cuarto muestras, la ubicación se realiza de acuerdo a lo requerido por el Ing Favio Martínez, apoyo a la supervisión.
NP 28	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, tubería conduit EMT de 3/4", cajas de paso, caja 5800, conectores para empalme, soportaría necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	**UN**	8,00	Se realizo la instalación de 12 salidas para interruptores sencillos. la ubicación se realiza de acuerdo a lo requerido por el Ing Favio Martínez, así como la mayor cantidad de obra ya que se envía a cero la actividad de interruptores dobles.

NP 30	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación; (incluye tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-120V, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, tubería conduit EMT de 3/4", cajas de paso, caja 2400, conectores para empalme, soportaría necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	15,00	Se realizo la instalación para 15 salidas de iluminación que corresponde a las 15 luminarias a instalar, la distribución y localización se realiza de acuerdo a las indicaciones realizadas por el el Ing Favio Martínez, apoyo a la supervisión.
NP 31	Suministro e Instalación de Luminaria Tipo Panel Led 60X60 40W, 6500K, 4226lm, IP65 montaje de incrustar o descolgar, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y clavija, driver multivoltaje, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento).	UN	18,00	Se realizo la instalación de 18 luminarias tipo led 60x60 IP65, según indicaciones de la supervisión se instalaron en sala de necropsias, sala de necropsias auxiliar, cuarto de rx y cuarto de muestras.
NP 32	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4" para circuitos alimentadores; (incluye, uniones, curvas, boquillas terminales, cajas de paso en aluminio inyectado con tapa, soportaría necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	ML	10,00	Se realizo la instalación de 18 ml de tubería Conduit EMT ¾, aumentando en 8 ml la cantidad contractual, haciendo los respectivos descuentos por punto.
NP 33	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Tubería Conduit IMC de 1" para circuitos de distribución; (incluye, uniones, elaboración de roscas con terraja, boquillas terminales, soportaría necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	ML	23,70	Se realiza la instalación de 21 ml, con esta cantidad menor ejecutada se satisface el 100% de la necesidad.
NP 34	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tubería de 1", tapa y empaque, circuitos de distribución; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	2,00	Se realizo la instalación de 4 conduletas en aluminio inyectado para tubería IMC de 1", a solicitud de la supervisión se distribuyeron 3 en la parte externa y 1 sobre cielo raso.
NP 36	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Canaleta de superficie plástica dexson o similar 100x45 con división y tapa; (incluye accesorios como uniones, ángulos externo e internos, derivaciones, ángulos planos, tapa final, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	ML	2,00	Se realizo la instalación de 2 ml de canaleta en el cuarto de muestras y rx. actividad al 100%.

NP 37	Suministro e Instalación de Luminaria Led Hermética T8 2x18W IP65 cuerpo plástico reforzado y difusor en policarbonato, driver multivoltaje; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento).	UN	1,00	Se realizo la instalación de 1 luminaria tipo led hermética en el cuarto de aseo de la sala de necropsias.
NP 38	Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, forro del asilamiento en lámina galvanizada o de aluminio, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).	M2	9,95	Se realizo la instalación de 8,80 m2 de ducto según especificaciones en la zona externa para futura conexión y puesta en marcha de la unidad de aire acondicionado.
NP 39	Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornillería, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).	M2	3,62	Se realizo la instalación de 3,62 m2 de ductos, en los puntos de inyección y extracción del aire existente ya que el existentes no eran funcional pues los mismos no estaban anclados al cielo raso que existía previamente.
NP 40	Rejilla difusora 3 vías de aire 14"X14", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).	UN	1,00	Se realizo la instalación de rejilla difusora de 3 vías 14”x14” para la posterior puesta en marcha de la unidad de aire acondicionado por parte de la entidad.
NP41	Suministro, instalación y puesta en servicio de Tablero de Distribución Trifásico enchufable para 42 Circuitos con espacio para totalizador, 225A, barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado o sobrepuesto).	UN	1,00	Se realizo la instalación de 1 tablero trifasico enchufable para 42 circuitos, según indicaciones de la supervisión.
NP 42	Suministro e Instalación de Breaker Industrial regulable en caja moldeable con disparador de sobrecarga 112-160A, 36KA. (incluye accesorios de instalación, terminales, cinta termoencogible y accesorios de fijación).	UN	2,00	Se realizo la instalación de 2 breaker industrial regulable en caja moldeable con disparador de sobrecarga 112-160A, 36KA en la subestación, según requerimiento de la supervisión.

NP 43	Suministro e instalación de Interruptor Tripolar Termo Magnético enchufable de 30 Amp. 10kA	**UN**	1,00	Se realizo la instalación de 1 Interruptor Tripolar Termo Magnético enchufable de 30 Amp. 10kA. según requerimiento de la supervisión.
NP 46	Suministro e instalación de interruptor monopolar termomagnético enchufable de 20 Amp. 10kA	**UN**	6,00	Se realizo la instalación de 10 interruptores monopolar termomagnético enchufable de 20 Amp. 10kA, y se envía a cero Interruptor Tripolar Termo Magnético enchufable de 20 Amp. 10kA- 20- 30 Amp. 10kA a solicitud de la supervisión.
NP 47	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de Salida Para Toma Especial alimentación marmita 50A 250V empotrada, circuito dedicado; (incluye descableado y cableado en cable 3x10 +12 AWG LSZH, caja 2400 doble fondo, tapa, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	**UN**	1,00	Se realizo la instalación de salida para toma especial para alimentación de marmita en la sala de necropsias auxiliar.
NP 48	Rejilla para toma de aire 16"X14", dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).	**UN**	1,00	Se realiza la instalación de rejilla para toma de aire 16”x14” para la posterior puesta en marcha de la unidad de aire acondicionado actividad que no esta incluida en el presente contrato.
NP 49	Suministro e instalación de conductores, Acometida en Cable de Cobre calibre 3x1/0F+1/0N+2T AWG LSZH de interconexión entre tablero de transferencia eléctrica Torre A y tablero TAB - 1E TALLER; (incluye bornas de ponchar estañadas, cinta termoencogible, marcación y demás elementos consumibles para su correcta instalación)	**ML**	43,00	De acuerdo a la necesidad presentada por la supervisión y de acuerdo a las condiciones aprobadas en el acta modificatoria 1, se realiza la instalación de la acometida en cable 3x1/0F+1/0N+2T AWG LSZH.
NP 50	Suministro e instalación de Cable Trenzado 3# 12 WG SHSZ conductor eléctrico	**ML**	30,00	Se realiza la instalación de 10 ml de cable trenzado 3# 12 WG SHSZ, siendo una menor cantidad, pero con la cual se satisface el 100% de la necesidad.

NP 51	Suministro e instalación de Ducto PVC conduit de 3/4" incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	**ML**	27,50	Se realizo la instalación de 30 ml de tubería pvc Conduit ¾".
NP 52	Suministro e instalación Enchape Para Muros (0.30 x .60 m) en zonas afectadas por la condensación producida por los cuartos fríos y cuarto de desechos, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	**M2**	29,06	Se realiza la instalación de 35,01 m2 de enchape para muros en zonas colindantes con el cuarto frio, en donde no hay un aislamiento adecuado, en el cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos se realiza para tener mejores condiciones de aseo y asepsia y en el cuarto de almacenamiento de sustancias peligrosas debido a que el tipo de material allí almacenado han invadido la mampostería.
NP 53	Suministro e instalación de conexión de Manguera de ½" súper reforzada 4 capas truper con refuerzo de tramado radial, con llave de regulación de 1/2 x 1/2 " cierre rápido y conector rápido para manguera de 1/2" plástico para mesas de necropsias , incluye todos los elementos necesarios para su perfecta instalación.	**UN**	7,00	Se realiza la instalación de 7 secciones de manguera superreforzada 4 capas de 2,80 m en cada mesa de necrospias, con llaves de regulación y conector rápido para manguera de ½".

7. PÓLIZAS

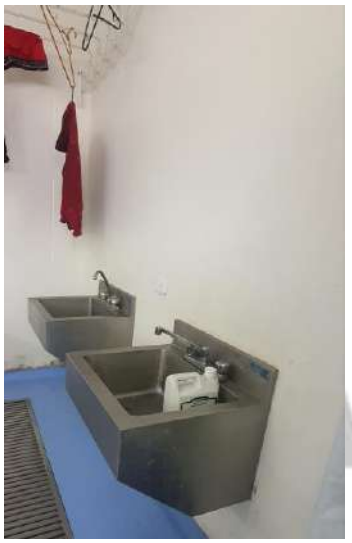
COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA		VR. ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	02/03/2023	07/04/2024	$26.892.938,30
	Prestaciones sociales	02/03/2023	07/04/2026	$13.446.469,15
	Estabilidad de la obra	07/04/2023	07/04/2028	$80.678.814,90
	Responsabilidad civil	05/12/2022	07/04/2023	$232.000.000,00

ADRIANA RODRIGUEZ MORA
Contratista

Anexos: Registro fotográfico.
Pagos seguridad social.

ANEXO FOTOGRAFICO

ITEM 1.3 Desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios (lavamanos, lavamanos quirúrgico, sanitario orinales etc.). Incluye taponamiento provisional de puntos hidráulicos y sanitarios, traslado hasta lugar de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto, reinstalación, conexión a puntos hidráulicos y sanitarios, suministro de elementos de conexión, (sifones, accesorios, acoples) y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

ITEM 1.4 Desmonte y reinstalación de mesas de necropsias. Incluye retiro hasta sitio de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto. Incluye taponamiento temporal de puntos hidráulicos y sanitarios, chazos expansivos de acero inoxidable 3/8" x 2", conexiones a puntos hidráulicos y sanitarios, elementos de conexión (sifones, canastillas de acero inoxidable, accesorios de PVC, tornillos) y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

ITEM 1.5 Desmonte y reinstalación de superficies de trabajo en acero inoxidable (1,20 m. x 0,60 m.). Incluye desmonte, traslado hasta sitio de depósito temporal dentro de la sede indicado por el Instituto, elementos de instalación, tornillos, sellado de juntas y demás elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

ITEM 1.6 Demolición de cárcamos en concreto de 0,40 m. de ancho por 0,30 m. de profundidad. Incluye retiro de rejilla y su traslado hasta lugar de depósito temporal indicado por el Instituto. Incluye desmonte de marco metálico. Incluye cargue y retiro de escombros de demolición a botadero autorizado. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución.





ITEM 1.7 Demolición de sobre piso en concreto, espesor existente 0,12 m. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución. (Bajo mesas de necropsia).









ITEM 1.8 Pase de viga de cimentación longitud 0,40 m. y diámetro 4 pulgadas. Incluye retiro de escombros a botadero autorizado. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución

ITEM 1.10 Desmonte de cielorraso en PVC, dry wall o fibra mineral, incluye retiro de material a botadero autorizado.

ADRIANA RODRIGUEZ

ITEM 1.11 Desmonte y posterior reinstalación de lámparas de iluminación ubicadas en cielorraso. Incluye retiro hasta el sitio de depósito temporal dentro de la sede del Instituto.

ITEM 2.1 excavaciones en tierra, recebo o cualquier material para instalaciones sanitarias. Incluye cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución.

ITEM 2.2 Base en recebo compactado b200 para soporte o base de tubería sanitaria, de 15 cm. De espesor y 15 cm de espesor sobre cota clave de tubería. Incluye disposición y apisonamiento manual de material, nivelación o pendientado y todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

ITEM 3.1 Placa de contrapiso espesor de 12 a 15 cm. En concreto de 3000 psi, para reposición de placa en sitios de demolición. Incluye refuerzo en varilla corrugada de 1/2" cada 30 cm en ambos costado, malla electro soldada de 4mm (0.15*0.15), puente de adherencia epóxico sikadur 32 o similar mínimo cada 30 cm. En ambos costados. Incluye todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 4.1 Caja de inspección en mampostería, dimensiones de 0,70 m. x 0,70 m. x 0,70 m, medidas internas, placa de piso en concreto 3000 psi e= 0.15 m con refuerzo 60000 psi en varillas de 1/2" cada 15 cm en ambos sentidos, muros en ladrillo tolete cocido, tapa en lámina alfajor de 1/8" (doblada en C de 1") de 0.76 x 0.76 m en dos hojas de 0.76 x 0.36 m con contramarco de 1,1/4" espesor 3/16"embebido con uñas de anclaje , bisagras de pistón laterales de apertura 180° cada hoja, dos manijas retractiles cada tapa, tapa luz en platina de 1" de 1/8", anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte. Incluye retiro de sobrantes a botadero autorizado. Incluye todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 4.3 Construcción de cárcamo en concreto reforzado con malla eletrosoldada m 84, de 0,40 m. De ancho x 0,15 m. De profundidad (medidas internas), muros en ladrillo= 0.15 m. Incluye, pañete impermeabilizado esmaltado 1:3, mediacañas en todos sus vértices. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 4.4 Construcción de red hidráulica en tubería PVC RDE 9, de ½". Incluye accesorios, limpiador, soldadura PVC, abrazaderas tipo pera o trapecio (para tramos descolgados) y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento

ITEM 4.5 construcción de punto hidráulico af de 1/2". Incluye tubería pvcp, rde 9, accesorios, limpiador, soldadura, regatas, resanes, cargue y retiro escombros a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ADRIANA RODRIGUEZ

ITEM 4.6 Suministro e instalación llave de jardín 1/2" x 3/4". Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

INGENIERIA

ITEM 4.7 Suministro e instalación de registro de corte hidráulico (Válvula de bola de 1/2 "), metálico tipo Grival. Incluye instalación en muro, conexiones, regata para instalación de tapa, tapa registro plástica 15 x 15 cm., cinta teflón, pruebas de presión, accesorios PVC, limpiadores, soldadura y demás elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento.

ITEM 4.8 Punto sanitario de 2" (codo o sifón). Incluye tubería pvcs, accesorios, limpiador, soldadura pvc y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 4.9 Punto sanitario de 3" (sifón). Incluye tubería pvcs, accesorios, limpiador, soldadura pvc y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 4.10 Punto sanitario de 4" (tapón de inspección roscado). Incluye tubería PVCS, accesorios, limpiador, soldadura PVC, Tapón de inspección de aluminio tipo colregilla o similar, y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. (Según diseño).

ITEM 4.11 punto sanitario de 4" (codo). Incluye tubería pvcs, accesorios, limpiador, soldadura y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 4.12 Red sanitaria en tubería pvcs 2". Incluye tubería, instalación y nivelación o pendientado, accesorios, limpiador, soldadura pvc, retiro de sobrantes a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

ITEM 4.13 Red de reventilación en tubería pvc de 2" incluye regatas en muros, tubería, accesorios, limpiador, soldadura pvc, protección tipo cuello de ganso sobre cubierta, retiro de sobrantes a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.







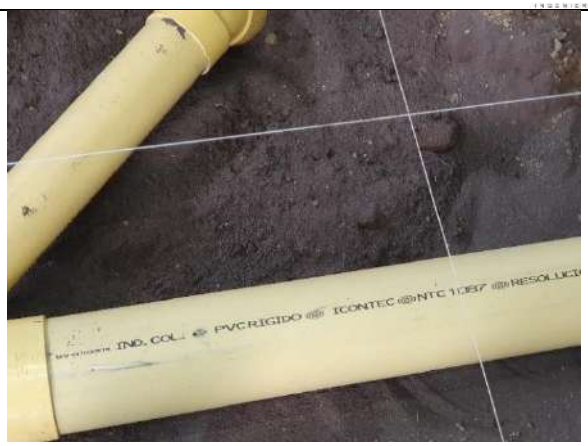


ITEM 4.14 red sanitaria en tubería pvcs 3", incluye tubería, instalación y nivelación o pendientado, accesorios, limpiador, soldadura pvc. Incluye retiro de sobrantes a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 4.15 red sanitaria en tubería pvcs 4", incluye tubería, instalación y nivelación o pendientado, accesorios, limpiador, soldadura pvc. Incluye retiro de sobrantes a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 4.16 red sanitaria en tubería pvcs 6", incluye tubería, instalación y nivelación o pendientado, accesorios, limpiador, soldadura pvc. Incluye retiro de sobrantes a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 5.1 Pañete impermeabilizado 1:3 para recubrimiento de muros o en zonas afectadas por humedad o deterioradas. Incluye filos, dilataciones, medidas inferiores a un metro, carteras de vanos, puertas y ventanas, resanes de regatas. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.

ITEM 6.1 Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. x 0.30 m. ó 0.33 m. 0.33 m. a junta perdida, color blanco Huila Grano 1. Incluye corte con pulidora, juntas en PVA con cemento blanco concretero y marmolina blanca o carbonato de calcio, destrocado, pulido, sellado, brillado y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado.









ITEM 6.2 Construcción de guarda escoba media caña en granito pulido de 0,10 m. x 0,10 m., R=0,02 m. embebida en muros y piso, con terminado a ras de muro y piso, espesor mínimo de 2.5 cm. color igual o similar al color del piso. Incluye dilatación en PVC, cortes con pulidora, pulida, sellada y brillada y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado.





ITEM 6.3 Suministro e instalación de piso tablón de gres grafilado, color y tamaño igual al existente (para andén). Incluye dilataciones o franjas en granito lavado, de grano, medidas y color iguales a las existentes. Incluye material de pega, boquilla y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado. Se deben homologar las características del piso existente en apariencia e instalación.

ITEM 9.3 suministro e instalación de pintura koraza 5 años para exteriores, dos manos, color a escoger, incluye filos y dilataciones. Incluye medidas inferiores a 1.00 m (portería)











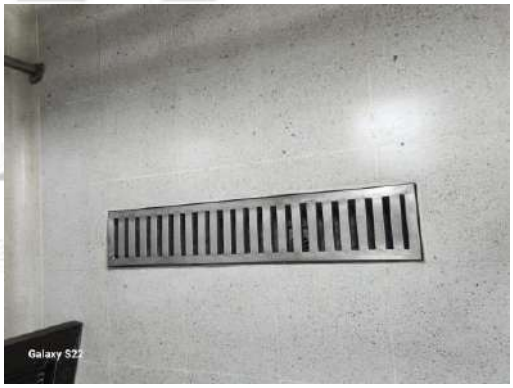


ITEM 9.6 Mantenimiento de marcos y puertas metálicas. Incluye anticorrosivo, lijada y pintura en esmalte semimate a dos manos, color a escoger. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

ITEM 10.1 Suministro e instalación de rejilla metálica de 0,20 m. de ancho para cárcamo, en tubo cuadrado de acero inoxidable de 1" x 1" y marco en ángulo de acero inoxidable en 1,1/4", con uñas de anclaje en el mismo material, incluye instalación de marco en placa de contrapiso, y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 10.2 Suministro e instalación de marco para rejillas de cárcamos, de 40 cm. de ancho, en ángulo de acero inoxidable de 1,1/4" x 1,1/4" x 1/4", con uñas de anclaje, incluye nivelación y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

ITEM 10.3 Suministro e instalación de protectores guarda camillas para áreas de circulación de la sala de necropsias: guarda camillas IPC. Ref 700, con estructura de soporte en aluminio completa y plástico de alto impacto y jumper interior para amortiguar golpes, dimensiones de 7 3/4" (197 mm) ancho x 1 " (25mm), color igual o similar a existente, anclaje de soporte de aluminio a muro, con chazos expansivos de 1,1/2" de largo x 5/8" mínimo 8 unidades por metro lineal y máximo cada 34 cm de distancia y con tornillo de 3/16". Incluye todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en sitio.

ITEM 10.4 Suministro e instalación terminales para guardacamillas IPC Ref. 700, color a escoger, ancladas a riel en aluminio con mínimo dos (2) tornillos. Incluye todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

ITEM 10.5 Suministro e instalación de tragante metálica - aluminio tipo cúpula de 5" x 3"para instalación en sifones de cárcamos. Incluye todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

ITEM 10.6 Suministro e instalación de rejilla de ventilación plana 20 x 20 cm aluminio, incluye cortes con pulidora, regatas, remates estucado y pintura de los resanes

ITEM 10.7 Suministro e instalación de esquineros en ángulo de aluminio cepillado color natural 2"x 2", espesor 3/16" H=1.0 m, anclados a los muros mediante chazos expansivos ¼, "tornillo avellanado 8X2". Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

ITEM NP 01. Placa de contrapiso espesor de 10 cm. En concreto de 3000 psi, para reposición de placa en sitios de demolición. Incluye refuerzo en, malla electro soldada de 4mm (0.15*0.15), incluye todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.













ITEM NP 02. Construcción de red hidráulica en tubería pvcp rde 21, de 1". Incluye accesorios, limpiador, soldadura pvc, abrazaderas tipo pera o trapecio (para tramos descolgados) y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

ITEM NP 03 Suministro e instalación de Cielo Raso en PVC sistema GSP plano - tipo decorline E=9 mm de altura y ancho lámina 30 cm incluye claraboyas de inspección de 60 x 60 en PVC con marco y contramarco en aluminio blanco cada 3 metros aproximadamente en los dos sentidos; se debe instalar seccionado en tramos no superiores a 3 metros. Incluye claraboyas de inspección, remates laterales, uniones y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento. (Sala de necropsias y cuartos anexos)

















ITEM NP 04. Suministro y aplicación de pintura super lavable tipo 1 a tres manos para muros (color blanco). Incluye medidas menores a 1.00 m., incluye filos y dilataciones y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución.













ITEM NP 05 reparación de humedades en mampostería existente, con sika imper mur (resina acuosa de impregnación) a dos manos, previa aplicación de ácido aceito para el control de moho en muros y paredes, en área completa desde el nivel de guarda escoba con presencia de humedades. Incluye retiro de pintura y estuco dañados con espátula y grata metálica. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado y todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.

























ITEM NP06 suministro y aplicación de estuco zócalo en muros. (incluir área completa con presencia de humedades desde el nivel de guarda escoba, incluye lijado, filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro (incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado)





















ADRIANA RODRIGUEZ





ITEM NP 07. Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros interiores en zonas asépticas, de dos componentes (componente a, pintura epóxica, componente b catalizador poliamídico, acabado semibrillante, tres manos, color blanco (área morgue y servicios anexos).

ADRIANA RODRIGUEZ


FUERA
DE
SERVICIO




Galaxy S22



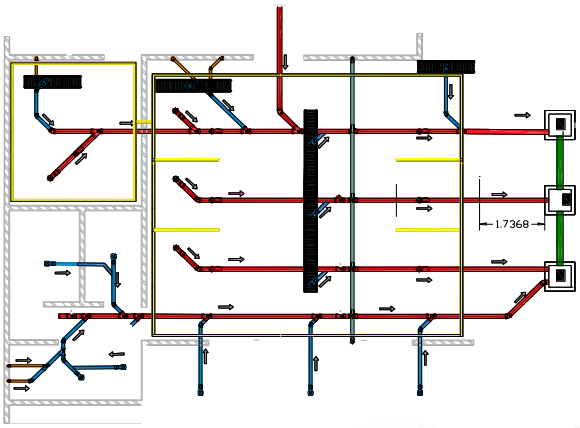









ITEM NP 08 revisión, ajuste y diseño final de redes sanitarias y filtro de drenaje, inclye el diseño de desagües de mesas de necropsias, desagües a cajas, red princpal incluyendo ubicación de redes sanitarias existentes de acuerdo con los niveles encontrados en la excavación, al diseño propuesto por la entidad y a las características del lugar.





ITEM NP 09 Demolición de afinado de piso en concreto simple, espesor hasta 11 cm. incluye demolición de afinado, terminadode piso (en cualquier material), demolición de mediacaña y/o guarda escoba, cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado, trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. (Sala de necropsias y servicios anexos)





ITEM NP 10. Demolición de Placa de Contrapiso en concreto espesor hasta10 cm. Incluye cortes con pulidora, cargue, retiro, disposición final de escombros en botadero autorizado, trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. (Sala de necropsias y servicios anexos)













ITEM NP11 Demolición de los terminados de piso en tablón de gres grafiado, incluye dilataciones o franjas en granito lavado, cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado






ITEM NP 12 demolición cajas de inspección de cualquier dimensión, con espesores de muros hasta 15 cm, incluye la demolición del elemento completo, pañetes, acabados, tapas en concreto, cargue y retiro escombros hasta botadero autorizado.



ITEM NP 13. Desactivación y vaciado de material biológico encontrado en cajas de inspección de sala de necropsias, incluye retiro y disposición final de lodos y material biológico en sitio autorizado.

ITEM NP 14. Desmonte y reinstalación de guarda camillas. Existentes en pvc. Incluye todos los materiales, accesorios y herramientas para su correcta instalación y funcionamiento.

ITEM NP 15 Desmonte y reinstalación de Muebles y Elementos anclados a muros o a piso (estantería metálica, gabinetes, mesas, puestos de trabajo) - Incluye embalaje y traslado a sitio de almacenamiento indicado por la Entidad.

ITEM NP 16 Construcción Canal Aguas Lluvias para dar continuidad al existente, en concreto 3000 psi, homologando características y espesores del elemento existente.

ITEM NP 17 Suministro e instalación Grifería Cuello de Ganso Sencilla para mesas de necropsias, incluye desmonte, elementos necesarios para su correcta instalación y disposición de sobrantes en sitio autorizado.

ITEM NP 20 Suministro e instalación de Granito Lavado para bordillo de 0,40x,0,30 m, en rampa de acceso a sede administrativa, incluye dilataciones plásticas cada 1,5 metros.

ITEM NP 21. Construcción filtro tipo francés, en tubería pvcs 2" (0,30*0,30 m y pendiente de 2%) con perforaciones de 1/2" cada 10 cm en el 75% de la superficie del tubo (3 filas de perforaciones en la periferia), con batea constante de 1/4 de la periferia (90°), (incluye tubería, accesorios pvc, grava 1", geotextil nt1600s traslapado 0,30m y demás accesorios para su correcta instalación) (sala de necropsias y cuarto de sépticos)













ITEM NP 22 Suministro e instalación de Registro de Corte Hidráulico, PVC 1", (Válvula Bola 1pulg PVC Soldar tipo pesada PCP) Incluye instalación en muro, conexiones, regatas para instalación de tapa, tapa registro plástica 20 x 20 cm, pruebas de presión, accesorios PVC, limpiadores, soldadura y demás elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funcionamiento.

ITEM NP 23 Conexión de Poceta de Mesa de Necropsias en tubería PVCS de 2" de diámetro, desmontable, incluye tubería PVCS hasta 2 ml, accesorios PVC, unión universal roscada, conexiones a sosco metálico existente, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución

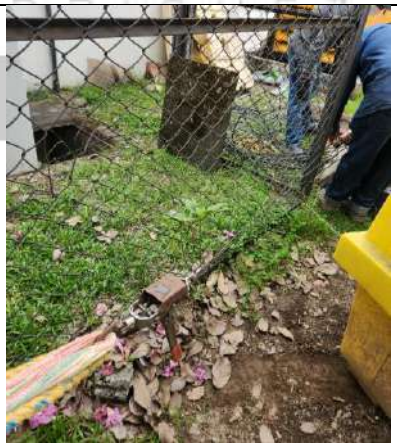
	

ITEM NP. 24 desmonte de instalaciones eléctricas (normal, regulado, iluminación, voz y datos) de áreas de sala necropsias y áreas anexas; (incluye retiro de tuberías, cajas de paso, cableado desde salidas eléctricas hasta tablero de distribución, aparatos eléctricos retiro y disposición final en botadero autorizado o sitio donde la entidad indique, identificación y marcación de circuitos y demás elementos eléctricos.

ITEM NP 25 Desmonte, retiro de Acometida Eléctrica en cable de cobre calibre 3x4F+4N+6T AWG de interconexión entre tablero de distribución general TSG cuarto de subestación y tablero TBP - 1E Bloque patología; (incluye desconexión, corte visible y efectivo, bloqueo y señalización, marcación y traslado al sitio indicado por la Entidad y demás elementos consumibles para su correcta ejecución)

ITEM NP 26 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Salida a 120V para tomacorriente GFCI empotrada, 2P+T 15A 120V, circuito compartido; (incluye cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH, conectores para empalme, tapa protección Waterproff, tapa, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

ITEM NP 27 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada color naranja en canaleta, grado hospitalario 2P+T 15A 120V, circuito compartido; (incluye cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH, caja de superficie dexson para canaleta 100x45 sobreponer, conectores auto desforre, tapa, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

ITEM NP 28 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, tubería conduit EMT de 3/4", cajas de paso, caja 5800, conectores para empalme, soportaría necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

ITEM NP 30 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación; (incluye tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-120V, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, tubería conduit EMT de 3/4", cajas de paso, caja 2400, conectores para empalme, soportaría necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

ITEM NP 31 Suministro e Instalación de Luminaria Tipo Panel Led 60X60 40W, 6500K, 4226lm, IP65 montaje de incrustar o descolgar, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y clavija, driver multivoltaje, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento).

ITEM NP 32 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4" para circuitos alimentadores; (incluye, uniones, curvas, boquillas terminales, cajas de paso en aluminio inyectado con tapa, soportaría necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).





ITEM NP 33 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Tubería Conduit IMC de 1" para circuitos de distribución; (incluye, uniones, elaboración de roscas con terraja, boquillas terminales, soportaría necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).





ITEM NP 34 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tubería de 1", tapa y empaque, circuitos de distribución; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación).





ITEM NP 36 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de Canaleta de superficie plástica dexson o similar 100x45 con división y tapa; (incluye accesorios como uniones, ángulos externo e internos, derivaciones, ángulos planos, tapa final, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

ITEM NP 37 Suministro e Instalación de Luminaria Led Hermética T8 2x18W IP65 cuerpo plástico reforzado y difusor en policarbonato, driver multivoltaje; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento).

ITEM NP 38 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, forro del asilamiento en lámina galvanizada o de aluminio, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).









ITEM NP 39 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).



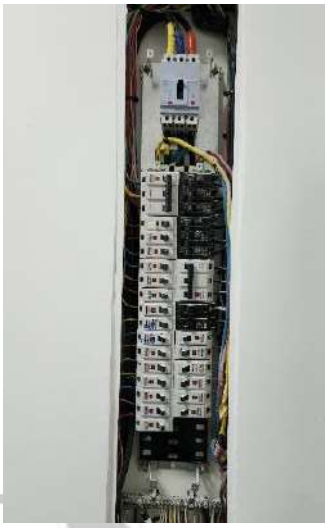


ITEM NP 40 Rejilla difusora 3 vias de aire 14"X14", dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).

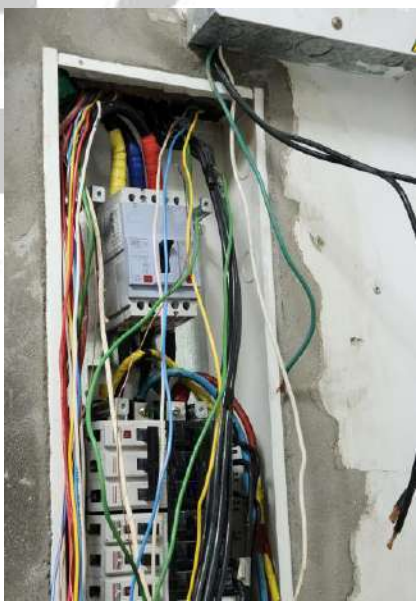
ITEM NP 41 Suministro, instalación y puesta en servicio de Tablero de Distribución Trifásico enchufable para 42 Circuitos con espacio para totalizador, 225A, barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado o sobrepuesto).

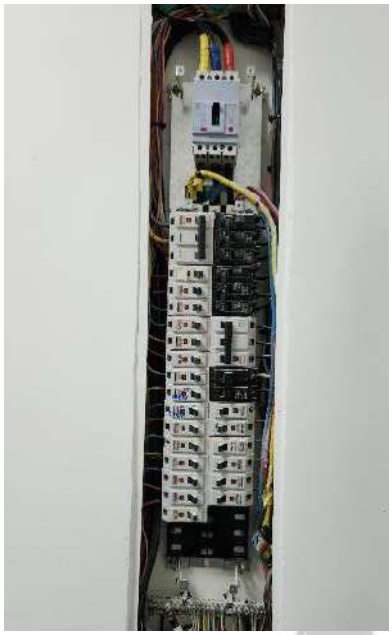
ITEM NP 42 Suministro e Instalación de Breaker Industrial regulable en caja moldeable con disparador de sobrecarga 112-160A, 36KA. (incluye accesorios de instalación, terminales, cinta termoencogible y accesorios de fijación).

ITEM NP 43 Suministro e instalación de Interruptor Tripolar Termo Magnético enchufable de 30 Amp. 10Ka.

ITEM NP 46 Suministro e instalación de interruptor monopolar termomagnético enchufable de 20 Amp. 10Ka.

ITEM NP 47 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de Salida Para Toma Especial alimentación marmita 50A 250V empotrada, circuito dedicado; (incluye descableado y cableado en cable 3x10 +12 AWG LSZH, caja 2400 doble fondo, tapa, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

ITEM NP 48 Rejilla para toma de aire 16"X14", dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje).

ITEM NP 49 Suministro e instalación de conductores, Acometida en Cable de Cobre calibre 3x1/0F+1/0N+2T AWG LSZH de interconexión entre tablero de transferencia eléctrica Torre A y tablero TAB - 1E TALLER; (incluye bornas de ponchar estañadas, cinta termoencogible, marcación y demás elementos consumibles para su correcta instalación)

ITEM NP 50 Suministro e instalación de Cable Trenzado 3# 12 WG SHSZ conductor eléctrico.

ITEM NP 51 Suministro e instalación de Ducto PVC conduit de 3/4" incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

ITEM NP 52 Suministro e instalación Enchape Para Muros (0.30 x .60 m) en zonas afectadas por la condensación producida por los cuartos fríos y cuarto de desechos, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.









ITEM NP 53 Suministro e instalación de conexión de Manguera de ½" súper reforzada 4 capas truper con refuerzo de tramado radial, con llave de regulación de 1/2 x 1/2 " cierre rápido y conector rápido para manguera de 1/2" plástico para mesas de necropsias, incluye todos los elementos necesarios para su perfecta instalación.





AR
ADRIANA RODRIGUEZ
INGENIERIA

8. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES

MANEJO AGUAS LLUVIAS: En la zona perimetral de las instalaciones intervenidas se observa un avanzado estado de deterioro de los canales aguas lluvias, sin pendiente, lo cual permite el apozamiento de aguas lluvias contribuyendo a la humedad interna, así como el deterioro y/o ausencia de la boquilla del tablón externo, situación que agrava la humedad en las instalaciones; la facheleta de muros tampoco cuenta con boquilla a esto sumado el mal estado de la estructura en pvc del cielo raso de ingreso a la zona de recepción que permite el paso del agua la cual cae directamente en muros, reflejando la humedad en paredes internas.

Se recomienda a la entidad realizar el mejoramiento del canal perimetral, el cual debe contar con las pendientes correctas para su desagüe final, así como la reposición del tablón el cual esta bastante desgastado por el paso del tiempo o en su defecto rectificación de boquilla con el fin de evitar el ingreso de agua lluvia.





CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS: Se recomienda a la entidad realizar el almacenamiento de sustancias químicas de acuerdo a las indicaciones reglamentarias con el fin de evitar el contacto de estas con el tablón instalado y muros y así prolongar la vida útil de los mejoramientos realizados, ya que previo al inicio de actividades se pudo observar la corrosión del piso existente y muros.

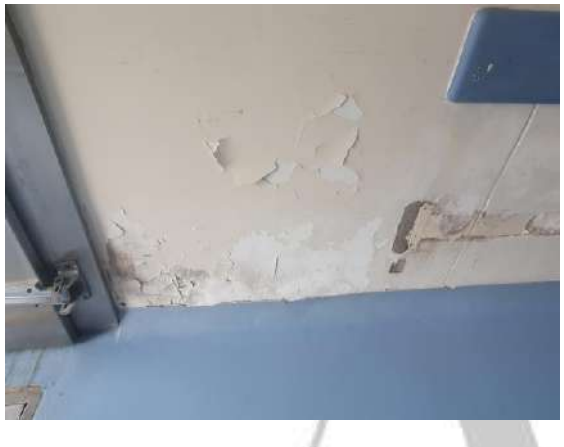








CUARTOS FRIOS: Se recomienda a la entidad realizar el aislamiento correcto de los cuartos fríos con muros así como el manteamiento periódico de los mismos, ya que esto afecta directamente el estado de muros, generando mayor presencia de humedad en paredes que colindan con estas zonas.

AR
INGENIERIA

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-01-25, 06:30:53 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1052056210

Periodo Cotización 202212 **Periodo Servicio** 202301

Cliente:

PAGADA 2023-01-25

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA				
Documento	CC 40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 86075374		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BLANCO FARFAN VICTOR GERARDO	50001000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	4	4	4	4			F	$ 1.000.000	230301		16 %	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 133.334	$ 9.300	CCF34	4 %	$ 133.334	$ 5.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COFREM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 5.400	$ 9.300	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-01-25, 06:30:53 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1052056210

Periodo Cotización 202212 **Periodo Servicio** 202301

Cliente:

PAGADA 2023-01-25

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA				
Documento	CC 40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 86078218		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CUPITRA CUPITRA OSCAR WILMAR	50001000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	4	4	4	4			F	$ 1.000.000	25-14		16 %	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	CCFC55		4 %	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 133.334	$ 9.300	CCF34	4 %	$ 133.334	$ 5.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	CAJACOPI EPS S.A.S	ARL SURA	COFREM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 5.400	$ 9.300	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-09, 01:20:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA
CEDULA CIUDADANIA	CC 40326186
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053870925
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	2071537481
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 18.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 18.900	$ 0
		SubTotales:		$ 18.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 18.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-13, 11:53:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	JOSE LUIS NIVIA PEÑA
CEDULA CIUDADANIA	CC 79531057
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053226871
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1967227719
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 330.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 145.000	$ 0
		SubTotales:		$ 330.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 330.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-14, 06:52:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1052083472

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA		
Documento	CC40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006861160	YOCER FEDERICO NIETO HERRERA	01	00		X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF34) COFREM	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1121853936	FABIAN ALEXANDER CUPITRA CUPITRA	01	00		X															0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 20.200	6,960	$ 502.667	$ 35.000	(CCF34) COFREM	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 17306529	GONZALO HERRERA MORALES	01	03	X																0	0	1	1	1	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF34) COFREM	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.900
CC 86075374	VICTOR GERARDO BLANCO FARFAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 86078218	OSCAR WILMAR CUPITRA CUPITRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.977.334	$ 3.016.001	$ 3.016.001	$ 3.016.001	$ 476.500	$ 120.800	$ 210.100	$ 120.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.200	$ 0	$ 928.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-03-21, 07:08:31 PM **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 1053520105

Periodo Cotización 202301 **Periodo Servicio** 202301

Cliente:

PAGADA 2023-03-21 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA				
Documento	CC 40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79531057		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					NIVIA PEÑA JOSE LUIS	50001000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
X															0	0	0	6	0			$ 1.160.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NIN-EP		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 232.000	$ 16.200	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NINGUNA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-13, 12:00:29 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2023
Empresa	JOSE LUIS NIVIA PEÑA
CEDULA CIUDADANIA	CC 79531057
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053324933
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1967243862
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 68.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 37.200	$ 1.300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 29.000	$ 1.000
		SubTotales:		$ 66.200	$ 2.300
		Total a Pagar:			$ 68.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-05, 08:45:30 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1053285559

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023

PAGADO 05/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA		
Documento	CC40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121884519	LESTHER FABIAN VILLADA LEON	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 386.667	$ 15.500	6,960	$ 386.667	$ 27.000	(CCF34) COFREM	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 86041319	GABRIEL EDUARDO ROJAS GARZON	01	00	X																0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 386.667	$ 61.900	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 386.667	$ 15.500	6,960	$ 386.667	$ 27.000	(CCF34) COFREM	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 86075374	VICTOR GERARDO BLANCO FARFAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.933.334	$ 1.933.334	$ 1.933.334	$ 1.933.334	$ 309.400	$ 77.400	$ 134.800	$ 77.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599.000	$ 0	$ 599.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-03-09, 03:44:20 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1053059447

Periodo Cotización 202302 **Periodo Servicio** 202303

Cliente:

PAGADA 2023-03-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA				
Documento	CC 40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 17306529		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	03					HERRERA MORALES GONZALO	50001000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
	X														0	0	4	4	4		F	$ 1.160.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 154.667	$ 10.800	CCF34	4 %	$ 154.667	$ 6.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COFREM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 10.800	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-03-09, 03:44:20 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1053059447

Periodo Cotización 202302 **Periodo Servicio** 202303

Cliente:

PAGADA 2023-03-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA				
Documento	CC 40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 86064945		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CUPITRA CUPITRA WILTON	50001000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X	X														0	5	5	5	5			F	$ 1.160.000	230301		16 %	$ 193.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	CCFC55		4 %	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 193.334	$ 13.500	CCF34	4 %	$ 193.334	$ 7.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	CAJACOPI EPS S.A.S	ARL SURA	COFREM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 7.800	$ 13.500	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-03-09, 03:44:20 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1053059447

Periodo Cotización 202302 **Periodo Servicio** 202303

Cliente:

PAGADA 2023-03-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA				
Documento	CC 40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 86075374		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BLANCO FARFAN VICTOR GERARDO	50001000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.160.000	230301		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.160.000	$ 80.800	CCF34	4 %	$ 1.160.000	$ 46.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COFREM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 80.800	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-03-09, 03:44:20 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1053059447

Periodo Cotización 202302 **Periodo Servicio** 202303

Cliente:

PAGADA 2023-03-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA				
Documento	CC 40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 86078218		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CUPITRA CUPITRA OSCAR WILMAR	50001000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X														0	18	18	18	18			F	$ 1.160.000	25-14		16 %	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	CCFC55		4 %	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 696.000	$ 48.500	CCF34	4 %	$ 696.000	$ 27.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	CAJACOPI EPS S.A.S	ARL SURA	COFREM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 27.900	$ 48.500	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-23, 10:43:45 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1053521037

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 21/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA		
Documento	CC40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79531057	JOSE LUIS NIVIA PEÑA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 100	$ 80.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-04-05, 08:43:42 PM **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 1053870915

Periodo Cotización 202303 **Periodo Servicio** 202303

Cliente:

PAGADA 2023-04-05 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA				
Documento	CC 40326186	**Dirección**	CR 44C #18 - 10 EL BUQUE CS D 12		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107635227		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79531057		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					NIVIA PEÑA JOSE LUIS	50001000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	0	0	30	0			$ 1.160.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NIN-EP		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.160.000	$ 80.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NINGUNA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-09, 01:17:47 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA
CEDULA CIUDADANIA	CC 40326186
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053854075
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2071529565
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 252.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 86.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 43.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 10.900	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 10.900	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	1	$ 10.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	3	$ 56.700	$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	3	$ 32.700	$ 0
		SubTotales:		$ 252.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 252.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-23, 09:12:57 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1054932931

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 23/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE LUIS NIVIA PEÑA		
Documento	CC79531057	**Dirección**	CL 4 SUR #35 A - 70
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6606060
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79531057	JOSE LUIS NIVIA PEÑA	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 14.000	$ 344.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1006866323	ANDRES JULIAN GARCIA AMAYA	CLL 37 B ESTE 17 A-18 BARRIO GAIT5ANA	6713435	Fannyandleo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	22/03/2023	66456578	$233.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	82.200	0		0		0	0	0	0	82.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	105.200	0	0	0	0	0	0		105.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	45.800				45.800	0	0	45.800			458	45.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	82.200	82.200
Pensión	1	105.200	105.200
Riesgos Laborales	1	45.800	45.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	233.200	233.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1006866323	ANDRES JULIAN GARCIA AMAYA		CLL 37 B ESTE 17 A-18 BARRIO GAIT5ANA	6713435	Fannyandleo@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	22/03/2023	66456578	$233.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006866323	GARCIA AMAYA ANDRES JULIAN	57	0			N	X																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS008	657.334	82.200	14-11	657.334	5	45.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACION PAZ Y SALVO

Yo, JOSE LUIS NIVIA PEÑA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de arquitecto residente de obra, para el proyecto 0253-SG-2022, REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, certifico que ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA, esta a paz y salvo por todo concepto.

Villavicencio, 05 de abril de 2023.



JOSE LUIS NIVIA PEÑA
C.C. 79.531.057 BTA

CERTIFICACION

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo**,** LUZ ELIANA MESA SANCHEZ, identificada con cedula de ciudadanía No 1.057.574.660 de Sogamoso, en mi calidad de representante legal de 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S, certifico que la Ingeniera ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA, identificada con cedula de ciudadanía N° 40.326.186, se encuentra a PAZ Y SALVO, por el concepto de suministro de materiales para la ejecución del Contrato 0253-SG-2022, REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META-VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

Dada en Villavicencio, a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2023

5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
R.L Luz Eliana Mesa Sánchez
Nit: 901253593-1
c.c 1.057.574.660 de Sogamoso

Villavicencio, 28 de abril de 2023.

Arquitecto
ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Supervisor 0253-SG-2022
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

REf: Contrato 0253-SG-2022, REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

Asunto: PAZ Y SALVO MAESTRO DE OBRA

Respetado Arquitecto,

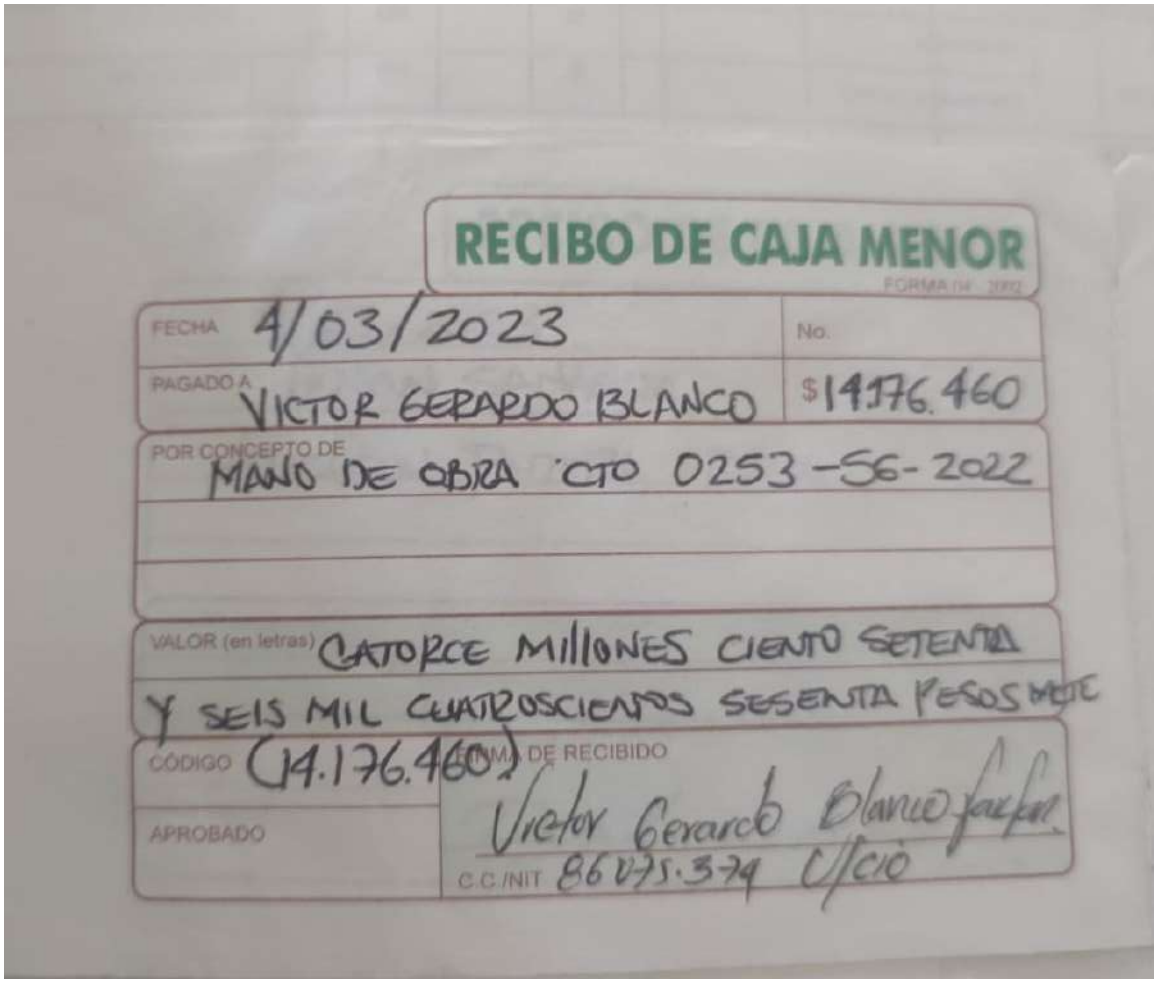
Por medio de la presente adjunto copia recibo de pago firmado por el maestro de obra, el señor Victor Gerardo Blanco, ya que una vez se finalizan las actividades en sitio no se pudo tener contacto con el mismo, por lo cual no fue posible obtener el paz y salvo por los servicios prestados, los cuales fueron cancelados en su totalidad.

Sin otro particular,

Cordialmente.

ADRIANA RODRIGUEZ MORA
Contratista

Correo electrónico: cyaingenieria2017@gmail.com
Celular: 3107635227



RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA (14 - 2002)

FECHA 4/03/2023	No.
PAGADO A VICTOR GERARDO BLANCO	$14176.460
POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA CTO 0253-56-2022	
VALOR (en letras) CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	
CÓDIGO (14.176.460)	FIRMA DE RECIBIDO Victor Gerardo Blanco Farfan
APROBADO	C.C./NIT 8675.374 C/cio

Correo electrónico: cyaingenieria2017@gmail.com
Celular: 3107635227

PAZ Y SALVO

Yo, ANDRES JULIAN GARCIA AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.006.866.323, por medio del presente documento certifico que la Ingeniera ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA, se encuentra a paz y salvo por todo concepto por mi labor ejecutada como subcontratista en obra para el proyecto 0253-SG-2022, REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META- VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, certifico que ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA.

Villavicencio, 28 de abril de 2023.

ANDRES JULIAN GARCIA AMAYA
C.C. 1.006.866.323

Villavicencio, 9 de agosto de 2023

PAZ Y SALVO

Yo MARICELY SANDOVAL QUESADA, identificada con cédula de ciudadanía No 37745229 de Bucaramanga, me permito certificar que la señora ADRIANA RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No 40.326.186, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto en lo que se refiere al tema de la Prestación de servicios desde el día 13 de enero al 24 de enero del 2023, en el contrato de obra No. 253-SG-2022 cuyo objeto es REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META – VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los dos (09) días del mes de agosto del año 2023.

Cordialmente,



Maricely Sandoval Quesada
C.C. 37745229
Celular: 3166964604
Dirección: Cr 13 este # 36-231

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	89553898	917946828694	10/05/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **40326186**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.61.250.45**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 50,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 50,000.00	COP$ 50,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	89553898	917946828694	10/05/2023

Número de Identificación 40326186	**Primer Nombre ó Razón Social** ADRIANA
Primer Apellido (si es Persona natural) RODRIGUEZ	**Tipo de documento** 03
Dígito de Verificación (Si es persona 40326186	**Naturaleza Juridica** 03
Departamento META	**Ciudad Capital** VILLAVICENCIO (META)
Dirección de Domicilio CR 44C 18 10	**Ciudad de Domicilio** VILLAVICENCIO
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,310 7635227
Correo electrónico adryrodriguez2117@yahoo.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Meta	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-050-000000
Número Licencia de Obra	**Número Contrato de Obra** 0253-SG-2022
Nombre Obra reparacones locativas	**Fecha Inicio Obra** 21/12/2022
Fecha Terminación Obra 07/04/2023	**Ciudad de Ejecución de la Obra** villavicencio
Tipo FIC Mensual	**Año Periodo a Pagar** 2022
Mes Periodo a Pagar 12	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 50807000.00
Costo Total Mano de Obra 2031406.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 2
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 50000.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 50000.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	89554271	917946830875	10/05/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **40326186**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.61.250.45**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 145,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 145,000.00	COP$ 145,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	89554271	917946830875	10/05/2023

Número de Identificación 40326186	**Primer Nombre ó Razón Social** ADRIANA
Primer Apellido (si es Persona natural) RODRIGUEZ	**Tipo de documento** 03
Dígito de Verificación (Si es persona 40326186	**Naturaleza Juridica** 03
Departamento META	**Ciudad Capital** VILLAVICENCIO (META)
Dirección de Domicilio CR 44C 18 10	**Ciudad de Domicilio** VILLAVICENCIO
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,310 7635227
Correo electrónico adryrodriguez2117@yahoo.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Meta	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-050-000000
Número Licencia de Obra	**Número Contrato de Obra** 0253-SG-2022
Nombre Obra reparaciones locativas	**Fecha Inicio Obra** 22/12/2022
Fecha Terminación Obra 07/04/2023	**Ciudad de Ejecución de la Obra** VILLAVICENCIO
Tipo FIC Mensual	**Año Periodo a Pagar** 2023
Mes Periodo a Pagar 1	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 50807000.00
Costo Total Mano de Obra 2031406.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 5
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 145000.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 145000.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	89555341	917946830196	10/05/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **40326186**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.61.250.45**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 116,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 116,000.00	COP$ 116,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	89555341	917946830196	10/05/2023

Número de Identificación 40326186	**Primer Nombre ó Razón Social** ADRIANA
Primer Apellido (si es Persona natural) RODRIGUEZ	**Tipo de documento** 03
Dígito de Verificación (Si es persona 40326186	**Naturaleza Juridica** 03
Departamento META	**Ciudad Capital** VILLAVICENCIO (META)
Dirección de Domicilio CR 44C 18 10	**Ciudad de Domicilio** VILLAVICENCIO
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,310 7635227
Correo electrónico adryrodriguez2117@yahoo.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Meta	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-050-000000
Número Licencia de Obra	**Número Contrato de Obra** 0253-SG-2022
Nombre Obra reparaciones locativas	**Fecha Inicio Obra** 22/12/2022
Fecha Terminación Obra 07/04/2023	**Ciudad de Ejecución de la Obra** villavicencio
Tipo FIC Mensual	**Año Periodo a Pagar** 2023
Mes Periodo a Pagar 2	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 50807000.00
Costo Total Mano de Obra 2031406.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 4
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 116000.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 116000.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	89555864	917946829916	10/05/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **40326186**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.61.250.45**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 87,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 87,000.00	COP$ 87,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	89555864	917946829916	10/05/2023

Número de Identificación 40326186	**Primer Nombre ó Razón Social** ADRIANA
Primer Apellido (si es Persona natural) RODRIGUEZ	**Tipo de documento** 03
Dígito de Verificación (Si es persona 40326186	**Naturaleza Juridica** 03
Departamento META	**Ciudad Capital** VILLAVICENCIO (META)
Dirección de Domicilio CR 44C 18 10	**Ciudad de Domicilio** VILLAVICENCIO
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,310 7635227
Correo electrónico adryrodriguez2117@yahoo.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Meta	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-050-000000
Número Licencia de Obra	**Número Contrato de Obra** 0253-SG-2022
Nombre Obra REPARACIONES LOCATIVAS	**Fecha Inicio Obra** 21/12/2022
Fecha Terminación Obra 07/04/2023	**Ciudad de Ejecución de la Obra** VILLAVICENCIO
Tipo FIC Mensual	**Año Periodo a Pagar** 2023
Mes Periodo a Pagar 3	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 50807000.00
Costo Total Mano de Obra 2031408.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 3
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 87000.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 87000.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	89556124	917946827496	10/05/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **40326186**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.61.250.45**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 87,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 87,000.00	COP$ 87,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	89556124	917946827496	10/05/2023

Número de Identificación 40326186	**Primer Nombre ó Razón Social** ADRIANA
Primer Apellido (si es Persona natural) RODRIGUEZ	**Tipo de documento** 03
Dígito de Verificación (Si es persona 40326186	**Naturaleza Juridica** 03
Departamento META	**Ciudad Capital** VILLAVICENCIO (META)
Dirección de Domicilio CR 44C 18 10	**Ciudad de Domicilio** VILLAVICENCIO
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,310 7635227
Correo electrónico adryrodriguez2117@yahoo.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Meta	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-050-000000
Número Licencia de Obra	**Número Contrato de Obra** 0253-SG-2022
Nombre Obra reparaciones locativas	**Fecha Inicio Obra** 21/12/2022
Fecha Terminación Obra 07/04/2023	**Ciudad de Ejecución de la Obra** villavicencio
Tipo FIC Mensual	**Año Periodo a Pagar** 2023
Mes Periodo a Pagar 4	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 50807000.00
Costo Total Mano de Obra 4031408.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 3
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 87000.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 87000.00

ecollect
Seguro para ti

Contrato 0253-56-2022

OBJETO: Realizar los Reparaciones locativas sede seccional Meta-Villavicencio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Contratista: Adriana Marcela Rodriguez Mora

Plazo de ejecucion: 2 meses

Fecha de Iniciacion: 21 de Diciembre de 2022

Fecha de Terminacion: 21 de Febrero de 2023

Valor Inicial del Contrato: $ 174.479.287,85

Prorroga 1 (otro si 1): 14 dias calendario

Nueva Fecha de Terminacion: 07 de marzo de 2023

Prorroga 2 (otros si 2) : 30 dias calendario

Nueva Fecha de Terminacion: 07 de abril de 2023

Adicional 1 $ 89.450.096.,29

Valor Final del contrato: $ 268.929.384.14.

Miercoles 21 de Diciembre de 2022.
Se da inicio al contrato 0253-56-2022. Se realiza inspección visual de las areas a intervenir y su estado, se puede evidenciar que las instalaciones se encuentran aun en su uso habitual tanto sala de necropsias como la sala auxiliar septica por lo cual se le solicita a la entidad sean entregadas las especios para proceder a los trabajos.

Jueves 22 de Diciembre de 2022

Se presenta aun los espacios en uso lo cual impide iniciar labores, nuevamente se solicita sea entregadas los especios.

Viernes 23 de Diciembre de 2022

Se informa por parte de la entidad. que se hara entrega de sala de necropsias para su inicio de labores, la posibilidad de iniciar labores se informa se ejecutara posterior a la entrega total de area libre de agentes contaminantes, por tal motivo se solicita hacer un aseo general a mesas y especio general que evidencian rasgos de Labores ejecutadas hay.

Sabado 24 de Diciembre de 2022

Se encuentra en proceso de limpieza por parte del personal de la entidad, hasta tanto no sea desocupado dicho especio y entregado al contratista no se dara inicio a Labores.

Lunes 26 de Diciembre de 2022

Se recibe sala de necropsias para dar inicio a labores.

Martes 27 de Diciembre de 2022

se da inicio a labores de capacitacion del personal para el buen manejo de los elementos existentes pues por sus caracteristicas deben ser manipulados con especial cuidado.
se hace entrega de todos los elementos de proteccion personal y elementos para su aseo personal

Miercoles 28 de Diciembre de 2022

Se inicia un proceso de desinfeccion por parte del contratista con aspersion de agentes desinfectantes en mesas y muros en general

Jueves 29 de Diciembre 2022

Se inicia luego del Proceso de Desinfeccion el desmonte de Lavamanos quirurgicos. que por su uso presenta corrosion en los elementos de anclaje lo cual hace necesario cortar los pernos que anclan el elemento a la pared.

Viernes 30 de Diciembre 2022

Continuo el Desmonte de lavamanos y superficies de trabajo ubicadas entre las mesas de

Necropsias en sala de necropsias y sala auxiliar septica

Lunes 2 de enero de 2023

Continua el proceso de Desmonte de superficies de trabajo y se da inicio al desmonte de mesas de necropsias.

Martes 3 de enero de 2023

En el proceso de desmonte de mesas de necropsias se encuentran elementos contaminantes que obstruyen las tuberias, se procede con precaucion y los debidos elementos de proteccion personal.

Miercoles 4 de enero de 2023

Se dispone todos los elementos desmontados a la Fecha de sala de necropsias y sala aux septico en la zona verde frente a la bahia de entrega de cadaveres

Jueves 5 de enero de 2023

Posterior al desmonte de mesas de necropsias, lavamanos y Mesas de apoyo se procede con la parte de iluminacion en cielo raso, se procede al desmonte de lamparas para lo cual se hace necesario identificar los circuitos correspondientes en el tablero de circuitos y asi poder cortar el circuito de las lamparas para evitar accidentes

Viernes 6 de enero de 2023

Se da inicio al desmonte de lamparas en cuarto de desechos peligrosos, sustancias quimicas aseo y casillo.

Sabado 7 de enero de 2023

Se da inicio al desmonte de cielo raso en cuarto de desechos peligrosos, sustancias quimicas, aseo y casillo.

Lunes 9 de enero de 2023

Continua labores de desmonte de cielo raso en sala de necropsias y cuarto auxiliar septico, paralelo se procede a la demolicion de un sobre piso en concreto existente bajo las mesas de necropsias en sala de necropsias y sala auxiliar septica.

Martes 10 de enero de 2023

Culmina el proceso de desmonte de cielo rasos y se dispone del material sobrante en un area destinada en bahia de parqueadero de entrega de cadaveres. continua la demolicion del sobre piso en concreto en sala de necropsias.

Miercoles 11 de enero de 2023

Se da inicio del desmonte de muro divisorio entre area de residuos peligrosos y sustancias quimicas esto debido a su avanzado estado de deterioro.

Continuan labores de demolicion de sobre piso.
todo

Jueves 12 de Enero de 2023

Continua las labores de Demolicion de Sobre piso paralelo a dicha actividad se da inicio a labores de limpieza en muros de Fachada a esa altura por encima del acabado en enchape existente de 90 centimetros en donde se retiran elementos sueltos de pañete o otros elementos.
todo

Viernes 13 de Enero de 2023

Continua labores de demolicion de sobre piso durante la demolicion de una parte de piso se evidencia condiciones diferentes a lo contractualmente contratado por lo cual se solicita evaluar estos items y varios mas que evidencian caracteristicas diferentes al inicialmente contratado.
todo

Sabado 14 de Enero de 2023

Culmina labores de demolicion de sobre piso Dejo mesas de terrazas y se procede al retiro del material sobrante.
culmina labores de limpieza en Fachada para dar inicio a la retiracion del pañete impermeabilizado
todo

Lunes 16 de Enero de 2023

Continua labores de pañete en Fachadas se solicita a la entidad revisar las cotizaciones actuales de los items de demolicion de Placa

Viernes 17 de enero de 2023

Continua labores de pañete impermeabilizado en las fachadas.

Miercoles 18 de enero de 2023

Continua la labor de pañete impermeabilizado, se procede a ejecutar el desmonte del cielo raso faltante en Sala de necropsias y cuarto septico, se dejan habilitadas varias puntos de iluminacion para poder trabajar.

Jueves 19 de enero de 2023

Continua labores de desmonte de estructuras de soporte de cielo raso en cuarto septico

Viernes 20 de enero de 2023

Continua labores de pañete impermeabilizado en las fachadas del edificio

Sabado 21 de Enero de 2023

Se ejecuta labores de pañete impermeabilizado en fachadas.

Lunes 23 de Enero de 2023

De acuerdo a conversaciones con supervisión por la preocupación en los atrasos, se expone las circunstancias por los cuales se presenta estos atrasos debido a Items que no corresponden en su análisis a lo contratado y que implican revisión y ajuste además de evidencias Items no previstos y necesarios en la ejecución.

todo

Martes 24 de Enero de 2023

Continuan labores de concreto impermeabilizado en Fachadas al igual que el desmonte de las estructuras de soporte del cielo raso existente.

todo

Miercoles 25 de Enero de 2023

Continua el proceso de vaciado de paneles impermeabilizado en Fachadas.

todo

Jueves 26 de Enero de 2023

Se da por terminada la actividad de concreto impermeabilizado.
Se da por terminado labores de desmonte de las estructuras metalicas de soporte de cielo raso existente.

todo

Viernes 27 de Enero de 2023

Se procede a dar inicio a la actividad de pintura externa en Fachadas con pintura Koraza

todo

Sabado 28 de Enero de 2023

Por Factores del clima intensas lluvias se suspende la labor de pintura el dia de hoy

Jadu

Lunes 30 de Enero de 2023

Continua las Labores de pintura en Fachadas con Koraza

Jadu

Martes 31 de Enero de 2023

Continua la labor de pintura en viga canal con pintura Koraza.

Jadu

Miercles 1 de Febrero de 2023

Continua labores de pintura en Fachada de viga canal y Fachada a zona de ingreso a entrega cabañas

Jadu

Jueves 2 de Febrero de 2023

Continua labores de pintura en Fachadas
Se informa por parte de la Ing. Adhara Rodriguez Hsq la compra del tabla de granito del eje de sala de recepcion, sala de septico y cuarto de aseo desechos, sistema, quirco, rx, inmuno y Muestras.

Jadu

Viernes 3 de Febrero de 2023

Continua labores de pintura en fachadas.

Jadu

Sabado 4 de Febrero de 2023

Se da inicio a mantenimiento de la rampa de acceso a area de entrega de cadaveres

todu

lunes 6 de Febrero de 2023

Se informa por parte del contratista de la compra de cerámicas de piso para el granado de los guardaescobas y pegue en tabla de gres.

todu

Martes 7 de Febrero de 2023

Continuan labores de limpieza, lijado y arreglos necesarios en puntos de acceso a zona de entrega de cadaveres.

todu

Miercoles 8 de Febrero de 2023

Continuan labores de pintura en Fachada y acceso del portón Metalico a acceso de zona de entrega cadaveres.

todu

Jueves 9 de Febrero de 2023

Se inician labores para la instalación de rejillas de ventilación en bahías de area de entrega de cadaveres.

todu

Viernes 10 de Febrero de 2023

Continuan labores de instalación de rejillas, pintura en fachada y mantenimiento de puerta metalica

todu

Sabado 11 de Febrero de 2023

Se efectua un asseo general en las zonas intervenidas para retirar los materiales sobrantes del descarte de cielo raso y otros.

Lunes 13 de Febrero de 2023

Continuan las Labores de pintura en Fachada, instalacion de rejillas de Ventilacion y arreglo de pared en zona de entrega de cadaveres.

Martes 14 de Febrero de 2023

Se suspende labores de pintura por fuertes lluvias Continuan los arreglos del pared de acceso y entrega de cadaveres.

Miercoles 15 de Febrero de 2023

Continuan labores de pintura de viga canal con pintura Koraza.

Jueves 16 de Febrero de 2023

Se realiza solicitud de prorroga por 11 dias con el fin de revisar junto con supervision las actividades que se deben reevaluar y las que no fueron tenidas en cuenta puesto que esto a impedido el inicio de la totalidad de las obras a ejecutar.

Viernes 17 de Febrero de 2023

Continuan labores que se han podido dar inicio nuevas se dejan habilidad de las oficinas necesarias para poder dar inicio a las de drenaje de placa a concreto y cimentaciones generales.

Sabado 18 de Febrero de 2023.

Continuan las Labores de Pintura en Remate de los Fachadas laterales, se colmina la instalacion de rejillas de ventilacion y se procede con la pintura del portal de acceso a entrega de cadaveres

Lunes 20 de Febrero de 2023

Continuan operacion de las actividades que ha la fecha ha podido ser ejecutadas, se esta a la espera del analisis de la totalidad de items, cantidades y nuevos NNP no previstos de acuerdo al radicado de prorroga y modificatorio del dia 16 de Febrero

Martes 21 de Febrero de 2023

Se da visto bueno de prorroga solicitada por 14 dias y se amplia plazo de terminacion a dic 7 de Marzo de 2023

Miercoles 22 de Febrero de 2023

Se da inicio a la demolición de zonas puntuales de piso por donde pasaran tuberías de aguas residuales en cuarto de aseo, cuarto de derecha galpon y cuarto de calderas

Culminan las labores de pintura de fachada y arreglos en porton de zona de entrega de cadaveres

Jueves 23 de Febrero de 2023

Continua labor de demolición de piso en zonas puntuales por donde pasaran las nuevas redes sanitarias

Viernes 24 de Febrero de 2023

Se hace necesario durante la demolición de placa en zonas puntuales el retiro de tuberías existentes para liberar los espacios para las nuevas tuberías

Sabado 25 de Febrero de 2023

Continuan las demoliciones puntuales en PK - 10 muros y muestras

Lunes 27 de Febrero de 2023

Se solicita se informe el estado de los equipos en cuanto al analisis de Items no previstos y

mayores y menores cantidades para estas dar inicio a labores que no he sido posible iniciar hasta tanto no se despacha por parte de supervisión

Martes 28 de Febrero de 2023

luego de culminar la demolición de placa en sitios puntuales se procede con las excavaciones teniendo en cuenta las cotas de rasante y batea de las tuberías nuevas según lo establecido

Miercoles 1 de marzo de 2023

Continuan las excavaciones y retiro del material a sitio de acopio para su posterior retiro a sitio autorizado

Jueves 2 de marzo de 2023

Continua labores de excavación para tubería nueva en zona de descargas de placa en pozos de aseo - PX- NUMO - investigar

Viernes 3 de Marzo de 2023

Se radico el dia 2 de marzo las cantidades nuevas modificatorias para su revisión y

Visto bueno por parte de supervisión

Sábado 4 de marzo de 2023

Continúan excavaciones en zonas de cisterna - Nivel - Subestación eléctrica

Lunes 6 de marzo de 2023

Se solicita información con respecto a cadenamiento de rectificación y así poder dar inicio a labores pendientes por demás

Martes 7 de marzo de 2023

Continúan excavaciones en las zonas pendientes de demoliciones ejecutadas en área interior - Nivel - Subestación eléctrica

Miércoles 8 de marzo de 2023

Se da visto bueno al acta rectificativa y de ítems nuevos, con este ya se puede dar inicio a las actividades, ya que por parte de este visto bueno no se ha pedido inicio

Jueves 9 de marzo de 2023

Se da inicio a Labores de demolición de placa en concreto y afinado de piso en el area total de sala de necropsias y sala auxiliar septica al igual que actividades de pintura superlavable en histotecnologia-cuarto frio area externa-cuarto de mantenimiento y recepcion que son las zonas que presenta este tipo de pintura previo ala pintura se efectua el raspado y desinfeccion de muros.

Viernes 10 de marzo de 2023

Continuan labores de demolición de placas en sala aux septica y sala de necropsias.
Se continua el raspado y limpieza de muros para proceder ala reparación con estuco zocalo antes de inicial la Labo de pintura cauchotal.
Paralelo se ejecutan demolicion de carcamos y cajas de inspeccion existentes en el espacio de sala de necropsias, previo retiro del material acumulado en este espacio.

Sabado 11 de marzo de 2023

Culminan las labores de demolicion de placas y se procede ala excavacion de tierra para ejecutar un relleno compactado de buenas caracteristicas tecnicas para la nueva placa pues el material encontrado de relleno existente es mezcal de residuos y escombros que no

es optimo para la obra nueva a construir. paralelo a las actividades de excavación se inician labores de restitución y cambio de duelas para redes electricas, tomando en cuenta las solicitudes y elementos necesarios en cada especie

Continua a su vez labores de estuco zocalo en histotecnologia - area cuarto de aseo almacenamiento de muestras - recepcia - area de mantenimiento y baños y vestiers frente a sala de necropcias.

Lunes 13 de marzo de 2023

Se culmina labor de excavacion hasta nivel establecido para sellero, se da inicio a labor de redes hidrosanitarias nuevas teniendo en cuenta los niveles de bases de baños y cambio de cajas de inspeccion nuevas en la zona externa de sala de necropsias

Continua labores de estuco zocalo y pintura en las areas de histotecnologia - recepcia - vestier y baños sala de necropsias sala de entrenamiento.

Se desmonta muebles y guardamallos que interfieren con los trabajos de pintura y demas pendientes en el area total.

Martes 14 de marzo de 2023

Continua labores de instalaciones sanitarias segun

diseño y niveles establecidos.
Continua labores de pintura epoxica se da inicio a raspado en zonas donde ca existia epoxica en hall de cuarto de hidroterapia y zona de entrega de cadaveres y casilla al igual que sala de necropsias y cuarto auxiliar septico.
Se da inicio a la construccion de cajas de inspeccion de 70x70 en la zona exterior del salon de necropsias.

Miercoles 15 de Marzo de 2023

Culmina labores de cuarto sanitario para dar inicio a la labor de relleno, se va construyendo el filtro frances planteado perimetralmente en sala de necropsias y cuarto auxiliar septico para poder proceder a fundir placa de contrapiso nueva.

Continuar labores de pintura epoxica y raspado en muros donde se aplicara pintura epoxica
Paralelo a estas labores se viene trabajando en las instalaciones electricas nuevas que va por muro y cielo raso.
Se da inicio a la viga de estructura nueva de soporte de cielo raso.

Jueves 16 de Marzo de 2023

Culmina la labor de relleno compactado y la ejecucion del Filtro Frances perimetral

Se procede al tendido de la red hidraulica y redes de baja electricas que iran en dicha.

Continua labores de gestion sustentable y limpieza en zona donde se ubican equipo sala aux septico - vestidor area - residuos peligrosos sustancias quimicas - cuarto rx - muestras y sala de reuniones principal.

Continua labores de estructura casa club en general. en las zonas de sala aux septico sala de reuniones - comedor area - sala de rx insumos y muestras - residuos peligrosos y sustancias quimicas

Se procede al desmonte de las redes electricas existentes y la entrega del mismo adjunto al director de la Entidad.

Viernes. 17 de marzo de 2023

Se da inicio a la Fundida de la losa en concreto para ello se instala la malla electrosoldada previa verificacion de que todas las redes hidraulicas y electricas esten completas y se efectua prueba hidraulica de presion y estanqueidad. Satisfactoria.

Sabado 18 de marzo de 2023

Culmina la labor de fundido de losa en concreto

en sala de necropsias y sala aux septica al igual que los techos pasillos en los demas ambientes.

Continua las labores en zonas de pintura lavable y se procede a aplicar estuco zocalo en las areas de patio epoxica area resanado y desinfeccion.

Continua la instalacion de redes electricas nuevas para iluminacion - tomacorrientes - brics gfci - Toma especial varilla. ducto para alimentador nuevo y la instalacion del tablero de circuitos nuevo.

lunes 20 de marzo de 2023

Se da inicio a la instalacion de piso a las zonas donde no fue necesario derder en su totalidad sino areas muy puntuales se da espera de fraguado del concreto acelerado para proceder a la instalacion de piso en sala de necropsias y sala aux septica.

- Continua trabajos de ISIT electricas nuevas se continua con la propagacion de tuberias hidraulicas en muros para puntos de colocacion de las llaves de los mesas y lavamanos, a su vez se colocara la red de reubicacion en muros hacia el exterior

Martes 21 de marzo de 2023
se da inicio a la labor de piso en sala de recepcion y sala aux septica.
Continua labores de cielo raso en zona de area de aseo - cuarto de desechos peligrosos - sustancias quimicas.
Se culmina la instalacion de redes electricas en cielo raso para dar inicio a la 1ra delantera de cielo raso en areas donde ya se cuenta con la estructura.

Culmina labor de instalacion hidraulica y se procede a la prueba hidraulica de presion.

Miercoles 22 de Marzo de 2023
Se aplica el sello de piso en zonas de rayos x - Muestras - area desechos peligrosos - sustancias quimicas para su maduracion 6 dias y pasados continua con el proceso de destanque y asi solo se puede efectuar mas labores el dia de hoy pues no se recomendables ya que hasta tanto se que el enbaquillado general del tablero de cuarto

Jueves 23 de Marzo de 2023

- Se procede con remates para pintura epoxica
- culmina labores de prueba hidraulica satisfactoriamente.

Se culmina la instalacion de piso en sala auxiliar septica y se procede al sellado para su maduracion

Viernes 24 de marzo de 2023

Continua labores de instalación de aislamiento y culmina la instalación del piso en sala de necropsias, se aplica el sellante para su endurecido.

Se continua con labores de pintura epóxica en hall de histotecnología, zona de entrega de cadáveres y zona de camillas.
Culmina la instalación de redes eléctricas para tomacorrientes, breakers regulados y interruptores nuevos.

Sabado 25 de marzo de 2023

Se programa para el día de hoy el vaciado de concreto de la acometida que va desde la subestación al tablero nuevo de oficinas y evitar entorpecer labores pues se debe suspender el flujo eléctrico

- se inicia la elaboración de guardacantos en granito pulido en las zonas exteriores

Continua labores de pintura epóxica

Domingo 26 de marzo de 2023
Se culmina el día de hoy la instalación de la acometida principal con alguna contratiempos

Lunes 27 de marzo de 2023

Se procede al destranque del piso en zona de area - cuarto químico - area de residuos peligrosos cuarto de insumos - RX - muestras especificando que ya estaban en su totalidad con guarda escoba.
Se culmina la instalación de cielo raso en el 100%
Se instalan aparatos electricos tomacorrientes - tomas para iluminación y reguladas
Se instala al igual el tablon de yeso granulado en las areas externas donde se aprecia el piso por las demoliciones.

Martes 28 de marzo de 2023

Continua el proceso de pulido de piso y instalación de aparatos electricos en general.
Se da inicio a trabajos de pulido de piso en sala auxiliar septica.
Culminar labores de pintura epoxica en zona de circulación y zona de entrega de cadaveres y caillas
Se da inicio al arreglo de estructura metalica del porton de acceso a mediano legal por el sector de entrega de cadaveres puerta externa

Miercoles 29 de Marzo de 2023
Se procede al sellado definitivo de los pisos de cuarto de area - sustancias químicas - residuos peligrosos RX - insumos y muestras se aislan totalmente del area de sala aux septica para evitar residuos de polvo

Se procede Jueves 30 de marzo de 2023
Se procede a la colocación de los pisos vinisterados para dar inicio a la pintura epoxica y culminar el piso nuevo

Culmina la labor de pulida de piso en sala aux septica y se aplica el sellado de protección y brillo.
Se da inicia a la instalación de muebles en las zonas ya pintadas y que fuera necesario retirar al igual que la instalación de guardacamilla que tambien se retiraron.

Viernes 31 de marzo de 2023

Se culmina labor de pintura epoxica en inmunos rx - muestras - hall de acceso frente a desechos peligrosos y se aisla totalmente para dar inicio a los trabajos de pulida de piso en sala de necropsias que es el unico que falta por esta labor.
Se procede a la protección del piso en sala aux septica para dar inicio a la pintura epoxica

Continuan labores paralelas de instalación de iluminación en cielo rasos en las zonas ya terminadas en su totalidad inmunos - aseo - cuarto de desecho peligrosos - sustancias químicas - rx y muestras.

Sabado 1 de abril de 2023

Continua labor de pulida de piso en sala de

Necropsias
Culmina labor de pintura epoxica en sala auxiliar septica
Culmina la labor de instalacion de iluminacion en su totalidad.

Todo

Domingo 2 de abril de 2023
Se culmina labores de culida de piso en sala de necropsias y se procede a sellar el piso para su esoterdia y brillo final.

Todo

lunes 3 de abril de 2023

- Se dainicio a la instalacion de mesa de necropsias, lavaManos y mesas de apoyo en sala auxiliar septica al igual que la instalacion de la regilla del carcamo. se ultima detalles en esta area de instalacion de goodrawills

Se da inicio de pintura epoxica en sala de necropsias fase proteccion del piso para evitar daños o salpicaduras.

Todo

Martes 4 de abril de 2023
Culmina la labor de pintura epoxica en sala de necropsias.
culmina la instalacion de mesa de necropsias lavamanos y superficies de apoyo en sala aux septica.

Se procede a la instalación de muebles que fueron retirada de las especies de área insumos - rx - muestras previa limpieza de los espacios y los muebles.

todo

Miercoles 5 de abril de 2023

- Se efectua aseo general del area de trabajo en las zonas ya terminadas.
- Se inicia labor de instalación de mesas de necropsias - lavamanos y superficies de apoyo en sala de necropsias siendo esta el unica area por termina esta actividad.

- Se efectua limpieza general al interno del edificio en las zonas afectadas por los trabajos.

todo

Jueves 6 de abril de 2023

Se deja instalado en totalidad las mesas de necropsias - superficies de apoyo y lavamanos en sala de necropsias

todo

Viernes 7 de abril de 2023

Se culminan labores de aseo en la totalidad del area intervenida y se retiran los escombros acumulados a sitios de

desasicos final autorizados

today

MANUAL DE MANTENIMIENTO

Este Manual contiene una descripción de las acciones de mantenimiento preventivo que deben realizarse, con la frecuencia indicada, en todos y cada uno de los componentes, a fin de conservarlos en óptimas condiciones de operación. El propósito fundamental de este documento, es proporcionar a los responsables de la operación y mantenimiento un instrumento que puedan aplicar a su debido tiempo para prevenir daños mayores en las instalaciones, reducir costos, proveer un buen servicio y un buen ambiente a la comunidad que labora en las instalaciones.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

- **CAJAS DE INSPECCIÓN:**

En la parte exterior se localizan 3 cajas de inspección del sistema sanitario, las cuales deben ser periódicamente revisadas con el fin de verificar el paso de residuos líquidos, dicha inspección deberá realizarse de manera semanal con el fin de realizar un mantenimiento preventivo en caso de evidenciarse disminución en el caudal que fluye, se deberá realizar registro del estado y actividad realizada.

- **RED SANITARIA:**

El mantenimiento preventivo que debe aplicarse periódicamente a las tuberías de la red sanitaria, debe consistir en el lavado interno de estas, para esta actividad deberá hacerse la inspección y limpieza a través de los tapones de inspección, los cuales fueron instalados en diferentes puntos por donde pasa la red sanitaria. Esta limpieza debe efectuarse por lo menos una vez al mes, obedeciendo a un programa de Mantenimiento Preventivo que incluye purgas de la red de sanitaria, se deberá llevar un registro que incluya el personal designado para la actividad, herramienta utilizada y fecha del mantenimiento acompañado de registro fotográfico.

Las mesas de necropsias cuentan con un sistema de tubería diseñado para ser removido en caso de obstrucción, el mismo debe ser reinstalado conservando las condiciones iniciales del diseño.

De acuerdo a las actividades diarias realizadas en las instalaciones, el principal problema que se puede presentar es la obstrucción por acumulación de grasas, las cuales se endurecen progresivamente y forman tacos creando una traba en el sistema.

- **CARCAMOS**

Estas estructuras localizadas al interior de la morgue cuentan con un sifón tipo cúpula removible, con el fin de contribuir a un mejor mantenimiento y limpieza por acumulación de sedimentos, se deberá realizar una limpieza de los mismos de manera semanal, teniendo la

precaución de realizar una correcta reinstalación de la rejilla tipo cúpula y así evitar el ingreso de sedimentos a la red sanitaria.

BASES Y PISOS

- **PISO EN TABLON DE GRANITO VIBROPRENSADO:**

En las zonas donde se instaló el tablón en granito vibro prensado existe un constante contacto con sangre y otras sustancias químicas, por lo cual se recomienda la aplicación de sellador cada 2 meses con el fin de prolongar la vida útil del miso, no se debe lavar el granito con materiales abrasivos (tales como esponjas metálicas, estropajos, lanas de acero, limpiadores a base de cloro), su limpieza deberá hacerse con jabones neutros de manera diaria, una vez finalizada la labor de limpieza deberá secarse con un paño adecuado el área lavada.

- **PISO TABLON DE GRESS:**

En la zona de ingreso a la bahía de descargue de cadáveres se debe tener precaución al momento de descargue de los mismos, ya que los vehículos fúnebres se estacionan sobre el área donde se realizó la reposición del tablón, lo cual genera grietas en el material, disminuyendo su vida útil, por lo cual se hace la recomendación de evitar este tipo de trafico sobre el material instalado.

INSTALACIONES ELECTRICAS:

Se deberá tener un estricto cuidado de no sobrecargar el sistema ni realizar conexiones que alteren el diseño eléctrico, no se deberán realizar conexiones que no cuenten con aprobación de un profesional en el área, en caso de realizarse alguna modificación o adición deberá llevarse un estricto registro del mismo.

El cableado eléctrico es un punto muy esencial de la instalación eléctrica, ya que se encarga de suministrar toda la potencia a la carga o consumo. En este debe de procurarse de que no está sobrecalentada y no sobrecargarse, se debe evitar posibles empalmes dentro del panel, se debe limpiar toda la caja de suciedad y polvo, no se deben modificar los aparatos eléctricos instalados, por lo cual se recomienda realizar una inspección de manera mensual para verificar el estado de la red.

ADRIANA RODRIGUEZ MORA
CONTRATISTA
