
CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-03	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 4,0 a 6,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.	UNID. DE MEDIDA	ml

PLANTA





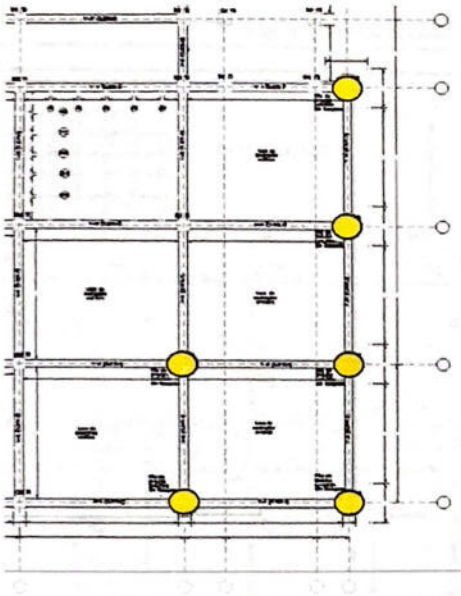

LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
PILA E3			2.00	1.00	2.00
PILA EF4			2.00	1.00	2.00
PILA EF4'			2.00	1.00	2.00
PILA EF5			2.00	1.00	2.00
PILA G4			2.00	1.00	2.00
PILA G4'			2.00	1.00	2.00
PILA G5			2.00	1.00	2.00
NIVEL +0.00					
PILA E1			2.00	1.00	2.00
PILA E2			2.00	1.00	2.00
PILA H1			2.00	1.00	2.00
PILA H2			2.00	1.00	2.00
PILA H3			2.00	1.00	2.00
PILA H4			2.00	1.00	2.00
					-
					-
					-
					-
					-
					76.00
TOTAL					76.00

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA
ING KATHLEEN DIAZ HOYOS

Firma

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

Firma

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Contratista: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Interventoría: AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES


FECHA DE EMISION :NOV 2023

FECHA	DD	15	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

PROYECTO	EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA. CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
INTERVENTORIA:	AG CONSTRUCTOES Y CONSULTORES

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-04	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 6,0 a 8,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.	UNID. DE MEDIDA	ml

PLANTA

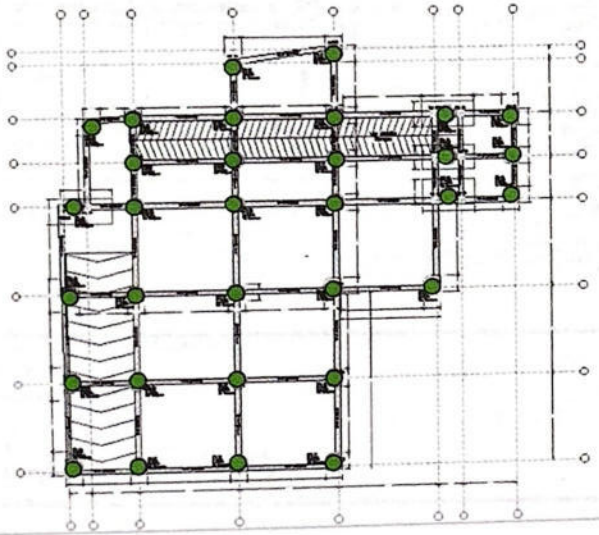




LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
PILA A1			1.00	1.00	1.00
PILA A2			1.00	1.00	1.00
PILA A3			1.00	1.00	1.00
PILA A4			1.00	1.00	1.00
PILA A'5			1.00	1.00	1.00
PILA B1			1.00	1.00	1.00
PILA B2			1.00	1.00	1.00
PILA B3			1.00	1.00	1.00
PILA B4			1.00	1.00	1.00
PILA B4'			1.00	1.00	1.00
PILA B5			1.00	1.00	1.00
PILA C1			1.00	1.00	1.00
PILA C2			1.00	1.00	1.00
PILA C3			1.00	1.00	1.00
PILA C4			1.00	1.00	1.00
PILA C4'			1.00	1.00	1.00
PILA C5			1.00	1.00	1.00
PILA C6			1.00	1.00	1.00
PILA D1			1.00	1.00	1.00
PILA D2			1.00	1.00	1.00
PILA D3			1.00	1.00	1.00
PILA D4			1.00	1.00	1.00
PILA D4'			1.00	1.00	1.00
PILA D5			1.00	1.00	1.00
PILA D6			1.00	1.00	1.00
PILA E3			1.00	1.00	1.00
PILA EF4			1.00	1.00	1.00

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-04	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 6,0 a 8,0 m de profundidad con DÍAMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.	UNID. DE MEDIDA	ml

PLANTA

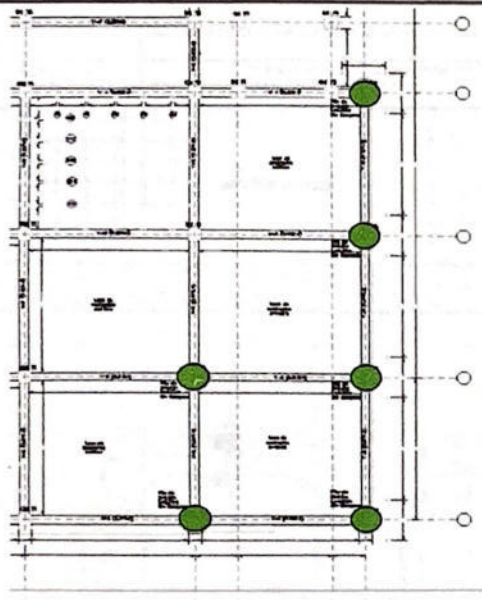





LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
PILA EF4'			1.00	1.00	1.00
PILA EF5			1.00	1.00	1.00
PILA G4			1.00	1.00	1.00
PILA G4'			1.00	1.00	1.00
PILA G5			1.00	1.00	1.00
PILA E1			1.00	1.00	1.00
PILA E2			1.00	1.00	1.00
PILA H1			1.00	1.00	1.00
PILA H2			1.00	1.00	1.00
PILA H3			1.00	1.00	1.00
PILA H4			1.00	1.00	1.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					38.00
TOTAL					38.00

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA
ING KATHLEEN DIAZ HOYOS

Firma

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

Firma

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS


Contratista: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
Interventoria: AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
FECHA DE EMISION :NOV 2023

FECHA	DD	15	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

PROYECTO	EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	INTERVENTORIA:	AG CONSTRUCTOES Y CONSULTORES

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-05	Construcción de PILAS en CONCRETO PREMEZCLADO 28 Mpa Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, bombeo con autobomba, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente.	UNID. DE MEDIDA	M3

PLANTA

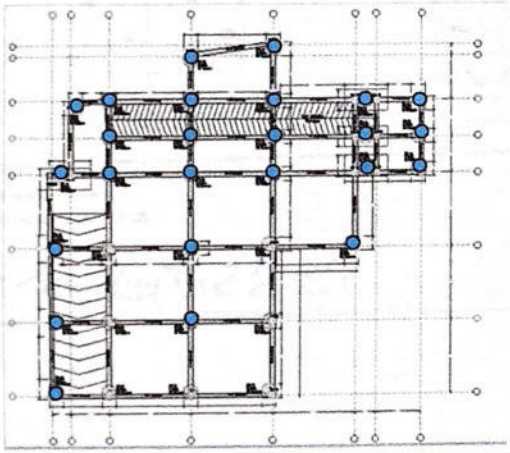






LOCALIZACION	RADIO	RADIO	Π	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
PILA A1	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA A2	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA A3	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA A4	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA A'5	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA B1						
PILA B2						
PILA B3						
PILA B4	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA B4'	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA B5	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA C1						
PILA C2	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA C3	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA C4	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA C4'	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA C5	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA C6	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA D1						
PILA D2						
PILA D3						
PILA D4	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA D4'	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-05	Construcción de PILAS en CONCRETO PREMEZCLADO 28 Mpa Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, bombeo con autobomba, mano de obra, vibrado, protección, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se paga en su ítem correspondiente.	UNID. DE MEDIDA	M3

PLANTA

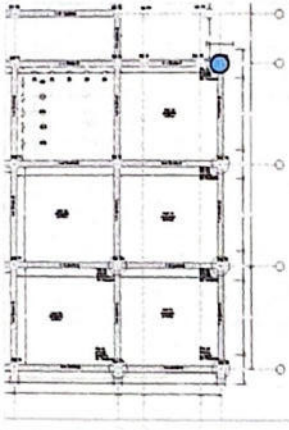





LOCALIZACION	RADIO	RADIO	Π	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
PILA D5	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA D6	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA E3	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA EF4	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA EF4'	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA EF5	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA G4	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA G4'	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA G5	0.50	0.50	3.1416	8.00	1.00	6.28
PILA E1						
PILA E2						
PILA H1						
PILA H2						
PILA H3						
PILA H4	0.50	0.50	3.1416	2.40	1.00	1.88
						-
						158.96
TOTAL						158.96

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA
ING KATHLEEN DIAZ HOYOS

Firma

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

Firma

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Contratista: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
Interventoría: AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
FECHA DE EMISION :NOV 2023


CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

FECHA	DD	15	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

PROYECTO	EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS — INTERVENTORIA: AG CONSTRUCTOES Y CONSULTORES

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-06	IZAJE DE CANASTAS PARA PILAS DE LONGITUD DE 4 metros a 8 metros	UNID. DE MEDIDA	UN


PLANTA

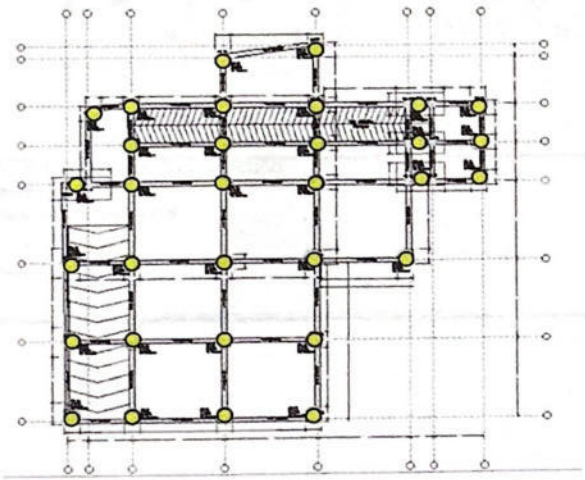

LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
PILA A1				1.00	1.00
PILA A2				1.00	1.00
PILA A3				1.00	1.00
PILA A4				1.00	1.00
PILA A'5				1.00	1.00
PILA B1				1.00	1.00
PILA B2				1.00	1.00
PILA B3				1.00	1.00
PILA B4				1.00	1.00
PILA B4'				1.00	1.00
PILA B5				1.00	1.00
PILA C1				1.00	1.00
PILA C2				1.00	1.00
PILA C3				1.00	1.00
PILA C4				1.00	1.00
PILA C4'				1.00	1.00
PILA C5				1.00	1.00
PILA C6				1.00	1.00
PILA D1				1.00	1.00
PILA D2				1.00	1.00
PILA D3				1.00	1.00
PILA D4				1.00	1.00
PILA D4'				1.00	1.00
PILA D5				1.00	1.00
PILA D6				1.00	1.00
PILA E3				1.00	1.00
PILA EF4				1.00	1.00

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-06	IZAJE DE CANASTAS PARA PILAS DE LONGITUD DE 4 metros a 8 metros	UNID. DE MEDIDA	UN

PLANTA

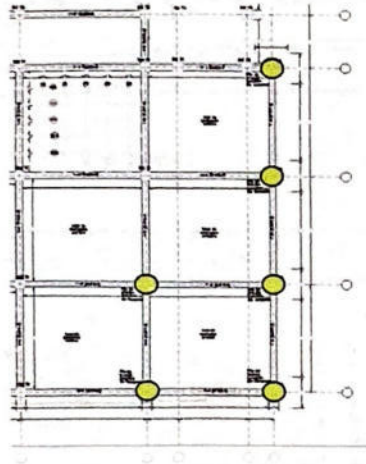



LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
PILA EF4'				1.00	1.00
PILA EF5				1.00	1.00
PILA G4				1.00	1.00
PILA G4'				1.00	1.00
PILA G5				1.00	1.00
PILA E1				1.00	1.00
PILA E2				1.00	1.00
PILA H1				1.00	1.00
PILA H2				1.00	1.00
PILA H3				1.00	1.00
PILA H4				1.00	1.00
					-
					38.00
			TOTAL		38.00

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA
ING KATHLEEN DIAZ HOYOS

Firma

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

Firma

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Contratista: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Interventoria: AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES

FECHA DE EMISION :NOV 2023

FECHA	DD	15	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

PROYECTO	EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.		
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	INTERVENTORIA:	AG CONSTRUCTOES Y CONSULTORES

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-07	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto de f'c=28MPa (280kg/cm²), para Vaciado zapatas. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	UNID. DE MEDIDA	M3

PLANTA





LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
NIVEL -3.98 Y -2.96					
ZAPATA A1	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA A2	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA A3	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA A'4	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA A'5	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA B1	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA B2	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA B3	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA B4	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA B4'	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA B5	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA C1	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA C2	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA C3	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
ZAPATA C4	1.50	1.50	0.62	1.00	1.40
					-
					-
					13.50
				TOTAL	13.50

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA
ING KATHLEEN DIAZ HOYOS

Firma

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

Firma

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Contratista: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Interventoria: AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES


FECHA DE EMISION :NOV 2023

FECHA	DD	15	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

PROYECTO	EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.		
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	INTERVENTORIA:	AG CONSTRUCTOES Y CONSULTORES

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-08	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto de f'c=28 MPa (280kg/cm²), para Vaciado Pedestales 60x.60x.80. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	UNID. DE MEDIDA	UN

PLANTA

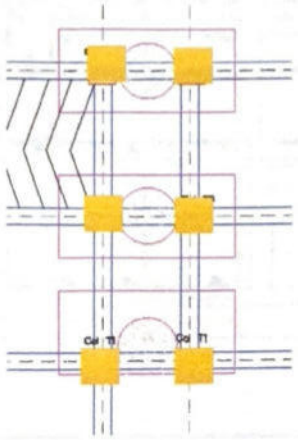



LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNA E4				1.00	1.00
COLUMNA E4'				1.00	1.00
COLUMNA E5				1.00	1.00
COLUMNA F4				1.00	1.00
COLUMNA F4'				1.00	1.00
COLUMNA F5				1.00	1.00
					-
					-
					6.00
TOTAL					6.00

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA
ING KATHLEEN DIAZ HOYOS

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Contratista: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Interventoria: AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES


FECHA DE EMISION :NOV 2023

FECHA	DD	15	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

PROYECTO	EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 20230600520B1 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
INTERVENTORIA:	AG CONSTRUCTOES Y CONSULTORES

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-09	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto de f'c=28MPa (280kg/cm²), para Vaciado vigas de fundación .45x.45. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	UNID. DE MEDIDA	ML

PLANTA

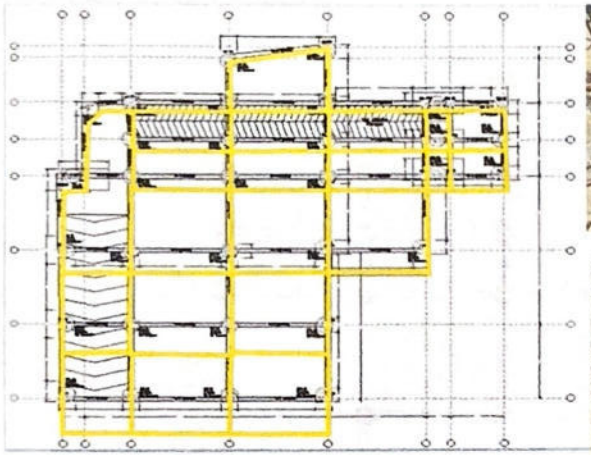





LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
VIGAS DE FUNDACIÓN NIVEL -3.98 Y -2.96					-
Viga longitudinal 0.4x0.5	4.85			14.00	67.90
	2.18			14.00	30.45
	2.73			1.00	2.73
	3.55			1.00	3.55
Viga Transversal 0.4x0.5	3.63			4.00	14.52
	5.40			16.00	86.40
	2.36			1.00	2.36
	5.45			1.00	5.45
	1.07			6.00	6.42
	2.72 ,			3.00	8.16
VIGAS DE FUNDACION NIVEL -0+00					
Viga longitudinal 0.4x0.5	4.85			8.00	38.80
Viga Transversal 0.4x0.5	5.39			7.00	37.73
					-
					304.47
			TOTAL		304.47

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA
ING KATHLEEN DIAZ HOYOS

Firma

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

Firma

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Contratista: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Interventoría: AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES


FECHA DE EMISION :NOV 2023

FECHA	DD	15	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

PROYECTO	EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
INTERVENTORIA:	AG CONSTRUCTOES Y CONSULTORES

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-10	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto de f'c=28MPa (280kg/cm²), para Vaciado columnas 45x.45. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo	UNID. DE MEDIDA	ML

PLANTA

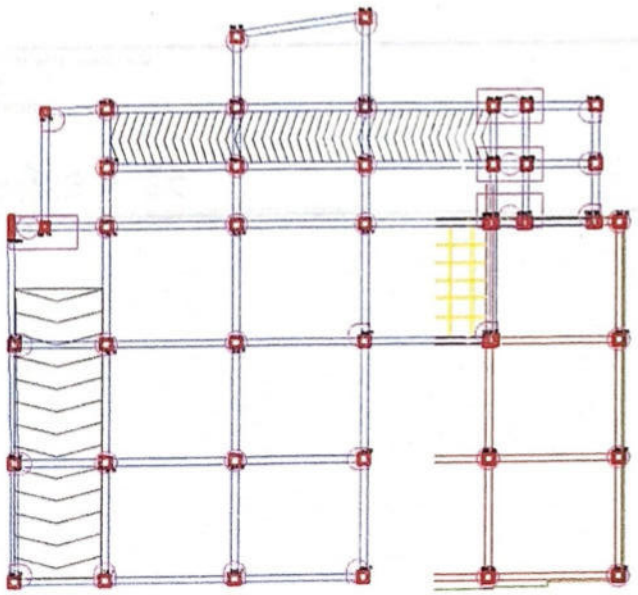

LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
NIVEL -3.98 Y -2.96					
COLUMNA A1		3.40		1.00	3.40
COLUMNA A2		3.40		1.00	3.40
COLUMNA A3		3.40		1.00	3.40
COLUMNA A'4		3.40		1.00	3.40
COLUMNAA'5		3.40		1.00	3.40
COLUMNA B1		3.40		1.00	3.40
COLUMNAB2		3.40		1.00	3.40
COLUMNA B3		3.40		1.00	3.40
COLUMNA B4		3.40		1.00	3.40
COLUMNA B4'		3.40		1.00	3.40
COLUMNA B5		3.40		1.00	3.40
COLUMNA C1		3.40		1.00	3.40
COLUMNAC2		3.40		1.00	3.40
COLUMNA C3		3.40		1.00	3.40
COLUMNA C4		3.40		1.00	3.40
COLUMNA C4'		3.40		1.00	3.40
COLUMNA C5		3.40		1.00	3.40
COLUMNA C6		3.40		1.00	3.40
COLUMNA D1		3.40		1.00	3.40
COLUMNA D2		3.40		1.00	3.40
COLUMNA D3		3.40		1.00	3.40
COLUMNA D4		3.40		1.00	3.40
COLUMNA D4'		3.40		1.00	3.40
COLUMNA D5		3.40		1.00	3.40
COLUMNA D6		3.40		1.00	3.40
COLUMNA E3		3.40		1.00	3.40
COLUMNA E4		3.40		1.00	3.40
COLUMNA E4'		3.40		1.00	3.40

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-10	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto de f'c=28MPa (280kg/cm²), para Vaciado columnas 45x45. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo	UNID. DE MEDIDA	ML

PLANTA







LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNA E5		3.40		1.00	3.40
COLUMNA F4		3.40		1.00	3.40
COLUMNA F4'		3.40		1.00	3.40
COLUMNA F5		3.40		1.00	3.40
COLUMNA G4		3.40		1.00	3.40
COLUMNA G4'		3.40		1.00	3.40
COLUMNA G5		3.40		1.00	3.40
NIVEL 0+00					
COLUMNA E1		3.40		1.00	3.40
COLUMNA E2		3.40		1.00	3.40
COLUMNA H4		3.40		1.00	3.40
COLUMNA H3		3.40		1.00	3.40
					-
					132.60
		TOTAL			132.60

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA
ING KATHLEEN DIAZ HOYOS

Firma

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

Firma

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS


Contratista: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
Interventoria: AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
FECHA DE EMISION :NOV 2023

FECHA	DD	15	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

PROYECTO	EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
INTERVENTORIA:	AG CONSTRUCTOES Y CONSULTORES

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-11	Suministro, transporte, preparación y colocación de concreto de f'c=28MPa (280kg/cm²), para Vaciado columnas 30x.30. Incluye mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	UNID. DE MEDIDA	ML

PLANTA

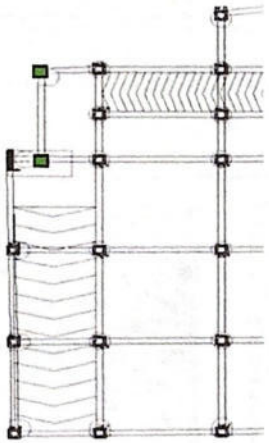





LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
Nivel -3.98					
COLUMNA A'4		3.40		1.00	3.40
COLUMNA A'5		3.40		1.00	3.40
					6.80
TOTAL					6.80

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA
ING KATHLEEN DIAZ HOYOS

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Contratista: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Interventoria: AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES

FECHA DE EMISION :NOV 2023

FECHA	DD	15	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

PROYECTO	EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
INTERVENTORIA:	AG CONSTRUCTOES Y CONSULTORES

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-12	Extracción de roca encontrada en zona de excavación de Pilas a cualquier grado de profundidad, que supere el diametro del balde 28cm (11 pulgadas), SU MEDIDA SERA EN SITIO según complejidad de dicha extracción.	UNID. DE MEDIDA	UN

PLANTA

EXTRACCIÓN DE ROCA (UND)

C2	C3	C4	C4'	C6	D5	D4	EF4	H4	G4'	G5
	4									6
								15		
	7					6				
				1						
		7	5		7				3	









LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
EXTRACCCION DE ROCA					
PILA C3				11.00	11.00
PILA C4				7.00	7.00
PILA C4'				5.00	5.00
PILA C6				1.00	1.00
PILA D5				7.00	7.00
PILA D4				6.00	6.00
PILA H4				15.00	15.00
PILA G4'				3.00	3.00
PILA G5				6.00	6.00
					61.00
			TOTAL		61.00

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA
ING KATHLEEN DIAZ HOYOS

Firma

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ

Firma

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Contratista: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
Interventoria: AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
FECHA DE EMISION :NOV 2023

FECHA	DD	15	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

PROYECTO	EJECUCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.				
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS		INTERVENTORIA:	AG CONSTRUCTOES Y CONSULTORES	

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP-13	Demolición y extracción de roca de acuerdo a la geometria encontrada en el área de la Pila. Cabe resaltar que dicha demolición se paga proporcional a lo dimensionado en la excavación del anillo. Incluye, molinetes,motobomba, soga, arnes, linea de vida, barra, balde, pala y compresor.	UNID. DE MEDIDA	ML


PLANTA

C2	C3	C4	C4'	C6	D5	D4
	0.47		0.25			
		0.29				0.14
	0.89					
			0.24		0.44	
0.24						
0.42				0.63		
0.66	1.35	0.29	0.49	0.63	0.44	0.14









LOCALIZACION	LARGO	ALTURA	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
Demolición de Roca en Pila área completa					
PILA C2	0.66			1.00	0.66
PILA C3	1.35			1.00	1.35
PILA C4	0.29			1.00	0.29
PILA C4'	0.49			1.00	0.49
PILA C6	0.63			1.00	0.63
PILA D5	0.44			1.00	0.44
PILA D4	0.14			1.00	0.14
					4.00
TOTAL					4.00

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO
RESIDENTE DE OBRA
ING KATHLEEN DIAZ HOYOS

AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EHIMER ALBERTO SALINAS GOMEZ
