
PROYECTO AVENIDA 68 TRAMO 1 - SECTOR 4 - DE CALLE 13 COSTADO SUR A AV. LA ESPERANZA (K4+920 A K6+875)

Id	EDT	Nombre de la Actividad	Plazo
1	**1**	**PROYECTO AVENIDA 68 TRAMO 1 - SECTOR 4 - DE CALLE 13 COSTADO SUR A AV. LA ESPERANZA (K4+920 A K6+875)**	**56 MESES**
2	***1.1***	***ACTA DE INICIO***	***HITO***
3	**1.2**	**ETAPA PRELIMINARES**	**8 MESES**
4	**1.3**	**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**47 MESES**
5	*1.3.1*	*INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 - SECTOR 4*	*Hito*
6	**1.3.2**	**VIAS REDES Y ESPACIO PÚBLICO**	**34 meses**
7	*1.3.2.1*	*INICIO VIAS REDES Y ESPACIO PÚBLICO*	*Hito*
8	1.3.2.2	DEMOLICIÓN PUENTE PEATONAL CANAL SAN FRANCISCO - CALLE 22A	1 mes
9	**1.3.2.3**	**Sector 1**	**16 meses**
10	**1.3.2.3.1**	**VIAS**	**8 meses**
11	1.3.2.3.1.1	Corredor BRT	4 meses
12	1.3.2.3.1.2	Carril Mixto	4 meses
13	1.3.2.3.1.3	Señalización y Demarcación	2 meses
14	1.3.2.3.2	REDES	6½ meses
15	1.3.2.3.3	ESPACIO PUBLICO	8 meses
16	1.3.2.3.4	CICLORRUTA	5½ meses
17	**1.3.2.4**	**Sector 2**	**16 meses**
18	**1.3.2.4.1**	**VIAS**	**8 meses**
19	1.3.2.4.1.1	Corredor BRT	4 meses
20	1.3.2.4.1.2	Carril Mixto	4 meses
21	1.3.2.4.1.3	Señalización y Demarcación	2 meses
22	1.3.2.4.2	REDES	6½ meses
23	1.3.2.4.3	ESPACIO PUBLICO	8 meses
24	1.3.2.4.4	CICLORRUTA	5½ meses
25	**1.3.2.5**	**Sector 3**	**15 meses**
26	**1.3.2.5.1**	**VIAS**	**7½ meses**
27	1.3.2.5.1.1	Corredor BRT	3½ meses
28	1.3.2.5.1.2	Carril Mixto	4 meses
29	1.3.2.5.1.3	Señalización y Demarcación	2 meses
30	1.3.2.5.2	REDES	6½ meses
31	1.3.2.5.3	ESPACIO PUBLICO	7½ meses
32	1.3.2.5.4	CICLORRUTA	5½ meses
33	*1.3.2.6*	*FIN VIAS REDES Y ESPACIO PÚBLICO*	*Hito*
34	**1.3.3**	**BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 22A (CANAL SAN FRANCISCO) - (SON 2) CALZADA 1**	**10 meses**
35	*1.3.3.1*	*INICIO CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 22A (CANAL SAN FRANCISCO) - (SON 2) CALZADA 1*	*Hito*
36	1.3.3.2	DEMOLICIÓN CANAL Y ESTRUCTURA SOBRE CANAL SAN FRANCISCO CALLE 22A	1 mes
37	1.3.3.3	CIMENTACIÓN	4½ meses
38	1.3.3.4	INFRAESTRUCTURA	4 meses
39	1.3.3.5	SUPERESTRUCTURA	2 meses
40	1.3.3.6	ACABADOS	1 mes
41	1.3.3.7	ESPACIO PUBLICO	1½ meses
42	*1.3.3.8*	*FIN CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 22A (CANAL SAN FRANCISCO) - (SON 2) CALZADA 1*	*Hito*
43	**1.3.4**	**BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 22A (CANAL SAN FRANCISCO) - (SON 2) CALZADA 2**	**9½ meses**
44	*1.3.4.1*	*INICIO CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 22A (CANAL SAN FRANCISCO) - (SON 2) CALZADA 2*	*Hito*
45	1.3.4.2	CIMENTACIÓN	5½ meses
46	1.3.4.3	INFRAESTRUCTURA	3½ meses
47	1.3.4.4	SUPERESTRUCTURA	1½ meses
48	1.3.4.5	ACABADOS	1 mes
49	1.3.4.6	ESPACIO PUBLICO	1½ meses
50	*1.3.4.7*	*FIN CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 22A (CANAL SAN FRANCISCO) - (SON 2) CALZADA 2*	*Hito*
51	**1.3.5**	**ESTACIÓN TRANSMILENIO 8 - CALLE 13 (Incluye Cicloparqueadero)**	**10 meses**
52	*1.3.5.1*	*INICIO CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN TRANSMILENIO 8 - CALLE 13*	*Hito*
53	1.3.5.2	CIMENTACIÓN	1½ meses
54	1.3.5.3	ESTRUCTURA	6½ meses
55	1.3.5.4	ACABADOS	3 meses
56	1.3.5.5	REDES SECAS	2½ meses
57	1.3.5.6	TAQUILLAS	1 mes
58	1.3.5.7	CICLOPARQUEADERO - CALLE 13	2 meses
59	*1.3.5.8*	*FIN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN TRANSMILENIO 8 - CALLE 13*	*Hito*
60	**1.3.6**	**ESTACIÓN TRANSMILENIO 9 - CALLE 19**	**8½ meses**
61	*1.3.6.1*	*INICIO ESTACIÓN TRANSMILENIO 9 - CALLE 19*	*Hito*
62	1.3.6.2	CIMENTACIÓN	1½ meses
63	1.3.6.3	ESTRUCTURA	6 meses
64	1.3.6.4	ACABADOS	3 meses
65	1.3.6.5	REDES SECAS	2½ meses
66	1.3.6.6	TAQUILLAS	1 mes
67	*1.3.6.7*	*FIN ESTACIÓN TRANSMILENIO 9 - CALLE 19*	*Hito*
68	**1.3.7**	**ESTACIÓN TRANSMILENIO 10 - AVENIDA ESPERANZA (Incluye Cicloparqueadero)**	**9 meses**
69	*1.3.7.1*	*INICIO ESTACIÓN TRANSMILENIO 10 - AVENIDA ESPERANZA*	*Hito*
70	1.3.7.2	CIMENTACIÓN	1½ meses
71	1.3.7.3	ESTRUCTURA	5½ meses
72	1.3.7.4	ACABADOS	3 meses
73	1.3.7.5	REDES SECAS	2½ meses
74	1.3.7.6	TAQUILLAS	1 mes
75	1.3.7.7	CICLOPARQUEADERO - AV. ESPERANZA	2 meses
76	*1.3.7.8*	*FIN ESTACIÓN TRANSMILENIO 10 - AVENIDA ESPERANZA*	*Hito*
77	**1.3.8**	**PASO PEATONAL TIPO BOX - CALLE 13**	**20 meses**
78	*1.3.8.1*	*INICIO CONSTRUCCIÓNPASO PASO PEATONAL TIPO BOX - Av. PRIMERO DE MAYO*	*Hito*
79	1.3.8.2	CIMENTACIÓN	5½ meses
80	1.3.8.3	ESTRUCTURA	14½ meses
81	1.3.8.4	ACABADOS	5½ meses
82	1.3.8.5	REDES SECAS	11 meses
83	*1.3.8.6*	*FIN CONSTRUCCIÓN PASO PEATONAL TIPO BOX - Av. PRIMERO DE MAYO*	*Hito*
84	**1.3.9**	**PUENTE PEATONAL - AVENIDA ESPERANZA SUR**	**9½ meses**
85	*1.3.9.1*	*INICIO PUENTE PEATONAL - AVENIDA ESPERANZA SUR*	*Hito*
86	1.3.9.2	CIMENTACIÓN	1½ meses
87	1.3.9.3	ESTRUCTURA	6½ meses
88	1.3.9.4	ACABADOS	2 meses
89	1.3.9.5	REDES SECAS	2½ meses
90	*1.3.9.6*	*FIN PUENTE PEATONAL - AVENIDA ESPERANZA SUR*	*Hito*
91	**1.3.10**	**PUENTE PEATONAL - AVENIDA ESPERANZA NORTE**	**9½ meses**
92	*1.3.10.1*	*INICIO PUENTE PEATONAL - AVENIDA ESPERANZA NORTE*	*Hito*
93	1.3.10.2	CIMENTACIÓN	1 mes
94	1.3.10.3	ESTRUCTURA	6½ meses
95	1.3.10.4	ACABADOS	2 meses
96	1.3.10.5	REDES SECAS	3 meses
97	*1.3.10.6*	*FIN PUENTE PEATONAL - AVENIDA ESPERANZA NORTE*	*Hito*
98	**1.3.11**	**PUENTE PEATONAL P7 CANAL SAN FRANCISCO - CALLE 22A**	**9½ meses**
99	*1.3.11.1*	*INICIO PUENTE PEATONAL - CANAL SAN FRANCISCO - CALLE 22A*	*Hito*
100	1.3.11.2	CIMENTACIÓN	1 mes
101	1.3.11.3	ESTRUCTURA	6½ meses
102	1.3.11.4	ACABADOS	2 meses
103	1.3.11.5	REDES SECAS	3 meses
104	*1.3.11.6*	*FIN PUENTE PEATONAL - CANAL SAN FRANCISCO - CALLE 22A*	*Hito*
105	*1.3.12*	*FIN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN T1-S4*	*Hito*
106	**1.4**	**ETAPA DE ENTREGA**	**1 MES**
107	***1.5***	***FIN TRAMO - SECTOR 4***	***HITO***

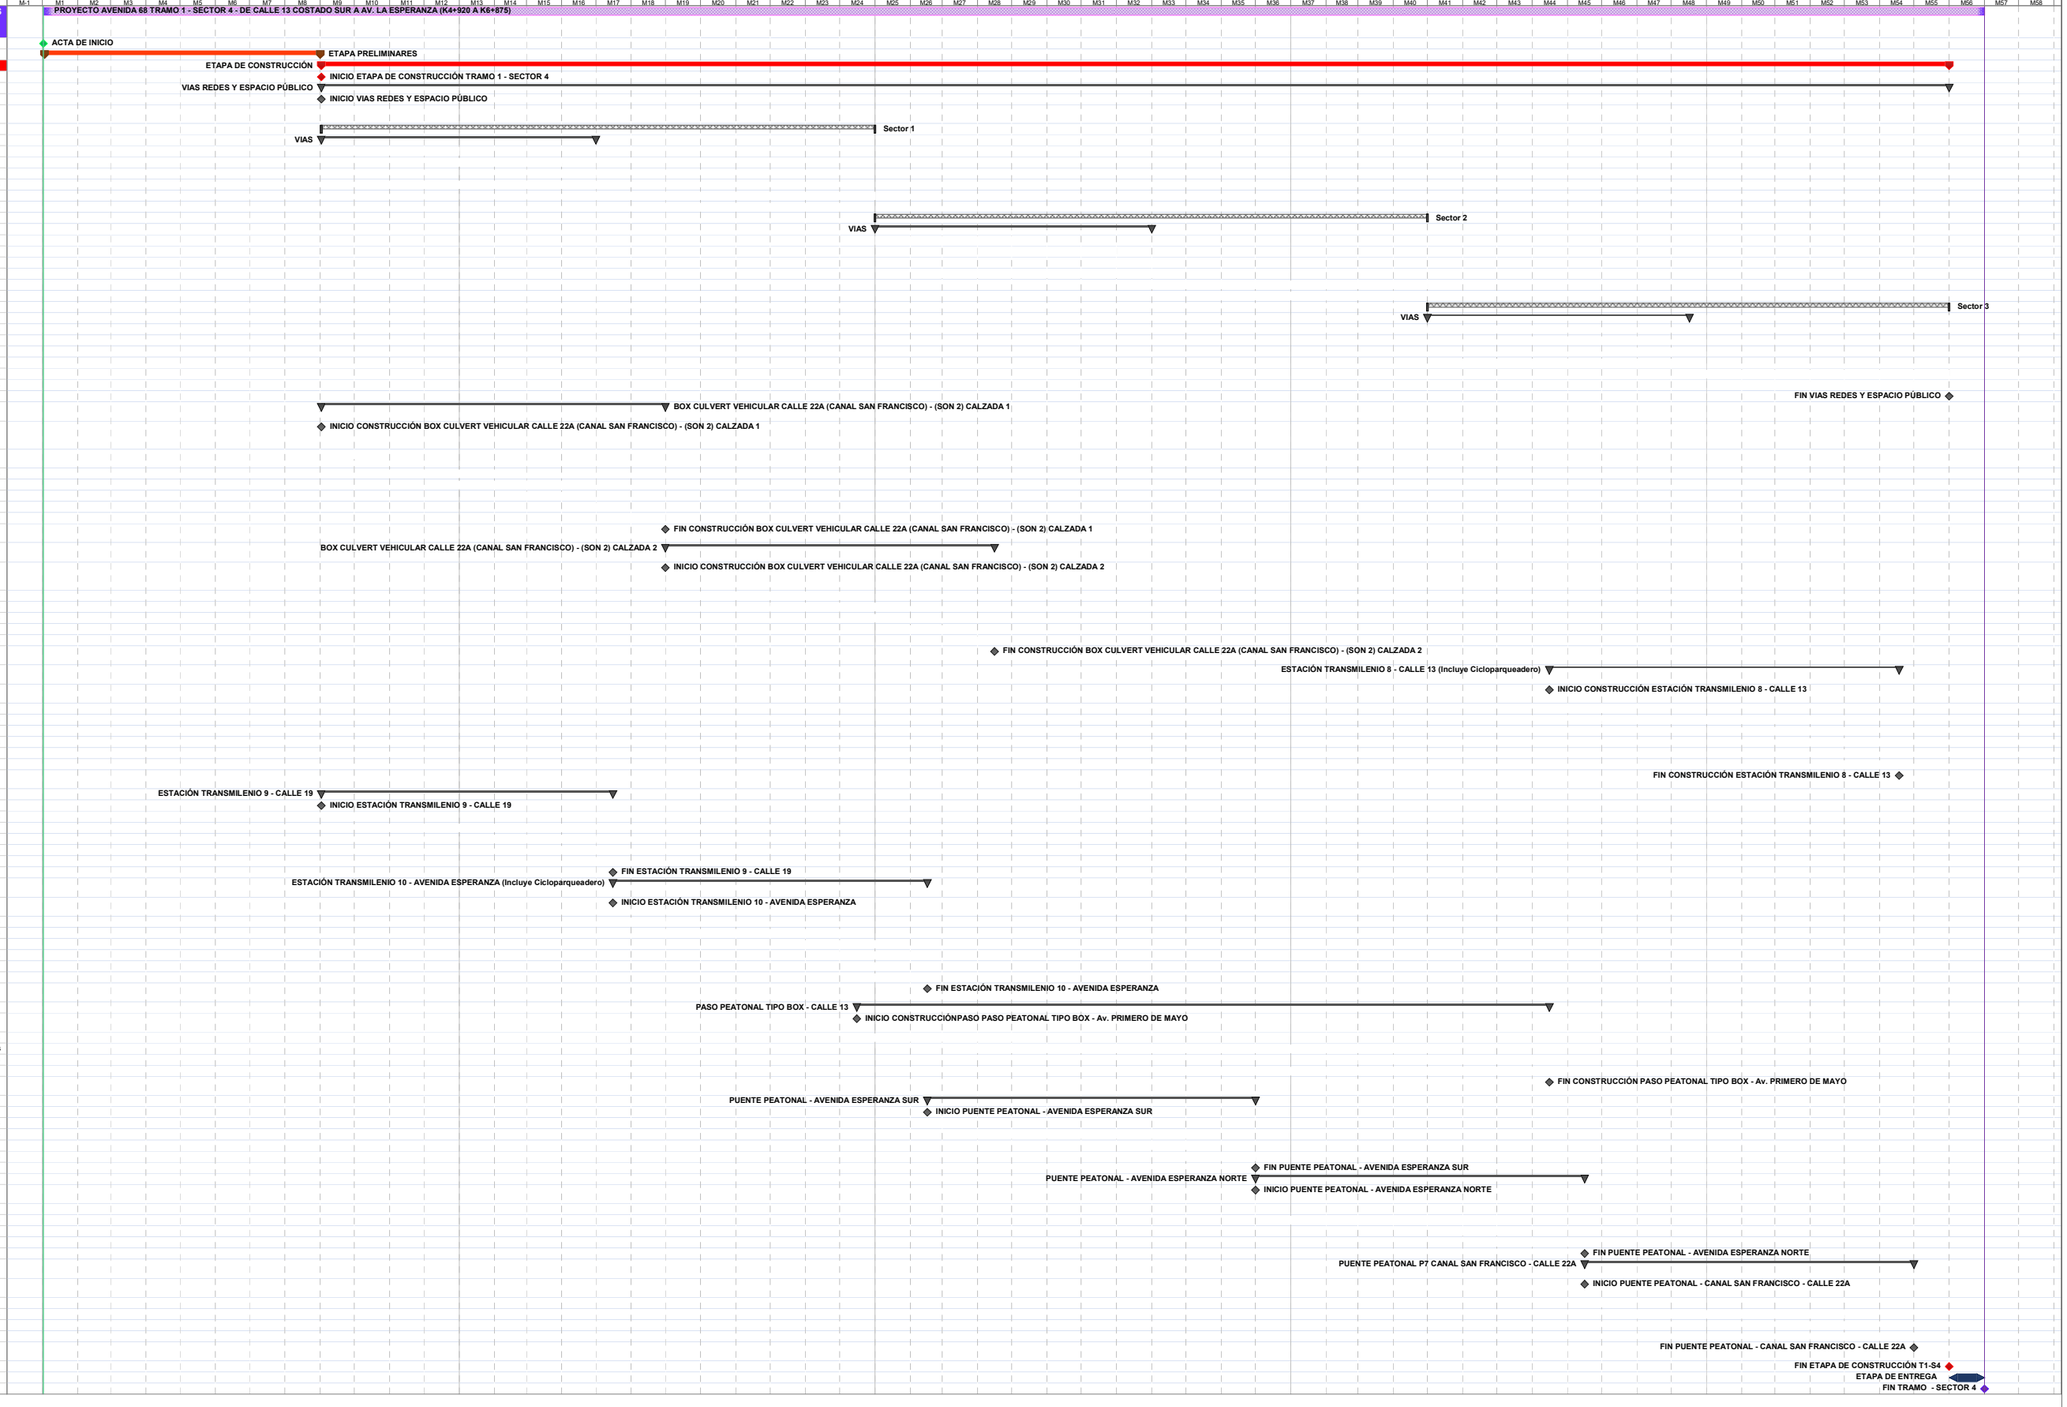

Proyecto: Cronograma Av.68 - Sector 4 (2019-10)
Plazo: 56 MESES

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
