ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

Acta e Informe de Recibo Parcial No. 02		**Fecha Acta e Informe: 21** / 11 / 2023	
Contrato No.: DJC-CM-08.05-05-284-2023			
Contratante – Nit:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO **Nit.** 805.000.889-0		
Contratista – CC/Nit:	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S – NIT 900.215.779-7		
Objeto del Contrato:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO		
Fecha de Inicio:	08 / 11 / 2023	**Fecha de Terminación:**	15 / 12 / 2023
Valor Inicial:	$ 859.431.447 IVA INCLUIDO	**Valor Otro Sí** (adición o dismin.)	$ 0
Forma de Pago:	La UNIAJC cancelará al INTERVENTOR el valor del contrato de la siguiente forma: Se realizará en tres pagos parciales equivalentes al 30% Pago 1; 30% pago 2; y un último pago por el 40% del contrato, correspondiente a la instalación completa de la solución, funcionando en perfectas condiciones y acorde a los requerimientos técnicos de la Universidad. El valor del contrato será cancelado al contratista previa certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobado los informes en los términos previstos, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. La UNIAJC, realizará los pagos, con un tiempo no mayor a 60 días hábiles/calendario de la fecha de la recepción factura y/o cuenta de cobro con todos sus soportes, previa certificación de la documentación y la prestación del servicio a entera satisfacción por parte del Supervisor/Interventor del Contrato, según disponibilidad del PAC		
Certificado de Disponibilidad:	15233	**Registro Presupuestal:**	40288
Número de Factura:	**FESG359**	**Fecha de Factura:**	21 / 11 / 2023
Valor Factura:	$ 257.829.434		

ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

Supervisor y/o Interventor:	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S – NIT 900.215.779-7

En Santiago de Cali, se reunieron el supervisor y contratista, a fin de realizar el recibo parcial del Contrato suscrito, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: Que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO y EL CONTRATISTA, celebraron Contrato con las especificaciones anteriormente mencionadas.

Segunda: Garantías Constituidas por el Contratista (Las solicitadas en el contrato):

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		**Póliza N°:** 45-44-101152049
Amparos	**Vigencia**	
	Desde	**Hasta**
1. Garantía Única de Cumplimiento	**03 / 11 / 2023**	**30/ 06 / 2024**
1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	**03 / 11 / 2023**	**31 / 12 / 2026**
1.4. Calidad del servicio	**31 / 12 / 2023**	**31 / 12 / 2028**
Amparos Adicionales:	Modificación No. No Aplica	Póliza No. No Aplica

Tercera: Que el suscrito Supervisor y/o Interventor, procedió a verificar el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones pactadas en el contrato, por lo cual allega el informe y la respectiva cuenta de cobro.

Periodo del Informe: NOVIEMBRE	
Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales) [1]	**Gestión realizada por el Contratista**
1. Fechas de despacho Cisco.	Seguimiento - Aceptado Confirmación fechas de despacho
2. Tubería principal instalada y terminada, se instaló cableado eléctrico y de voz y datos desde tubería principal hasta todos los centros de datos a la altura de los bajantes	Seguimiento – Aceptado Sede Av. 6 Principal
3. Actividades programadas para este corte en estación 1, terminadas al 100%. Excepto en instalación de fibra ótica	Seguimiento – Aceptado Estación 1
4. Actividades programadas para este corte en Sede Sur, terminadas al	Seguimiento – Aceptado Estación Sur

[1] Es necesario que para cada pago, el Interventor o Supervisor detalle las actividades realizadas por el contratista y los entregables del periodo correspondiente.

ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

100%. Excepto en instalación de fibra ótica Se anexa Evidencias	

Cuarta: Que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO considera necesario y viable proceder con la ejecución de lo allí contemplado, y así dar continuidad con el objeto del CONTRATO celebrado, así como proceder al pago parcial correspondiente de acuerdo con el siguiente balance económico:

Detalle	Fecha Acta y/o Informe	Factura y/o C. Cobro.		Valor Contrato	Amortización Anticipo	Pagos Realizados	Saldo Contrato
		No.	Fecha				
Inicio del Contrato	08/11/2023	No Aplica	No Aplica	$859.431.447	No Aplica	No Aplica	$859.431.447
Cuota No. 1 – Rec. Parcial	14/11/2023	FESG355	14/11/2023	No Aplica		$257.829.434	$601.602.013
Cuota No. 2 – Rec. Parcial	21/11/2023	FESG359	21/11/2023	No aplica		$257.829.434	$343.772.579

Nota: Que para efectos de radicar la Factura correspondiente al pago y de acuerdo con lo previsto en la cláusula "Valor y Forma de Pago" del contrato, el Contratista deberá adjuntar a su factura una copia de esta Acta e Informe de Recibo Parcial debidamente firmada por las partes.

Quinta: El Supervisor y/o Interventor le consta que el contratista pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, encontrándose que sus cotizaciones para la presentación de esta acta están ajustadas a la Ley[2] (se anexan las evidencias)

Seguridad Social - Personas Jurídicas

Fecha Certificado: 21/ 11 / 2023	
Nombre del Revisor Fiscal o Contador	**Tarjeta Profesional:** N°. 220017-T
WILMER ALEXANDER ALONSO GOMEZ	

En constancia de aceptación por las partes se firma en Santiago de Cali, por quienes intervienen en ella.

Supervisor y/o Interventor,

CARLOS ANDRES BOLAÑOS
SUPERVISOR
C.C. No. 16.917.124

Contratista,

SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S
Nit. 900.215.779-7
Javier Alfonso Rodríguez Aguirre
C.C. No. 91.283.452
Representante Legal

[2] Contratista debe verificar y acreditar el pago de aportes de la persona que haya contratado (Minsalud, concepto 201511201727881 del 10/14/2015)

Segurytecnia de Colombia S.A.S

NIT: 900215779 - 7
Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá
Teléfonos: 3164682828
Dirección: Kra 1 Este No 89 - 95 Of 401

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # FESG359

Fecha factura: nov. 21, 2023 09:32:18
Vencimiento: dic. 21, 2023
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764043868338 del 2023-02-03 al 2024-02-03 autorizado del FESG260 al FESG500

FACTURADO A:
Cliente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO
NIT: 805000889-0
Email: facturacionuniajc@admon.uniajc.edu.co
Tel: 3016115744
Dirección: Sede Principal Avenida 6N No 28N-102
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	01	**Factura No. 2 de la interventoria del contrato DJC-CM08.05-05-284-2023 correspondiente al 30% del valor del contrato. segundo pago** Unidad: 94	1	$ 216,663,390.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 216,663,390.00	**$ 257,829,434.00**

Cantidad de lineas: 1

NOTAS

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS A LA CUENTA CORRIENTE No 897010831 DEL BANCO BBVA Y REPORTAR SU PAGO A info@segurytecniadecolombia.com, DETALLANDO LAS RETENCIONES PRACTICADAS

Observación

Objeto del contrato: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.
Fecha acta de inicio: 8 de Noviembre de 2023

Aplicar retención de servicios en proyectos de infraestructura del 6%

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 M/CTE PESOS

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 216,663,390.00**
Total impuestos:	**$ 41,166,044.00**
Total IVA:	$ 41,166,044.00
TOTAL	**$ 257,829,434.00**

CUFE: 80e8e28dffcf79d8154ddea6549a455fb0f7af075a9fe3e0748ada3534e6135049f2057d1062bb2d29726ad9945e183a

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

SEGURYTECNIA
DE COLOMBIA

Bogotá D.C, 21 de Noviembre del 2023

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, WILMER ALEXANDER ALONSO GOMEZ, identificado con la C. C. No. 1. 015.405. 577 de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el NIT No. 900 .215.779-7, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de seguridad social (salud, pensión), ARL y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuyo parágrafo segundo fue modificado por el articulo 10 de la Ley 828 de 2003 y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos en los últimos seis (6) meses.

Se expide el presente certificado el 21 de Noviembre de 2023.

Cordialmente,

REVISOR FISCAL
WILMER ALEXANDER ALONSO GÓMEZ
CC 1.015.405.577

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS**, identificado(a) con NIT número **900.215.779-7** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0897010831** aperturada el **3 de junio del 2009**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.


Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **10 de noviembre del 2023.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:


Cuenta de 10 dígitos:**0897010831**
Cuenta de 16 dígitos:**0897000100010831**
Cuenta de 20 dígitos:**00130897000100010831**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

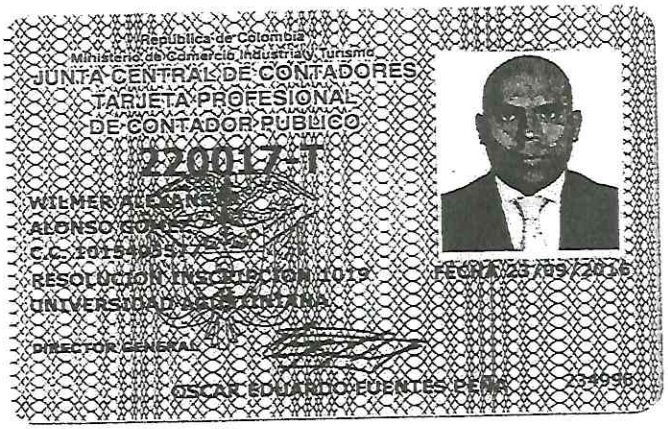

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
220017-T
WILMER ALEXANDER
ALONSO GOMEZ
C.C. 1015400517
RESOLUCION INSCRIPCION 1019
UNIVERSIDAD CATOLICA
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
FECHA 25/09/2016
234996

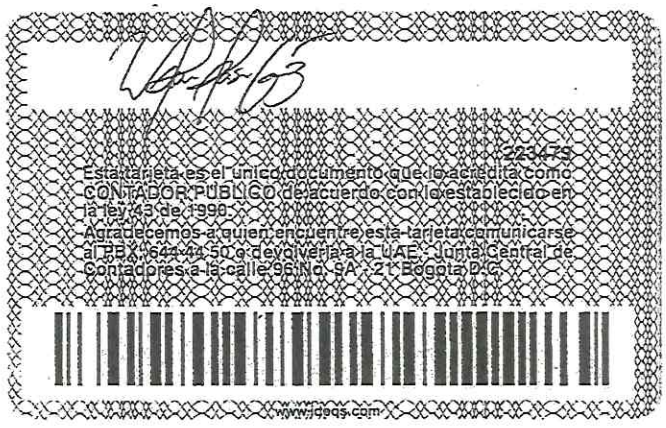

223479
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la U.A.E. - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.jcpqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 0 B 5 E 7 9 F 2 5 E 3 E B 4 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILMER ALEXANDER ALONSO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015405577 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 220017-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.015.405.577**

ALONSO GOMEZ
APELLIDOS

WILMER ALEXANDER
NOMBRES

Wilmer Alexander Alonso Gómez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-1988**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-JUN-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABSATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500112-47151383-M-1015405577-20060818 **07063** 06229O 02 215314142

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.283.452**

RODRIGUEZ AGUIRRE

APELLIDOS

JAVIER ALFONSO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAY-1972**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	**O-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUL-1990 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00003361-M-0091283452-20080329 **0000**091316A 1 6210015442

'OS GENERALES DEL APORTANTE

lentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	Si

'OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
-10	2023-11	255604280	9458635298	E	2023/11/21	2023/11/03	BANCOLOMBIA	0	$7,644,100

)UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ursal: CAFAM (6 Afiliados)						$20,370,000	$3,370,200			$20,370,000	$814,800			$20,370,000	$814,800			$20,370,000	$1,418,100		$0	$0
tro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$20,370,000	$3,370,200			$20,370,000	$814,800			$20,370,000	$814,800			$20,370,000	$1,418,100		$0	$0
ad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$20,370,000	$3,370,200			$20,370,000	$814,800			$20,370,000	$814,800			$20,370,000	$1,418,100		$0	$0
	CC	3169166	ACOSTA ABRAHAM	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
	CC	38568275	ARBOLEDA CAROLINA	25-14	30	$6,400,000	$1,088,000	EPS001	30	$6,400,000	$256,000	CCF21	30	$6,400,000	$256,000	14-11	30	$6,400,000	$445,500	30	$0	$0
	CC	19376735	BULLA MARCO	25-14	30	$1,900,000	$304,000	RES008	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
	CC	79569714	RODRIGUEZ GABRIEL	230201	30	$3,670,000	$587,200	EPS008	30	$3,670,000	$146,800	CCF21	30	$3,670,000	$146,800	14-11	30	$3,670,000	$255,500	30	$0	$0
	CC	91283452	RODRIGUEZ JAVIER	25-14	30	$4,700,000	$799,000	EPS001	30	$4,700,000	$188,000	CCF21	30	$4,700,000	$188,000	14-11	30	$4,700,000	$327,200	30	$0	$0
	CC	79858832	TORRES NELSON	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ursal: CAFAM 1 (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
tro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
ad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
	CC	1070011161	HERNANDEZ JUAN	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
	CC	51790138	RODRIGUEZ GLADYS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
tal	Afiliados(8)					$25,370,000	$4,170,200			$25,370,000	$1,014,800			$25,370,000	$1,014,800			$25,370,000	$1,444,300		$0	$0

'OS GENERALES DEL APORTANTE

lentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
)00215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	Si

'OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-10	2023-11	255604280	9458635298	E	2023/11/21	2023/11/03	BANCOLOMBIA	0	$7,644,100

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 3)				8	$4,170,200	$0	$0	$4,170,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,783,000	$0	$0	$2,783,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$800,000	$0	$0	$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$587,200	$0	$0	$587,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,444,300	$0	$0	$1,444,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,444,300	$0	$0	$1,444,300
(ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,014,800	$0	$0	$1,014,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	$1,014,800	$0	$0	$1,014,800
(ADMINISTRADORAS: 6)				8	$1,014,800	$0	$0	$1,014,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$444,000	$0	$0	$444,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$246,800	$0	$0	$246,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$48,000	$0	$0	$48,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	1	$76,000	$0	$0	$76,000
TAL				8	$7,644,100	$0	$0	$7,644,100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91276282
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDUARDO RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 38A NO 46-93	TELÉFONO:	5864120
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de servicios de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7901217739	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		274166308	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	$ 208.000
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901037916	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	$ 162.500
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	$ 6.800

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14895566230

(415)7707212489984(8020) 000001489556623 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 5 7 7 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 ESTE 89 95 OF 401 ED PIJAO ORIENTAL

42. Correo electrónico javiro15@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 2 6 3 9 7 2	3 1 6 4 6 8 2 8 2 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 0 8 0 4 3 0	7 1 1 2	2 0 0 8 0 4 3 0					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1	2	
		58. CPC	5 4	9 7	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 11 / 20 : 17: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ AGUIRRE JAVIER ALFONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895566230

(415)7707212489984(8020) 000001489556623 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 5 7 7 9	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	0 0 0 0 0	
73. Fecha	2 0 0 8 0 4 1 8	
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 5 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 4 9 5 2 1	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	2 7 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 4 1 8	
81. Hasta	2 0 1 8 0 4 1 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895566230

(415)7707212489984(8020) **000001489556623 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 5 7 7 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 8 0 9 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 1 2 8 3 4 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	AGUIRRE	JAVIER	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 8 5 6 8 2 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARBOLEDA	ARCILA	CAROLINA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895566230

(415)7707212489984(8020) 000001489556623 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 5 7 7 9	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 1 2 8 3 4 5 2	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	AGUIRRE	JAVIER	ALFONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
50,000,000	1 0 0	2 0 1 4 1 0 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895566230

(415)7707212489984(8020) 000001489556623 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 1 5 7 7 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 5 4 0 5 5 7 7		2 2 0 0 1 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ALONSO	GOMEZ	WILMER	ALEXANDER

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 1 8

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 4 8 4 7 8		1 1 2 4 4 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BRIÑEZ	CAMPOS	GERMAN	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SEGURYTECNIA DE COLOMBIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO UNIAJC

CONTRATO DJC-CM-08.05-05-284-2023

Informe semanal #2

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO. CONTRATO 284.

Periodo de Informe *15/11/2023* **a** *21/11/2023*

Fecha: 21/11/2023
Versión: 1
Versión de Plantilla: 1 – 25/10/2022

Información de control del documento

Descripción	Valor
Título del Documento:	Informe semanal 2 de Progreso del Proyecto
Nombre del Proyecto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – CONTRATO 284
Autor del documento:	Ing. Hugo Polania - Gestor Documental
Director del Proyecto:	Ing. Javier Rodríguez
Versión Doc.:	1
Confidencialidad:	Media
Fecha:	21/11/2023

Aprobación y revisión del documento:

NOTA: Se requieren todas las aprobaciones. Se deben mantener registros de cada aprobación.

Todos los revisores de la lista se consideran necesarios a menos que se indique explícitamente como Opcionales.

Nombre	Rol	Acción	Fecha	Firma
Gabriel Rodríguez	Ingeniero Residente	Revisa	21-11-2023	
Eduardo Rodriguez	Ingeniero Residente	Revisa	21-11-2023	
Javier Rodríguez	Director del proyecto	Aprueba	21-11-2023	
Carolina Arboleda	Coordinadora Técnica	Revisa	21-11-2023	
Javier Rodríguez	Rep. Legal	Autoriza	21-11-2023	

Historial de documentos:

El Autor del Documento está autorizado a hacer los siguientes tipos de cambios al documento sin requerir que el documento sea aprobado nuevamente:

Editorial, formateo y ortografía.

Aclaración.

Para solicitar un cambio en este documento, póngase en contacto con el Autor o el Propietario del Documento.

Las modificaciones de este documento se resumen en la siguiente tabla en orden cronológico inverso (primero la última versión).

Revisión	Fecha	Creada por	Breve descripción de los cambios	Firma
1	21-11-2023	Hugo Polania	Primera versión	

Contenido

1. SÍNTESIS DEL PROYECTO 4

Comité de dirección del proyecto 4

Información contractual 4

Resumen ejecutivo 4

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 5

Plan de Proyecto (Programado vs. ejecutado) 5

Avances 5

Incidencias y control de calidad 6

Relación de oficios 7

3. COMPONENTE TECNICO 8

Comportamiento en tiempo y Actividades de trabajo 8

Actividades realizadas 8

Hitos y Entregables 9

Plan de acción 10

Registro Fotográfico: 11

4. COMPONENTE FINANCIERO 11

Definición forma de pago ..... **¡Error! Marcador no definido.**

5. COMPONENTE DE RIESGOS 13

6. COMPONENTE AMBIENTAL 13

7. COMPONENTE SISO 13

Actividades realizadas en el componente de salud y seguridad en el trabajo – sst 13

Indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo (resolución 0312 de 2019) 14

Acciones preventivas, correctivas y de mejora 15

Relación del personal presente en las sedes. 15

8. ANEXOS 16

1. Síntesis del Proyecto

Comité de dirección del proyecto

Comité de Dirección del Proyecto de interventoría (CDPI)	**Ingeniero residente (IR): Ing. Gabriel Rodríguez**
	Ingeniero Residente (IR): Ing. Eduardo Rodriguez
	Coordinadora Técnica (CT): Ing. Carolina Arboleda
	Director de Proyecto (DP): Ing. Javier Rodríguez
Comité de Dirección del Proyecto de Ejecución	**Director del proyecto: Laura Martínez**
Universidad Antonio José Camacho	**Supervisor: Ing. Carlos Andrés Bolaños Ceballos**

Información contractual

Contrato Interventoría: Segurytecnia de Colombia S.A.S.		**Contrato UNIÓN TEMPORAL CIBSIT**	
Nro. Contrato	DJC-CM-08.05-05-284-2023	**Nro. Contrato**	DJC-LP-08.01-01-272-2023
Fecha inicio	02-11-2023	**Fecha inicio**	02-11-2023
Fecha fin	15-12-2023	**Fecha fin**	15-12-2023
Plazo inicial	2 meses	**Plazo inicial**	2 meses
Plazo final	15-12-2023	**Plazo final**	15-12-2023
Valor Inicial	$859.552.100	**Valor Inicial**	$8.570.138.400
Valor adicional	Sin modificaciones	**Valor adicional**	Sin modificaciones

Resumen ejecutivo

El proyecto actualmente se encuentra con un avance del **9%** de acuerdo con el cronograma establecido y aprobado por interventoría. Esta variación se atribuye a ajustes en el alcance del proyecto realizados por la entidad contratante. Estos cambios han generado demoras significativas en algunas tareas, lo que ha llevado a la necesidad de implementar un control de cambios.

Con el objetivo de gestionar eficazmente estas modificaciones, se ha presentado una solicitud de control de cambios que abarca modificaciones en la metodología de ejecución, ajustes en el alcance y modificaciones en el presupuesto. La solicitud ha sido revisada y respaldada por la interventoría, siendo posteriormente sometida a la Universidad para su aprobación y procesamiento.

Esta instancia de control de cambios se ha llevado a cabo de manera diligente y conforme a los procedimientos establecidos, garantizando la transparencia y la integridad del proceso. Se espera que la aprobación por parte de la Universidad permita una ejecución más eficiente y acorde a los ajustes necesarios, optimizando así la consecución de los objetivos del proyecto.

Además, es importante destacar que se han logrado avances notables en las actividades de mayor relevancia dentro del proyecto, específicamente aquellas que conforman la ruta crítica. A pesar de las dificultades surgidas por la imposibilidad de ejecutar las tareas según lo establecido en el cronograma inicial, se ha adoptado una estrategia proactiva.

En respuesta a los desafíos identificados, se han adelantado actividades con fechas de inicio cercanas, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los plazos acordados contractualmente. Esta decisión estratégica ha permitido mitigar el impacto de las demoras en algunas áreas del proyecto, garantizando así que se avance de manera eficiente en las etapas cruciales para el cumplimiento de los objetivos finales.

Este enfoque ágil y anticipado ha demostrado ser efectivo para mantener el proyecto en curso y ha contribuido positivamente a la gestión de los tiempos, asegurando que se cumplan los compromisos establecidos a pesar de los ajustes en el alcance y las variaciones en el cronograma inicial.

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Debido a los resultados derivados de los estudios y diseños de las sedes de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC, realizados durante la ejecución del proyecto, así como las nuevas actividades complementarias identificadas por la entidad contratante, se ha generado la necesidad imperativa de solicitar al contratista la presentación de una nueva versión del cronograma.

La entrega de este nuevo cronograma es esencial para reflejar de manera precisa y actualizada las modificaciones en el alcance y las adaptaciones necesarias en el plan de ejecución. Es importante señalar que este ajuste tendrá implicaciones en la trazabilidad del proyecto, debido a que, hasta contar con una versión final del cronograma actualizado, la evaluación histórica de los avances se verá temporalmente limitada.

No obstante, esta actualización del cronograma es un paso crucial para garantizar la alineación efectiva del proyecto con los objetivos acordados y las expectativas de la entidad contratante. La transparencia y la comunicación abierta con todas las partes involucradas serán fundamentales durante este proceso de adaptación, asegurando así una gestión eficiente y la toma de decisiones informada a lo largo de la ejecución del proyecto.

Plan de Proyecto (Programado vs. ejecutado)

De acuerdo con la reunión realizada con el contratista, el miércoles 3 de noviembre de 2023 se definió la herramienta MS Project, como elemento de valoración del alcance del proyecto, sin embargo, en acuerdo con todas las partes interesadas en el proyecto, se definió, utilizar una metodología que asigne factores de contribución, en términos de porcentaje, a cada una de las actividades (ELDIN, 1989), con el objeto que la nueva versión del cronograma, no solo evalúe los alcances en tiempo, sino también el peso de las actividades desarrolladas.

Para tal efecto la Interventoría diseño una herramienta en Excel que se entregó al contratista para el desarrollo, control y retroalimentación del cumplimiento del cronograma.

Mientras de recibe la nueva versión del cronograma se presentan los avances por cada uno de los frentes de trabajo iniciados al corte de este informe:

Avances

Se presenta información de avances a la fecha:

Fecha	Título	Descripción	Estado[1]	Aceptación / Rechazo	Responsable
20/11	Fechas de despacho Cisco	Confirmación fechas de despacho	Terminado	Aceptado	Contratistas
20/11	Sede Avenida Sexta	Tubería principal instalada y terminada, se instaló cableado eléctrico y de voz y datos desde tubería principal hasta todos los centros de datos a la altura de los bajantes	Terminado	Aceptado	Contratistas

[1] El estado del avance puede ser cualquiera de los siguientes: Entregado; Entrega pendiente.

20/11	Estación 1	Actividades programadas para este corte en estación 1, terminadas al 100%. Excepto en instalación de fibra ótica	Terminado	Aceptado	Contratistas
20/11	Sede Sur	Actividades programadas para este corte en Sede Sur, terminadas al 100%. Excepto en instalación de fibra ótica	Terminado	Aceptado	Contratistas

Incidencias y control de calidad

ID	fecha	Descripción	Estado[2]	Detalles de la acción	Urgencia[3]	Impacto[4]	Califc.[5]	Responsable
1	04/11/23	La ejecución de las actividades establecidas en el contrato DJC-CM-08.05-05-284-2023 está directamente vinculada al progreso de la obra civil, operando de manera dependiente	Abierto	Las actividades de ejecución del contrato están directamente vinculadas al progreso de la obra civil. Por lo tanto, se seguirá un enfoque dependiente, coordinando las acciones conforme avance la construcción para garantizar la sincronización adecuada entre las tareas del contrato y el desarrollo de la obra civil.	5	5	5	UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO UNIAJC
2	16/11/23	Se presento control de cambios	Abierto	En consecuencia, de los resultados derivados de los estudios y diseños de las sedes de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC,	5	5	5	UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO UNIAJC

[2] El estado de la incidencia puede ser cualquiera de los siguientes: Abierto; Pospuesto; Resuelto; Cerrado.

[3] Valor numérico que indica la urgencia de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

[4] Valor numérico que denota la gravedad/impacto de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

[5] Tamaño de la incidencia representa el coste relacionado con la resolución de la incidencia. Los valores posibles son: 5=Muy alto; 4=Alto; 3=Medio; 2=Bajo; 1=Muy bajo.

				realizados durante la ejecución del proyecto, así como las nuevas necesidades identificadas por la entidad contratante.				
3	15/11/23	Observaciones de mantenimiento		El contratista encontró oxido en tuberías expuestas en terraza avenida sexta.	5	1	5	UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO UNIAJC
4	16/11/23	Cambio de requerimientos		Nuevos cambios en puntos adicionales, se cancelaron puntos que debían ser instalados	5	5	25	UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO UNIAJC
5	16/11/23	Adquisiciones		Demoras en entrega de fibra óptica	5	4	20	UNIÓN TEMPORAL CIBSIT
6	20/11/23	Ejecución de tareas de moderado riesgo durante horario diurno		Se programa trabajo nocturno para eliminar riesgo para estudiantes y profesores				UNIÓN TEMPORAL CIBSIT

Relación de oficios

En reunión con el contratista se definió tiempo de respuesta para todo tipo de oficio, el estado de dichos documentos se calificará como; en proceso, si se encuentra dentro de los tres días hábiles inmediatos a la fecha de envió del oficio; sin respuesta todo oficio cuya respuesta supere los tres días hábiles

Nro.	Fecha	Concepto	Responsable	Estado
SDC-284-001	07/11/23	Requerimiento de documentación – contrato djc-lp-08.01-01-272-2023	UNIÓN TEMPORAL CIBSIT	En proceso
SDC-284-002	11/11/23	Requerimiento direccionamiento ip equipos – contrato djc-lp-08.01-01-272-2023	UNIAJC	En proceso
SDC-284-003	15/11/23	Segunda solicitud requerimiento de documentación – contrato djc-lp-08.01-01-272-2023	UNIÓN TEMPORAL CIBSIT	En proceso
SDC-284-004	16/11/23	Concepto interventoría recomendación para adición al contrato djc-lp-08.01-01-272-2023.	UNIAJC	En proceso
SDC-284-005	16/11/23	Solicitud de seguimiento crítico para la entrega de equipos de cómputo bajo el contrato djc-lp-08.01-01-272-2023.	UNIÓN TEMPORAL CIBSIT	En proceso
SDC-284-006	16/11/23	Validación y aceptación del cronograma de proyecto bajo el contrato djc-lp-08.01-01-272-2023.	UNIÓN TEMPORAL CIBSIT	En proceso

3. COMPONENTE TECNICO

Comportamiento en tiempo y Actividades de trabajo

El cronograma entregado por el contratista fue revisado y validado por la interventoría, sin embargo, en ocasión de los resultados derivados de los estudios y diseños de las sedes de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC, realizados durante la ejecución del proyecto, así como las nuevas necesidades identificadas por la entidad contratante, se ha generado la necesidad imperativa de solicitar al contratista la presentación de una nueva versión del cronograma.

.

Actividades realizadas

Contempla las actividades distribuidas por sedes en la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO (UNIAJC).

1. Avenida sexta
    a. Se terno instalación de tubería central (principal), tarea critica del proyecto.
    b. Se cambio tubería por bandeja, en el camino de coordinación a gestión humana y sala virtual, donde se instalarían puntos adicionales al contrato, que posteriormente se cancelaron para optimizar la utilización de los recursos del proyecto.
    c. Se encontraron tuberías ICBC oxidadas, no correspondientes al proyecto (hallazgo informado a la universidad para mejorar su mantenimiento). En consecuencia, se está protegiendo la tubería del proyecto para evitar futuros daños y alargar su vida útil.
    d. Se instaló tubería de ¾ para todos los centros de cableados solo faltan los bajantes a los gabinetes.
    e. Se arranco esta semana con cableado eléctrico, se llegó a todas las áreas perimetrales, solo está pendiente bajar a mobiliario (bajantes, puntos de datos y perimetrales). Depende de llegada de mobiliario, actividad propia de la Universidad, a la cual se oficiará solicitando fecha de instalación.

CENTRO DE CABLEADO	ACTIVIDAD	% PLANEADO	%REAL
CONTAC CENTER	INSTALACIÓN DE CABLEADO DE DATOS Y ELÉCTRICO	100	70
DTIC	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FIBRA ÓPTICA	100	70
310	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FIBRA ÓPTICA	100	70
311	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FIBRA ÓPTICA	100	70
PPAL CORE	INSTALACIÓN DE BANDEJA MALLA DE 20CM	100	48

2. Estación 1
    a. Las tareas programadas para este corte fueron efectuadas al 100%, excepto:
        i. Instalación de fibra óptica, la cual se encuentra la espera de entrega por parte del proveedor
        ii. Adecuación de bandejas existentes.

CENTRO DE CABLEADO	ACTIVIDAD	% PLANEADO	%REAL
PISO 6	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FIBRA OPTICA	100	100
	ADECUACIÓN DE BANDEJA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA NUEVA	15	15
PISO 5	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FIBRA OPTICA	100	100
PISO 2	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FIBRA OPTICA	100	100
PISO 1	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FIBRA OPTICA	100	100

3. Sede Sur
    a. Pendiente la instalación de la fibra óptica e infraestructura en aula máxima. Actividades en biblioteca, aulas zona del campestre y laboratorios al 100%, pendientes entrada a los RAC
    b. Se define que la reserva de la fibra en ultima caja al lado del RAC.

CENTRO DE CABLEADO	ACTIVIDAD	% PLANEADO	%REAL
NOC BIBLIOTECA	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FIBRA OPTICA	100	80
AULA MÁXIMA	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FIBRA OPTICA	10	10
SALONES CAMPESTRES	SONDEO POR ZONA BLANDA DESDE BILIOTECA	100	100
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA	SONDEO POR ZONA BLANDA DESDE BILIOTECA	100	100
LABORATORIO DE QUÍMICA	SONDEO POR ZONA BLANDA DESDE BILIOTECA	100	100

4. Esta semana se trabajará horario nocturno para optimizar tiempos y minimizar riesgos para estudiantes y colaboradores de la entidad contratante. Se realizarán las siguientes actividades:
    a. Instalaciones de tuberías en pasillos
    b. Trabajos que requieran manejo de alturas.

Hitos y Entregables

ID	Hito	Fecha Actual de entrega	Estado	Comentarios
1	Firma de Acta de Inicio	10/11/2023	Aceptado	Ninguno
2	Entrega de Cronograma	07/11/2023	Aceptado	Posibles modificaciones que no alteran el desarrollo de la ejecución.
3	Inicio de actividades del contrato suministro no. DJC-LP-08.01-01-272-2023	03/11/2023	Aceptado	En Desarrollo

Hitos Sede Avenida Sexta

CENTRO DE CABLEADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE CORTE	SEGUIMIENTO
SEDE AV SEXTA				
CONTAC CENTER	4/11/23	15/12/23	17/11/23	24%
BIENESTAR	11/12/23	15/12/23	17/11/23	0%
GESTION HUMANA	25/11/23	29/12/23	17/11/23	7%
DTIC	9/11/23	19/12/23	17/11/23	17%
310	9/11/23	19/12/23	17/11/23	17%
311	9/11/23	19/12/23	17/11/23	18%
BIBLIOTECA	21/11/23	21/12/23	17/11/23	8%
ELECTRÓNICA	21/11/23	22/12/23	17/11/23	8%
COORDINACIÓN	21/11/23	22/12/23	17/11/23	8%
RECTORIA	21/11/23	19/12/23	17/11/23	10%
CASA DOCENTE	1/12/23	29/12/23	17/11/23	3%
COMUNICACIONES	1/12/23	29/12/23	17/11/23	12%
PPAL CORE	11/11/23	29/12/23	17/11/23	2%

Hitos sede Estación 1

CENTRO DE CABLEADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE CORTE	SEGUIMIENTO
SEDE ESTACIÓN 1				
PISO 6	9/11/23	19/12/23	17/11/23	4%
PISO 5	15/11/23	16/12/23	18/11/23	14%
PISO 2	15/11/23	15/12/23	19/11/23	14%
PISO 1	15/11/23	16/12/23	20/11/23	13%

Hitos Sede Sur

CENTRO DE CABLEADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE CORTE	SEGUIMIENTO
SEDE SUR				
NOC BIBLIOTECA	7/11/23	27/12/23	17/11/23	9%
PPAL PROYECTADO	20/11/23	29/12/23	17/11/23	0%
PPAL CENTRAL	20/11/23	20/12/23	17/11/23	0%
LAB SISTEMAS 104	20/11/23	21/12/23	17/11/23	0%
DOCENTES	20/11/23	21/12/23	17/11/23	0%
LAB SISTEMAS 105	20/11/23	22/12/23	17/11/23	0%
AULA MÁXIMA	16/11/23	23/12/23	17/11/23	3%
LAB DIDACTICA	27/11/23	11/12/23	17/11/23	0%
SALONES CAMPESTRES	16/11/23	27/12/23	17/11/23	7%
LAB ELECTRÓNICA	16/11/23	28/12/23	17/11/23	7%
LAB QUÍMICA	16/11/23	29/12/23	17/11/23	7%

Plan de acción

Seguimiento a las siguientes actividades:

- Presentación de facturación y seguimiento a desembolsos por parte de la entidad contratante
- Supervisión técnica y monitoreo constante de las actividades llevadas a cabo en las sedes correspondientes de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO (UNIAJC).
- Implementación de infraestructura para enlaces de fibra óptica (F.O), abarcando la instalación de tuberías y accesorios necesarios.

Registro Fotográfico:



El registro fotográfico completo del proyecto se encuentra a disposición para ser consultado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z7zceUyl2W3AQhGNY40EXnArKXrc-stR

4. COMPONENTE FINANCIERO

Contrato nro. DCJ-IP-08.01-01-272-2023 contratista

Para el análisis de la información financiera y contable del CONTRATO NRO DJC-LP-08.01-01-272-2023 se tomó como base la información reportada por el contratista UNION TEMPORAL CIBIST NIT 901.764.220-0

La metodología utilizada consiste en contrastar las actividades ejecutadas y reportadas por el contratista previa aprobación del área técnica del equipo interventor contrastando con la Clausula octava del contrato.

Valor del contrato: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($8.570.138.400) IVA INCLUIDO.

OCTAVA: FORMA DE PAGO: LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC pagará al CONTRATISTA El contrato resultante se cancelará de la siguiente manera: Se realizará en tres pagos parciales equivalentes al 30% Pago 1; 30% pago 2; 30% y un último pago por el 40% del contrato, correspondiente a la instalación completa de la solución, funcionando en perfectas condiciones y acorde a los requerimientos técnicos de la Universidad; previa certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobado (el) o (los) informe (s) en los términos previstos, y la

acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. La UNIAJC, realizará (el) o (los) pago (s), con un tiempo no mayor a sesenta (60) días calendario de la fecha de la recepción factura y/o cuenta de cobro con todos sus soportes, previa certificación de la documentación y la prestación del servicio a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, según disponibilidad del PAC.

El 14 de noviembre de 2023 se radico la factura FE 2 por valor de $ 2.571.041.520 correspondiente al primer 30 %, sobre la cual la entidad aun no realizo desembolso al tener un vencimiento de 60 días.

Corte	Pago	valor Acum/Pptado	Valor Acum/ Real	Cumplim
14/11/2023	-	2.571.041.520,00	-	0%
-	-	2.571.041.520,00	-	0%
-	-	3.428.055.360,00	$ 0	0%
Total		$ 8.570.138.400	$ 0	0%



La facturación y pagos pendientes se están ejecutando conforme los avances presentados y conciliados entre las partes, por lo tanto, las fechas estimadas de pago no están establecidas contractualmente y se actualizarán en el momento que se ejecuten.

Ejecución Financiera

El contratista ha ejecutado satisfactoriamente el 30 % del valor del contrato como se evidencia en la factura FE2.

	FE2
Subtotal	2.160.539.092,44
IVA	410.502.427,56
Total	2.571.041.520,00

TOTAL EJECUCION FECHA DE INFORME	2.571.041.520	30%
TOTAL CONTRATO	8.570.138.400	

Quedando pendiente una ejecución del 70% o $ 5.999.096.880 del total del contrato con IVA incluido.

A la fecha de informe se está tramitando la documentación pertinente para facturar el segundo 30 % de acuerdo al avance del proyecto.

Auditoría a órdenes de pago

En cumplimiento a lo establecido en la Metodología relacionada con la autorización de Órdenes de Pago, la Interventoría realiza la actividad de Auditoría con el objeto de verificar el pago efectivo al proveedor de los bienes y servicios adquiridos. Al respecto las siguientes observaciones:

- Se ha verificado el cumplimiento de aportes parafiscales
- Se ha verificado la documentación aportada junto a los requisitos legales.

Contrato nro. DJC-CM-08.05-05-284-2023- Interventor

En cumplimiento a la ejecución del contrato el interventor ha prestado sus servicios en los diferentes componentes mensualmente y emitido las recomendaciones, revisiones e informes a que dé lugar por lo tanto a la fecha ha emitido la facturación correspondiente a periodos concluidos:

- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE ANILLOS DE FIBRA ÓPTICA Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.
- Valor del contrato: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($859.431.447) IVA incluido.
- El 14 de noviembre de 2023 se radico la factura FESG 355 por valor de $ 257.829.434 correspondiente al primer 30 %, sobre la cual la entidad aun no realizo desembolso al tener un vencimiento de 60 días.

5. COMPONENTE DE RIESGOS

A través del oficio SDC-284-001, se ha requerido al contratista la entrega de la matriz de riesgos, la cual está actualmente en proceso de recepción.

6. COMPONENTE AMBIENTAL

Hasta la fecha, se ha generado un volumen de residuos en el sitio de la obra, los cuales están debidamente gestionados, sin ocasionar alteraciones ni impactos ambientales.

7. COMPONENTE SISO

La supervisión de las actividades y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo son responsabilidad de SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS, la cual realiza un seguimiento detallado mediante la revisión y validación en campo de las evidencias documentadas. Esta revisión incluye observaciones de inspectores e ingenieros interventores, garantizando así el cumplimiento de los estándares y normativas aplicables.

Actividades realizadas en el componente de salud y seguridad en el trabajo – sst

Para el periodo informado se verificó que las siguientes actividades se realizarán bajo la normatividad legal vigente y las especificaciones técnicas emitidas por la entidad contratante:

- Se realiza acompañamiento en campo a las actividades desarrolladas en las sedes de Av6n, estación 1 y sur.
- Se realiza la verificación a la ejecución del calentamiento y las charlas SST antes del inicio de las actividades.
- Se verifica el diligenciamiento de los ATS y permisos de trabajo según aplique.

- Se realiza el consolidado del personal que se encuentra ejecutando actividades en las tres sedes.

- Se realiza actividades de verificación y validación de los certificados de alturas del personal que ejecuta estas actividades en el proyecto.

- Se valida que el personal que se encuentra ejecutando las labores en las diferentes sedes es el que está relacionado en la planilla de la seguridad social.

Indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo (resolución 0312 de 2019)

Para este periodo Informado y según la ejecución de las diferentes actividades establecidas, se implementaron diferentes acciones que permiten controlar los posibles riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores en sitio.

Teniendo en cuenta la información presentada, se relaciona en el siguiente cuadro las siglas y sus significados para el análisis de las tablas de los indicadores:

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD				
VARIABLE	**DEFINICIÓN**	**INDICADOR**	**PERIODO**	
			MES noviembre	**AÑO 2023**
Número de trabajadores	Número de trabajadores reportados por el contratista	Número de trabajadores	24	
Número de días laborales	Días laborales por periodo	Número de días laborales	5	2023
Frecuencia de accidentalidad	Evalúa y presenta los resultados de la frecuencia de los eventos, a raíz de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades de origen común	AT en el mes	0	0
		Frecuencia AT	0	0
Severidad de accidentalidad	Cantidad de días que se cargan o asignan a una lesión generada por un accidente o incapacidad	Días de incapacidad	0	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes laborales mortales en un período de tiempo	Numero accidentes	0	0
		Proporción	0	0
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de una enfermedad laboral presentes en una población en un período de tiempo.	Número de casos nuevos y antiguos de EL	0	0
		Proporción	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un período de tiempo	Número de casos nuevos	0	0
		Incidencia laboral	0	0
Ausentismo por causa médica	Es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	Número días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	0
		Ausencia por causa medica	0	0

Acciones preventivas, correctivas y de mejora

Para el periodo informado se realizaron las siguientes acciones.

- Se realiza orden y aseo en el sitio de almacenamiento de las herramientas de las sedes Av. 6n y sur
- Se revisaron los documentos y soportes como permisos de trabajos en alturas y ATS.
- Uso correcto de esquema para de equipo de protección contra caídas.
- Asegurar la señalización y demarcación de área de trabajo en la realización de actividades.

Relación del personal presente en las sedes.

Del listado del personal avalado por la Universidad AJC se filtran las personas que están ejecutando actividades en los diferentes frentes.

N°	SEDES	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	VISITAS DE SUPERVISION	MAURICIO VELESQUEZ CORTES	94418996	GERENTE GENERAL
2	VISITAS DE SUPERVISION	LAURA MARTINEZ BURBANO	1144171039	INGENIERA DE PROYECTOS
3	VISITAS DE SUPERVISION	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	16795532	COORDINADOR DE PROYECTOS
4	SEDE SUR	JOSE ANTONIO ROSERO DIZU	1118303368	COORDINADOR DE SST
5	SEDE SUR	DIEGO ALBERTO SALINAS FLOREZ	1130661259	COORDINADOR OPERATIVO
6	VISITAS DE SUPERVISION	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO SUAREZ	1144024555	INGENIERO DE PROYECTOS
7	SEDE SUR	YEINSON STIVEN GARCIA GRACIA	1144135398	SUPERVISOR
8	SEDE SUR	JULIO CESAR MENA PAZ	1130593347	TECNICO
9	VISITAS DE SUPERVISION	DIMAR JAVIER ARMERO TENORIO	94322975	COORDINADOR OPERATIVO
10	VISITAS DE SUPERVISION	JULIAN DAVID ROSERO	1107074960	INGENIERO DE PROYECTOS
11	SEDE AV 6N	MAURICIO MORALES CABRERA	1144195287	SUPERVISOR SST
12	SEDE SUR	JEFFERSON PARRA	1107045368	AUXILIAR
13	SEDE AV 6N	SANTIAGO VELASQUEZ MOLINA	1110362496	AUXILIAR
14	SEDE SUR	LUZ ELENA ROMERO	1143138230	SUPERVISOR SST
15	SEDE AV6N	SEBASTIAN VELAZQUEZ	1107839939	AUXILIAR
16	SEDE AV6	JOSE MOMPOTES	76319162	TENICO
17	SEDE Av 6N - ESTACIÓN	JOSE MIGUEL SOLARTE	87028302	GERENTE
18	SEDE AV 6N	EDWIN FERNANDO ARCOS	1085662131	AUXILIAR
19	SEDE AV 6N	CARLOS ALBERTO CORAL	1143852213	AUXILIAR
20	SEDE ESTACION	MARCOS ALBEIRO BENITES	94310435	TENICO
21	SEDE AV 6N	DANIEL FERNANDO GUERRERO	1113540816	AUXILIAR
22	SEDE ESTACION	MARIO ANDRES LOPEZ TENORIO	1085689617	AUXILIAR
23	SEDE AV 6N	RAUL VALLEJO IDROBO	16720513	AUXILIAR
24	SEDE AV 6N	FRANCISCO JAVIER ORTIZ ORDOÑEZ	16289925	AUXILIAR

Se realiza la verificación de los certificados de trabajo en alturas del personal que ejecuta esta actividad, también se verifica la afiliación a ARL de las 2 personas que ingresaron esta semana con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, velando por la preservación de la seguridad y salud del personal en el desarrollo de las funciones en el presente contrato.

- https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx
- https://www.positivaenlinea.gov.co/nuevo/
- https://www.arlsura.com/index.php/certificado-y-carne-de-afiliacion

VARIABLE 14 AL 18 DE NOVIEMBRE AÑO 2023 TOTAL PERSONAL	
# días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0
# trabajadores incluidos subcontratistas, tercerizados	24
# días trabajados	5
# de ausencia por causa medica	0
# de AT	0
# de EL	**0**

8. ANEXOS

- Planilla de pagos parafiscales
- Certificación Pagos parafiscales
- RUT
- Certificación cámara de comercio
- Fotocopia de la cédula revisor fiscal
- Fotocopia Representante legal
- Certificación Bancaria
- Factura No.1
