## I. IDENTIFICACIÓN

| CONTRATO No. **NA** | CONVENIO No. **156-2023** | OS No. **NA** |
|---|---|---|

**INFORME DE:** **SUPERVISIÓN** __**X**__ **INTERVENTORÍA** _____

**CONVENIENTES:** - MUNICIPIO DE TELLO (Ejecutor) - JOSÉ MANUEL CÓRDOBA TRUJILLO.
- CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM.

**OBJETO:** "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS.*".

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 24 de febrero de 2023

**FECHA DE INICIO:** 3 de marzo de 2023

**DURACIÓN INICIAL**: Nueve (9) meses

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** 2 de diciembre de 2023
**FECHA DE TERMINACION FINAL:** 29 de diciembre de 2023

**OTROSIS, ADICIONALES Y SUSPENSIONES:**
Suspensión 1: 25 de julio de 2023
Reiniciación 1: 22 de agosto de 2023
Otrosi 1: 05 de septiembre de 2023

**FECHA DEL INFORME**: 27 de septiembre de 2023

## II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- ✓ El Convenio Interadministrativo No.156 fue suscrito el día 24 de febrero de 2023, entre Municipio de Tello y la CAM.

- ✓ El Convenio No.156 de 2023 cuenta con Acta de Inicio de fecha 3 de marzo de 2023, tiene un plazo inicial de nueve (9) meses contados a partir de la firma de dicha acta.

- ✓ Mediante los oficios 1633 2023-S de fecha 23 de mayo de 2023, y 5417 2023-S de fecha 6 de julio de 2023, la CAM a través de la Subdirección de Gestión Ambiental ha realizado requerimientos de avance y seguimiento al convenio.

- ✓ El Municipio de Tello mediante oficio de fecha 24 de julio de 2023, solicitó la suspensión del convenio para: revisar las condiciones, cantidades y precios unitarios para determinar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, acorde con las variaciones del mercado.

- ✓ Se suscribió el acta de suspensión No.1 de fecha 25 de julio de 2023, atendiendo la solicitud y justificación presentada por el Municipio de Tello.

- ✓ Mediante oficio de fecha 22 de agosto de 2023, el municipio de Tello informa que realizó una revisión exhaustiva de las condiciones pactadas en el convenio, teniendo en cuenta que cantidades y precios del proyecto deben ser ajustadas a las condiciones del mercado para el municipio la presente vigencia 2023, y lo justifica.


- ✓ Se suscribió el acta de reinicio No.1 de fecha 22 de agosto de 2023, una vez terminado el motivo que generó la suspensión.

- ✓ El día 24 de agosto de 2023 se elaboró el acta de justificación para la celebración del otrosi No.1 al convenio interadministrativo No.156 de 2023 suscrito entre el Municipio de Tello y la CAM.

- ✓ Se suscribió el Adicional No.1 al convenio interadministrativo 156 de 2023, con fecha 5 de septiembre de 2023, donde se adiciona el valor de $168.183.490 con recursos del Municipio, al monto del aporte inicial del ente territorial al convenio y respaldados con el CDP 2023000593 del 23 de agosto de 2023.

    - Valor inicial aporte del Municipio de Tello por la suma de $64.444.684 en efectivo, respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal 2023000065 del 24 de enero de 2023
    - Valor adicional del Municipio de Tello por la suma de $168.183.490 en efectivo, respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal 2023000593 del 23 de agosto de 2023.
    - Valor del aporte de la CAM por la suma de $920.638.346 en efectivo, respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal 2023000176 del 31 de enero de 2023, no se modifica.

- ✓ El municipio de tello en calidad de ejecutor del proyecto, reporta la publicación del proceso precontractual de Licitación Pública LP-002-2023 objeto del convenio para la "REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO", y publicando el aviso de la Convocatoria el día 26 de septiembre de 2023 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. La convocatoria presentó el siguiente cronograma:

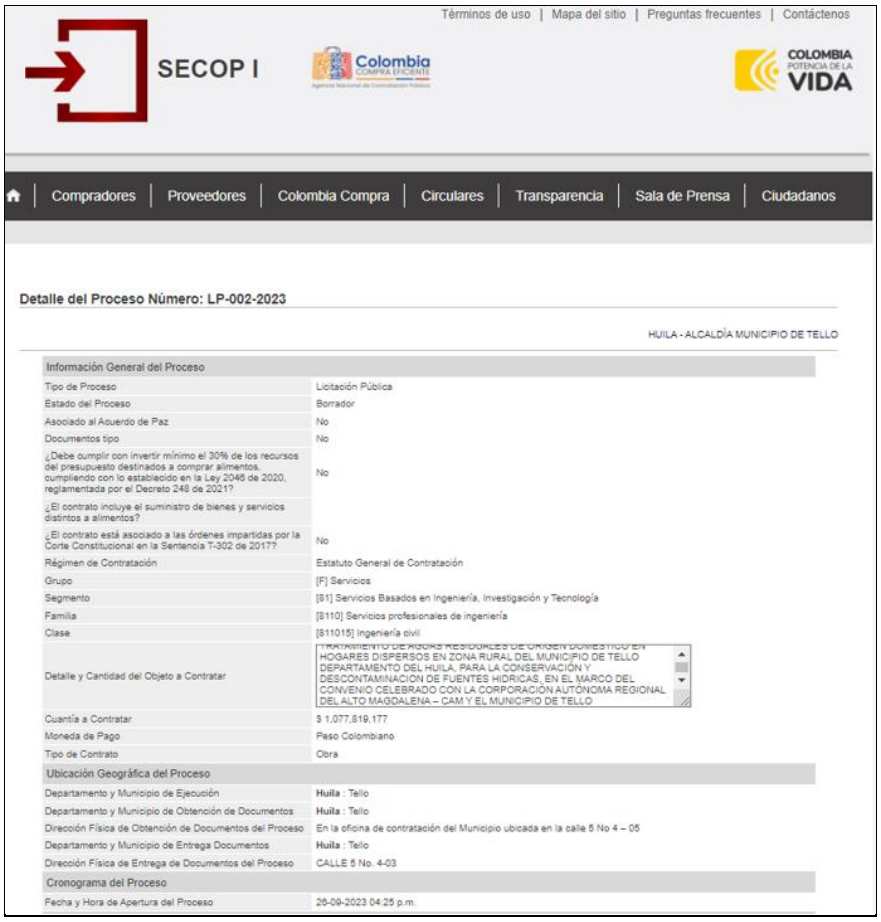

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

SECOP I

Colombia Compra Eficiente


COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

**Detalle del Proceso Número: LP-002-2023**

HUILA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TELLO

| Información General del Proceso | |
|---|---|
| Tipo de Proceso | Licitación Pública |
| Estado del Proceso | Borrador |
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
| Documentos tipo | No |
| ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? | No |
| ¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos? | |
| ¿El contrato está asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017? | No |
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
| Grupo | [F] Servicios |
| Segmento | [81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología |
| Familia | [8110] Servicios profesionales de ingeniería |
| Clase | [811015] Ingeniería civil |
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO |
| Cuantía a Contratar | $ 1,077,819,177 |
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
| Tipo de Contrato | Obra |
| **Ubicación Geográfica del Proceso** | |
| Departamento y Municipio de Ejecución | **Huila** : Tello |
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | **Huila** : Tello |
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | En la oficina de contratación del Municipio ubicada en la calle 5 No 4 – 05 |
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | **Huila** : Tello |
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CALLE 5 No. 4-03 |
| **Cronograma del Proceso** | |
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 26-09-2023 04:25 p.m. |

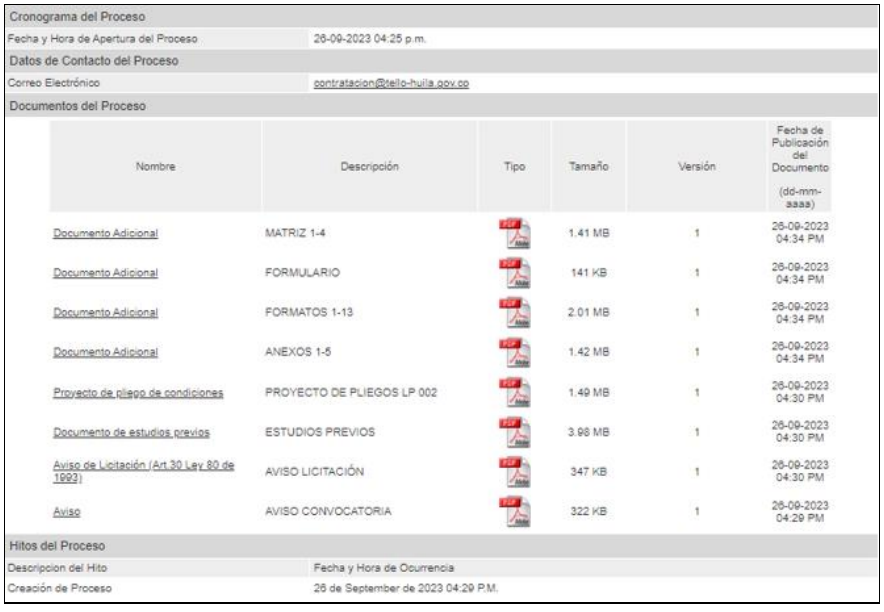

| Cronograma del Proceso | |
|---|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 26-09-2023 04:25 p.m. |
| **Datos de Contacto del Proceso** | |
| Correo Electrónico | contratacion@tello-huila.gov.co |

**Documentos del Proceso**

| Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento Adicional | MATRIZ 1-4 | | 1.41 MB | 1 | 26-09-2023 04:34 PM |
| Documento Adicional | FORMULARIO | | 141 KB | 1 | 26-09-2023 04:34 PM |
| Documento Adicional | FORMATOS 1-13 | | 2.01 MB | 1 | 26-09-2023 04:34 PM |
| Documento Adicional | ANEXOS 1-5 | | 1.42 MB | 1 | 26-09-2023 04:34 PM |
| Proyecto de pliego de condiciones | PROYECTO DE PLIEGOS LP 002 | | 1.49 MB | 1 | 26-09-2023 04:30 PM |
| Documento de estudios previos | ESTUDIOS PREVIOS | | 3.98 MB | 1 | 26-09-2023 04:30 PM |
| Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993) | AVISO LICITACIÓN | | 347 KB | 1 | 26-09-2023 04:30 PM |
| Aviso | AVISO CONVOCATORIA | | 322 KB | 1 | 26-09-2023 04:29 PM |

| Hitos del Proceso | |
|---|---|
| Descripcion del Hito | Fecha y Hora de Ocurrencia |
| Creación de Proceso | 26 de September de 2023 04:29 P.M. |

| Anexo 2 - Cronograma Licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico | | | |
|---|---|---|---|
| Código | CCE-EICP-IDI-13 | Versión | 1 |

| Actividad | Fecha | Lugar | Norma |
|---|---|---|---|
| Publicación del aviso de convocatoria pública | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Publicación Estudios y Documentos Previos | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Publicación del Proyecto de pliego de condiciones | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones | HASTA EL 07 DE OCTUBRE DE 2023 | En la Oficina de Contratación del Municipio de Tello y/o a través del correo electrónico: contratacion@tello-huila.gov.co | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4. |
| Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 10 DE OCTUBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I]<br>[Página web de la Entidad] | L. 80/93 art. 30 |
| Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones | 13 DE OCTUBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección | 13 DE OCTUBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Publicación del pliego de condiciones definitivo | 13 DE OCTUBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Audiencia de asignación de Riesgos | 17 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 10:00 AM | Calle 5 No. 4-03 , oficina de contratacion. Municipio de Tello H | L. 80/93 art. 30 |
| Presentación de Observaciones al pliego de condiciones | 13 - 17 DE OCTUBRE DE 2023 | En la Oficina de Contratación del Municipio de Tello y/o a través del correo electrónico: contratacion@tello-huila.gov.co | Fecha definida por la Entidad. |
| Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones | 18 DE OCTUBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Plazo máximo para la expedición de Adendas | 18 DE OCTUBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1. |
| Fecha de cierre | 24 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 9:00 AM | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1 | 24 DE OCTUBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 | 31 DE OCTUBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | L. 1882/18 art. 1 |
| Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | L. 1882/18 art. 1 |
| Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 | 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 AM | Calle 5 No. 4-03 , oficina de contratacion. Municipio de Tello H | Fecha definida por la Entidad. |
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1. |
| Firma del Contrato | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. |
| Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | Calle 5 No. 4-03 , oficina de contratacion. Municipio de Tello H | Fecha definida por la Entidad. |
| Aprobación de garantías | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | Fecha definida por la Entidad. |

## III. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA

### OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. GESTOR DEL PAP – PDA HUILA (Ejecutor):

| ACTIVIDAD O PRODUCTO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Etapa de Legalización | 100% | Se cumplió con la suscripción del convenio 156 de 2023, acta de inicio de fecha 3 de marzo de 2023, acta de reinicio de fecha 22 de agosto de 2023, y Otrosi No.1 de fecha 5 de septiembre de 2023; lo anterior, motivó la siguiente etapa pre-contractual con la publicación del proceso LP-0002-2023 |
| Etapa pre-contractual | 25% | El proceso LP-0002-2023 se publicó en la plataforma SECOP y cuenta con cronograma para la adjudicación de contrato. |
| Etapa contractual | 0% | |
| Etapa de ejecución | 0% | |
| Etapa de seguimiento | 0% | |

| ACTIVIDAD O PRODUCTO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Informe de ejecución física y financiera – recibo final | 0% | |
| Etapa de liquidación | 0% | |

## IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

| ACTIVIDAD O PRODUCTO | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS | $1.088.821.836 | $0 | 0% | Proceso LP-002-2023 |
| INTERVENTORIA | $64.444.684 | $0 | 0% | |
| **TOTAL** | **$1.153.266.520** | **$0** | **0%** | |

A continuación, se presenta mayor detalle de la ejecución financiera:

| **CONVENIO** | |
|---|---|
| No. Convenio y fecha | 156 del 24/02/2023 |
| **Aportes obra**: | |
| CAM Tasa Retributiva | $920.638.346 |
| **Aportes interventoría**: | |
| MUNICIPIO DE TELLO | $64.444.684 |
| **Aportes obra Otro si No.1**: | |
| MUNICIPIO DE TELLO | $168.183.490 |

## V. OTROS

| CONCEPTO | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | SI | NO | |
| Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión) | | | |
| Modificación de garantías | | | |
| Cláusulas de responsabilidad Ambiental | | | |
| Cláusulas de responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo | | | |
| Otros (Explicar) | | | |

## VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

**Calificación Promedio mínima aceptable 3,5**

**VALORACION DE LA CALIFICACION**

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

| CRITERIOS | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| Desempeño técnico | |
| Oportunidad en entrega | |
| Cantidad entregada | |
| Responsabilidad Ambiental | |
| Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo | |
| **PROMEDIO CALIFICACION** | |

## VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

La CAM en ejercicio de la supervisión correspondiente, remitió oficios, atendió y convocó a reuniones, para que se cumpla el objeto del convenio, así mismo ha prestado al municipio el apoyo institucional necesario y conforme a sus competencias para facilitar la ejecución del mismo.

Se realiza el presente informe de supervisión, para el seguimiento al cumplimiento del convenio, referente a la contratación y ejecución de las obras del proyecto.

Atentamente,



**LEONEL FERNANDO OBREGON SALAZAR**
Profesional Especializado
Supervisor CAM
