INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION** Fecha Impresión **23/09/12**
Dirección: **KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV** No. Remisión: **82654043**
Teléfono: **3100555** Página: **11 de 12**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalto mm
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042689E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0442744	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2021 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2022
* Doblado: NTC 1:2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y e
* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente Informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del Informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

209

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/09/12
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82654043
Teléfono:	3100555	Página:	12 de 12

Métodos de ensayo y declaración de Incertidumbre de la medición

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 497 psi/3.427 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 497 psi/3.427 Mpa
Alargamiento	± 0.36%
Altura Resalte	± 0.012 mm
Separación entre extremos	± 0.013 mm
Espaciamiento	± 0.025 mm
Angúlo de Resalte	± 0.11 °
Peso metro (masa)	± 0.0059 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

308

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV-
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648391
Página: 1 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042934A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042936A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429388	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429389	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429390	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.005	0.001	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.005	0.001	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.005	0.001	0.45	0.01	0.01	0.00

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

307

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.c
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648391
Página: 2 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.005	0.001	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.004	0.002	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.004	0.002	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.004	0.002	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60)	BTY0445005	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.004	0.002	0.45	0.01	0.01	0.00

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042934A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042936A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

302

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648391
Página: 3 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429388	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429389	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO CDR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429390	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.004

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

303

INFORME DE ENSAYOS

Ternium

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT:	901131909-1
Teléfono:	01 8000 423 724
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600
Página Web:	www.ternium.com.cc

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	Nº. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	4 de 13

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.004
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.004
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445005	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.004

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Tracción psi	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042934A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042936A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429388	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	5 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal	Carga Fluencia	Carga Tracción
					psi	psi	%			Pulg.2	lbf	lbf
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429389	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429390	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	72242	104054	15	Sin Grieta	1.44	0.31	22395	32257
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	72242	104054	15	Sin Grieta	1.44	0.31	22395	32257
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	72242	104054	15	Sin Grieta	1.44	0.31	22395	32257
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	72242	104054	15	Sin Grieta	1.44	0.31	22395	32257
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68259	101528	15	Sin Grieta	1.49	0.31	21160	31474

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

505

INFORME DE ENSAYOS

Ternium

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.c
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión: 23/08/29
No. Remisión: 82648391
Página: 6 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Tracción psi	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68259	101528	15	Sin Grieta	1.49	0.31	21160	31474
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68259	101528	15	Sin Grieta	1.49	0.31	21160	31474
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445005	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68259	101528	15	Sin Grieta	1.49	0.31	21160	31474

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensaya
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042934A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042936A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429388	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

306

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION Fecha Impresión 23/08/29
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV No. Remisión: 82648391
Teléfono: 3100555 Página: 7 de 13

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429389	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429390	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230823
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230823
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230823
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230823
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.c
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION Fecha Impresión 23/08/29
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV No. Remisión: 82648391
Teléfono: 3100555 Página: 8 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Temium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445005	NTC 2289 GR60	Temium Atlántic	20230824

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042934A	NTC 2289 GR60	Temium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042936A	NTC 2289 GR60	Temium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429388	NTC 2289 GR60	Temium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429389	NTC 2289 GR60	Temium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0429390	NTC 2289 GR60	Temium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

308

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	9 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	50	3.6	10.6	1.566
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	50	3.6	10.6	1.566
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	50	3.6	10.6	1.566
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	50	3.6	10.6	1.566
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.7	1.555
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.7	1.555
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.7	1.555

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Ternium

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.c
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648391
Página: 10 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte °	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445005	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.7	1.555

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042934A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042936A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429388	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429389	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429390	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

320

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	11 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.83
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.83
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.83
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0445005	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.83

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

311

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.c
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	12 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
	NTC2289/G60				

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

- Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018
- Doblado: NTC 1:2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10
- Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8
- Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 497 psi/3.427 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 497 psi/3.427 Mpa
Alargamiento	± 0.36%
Altura Resalte	± 0.012 mm
Separación entre extremos	± 0.013 mm
Espaciamiento	± 0.025 mm

Eivy Jerez

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

212

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	13 de 13

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Angulo de Resalte	± 0.11 °
Peso metro (masa)	± 0.0059 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

313

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648392
Página: 1 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042933A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429371	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429372	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429373	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429374	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429375	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429377	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429379	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429380	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

314

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.c
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión: 23/08/29
No. Remisión: 82648392
Página: 2 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429381	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429384	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429385	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429386	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042933A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429371	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

515

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648392
Página: 3 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429372	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429373	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429374	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	RDLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429375	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	RDLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429377	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429379	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	RDLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429380	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429381	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Labpratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

316

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648392
Teléfono:	3100555	Página:	4 de 13

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429384	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429385	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429386	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Tracción psi	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042933A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429371	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429372	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648392
Página: 5 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Tracción psi	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429373	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429374	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429375	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429377	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429379	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429380	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429381	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

318

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.c
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648392
Teléfono:	3100555	Página:	6 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal	Carga Fluencia	Carga Tracción
					psi	psi	%			Pulg.2	lbf	lbf
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429384	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429385	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429386	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042933A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429371	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429372	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824

Eivy Jerez

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

219

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión: 23/08/29
No. Remisión: 82648392

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA-PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429373	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429374	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429375	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429377	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429379	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429380	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429381	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429384	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

320

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648392
Teléfono:	3100555	Página:	8 de 13

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429385	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429386	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824

DATOS GENERALES / PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)
					°	mm	mm	Kg/m
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042933A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429371	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429372	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429373	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0429374	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

321

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648392
Teléfono:	3100555	Página:	9 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m
	NTC2289/G60							
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429375	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429377	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429379	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429380	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429381	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429384	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0429385	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560

Elvy Jerez.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

225

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648392
Teléfono:	3100555	Página:	10 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalto	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m
	NTC2289/G60							
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429386	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042933A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429371	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO CDR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429372	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429373	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO CDR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429374	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

323

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648392
Página: 11 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
NATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429375	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429377	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429379	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429380	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429381	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429383	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429384	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429385	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0429386	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.85

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

425

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Téléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648392
Teléfono:	3100555	Página:	12 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
	NTC2289/G60				

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición	
Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:	
* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 8, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018	
* Doblado: NTC 1:2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10	
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8	
* Verfiación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.	
Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:	
Variable	**Incertidumbre Expandida(1)**
Resistencia a la Fluencia	± 497 psi/3.427 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 497 psi/3.427 Mpa
Alargamiento	± 0.36%
Altura Resalte	± 0.012 mm
Separación entre extremos	± 0.013 mm
Espaciamiento	± 0.025 mm

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

225

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648392
Teléfono:	3100555	Página:	13 de 13

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Angulo de Resalte	± 0.11 °
Peso metro (masa)	± 0.0059 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

926

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION Fecha Impresión 23/09/12
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV No. Remisión: 82654043
Teléfono: 3100555 Página: 1 de 12

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Co	% Cr	% Ni	% Cu
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042681H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042682F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042682H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042683F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042684F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042686H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/09/12
No. Remisión: 82654043
Página: 2 de 12

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042689E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.05	0.17	0.006	0.009	0.002	0.45	0.01	0.01	0.01

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042681H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042682F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042682H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

318

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/09/12
No. Remisión: 82654043
Página: 3 de 12

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042683F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042684F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042686H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Ternium

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION**
Dirección: **KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV**
Teléfono: **3100555**

Fecha Impresión: **23/09/12**
No. Remisión: **82654043**
Página: **4 de 12**

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042689E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Tracción psi	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042681H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042682F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2269/G60	BTY042682H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042683F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042684F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

330

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION Fecha Impresión 23/09/12
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV No. Remisión: 82654043
Teléfono: 3100555 Página: 5 de 12

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Tracción psi	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042686H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042689E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69552	101804	16	Sin Grieta	1.46	0.11	7651	11198

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

337

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedéra (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/09/12
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82654043
Teléfono:	3100555	Página:	6 de 12

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal	Carga Fluencia	Carga Tracción
					psi	psi	%			Pulg.2	lbf	lbf
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042744G	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	67322	99329	15	Sin Grieta	1.48	0.11	7405	10926

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042681H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042682F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042682H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042683F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042684F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

355

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131989-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/09/12
No. Remisión: 82654043
Página: 7 de 12

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	PROPIEDADES FISICAS Fecha Ensayo
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042686H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042689E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0442744	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230906

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

333

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/09/12
No. Remisión: 82654043
Página: 8 de 12

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)
					°	mm	mm	Kg/m
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042681H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042682F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042682H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042683F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042684F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042686H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

334

INFORME DE ENSAYOS

Ternium

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION Fecha Impresión 23/09/12
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV No. Remisión: 82654043
Teléfono: 3100555 Página: 9 de 12

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte °	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042689E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	51	2.2	6.2	0.573
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0442744	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	50	2.3	6.1	0.575

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8"	BTY042681H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

335

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/09/12
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82654043
Teléfono:	3100555	Página:	10 de 12

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
9005643	NTC2289/G60 ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042682F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042682H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042683F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042684F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042685H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042686H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

336

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/09/12
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82654043
Teléfono:	3100555	Página:	11 de 12

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalto mm
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042687H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042688H	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.46
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY042689E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.45
9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BTY0442744	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.45

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2021 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2022
* Doblado: NTC 1:2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8
* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

3372

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/09/12
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82654043
Teléfono:	3100555	Página:	12 de 12

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 497 psi/3.427 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 497 psi/3.427 Mpa
Alargamiento	± 0.36%
Altura Resalte	± 0.012 mm
Separación entre extremos	± 0.013 mm
Espaciamiento	± 0.025 mm
Angulo de Resalte	± 0.11 °
Peso metro (masa)	± 0.0059 Kg/m

1) La incertidumbre expandida se base en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

238

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV-	No. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	1 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042934A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042936A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2269/G60	BTY0429388	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429389	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429390	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.19	0.004	0.010	0.001	0.46	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.005	0.001	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.005	0.001	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.005	0.001	0.45	0.01	0.01	0.00

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

339

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión: 23/08/29
No. Remisión: 82648391
Página: 2 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.005	0.001	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.004	0.002	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.004	0.002	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.004	0.002	0.45	0.01	0.01	0.00
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60)	BTY0445005	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.09	0.18	0.006	0.004	0.002	0.45	0.01	0.01	0.00

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042934A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042936A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002

Elvy Jerez

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

0240

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648391
Página: 3 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429388	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429389	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429390	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.002
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.004	0.003
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.004

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648391
Página: 4 de 13

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.004
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.004
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445005	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.005	0.004

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Tracción psi	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042934A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042936A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429388	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212

Eivy Jerez

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648391
Página: 5 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Tracción psi	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal Pulg.2	Carga Fluencia lbf	Carga Tracción lbf
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429389	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429390	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68211	100683	16	Sin Grieta	1.48	0.31	21145	31212
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	72242	104054	15	Sin Grieta	1.44	0.31	22395	32257
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	72242	104054	15	Sin Grieta	1.44	0.31	22395	32257
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	72242	104054	15	Sin Grieta	1.44	0.31	22395	32257
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	72242	104054	15	Sin Grieta	1.44	0.31	22395	32257
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	69259	101528	15	Sin Grieta	1.49	0.31	21160	31474

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	6 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia	Resistencia Tracción	Alargamiento	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal	Carga Fluencia	Carga Tracción
					psi	psi	%			Pulg.2	lbf	lbf
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68259	101528	15	Sin Grieta	1.49	0.31	21160	31474
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68259	101528	15	Sin Grieta	1.49	0.31	21160	31474
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445005	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	68259	101528	15	Sin Grieta	1.49	0.31	21160	31474

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042934A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042936A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429388	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

34h

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	7 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429389	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429390	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230823
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230823
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230823
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230823
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824

Elvy Jerez

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

345

INFORME DE ENSAYOS

Ternium

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	8 de 13

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445005	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	20230824

DATOS GENERALES / PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)
					°	mm	mm	Kg/m
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042934A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY042936A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429388	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429389	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0429390	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560

Elvy Jerez

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

9826

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648391
Página: 9 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Angulo Resalte	Separación Extremos mm	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m
9005638	NTC2289/G60 ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.6	1.560
9005638	NTC2289/G60 ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	50	3.6	10.6	1.566
9005638	NTC2289/G60 ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	50	3.6	10.6	1.566
9005638	NTC2289/G60 ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	50	3.6	10.6	1.566
9005638	NTC2289/G60 ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	50	3.6	10.6	1.566
9005638	NTC2289/G60 ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.7	1.555
9005638	NTC2289/G60 ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.7	1.555
9005638	NTC2289/G60 ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	54	3.9	10.7	1.555

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Ternium

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	11 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0429391	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0,85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443701	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0,85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443716	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0,85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443729	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0,85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0443733	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0,85
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445001	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0,83
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445002	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0,83
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BTY0445003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0,83
9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8"	BTY0445005	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0,83

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

348

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600

INFORMACION GENERAL

Cliente: STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION
Dirección: KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV
Teléfono: 3100555

Fecha Impresión 23/08/29
No. Remisión: 82648391
Página: 12 de 13

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte mm
	NTC2289/G60				

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición	
Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:	
* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018	
* Doblado: NTC 1:2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10	
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8	
* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.	
Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:	
Variable	**Incertidumbre Expandida(1)**
Resistencia a la Fluencia	± 497 psi/3.427 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 497 psi/3.427 Mpa
Alargamiento	± 0.36%
Altura Resalte	± 0.012 mm
Separación entre extremos	± 0.013 mm
Espaciamiento	± 0.025 mm

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

349

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social:	Ternium del Atlantico S.A.S.	Página Web:	www.ternium.com.co
NIT:	901131909-1		
Teléfono:	01 8000 423 724		
Dirección:	Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCION	Fecha Impresión	23/08/29
Dirección:	KM 114 CRT LA CORDIALIDAD KM 3 CRV	No. Remisión:	82648391
Teléfono:	3100555	Página:	13 de 13

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Angulo de Resalte	± 0.11 °
Peso metro (masa)	± 0.0059 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

359

CONSORCIO
INGENIERÍA
Nit: 901.590.075-0

ANEXO TC-07 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

CONSORCIO

INGENIERÍA

Nit: 901.590.075-0

FORMATO CONTROL DE MAQUINARIA

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONTRATO DE OBRA No. _CTO 448 MT 2022_

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No._CTO 477 MT 2022_

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

PERIODO: ___del 01 al 30 de septiembre__

No.	DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA O EQUIPO	DIAS DEL MES (Cantidad de horas trabajadas en el día)																													
		V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
1	BOBCAT S150	9	5		8	9	9	9	8	3		9	9	9	9	9	5		9	6	9	9	9	5		9	9	6	7	9	5	
2	EXCAVADORA P50	9	5		8	9	9	9	8	3		9	9	9	9	9	5		9	6	9	9	9	5		8	9	6	7	9	5	
3	ESTACIÓN TOTAL ELECTRONICA - NIKON	9	5		8	9	9	9	6	3		9	9	9	9	9	5		9	6	9	9	9	5		9	9	6	7	9	5	
4	NIVEL AUTOMATICO - NIKON	9	5		8	9	9	9	6	3		9	9	9	9	9	5		9	6	9	9	9	5		9	9	6	7	9	5	
5	GENERADOR DE ENERGIA	10	5		10	10	10	10	10	5		10	10	10	10	10	5		10	10	10	10	10	5		10	10	10	10	10	5	
6	VIBROCOMPACTADOR FIAT ALLIS CAT-15	9	5		8	9	9	9	8	3		9	9	9	9	9	5		9	6	9	9	9	5		9	9	6	7	9	5	
7	VOLQUETAS DOBLE TROQUE (6)	9	5		8	9	9	9	8	3		9	9	9	9	9	5		9	6	9	9	9	5		9	9	6	7	9	5	

ELABORÓ:
Ing. SANDRA LOPEZ
Residente de Obra

APROBÓ:
Ing. FABIAN BOHORQUEZ LESMES
Director de Obra

CONSORCIO
INGENIERÍA
Nit: 901.590.075-0

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

CONSORCIO BS INGENIERÍA

CONTRATO DE OBRA No. _CTO 448 MT 2022_

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _CTO 477 MT 2022_

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

PERIODO: del 01 al 30 de septiembre

Equipo Utilizado por el Contratista CONSORCIO BS INGENIERIA							Equipo Utilizado por la interventoría				
Nombre del Equipo	Actividad en la que se usa	N° Serie / ID	Precisión	N° Certificado de Calibración y/o verificación	Fecha Certificado	Certificado Vigente hasta	N° Serie / ID	Precisión	N° Certificado de Calibración y/o verificación	Fecha Certificado	Certificado Vigente hasta
ESTACION TOTAL ELECTRONICA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - REPLANTEO ESTRUCTURA	XV0115	2"	33035	4/03/2023	4/09/2023					
NIVEL AUTOMATICO	REPLANTEO ESTRUCTURA	RX6806	2 mm	33034	3/03/2023	3/09/2023					
ESTACION DE TOPOGRAFIA ELECTRONICA - NIKON	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - REPLANTEO ESTRUCTURA	881132	2"	7823	1/04/2023	1/10/2023					
NIVEL ELECTRONICO - COMPENSADOR	REPLANTEO ESTRUCTURA	RS232	2 mm	7823	1/04/2023	1/10/2023					

Ing. SANDRA LOPEZ
Residente de Obra

Ing. FABIAN BOHORQUEZ LESMES
Director de Obra

355

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7823

DESCRIPCION INSTRUMENTO

ESTACION DE TOPOGRAFIA ELECTRONICA
MARCA NIKON
MODELO DTM322
SERIAL 881132

DATOS CLIENTE
Ingeniero WILLIAM SALAMANCA

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

FECHA DE RECEPCION EQUIPOS	Abril	01	de	2023
FECHA DE EJECUCION CALIBRACION	Abril	01	de	2023
FECHA EXPEDICION CERTIFICADO DE CALIBRACION	Abril	01	de	2023
FECHA RECOMENDADA PROXIMA CALIBRACION	Octubre	01	de	2023

CONVENCIONES
NA: NO APLICA A: CORRECTO B: CORREGIDO C: REPARADO D: NO CORREGIDO

ESTADO INSTRUMENTO USADO

PARAMETROS TÉCNICOS INSTRUMENTO FABRICANTE

Resolución angular	1"
Precisión angular directa	2"
Precisión en distancia	3mm + 2ppm
Rango de alcance con un prisma	2300m
Nivel electrónico	5"
Temperatura de trabajo	-20c +50c
Distancia de enfoque mínima	1.5 m
Precisión de centrado compensador automático	ok

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACION:

EQUIPO UTILIZADO COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 18675120022	Certificado 26/05/2021
TEODOLITO ELECTRONICO MARCA LEICA MODELO T1800 No 412027	Precisión 1" DIN18723
NIVEL MARCA LEICA MODELO NA2 No 5047280 PLACA GPM3 No 87079	Precisión 0.2mm DIN18723

Procedimientos estandarizados bajo normas DIN 18723 DIN 17123 Incluye dos páginss

AJUSTES EFECTUADOS

GENERALES	
Limpieza general estación, estuche, cargador, y cables	B
Limpieza interna	B
Display, membranas de teclado	B
OPTICOS	
Cuerpo de enfoque telescopio	A
Cuerpo de enfoque grasas plomada óptica	A
Ajuste plomada óptica y/o laser	A
Reticulo	A
Grasas ocular	A
Circulos de lectura vertical y horizontal	A
Nivel esférico base	A
Nivel tubular	A
MECANICOS	
Base nivelante grasas y tornillos de nivelación	A
Compensador mecánico	NA
Grasas y ajuste tornillos de movimiento fino horizontal y vertical	A
Verticalidad instrumento	A
Miras de punteria telescopio	A

AT Instrumentos & Software SAS
Conmutador 467 3864
NIT 830.503.528-7

356

Powered by CamScanner

AT Instrumentos & Software SAS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Nº 7823

ELECTRONICOS	
Nivel electrónico - compensador	A
Memoria interna	A
Puerto serial de comunicación RS232	A
Puerto USB	NA
Puerto Bluetooth	NA
Pruebas de funcionamiento con variación de temperatura	A
Variación de ángulo horizontal fijo Variación vertical	A
Variación ángulo vertical fijo Variación horizontal	A
SOFTWARE	
Verificación de sistema instrumento	A
Actualización de firmware	A
Actualización de programas	A
Almacenamiento memoria interna	A
ACCESORIOS	
Baterías	A
Cargador	A
Cables de datos comunicación	NA
Filtro solar	NA

verifique la autenticidad de este certificado en www.atinstrumentos.com

AJUSTE CON COLIMADOR

DESCRIPCION	FASE I	FASE II	ERROR (SEGUNDOS)	TOLERANCIA (SEGUNDOS)	UNIDAD PATRON ADSOLUTA	INCERTIDUMBRE +/-
Angulo vertical	89.59.59	270.00.01	1	=2	1"	2"
Angulo horizontal	0.0000	180.00.00	0	=2	1"	2"
Compensador en X	0.5	0.5	0.5	0.5	1"	0.5
Compensador en Y	0.5	0.5	0.5	0.5	1"	0.5
Nivel tubular	10"	10"	<10	<10	60"	2mm
Nivel Chasis esférico	6'	6'	<6	<6	6	6'
Verticalidad	0	180.00.02	=2	=2	1"	2"
Plomada Óptica	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Plomada laser	0	1mm	0.5mm	<1.5mm	1mm	1mm

AJUSTE LINEA BASE CON PRISMA

Ppm= 79 Constante de prisma = 0

Distancia en mm	Promedio 20 mediciones	Fase I	Fase II	Desviación estándar	Incertidumbre (mm)	Tolerancia (mm)	Error (mm)
3356		3357	3356	1.123	1	2	1
24245		24245	24246	1.135	1	2	1
159265		159264	159267	1.145	1	2	2
435815		435813	435816	1.145	1	2	2

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior AT Instrumentos & Software SAS. No asume ninguna responssbilidad por el uso inadecuado del instrumento, transporte, no verificación del instrumento por parte del usuario y el uso de este certificado.
Los valores presentados están realizados en la fecha del presente certificado de calibración, en el momento y condiciones descritas al realizar las medidas.
El presente documento no demuestra propiedad sobre el instrumento calibrado. Número de páginas dos (2).

ELABORO:

LORENA CUBILLOS
Técnico de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS

APROBO:

HUGO ANDRES GONZALEZ
Jefe de laboratorio
AT Instrumentos & Software SAS.

AT Instrumentos & Software SAS

Conmutador 467 3864

Nit: 830.509.998-7

AT Instrumentos & Software SAS
Cra. 47 No. 128B - 71 Prado Veraniego PBX: (57-1) 467 3864
home page: www.atinstrumentos.com E-mail: info@atinstrumentos.com
Centro de respuesta comercial: 310 211 0992 Centro de respuesta técnica: 305 756 4410

357

Powered by CamScanner

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

No. 33035

CERTIFICADO

Equipo: Estación Total Electrónica **Marca:** Topcon

Modelo: ES-62 **Número de Serie:** XV0115

Cliente: CONSORCIO LYB

Fecha de expedición: 4 de marzo de 2023

Recomendamos ajustar: 4 de septiembre de 2023

¿Equipo nuevo? ☐ SI ☑ No

1. El servicio técnico de BB Equipos Topográficos S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del equipo verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del equipo y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo Utilizado:

Sistema de Colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0010 , Certificado el 01-12-2022 .

Patrones Utilizados:

Estación Total Sokkia CX-101 S/N: GP1430, Calibrado el 11-08-2022.
Nivel Automático Sokkia B20 S/N: QT6328, Calibrado el 11-08-2022.

Elaboró:

Cristian Ortega
Técnico

04 MAR 2023

Aprobó:

Cristian Ortega
Jefe de servicio técnico

Compra, Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajuste de Equipos Topográficos

BB Equipos Topográficos S.A.S. - Cra. 19 B No. 83 - 63 Oficina 401, Bogotá D.C. - PBX: 893 2626
FAX: 552 2170 - serviciotecnico@bbequipostopograficos.com - www.bbequipostopograficos.com

TOPCON SOKKIA Trimble. Nikon

SPECTRA McCloskey TORP<DO TM Technology & Attachment RECYCLER

358

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

No. 33035

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN FABRICANTE

Aumentos del telescopio	30X	Alcance sin reflector	350 m
Precisión angular (DIN 18723)	2"	Alcance con dianas reflectivas	300 m
Precisión en distancia	± (2mm+2ppmXD)	Alcance con un prisma	4000 m

AJUSTES EFECTUADOS

CODIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☑	☐	☐	☐	Ajuste del retículo	☑	☐	☐	☐
Prensa horizontal y vertical	☑	☐	☐	☐	Ajuste de la verticalidad	☑	☐	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H y/o V	☑	☐	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☑	☐	☐
Chequeo del teclado	☑	☐	☐	☐	Ajuste de plomada óptica o láser	☐	☑	☐	☐
Ajuste del compensador	☐	☑	☐	☐	Ajuste de las mirillas de puntería	☑	☐	☐	☐
Ajuste del nivel tubular	☐	☐	☐	☑	Ajuste del distanciómetro	☐	☑	☐	☐

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Punto 0 compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<7"	<7"
Nivel tubular	<15"	<15"	Verticalidad	<20"	<20"
Nivel circular	<5'	<5'	Plomada óptica o láser	<1mm	<1mm
Colimación horizontal	<7"	<7"			

AJUSTE CON LINEAS BASE

Constante de Prisma: -30mm PPM: 7...

DISTANCIA (mm)	PROMEDIO (10 Medidas)	DESVIACION ESTANDAR	INCERTIDUMBRE (mm)	TOLERANCIA (mm)	Error (mm)
7393,8	7393,4	0,52	0,16	± 2.0	-0,40

Fin de este documento.

Compra, Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajuste de Equipos Topográficos

BB Equipos Topográficos S.A.S. - Cra. 19 B No. 83 - 63 Oficina 401, Bogotá D.C. - PBX: 893 2626
FAX: 552 2170 - serviciotecnico@bbequipostopograficos.com - www.bbequipostopograficos.com

TOPCON SOKKIA Trimble. Nikon.
SPECTRA McCloskey TORP<DO TMA Technology & Attachment RECEIVER

359

EQUIPOS
TOPOGRÁFICOS

No. 33034

CERTIFICADO

Equipo: Nivel Automático **Marca:** Topcon

Modelo: AT-B4 **Número de Serie:** RX6806

Cliente: Consorcio L Y B

Fecha de expedición: 3 de marzo de 2023

Recomendamos ajustar: 3 de septiembre de 2023

¿Equipo nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El servicio técnico de BB Equipos Topográficos S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del equipo verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del equipo y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo Utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0011 , Certificado el 01-03-2023 .

Patrones Utilizados:

Estación Total Sokkia CX-101 S/N: GP1430, Calibrado el 11-08-2022.
Nivel Automático Sokkia B20 S/N: QT6328, Calibrado el 11-08-2022.

Elaboro:

Carlos Herrera
Técnico

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
0 3 MAR 2023
TÉCNICO

Aprobó:

Cristian Ortega
Jefe de servicio técnico

EQUIPOS
TOPOGRÁFICOS

No. 33034

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN FABRICANTE

Desviación Estándar (doble km de nivelación)	2mm	Mínima distancia focal	0.5 m
Tipo de imagen	Directa	Relación de estadía	100
Magnificación	24X	Rango del compensador	± 15'
Apertura del objetivo	30mm	Exactitud del compensador	0.5"

AJUSTES EFECTUADOS

CODIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☑	☐	☐	☐	Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H	☑	☐	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☐	☐	☑
Chequeo del teclado	☐	☐	☐	☑	Ajuste de las mirillas de puntería	☐	☐	☐	☑
Ajuste del compensador	☐	☑	☐	☐	Ajuste del distanciometro	☐	☐	☐	☑

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Rango de compensación	±15'	<30"
Nivel circular	<5'	<5'	Verticalidad de la retícula	<10"	<10"

Fin de este documento.

CONSORCIO
INGENIERÍA
Nit: 901.590.075-0

ANEXO TC-o8 INFORMES SEMANALES

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GI-F-019
VERSION: 03
FECHA: JULIO DE 2023

INFORMACION GENERAL

SEMANA No.	28	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	4/09/2023	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	19,41%
DESDE	28/08/2023		% AVANCE SEMANA
HASTA	3/09/2023		1,31%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 18.376.116.516,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/08/2024
CONTRATO DE INTERYENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1.316.504.045,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2823	FECHA VENCIMIENTO	25/09/2024

CONTROL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	VALOR EJEDUTADO	%
1,00000	AJUSTE A LOS DISEÑOS	UN	1,00	$ 151.725.000,00	1,00	0,93%	1,00	151.725.000	100%
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	1,00	$ 1.800.000,80	1,00	8,81%	1,00	1.800.000	100%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 2.149.242,88	1,00	8,81%	1,00	2.149.242	100%
1,10004	DESCAPOTE CON MAQUINA E=0,28M	M2	5877,57	$ 1.638,80	5878,00	8,06%	-	-	0%
1,10005	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	5057,93	$ 19.964,00	5858,00	8,34%	50,29	561.388	1%
1,10006	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1,00	$ 2.866.124,00	1,00	8,02%	0,50	1.433.062	58%
1,10007	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	817,83	$ 49.774,00	817,83	8,19%	53,50	2.662.909	9%
1,10008	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2937,42	$ 19.041,00	2937,42	0,34%	5.537,07	105.431.350	189%
1,10009	RETIRO DE SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE CARGUE)	M3/KM	1356,37	$ 9.749,00	1817,28	0,06%	148.358,75	1.446.349.454	14584%
1,10010	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	404,72	$ 21.487,00	0,00	0,05%	40,48	888.794	10%
1,10013	PROTECCIÓN TALUDES CON MALLA Y MORTERO	M2	148,06	$ 21.147,35	111,06	0,02%	-	-	0%
1,10012	REPLANTEO ESTRUCTURA	M2	2962,19	$ 4.040,00	2962,19	0,07%	-	-	0%
1,20001	CONCRETO 2500 PSI	M3	43,87	$ 401.038,35	43,87	0,11%	-	-	0%
1,20002	CONCRETO CICLOPEO 2800 PSI, 40% RAJON	M3	87,35	$ 288.935,28	97,35	0,17%	-	-	0%
1,20003	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	12,00	$ 834.144,45	12,00	0,06%	-	-	0%
1,20004	ZAPATAS EN CONCRETO 4000PSI	M3	155,40	$ 837.788,18	87,00	0,79%	-	-	0%
1,20006	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI A LA VISTA	M3	287,77	$ 777.462,80	28,14	1,37%	-	-	0%
1,20008	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	25195,81	$ 18.282,40	8298,75	1,57%	15.460,66	157.735.838	245%
1,70053	CANALIZACIÓN EN 4 TUBOS DE 6" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN), ESTA CANTIDAD ES ESTIMADA Y DEPENDERA DEL PROYECTO FINAL APROBADO POR CODENSA	ML	39,00	$ 389.212,90	39,00	8,89%	-	-	0%
1,90020	Tubería sanitaria 2"	ML	78,34	$ 22.115,60	70,34	0,81%	-	-	
1,90021	Tubería sanitaria 3"	ML	8,58	$ 29.626,30	8,58	8,00%	-	-	
1,90022	Tubería sanitaria 4"	ML	307,08	$ 48.664,00	138,10	8,88%	-	-	
1,90029	Excavación en material comun	UN	67,44	$ 36.479,15	67,44	0,82%	-	-	8%
1,90032	Suministro e instalación tubería sanitaria 4"	ML	196,47	$ 48.664,00	113,95	8,85%	-	-	
1,90036	Excavación en material comun	UN	67,88	$ 36.488,15	67,98	8,82%	-	-	
2,10009	SUBBASE GRANULAR	M3	88,81	$ 158.778,35	8,88	8,89%	1.759,75	275.890.781	
2,30001	PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA Y SUPERVISION PROVISIONAL ALCANTARILLADO	UN	1,00	$ 3.326.856,00	1,00	8,82%	0,50	1.663.429	50%
2,30028	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS EXISTENTES (PLACAS Y VIGAS)	M2	651,31	$ 519.123,60	485,88	2,06%	329,88	171.248.493	87%
2,30033	CERCA EN TELA VERDE H=2.18 M	ML	352,48	$ 29.326	352,48	8,06%	352,40	18.334.500	100%
2,30044	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,8-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	727,53	$ 71.008,85	451,87	8,32%	-	-	8%
NP-001	DESMONTE Y RETIRO DEL PARQUE BIOSALUDABLE	UN	1,00	$ 2.000.800,00	1,00	8,81%	1,00	2.000.000	100%
NP-002	DESMONTE Y RETIRO DE LA MALLA CONTRAIMPACTO	GLB	58,16	$ 400.800,00	58,18	8,14%	38,16	15.264.000	66%
NP-003	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA EXISTENTE	M2	6448,00	$ 6.129,00	6448,00	0,24%	6.904,55	42.317.987	107%
NP-004	FILTRO GEODREN 8,45X8,45 M CON TUBERIA FILTRO DE D=100 mm (incluye geotextil y	ML	230,00	$ 129.978,00	238,00	0,18%	-	-	0%
NP-005	DESMONTE Y RETIRO DE LOS ARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTES	UN	2,00	$ 298.000,00	2,00	0,00%	2,00	580.000	100%
				TOTAL		10,10%		$ 3.178.709.493,64	19,41%

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
2023001944	CONSORCIO BS INGENIERIA	AJUSTE A LOS DISEÑOS	13/06/2823	18/06/2823	$ 151.725.000,00	$ 31.684.500,00	$ 120.040.500,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 151.725.000,05	$ 31.684.500,00	$ 120.040.500,05


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- ☐ Se realiza actividades de excavaciones manuales.
- ☐ Se realiza actividades de localización y replanteo de cimientos.
- ☐ Ingresa a obra el acero figurado de 6000PSI para instalación en zapatas y vigas de cimentación.
- ☐ Adecuación de campamentos para personal de obra.
- ☐ Construcción de baños para personal de obra y administrativos.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA***

- ☐ La interventoria realiza seguimiento y control de la ejecución de las obras para que se desarrollen con veracidad y aceleración pertinente para evitar atrasos.
- ☐ Realiza actividades de confirmación de levantamiento topografico de la localización y replanteo de cimientos.

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

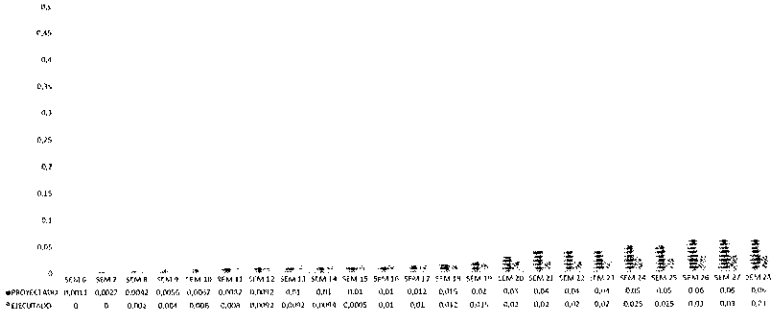

PERIODO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 6	0,82%	0,80%	-0,01%
SEM 7	0,92%	4,92%	0,00%
SEM 8	1,00%	0,92%	-0,08%
SEM 9	1,00%	0,94%	-0,06%
SEM 10	1,00%	0,95%	-0,05%
SEM 11	1,00%	1,00%	0,00%
SEM 12	1,20%	1,00%	-0,20%
SEM 13	1,50%	1,20%	-0,30%
SEM 14	2,00%	1,50%	-0,50%
SEM 15	3,00%	2,00%	-1,00%
SEM 16	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 17	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 18	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 19	5,00%	1,50%	-2,50%
SEM 20	5,00%	2,50%	-2,50%
SEM 21	6,00%	3,00%	-3,00%
SEM 22	6,00%	3,00%	-3,00%
SEM 23	6,50%	4,00%	-2,50%
SEM 24	7,00%	11,50%	4,50%
SEM 25	8,00%	15,00%	7,00%
SEM 26	9,00%	10,04%	9,04%
SEM 27	9,50%	10,10%	8,60%
SEM 28	10,10%	19,41%	9,31%

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PERSONAL DE OBRA



ADECUACION CAMPAMENTOS PARA PERSONAL DE OBRA



ACERO FIGURADO DE 6000PSI



ACERO FIGURADO DE 6000PSI



EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.8 M



EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.8 M




LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN



EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M

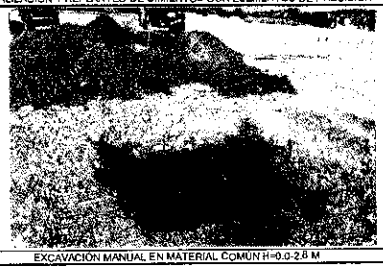

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.8 M

DEMOLICIÓN DE PLACAS EXISTENTES

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA	
DIRECTOR	SI	RETRO	SI
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	SI
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	NO
ASESOR SST	SI	MEZCLADORA	SI
MAESTRO	1	BOMBA CONCRETO	NO
OFICIALES	3	MINICARGADOR	SI
AYUDANTES	3	OTROS	SI
OTROS	9		

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)

FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO
28/08/2023		8,00	NO
29/08/2023		8,00	NO
30/08/2023		8,00	NO
31/08/2023		8,00	NO
1/09/2023		8,00	NO
2/09/2823		7,00	NO
-		47,00	

GRAFICO DE TIEMPO



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- Desmonte y retiro de malla contraimpacto
- Relleno con material granular
- Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión.
- Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

Se tiene previste continuar con las actividades de replanteo de cimentición con elementos de precisión, Concreto ciclopeo 2000PSI, 40% rejon, acero figurado de 6000PSI, excavación manual, concrete de 2500PSI, Vigas de amarre en concreto 3500 PSI.

ING. FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIENIERIA
No. MAT: 25202-088508

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GI-F-019
VERSION: 03
FECHA: JULIO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	29	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	11/09/2023	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	27,83%
DESDE	4/09/2023		% AVANCE SEMANA
HASTA	10/09/2023		8,42%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 16.376.116.616,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/06/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1.316.604.045,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/09/2024

CONTROL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	VALOR EJECUTADO	%
1,00000	AJUSTE A LOS DISEÑOS	UN	1,00	$ 151.725.000,00	1,00	0,93%	1,00	151.725.000	100%
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	1,00	$ 1.600.000,00	1,00	0,01%	1,00	1.800.000	100%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 2.149.242,00	1,00	0,01%	1,00	2.149.242	100%
1,10004	DESCAPOTE CON MAQUINA E=0,20M	M2	5977,57	$ 1.636,00	5676,00	0,06%	-	-	0%
1,10005	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISION	M2	5057,93	$ 10.964,00	5058,00	0,34%	50,29	551.360	1%
1,10006	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1,00	$ 2.866.124,00	1,00	0,02%	0,50	1.433.062	50%
1,10007	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	617,83	$ 49.774,00	617,83	0,19%	53,50	2.662.909	9%
1,10006	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENDR DE 5 KM)	M3	2937,42	$ 19.041,00	2937,42	0,34%	7.434,08	141.552.317	253%
1,10009	RETIRO DE SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE CARGUE)	M3/KM	1356,37	$ 9.749,00	1017,28	0,08%	207.640,31	2.024.265.407	2300%
1,10010	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	404,72	$ 21.487,00	0,00	0,05%	40,48	889.794	1200%
1,10013	PROTECCION TALUDES CON MALLA Y MORTERO	M2	146,08	$ 21.147,35	111,06	0,02%	-	-	0%
1,10012	REPLANTEO ESTRUCTURA	M2	2962,19	$ 4.040,00	2962,19	0,07%	-	-	0%
1,20001	CONCRETO 2500 PSI	M3	43,87	$ 401.038,35	43,87	0,11%	-	-	0%
1,20002	CONCRETO CILOPEO 2000 PSI, 40% RAJON	M3	97,35	$ 288.935,20	97,35	0,17%	66,23	19.136.178	68%
1,20003	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	12,00	$ 634.144,45	12,00	0,06%	-	-	0%
1,20004	ZAPATAS EN CONCRETO 4000PSI	M3	155,40	$ 637.768,10	115,00	0,79%	-	-	0%
1,20006	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI A LA VISTA	M3	267,77	$ 777.482,80	34,53	1,37%	-	-	0%
1,20008	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	25195,01	$ 10.202,40	7306,55	1,57%	15.460,66	157.735.636	212%
1,70053	CANALIZACION EN 4 TUBOS DE 6" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSION), ESTA CANTIDAD ES ESTIMADA Y DEPENDERA DEL PROYECTO FINAL APROBADO POR CODENSA	ML	39,00	$ 389.212,90	39,00	0,09%	-	-	0%
1,90020	Tuberia sanitaria 2"	ML	70,34	$ 22.116,60	70,34	0,01%	-	-	
1,90021	Tuberia sanitaria 3"	ML	8,56	$ 29.626,30	8,56	0,00%	-	-	
1,90022	Tuberia sanitaria 4"	ML	307,08	$ 40.664,00	184,25	0,06%	-	-	
1,90029	Excavación en material comun	UN	67,44	$ 36.479,15	67,44	0,02%	-	-	0%
1,90032	Suministro e instalación tuberia sanitaria 4"	ML	196,47	$ 40.664,00	167,00	0,05%	-	-	
1,90036	Excavación en material comun	UN	67,80	$ 36.460,15	67,60	0,02%	-	-	
2,10009	SUBBASE GRANULAR	M3	68,81	$ 156.776,35	0,00	0,09%	4.334,94	679.624.741	
2,30001	PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA Y SUPERVISION PROVISIONAL	UN	1,00	$ 3.326.858,00	1,00	0,02%	0,50	1.663.429	50%
2,30028	DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES (PLACAS Y VIGAS)	M2	651,31	$ 519.123,60	560,13	2,06%	328,88	171.246.493	59%
2,30033	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 M	ML	352,40	$ 29,326	352,40	0,06%	352,40	10.334.500	100%
2,30044	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,0-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	727,53	$ 71.006,65	516,54	0,32%	-	-	0%
NP-001	DESMONTE Y RETIRO DEL PARQUE BIOSALUDABLE	UN	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	0,01%	1,00	2.000.000	100%
NP-002	DESMONTE Y RETIRO DE LA MALLA CONTRAIMPACTO	GLB	58,16	$ 400.000,00	58,16	0,14%	38,16	15.264.000	66%
NP-003	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA EXISTENTE	M2	6448,00	$ 6.129,00	6446,00	0,24%	6.804,55	42.317.987	107%
NP-004	FILTRO GEODREN 0.45X0.45 M CON TUBERIA FILTRO DE D=100 mm (incluye geotextil y gravilla, no incluye el retiro de la excavación)	ML	230,00	$ 129.978,00	230,00	0,18%	-	-	0%
NP-005	DESMONTE Y RETIRO DE LOS ARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTES	UN	2,00	$ 280.000,00	2,00	0,00%	2,00	560.000	100%
				TOTAL		19,69%		$ 4.557.822.588,72	27,93%

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
2023001944	CONSORCIO BS INGENIERIA	AJUSTE A LOS DISEÑOS	13/06/2023	16/06/2023	$ 151.725.000,00	$ 31.684.500,00	$ 120.040.500,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 151.725.909,90	$ 31.684.509,99	$ 129.04e.50o,00


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- ☐ Se realiza actividades de excavaciones manuales.
- ☐ Se realiza actividades de localización y replanteo de cimientos.
- ☐ Se continue con actividades de llenos en sub base granular.
- ☐ Instalación de acero figurado de 6000PSI en zapatas y vigas de cimentación.
- ☐ Perfilada de talud.
- ☐ Mejoramiento de terreno con graves, csl y rajón.
- ☐ Concreto Ciclopeo 2000 PSI, 40% Rajón
- ☐ Toma densidades de sub base granular.
- ☐ Construcción de baños para personal de obra y administrativos.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA*


- ☐ La interventoría realiza seguimiento y control de la ejecución de las obras para que se desarrollen con veracidad y aceleración pertinente para evitar atrasos.
- ☐ Realiza revisión de informes semanales.
- ☐ Revisión de acta No.2.

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

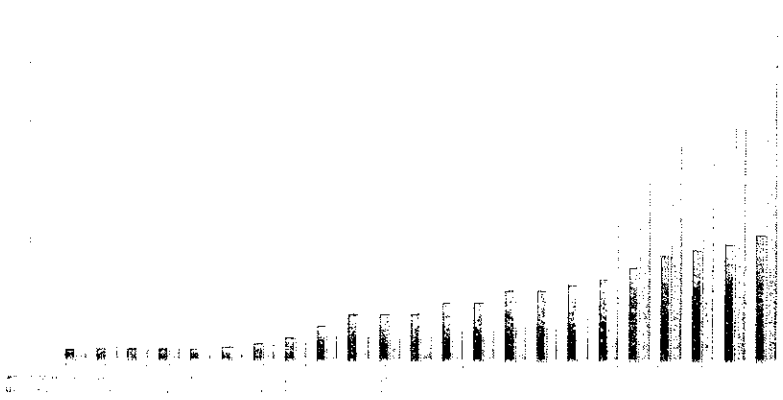

PERIODO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 7	0,92%	0,92%	0,00%
SEM 8	1,00%	0,92%	-0,08%
SEM 9	1,00%	0,94%	-0,06%
SEM 10	1,00%	0,95%	-0,05%
SEM 11	1,00%	1,00%	0,00%
SEM 12	1,10%	1,00%	-0,10%
SEM 13	1,50%	1,20%	-0,30%
SEM 14	2,00%	1,50%	-0,50%
SEM 15	3,00%	2,00%	-1,00%
SEM 16	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 17	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 18	4,00%	2,00%	-1,00%
SEM 19	5,00%	2,50%	-2,50%
SEM 20	5,00%	2,50%	-2,50%
SEM 21	6,00%	3,00%	-3,00%
SEM 22	6,00%	3,00%	-3,00%
SEM 23	6,50%	4,00%	-1,50%
SEM 14	7,00%	11,59%	4,59%
SEM 15	8,00%	15,80%	7,80%
SEM 26	9,00%	18,04%	9,04%
SEM 27	9,50%	10,10%	8,60%
SEM 28	10,00%	19,41%	9,41%
SEM 29	10,80%	17,83%	17,03%

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA EL PERSONAL DE OBRA



TOMA DENSIDADES DE RELLENO EN SUB BASE GRANULAR



ACERO FIGURADO DE 6000PSI



ACERO FIGURADO DE 6000PSI



CONCRETO CILÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN



CONCRETO CILÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN




RELLENOS EN SUB BASE GRANULAR



RELLENOS EN SUB BASE GRANULAR




LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN

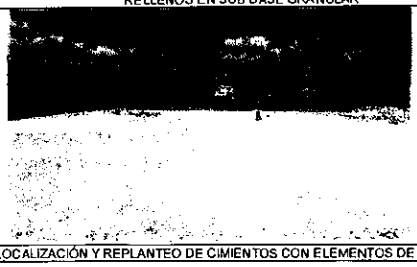

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN



MEJORAMIENTO OE TERRENO EN CAL Y GRAVAS GRUESAS



MEJORAMIENTO DE TERRENO EN CAL Y GRAVAS GRUESAS

DEMOLICIÓN DE PLACAS EXISTENTES

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA	
DIRECTOR	SI	RETRO	SI
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	SI
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	NO
ASESOR SST	SI	MEZCLADORA	SI
MAESTRO	1	BOMBA CONCRETO	NO
OFICIALES	12	MINICARGADOR	SI
AYUDANTES	3	OTROS	SI
OTROS	5		

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)

FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO
4/09/2023		8,00	NO
5/09/2023		8,00	NO
6/09/2023		8,00	NO
7/09/2023		8,00	NO
8/09/2023	1,00	7,00	NO
9/09/2023	2,00	5,00	SI
	3,00	44,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- Amarre de acero figurado
- Dados en Concrete de 4000PSI
- Relleno con materiel granular
- Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión.
- Excavación menusl en materisl común h=0.0-2.0 m (incluye retire de sabrsntas e una distancia maner da 5 km).
- Zapatas en concrete da 4000PSI
- Vigas da amerre en concrete de 3500PSI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

Sa tiene previsto continuar con las actividades de replanteo de cimentación con elementes de precisión, amarre de acero figurado de 6000PSI, excavación manual y relleno en sub base granufer.

ING. FABIAN BONORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIENIERIA
No. MAT: __25202-088508__

* AOJUNTO CON ESTE FORMATO SE OEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE OOCUMENTO OEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE OILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GI-F-018
VERSION: 03
FECHA: JULIO DE 2023

INFORMACION GENERAL

SEMANA No.	30	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	18/09/2023	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	31,81%
DESDE	11/09/2023		% AVANCE SEMANA
HASTA	17/09/2023		3,98%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 16.376.116.616,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/08/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1.316.604.045,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/09/2024

CONTROL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	VALOR EJECUTADO	%
1,00000	AJUSTE A LOS DISEÑOS	UN	1,00	$ 151.725.000,00	1,00	0,93%	1,00	151.725.000	100%
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	1,00	$ 1.800.000,00	1,00	0,01%	1,00	1.800.000	100%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 2.149.242,00	1,00	0,01%	1,00	2.149.242	100%
1,10004	DESCAPOTE CON MAQUINA E=0,20M	M2	5877,57	$ 1.636,00	5876,00	0,08%	-	-	0%
1,10005	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	5057,93	$ 10.964,00	5058,00	0,34%	50,29	551.380	1%
1,10008	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1,00	$ 2.866.124,00	1,00	0,02%	0,50	1.433.062	50%
1,10007	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	617,83	$ 49.774,00	817,83	0,19%	53,50	2.662.909	8%
1,10008	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2937,42	$ 19.041,00	2937,42	0,34%	7.434,08	141.552.317	263%
1,10009	RETIRO DE SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE CARGUE)	M3/KM	1358,37	$ 9.749,00	1017,28	0,08%	207.640,31	2.024.265.407	2300%
1,10010	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	404,72	$ 21.487,00	0,00	0,05%	40,48	869.794	1200%
1,10013	PROTECCION TALUDES CON MALLA Y MORTERO	M2	149,08	$ 21.147,35	111,06	0,02%	-	-	0%
1,10012	REPLANTEO ESTRUCTURA	M2	2962,19	$ 4.040,00	2962,19	0,07%	-	-	0%
1,20001	CONCRETO 2500 PSI	M3	43,87	$ 401.038,35	43,87	0,11%	5,00	2.005.192	11%
1,20002	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	97,35	$ 288.935,20	87,35	0,17%	66,23	19.136.179	68%
1,20003	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	12,00	$ 834.144,45	12,00	0,06%	-	-	0%
1,20004	ZAPATAS EN CONCRETO 4000PSI	M3	155,40	$ 837.768,10	130,54	0,79%	9,50	7.958.797	7%
1,20006	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI A LA VISTA	M3	287,77	$ 777.492,80	46,92	1,37%	12,00	9.329.794	25%
1,20008	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	25195,01	$ 10.202,40	8566,30	1,57%	15.460,66	157.735.838	180%
1,70053	CANALIZACIÓN EN 4 TUBOS DE 6" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN), ESTA CANTIDAD ES ESTIMADA Y DEPENDERA DEL PROYECTO FINAL APROBADO POR CODENSA	ML	39,00	$ 389.212,90	39,00	0,09%	-	-	0%
1,90020	Tubería sanitaria 2"	ML	70,34	$ 22.116,80	70,34	0,01%	-	-	0%
1,90021	Tubería sanitaria 3"	ML	8,56	$ 29.826,30	8,58	0,00%	-	-	0%
1,90022	Tubería sanitaria 4"	ML	307,08	$ 40.664,00	233,38	0,08%	-	-	0%
1,80029	Excavación en material comun	UN	87,44	$ 36.479,15	67,44	0,02%	-	-	0%
1,90032	Suministro e instalación tubería sanitaria 4"	ML	196,47	$ 40.864,00	196,47	0,05%	-	-	0%
	Suministro e instalación tubería sanitaria 6"	ML	201,93		123,18	0,00%	-	-	0%
1,90036	Excavación en material comun	UN	87,60	$ 36.480,15	67,80	0,02%	-	-	0%
2,10009	SUBBASE GRANULAR	M3	86,61	$ 156.778,35	0,00	0,09%	7.334,84	1.149.959.791	100%
2,30001	PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA Y SUPERVISION PROVISIONAL	UN	1,00	$ 3.326.856,00	1,00	0,02%	0,50	1.663.429	50%
2,30028	DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES (PLACAS Y VIGAS)	M2	651,31	$ 519.123,60	625,28	2,08%	329,88	171.248.493	53%
2,30033	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 M	ML	352,40	$ 29.326	352,40	0,06%	352,40	10.334.500	100%
2,30044	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,0-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	727,53	$ 71.009,65	582,02	0,32%	-	-	0%
NP-001	DESMONTE Y RETIRO DEL PARQUE BIOSALUDABLE	UN	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	0,01%	1,00	2.000.000	100%
NP-002	DESMONTE Y RETIRO DE LA MALLA CONTRAIMPACTO	GLB	58,16	$ 400.000,00	58,18	0,14%	38,16	15.264.000	66%
NP-003	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA EXISTENTE	M2	6448,00	$ 6.129,00	6448,00	0,24%	6.904,55	42.317.987	107%
NP-004	FILTRO GEODREN 0.45X0.45 M CON TUBERIA FILTRO DE D=100 mm (incluye geotaxtil y gravilla, no incluye el retiro de la excavación)	ML	230,00	$ 129.978,00	230,00	0,18%	-	-	0%
NP-005	DESMONTE Y RETIRO DE LOS ARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTES	UN	2,00	$ 290.000,00	2,00	0,00%	2,00	580.000	100%
				TOTAL		11,50%		$ 5.209.928.933,68	31,81%

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
2023001844	CONSORCIO BS INGENIERIA	AJUSTE A LOS DISEÑOS	13/06/2023	16/06/2023	$ 151.725.000,00	$ 31.684.500,00	$ 120.040.500,00
2023003801	CONSORCIO BS INGENIERIA	AVANCE DE OBRA No.1	8/08/2023	14/09/2023	$ 1.672.650.478,00	$ 217.444.780,00	$ 1.455.205.698,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 1.824.375.478,00	$ 249.129.288,80	$ 1.575.246.198,00


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- O Se realiza actividades de excavaciones manuales.
- □ Se realiza actividades de localización y replanteo de cimientos.
- O Se continua con actividades de llenos en sub base granular.
- □ Instalación de acero figurada de 6000PSI en zapatas y vigas de cimentación.
- □ Toma densidades de sub base granular.
- O Zapatas en Concreto 4000PSI.
- □ Toma de muestras Cilindros en concretos

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA*

- □ La interventoria realiza seguimiento y control de la ejecución de las obras para que se desarrollen con veracidad y aceleración pertinente para evitar atrasos.
- □ Realiza revisión de informes semanales.

GRAFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

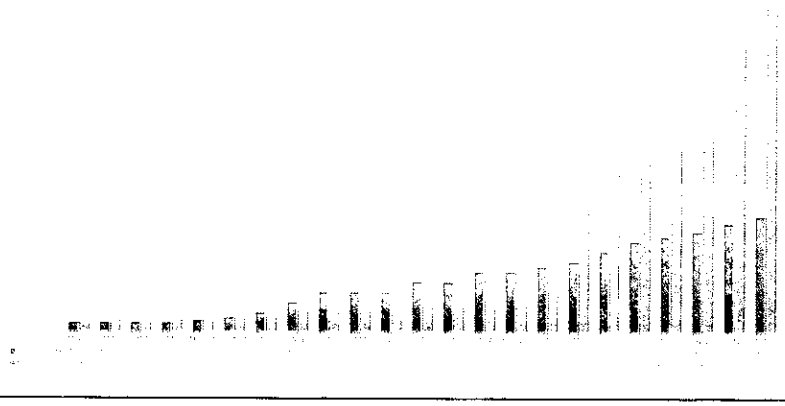

PERIODO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 8	1,00%	0,92%	-0,08%
SEM 9	1,00%	0,94%	-0,06%
SEM 10	1,00%	0,95%	-0,05%
SEM 11	1,00%	1,00%	0,00%
SEM 12	1,20%	1,00%	-0,20%
SEM 13	1,50%	1,20%	-0,30%
SEM 14	2,00%	1,50%	-0,50%
SEM 15	3,00%	1,00%	-1,00%
SEM 16	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 17	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 18	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 19	5,00%	2,50%	-2,50%
SEM 20	5,00%	2,50%	-2,50%
SEM 21	6,00%	3,00%	-3,00%
SEM 22	6,00%	3,00%	-3,00%
SEM 23	6,50%	4,00%	-2,50%
SEM 24	7,00%	11,59%	4,59%
SEM 25	8,00%	15,80%	7,80%
SEM 26	9,00%	18,04%	9,04%
SEM 27	9,50%	18,10%	8,60%
SEM 28	10,00%	19,41%	9,41%
SEM 29	10,80%	27,83%	17,03%
SEM 30	12,50%	31,81%	20,31%

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS DE CONCRETOS



TOMA DENSIDADES DE RELLENO EN SUB BASE GRANULAR



ACERO FIGURADO DE 6000PSI



ACERO FIGURADO DE 6000PSI



VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI A LA VISTA



VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI A LA VISTA



RELLENOS EN SUB BASE GRANULAR



RELLENOS EN SUB BASE GRANULAR



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN



ZAPATAS EN CONCRETO 4000PSI



ZAPATAS EN CONCRETO 4000PSI

DEMOLICIÓN DE PLACAS EXISTENTES

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA		REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)			
				FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO
DIRECTOR	SI	RETRO	SI	11/09/2023		8,00	NO
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	SI	12/09/2023		8,00	NO
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	NO	13/09/2023		8,00	NO
ASESOR SST	SI	MEZCLADORA	SI	14/09/2023		8,00	NO
MAESTRO	1	BOMBA CONCRETO	SI	15/09/2023		8,00	NO
OFICIALES	8	MINICARGADDR	SI	16/09/2023		7,00	NO
AYUDANTES	5	OTROS	SI				
DTRDS	7				-	47,00	

GRADO DE HUMO



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUENTE SEMANA

- Amarre de acero figurado
- Dados en Concreto de 4000PSI
- Relleno con materiel granular
- Localizeción y replanteo de cimientos con elementos de precisión.
- Excavación manuel en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrentes a una distancia menor de 5 km).
- Zapatas en concreto da 4000PSI
- Vigas de emerre en concreto de 3500PSI

CONCLUSIDNES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA / CONTRATISTA

Se tiene previsto continuar con lae ectividades da replanteo de cimentación con elemantos de precisión, amerre da acero figurado de 6000PSI, excaveción manual y relleno en sub base granular.

ING. FABIAN BOHDRQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSDRCIO BS INGENIENIERIA
No. MAT: __26282-088508__

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE OEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO 0EBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GI-F-019
VERSION: 03
FECHA: JULIO DE 2023

INFORMACION GENERAL

SEMANA No.	31	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	25/09/2023	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	33,26%
DESDE	18/09/2023		% AVANCE SEMANA
HASTA	24/09/2023		#¡REF!

CONTRATO DE OBRA	No. 449 MT 2022	VALOR	$ 16.376.116.616,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	26/08/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1.316.604.045,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	8/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	26/09/2024

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	VALOR EJECUTADO	%
1,00000	AJUSTE A LOS DISENOS	UN	1,00	$ 151.725.000,00	1,00	0,93%	1,00	151.725.000	100%
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	1,00	$ 1.800.000,00	1,00	0,01%	1,00	1.800.000	100%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 2.140.242,00	1,00	0,01%	1,00	2.140.242	100%
1,10004	DESCAPOTE CON MAQUINA E=0,20M	M2	5877,57	$ 1.638,00	5878,00	0,06%	-	-	0%
1,10005	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	5057,93	$ 10.964,00	5058,00	0,34%	842,43	9.236.403	17%
1,10006	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1,00	$ 2.966.124,00	1,00	0,02%	0,50	1.433.062	50%
1,10007	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	817,83	$ 49.774,00	617,83	0,19%	105,61	5.258.632	17%
1,10008	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2937,42	$ 19.041,00	2937,42	0,34%	7.363,45	140.588.271	251%
1,10009	RETIRO DE SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE CARGUE)	M3/KM	1356,37	$ 9.749,00	1358,37	0,08%	204.765,31	1.996.549.502	2300%
1,10010	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	404,72	$ 21.487,00	0,00	0,05%	40,48	869.794	1200%
1,10013	PROTECCIÓN TALUDES CON MALLA Y MORTERO	M2	148,08	$ 21.147,35	111,06	0,02%	-	-	0%
1,10012	REPLANTEO ESTRUCTURA	M2	2982,19	$ 4.040,00	2982,19	0,07%	-	-	0%
1,20001	CONCRETO 2500 PSI	M3	43,87	$ 401.036,35	43,87	0,11%	3,89	1.560.039	9%
1,20002	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	97,35	$ 289.935,20	97,35	0,17%	96,13	27.775.341	99%
1,20003	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	12,00	$ 834.144,45	12,00	0,08%	-	-	0%
1,20004	ZAPATAS EN CONCRETO 4000PSI	M3	155,40	$ 837.768,10	147,63	0,79%	15,50	12.985.406	10%
1,20006	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI A LA VISTA	M3	267,77	$ 777.482,80	63,31	1,37%	19,55	15.199.789	31%
1,20008	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	25195,01	$ 10.202,40	9574,10	1,57%	32.665,24	333.283.845	341%
1,70053	CANALIZACIÓN EN 4 TUBOS DE 6" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN), ESTA CANTIDAD ES ESTIMADA Y DEPENDERA DEL PROYECTO FINAL APROBADO POR CODENSA	ML	39,00	$ 389.212,90	39,00	0,09%	-	-	0%
1,90020	Tubería sanitaria 2"	ML	70,34	$ 22.118,60	70,34	0,01%	-	-	0%
1,90021	Tubería sanitaria 3"	ML	9,58	$ 29.626,30	9,58	0,00%	-	-	0%
1,90022	Tubería sanitaria 4"	ML	307,08	$ 40.664,00	282,51	0,08%	-	-	0%
1,90029	Excavación en material comun	UN	87,44	$ 36.479,15	87,44	0,02%	-	-	0%
1,90032	Suministro e instalación tubería sanitaria 4"	ML	196,47	$ 40.864,00	196,47	0,05%	-	-	0%
1,90033	Suministro e instalación tubería sanitaria 8"	ML	201,93	$ 51.488,95	123,19	0,06%	-	-	0%
1,90034	Suministro e instalación tubería alcantarillado 200 mm"		35,62	$ 66.309,00	35,62	0,01%	-		
1,90035	Suministro e instalación tubería alcantarillado 250 mm"		81,74	$ 90.781,00	81,74	0,05%	-		
1,90036	Excavación en material comun	UN	67,80	$ 36.480,15	67,80	0,02%	-	-	0%
2,10009	SUBBASE GRANULAR	M3	98,81	$ 156.776,35	0,00	0,09%	7.336,99	1.150.291.186	100%
2,30001	PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA Y SUPERVISION PROVISIONAL	UN	1,00	$ 3.326.658,00	1,00	0,02%	0,50	1.663.429	50%
2,30028	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS EXISTENTES (PLACAS Y VIGAS)	M2	851,31	$ 519.123,60	851,31	2,06%	329,89	171.248.493	51%
2,30033	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 M	ML	352,40	$ 29.326	352,40	0,06%	379,34	11.124.544	108%
2,30044	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,0-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	727,53	$ 71.008,65	640,22	0,32%	-	-	0%
NP-001	DESMONTE Y RETIRO DEL PARQUE BIOSALUDABLE	UN	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	0,01%	1,00	2.000.000	100%
NP-002	DESMONTE Y RETIRO DE LA MALLA CONTRAIMPACTO	GLB	58,16	$ 400.000,00	56,16	0,14%	38,16	15.264.000	66%
NP-003	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA EXISTENTE	M2	6448,00	$ 6.129,00	6448,00	0,24%	6.904,55	42.317.987	107%
NP-004	FILTRO GEODREN 0,45X0,45 M CON TUBERIA FILTRO DE O=100 mm (incluye geotaxtil y gravilla, no incluye el retiro de la excavación)	ML	230,00	$ 129.978,00	230,00	0,16%	-	-	0%
NP-005	DESMONTE Y RETIRO DE LOS ARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTES	UN	2,00	$ 290.000,00	2,00	0,00%	2,00	580.000	100%
				TOTAL		12,50%		$ 5.446.179.711,25	33,26%

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
2023001944	CONSORCIO BS INGENIERIA	AJUSTE A LOS DISENOS	13/06/2023	16/06/2023	$ 151.725.000,00	$ 31.684.500,00	$ 120.040.500,00
2023003801	CONSORCIO BS INGENIERIA	AVANCE DE OBRA No.1	6/09/2023	14/09/2023	$ 1.672.650.478,00	$ 217.444.780,00	$ 1.455.205.698,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 1.824.375.478,00	$ 249.129.280,00	$ 1.575.246.196,00


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- Se realiza actividades de excavaciones manuales.
- Se realiza actividades de localización y replanteo de cimientos.
- Se continue coc actividades de llanos en sub base granular.
- Instalación de acero figurado de 6000PSI en zapatas y vigas de cimentación.
- Toma densidades de sub base granular.
- Zapatas en Concreto 4000PSI.
- Toma de muestras Cilindros en concretos
- Cerca en tela verde H=2,10m - costado Nor-oriente

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

- La interventoría realiza seguimiento y control de la ejecución de las obras para que se desarrollen con veracidad y celerida partinanta para evitar atrasos.
- Realiza revisión de informes semanales.
- Toma densidades del material de relleno

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

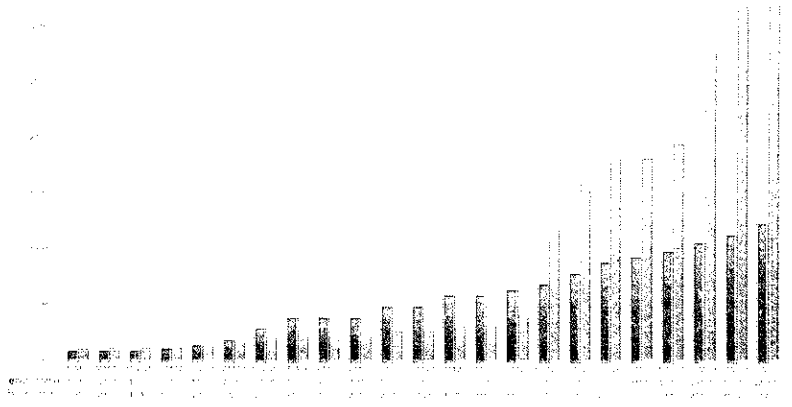

PERIDDD	PRDYECTADO	EJECUTADD	DIFERENCIA
SEM 9	1,00%	0,94%	-0,06%
SEM 10	1,00%	0,95%	-0,05%
SEM 11	1,00%	1,00%	8,00%
SEM 12	1,20%	1,00%	-0,28%
SEM 13	1,50%	1,20%	-8,38%
SEM 14	2,00%	1,50%	-8,58%
SEM 15	3,00%	2,00%	-1,00%
SEM 16	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 17	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 18	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 19	5,00%	2,50%	-2,50%
SEM 28	5,00%	2,50%	-2,50%
SEM 21	6,00%	3,00%	-3,00%
SEM 22	6,00%	3,00%	-3,00%
SEM 23	6,58%	4,00%	-2,50%
SEM 24	7,00%	11,59%	4,59%
SEM 25	8,00%	15,80%	7,80%
SEM 26	9,00%	18,04%	9,04%
SEM 27	9,58%	18,18%	8,60%
SEM 28	10,00%	19,41%	9,41%
SEM 29	10,80%	27,83%	17,83%
SEM 38	11,50%	31,81%	20,31%
SEM 31	12,50%	33,26%	28,75%

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS DE CONCRETOS



ACERO FIGURADO DE 6000PSI



EXCAVACIONES MANUALES PARA MEJORAMIENTO



CERRAMIENTO EN TELA VERDE DEL COSTADO Nor- Este



VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI



VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3508 PSI



RELLENDS EN SUB BASE GRANULAR



RELLENOS EN SUB BASE GRANULAR



LDCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN



LOCALIZACIÓN Y REPLANTED DE CIMIENTOS CDN ELEMENTDS DE PRECISIÓN

DEMDLICIÓN DE PLACAS EXISTENTES

RELACION DE PERSONAL Y MAQINARIA				REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA		FECHA	LLUVIA	SECO	OETUVO
DIRECTOR	SI	RETRO	SI	18/09/2023		8,00	NO
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	SI	19/09/2023		8,00	NO
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	NO	20/09/2023		8,00	NO
ASESOR SST	SI	MEZCLA0ORA	SI	21/09/2023		8,00	NO
MAESTRO	1	BOMBA CONCRETO	SI	22/09/2023		8,00	NO
OFICIALES	10	MINICARGA0OR	SI	23/09/2023		7,00	NO
AYUDANTES	8	OTROS	SI				
OTROS	7					47,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUENTE SEMANA

- Amarre de acero figurado
- Dados en Concreto de 4000PSI
- Relleno can meteriel granular
- Localización y replentaa da cimlantos con elemantoa da precisión.
- Excavación manual an materiel común h=0.0-2.0 m (incluya retiro da sobrantes a una distancia menar de 5 km).
- Zapatss en concreto da 4000PSI
- Vigas da amarre an concreto de 3500PSI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

Se tiene previsto continuar can laa actividades de replanteo de cimentación con elamantaa da precisión, amarre da acero figurado de 6000PSI, excavación manual y relleno en sub base granular.

ING. FABIAN BDHDRQUEZ LESMES
DIRECTDR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIENIERIA
No. MAT: __25202-096508__

* A0JUNTO CON ESTE FORMATO SE 0EBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE 0OCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE OILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GI-F-019
VERSION: 03
FECHA: JULIO DE 2023

INFORMACION GENERAL

SEMANA No.	32	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	2/10/2023	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	33,49%
DESDE	25/09/2023		% AVANCE SEMANA
HASTA	1/10/2023		0,23%

CONTRATO DE OBRA	No. 448 MT 2022	VALOR	$ 16.376.118.616,00	PLAZO	18 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/08/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 477 MT 2022	VALOR	$ 1.316.604.045,00	PLAZO	19 MESES	FECHA DE INICIO	6/12/2023	FECHA VENCIMIENTO	25/09/2024

CONTROL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	VALOR EJECUTADO	%
1,00000	AJUSTE A LOS DISEÑOS	UN	1,00	$ 151.725.000,00	1,00	0,93%	1,00	151.725.000	100%
1,10001	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA 3x5	UN	1,00	$ 1.800.000,00	1,00	0,01%	1,00	1.800.000	100%
1,10002	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 2.149.242,00	1,00	0,01%	1,00	2.149.242	100%
1,10004	DESCAPOTE CON MAQUINA E=0,20M	M2	5877,67	$ 1.536,00	5878,00	0,05%	-	-	0%
1,10005	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	5057,93	$ 10.964,00	5058,00	0,34%	1.254,48	13.754.119	25%
1,10006	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1,00	$ 2.866.124,00	1,00	0,02%	0,50	1.433.062	50%
1,10007	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	617,83	$ 49.774,00	617,83	0,19%	105,61	5.256.632	17%
1,10008	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2937,42	$ 19.041,00	2937,42	0,34%	7.383,45	140.588.271	251%
1,10009	RETIRO DE SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO (INCLUYE CARGUE)	M3/KM	1356,37	$ 9.749,00	1356,37	0,08%	204.795,31	1.996.549.502	2300%
1,10010	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	404,72	$ 21.487,00	0,00	0,05%	40,48	869.794	1200%
1,10013	PROTECCION TALUDES CON MALLA Y MORTERO	M2	148,08	$ 21.147,35	148,08	0,02%	-	-	0%
1,10012	REPLANTEO ESTRUCTURA	M2	2962,18	$ 4.040,00	2882,19	0,07%	-	-	0%
1,20001	CONCRETO 2500 PSI	M3	43,87	$ 401.038,35	43,87	0,11%	6,39	2.562.636	15%
1,20002	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJON	M3	87,35	$ 288.935,20	87,35	0,17%	96,13	27.776.341	99%
1,20003	DADOS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	12,00	$ 834.144,45	12,00	0,06%	-	-	0%
1,20004	ZAPATAS EN CONCRETO 4000PSI	M3	155,40	$ 837.768,10	155,40	0,79%	27,00	22.619.739	17%
1,20006	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI A LA VISTA	M3	287,77	$ 777.482,80	77,70	1,37%	34,05	26.473.289	44%
1,2000B	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	25195,01	$ 10.202,40	10581,90	1,57%	32.665,24	333.263.845	309%
1,30001	CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS Y PANTALLAS A LA VISTA	M3	42,67	$ 1.138.210,20	0,00	0,30%	2,00	2.276.420	5%
1,70053	CANALIZACIÓN EN 4 TUBOS DE 6" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN), ESTA CANTIDAD ES ESTIMADA Y DEPENDERA DEL PROYECTO FINAL APROBADO POR CODENSA	ML	39,00	$ 389.212,90	38,00	0,09%	-	-	0%
1,90020	Tuberia sanitaria 2"	ML	70,34	$ 22.116,80	70,34	0,01%	-	-	0%
1,90021	Tuberia sanitaria 3"	ML	8,58	$ 29.626,30	8,58	0,00%	-	-	0%
1,90022	Tuberia sanitaria 4"	ML	307,08	$ 40.664,00	307,08	0,08%	-	-	0%
1,90023	Tuberia ventilación 2"	ML	143,04	$ 35.535,00	24,32	0,03%	-	-	0%
1,90029	Excavación en material comun	UN	67,44	$ 36.479,15	67,44	0,02%	-	-	0%
1,90031	Suministro e instalacion de bajante aguas de 4" PVC	ML	128,00	$ 40.664,00	15,48	0,03%	-	-	0%
1,90032	Suministro e instalación tubería sanitaria 4"	ML	198,47	$ 40.664,00	186,47	0,05%	-	-	0%
1,90033	Suministro e instalación tubería sanitaria 6"	ML	201,93	$ 51.488,96	201,93	0,06%	-	-	0%
1,90034	Suministro e instalación tubería alcantarillado 200 mm"	ML	35,62	$ 66.309,00	35,62	0,01%	-	-	0%
1,90035	Suministro e instalación tubería alcantarillado 250 mm"	ML	81,74	$ 90.781,00	91,74	0,05%	-	-	0%
1,90036	Excavación en material comun	UN	67,80	$ 36.490,15	67,80	0,02%	-	-	0%
1,90037	Relleno en material de excavación	UN	45,75	$ 24.083,30	17,84	0,01%	-	-	0%
1,90038	Cajas de inspección con tapa	UN	43,00	$ 607.280,50	2,16	0,16%	-	-	0%
2,10008	SUBBASE GRANULAR	M3	88,81	$ 156.77B,35	0,00	0,09%	7.336,99	1.150.281.186	100%
2,30001	PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA Y SUPERVISION PROVISIONAL	UN	1,00	$ 3.326.858,00	1,00	0,02%	0,50	1.663.429	50%
2,30029	DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES (PLACAS Y VIGAS)	M2	651,31	$ 519.123,60	651,31	2,06%	329,88	171.248.493	51%
2,30033	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 M	ML	352,40	$ 29.326	352,40	0,08%	379,34	11.124.544	108%
2,30044	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0,0-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	727,53	$ 71.008,65	705,70	0,32%	-	-	0%
NP-001	DESMONTE Y RETIRO DEL PARQUE BIOSALUDABLE	UN	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	0,01%	1,00	2.000.000	100%
NP-002	DESMONTE Y RETIRO DE LA MALLA CONTRAIMPACTO	GLB	58,16	$ 400.000,00	58,16	0,14%	38,16	15.264.000	66%
NP-003	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA EXISTENTE	M2	6448,00	$ 6.129,00	6449,00	0,24%	6.904,55	42.317.987	107%
NP-004	FILTRO GEODREN 0.45X0.45 M CON TUBERIA FILTRO DE D=100 mm (incluye geotextil y gravilla, no incluye el retiro de la excavación)	ML	230,00	$ 129.978,00	230,00	0,18%	-	-	0%
NP-005	DESMONTE Y RETIRO DE LOS ARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTES	UN	2,00	$ 290.000,00	2,00	0,00%	2,00	590.000	100%
				TOTAL		12,80%		$ 6.484.356.784,33	33,49%

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
2023001944	CONSORCIO BS INGENIERIA	AJUSTE A LOS DISEÑOS	13/06/2023	16/06/2023	$ 151.725.000,00	$ 31.684.500,00	$ 120.040.500,00
2023003801	CONSORCIO BS INGENIERIA	AVANCE DE OBRA No.1	6/09/2023	14/09/2023	$ 1.672.650.478,00	$ 217.444.780,00	$ 1.455.205.698,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 1.824.375.478,00	$ 249.129.280,00	$ 1.575.249.196,00


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- Se realiza actividades de excevaciones manuales para Zapatas, vigas de cimentación y mejoramiento de terreno.
- Se realize actividades de localización y replanteo de cimientos.
- Se continua con actividades de llenos en sub base granular.
- Instalación de acero figurado de 6000PSI en zapatas y vigas de cimentación.
- Toma densidades de sub base granular.
- Zapatas en Concreto 4000PSI.
- Tsms de muestres Cilindros en concretos
- VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

- La interventorie realiza seguimiento y control de le ejecución de las obras pare que se desarrollen con veracidad y celerida pertinente pere evitar atrasos.
- Realize ravisión de informes semanales.
- Revision de documentos personal de obra
- Ravision de documentos maquinaria

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL

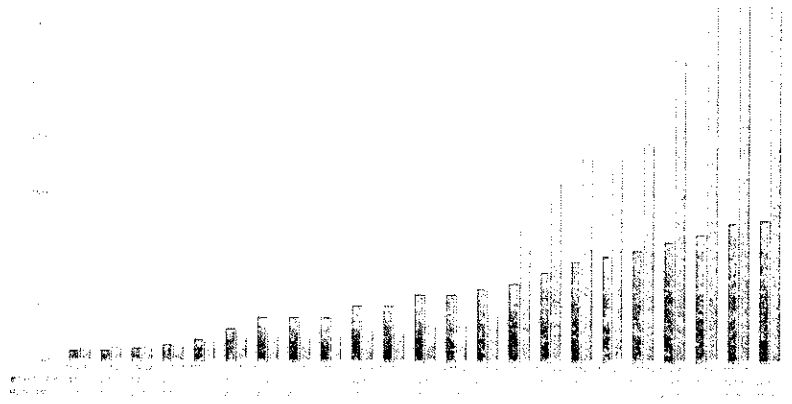

PERIODO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 10	1,00%	0,95%	-0,05%
SEM 11	1,00%	1,00%	0,00%
SEM 12	1,20%	1,00%	-0,20%
SEM 13	1,50%	1,20%	-0,30%
SEM 14	2,00%	1,50%	-0,50%
SEM 15	3,00%	2,00%	-1,00%
SEM 16	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 17	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 18	4,00%	2,00%	-2,00%
SEM 19	5,00%	2,50%	-2,50%
SEM 20	5,00%	2,50%	-2,50%
SEM 21	6,00%	3,00%	-3,00%
SEM 22	6,00%	3,00%	-3,00%
SEM 23	6,50%	4,00%	-2,50%
SEM 24	7,00%	11,59%	4,59%
SEM 25	8,00%	15,00%	7,80%
SEM 26	9,00%	18,04%	9,04%
SEM 27	9,50%	18,10%	8,60%
SEM 28	10,00%	19,41%	9,41%
SEM 29	10,80%	27,83%	17,03%
SEM 30	11,50%	31,81%	20,31%
SEM 31	12,50%	33,26%	20,76%
SEM 32	12,00%	33,49%	20,69%

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS DE CONCRETOS



ACERO FIGURADO DE 6000PSI



EXCAVACIONES MANUALES PARA MEJORAMIENTO



VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI




VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI




ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI



RELLENOS EN SUB BASE GRANULAR

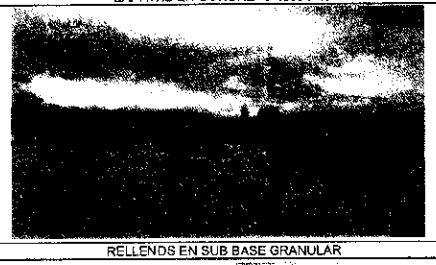

RELLENOS EN SUB BASE GRANULAR



PRUEBA DE SLUMP DE CONCRETO



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN

DEMOLICIÓN DE PLACAS EXISTENTES

RELACION DE PERSONAL Y MAQINARIA				REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA		FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO
DIRECTOR	SI	RETRO	SI	25/09/2023		9,00	NO
RESIDENTE	SI	VOLQUETA	SI	26/09/2023		9,00	NO
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	NO	27/09/2023	3,00	6,00	SI
ASESOR SST	1	MEZCLADORA	SI	28/09/2023	2,00	7,00	SI
MAESTRO	1	BOMBA CONCRETO	SI	29/09/2023		9,00	NO
OFICIALES	9	MINICARGADOR	SI	30/09/2023		9,00	NO
AYUDANTES	12	OTROS	SI				
OTROS	8				5,00	45,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUENTE SEMANA

- Amarre de acero figurado
- Dados en Concreto de 4000PSI
- Relleno con material granular
- Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión.
- Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).
- Zapatas en concreto de 4000PSI
- Vigas de amarre en concreto de 3500PSI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

Se tiene previsto continuar con las actividades de replanteo de cimentación con elementos de precisión, amarre de acero figurado de 6000PSI, excavación manual y relleno en sub base granular, Concreto de 4000PSI para zapatas, concreto de 3500PSI para vigas de cimentación, concreto de 2500PSI.

ING. FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIENIERIA
No. MAT: __25202-088508__

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

CONSORCIO
INGENIERÍA
Nit: 901.590.075-0

COPIA DE LA BITACORA DE OBRA

E-mail: ingebypltda@gmail.com
Cra. 68D No. 25B - 86 Of. 327-3 - Teléfono: 7561194- Cel. 315 295 8783 – Bogotá D.C.

Interventoria.
miércoles 30 AGOSTO 2023
* Personal interventoria: Residente (2) Inspector (1) Profesional SST (2) Asesor (1) Inspector (1) * Personal Administrativo Obra: Residente (1) Inspector (1) profesional SST (1) Asesor (1) Director (1) * personal obra: maestro (1) Oficiales (3) Ayudantes (3) Maquinaria (5) Equipos (2) * Se continua con actividades de Replanteo y excavación de zapatas para cimentacion, se continua con actividades de excavación del campamento, se realiza comite en obra.
Clima tarde: soleado Clima mañana: soleado
* SE REALIZA REPLANTEO DEL BLOQUE F; PASA A INICIO ACTIVIDAD EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO RELLENO Y LUEGO PROCEDER CON CICLOPEO.

Residente 85

F/L Interventoria. Residente Obra.

JUEVES 31 AGOSTO 2023
* personal Interventoria: profesional SST (1) Residente (2) Inspector (2) Director (1) Asesor (1) * personal Administrativo Obra: profesional SST (1), Residente (1) Inspector (1) * personal obra: maestro (1) Oficiales (3) Ayudantes (3), maquinaria (5), Equipos (2) * Se continua con actividades de Replanteo y excavación de zapatas, se continua con actividad de adecuacion del campamento, la interventoria revisa planillas de seguridad del personal que realiza las actividades en obra.
Clima mañana: soleado Clima tarde: soleado
* SE INICIA LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN PARA CICLOPEO.

Residente de Obra.

Residente 85

F/L Interventoria.
VIERNES 01 SEPTIEMBRE 2023.
* personal Interventoria: profesional SST (2) Residente (1) Inspector (1) * personal Administrativo Obra: Residente (2) Inspector (2) profesional SST (2) Asesor (2) * personal obra: Oficiales (3) Ayudantes (2) Almacenista (1) subcontratista (9) topografo (1) * se continua con actividades de excavación de zapatas como también se continua con actividad de levantamiento topografico para Replanteo de cimentacion por parte del contratista de obra, llega acero para refuerzo de zapatas y vigas, tambien se continua con actividades de relleno y compactación llega material para Relleno continuando con

1378

Acometida para la instalación provisional electrica
Clima mañana: Soleada Clima tarde: Soleada
*Llego acero de Refuerzo de los BLOQUES C-E-F (ZAPATAS-VIGAS-COLUMNAS)

F/I Interventoria Residente de Obra

"MIERCOLES" 02 SEPTIEMBRE 2023. SABADO
Personal interventoria: Residente (1) Profesional SST (1) Inspector (1) Topografo (1) *Asesor (1) * personal Administrativo obra: Residente (1) Profesional SST (1), Inspector (1), Topografo (2) *Asesor (1) * personal obra. Oficiales (3) * Ayudantes (2) Sub contratistas (9) *maquinaria ( ) Equipos ( ) * se continua con Actividades de Excavación de zapatas para cimentación, como también se continua con Relleno para nivelacion de terreno, se Realizan Replanteos por parte del Contratista y interventoria para Verificacion de ejes.
Clima mañana: Soleada Clima tarde: soleada.
*SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE REPLANTEO Y EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO Y CICLOPEO.

F/I Interventoria. Residente Obra

Lunes 04 SEPTIEMBRE 2023
Personal Interventoria: Profesional SST (1), Residente (1) Inspector (1) topografo (1) Asesor (1) Director (1) * Personal Administrativo obra Residente (1) inspector (1) Profesional SST (1) Asesor (1) topografo (2) Ayudantes (2) oficiales (4) Almacenista (1) sub contratista (9). maquinaria ( ), Equipos ( ). * Se continua con actividades de excavación, de zapatas para cimentacion, como tambien se continua con actividades de relleno con material granular, se continua compactación con Vibrocompactador, por consiguiente se continua con toma de densidades por parte del contratista aun esta pendiente Respuesta de que enel Colombia Emita Respuesta de la factivilidad de la provisional electrica.
Clima mañana: soleada Clima tarde: Soleada. 379
* SE INICIA LA ACTIVIDAD DE ARMADO DE ACERO PARA ZAPATAS

P/L Interventoria. Residente 35
R. Obra.
MARTES 05 SEPTIEMBRE 2023.
* Personal Interventoria: profesional SST (1) Residentes (1) inspector (1) Asesor (1) Director (1) * Personal Administrativo obra: (6) Personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (3), Sub contratista I.P.Z (9), Almacenista (1), topografo (1), Auxiliar Topo (1) Operario (1) mini, Operario Retro (1) * se continua continua con actividades de excavación de zapatas, se continua con actividad de Relleno de material granular, se Realiza compactación con vibrocompactador, Aun esta pendiente Respuesta de enel colombia de la factibilidad del la provisional Electrica para la obra * maquinaria (1) Equipos (1) * se realiza mejoramiento del terreno en las zapatas, siguiendo las Recomendaciones del geotecnista, dicha mejoramiento se realiza con grava y cal viva a dos capas o más. compactado con compactador tipo canguro.
Clima mañana: soleada Clima tarde: soleada.
* SUSPENDEN ACTIVIDADES lluvia Hasta las 8:00 am * SE TOMAN DENSIDADES (4) PUNTOS B-E
* CONTINUAN CON ADECUACION DE CAMPAMENTO ESES ZAPATAS
Residente 35

P/L Interventoria. MIÉRCOLES 06 SEPTIEMBRE 2023.
* Personal Interventoria: Profesional SST (1) Inspector (1) Residente (1) Asesor (1) topografo (2) * Personal Administrativo Obra: (6) Almacenista (1) Topografo (1) Operario mini (1) Operario Retro (1) * Personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (3) sub contratista (9) * Se continuan con actividades de adecuación del campamento como también se realizan excavaciones para zapatas de cimentación, se realizan mejoramiento con cal viva y grava incal con Vibro compactador tipo canguro, se realiza comite de Obra N° 17 donde se presenta avance de obra 19.41% y el programado es de 10% Como también se radica Acta de cobro N° 2 por parte del contratista, se continuan actividades de Relleno con material granular.
Clima mañana: Soleada Clima Tarde: 1 hora de lluvia
Residente de Obra.
Residente 35

P/L Interventoria
JUEVES 07 SEPTIEMBRE 2023. 380
* Personal interventoria: Residente (1) Inspector (1) * Personal SST (1) Asesor (1)

Operario Vibro (1) sub contratista (9) * se continua con activi-
dades de excavación y relleno con material granular para
compactar con Vibrocompactador, se realiza fundida de concreto
ciclopeo 2000psi, se espera resultados de toma de densidades toma
dos el día anterior para continuar con actividad de relleno.
se programa toma de densidades por parte de interventoria. Aún
está pendiente, la respuesta por parte de Enel colombia, como tambien
está pendiente la instalacion provisional de plantarillado.
Clima mañana: soleada. Clima tarde: Soleada

Residente de Obra. RESIDENTE BS

P/L interventoria.
VIERNES 08 SEPTIEMBRE 2023.
Personal Interventoria: Residente(1) inspector(1) Profesional SST(1)
Asesor (1) topografo(1) * personal Administrativo Obra:(5)
Topografo(1), Auxiliar Topo(1), *Personal Obra: Oficiales(2), Ayudante(2),
Operario mini (1), Operario excavadora (1) Operador Vibro (1) maquinaria(3)
equipo(1) sub contratista JPZ(9) * Continua con actividades de
rellenos en bloque E y F * Siguen realizando actividad de
compactacion de material * Segun los resultados de las
densidades para bloque E casa 1 (97%) 2 (99%) 1 (100%)
para un total de cuatro puntos tomados en las fechas mencionadas
anteriormente.
Clima mañana. 2 horas de lluvia Tarde. Soleada

Residente de Obra.

P/L Interventoria.
Sabado 09 SEPTIEMBRE 2023.
*Personal Interventoria: Residente(1) profesional SST(1) inspector(1)
Asesor(1) topografo(1) * personal Administrativo Obra BS(3)
topografo(1), Auxiliar topografia(1) *Personal Obra, Ayudante(3)
Oficiales(2) *sub contratista, JPZ oficiales (6) Maestro(1). Operario
mini cargador (1), Operario mini retro Excavadora (1) Operario vibro(1)
* Se continua con actividades de Relleno con material granular 38

como tambien se continua con actividad de amare de acero para vigas, zapatas y columnas de cimentacion, se compacta con Vibro compactador y Vibro compactador trini en la zona de los adoquines, se realizan actividades de adecuacion del campamento "Baños provisionales" por parte del contratista.
clima mañana: soleada clima tarde: soleada.

Residente de Obra. Residente SST

R/L Interventoria.

LUNES 11 SEPTIEMBRE 2023

*Personal Interventoria: Profesional SST (1), Residente (1), inspector (2) Director (1) Asesor (1) *Personal Administrativo Obra BS (5) topografo (1), Auxiliar Topografia (1) Ayudantes (3), Oficiales (2) *Sub contratista (8), maestro (1) inspectora SST (1), Operario mini cargador (1) Operario mini retro (1) Operario Vibro (1) *maquinaria (3) Equipos (2) * Se continua con la adecuacion y relleno con material granular, se realiza compactacion con Vibro compactador, como tambien se continua. Con amare de acero para Vigas y zapatas.
Clima mañana: soleada. clima tarde: soleada.

Residente de Obra Residente SST

R/L Interventoria.

MARTES 12 SEPTIEMBRE 2023.

* Personal Interventoria: Residente (1) inspector (1), Profesional SST (1) Director (1) Asesor (1) *Personal Administrativo BS (5), Topografo (1) Auxiliar Topografia (1), *Personal Obra Oficiales (3), Ayudantes (2), *Personal sub contratista (8) maestro (1), Operario mini cargador (1) Operario mini Retro (1), Operario Vibro (1) maquinaria (3) Equipos (2) *Se continua con actividades de adecuacion de baños, se continua con actividad de amarre de acero para viga, columna y zapatas de cimentacion, como tambien se continua con la adecuacion del terreno con Relleno y compactacion con Vibro, llega Concreto para fundida de adoquin, se toman muestras por parte de obra, como tambien se realiza prueba de asentamiento, del concreto para Fundir salado 2.5cm = 1/2" 6.5m³. Se realizan toma de densidades por Parte de obra e interventoria.

clima mañana soleada. clima tarde: soleada.

Residente de Obra. Residente SST

F/L Interventoría

MIERCOLES 13 SEPTIEMBRE 2023.

*Personal Interventoria: Profesional SST (1), Inspector de Obra (1) Residente (1) Asesor (1) topografo (1) * personal Administrativo Obra (6). Topografo (1) Auxiliar Topografia (1) *Personal Obra: Ayudantes (3) Oficiales (2) * personal sub contratista: ypz (8) oficiales, ypz Ayudantes, maestro (1) Inspectora SST (1), Operario mini Cargador (1) Operario. mini Retro (1) Operario Vibro (1) Maquinaria (3) Equipos (2) *Se continua con amarre de acero para Vigas Zapatas y columnas como tambien se revisan por parte de interventoria del amarre del acero donde se encontraron detalles en la instalación de los flejes en el eje FA-F3, Como tambien se realizan observaciones en la instalación de los flejes en el eje FD-F1, posteriormente se realiza corrección por parte del contratista y sub contratista, Se realiza comite de obra donde se tratan temas de avance de la obra lo cual a la fecha se presenta un programado del 10.80% y un Ejecutado del. 27,83% * SE TOMAN DENSIDADES EN PLATAFORMA. COMPLETA

Clima mañana: soleada clima tarde: soleada.

Residente de Obra. Residente SST

F/L Interventoria.

JUEVES 14 SEPTIEMBRE 2023.

*Personal Interventoria: profesional SST (1), Residente (1), Asesor (2), Inspector (1) topografo (1) *personal Administrativo Obra: (5), topografo (1) Auxiliar topografo (1) * personal obra: Oficiales (2) Ayudantes (3) *personal sub contratista: Oficiales (8) ypz, maestro (1), inspectora SST (1) operario minicargador (1) Operario miniretro (1) Operario Vibro compactador (1), maquinaria (3) Equipos (2), * se continua con adecuación del terreno con relleno y compactación con vibro compactador, se continua con amarre de acero para vigas, columnas y zapatas de cimentación, todo con el Fin de fundir concreto. el dia sabado

Clima mañana- soleado Clima tarde soleada.

* (LEGAN RESULTADO DE DENSIDADES DE 5 PUNTOS DEL BLOQUE E ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS 1(98%), 2(99%), 1(92%), 1(97%)
* INTERVENTORIA AUTORIZA EL INICIO DE ENCOFRADOS

R/L Interventoria.

P VIERNES 15 SEPTIEMBRE 2023.

Personal Interventoria: Profesional SST (1), Residente (1) Inspector (2) topografo. (1), Asesor (1) * personal administrativo obra: (5), Topografo (1) Auxiliar topografia (1) * personal Obra: OFICIALES BS (2) Ayudantes BS (3) * Sub Contratista ypz (8), maestro (1), inspectora sst (1), * Operadores maquinaria. minicargador (1) mini retro (1), Vibro compactador (1), se continua. con actividades de amarre de acero para zapatas, vigas y columnas para la cimentacion del bloque "F" como tambien se realizan. Relleno con material granular, se realiza compactacion con vibro compactador, asi mismo se realizan actividades de excavacion para. Concreto ciclopeo en el bloque "E" * SE TOMAN DENSIDADES PSCS BLOQUE G Clima mañana Soleada clima tarde soleada.

* Y DENSIDADES PSCS BLOQUE E (COLUMNAS CAPS) NIVEL VIGAS.

Residente de Obra

R/L Interventoria.

SABADO 16 SEPTIEMBRE 2023.

Personal Interventoria: Residente (1) Inspector (1) Profesional SST (1). Asesor (2), Director (1) * Personal Administrativo obra (5), topografo (1) Auxiliar topografia (1) * personal Obra: OFICIALES BS (2) Ayudantes BS (3) * Sub contratista. ypz (8), maestro (1) Inspector SST (1) * Operadores. maquinaria. minicargador (1) mini retro (1) Vibro Compactador (1), se continuan actividades programadas como son fundida de. Vigas, zapatas y columnas, se continua con la actividad de excavacion para Ciclopeos en bloque "E", como tambien se realiza compactacion con vibro.

Clima mañana soleada clima tarde soleada.

Residente de Obra

LUNES 18 SEPTIEMBRE 2023

Personal Interventoria: profesional SST (1), residente (1) Inspector (7) director (1), topografo (1), * personal Administrativo obra. (5), topografo (2) Auxiliar topografo (2) * personal Obra. Oficiales (2) Ayudantes (2) * personal sub contratista y/o (8) maestro (1), Inspectora SST (1), Operativos maquinaria. Operador minicargador (1) operador mini retro (1) operar vibro (1) Se continua con actividades de retiro de encofrado de las vigas de cimentacion, como tambien se continua con actividad de excavacion para aclopeo bloque "E" Se continua con relleno y compactacion con vibro compactador * Se reciben resultados verificacion puntos bloque E. Clima mañana soleada Clima tarde soleada. * Se recibe resumido de densidades de 15 puntos nivel terraza 5 (98%) 4 (99%) 6 (100%) * Llega a obra acero del bloque D-B-G * Se entregan muestras a laboratorio (4) zapatas - vigas. L/L Interventoria.

Martes 19 SEPTIEMBRE 2023.

Personal Interventoria: profesional SST = (1) Inspector (2) Asesor (1) Residente (1), topografo (1), * personal Administrativo contratista (5), topografo (2) Auxiliar contratista topografia (1) * personal Operativos (3) oficiales, Ayudantes (2), * personal sub contratista. y/o (8), maestro (1), Inspector SST (1), * Operadores Maquinaria. Operador mincargador (3), Operador mini retro (1), Operador Vibro (1), * se continua con actividades de excavacion para aclopeo en bloque "E", se Retira encofrado de las vigas de cimentacion del bloque "F", se continua con actividades de relleno con material granular para cimentacion de los siguientes bloques. se continua con amarre de acero para cimentacion de vigas, zapatas y columnas. para fundir el siguiente dia. Clima mañana soleada clima tarde soleada.

Residente de Obra.

K/L Interventoria.

MIERCOLES 20 SEPTIEMBRE 2023.

Personal Interventoria: Residente (1), Inspector (1), profesional SST (1) Asesor (1) Topografo (1) Director (1). * personal Administrativo Obra. (6) Topografo (1), Auxiliar topografia (1) * personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (3) * personal Obra & Sub contratista y/z (13) maestro (1) inspectora sst (1), * personal Operativo maquinaria: minicargador (1) minirretro (1) Vibro compactador * Se continua con actividades de encofrado de acero para fundida de vigas de cimentacion se continua con actividades de Excavacion para concreto ciclopeo en bloque "E", como tambien se continua con actividades de relleno y compactacion con vibro, en horas de la tarde se realiza Comite donde se tratan temas de avance de obra lo cual indica un 31,81 ejecutado y un programado del 11.50, se realiza Fundida de vigas, zapatas y columnas bloque "F" y se da por terminadas la de primera etapa de amentacion del bloque "F". Clima mañana soleada Clima tarde soleada.

Residente de Obra

Residente SST

K/L Interventoria

JUEVES 21 SEPTIEMBRE 2023.

Personal Interventoria: Profesional SST (1), Residente (1), Inspector (2) Asesor (1), Topografo (1), * personal Administrativo Obra (5) topograp (1), Auxiliar topografo (1) * personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (3), Personal Sub contratista y/z: (8) Oficiales, maestro (1), inspectora, SST (1) * personal Operativo maquinaria: Operario minirecto (1), Operario minicargador (1) Operario Vibro compactador (1) *Se continua con actividadades de excavacion para concreto ciclopeo en bloque "E", se continua con actividad de relleno y compactacion con vibro compactador, Se realiza mejoramiento en excavacion para ciclopeo con cal viva y grava, se Adicionan (5) oficiales para el subcontratista y/z * Se replanteo para descubrir en el eje C>4;7 frente al Bloque E. * Se ejecuta actividad del descimbrado de zapatas y vigas Bloque F. * Se verifica niveles de concretos con topografia. Clima Mañana 2 horas de lluvia

Residente SST

Residente de Obra.

R/L Interventoria.

VIERNES 22 SEPTIEMBRE 2023.

PERSONA INTERVENTORIA: Profesional SST (1). Residente(1) Inspector (1) topografo (1) Asesor (1) * personal Administrativo. Obra: (4) topografo (2), Auxiliar topografia (2) * personal Obra: Oficiales (2), Ayudantes (3) * sub contratista y Pz: Oficiales (13), maestro (1) inspectoria SST (1), * Operativos maquina: mini cargador (1) mini Retro (1) Operario Vibro (1), Encargado maquinaria (1) Se continua. Con actividades de Relleno y compactacion con Vibro, se continua con excavacion para Concreto ciclopeo, se realiza mejoramiento con piedra "grava" y cal viva, En horas de la tarde se realizan fundida de concreto ciclopeo para zapatas

Clima mañana: 2 horas de lluvia

Clima tarde: Soleada

Residente de Obra.


R/L Interventoria.


SABADO 23 SEPTIEMBRE 2023

Personal Interventoria: Profesional SST (1), Residente (1) inspector (1) Asesor (1) * personal Administrativo Obra: (4), topografo (1) Auxiliar topografia (1) * personal obra: Oficiales (2), Ayudantes (3) * personal Sub contratista y Pz: (13) maestro (1), inspector SST (1) * Operarios maquinaria: mini cargador (1), min Retro (1) Vibro (1) Encargado maquinaria (1), * Se continua con actividades de. Excavación para ciclopeo, como tambien se continua con compactacion con Vibro compactador, se continua con amarre de acero. para Vigas, zapatas y columnas del bloque E-F, llega visita programada del Asesor. Estructural del contratista de obra para analizar temas relacionados con talud del cerramiento, mediante el recorrido Realiza recomendaciones que se relacionan a continuación

Visita asesoría estructural.
Recorrido general. Sep 23/23

1) Protección relleno, cimentación y placa

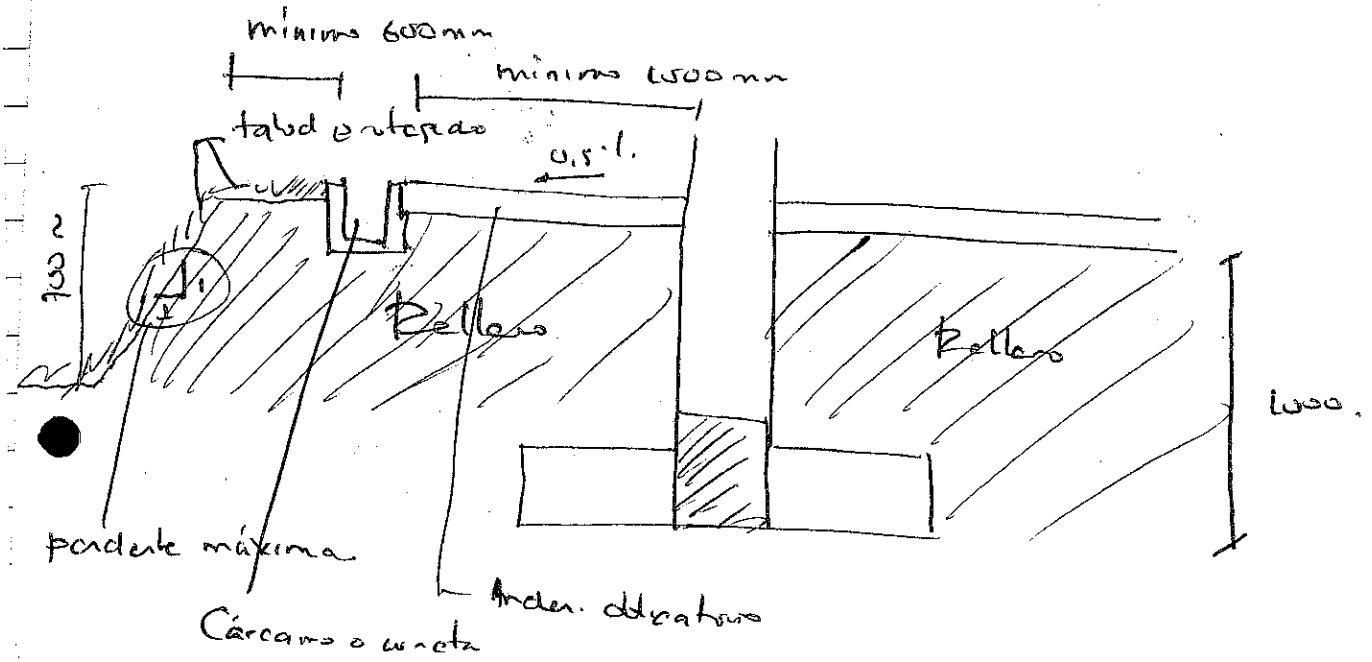


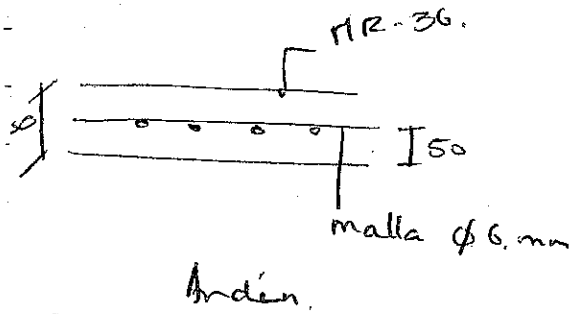


Andén.


Jorge I. Hargen
MP 17202-73123685
Asesor Consorcio BS.


2) Pedestal Columnas circulares

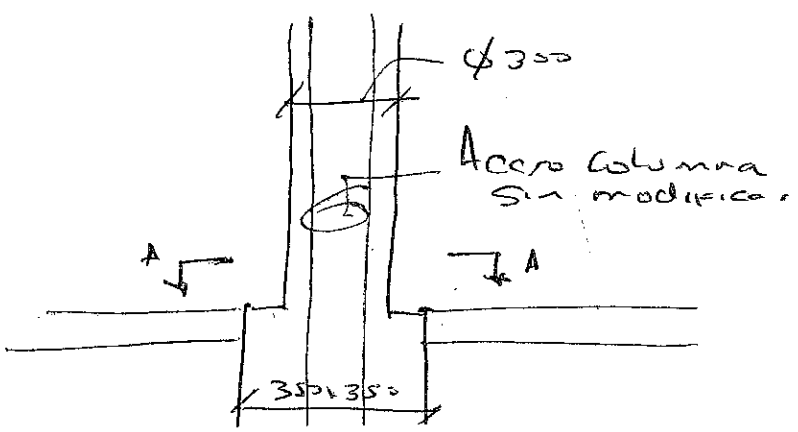


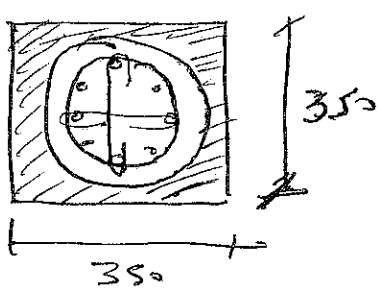


3) Vigas muros Fachada.

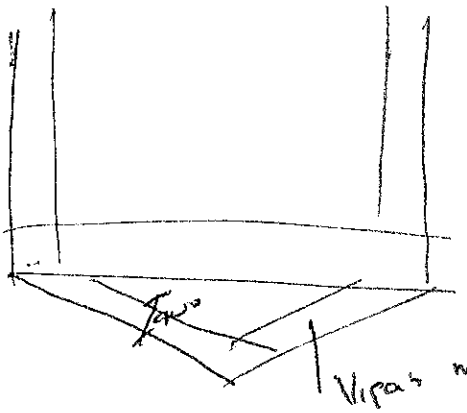

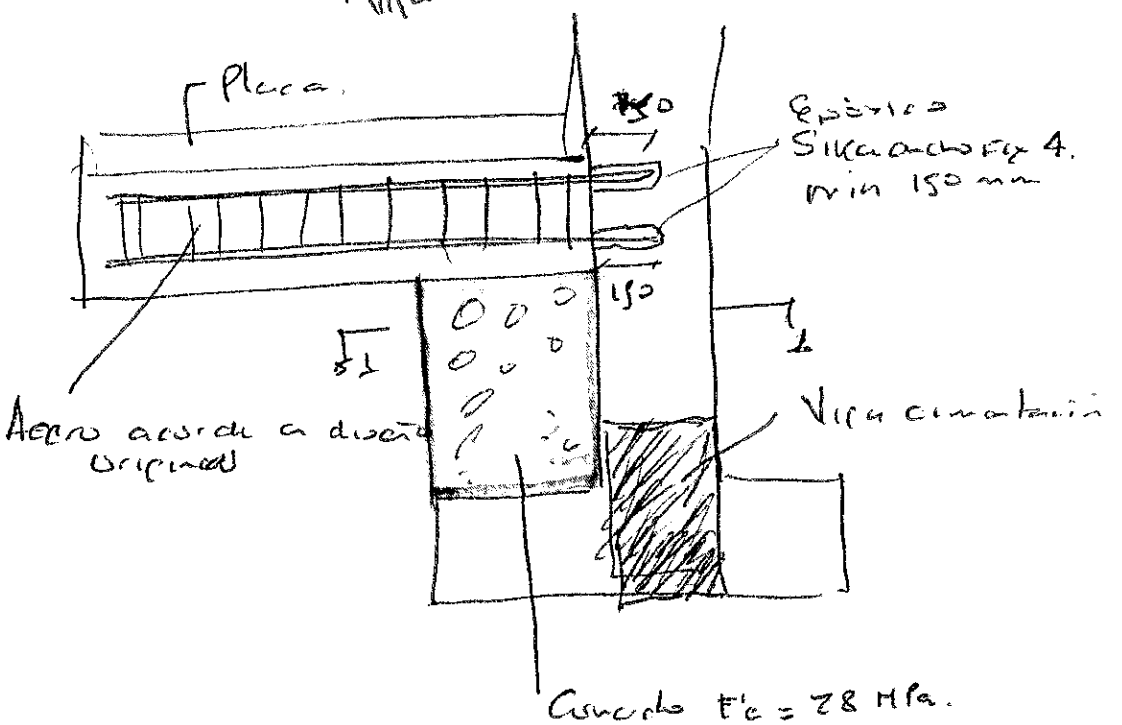

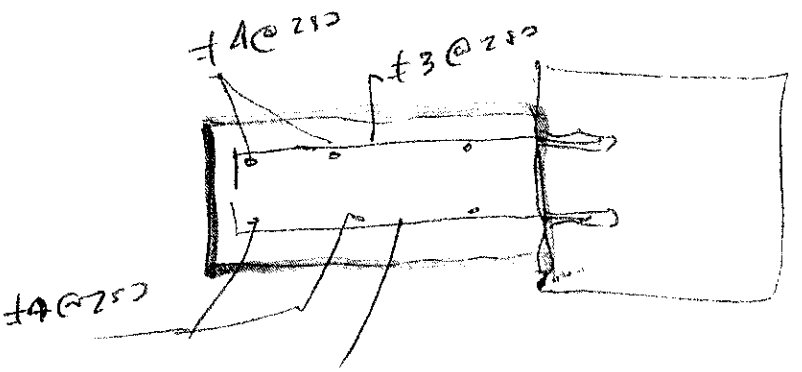


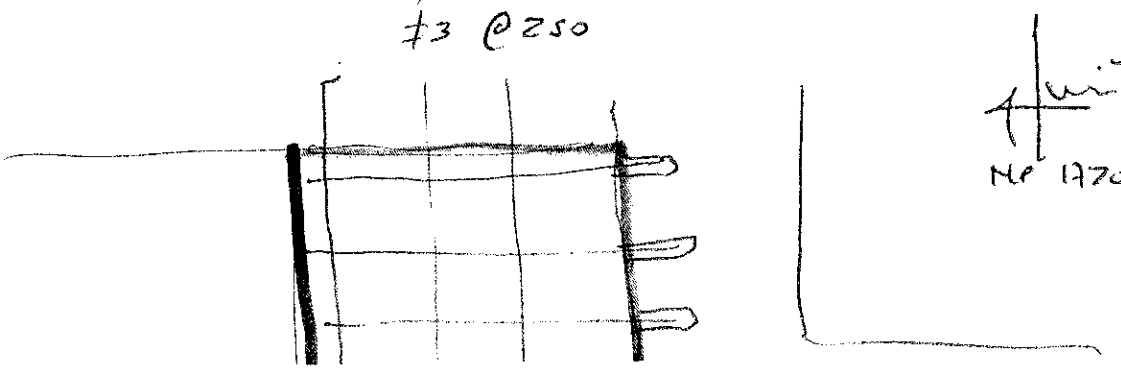

Unid.

Mp 17707-73123 Cal

4) Zona Gaviones

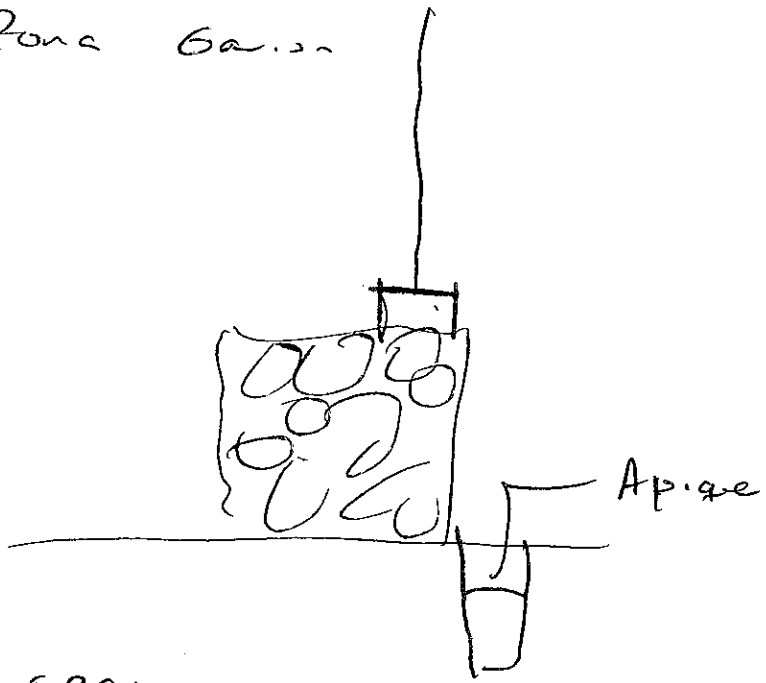

Se requiere apoyo junto a muro en 2 o 3 puntos. Adicional dimensiones del gavión.

Se requiere revisar estudio de suelos.

Basado en la info se determina diseño.

Atte.

Residente de Obra.

Clima mañana: 2 horas de lluvia clima tarde: Soleada

R/L Interventoria.

LUNES 25 SEPTIEMBRE 2023.

* Personal Interventoria: profesional SST (1) inspector (1), topografo (1) asesor (1) residente (1) * personal Administrativo obra: (4), topografo (1) Auxiliar topografia (1) * personal obra: oficiales (2) Ayudantes (3), * personal sub contratista y/o: (13), maestro (1) inspector SST (1) Operarios maquinaria: mini cargador (1), mini retro (1) Vibro compactador (1) encargado maquinaria (1), se continua con actividades de excavacion para ciclopeo, se continua con amarre de acero para VSC Bloque E-F

Clima mañana Soleada Clima tarde. 2 horas de lluvia

R/L Interventoria Obra

MARTES 26 SEPTIEMBRE 2023

Personal Interventoria: (6) * personal Administrativo obra BD (5) * auxiliar topografia (1) topografo (1), * personal obra (2) oficiales, Ayudantes (3) * operarios maquinaria-mini cargador (1): mini retro (1), * se continua con amarre de acero para VSC E-F. se continua con relleno y compactacion, sub contratistas y/o (12) * SE TOMAN DENSIDADES

Clima mañana: Soleada Clima tarde: Soleada

* SE FUNDE SOCALOS PISO EJE 3 NODE E. (VIGAS) * SE REQUIERE EXCAVACION DE VIGAS Y ZAPATAS.

R/L Interventoria.

MIERCOLES 27 SEPTIEMBRE. 2023

* Personal Interventoria: (5) * personal Administrativo obra (1) * Oficiales (2) Ayudantes (3) Operarios maquinaria (3) subcontratista y/o (13) * se continua con Relleno y compactacion * LLEGAN RESULTADOS DE 9 DENSIDADES; AMARRE DE ACERO VIGAS-ZAPATAS NODO E

CLIMA: LLUVIAS EN LAS HORAS DE LA MAÑANA 2am - 5am.

28 - Septiembre - 2023.
Visita tecnica. Centro Educativo para La primera infancia vereda La fuente. Tocancipá. hora 11:30 a.m
Referente a las gradas en piedra confinada con malla calibre ±12 tipo gavion.
Se observa que entre los tres niveles de graderia de altura 40 cm/cada uno. para una altura total de 120 cm. y la malla de cerramiento del predio a una distancia promedio 180 cm, hay un terreno en suelo organico (tierra negra) como relleno, con acabado en cesped (Pasto kikuyo), que a pesar del cortotiempo ha consolidado y permite sostenerce en un angulo de ±90° con La Horizontal. en algunas parte con angulo negativo,

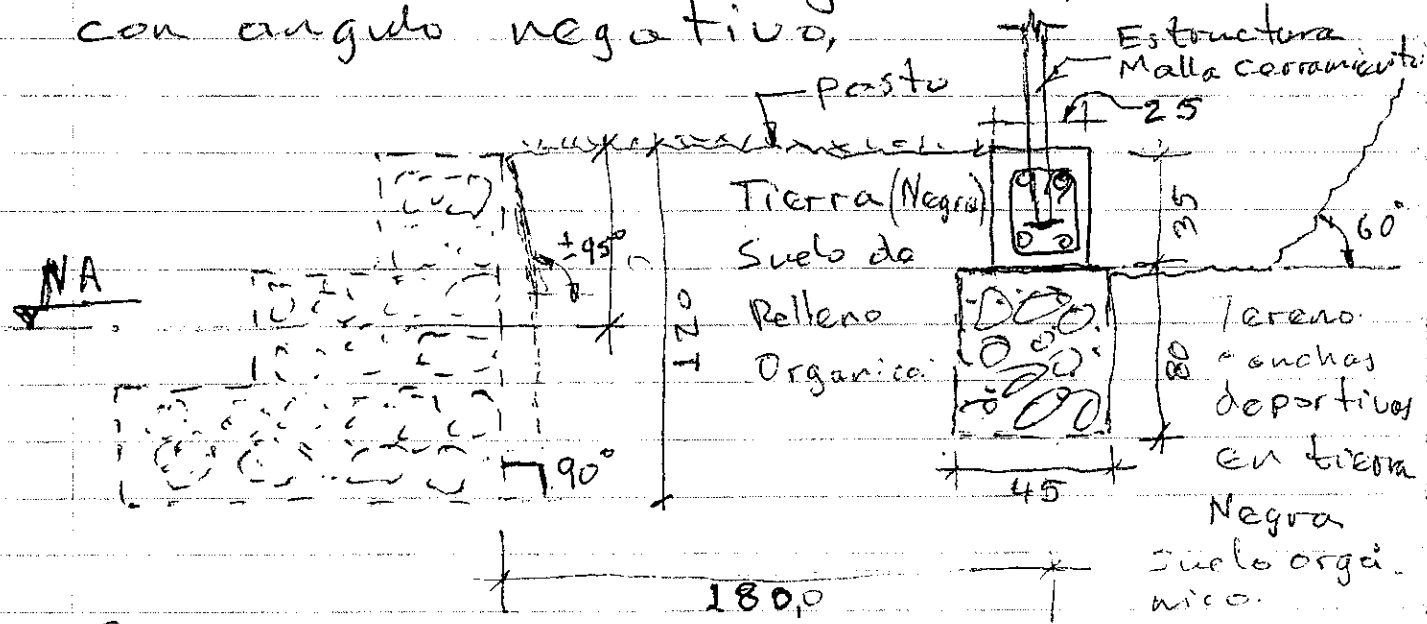


Fig 1:
Esquema del perfil que se describe

Es decir que el angulo llega a ser ±95° a 100° con la orizontal, en el terreno del lado al otro lado del cerramiento se encuentra un talud en el mismo suelo tierra negra.

césped (Pasto Kikuyo) donde apesar del tiempo no precenta deslizamiento.

Todo esto indica que si se hace un perfilado al relleno en suelo organico a 45° con respecto a la horizontal antre el nivel de acabado del piso de los salones del hogar infantil la fuente Tocancipa y el nivel de corona del relleno en suelo organico que es en promedio 1 cm, aun quedaria en promedio 30 cm de ancho de cresta de terreno hasta el cerramiento, lo que no permitiria el volteo de dicho cerramiento. Ademas si se revisa el sistema de cimentacion de dicho cerramiento el cual no fue en el suelo organico que se precenta si no que se hizo un un mejoramiento con pedestales dos de una profundidad donde el suelo es estable a -1,05 m del nivel original del terreno que es la base de las gradas segun estudio de suelos utilizado (Realizado) para la ejecucion del proyecto infantil la fuente Tocancipa.
Es decir que si el cerramiento no fue estabilizado desde abajo del nivel 0,00 o base las gradas en piedra dicho cerramiento colapsaria si o si (~~x~~) aun estubieran las gradas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El cerramiento tiene una cimentaci

con propia que no depende del suelo a lado y lado de la cimentacion de dicho cerramiento.

2. El suelo de relleno, suelo orgánico o tierra negra no influy en la estabilidad del cerramiento por consiguiente es cuestion de perfilarlo, para combiar su arista a un angulo entre 45° y 60°, con respecto a la horizontal, donde su arranque lo determina el nivel de acabado de los salones del centro infantil la Fuente Tocoricipá.

3. Segun las dimensiones tomadas en terreno al hacer una excavación con erramienta de mano (Palas), y anotadas en la fig 1. indica que la base del cimiento ciclopeo esta entre 5 y 15 cm por encima de la base donde se encontraba la graderia y con una separación de 180 cm quiere decir que no hay afectacion segun el angulo corte o rodadura del suelo.

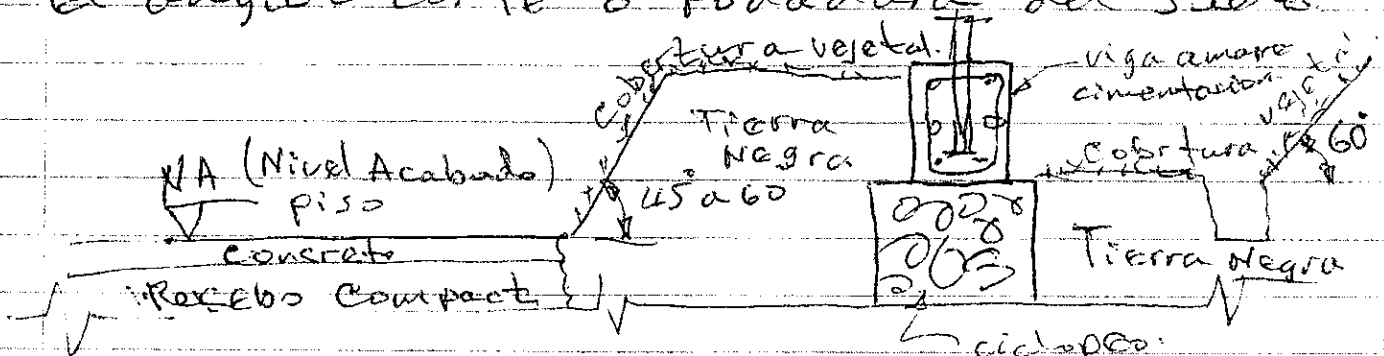



Figura 2.
Perfil acabado área que colinda el cerramiento.

Ing OCTAVIO ENRIQUE TORRES FORERO 394


Concepto Tecnico zapatas cimentación con centro Infomtfl La Fuente. Tocancipá


A la pregunta que significa doble parrilla de refuerzo en zapata. se tiene:

Parrilla es el armado de los hierros de refuerzo en las dos direcciones tanto Longitudinal una dirección y transversal la otra dirección

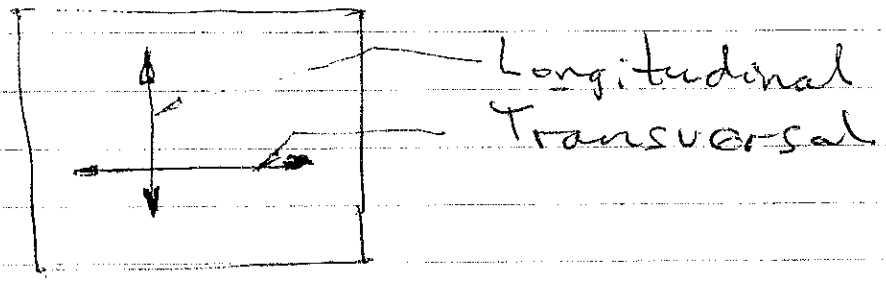

luego doble parrilla es: una superior y otra inferior

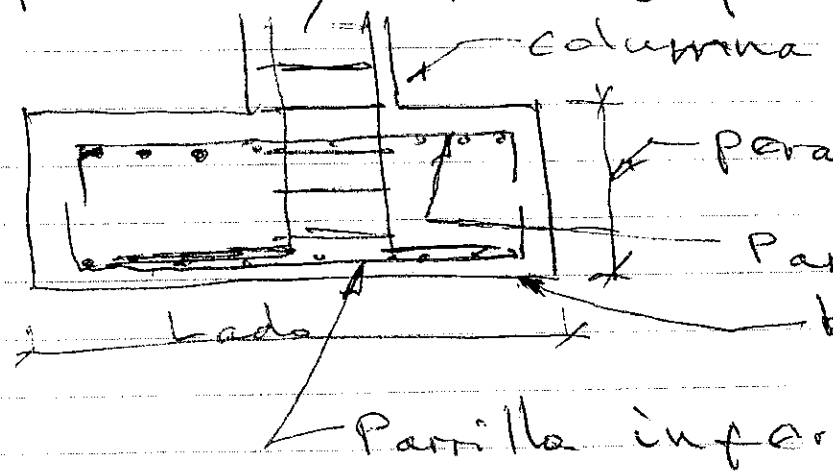

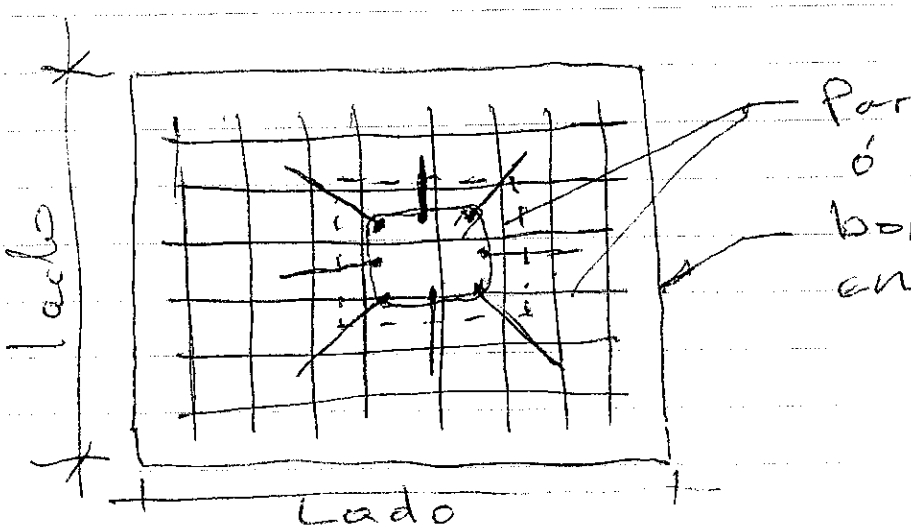

En resumen:
Con base en los planos que se estan llevando en la obra del centro Infantil la Fuente de Tocancipá es que los hierros de parrilla son iguales en los dos direcciones y no que es doble parrilla.
Tambien resalto que son los planos que desapruebe y que no son los que yo aprobé, en en la revisión de aplicación a la norma NSR-10.
Al revisar el plano 4/13 - La zapata III que indica doble parrilla es una referencia confusa y el gancho de 10 cm no cumple la NSR en cuanto a la longitud del gancho.

Atte:

OCTAVIO ENRIQUE TORRES FORERO.
Mat. Prof. 25202-098759 CND.

F/L Interventoria.
Personal interventoria * (5) * Personal administrativo Obra: (4) * Oficiales (2) Ayudantes (3) topografo (1) Auxiliar (1) * sub contratista yp t (13), maquinaria (3) Operarios maquinaria (3) encargado (1) inspectora SST sub contratista (1) Encargado maquinaria (1). Se continua con actividades de excavacion para ciclopeo en bloque E.
* CONTINUAN CON EL ARMADO DE VIGAS PARA BLOQUE E.
* SE INICIA CON EL REMANTEO DEL BLOQUE C.
* SE VERIFICAN NIVELES PARA COLUMNAS BLOQUE E; PARA DAR INICIO A FUNDIDA DE CIMENTACIÓN; CONJUNTAMENTE CON INTERVENTORIA DE REALIZA LA REVISIÓN DE ACERO (CIMENTACIÓN) DEL BLOQUE E.
CLIMA: DURANTE LA TARDE SE PRESENTA LLUVIA 2:00pm - 4:00pm.

VIERNES 29 SEPTIEMBRES 2023.
* personal Interventoria (5) * personal Administrativo obra (11).
Topografo (1), Auxiliar (1). * personal Obra sub contratista ypz (17)
maquinaria (3), Operarios maquinaria (3) maestro ypz (1) encargado maquinaria (1)
*inspectoria SST ypz (1) * se continua con actividades de Relleno y compactacion
con vibro compactador, se continua con amarre de acero para VSC del
bloque E-F, en horas de la tarde se realiza fundida de
zapatas, Vigas y columnas en bloque E-F, se toman muestras, se
realizan inspecion antes de fundir del amarre de acero para liberar para
posteriormente continuar con fundida de zapatas y vigas en bloque (E)
la interventoria realiza observaciones al contratista sobre amarre de aceros
y recubrimiento ya que se presentan flejes sueltos y falta adecuar para el recubrimiento
* LA ACTIVIDAD DE FUNDIDA DE CIMENTACION SE REQUIZA LUEGO DE SUBSANAR OBSERVACIONES DE PIE.
Clima mañana: Soleada Clima tarde: Soleada
INTERVENTORIA. * SE INICIA LA DEMOLICION DE PLACA EXISTENTE JUEGO
DE REPLANTEO DE POZOS (AGUAS LLUVIAS-RESIDUALES)

R/L Interventoria. Residente Obra. RESIDENTE SST

SABADO 30 SEPTIEMBRES 2023.
* personal Interventoria: (5) * personal Administrativo Obra (11)
* personal Obra: Oficiales (2) Ayudantes (3) Topografo (1) Auxiliar topo-
grafia (1) * Sub contratista ypz (17) inspectora SST (1) maestro (1)
maquinaria (3), Operarios maquinaria (3) encargado (1) * se continua
con Relleno y compactacion con vibro compactador, se continua con
excavacion para ciclopeo en bloque ("E") * CONTINUAN CON DEMOLICION.
DEMOLICION PLACA PARA POZOS DE INSPECCION. (AGUAS LLUVIAS-RESIDUALES)

Clima mañana: Soleada Clima tarde: Soleada

Residente de Obra. RESIDENTE SST

R/L Interventoria.
LUNES 02 OCTUBRE 2023.
* personal interventoria: (6) * personal contratista (11) 327

CONSORCIO
DS
INGENIERÍA

ANEXO 1
PLAN DE TRABAJO

CONSORCIO BS INGENIERIA	Version : 01	Fecha:06-09-2022	pag 1 dfe 1

OBJETIVO

Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la organizacion CONSORCIO BS INGENIERIA.

META	INDICADOR
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.	(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100

CICLO	ACTIVIDAD	18 MESES DE EJECUCION DEL PRO																																Responsable	RECURSOS	
		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE			Administrativos	Financieros
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
	Reuniónes mensuales del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST ,Registar en acta																																			Asesor SST - Integrante Copasst	x	
	Actualizar Reglamento de Higiene y Seguridad, divulgación al personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los trabajadores.																																			Asesor SST- Gerente	x	
	Revision de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, y divulgar al personal, dejar registro de la divulgación a todos los trabajadores,																																			Asesor SST- Gerente	x	
	Revizar y actualizar la Matriz de Identificación Peligros ,Evaluacion y Valoracion de Riesgos para la determinación de controles, divulgar al personal, registrar la evidencia de la divulgación a todos los trabajadores.Decreto 1072 de 2015 > Libro 2 > Parte 2 > Título 4 > Capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.15.																																			Asesor SST	x	

Elaborò:Ing.Viviana Pulgarin Garcia

CONSORCIO DS INGENIERÍA		Version : 01	Fecha:06-09-2022	pag 1 dfe 1

		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE				
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
I PLANEAR	Revisar y ajustar el Plan de Emergencias (Plan de Evacuación, divulgación al personal, dejar registro de la divulgación a todos																																					Asesor SST	x	
	Capacitación a todo el personal de acuerdo a la programacion ajustada con al ARL,dejar registro de la evidencia.																																					ARL-Asesor SST	x	
	Control Sistema de Seguridad Social,Seguimiento de afiliacion y pagos de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales																																					Vigia - Asesor SST	x	
	Realizacion de las Inspecciones de Seguridad , salud en el trabajo y ambiental merisual																																					Asesor SST	x	
	Realizacion de mantenimientos preventivo a la maquinaria y equipos (pre operacional), de acuerdo al programa.																																					Asesor SST	x	
	Realizacion de comites de Prevención del Acoso Laboral- Comité de Convivencia Laboral.Dejar evidencia.																																					Asesor SST	x	

Elaboró:Ing.Viviana Pulgarin Garcia

CONSORCIO DS INGENIERÍA

Version : 01 | Fecha:06-09-2022 | pag 1 dfe 1

ACTIVIDAD	ABRIL P	ABRIL E	MAYO P	MAYO E	JUNIO P	JUNIO E	JULIO P	JULIO E	AGOSTO P	AGOSTO E	SEPTIEMBRE P	SEPTIEMBRE E	OCTUBRE P	OCTUBRE E	NOVIEMBRE P	NOVIEMBRE E	DICIEMBRE P	DICIEMBRE E	ENERO P	ENERO E	FEBRERO P	FEBRERO E	MARZO P	MARZO E	ABRIL P	ABRIL E	MAYO P	MAYO E	JUNIO P	JUNIO E	JULIO P	JULIO E	AGOSTO P	AGOSTO E	SEPTIEMBRE P	SEPTIEMBRE E			
Realizar la capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.																																					Asesor SST	x	
Entrega de elementos de protección personal de acuerdo al cargo.																																					Asesor SST	x	
Capacitar al Comité de Convivencia Laboral.																																					Integante de CCL	x	
Planear y realizar de simulacro de evacuación.																																					Vigia-Asesor SST	x	
Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuenta sobre su desempeño																																					Vigia-Asesor SST	x	
Incluir en el procedimiento de compras la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.																																					Vigia-Asesor SST	x	
Incluir como requisito para el proceso selección y evaluación de proveedores y/o contratistas tengan documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud																																					Vigia-Asesor SST	x	

Elaboró:Ing.Viviana Pulgarin Garcia

CONSORCIO DS INGENIERÍA	Version : 01	Fecha:06-09-2022	pag 1 dfe 1

ACTIVIDAD	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE				
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
Revision de procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio)																																					Vigia-Asesor SST	x	
Realizar de Examenes Periódicos Ocupacionales a los colaboradores y realizar seguimiento																																					Vigia-Asesor SST	x	
Elaborar el profesiograma																																					Asesor SST	x	
Elaborar la caracterización de las condiciones de salud																																					Asesor SST	x	
Elaborar e implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos																																					Asesor SST	x	
Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común.																																					Asesor SST	x	

Elaboró:Ing.Viviana Pulgarin Garcia

CONSORCIO DS INGENIERÍA	Version : 01	Fecha:06-09-2022	pag 1 dfe 1

ACTIVIDAD	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE				
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
Implementar programa de estilo de vida saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y control, de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros																																				Asesor SST	x	
Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo.																																				Asesor SST	x	
Realizar inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, con la participación del COPASST																																				Copasst, apoyo sgsst	x	
Realizar inspecciones de extintores con participación del COPASST																																				Copasst, apoyo sgsst	x	
Realizar inspecciones de seguridad elementos de primeros auxilios con participación del COPASST																																				Copasst, apoyo sgsst	x	
Realizar inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST																																				Copasst, apoyo sgsst	x	

Elaboró:Ing.Viviana Pulgarin Garcia

CONSORCIO DS INGENIERÍA

Version : 01 | Fecha:06-09-2022 | pag 1 dfe 1

ACTIVIDAD	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE				
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
Ajustar matriz de elementos de protecóón personal																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Realizar inspecdones de elementos de protección personal.																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Mantenimiento a punto de hidratacion para consumo humano.																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Revision de plano de evacuacion de la instalaciones donde se identifique areas y salidas de emergencias																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Capacitar a las Brigadas de Emergencias.																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Dotar a las Brigadas de Emergencias.																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Realizar simulacro de incendio.																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Elaborar instructivo para el reporte de enfermedad laboral.																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Elaborar instructivo para notificación e investigación de accidente de trabajo																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Matriz de seguimiento reporte de actos y condiciones inseguras																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Capacitacion manejo de productos químicos-estandarizar procedimientos																																					Copasst, apoyo sgsst	x	

Elaboró:Ing.Viviana Pulgarin Garcia

CONSORCIO DS INGENIERÍA

Version : 01 | Fecha:06-09-2022 | pag 1 dfe 1

ACTIVIDAD	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE				
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
Segimiento a los cursos de trabajo en alturas (avanzado y recertificaóón).																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Segimiento a los cursos de trabajo en alturas (avanzado y recertificación).																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Investigación de accidentes e incidentes de trabajo																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Diagnostico de Riesgo mecánico																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Diseñar del Sistema de Vigilancia Musculo esquelético																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Realizar mediciòn ambientales iluminación (mediciòn ambiental de iluminacion definir puntos)																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Divulgacion de lesiones aprendidas a todos los trabajadores y dejar registro .																																					Copasst, apoyo sgsst	x	
Realizar una auditoria anual, la cual será planificada con la partiòpación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.																																					Copasst, apoyo sgsst	x	

Elaboró:Ing.Viviana Pulgarin Garcia

CONSORCIO DS INGENIERÍA

Version : 01 | Fecha:06-09-2022 | pag 1 dfe 1


ACTIVIDAD	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE				
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
Desarrollar taller de la prevención de riesgos al interior de los lugares de trabajo con la participación de representantes de los trabajadores y del empleador																																				Copasst, apoyo sgsst	x	
Realizar la batería de riesgo psicosocial																																				IPS	x	
[redacted]																																				apoyo sgsst	x	
[redacted]																																				apoyo sgsst	x	
[redacted]																																				apoyo sgsst	x	
[redacted]																																				apoyo sgsst	x	
[redacted]																																				apoyo sgsst	x	


Elaborado:Ing.Viviana Pulgarin Garcia

CONSORCIO DS INGENIERÍA

Version : 01 | Fecha:06-09-2022 | pag 1 dfe 1

	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE				
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
[redacted]																																					apoyo sgsst	x	
MES /AÑO	abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23		dic-23		ene-24		feb-24		mar-24		abr-24		may-24		jun-24		jul-24		ago-24		sep-24				
Actividades Programadas en el Mes	52		52		54		54		47		56		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				
Ejecucion Mensual del Programa	52		52		54		54		47		56		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				
cumplimiento	[redacted]												0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				
META	100%																																						





Elaboró:Ing.Viviana Pulgarin Garcia

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 2

INDICADORES


CONSORCIO DS INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD
	version:01


Constante "K":


Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:

Datos	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Consolidado
Total de horas hombre Programadas	368	800	1.664	2.200	5.616	*10.648*	10.648
Total de accidentes de trabajo	0	0	0	0	0	0	0
Total de accidentes mortales	0	0	0	0	0	0	0
Total de días perdidos por accidente de trabajo	0	0	0	0	0	0	0
Total de accidentes de trabajo con incapacidad	0	0	0	0	0	0	0
Total Concepto de Enfermedad Laboral (nuevos)	0	0	0	0	0	0	0
Total Concepto de Enfermedad Laboral (antiguos)	0	0	0	0	0	0	0
Total de investigaciones de accidentes de trabajo realizadas	0	0	0	0	0	0	0

Formula	Nivel de Desagregación	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Consolidado
S de accidentes de trabajo * K / Total de horas hombre	Índice de frecuencia de accidente de trabajo.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(S de accidentes de trabajo con incapacidad * K / Total de horas hombre)	Índice de frecuencia de accidente de trabajo con incapacidad.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
S de días perdidos por accidentes de trabajo * K / Total de horas hombre	Índice de Severidad de accidentes de trabajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(índice de frecuencia de accidente de trabajo * índice de Severidad de accidentes de trabajo) / 1000	Índice de lesiones incapacitantes de accidente de trabajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
S de accidentes de trabajo / Total es accidentes de trabajo	Investigaciones de Accidentes de Trabajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(Número de accidentes de trabajo/Número de at con muerte)*100	Mortalidad Accidente de trabajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(Número de casos existentes -nuevos y antiguos-/Total de trabajadores)*100	Prevalencia Enfermedad Laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(Casos nuevos/Personas expuestas al riesgo desarrollar EL)	Incidencia Enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

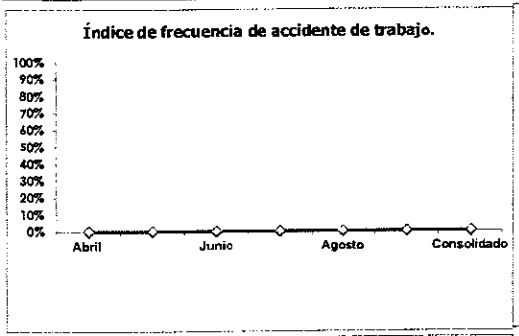

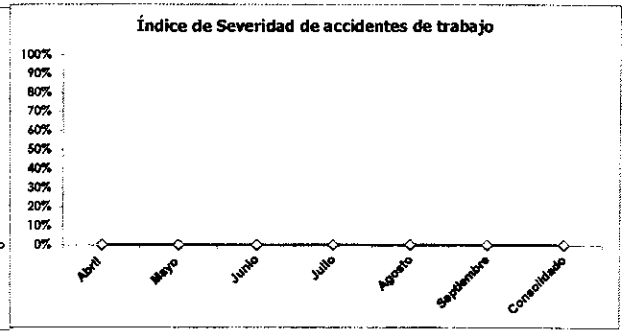

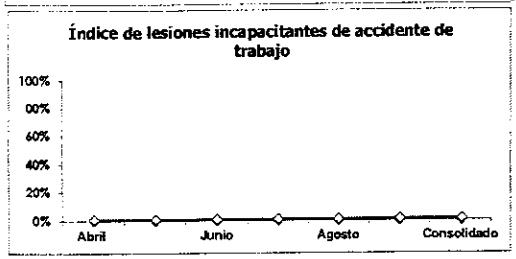

CONSORCIO DS INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			CONSORCIO DS INGENIERÍA
	MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS			
	FTO- ING-10	Versión: 01	Fecha: 26-09-2022	

OBJETIVO GENERAL

Controlar y prevenir cualquier riesgo ocupacionalmente que pueda generar Accidentes, lesiones y enfermedades laborales

	OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FRECUENCIA	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
	SG-SST INDICADORES DE RESULTADO											
1	Prevenir Accidentes, enfermedades laborales y lesiones en el desarrollo de las actividades de ingeobyp SAS	Indice de frecuencia de accidentes de trabajo (IF)	IF AT = (N° total de AT en el periodo / N° HHT del periodo) x 100000	0%	Asesor HSEQ (actualizacion indicadores de Sistema)	Mensual	0	0	0	0	0	0
		Proporción de prevalencia general de origen laboral	No. Casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) de Enfermedades profesionales año /No Promedio de trabajadores año *1000	0%		Mensual	0	0	0	0	0	0
		Tasa de accidentalidad	TA = N° AT / N° promedio de trabajadores	0%		Mensual	0	0	0	0	0	0
		Índice de severidad de AT	S AT = (N° días cargados + perdidos por AT en el año / N° HHT año) x*100000	0%		Mensual	0	0	0	0	0	0
		Índice de lesiones incapacitantes	[illegible] = (S x IS) / 1000	0%		Mensual	0	0	0	0	0	0
2	Indice de Frecuecia de Ausentismo	Incluye Enfermedad Común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud.	FA= N° De eventos de ausencia por causa de salud último año *100000 Horas hombre programadas en el año	80%		Anual	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Mejorar el SG-SST continuamente.	Cumplimiento de acciones correctivas	Acciones correctivas realizadas x100 / No de No Conformidades encontradas	100%		Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	SG-SST INDICADORES DE ESTRUCTURA											
4	Política de SST	Divulgación de la política de SST	Documento de la Política de SST firmada, divulgada y fechada. Cumplimiento de requisitos de norma.	100%	Asesor HSEQ (actualizacion indicadores de Sistema)	Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Objetivos y metas	Objetivos y metas de seguridad divulgados	Documento de la Política de SST firmada, divulgada y fechada. Cumplimiento de requisitos de norma.	100%		Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Identificación de peligros y riesgos	Método definido para la identificación de peligros	Método definido para la identificación de peligros.	100%		Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Funcionamiento del Cosasst	Funcionamiento del COPASST	La organizacion cuenta con un COPASST con funcionamiento y con delegación de funciones.	100%		Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Evaluación inicial del SG-SST	100% de cumplimiento del SG SST	Sumatoria de porcentajes por cada uno de los item evaluados	50%	Asesor HSEQ (actualizacion indicadores de Sistema)	Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Plan anual de Trabajo en SST	Ejecución del plan de trabajo en el SGSST	No. Actividades realizadas/ No. Actividades programadas * 100	95%		Semestral	95%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Intervención de peligros y riesgos	Intervención de los peligros identificados	N° total de peligros intervenidos en el periodo/Total de peligros identificados	80%		Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Investigación de accidentes e incidentes	Porcentaje de accidentes/ incidentes investigadosPorcentaje de accidentes/ incidentes ocurridos	N° De accidentes /incidentes investigados /Nro accidentes /incidentes reportados	100%		Semestral	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	Cumplir con los requisitos legales aplicables	Indice de cumplimiento legal	% items cumplidos en matriz legal/ % items identificados en matriz legal	100%		Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Dar cobertura a todos lo trabajadores según Matriz de Capacitaciones y Matriz de identificacion de peligros y control de riesgos	Cumplimiento de 100% programa de capacitaciones	Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones programadas*100%	100%		Semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% Cobertura de las Capacitaciones	Trabajadores capacitados/Trabajadores programados x100	80%		Semestral	86%	86%	100%	100%	100%	100%

OBSERVACION:

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 3

EXÁMENES OCUPACIONALES

MEDICINA LABORAL EL TREBOL IPS

CENTRO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
NIT. 901045839-4
Según resolución 2346 de 2007 y 4272 de 2021-
Av. Cra 68 No 45-21 Zona industrial
Linea telefónica 321-480-51-18 de 2pm a 4 pm
medilabeltrebol@gmail.com
confirma autenticidad en medicinalaboraleltrebolips.com
resoluciones en la página web CLAVE resoluciones 2022

CONCEPTO OCUPACIONAL			
POST INCAPACIDAD		INGRESO	
ENFASIS CARDIOVASCULAR		EGRESO	
ESPACIOS CONFINADOS	X	PERIODICO	X
PRE-OCUPACIONAL		REINTEGRO	
ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR		ALTURAS	X

DATOS DEL PACIENTE

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE: DIANA YAZMIN CASTILLO HERNANDEZ	EDAD: 31 AÑOS	RH: B+
IDENTIFICACION: 1078347869	EPS:	ARL:
EMPRESA: JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.S	NIT: 900505840-3	CARGO: INSPECTOR HSEQ

ANTECEDENTES LABORALES: **ENFERMEDAD PROFESIONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES	ANTECEDENTES FAMILIARES
HOSPITALARIOS: NIEGA	DIABETES: NIEGA
QUIRURGICOS: NIEGA	HTA: NIEGA
PSIQUIATRICOS: NIEGA	HIPO-HIPER TIROIDISMO: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA	CANCER: NIEGA
OFTALMOLOGICOS: NIEGA	ASMA: NIEGA
OTROS: NIEGA	OTROS:NIEGA

PARACLINICO	EXAMEN FISICO
AUDIOMETRIA: NORMAL	T/A: 115/77 mHg
OSTEOMUSCULAR: TONO MUSCULAR Y EQUILIBRIO: CONSERVADOS	FC: 70 min
	FR: 20 min
OPTOMETRIA: NINGUNO	ESTATURA: 1.63 Mts
PSICOSENSOMETRICO: SIN ALTERACIONES NEUROLOGICAS	PESO: 65 KG
DERMATOLOGIA: SIN LESIONES	T°: 35.7°C
PERFIL LIPIDICO-GLICEMIA: NORMAL	OXIMETRIA: 98%
ESPIROMETRIA: NORMAL	

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL					
APTO PARA EL CARGO	SI		APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	
RESTRINGIDO		NO	REQUIERE RESTRICCIONES EN ACTIVIDADES		NO
CONDICIONAL		NO	SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO
APLAZADO		NO	APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	SI	

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

utilizar los elementos de protección personal, usar protección visual durante la jornada laboral, seguir las recomendaciones estrictas de medicina ocupacional, hacer periódicamente los exámenes de valoración ocupacional. El paciente no manifiesta signos ni síntomas relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo (sars-cov2) / no presenta morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID 19 según circular 030 del 2020.

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
R.E.G.80580567
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
Universidad de Manizales

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
MD ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FIRMA DEL TRABAJADOR EXAMINADO

Horario de atención de lunes a viernes de 7 am a 5 pm - sábados de 7 am a 3 pm - Domingos y Festivas de 8am a 11am.

MEDICINA LABORAL EL TREBOL IPS

CENTRO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
NIT. 901045839-4
Según resolución 2346 de 2007 y 4272 de 2021-
Av. Cra 68 No 45-21 Zona industrial
Línea telefónica 321-480-51-18 de 2pm a 4 pm
medilabeltrebol@gmail.com
confirma autenticidad en medicinalaboraleltrebolips.com
resoluciones en la página web CLAVE resoluciones 2022

CONCEPTO OCUPACIONAL			
POST INCAPACIDAD		INGRESO	X
ENFASIS CARDIOVASCULAR		EGRESO	
ESPACIOS CONFINADOS	X	PERIODICO	
PRE-OCUPACIONAL		REINTEGRO	
ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR		ALTURAS	X

DATOS DEL PACIENTE

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
NOMBRE: NEYDEL RINCON SANTANA		EDAD: 43 AÑOS	RH: A+
IDENTIFICACION: 3121594	EPS:	ARL:	
EMPRESA: JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.S	NIT: 900505840	CARGO: AYUDANTE	

ANTECEDENTES LABORALES: **ENFERMEDAD PROFESIONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES	ANTECEDENTES FAMILIARES
HOSPITALARIOS: NIEGA	DIABETES: NIEGA
QUIRURGICOS: NIEGA	HTA: NIEGA
PSIQUIATRICOS: NIEGA	HIPO-HIPER TIROIDISMO: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA	CANCER: NIEGA
OFTALMOLOGICOS: NIEGA	ASMA: NIEGA
OTROS: NIEGA	OTROS:NIEGA
PARACLINICO	**EXAMEN FISICO**
AUDIOMETRIA: NORMAL	T/A: 115/75 mHg
OSTEOMUSCULAR: TONO MUSCULAR Y EQUILIBRIO: CONSERVADOS	FC: 71 min
	FR: 20 min
OPTOMETRIA: NORMAL	ESTATURA: 1.71 Mts
PSICOSENSOMETRICO: SIN ALTERACIONES NEUROLOGICAS	PESO: 77 kg
DERMATOLOGIA: SIN LESIONES	T°: 35.5°C
PERFIL LIPIDICO-GLICEMIA: NORMAL	OXIMETRIA: 96%
ESPIROMETRIA: NORMAL	

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL					
APTO PARA EL CARGO	SI		APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	
RESTRINGIDO		NO	REQUIERE RESTRICCIONES EN ACTIVIDADES		NO
CONDICIONAL		NO	SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO
APLAZADO		NO	APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	SI	

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

utilizar los elementos de protección personal, usar protección visual durante la jornada laboral, seguir las recomendaciones estrictas de medicina ocupacional, hacer periódicamente los exámenes de valoración ocupacional. El paciente no manifiesta signos ni síntomas relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo (sars-cov2) / no presenta morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID 19 según circular 030 del 2020.

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
RNG.80589567
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
Universidad de Manizales

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
MD ESPECIALISTA EN SEGURIOAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HUELLA INDICE DERECHO

Neydel Rincon

FIRMA DEL TRABAJADOR EXAMINADO

Clinisur IPS Ltda. Salud Ocupacional

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000366793

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S FECHA 22/12/2022 08:21:25

PREOCUPACIONAL O INGRESO [x] POS-OCUPACIONAL O EGRESO [ ] PERIÓDICO [ ]

NOMBRE Y APELLIDO: WILMAN DAVID CENTENO SAYAS **C.C** 1023958971

EDAD 25 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** OFICIAL DE CONSTRUCCION



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	[x]	Exámenes de laboratorio	SI [x] NO [ ]
Visiometría	[x]	Glic [x] Col [x] Trigli [x] Otros [ ]	
Optometría	[ ]	¿Cuáles?	
Audiometría	[x]		
Espirometría	[ ]	Énfasis Osteomuscular	[x]
		Otros	[ ]

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO [x]
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO [ ]

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	[ ]	[x]	[ ]
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	[ ]	[ ]	[x]

RESTRICCIONES
NINGUNA

RECOMENDACIONES
PUEDE LABORAR EN ALTURAS
CONTROLES DE SALUD MEDICO EPS /USO DE EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR./REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS
DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 692 DEL 29 DE ABRIL DEL 2022.

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI [ ] NO [ ] ¿Cuál?

wilman

FIRMA DEL PACIENTE

Captura Biométrica

Anderson Y. Gómez Avila
Médico Cirujano Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
Licencia

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CALLE 27 SUR No 19-07 PBX.:2784705 FAX.:2392301Fax

CONSULTORIO MEDICO DR RAFAEL GOMEZ

NIT 72136178-9 BOGOTA DC TV 94 NO 82 A 64
PBX 4 90 80 94 CELULAR 314 425 37 12 – 3108136250 EMAIL –RAFAGOMEZ40@HOTMAIL.COM
LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL RES 2607/2018

FECHA DE EXAMENES MEDICOS	TIPO DE EXAMEN MEDICO
24/08/2023	☒Ingreso ☐Egreso ☐Periódico ☒Altura ☐ Osteomuscular

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE

Nombres: DIEGO JOSE			Apellidos: ANGULO BALLESTAS	
Razón social: JPZ			Celular: 3114984762	
Dirección: B/ ALPES LOC BOLIVAR		C.C: 986550	G.S RH:	
Genero: Masculino☒ Femenino ☐	Fecha de nacimiento: 08/01/1991	Edad en años: 32	EPS: CAPITAL SALUD	
			ARL:	AFP:

INFORMACION OCUPACIONAL CARGO ACTUAL A INGRESAR

Fecha ingreso a la empresa	Cargo:	Sección:	Antigüedad en el cargo 4 AÑOS
24/08/2023	OFICIAL DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION	no aplica para ingreso

CONSULTAS PROCEDIMIENTOS Y/O EXAMEN REALIZADOS

Consulta de Medicina Laboral, visiometría, audiometría, hemograma, colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, glicemia, espirometría.

CONSENTIMEINTO INFORMADO DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR

Autorizo al (a la) Dr. (a) abajo mencionado(a), a realizar en mi examen médico y/o paraclínicos ocupacionales, registrados en este documento. El profesional abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y el propósito del examen médico y paraclínico ocupacionales. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y riesgos del examen médico y paraclínicos ocupacionales. A partir de la asesoría brindada ante de las respectivas toma de pruebas. Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento antes que se realizaran los exámenes. Las respuestas dadas por mí en estos exámenes están completas y son verídicas. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

CONCEPTO OCUPACIONAL

☑ Apto sin restricciones ☐ Apto con restricciones ☐ Aplazado ☐ Apto con patologías que no generan restricción

☑ Apto para trabajo en alturas ☐ Apto para trabajar en el suelo ☐ Apto para manipular alimentos

RECOMENDACIONES

Ocupacionales
- ☐Capacitación según matriz de riego y peligros
- ☒Higiene postural
- ☒higiene biomédica integral
- ☒Pausas activas laborales
- ☒Uso de los EPP
- ☐Cultura de autocuidado

Medicas
- ☐Valoración por optometría
- ☐Valoración por medicina general EPS
- ☐Valoración por ARL
- ☐Valoración por medicina laboral
- ☐Valoración por nutricionista

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
- ☐para trabajo en altura y/o espacios confinados y/o manipulación de alimentos.

Sistema de vigilancia epidemiológica
- ☐SVE Salud auditiva (énfasis en protección auditiva)
- ☐SVE Cardiovascular
- ☐SVE en salud visual
- ☐Corrección óptica permanente
- ☐SVE en salud respiratoria
- ☐SVE mecánico

Hábitos y estilo de vida saludable
- ☒Ejercicio físico regular 3 veces por semana (acondicionamiento físico)
- ☒Énfasis en estiramientos integrales
- ☒Nutrición balanceada
- ☐Cesación de tabaquismo
- ☐reducción consumo de alcohol

CONDICIONES DE SALUD – CERTIFICO QUE EL PACIENTE ACTUALMENTE Y TENIENDO EN CUENTA LA CIRCULAR 0030 DE 8 DE MAYO DE 2020 NO PADECE ENFERMEDADES DE ALTO RIESGO PARA COVID 19. **PACIENTE SANO.**

Dr. Rafael A. Gómez
Médico Cirujano
R.M. 2002-97
DR. Rafael Alberto Gomez Conrado
Medico especialista en salud ocupacional
Especialista En Salud Ocupacional
L.S.O. 2607 DE 2018

X
Paciente
c.c 986550

Los hallazgos fueron consignados en la historia clínica que desarrolla los contenidos establecidos en la resolución 2346 de 2007

Notas:
1).Archive este informe en la hoja de vida del trabajador en el área de recursos humanos
2). *El contenido de la historia clínica ocupacional tiene carácter confidencial y su custodia está regida por la resolución 1918 del 05 de junio 2009 del cual se transcriben a continuación algunos aportes "La custodia de las evaluaciones medicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional estará a cargo de la persona prestador del servicio de salud ocupacional que la genero en curso de la atención, cumpliendo los requisitos y procedimientos de archivos conforme a las normas legales vigentes para la historia clínica.*
En ningún caso los empleadores podrán tener, conservar o anexar copia de las evaluaciones medicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional a la hoja de vida del trabajado
3). Este examen no reemplaza el realizado por indumil para porte de armas.

MEDICINA LABORAL EL TREBOL IPS

CENTRO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
NIT. 901045839-4
Según resalución 2346 de 2007 y 4272 de 2021-
Av. Cra 68 No 45-21 Zona industrial
Línea telefónica 321-480-51-18 de 2pm a 4 pm
medilabeltrebol@gmail.com
confirma autenticidad en medicinalaboraleltrebolips.com
resoluciones en lo página web CLAVE resoluciones 2022

CONCEPTO OCUPACIONAL			
POST INCAPACIDAD		INGRESO	X
ENFASIS CARDIOVASCULAR		EGRESO	
ESPACIOS CONFINADOS	X	PERIODICO	
PRE-OCUPACIONAL		REINTEGRO	
ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR		ALTURAS	X

DATOS DEL PACIENTE

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE: JOSE WILLIAM GARZON CABUYA		EDAD: 46 AÑOS	RH: O+
IDENTIFICACION: 80396967	EPS:	ARL:	
EMPRESA: JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.S	NIT: 900505840	CARGO: AYUDANTE	

ANTECEDENTES LABORALES: **ENFERMEDAD PROFESIONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES	ANTECEDENTES FAMILIARES
HOSPITALARIOS: NIEGA	DIABETES: NIEGA
QUIRURGICOS: NIEGA	HTA: NIEGA
PSIQUIATRICOS: NIEGA	HIPO-HIPER TIROIDISMO: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA	CANCER: NIEGA
OFTALMOLOGICOS: NIEGA	ASMA: NIEGA
OTROS: NIEGA	OTROS:NIEGA
PARACLINICO	**EXAMEN FISICO**
AUDIOMETRIA: NORMAL	T/A: 117/75 ml1g
OSTEOMUSCULAR: TONO MUSCULAR Y EQUILIBRIO: CONSERVADOS	FC: 70 min
	FR: 22 min
OPTOMETRIA: NORMAL	ESTATURA: 1.73 Mts
PSICOSENSOMETRICO: SIN ALTERACIONES NEUROLOGICAS	PESO: 79 kg
DERMATOLOGIA: SIN LESIONES	T°: 35.6°C
PERFIL LIPIDICO-GLICEMIA: NORMAL	OXIMETRIA: 97%
ESPIROMETRIA: NORMAL	

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO	SI		APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	
RESTRINGIDO		NO	REQUIERE RESTRICCIONES EN ACTIVIDADES		NO
CONDICIONAL		NO	SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO
APLAZADO		NO	APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	SI	

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

utilizar los elementos de protección personal, usar protección visual durante la jornada laboral, seguir las recomendaciones estrictas de medicina ocupacional, hacer periódicamente los exámenes de valoración ocupacional. El paciente no manifiesta signos ni síntomas relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo (sars-cov2) / no presenta morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID 19 según circular 030 del 2020.

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
REG.80589567
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
Universidad de Manizales

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
MD ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FIRMA DEL TRABAJADOR EXAMINADO

Horario de atención de lunes a viernes de 7 am a 5 pm - sábados de 7 am a 3 pm - Domingos y Festivos de 8am a 11am.

MEDICINA LABORAL EL TREBOL IPS

CENTRO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
NIT. 901045839-4
Según resolución 2346 de 2007 y 4272 de 2021-
Av. Cra 68 No 45-21 Zona industrial
Línea telefónica 321-480-51-18 de 2pm a 4 pm
medilabeltrebol@gmail.com
confirma autenticidad en medicinalaboraleltrebolips.com
resoluciones en la página web CLAVE resoluciones 2022

CONCEPTO OCUPACIONAL			
POST INCAPACIDAD		INGRESO	X
ENFASIS CARDIOVASCULAR		EGRESO	
ESPACIOS CONFINADOS	X	PERIODICO	
PRE-OCUPACIONAL		REINTEGRO	
ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR		ALTURAS	X

DATOS DEL PACIENTE

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE: MARCO ANTONIO CABALLERO ROMERO — EDAD: 63 AÑOS — RH: A+

IDENTIFICACION: 3250057 — EPS: — ARL:

EMPRESA: JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.S — NIT: 900505840 — CARGO: AYUDANTE

ANTECEDENTES LABORALES:

ENFERMEDAD PROFESIONAL:

ANTECEDENTES PERSONALES	ANTECEDENTES FAMILIARES
HOSPITALARIOS: NIEGA	DIABETES: NIEGA
QUIRURGICOS: NIEGA	HTA: NIEGA
PSIQUIATRICOS: NIEGA	HIPO-HIPER TIROIDISMO: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA	CANCER: NIEGA
OFTALMOLOGICOS: NIEGA	ASMA: NIEGA
OTROS: NIEGA	OTROS:NIEGA

PARACLINICO	EXAMEN FISICO
AUDIOMETRIA: NORMAL	T/A: 116/77 mHg
OSTEOMUSCULAR: TONO MUSCULAR Y EQUILIBRIO: CONSERVADOS	FC: 71 min
	FR: 21 min
OPTOMETRIA: NORMAL	ESTATURA: 1.65 Mts
PSICOSENSOMETRICO: SIN ALTERACIONES NEUROLOGICAS	PESO: 65 kg
DERMATOLOGIA: SIN LESIONES	T°: 35.5°C
PERFIL LIPIDICO-GLICEMIA: NORMAL	OXIMETRIA: 96%
ESPIROMETRIA: NORMAL	

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO	SI		APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	
RESTRINGIDO		NO	REQUIERE RESTRICCIONES EN ACTIVIDADES		NO
CONDICIONAL		NO	SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO
APLAZADO		NO	APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	SI	

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

utilizar los elementos de protección personal, usar protección visual durante la jornada laboral, seguir las recomendaciones estrictas de medicina ocupacional, hacer periódicamente los exámenes de valoración ocupacional. El paciente no manifiesta signos ni síntomas relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo (sars-cov2) / no presenta morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID 19 según circular 030 del 2020.

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
C.C.80589567
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
Universidad de Manizales

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
MD ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FIRMA DEL TRABAJADOR EXAMINADO

MEDICINA LABORAL EL TREBOL IPS

CENTRO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
NIT. 901045839-4
Según resolución 2346 de 2007 y 4272 de 2021-
Av. Cra 68 No 45-21 Zona industrial
Linea telefónica 321-480-51-18 de 2pm a 4 pm
medilabeltrebol@gmail.com
confirma autenticidad en medicinalaboraleltrebolips.com
resoluciones en la página web CLAVE resoluciones 2022

CONCEPTO OCUPACIONAL			
POST INCAPACIDAD		INGRESO	X
ENFASIS CARDIOVASCULAR		EGRESO	
ESPACIOS CONFINADOS	X	PERIODICO	
PRE-OCUPACIONAL		REINTEGRO	
ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR		ALTURAS	X

DATOS DEL PACIENTE

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE: DUBAN JOSE DIAZ ARREGOCES		EDAD: 24 AÑOS	RH: O+
IDENTIFICACION: 1192798347	EPS:	ARL:	
EMPRESA: JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.S	NIT: 900505840-3	CARGO: AYUDANTE	

ANTECEDENTES LABORALES: **ENFERMEDAD PROFESIONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES	ANTECEDENTES FAMILIARES
HOSPITALARIOS: NIEGA	DIABETES: NIEGA
QUIRURGICOS: NIEGA	HTA: NIEGA
PSIQUIATRICOS: NIEGA	HIPO-HIPER TIROIDISMO: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA	CANCER: NIEGA
OFTALMOLOGICOS: NIEGA	ASMA: NIEGA
OTROS: NIEGA	OTROS:NIEGA
PARACLINICO	**EXAMEN FISICO**
AUDIOMETRIA: NORMAL	T/A: 118/77 mHg
OSTEOMUSCULAR: TONO MUSCULAR Y EQUILIBRIO: CONSERVADOS	FC: 71 min
OPTOMETRIA: NORMAL	FR: 20 min
PSICOSENSOMETRICO: SIN ALTERACIONES NEUROLOGICAS	ESTATURA: 1. 71 CMS
DERMATOLOGIA: SIN LESIONES	PESO: 76 KG
PERFIL LIPIDICO-GLICEMIA: NORMAL	T°: 35.7°C
ESPIROMETRIA: NORMAL	OXIMETRIA: 97%

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO		SI	APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	
RESTRINGIDO		NO	REQUIERE RESTRICCIONES EN ACTIVIDADES		NO
CONDICIONAL		NO	SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO
APLAZADO		NO	APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	SI	

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

utilizar los elementos de protección personal, usar protección visual durante la jornada laboral, seguir las recomendaciones estrictas de medicina ocupacional, hacer periódicamente los exámenes de valoración ocupacional. El paciente no manifiesta signos ni síntomas relacionados con el sindrome respiratorio agudo severo (sars-cov2) / no presenta morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID 19 según circular 030 del 2020.

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
REG.80589567
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
Universidad de Manizales

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
MD ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HUELLA INDICE DERECHO

FIRMA DEL TRABAJADOR EXAMINADO

Horario de atención de lunes a viernes de 7 am a 5 pm - sábados de 7 am a 3 pm - Domingos y Festivos de 8am a 11am.

MEDICINA LABORAL EL TREBOL IPS

CENTRO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
NIT. 901045839-4
Según resolución 2346 de 2007 y 4272 de 2021-
Av. Cra 68 No 45-21 Zona industrial
Línea telefónica 321-480-51-18 de 2pm a 4 pm
medilabeltrebol@gmail.com
confirma autenticidad en medicinalaboraleltrebolips.com
resoluciones en la página web CLAVE resoluciones 2022

CONCEPTO OCUPACIONAL			
POST INCAPACIDAD		INGRESO	X
ENFASIS CARDIOVASCULAR		EGRESO	
ESPACIOS CONFINADOS	X	PERIODICO	
PRE-OCUPACIONAL		REINTEGRO	
ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR		ALTURAS	X

DATOS DEL PACIENTE

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
NOMBRE: MARCO AURELIO CANO GARCIA	EDAD: 39 AÑOS	RH: O+
IDENTIFICACION: 72290019	EPS:	ARL:
EMPRESA: JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.S	NIT: 900505840-3	CARGO: AYUDANTE

ANTECEDENTES LABORALES: **ENFERMEDAD PROFESIONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES	ANTECEDENTES FAMILIARES
HOSPITALARIOS: NIEGA	DIABETES: NIEGA
QUIRURGICOS: NIEGA	HTA: NIEGA
PSIQUIATRICOS: NIEGA	HIPO-HIPER TIROIDISMO: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA	CANCER: NIEGA
OFTALMOLOGICOS: NIEGA	ASMA: NIEGA
OTROS: NIEGA	OTROS:NIEGA

PARACLINICO	EXAMEN FISICO
AUDIOMETRIA: NORMAL	T/A: 114/73 mHg
OSTEOMUSCULAR: TONO MUSCULAR Y EQUILIBRIO: CONSERVADOS	FC: 72 min
OPTOMETRIA: NORMAL	FR: 21 min
PSICOSENSOMETRICO: SIN ALTERACIONES NEUROLOGICAS	ESTATURA: 1. 67 CMS
DERMATOLOGIA; SIN LESIONES	PESO: 83 KG
PERFIL LIPIDICO-GLICEMIA: NORMAL	T°: 35.6°C
ESPIROMETRIA: NORMAL	OXIMETRIA: 96%

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO		SI	APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	
RESTRINGIDO		NO	REQUIERE RESTRICCIONES EN ACTIVIDADES		NO
CONDICIONAL		NO	SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO
APLAZADO		NO	APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	SI	

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

utilizar los elementos de protección personal, usar protección visual durante la jornada laboral, seguir las recomendaciones estrictas de medicina ocupacional, hacer periódicamente los exámenes de valoración ocupacional. El paciente no manifiesta signos ni síntomas relacionados con el sindrome respiratorio agudo severo (sars-cov2) / no presenta morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID 19 según circular 030 del 2020.

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
REG.80589567
especialista en seguridad y salud en el trabajo
Universidad de Manizales

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
MD ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Marco Cano
FIRMA DEL TRABAJADOR EXAMINADO

Horario de atención de lunes a viernes de 7 am a 5 pm - sábados de 7 am a 3 pm - Domingos y Festivos de 8am a 11am.

MEDICINA LABORAL EL TREBOL IPS

CENTRO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
NIT. 901045839-4
Según resolución 2346 de 2007 y 4272 de 2021-
Av. Cra 68 No 45-21 Zona industrial
Linea telefónica 321-480-51-18 de 2pm a 4 pm
medilabeltrebol@gmail.com
confirma autenticidad en medicinalaboraleltrebolips.com
resoluciones en la página web CLAVE resoluciones 2022

CONCEPTO OCUPACIONAL			
POST INCAPACIDAD		INGRESO	X
ENFASIS CARDIOVASCULAR		EGRESO	
ESPACIOS CONFINADOS	X	PERIODICO	
PRE-OCUPACIONAL		REINTEGRO	
ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR		ALTURAS	X

DATOS DEL PACIENTE

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE: SERGIO DAVID HUERTAS MARTINEZ		EDAD: 19 AÑOS	RH: B+
IDENTIFICACION: 1027521090	EPS:	ARL:	
EMPRESA: JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.S	NIT: 900505840-3	CARGO: AYUDANTE	

ANTECEDENTES LABORALES: **ENFERMEDAD PROFESIONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES	ANTECEDENTES FAMILIARES
HOSPITALARIOS: NIEGA	DIABETES: NIEGA
QUIRURGICOS: NIEGA	HTA: NIEGA
PSIQUIATRICOS: NIEGA	HIPO-HIPER TIROIDISMO: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA	CANCER: NIEGA
OFTALMOLOGICOS: NIEGA	ASMA: NIEGA
OTROS: NIEGA	OTROS:NIEGA

PARACLINICO	EXAMEN FISICO
AUDIOMETRIA: NORMAL	T/A: 115/75 mHg
OSTEOMUSCULAR: TONO MUSCULAR Y EQUILIBRIO: CONSERVADOS	FC: 72 min
OPTOMETRIA: NORMAL	FR: 21 min
PSICOSENSOMETRICO: SIN ALTERACIONES NEUROLOGICAS	ESTATURA: 1. 65 CMS
DERMATOLOGIA: SIN LESIONES	PESO: 67 KG
PERFIL LIPIDICO-GLICEMIA: NORMAL	T°: 35.4°C
ESPIROMETRIA: NORMAL	OXIMETRIA: 98%

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO		SI	APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	
RESTRINGIDO		NO	REQUIERE RESTRICCIONES EN ACTIVIDADES		NO
CONDICIONAL		NO	SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO
APLAZADO		NO	APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	SI	

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

utilizar los elementos de protección personal, usar protección visual durante la jornada laboral, seguir las recomendaciones estrictas de medicina ocupacional, hacer periódicamente los exámenes de valoración ocupacional. El paciente no manifiesta signos ni síntomas relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo (sars-cov2) / no presenta morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID 19 según circular 030 del 2020.

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
C.C.8058956?
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
Universidad de Manizales

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
MD ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sergio

FIRMA DEL TRABAJADOR EXAMINADO

Horario de atención de lunes a viernes de 7 am a 5 pm - sábados de 7 am a 3 pm - Domingos y Festivos de 8am a 11am.

MEDICINA LABORAL EL TREBOL IPS

CENTRO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
NIT. 901045839-4
Según resolución 2346 de 2007 y 4272 de 2021-
Av. Cra 68 No 45-21 Zona industrial
Línea telefónica 321-480-51-18 de 2pm a 4 pm
medilabeltrebol@gmail.com
confirma autenticidad en medicinalaboraleltrebolips.com
resoluciones en la página web CLAVE resoluciones 2022

CONCEPTO OCUPACIONAL			
POST INCAPACIDAD		INGRESO	X
ENFASIS CARDIOVASCULAR		EGRESO	
ESPACIOS CONFINADOS	X	PERIODICO	
PRE-OCUPACIONAL		REINTEGRO	
ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR		ALTURAS	X

DATOS DEL PACIENTE

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE: CARLOS EDUARDO HUERTAS MARTINEZ		EDAD: 28 AÑOS	RH: O+
IDENTIFICACION: 1031157773	EPS:	ARL:	
EMPRESA: JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.S	NIT: 900505840-3	CARGO: AYUDANTE	

ANTECEDENTES LABORALES: **ENFERMEDAD PROFESIONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES	ANTECEDENTES FAMILIARES
HOSPITALARIOS: NIEGA	DIABETES: NIEGA
QUIRURGICOS: NIEGA	HTA: NIEGA
PSIQUIATRICOS: NIEGA	HIPO-HIPER TIROIDISMO: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA	CANCER: NIEGA
OFTALMOLOGICOS: NIEGA	ASMA: NIEGA
OTROS: NIEGA	OTROS:NIEGA
PARACLINICO	**EXAMEN FISICO**
AUDIOMETRIA: NORMAL	T/A: 113/72 mHg
OSTEOMUSCULAR: TONO MUSCULAR Y EQUILIBRIO: CONSERVADOS	FC: 7 min
OPTOMETRIA: NORMAL	FR: 20 min
PSICOSENSOMETRICO: SIN ALTERACIONES NEUROLOGICAS	ESTATURA: 1. 63 CMS
DERMATOLOGIA: SIN LESIONES	PESO: 65 KG
PERFIL LIPIDICO-GLICEMÍA: NORMAL	T°: 35.5°C
ESPIROMETRIA: NORMAL	OXIMETRIA: 97%

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO		SI	APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	
RESTRINGIDO		NO	REQUIERE RESTRICCIONES EN ACTIVIDADES		NO
CONDICIONAL		NO	SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO
APLAZADO		NO	APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	SI	

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

utilizar los elementos de protección personal, usar protección visual durante la jornada laboral, seguir las recomendaciones estrictas de medicina ocupacional, hacer periódicamente los exámenes de valoración ocupacional. El paciente no manifiesta signos ni síntomas relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo (sars-cov2) / no presenta morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID 19 según circular 030 del 2020.

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
R.G.80589567
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
Universidad de Manizales

ALEXANOER NARVAEZ PAEZ
MD ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Carlos Huertas
FIRMA DEL TRABAJADOR EXAMINADO

HUELLA INDICE DERECHO

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 4

NOTIFICACIÓN EXAMEN DE RETIRO

Para el mes de septiembre no se retiró personal en obra

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 5

CONTROL DE PERSONAL

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	FECHA DE EXAMEN MEDICO	FECHA DE CURSO DE ALTURAS	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	INDUCCION Y NOTIFICACION DE RIESGO	CONTRATISTA	FECHA DE RETIRO
José Alfonso Herrera	86052493	Oficial	5ura	Nueva eps	Colpensiones	2/05/2023	N/A	5/05/2023	si	Bs ingeneria	Activo
Viviana Pulgarin Garcia	79952110	Asesor SST	Sura	Alian salud	Colpensiones	16/08/2022	N/A	Abril	si	Bs ingeneria	Activo
Fabián Bohórquez Lesmes	29674796	Director de Obra	Sura	Sanitas	Porvenir	3/05/2023	N/A	Abril	si	Bs ingeneria	Activo
Sandra Milena López Pérez	52716243	Residente De obra	5ura	Compensar	Colpensiones	12/05/2023	N/A	Abril	si	Bs ingeneria	Activo
Carlos Martínez	1122723202	Licitación	Sura	5anitas	Colfondos	27/12/2022	N/A	Abril	si	Bs ingeneria	Activo
Yilber Vargas	1031135149	Inspector	Sura	Famisanar	Porvenir	12/05/2023	N/A	25/05/2023	si	Bs ingeneria	Activo
Edilberto Cruz 5anta	1106780087	Apoyo	Sura	Famisanar	Porvenir	12/05/2023	N/A	25/05/2023	si	Bs ingeneria	Activo
Aldimer Bolaños	1030686139	Ayudante	Sura	Compensar	Proteccion	14/08/2023	N/A	11/08/2023	si	Bs ingeneria	Activo
Juan camilo tellez	1003824593	Ayudante	Sura	Compensar	Porvenir	14/08/2023	N/A	11/08/2023	si	Bs ingeneria	Activo
Henry Delgado	1897266	Ayudante	5ura	Famisanar	porvenir	14/08/2023	N/A	14/12/2022	si	Bs ingeneria	Activo
Sonia Patricia	24167471	Almacenista	Sura	Famisanar	Colfondos	16/08/2023	N/A	14/12/2023	si	Bs ingeneria	Activo
Comision topografica											
Dayana Tibavija	1057601521	Topografia	Sura	Nueva eps	Porvenir	28/08/2023	N/A	28/08/2023	si	Bs ingeneria	Activo
Jose Bayardo Rios	321267S	Auxil topo	Sura	Famisanar	Porvenir	28/08/2023	N/A	28/08/2023	si	Bs ingeneria	Activo

425

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	FECHA DE EXAMEN MEDICO	FECHA DE CURSO DE ALTURAS	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	Contratistas	INDUCCION Y NOTIFICACION DE RIESGO	FECHA DE RETIRO
Jorge Herrera	10025130	Asesor Estructural	Sura	Aliansalud	Colpensiones	Pendiente entrega por solicitud de realización examen	N/A	Abril	Asesor Externo	si	Activo
Nelki Buitrago	6422497	Especialista en Redes Electricas.voz y datos	Positiva	Salud total	Colpensiones	Pendiente entrega por solicitud de realización examen	N/A	Abril	Asesor Externo	si	Activo
Juan Sebastián de Plaza Solórzano	1032359946	Especialista en redes Hidráulicos, Sanitarias y de Gas	Sura	Sanitas	Porvenir	Pendiente entrega por solicitud de realización examen	N/A	Abril	Asesor Externo	si	Activo
Oscar Javier Pardo Moreno	12198722	Asesor Geotecnia	Sura	Compensar	Porvenir	Pendiente entrega por solicitud de realización examen	N/A	Abril	Asesor Externo	si	Activo

OPERARIOS MAQUINARIA EN OBRA											
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**FECHA DE EXAMEN MEDICO**	**FECHA DE CURSO DE ALTURAS**	**FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA**	**INDUCCION Y NOTIFICACION DE RIESGO**	**CONTRATISTA**	**FECHA DE RETIRO**
Harriman Antonio Torres	11210895	Operario Vibro	Sura	Famisanar	Proteccion	16/01/2023	N/A	18/07/2023	si	Miguel Blanco	Activo
Cristian BInco	1073527245	Operario minicargador	5ura	Compensar	Porvenir	2/10/2022	N/A	26/07/2023	si	Miguel Blanco	Activo
Fabian Beltran	10543722726	Operario mini retro excavadora	Sura	Famisanar	Porvenir	22/08/2023	N/A	22/08/2023	si	Independiente	Activo

424

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	FECHA DE EXAMEN MEDICO	FECHA DE CURSO DE ALTURAS	FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	CONTRATISTA	INDUCCION Y NOTIFICACION DE RIESGO	FECHA DE RETIRO
Luis Miguel Madarriaga	1100401076	Oficial Extructura	colpatria	nueva eps	porvenir	11/10/2022	15/10/2023	28/08/2023	JPZ	si	Activo
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargado Extructura	colpatria	sura	protecion	19/12/2022	20/11/2023	28/08/2023	JPZ	si	Activo
Jeeifri Carrasco	1102861240	Oficial Extructura	colpatria	Salud total	porvenir	24/08/2023	26/08/2023	28/08/2023	JPZ	si	Activo
Manuel Enrique Mejía	1079656576	Oficial Extructura	colpatria	Salud total	porvenir	18/01/2023	19/02/2023	28/08/2023	JPZ	si	Activo
John Fredy Montenegro	1033755912	Oficial Extructura	colpatria	Nueva eps	porvenir	24/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	JPZ	si	Activo
Andrés Arrollo de la hoz	73563565	Oficial Extructura	colpatria	Nueva eps	Colpensiones	24/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	JPZ	si	Activo
Arcenio Mora Meza	73564982	Oficial Extructura	colpatria	Famisanar	Colpensiones	22/09/2023	N/A	28/08/2023	JPZ	si	Activo
Yoibin Orlandez Quiñones	1004200332	Oficial Extructura	colpatria	Famisanar	porvenir	23/11/2023	19/11/2022	28/08/2023	JPZ	si	Activo
Yiver Enrique centeno	1023931435	Oficial Extructura	colpatria	Famisanar	porvenir	21/10/2022	25/08/2023	28/08/2023	JPZ	si	Activo
Diana Castillo Hernandez	1078347869	Oficial Extructura	colpatria	Sanitas	Proteccion		23/08/2023		JPZ	si	Activo
Neyder Rincon	3121594	Ayudante Extructura	colpatria	Salud Total	porvenir		N/A		JPZ	si	Activo
Wilmar David Centeno	1023958971	Oficial Extructura	colpatria	Nueva eps	porvenir		N/A		JPZ	si	Activo
Diego Jose Angulo	986550	Oficial Extructura	colpatria	Sanitas	Proteccion		N/A		JPZ	si	Activo

826

Jose William Garzon	80396967	ayudante Extructura	colpatria	Sanitas	porvenir	19/09/2023	N/A	20/09/2023	JPZ	si	Activo
Marco Antonio Caballero	3250057	Oficial Extructura	colpatria	Nueva eps	porvenir	27/09/2023	N/A	20/09/2023	JPZ	si	Activo
Duvan Jose Diaz	1192798347	Oficial Extructura	colpatria	Nueva eps	porvenir	27/09/2023	N/A	20/09/2023	JPZ	si	Activo
Marco Aurelio Cano	72290019	Oficial Extructura	colpatria	Sura	porvenir	27/09/2023	N/A	20/09/2023	JPZ	si	Activo
Sergio David Huertas	1027521090	Oficial Extructura	colpatria	Nueva eps	porvenir	27/09/2023	N/A	20/09/2023	JPZ	si	Activo
Carlos Eduardo Huertas	1031157773	Oficial Extructura	colpatria	Sanitas	porvenir	27/09/2023	N/A	20/09/2023	JPZ	si	Activo

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 6

DOCUMENTACIÓN PERSONAL

INGRESO SEPTIEMBRE

DOCUMENTACIÓN PERSONAL INGRESO SEPTIEMBRE

JPZ estructura				
	NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**
1	Diana Castillo Hernández	1078347869	Inspectora SST	JPZ
2	Neyder Rincón Santana	3121594	Ayudante	JPZ
3	Wilmar David Centeno	1023958971	Oficial	JPZ
4	Diego José Angulo Ballesta	986550	Oficial	JPZ
5	José William Garzón	80396967	Oficial	JPZ
6	Marco Antonio Caballero	3250057	Ayudante	JPZ
7	Duván José Diaz Arregocés	1192798347	Ayudante	JPZ
8	Marco Aurelio Cano	72290019	Ayudante	JPZ
9	Sergio David Huertas	1027521090	Ayudante	JPZ
10	Carlos Eduardo Huertas	1031157773	Ayudante	JPZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.078.347.869
CASTILLO HERNANDEZ
APELLIDOS
DIANA YAZMIN
NOMBRES

Diana Yazmin C
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 27-FEB-1992
SUESCA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

11-MAR-2010 SUESCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1525900-00347740-F-1078347869-20111129 0028563745A 1 37011721

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900505840
Número Afiliación:	272963
Razón social:	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1078347869
Nombre:	DIANA YAZMIN CASTILLO HERNANDEZ
Fecha Ingreso:	08/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	11011
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	7/9/2023 2:36:21 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005. República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

790711587

Fecha de Radicación: 07 09 2023

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lee las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente X B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS):

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
CASTILLO	HERNANDEZ	DIANA	YAZMIN

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1078347869	Femenino X Masculino	27 02 1992

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo: Condición:		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
AXA COLPATRIA	PROTECCION	1160000

18. Residencia Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
AV 68 N 41 60		2224811	DIANACASTILLO@GMAIL.COM

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana X Rural [ ]	SALITRE	BOGOTA D.C.

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	27. Sexo: Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C	EPS SANITAS CENTRO MEDICO NORTE	
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S	N [ ] T [ ] [ ] [ ]	900505840	

434

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y carrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [X] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliadas adicionales
- [ ] 9. Inicia da relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la ralación laboral o pérdida de las condicianes para seguir cotizanda
- [ ] 11. Vinculación a une entidad autarizada para realizar afiliaciones calectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autarizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Cantributiva — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimienta
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Repane da la calidad de Pensionada

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicas de identificación

Primer apellido	Segunda apellida	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documenio de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de Rsdicación	42. Fecha
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]		[ ] / [ ]		07 09 2023

43. EPS Anterior	44. Motiva de Traslado — Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica da las beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afillarse al Régimen Contributivo, Especial a de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existancia de razonas de fuerza mayar o casa fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración da NO intarnación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliadas adicionales en una Institución Prestadora de Servicias de Salud
- [X] 50. Autarización para que la E.P.S. solicita y obtanga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus benaficiarias a afiliados adicianales
- [X] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación a del reporte de navedades a la basa de datos de afiliadas vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requiaran
- [X] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del catizante a cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliadas adicianales, de acuerda can la previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreta 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico a al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia a beneficiaria	55. El Empleador, aportante o entidad respensable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Diana castillo hernandez	

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documenta de identidad — Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] — Total [ ]

- [ ] 57. Capia del dictamen de incapacidad permanente emitida por la autaridad campetente
- [ ] 58. Copia dal Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declara el divarcia, Sentancia Judicial que declare la saparación de cuerpas y Escritura Púbuca, Acta de Cancilación o Sentancia Judicial que declara la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificada de Adopeión a Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial a del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificada de Defunción de los padres a la Declaración suscrita por al cotizante sabre la ausancia de los dos padres
- [ ] 63. Copia da la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autarizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo a Providancia de las autoridades competentes en la que canste la calidad de beneficiaria a se ordena la afiliación de aficia

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
001	11				07 09 2023	

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de dacumento de identidad	Número del decumento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ][ ][ ][ ][ ]		

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker procesamiento
ASESORES COMERCIALES INTEGRALES LIMITADA. C.C. No. 900.282.038	EPS SANITAS RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN POR LA EPS. Recibido por: A.C.I. Fecha: 07-09-2023	

435

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CASTILLO HERNANDEZ DIANA YAZMIN** identificado(a) con **CC** número **1.078.347.869** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 04 de enero de 2011 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 07 de septiembre de 2023.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

436

Gobernación de CUNDINAMARCA
/Cundinamarcadigital @Cundinamarcadigital

RESOLUCIÓN No 25-5274 DE 2015
(14 DE OCTUBRE DE 2015)
"Por la cual se otorga Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a DIANA YAZMIN CASTILLO HERNANDEZ"

EL DIRECTOR DE DESARROLLO DE SERVICIOS
DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

En uso de la Delegación conferida por el Secretario de Salud de Cundinamarca mediante Resolución 0030 del 04 de febrero de 2013, la Ley 1562 de 2012, y la Resolución No. 04502 del 28 de diciembre de 2012, emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1562 de 2012, en su artículo 23, asignó directamente la competencia para otorgar y renovar las licencias para la prestación de servicios de salud ocupacional a las entidades departamentales y distritales de salud, en los siguientes términos: *"Licencias en Salud Ocupacional. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará en el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de Licencias en salud ocupacional a las personas naturales y jurídicas, que como mínimo deben comprender: requisitos, experiencia, campo de acción de acuerdo a su profesión, cobertura nacional y departamental, formación académica, y vigencia de la licencia.* ***La expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional estará a cargo de las entidades departamentales y distritales de salud".***

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución número 004502 del 28 de diciembre de 2012, expidió la reglamentación del procedimiento y requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional, y a su vez, el Secretario de Salud de Cundinamarca, mediante Resolución 0030 del 04 de febrero de 2013, delegó en el Director de Desarrollo de Servicios de Salud, la competencia para la expedición en primera instancia de los actos administrativos mediante los cuales se otorgue y renueve la licencia para la prestación de servicios de salud ocupacional.

Que DIANA YAZMIN CASTILLO HERNANDEZ identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.1.078.347.869, ha formulado solicitud escrita, para obtener licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual ha acompañado los documentos de que trata el artículo segundo de la Resolución 04502 del 28 de diciembre de 2012, emanada del Ministerio de Salud y Protección Social.

La Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, considera procedente otorgar la respectiva licencia para la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar licencia para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a DIANA YAZMIN CASTILLO HERNANDEZ identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.1.078.347.869, quien de acuerdo al perfil profesional como: TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL,EN EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, en las áreas de:

-EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Gobernación de CUNDINAMARCA
/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

RESOLUCIÓN No 25-5274 DE 2015
(14 DE OCTUBRE DE 2015)
"Por la cual se otorga Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a DIANA YAZMIN CASTILLO HERNANDEZ"

- EDUCACIÓN
- CAPACITACIÓN

PARÁGRAFO: La licencia de que trata el presente artículo tiene el carácter de personal e intransferible y validez en todo el territorio nacional, acorde con el inciso primero del artículo 6º de la Resolución 004502 del 28 de diciembre de 2012.

ARTICULO SEGUNDO: La licencia para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se otorga mediante la presente Resolución se concede por el término diez (10) años y podrá ser renovada por término igual, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en la normatividad vigente al momento de la renovación.

ARTICULO TERCERO: Toda la prestación de servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el titular de esta licencia preste a Instituciones Públicas o Privadas deberá estar acompañada de una (1) copia de la presente Resolución que acredita el otorgamiento de su respectiva licencia.

ARTICULO CUARTO: El titular de la licencia, deberá cumplir en el ejercicio de sus actividades con las normas legales, técnicas, éticas y de control de garantía de calidad para la prestación de servicios de salud ocupacional que para tal fin expida la autoridad competente.

ARTICULO QUINTO: La Secretaria de Salud de Cundinamarca, en cabeza de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, vigilará y controlará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución 004502 del 28 de diciembre de 2012, e impondrá las sanciones que acarreen su incumplimiento, sin detrimento de las demás sanciones que pueden derivarse de la transgresión a las normas legales vigentes.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Desarrollo de Servicios y el subsidio apelación ante el Secretario de Salud de Cundinamarca, en los términos y condiciones del artículo 13 de la Resolución 004502 del 28 de diciembre de 2012, en concordancia con el artículo 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá a los 14 días del mes de Octubre de 2015

JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO
Director de Desarrollo de Servicios de Salud

Elaboró. Esmeralda Ruiz G. / Octubre de 2015
Revisó. Claudia Hernandez R. / Octubre de 2015

438

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN
PIC VIRTUAL

AXA COLPATRIA
reinventando / los seguros

CERTIFICA QUE

DIANA YAZMIN CASTILLO HERNANDEZ
Con C.C. Nº 1.078.347.869

Asistió a la capacitación de

Certificación de capacitación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG–SST)

El dia 04 de Marzo de 2019 con una intensidad de 50 horas

Codigo: RCO-0004

ARL AXA COLPATRIA

439

NO ACREDITACION
18-CPR-002

Centro De Formación y Entrenamiento

PSM VERTICKAL SAS
NIT. 900905747 - 2

PROVEDOR No.08SE2020220000000040245-202012-03

AB CONSTRUYENDO SAS
Empresa NIT. 900974710-5
Representante Legal
MARIA ANGELICA BELTRAN GARCIA

Hace constar que:

ARL SURAMERICANA
Empresa administradora de riesgos laborales

DIANA YAZMIN CASTILLO HERNANDEZ

Con Cedula de Ciudadanía No.**1078347869**

CURSO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS

EN ACTUALIZACION DE COORDINADOR PARA TRABAJO EN ALTURAS

Con una intensidad de 16 Horas.

Realizado los días 19 Y 20 de agosto del 2023 en la ciudad de Bogotá D.C

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Res. 4272 del 2021 NTC-6072

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. el día 20 de Agosto de 2023

ALBA MERY ORTIZ
Representante Legal
PSM VERTICKAL TSA SAS
NIT 900.905. 747-2

EMANUEL DELGADO OJITO
C.C: 1014232001
Licencia en SO -5330-20/20

NOVUS ORDO CERTIFICARE **CELAC** Trabajo en Alturas NTC 6072 No. 30.370-1

Aprobación. MT.
No. 08SE2020220000000040245
2020/12/03

Verificación y Autenticidad del Certificado: psm.vertickal@gmail.com/www.psmvertickal.com
322 452 5330 749 8581 Av Americas No. 68B - 61 Bogota D.C. / Colombia

440

POSITIVA

POSITIVA EDUCA
Formación y crecimiento personal

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Mediante registro RCO-002 del Ministerio de Trabajo, que avala
el proceso de formación acorde con la Circular 063 de 2020

y en su nombre

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Certifican que

DIANA YAZMIN CASTILLO HERNÁNDEZ

Identificado(a) con documento de identidad No CC1078347869

Cursó y aprobó satisfactoriamente el curso de

Curso 20 horas del SG-SST - Actualización del proceso educativo virtual

Realizado con una intensidad horaria de 20 horas.
Luego de cumplir con las actividades programadas y reunir los requisitos que exigen las normas académicas se firma en Bogotá, Colombia, el 28 de febrero de 2022

CAMILO EUSEBIO GÓMEZ CRISTANCHO
Vicepresidente de Promoción y Prevención
de Positiva Compañía de Seguros

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

Positiva Compañía de Seguros · Positiva.col · Positivate.col · Positiva Colombia

El emprendimiento es de todos · Minhacienda


441

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
3121594
NUMERO

RINCON SANTANA
APELLIDOS


NEYDEL
NOMBRES

Neydel Rincon S
FIRMA

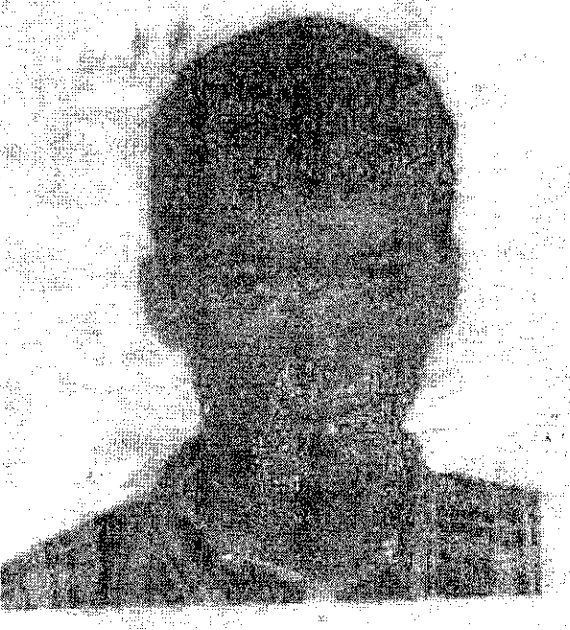

Powered by CamScanner

JP2



10-JUN-1960

PAME

(CUNDINAMARCA)

1.71 A+ M

27-ABR-2009 PAME

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900505840
Número Afiliación:	272963
Razón social:	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	3121594
Nombre:	NEYDEL RINCON SANTANA
Fecha Ingreso:	20/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	11011
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	19/9/2023 12:06:48 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4011003371	1|9|0|9|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion		3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
RINCON (Primer apellido)	SANTANA (Segundo apellido)	NEYDEL (Primer nombre)	(Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	3121594	Femenino ☐ Masculino ☒	1|0|0|6|1|9|8|0

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad		13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M	Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	COLFONDOS	1160000

18.Residencia			
CL 11 88 66 (Dirección)	7765434 (Telefono fijo)	(Telefono celular)	NEYDEYL@GMAIL.COM (Correo electronico)
SAN CAYETANO (Municipio/Distrito)	zona Urbana ☒ Rural ☐	11 (Localidad / comuna)	CUNDINAMARCA (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN OE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad			Condición	
			F	Tipo N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia					33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA S. CAYETANO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA S. CAYETANO	HOCAYETANO - HOCAYETANO
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES SAS	NIT	900505840	01

39.Ubicación				
CR 21 ND 159 13 (Dirección)	4732047 (Teleéfono)	SANDRADIAZL@HOTMAIL.COM (Correo electrónico)	BOGOTA (Municipio/distrito)	BOGOTA (Departamento)

445

No de Radicacion
4011003371

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados edicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizande
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		2|0|0|9|2|0|2|3

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia ecenérnica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributve,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- 52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicienales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Nayde Zincon	

IX. ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐ Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divercio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copie orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita per el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Neclonal de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADDS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Auterizacienes, asi como la veracidad de las demás información registrada.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

NEYDEL RINCON SANTANA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **3.121.594**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 19 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

447

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 1.023.958.971
CENTENO SAYAS

NOMBRES
WILMAN DAVID

FIRMA
wilman David



JP2




FECHA DE NACIMIENTO 10-MAR-1997
SAN MARTIN DE LOBA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

24-MAR-2015 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



448

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900505840
Número Afiliación:	272963
Razón social:	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1023958971
Nombre:	WILMAN DAVID CENTENO SAYAS
Fecha Ingreso:	20/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	11011
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	19/9/2023 12:33:20 PM

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 19/09/2023, el empleador JESUS PEREZ ZORRO identificado con NIT número 900505840 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6187206	19/09/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1023958971	WILMANDAVID CENTENO SAYAS	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-09-20

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de Septiembre del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

450

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

WILMAN DAVID CENTENO SAYAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.023.958.971**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 19 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

451

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN

4

No. 986550

COL

ANGULO BALLESTAS
APELLIDOS

DIEGO JOSE
NOMBRES

VEN
NACIONALIDAD


M
SEXO

22168863
DNI Nro.

08-01-1991
FECHA DE NACIMIENTO

24-06-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO

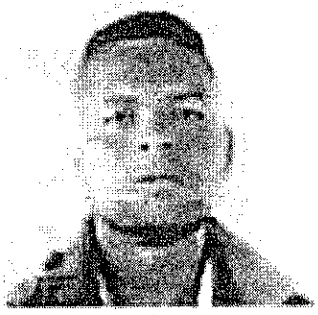

VISIBLES

FIRMA

JP2

E2023412

INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

Juan Francisco Espinosa Palacios
Director General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL986550<<<3<<<<<<<<<<<<<<<
9101081M3105308VENE2023632<<<8
ANGULO<BALLESTAS<<DIEGO<JOSE<<

452

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900505840
Número Afiliación:	272963
Razón social:	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	986550
Nombre:	DIEGO JOSE ANGULO BALLESTAS
Fecha Ingreso:	21/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	11011
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	20/09/2023 06:46:21 a.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4011006066	1|9|0|9|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion		3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado	**5. Tipo de cotizante**		**Codigo** (a registrar por la EPS) 1
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
ANGULO (Primer apellido)	BALLESTAS (Segundo apellido)	DIEGO (Primer nombre)	JOSE (Segundo nombre)
7.Tipo documento de identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
PT	986550	Femenino ☐ Masculino ☒	0|8|0|1|1|9|1

III. DATOS CDMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad		13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M	Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	COLFONDOS	1160000

18.Residencia			
CR 18 36 15 (Dirección)	7764532 (Telefono fijo)	Telefono celular	DIEGOJOSE@GMAIL.COM (Correo electronico)
BOGOTA (Municipio/Distrito)	zona Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	BOGOTA (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLED FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad			Condición	
			F	Tipo N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia					33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS CASTELLANA - VS CASTELLANA	VSCASTELLA - VSCASTELLA
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTRDS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES SAS	NIT	900505840	01

39.Ubicación				
CR 21 NO 159 13 (Dirección)	4732047 (Teleéfono)	SANDRADIAZL@HOTMAIL.COM (Correo electrónico)	BOGOTA (Municipio/distrito)	BOGOTA (Departamento)

454

No de Radicacion
4011006066

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación				
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	
Tipo documento de identidad ☐	Número documento de identidad	Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	Fecha de nacimiento	42.Fecha
43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código: ☐	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
52. ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

Diego Jose	
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante snbre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio ☐	Código del Departamento ☐	Número ficha ☐	Puntaje ☐	Nivel ☐		

70. Datos funcionario que realiza la validación			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo documento de identidad ☐	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario	

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

NIT 800.144.331-3

INFORMA QUE:

El (La) Señor(a) **DIEGO JOSE ANGULO BALLESTAS,** identificado(a) con **Permiso Por Protección** Temporal 986550, se encuentra afiliado(a) en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR.**

Se expide a solicitud del interesado el 20 de Septiembre de 2023.

Cordialmente,


Gerente de Clientes

456



Powered by CamScanner

JPZ

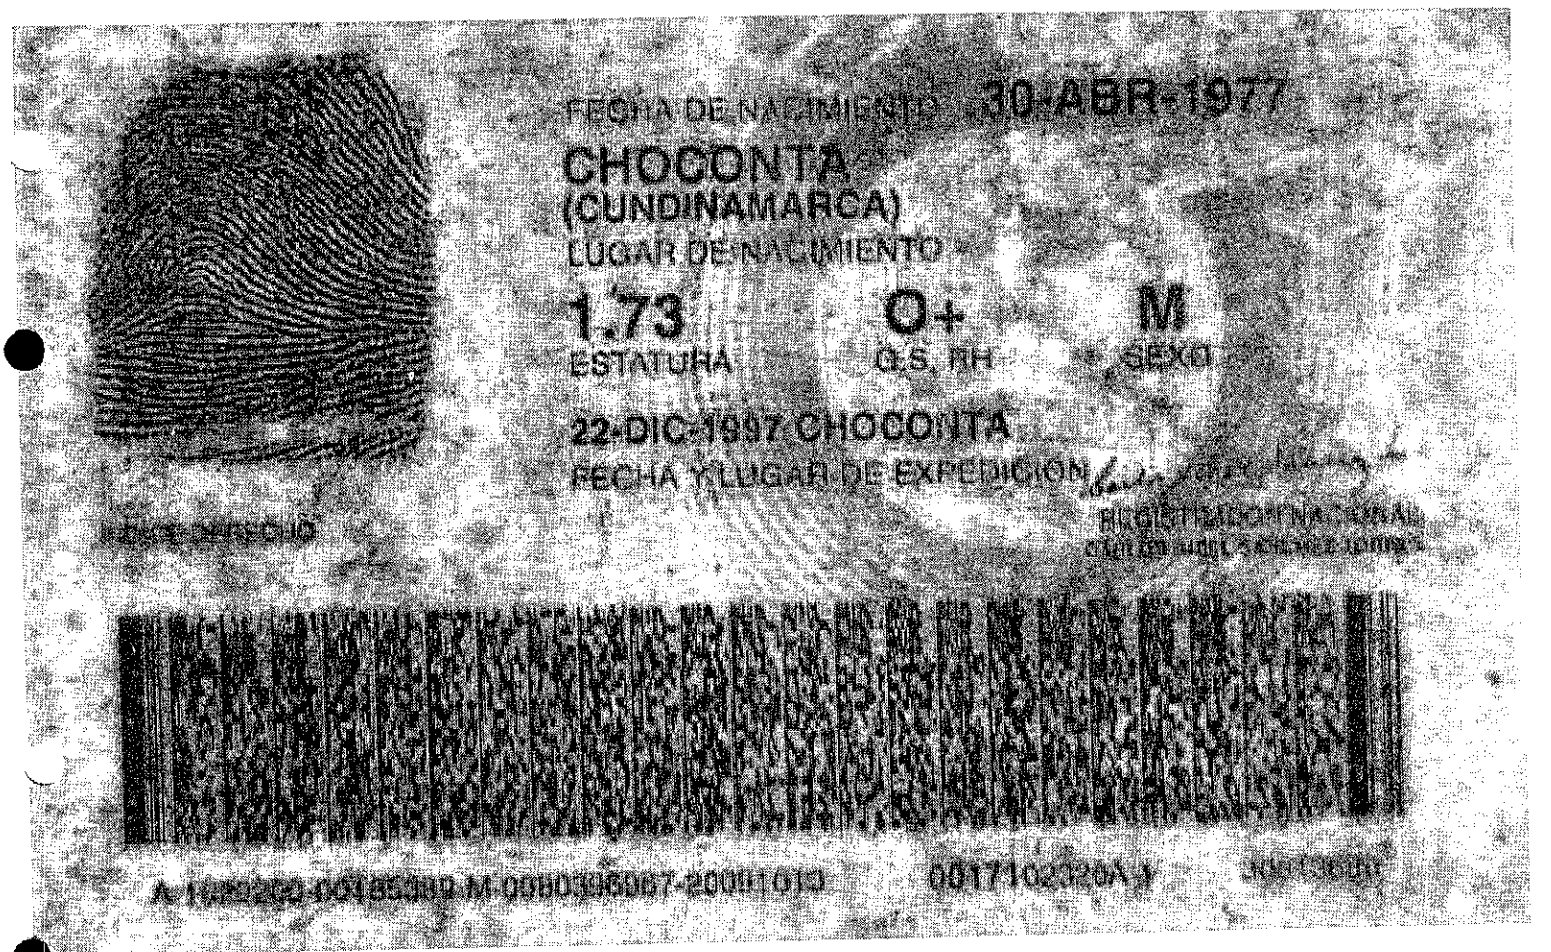

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1977

CHOCONTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-DIC-1997 CHOCONTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900505840
Número Afiliación:	272963
Razón social:	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	80396967
Nombre:	JOSE WILLIAM GARZON CABUYA
Fecha Ingreso:	20/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	11011
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	19/9/2023 12:19:13 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

790712889

Fecha de Radicación: 19 09 2023

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual { - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] } B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: GARZON	Segundo apellido: CABUYA	Primer nombre: JOSE	Segundo nombre: WILLIAM

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	80396967	Femenino [ ] Masculino [X]	30 04 1977

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [ ] Condición [ ]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
AXA COLPATRIA	PORVENIR	1160000

18. Residencia Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
AV 67 N 48 52		2224811	JOSEGRZON23@GMAIL.COM

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana [X] Rural [ ]	SALITRE	BOGOTA D.C.

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo: F	N	M	Condición: I	P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C	EPS SANITAS CENTRO MEDICO NORTE	
B		
B		
B		

V - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de Identificación	37. Número del documento de Identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.S	N [ ] T [ ] [ ] [ ]	900505840	

460

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código
- [X] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino	Sexo: Masculino	Fecha de Radicación	42. Fecha
					19 09 2023

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la E.P.S. envía información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
jose garzon cabuya	

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CN | RC | TI | CC | CE | PA | CD | SC — Total
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declara el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
001	1				19 09 2023	

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker preafiliación
ASESORES COMERCIALES INTEGRALES LIMITADA. C.C. No. 900.282.038	EPS SANITAS RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN POR LA EPS Recibido por: A.C.I Fecha: 19-09-2023	

467

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GARZON CABUYA JOSE WILLIAM** identificado(a) con **CC** número **80.396.967** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 15 de noviembre de 2006 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.**

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 19 de septiembre de 2023.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

20230919121112

462

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **3.250.057**

CABALLERO ROMERO


APELLIDOS

MARCO ANTONIO

NOMBRES

Marco A Caballero R.

FIRMA

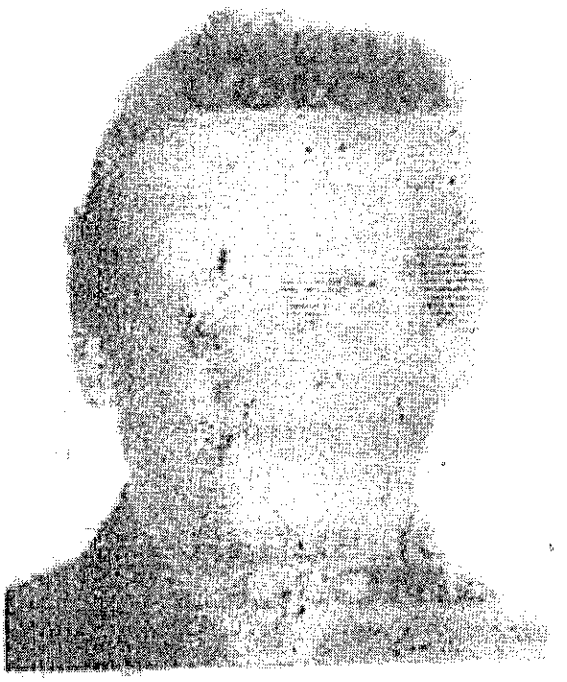

Powered by CamScanner

JP2



FECHA DE NACIMIENTO **25-OCT-1959**


EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-DIC-1977 EL COLEGIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1534000-00190969-M-0003250057-20091027 **00174963184 2** 1620155378

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900505840
Número Afiliación:	272963
Razón social:	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	3250057
Nombre:	MARCO ANTONIO CABALLERO ROMERO
Fecha Ingreso:	20/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	11011
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	19/09/2023 01:10:59 p.m.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

790712897

Fecha de Radicación: 19 09 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente X B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS):

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
CABALLERO	ROMERO	MARCO	ANTONIO
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	18. Fecha de nacimiento
CC	3250057	Femenino Masculino X	25 10 2003

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
	Tipo [ ] Condición [ ]		

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingrese Base de Cotización - IBC
POSITIVA	PORVENIR	1160000

18. Residencia Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
AV 68 N 41 60		2224811	CABALLERO23@HOTMAIL.COM

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana X Rural [ ]	SALITRE	BOGOTA D.C.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	29. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

32. Datos de residencia

	Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C	UAP KENNEDY	
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES SAS	N I T	900505840	

466

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [X] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de Radicación	42. Fecha
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]		[ ] / [ ]		19 09 2023

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de NO Internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Marco caballero romero	

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] Total [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
001	1[ ]				19 09 2023	DD MM AAAA

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ][ ][ ][ ][ ]		

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	EPS SANITAS — RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN POR LA EPS	Sticker procesamiento
ASESORES COMERCIALES INTEGRALES LIMITADA. C.C. No. 900.282.038		Recibido por: A.C.I Fecha: 19-09-2023	

467

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.170.043-7

CERTIFICA QUE:

MARCO ANTONIO CABALLERO ROMERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **3.250.057**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 19 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.192.798.347

DIAZ ARREGOCES


APELLIDOS

DUBAN JOSE

NOMBRES

-DUBAN DIAZ

FIRMA

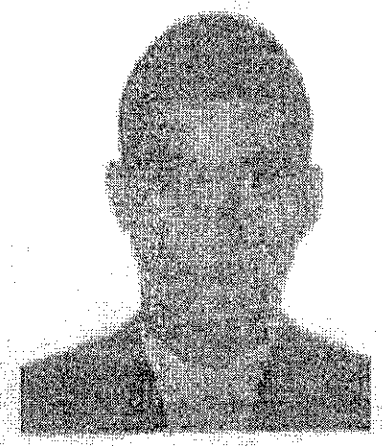



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1999

MAICAO
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

04-AGO-2017 MAICAO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALVIS VACHA

P-4801000-00945959-M-1192798347-20171012 0058097860A 2 49153863

JP2

469

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 900505840
Número Afiliación: 272963
Razón social: JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1192798347
Nombre: DUBAN JOSE DIAZ ARREGOCES
Fecha Ingreso: 28/09/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 11011
Centro de trabajo: 1
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 27/9/2023 4:37:07 PM

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 27/09/2023, el empleador JESUS PEREZ ZORRO identificado con NIT número 900505840 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6216810	27/09/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1192798347	DUBANJOSE DIAZ ARREGOCES	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-09-28

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Septiembre del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

471

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DUBAN JOSE DIAZ ARREGOCES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.192.798.347**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 27 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes.

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

472

8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA


NÚMERO 72.290.019
CANO GARCIA

APELLIDOS
MARCO AURELIO

NOMBRES



Marco Cano garcia
FIRMA




Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1984
BARBOSA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-2002 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO



A-0104300-01308502-M-0072290019-20220718 0080100444A 1 1548446973

JPZ

473

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900505840
Número Afiliación:	272963
Razón social:	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	72290019
Nombre:	MARCO AURELIO CANO GARCIA
Fecha Ingreso:	28/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	11011
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	27/9/2023 4:47:56 PM

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS | sura

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6I_1957914

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 900505840 JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES SAS
Afiliado	CC 72290019 MARCO AURELIO CANO GARCIA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,160,000
Cargo	OTRO
Sucursal	BOGOTA D.C. CR 21 # 159 13
Fecha de ingreso	27/09/2023
Fecha de radicación	27/09/2023 04:56:45 p.m.
Código de Transacción	165295044
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El periodo de inicio de pago es 10/2023

Fecha de generación 27/09/2023

475

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARCO AURELIO CANO GARCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **72.290.019**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

476

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.027.521.090
HUERTAS MARTINEZ
APELLIDOS
SERGIO DAVID
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 18-ABR-2004
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
22-ABR-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA RINCON

INDICE DERECHO

A-1500150-01345800-M-1027521090-20230309 0101287033A 2

JPZ

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900505840
Número Afiliación:	272963
Razón social:	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1027521090
Nombre:	SERGIO DAVID HUERTAS MARTINEZ
Fecha Ingreso:	28/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	11011
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	27/9/2023 4:16:43 PM

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 27/09/2023, el empleador JESUS PEREZ ZORRO identificado con NIT número 900505840 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
6216656	27/09/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1027521090	SERGIODAVID HUERTAS MARTINEZ	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-09-28

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Septiembre del año 2023.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

479

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

SERGIO DAVID HUERTAS MARTINEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.027.521.090**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 27 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:


En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

480

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.031.157.773
HUERTAS MARTINEZ
APELLIDOS
CARLOS EDUARDO
NOMBRES

Carlos Eduardo
FIRMA

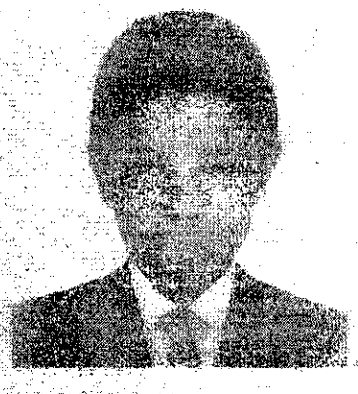



FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-ENE-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



I-1500150-00432267-M-1031157773-20130422 0032731968A 1 2850[illegible]90

JP2

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	900505840
Número Afiliación:	272963
Razón social:	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S A S

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1031157773
Nombre:	CARLOS EDUARDO HUERTAS MARTINEZ
Fecha Ingreso:	28/09/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	11011
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	27/9/2023 4:27:09 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

790713908

Fecha de Radicación: 27 09 2023

I - DATOS DEL TRAMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente X B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): [ ] [ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
HUERTAS	MARTINEZ	CARLOS	EDUARDO
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1031157773	Femenino [ ] Masculino X	01 01 1995

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ] [ ]	Tipo [ ] Condición [ ]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
AXA COLPATRIA	PORVENIR	1160000

18. Residencia Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
AV 68 N 41 60		2224811	CARLOS23@GMAIL.COM

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana X Rural [ ]	SALITRE	BOGOTA D.C.

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	[ ]

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1	[ ]				[ ]
B2	[ ]				[ ]
B3	[ ]				[ ]
B4	[ ]				[ ]
B5	[ ]				[ ]

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo: F	N	M	Condición: T	P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C	EPS SANITAS CENTRO MEDICO NORTE	
B		
B		
B		

V - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.S	[ ]		

483

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código
- [X] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Repone de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino	Sexo: Masculino	Fecha de Radicación	42. Fecha
					27 09 2023

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado (Código)	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Carlos huertas martinez	

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	CE	PA	CD	SC	Total
Cantidad									

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
001	1				27 09 2023	

70. Datos funcionario que realiza la validación: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	EPS SANITAS RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN POR LA EPS	Sticker procesamiento
ASESORES COMERCIALES INTEGRALES LIMITADA. C.C. No. 900 282 038		Recibido por: A.C.I Fecha: 27-09-2023	

484

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CARLOS EDUARDO HUERTAS MARTINEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.031.157.773**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 27 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

485

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 7

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

HBG

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS	CRA 68D No 25B-35 OF 327-3	7561151	ingebyplas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70595804	$4.981.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	588.800	588.800
Pensión	3	2.569.600	2.569.600
Riesgos Laborales	1	1.094.300	1.094.300
CCF	1	828.800	828.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.981.500	4.981.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

cómpensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS		CRA 63D No 25B-86 OF 337-3	7551154	ingebyp.ltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70595604	$4.961.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	196.000	0		0		0	0	0	0	196.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	106.400	0		0		0	0	0	0	106.400	2
EPS01z	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntaria Afiliada	Aporte Voluntaria Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-5	528.000	0	0	0	0	0	0		528.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	681.600	0	0	0	0	0	0		681.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.360.000	0	0	0	0	0	0		1.360.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neta Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.094.300				1.094.300	0	0	1.094.300			10.943	1.094.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	628.800	0	0	628.800	9

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830121507-2	INGEBYP SAS	CRA 68D No 25S-86 OF 327-3	7561121	ingebyp@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	04/09/2023	70595804	$4.981.500	

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No. de entificación	Apellidos y nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Sucursal	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
18182018	ROSAS JURADO FREDY WILLMAN	1	0			S																	231001	1,168,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,168,800	5	88,800	CCF24	1,168,800	46,400	0	0	0	0	0
122723202	MARTINEZ MOSQUERA CARLOS ABDON	1	0			S																	231001	1,600,800	256,000	0	0	0	0	EPS805	1,600,000	64,000	14-11	1,688,800	5	111,400	CCF24	1,600,800	64,008	0	0	0	0	0
11516005	PEREZ CELY JOSE MIGUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1,168,888	46,400	14-11	1,168,888	5	88,800	CCF24	1,160,088	46,408	0	0	0	0	0
26430367	PERDOMO SANZOS MARIA LILY	1	0			S										X							238301	1,588,888	240,000	0	0	0	0	EPS805	1,500,000	60,000	14-11	1,588,000	5	0	CCF24	1,500,000	D	0	0	0	D	0
79864001	BOHORQUEZ LESMES JEFFERSON ODILIO	1	0			S																	25-16	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS881	3,000,000	120,000	14-11	3,000,000	5	208,800	CCF24	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
79852116	BOHORQUEZ LESMES FABIAN OSWALDO	1	0			S																	25-16	3,000,000	480,000	0	0	0	0	EPS001	3,000,000	120,000	14-11	3,000,000	5	208,800	CCF24	3,000,000	120,000	0	0	0	0	0
79564578	JIMENEZ ABDALA JULIO ISIDORO	1	0			S																	25-14	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS818	2,500,000	100,000	14-11	2,500,000	5	174,000	CCF24	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
36387265	MARQUIN MARQUIN LUZ AIDA	1	0			S																	230301	1,888,800	288,000	0	0	0	0	EPS005	1,880,000	72,000	14-11	1,880,000	5	125,300	CCF24	1,880,000	72,000	0	0	0	0	0
52093568	TRUJILLO SALAMANCA ADRIANA MARCELA	1	0			S																	231881	1,588,000	240,080	0	0	0	0	EPS008	1,508,000	60,000	14-11	1,500,000	5	104,080	CCF24	1,580,000	60,008	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901590075-0	CONSORCIO 8S INGENIERIA	CR 68 D 25 B 68	[illegible]	contabilidad.[illegible]@[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	8 – menos de 200 c		BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70833548	$4.593.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	112.000	0		0		0	0	0	0	112.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	119.100	0		0		0	0	0	0	119.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	150.300	0		0		0	0	0	0	150.300	3
EPS037	Nueva EPS	800156264-2	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cetización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	489.200	0	0	0	0	0	0		489.200	2
230301	Porvenir	800224808-6	1.161.200	0	0	0	0	0	0		1.161.200	4
231001	Colfondos	800227940-6	112.000	0	0	0	0	0	0		112.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	611.200	0	0	0	0	0	0		611.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fende Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.032.800				1.032.800	0	0	1.032.800			10.328	1.032.800	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	583.400	0	0	583.400	9

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901590075-0	CONSORCIO BS INGENIERIA	CR 65 D 25 B 86	[illegible]	contabilidad[illegible]@g[illegible].com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTA, D. C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70833548	$4,593,200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	593,400	593,400
Pensión	4	2,373,600	2,373,600
Riesgos Laborales	1	1,032,800	1,032,800
CCF	1	593,400	593,400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4,593,200	4,593,200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901590075-0	CONSORCIO BS INGENIERIA	CR 68 D 25 B 86	3175611124	contabilidad@bsingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70833548	$4,593,200	

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólombia exterior	Desconocido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDICION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
29874796	PULGARIN GARCIA VIVIANA	1	0			S																	230301	2,800,000	448,000	0	0	0	0	EPS005	2,800,000	112,000	14-11	2,800,000	5	194,900	CCF24	2,800,000	112,000	0	0	0	0	0
19930186	GUERRERO MIRANDA GARU	1	0			S	X																230301	1,500,000	240,000	0	0	0	0	EPS041	1,500,000	60,000	14-11	1,500,000	5	104,400	CCF24	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0
86052493	HERRERA HERRERA JOSE ALFONSO	1	0			S																	25-14	1,500,000	240,000	0	0	0	0	EPS037	1,500,000	60,000	14-11	1,500,000	5	104,400	CCF24	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0
1d31135143	VARGAS ORTIZ YILBER YAMIL	1	0			S																	230201	2,400,000	384,000	0	0	0	0	EPS017	2,400,000	96,000	14-11	2,400,000	5	167,100	CCF24	2,400,000	96,000	0	0	0	0	0
1106780037	CRUZ SANTA EDELBERTO	1	0			S																	230301	2,300,000	368,000	0	0	0	0	EPS002	2,300,000	92,000	14-11	2,300,000	5	160,100	CCF24	2,300,000	92,000	0	0	0	0	0
52716243	LOPEZ PEREZ SANDRA MILENA	1	0			S							X										25-14	2,320,000	371,200	0	0	0	0	EPS008	2,320,000	92,800	14-11	2,320,000	5	161,500	CCF24	2,320,000	92,000	0	0	0	0	0
1003624593	TELLEZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	EPS017	657,334	26,300	14-11	657,334	5	45,800	CCF24	657,334	26,300	0	0	0	0	0
1030686139	BOLAÑOS RODRIGUEZ ALDIMER	1	0			S	X																230201	657,334	105,200	0	0	0	0	EPS008	657,334	26,300	14-11	657,334	5	45,300	CCF24	657,334	26,300	0	0	0	0	0
24167471	GONZALEZ PESCA SONIA PATRICIA	1	0			S	X																231001	700,000	112,000	0	0	0	0	EPS017	700,000	28,000	14-11	700,000	5	48,800	CCF24	700,000	28,000	0	0	0	0	0

PAGADA

H92

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901417696-5	CONSORCIO LYB		KR 68D 25b 86	3058567087	contabilidadlyb2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTA, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14	8
					TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	25/09/2023	71003235	$8.193.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	80.400	8		0		0	3	300	8	80.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	204.500	0		0		8	3	706	0	205.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	289.200	8		0		0	3	1.000	0	290.200	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	93.500	0		0		0	3	400	0	93.900	2
EPS017	[redacted]	830003564-7	92.800	0		8		0	3	400	0	89.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	278.900	8		8		0	3	900	0	271.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	[redacted] (AFP Proteccion)	800229739-0	761.100	0	0	0	0	3	2.900	0	763.600	9
230301	Porvenir	800144331-3	1.806.900	8	0	0	0	3	8.000	0	1.812.200	[redacted]
230901	Old Mutual	800088702-2	461.900	8	0	0	0	3	1.400	0	463.300	[redacted]
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.155.200	0	0	0	0	3	3.800	0	1.159.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.794.600				1.794.600	3	5.900	1.800.900			17.946	1.800.500	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.216.200	3	4.000	1.220.200	14

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901417696-5	CONSORCIO LYB	KR 68d 25b 86	3058557087	contabilidadlyb2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTA. D.C.	BOGOTA. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	25/09/2023	71063235	$8.193.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	8
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES PDR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.031.300	1.835.000
Pensión	4	4.124.406	4.138.100
Riesgos Laborales	1	1.794.600	1.800.500
CCF	1	1.216.200	1.220.200
ESAP	0	8	0
ICBF	0	0	8
MEN	8	8	8
SENA	0	0	0
TOTALES	[illegible]	8.166.500	[illegible]

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901417696-5	CONSORCIO LYB		KR 68d 25b 86	3058557887	contabilidadlyb2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 14 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	25/09/2823	71003235	$8.193.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días cotizados	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023000484	PALACIO RUIZ ANGIE VIVIANA	1	0			S																	30	230301	2.000.000	320.000	0	0	4	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	6	130.200	CCF24	2.000.000	80.800	0	0	0	0	0
2	CC	1030588882	PEÑA RONCANCIO LEIDY JOHANA	1	0			S																	30	230201	2.000.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	6	161.000	CCF24	2.600.000	104.800	0	0	0	0	0
3	[redacted]	1003461516	SOGAMOSO ANDRES FELIPE	1	0			S					X												30	230901	3.626.430	580.600	X	0	0	0	EPS008	3.626.430	145.200	14-11	3.626.430	6	252.600	CCF24	3.626.430	146.200	0	0	0	0	0
4	[redacted]	1118638358	BECERRA ZABALETA [redacted]	1	0			S																	30	230301	3.800.800	480.800	0	0	0	X	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.480.800	6	242.000	CCF24	3.000.000	120.800	0	0	0	0	4
5	CC	1121926108	GUERRERO RICA[redacted]	1	0			S								A									30	230901	2.511.807	401.900	0	0	0	0	EPS005	2.511.807	100.500	14-11	2.511.807	6	174.800	CCF24	2.511.807	100.500	0	0	0	0	0
6	CC	1124063692	MARTINEZ ORD[redacted] LUIS FERNANDO	1	0			S																	30	230301	1.500.600	240.200	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.800	14-11	1.500.000	6	104.400	CCF24	1.500.000	60.800	0	0	0	0	0
7	PT	1897268 [redacted]		1	0			S	X																30	230901	1.160.800	185.800	0	0	0	4	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	6	80.920	CCF24	2.220.000	180.000	0	0	0	0	0
8	CC	39186907	ALZATE OCAMPO LUZ ESTRELLA	1	0			S																	30	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	6	80.920	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	52717258	PRIETO [redacted] LIANA	1	0			S	X																30	25-14	600.000	528.800	0	0	0	4	EPS010	400.800	16.000	14-11	600.000	6	55.700	CCF24	1.200.000	48.000	4	0	0	0	0
10	CC	79003430	BERNAL [redacted] WILLIAM	1	0			S																	30	25-14	1.850.800	294.800	0	0	0	0	EPS002	1.850.800	98.000	14-11	1.850.000	6	114.000	CCF24	1.850.000	98.000	4	0	0	0	0
11	CC	79431877	SALAZAR BUE[redacted] HUMBERTO	1	0			S								X	X								30	25-14	2.X10.000	921.800	X	0	0	0	EPS002	2.014.000	80.400	14-11	2.010.000	6	139.600	CCF24	2.010.000	80.400	X	0	0	0	0
12	CC	79784883	FONSECA [redacted]	1	0			S																	30	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS009	1.800.000	84.000	14-11	1.800.000	6	111.400	CCF24	1.800.000	84.000	0	0	0	0	0
13	CC	80087133	MATABANCHOY L[redacted] GIOVANI FERNANDO	1	0			S	X																30	230201	1.836.840	366.800	0	0	0	0	EPS010	1.836.840	91.800	14-11	1.836.840	6	107.000	CCF24	2.448.000	110.000	0	0	0	0	0
14	CC	93462839	CUEVAS FERNA[redacted] OSCAR JOAQUIN	1	0			S	X																30	230201	600.000	96.000	0	X	0	0	EPS037	460.800	34.000	14-11	820.000	6	43.200	CCF24	2.467.000	98.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032359946	JUAN SEBASTIAN DE PLAZA SOLORZANO	CALLE 163B # 45-32 INT 2 APTO 203	8062980	jusedepla@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	17/10/2023	71218693	$332,700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	6	900	0	145.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.800	0	0	0	0	6	1.200	0	186.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nste Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.900
Pensión	1	185.600	186.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	332.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032359946	JUAN SEBASTIAN DE PLAZA SOLORZANO		CALLE 163B # 45-32 INT 2 APTO 203	8062980	jusedepla@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		Si

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	17/10/2023	71218693	$332.700	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	INE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1032359946	DE PLAZA SOLORZANO JUAN SEBASTIAN	3	0			N																	25-14	1.160.000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Asesor

SOI

Bancolombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6422497
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			NELKY BUITRAGO GRISALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 38 A 4 B 35	TELEFONO:	5541385
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	91 - PLANILLA 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7893309741	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			162845892

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 329.000
SUBTOTALES:										$ 320.000	$ 0	$ 329.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CCOIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.800	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 48.800
SUBTOTALES:									$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 48.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6422497	BUITRAGO GRISALES NELKY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.900.000	$ 6422497	$ 48.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 618.800

498

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

JPZ

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900505840-3	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES SAS		CRA 21 ND 159-13	4732047	sandradiazl@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	8 – menos de 200 c	PERSONAL TOCA	578	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	12/09/2023	70853138	$1.823.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	54.200	0		0		0	1	100	0	54.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	7.800	0		0		0	1	100	0	7.900	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	85.000	0		0		0	1	100	0	65.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	7.800	0		0		0	1	100	0	7.900	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	54.200	0		0		D	1	100	0	54.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	900224808-8	866.400	0	0	0	0	1	1.000	0	867.400	8
231001	Colfondos	800227840-6	74.300	0	0	0	0	1	100	0	74.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	409.500				409.500	1	500	410.000			4.095	410.000	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	235.400	1	300	235.700	9

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900505840-3	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES SAS		CRA 21 NO 159-13	4732047	sandradiazl@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PERSONAL TOCA	578	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	12/09/2023	7D853138	$1.823.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	235.400	236.000
Pensión	2	940.700	941.800
Riesgos Laborales	1	409.500	410.000
CCF	1	235.400	235.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.821.000	1.823.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900505840-3	JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES SAS		CRA 21 NO 159-13	4732047	sandradiazl@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PERSONAL TOCA	578	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	12/09/2023	70853138	$1.823.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Salario Integral	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1004200332	QUIÑONES QUIÑONES YOIBIN ORLANDES	1	8			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-4	1,160,000	5	80,600	CCF21	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1023931435	CENTENO SAYAS YEIVER ENRIQUE	1	0			S	X																230301	193,334	31,800	0	0	0	0	EPS008	193,334	7,800	14-4	193,334	5	13,500	CCF21	193,334	7,800	0	0	0	0	0
CC	1033755912	MONTENEGRO BALLESTEROS JOHN FREDY	1	8			S	X																230301	193,334	31,000	0	0	0	0	EPS037	193,334	7,800	14-4	193,334	5	13,500	CCF21	193,334	7,800	0	0	0	0	8
CC	1079656578	MEJIA GARCIA MANUEL ENRIQUE	1	8			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	46,400	14-4	1,160,000	5	80,600	CCF21	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1100401070	MADARRIAGA CALDERA LUIS MIGUEL	1	0			S																	230301	1,160,800	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,460	14-4	1,160,000	5	80,800	CCF21	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
CC	1102861240	CARRASCO MEDINA JEEIFRIS	1	0			S	X																230301	193,334	31,000	0	0	0	0	EPS002	193,334	7,800	14-4	193,334	5	13,500	CCF21	193,334	7,800	0	8	0	0	0
CC	17221802	GUIZA VARGAS BELISARIO	1	0			S																	230301	1,160,800	185,600	8	0	8	8	EPS010	1,160,000	46,460	14-4	1,160,000	5	80,800	CCF21	1,160,000	46,400	0	0	0	8	0
CC	73583565	ARROYO DELAHOZ ANDREZ	1	0			S	X																230301	193,334	31,000	8	0	0	8	EPS041	193,334	7,800	14-4	193,334	5	13,500	CCF21	193,334	7,800	0	0	0	0	0
CC	73584982	MORA MEZA ARCENIO	1	0			S	X																231601	464,000	74,300	0	0	0	0	EPS017	464,000	18,600	14-4	464,000	5	32,300	CCF21	464,000	18,600	0	8	8	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901264693	5	[redacted]	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERADOS	Cll[redacted]	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	1234567	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	S0556909	94563358?9	E	2023/09/	2023/09/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,123,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1057595301	CAMARGO JUAN	230301	15	$600,000	$96,000	EPS040	15	$600,000	$24,000	CCF22	15	$600,000	$24,000	14-11	15	$600,000	$41,800	15	$8	$0
2	CC 1106895559	CANTOR VALERIANO	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	38	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
3	CC 1032467566	GONZALEZ JULIAN	231001	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$150,000	CCF22	38	$1,200,000	$48,000	14-11	38	$1,200,000	$83,600	30	$1,200,000	$60,000
4	CC 1012458685	GONZALEZ MAICOL	230201	16	$640,000	$102,400	EPS010	16	$640,000	$25,600	CCF22	16	$640,000	$25,600	14-11	16	$640,000	$44,600	16	$0	$0
5	CC 13926956	JAIMES EUSTOQUIO	230301	16	$640,000	$102,400	EPS017	16	$640,000	$88,000	CCF22	16	$640,000	$25,600	14-11	16	$640,000	$44,600	16	$640,000	$32,000
6	CC 1076736373	POVEDA JUAN	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3	$120,000	$19,200	EPS010	3	$120,000	$15,000	CCF22	3	$120,000	$4,800	14-11	3	$128,000	$8,400	3	$128,000	$6,000
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	7	$280,000	$44,800	EPS037	7	$280,000	$35,000	CCF22	7	$280,000	$11,280	14-11	7	$280,000	$19,500	7	$280,000	$14,000
Total	**Afiliados(8)**				$5,880,000	$940,800			$5,880,000	$425,608			$5,080,000	$235,280			$5,888,008	$409,700		$2,248,000	$112,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$940,800	$0	$0	$940,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$435,200	$0	$0	$435,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$313,600	$0	$0	$313,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$409,700	$0	$0	$409,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$409,700	$0	$0	$409,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$235,200	$0	$0	$235,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	8	$235,200	$0	$0	$235,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$425,600	$0	$0	$425,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$24,000	$0	$0	$24,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$40,600	$0	$0	$40,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$278,000	$0	$0	$278,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$83,000	$0	$0	$83,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$67,200	$0	$0	$67,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$67,200	$0	$0	$67,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$44,800	$0	$0	$44,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$44,800	$0	$0	$44,800
TOTAL				**8**	**$2,123,300**	**$0**	**$0**	**$2,123,300**

2023/09/18 01:30 PM

aportes en línea

Planilla Asumian

[redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900528358	5	[redacted]	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 12A # 2C - 26	NEMOCON-CUNDINAMARCA	8578385	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	144845540	9456839283	E	2023/09/	2023/09/05	COLOMBIA	0	$2,547,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)						[redacted]																			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO (1 Afiliados)						$38,667	$6,200			$38,667	$1,600			$38,667	$1,600			$38,667		$2,780		$0	$0		$12,188
Ciudad: NEMOCON Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$38,667	$6,200			$38,667	$1,608			$38,667	$1,600			$38,667		$2,700		$0	$0		$12,100
1	CC	1055988240	HERNANDEZ DIEGO X	23830 1	1	$38,667	$6,200	EPS817	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,608	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$3,488,000	$556,800			$3,488,800	$139,200			$3,488,000	$139,280			$3,480,000		$151,580		$0	$0		$986,700
Ciudad: NEMOCON Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$3,488,000	$556,800			$3,480,088	$139,208			$3,488,000	$139,288			$3,480,000		$151,588		$0	$0		$986,788
2	CC	3242983	GARCIA PEDRO	23020 1	38	$1,160,000	$185,600	EPS817	38	$1,160,000	$46,400	CCF24	38	$1,160,000	$46,400	14-11	38	$1,160,000	4.350%	$50,500	38	$0	$0	SI	$328,900
3	CC	1079532740	MANRIQUE FREBY	23038 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS817	30	$1,168,000	$46,400	CCF24	30	$1,168,000	$46,400	14-11	38	$1,168,000	4.350%	$50,500	38	$0	$0	SI	$328,900
4	CC	3028505	RODRIGUEZ JOSE	23020 1	38	$1,160,000	$185,600	EPS017	38	$1,160,000	$46,400	CCF24	38	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,488,000	$139,200			$3,480,000	$139,280			$3,480,000		$18,380		$0	$0		$853,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,488,000	$139,200			$3,480,000	$139,280			$3,480,000		$18,380		$0	$0		$853,500
Ciudad: TOCANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$3,480,000	$556,800			$3,488,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,800		$18,300		$0	$0		$853,500
5	CC	1069099676	GOMEZ YOHANA	23830 1	38	$1,160,000	$185,600	EPS017	38	$1,160,000	$46,400	CCF24	38	$1,160,000	$46,400	14-11	38	$1,160,000	8.522%	$6,100	38	$0	$0	SI	$284,500
6	CC	1143253175	HERNANDEZ CAMILO	23820 1	38	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	38	$1,160,000	8.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
7	CC	3878418	HERNANDEZ HECTOR	23030 1	38	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	38	$1,160,000	$46,400	14-11	38	$1,160,000	8.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALQUILER MAQ CONSTRUCCION (2 Afiliados)						$2,242,667	$358,900			$2,242,667	$89,800			$2,242,667	$89,800			$2,242,667		$156,200		$0	$0		$694,700
Centro de Trabajo: ALQUILER MAQ Y CONSTRUCCION (2 Afiliados)						$2,242,667	$358,900			$2,242,667	$89,800			$2,242,667	$89,800			$2,242,667		$156,200		$0	$0		$694,700
Ciudad: NEMOCON Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$2,242,667	$358,900			$2,242,667	$89,800			$2,242,667	$89,800			$2,242,667		$156,200		$0	$0		$694,700
8	CC	1071440158	SANTANA CARLOS	23028 1	38	$1,160,000	$185,600	EPS817	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	38	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
[redacted]				23020 1	28	$1,882,667	$173,300	EPS017	28	$1,882,667	$43,400	CCF24	28	$1,882,667	$43,400	14-11	28	$1,882,667	6.960%	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
Total Afiliados(9)						$9,241,334	$1,478,700			$9,241,334	$369,800			$9,241,334	$369,800			$9,241,334		$328,700		$0	$0		$2,547,000

503

2023/09/06 11:48 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900528350	5	H.S SAN MARTIN SAS	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 12A # 3C - 75	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8578305	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	144845540	9456839283	E	2023/09/12	2023/09/06	BANCOLOMBIA	8	$2,547,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	DIAS/HRS	VALOR APORTES	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADDRAS: 2)				9	$1,478,700	$0	$0	$1,478,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$563,000	$0	$0	$563,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$915,700	$0	$0	$915,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$328,700	$0	$0	$328,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$328,700	$0	$0	$328,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$369,800	$0	$0	$369,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$369,800	$0	$0	$369,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$369,800	$0	$0	$369,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$277,000	$0	$0	$277,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				9	$2,547,000	$0	$0	$2,547,000

2023/09/06 11:48 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659672	[redacted]	[redacted]	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BLANCO	CL 78 C 13B -01	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4344624	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Cicve		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147356016	94560809209	E	2023/09/18	2023/09/07	BANCO DE BOGOTA	0	$3,517,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[redacted]																						
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	EC	15787735	ARCA YIHETH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (9 Afiliados)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$417,600			$10,440,000	$417,600			$10,440,000	$727,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$417,600			$10,440,000	$417,600			$10,440,000	$727,200		$0	$0
2	CC	1013675775	BETANCOURT JHOAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	79404280	BETANCOURT ENRIQUECIDES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$86,000	30	$0	$0
4	[redacted]				30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,000	30	$0	$0
5					30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,000	30	$0	$0
6	CC	79829412	BLANCO MIGUEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$40,600	30	$0	$0
7	CC	1049574	DIAZ IRAMISON	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$86,800	30	$0	$0
8	CC	93419378	FRANCO GERMAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,000	30	$0	$0
9	CC	79242214	GUTIERREZ ENRIQUE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,000	30	$0	$0
10	CC	79763958	[illegible]	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	Afiliados (10)					$11,600,000	$1,856,000			$11,600,000	$464,000			$11,600,000	$464,000			$11,600,000	$733,300		$0	$0

2023/09/07 12:58 PM

505

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-09-18, [illegible] Tipo Planilla E Número Planilla 65796381

Periodo Cotización 202308 Periodo Servicio 202309

Cliente:

PAGADA 2023-09-18

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HALCAR INGENIERIA SAS				
Documento	NI 901077277	**Dirección**	CRA 4 # 22-36		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8513960		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	21
Ciudad	ZIPAQUIRA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal	DELGADO BELLO CARLOS ANDRES	**Identificación**	CC 1075657263		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1054372726		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					[redacted]	25899000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 2,000,000	230301		16 %	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	14-23	5	6,960 %	$ 2,000,000	$ 139,200	CCF24	4 %	$ 2,000,000	$ 80,000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

58

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 8

CONTROL SEGURIDAD SOCIAL

ALCALDÍA

SEGUIMIENTO A INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL EN OBRA

CODIGO:	GH-F-017
VERSION:	01
FECHA:	DIC DE 2022

CONTRATO DE: (Prestación de Servicios /Obra / Interventoria) No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	BS INGENERIA	**NIT / C.C.:**	901590075-0
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"		

ASISTENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	% DE DEDICACIÓN	CEDULA	FECHA EXPEDICIÓN	IMG	RET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PERSONAL OPERATIVO	Fabian oswaldo	Bohorquez lasmas	Director	50%	79952119	28/08/1997			x	x		x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x	x	x		x
	Nelly	Criseles Buitrago	Asesor Eléctrico	15%	8422497	25/10/1983				x			x	x							x	x						x	x						x	x				
	Juan Sebastian	Plaza	Asesor redes	15%	1032356945	15/09/2009			x	x			x	x							x	x						x	x							x	x			
	Jorge Ivan	Herrera Roldan	Asesor Estructur	15%	10025130	28/08/1993			x	x			x	x							x	x						x	x							x	x			
	Oscar Javier	Pardo	Asesor geotecnic	15%	12198722	7/10/1997			x	x			x	x							x	x						x	x							x	x			
	Sandra Milena	Lopez Perez	Residente	100%	52716243	14/10/1999			x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Viviana	Pulgarin Garcia	SST	100%	29674796	14/07/2000			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	yilber	Virgas	Inspector obra	100%	1031135149	19/11/2009			x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
PERSONAL ADICIONAL	Carlos	Martinez Mosquera	Apoyo	100%	1122723202	13/12/2004			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Edilberto	Cruz	Apoyo	100%	106780087	29/09/2010			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
PERSONAL OPERATIVO	Jose Alfonso	Herrera Herrera	Almacenista	100%	86052493	25/03/1993			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Ademer	Bolaños Rodriguez	Ayudante	100%	1030886139	25/06/2003			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Henry	Delgado	Ayudante	100%	14/07/7094	12/05/2021			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Juan Camilo	Tellez	Ayudante	100%	1003824593	7/08/2022			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Sonia	Gozalez	Almacenistx	100%	24187441	03/05/200			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Dayanx	Tibavija	Topografia	100%	1057601521	6/09/2914			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Jose	Bayardo	Auxi Topograf	100%	3228675	14/07/200			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
SUBCONTRATISTA "A"																																						
SUBCONTRATISTA "B"	Harriman	Torres	Operario vibro	100%	11210695	15/02/2002			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Cristian	Blanco	Operario Mini Cargador	100%	1073527245	1/05/2011			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Fabian	Beltran	Operario Retro	100%	1054372726	8/08/2005			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Luis Miguel	Minadiraga	Extructura	100%	1100401976	18/02/2014			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Belizario	Guiza Vargas	Extructura	100%	17221802	189/02/2002			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Jeafri	Carrasco	Extructura	100%	1102861240	12/07/2012			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Manuel Enruqle	Mejix	Extructura	100%	1079656576	14/05/2007			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Jhon Fredy	Montealegre	Extructura	100%	1033755912	18/07/2911			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Andres	Arrollo de la hoz	Extructura	100%	73583585	30/06/1994			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Arcenio	Mora meza	Extructura	100%	23564962	09/05/200			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Yoibin	Orlandez Quinones	Extructura	100%	1004200332	17/07/2006			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Yiver Enrique	Cliucho	Extructura	100%	1023931435	5/03/2012			x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Diana	Castillo Hernandez	Extructura	100%	1678347889	11/03/2010	x		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Neyder	Rincon Santana	Extructura	100%	3121594	27/07/200	x		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Wilmar David	Centeno	Extructura	100%	1023958071	24/03/2015	x		x	x		x	x	x	x	x	y		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Jose William	Garzon	Extructura	100%	80396987	22/12/1997	x		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Marco Antonio	Caballero	Extructura	100%	3250057	22/12/1977	x		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Duvan Jose	Diaz	Extructura	100%	1192798347	4/08/2017	x		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Marco Aurelio	Cano	Extructura	100%	72280018	21/02/2002	x		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Sergio David	Huertas Martinez	Extructura	100%	1027521090	22/04/2022	x		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
	Carlos Eduardo	Huerta	Extructura	100%	1031157773	3/01/2013	x			x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x

LISANDRO NUÑEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25204-124092

EDGAR ANTONIO BARBOSA VALDERRAMA
RESIDENTE SST DE INTERVENTORIA
Licencia No 25-6071-2015

VIVIANA PULGARIN GARCIA
RESIDENTE SST DE OBRA
Licencia No 2013

CODIGO: GI-F-016
VERSION 03
FECHA: MAYO DE 2023

CONTROL A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

CONTRATO DE: (Prestación de Servicios /Obra / Interventoría) No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	BS INGENERIA	NIT / C.C.:	901590075-0
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"		

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	RIESGO ARL	PLANILLA No.	IBC	ING	RET	IND	COTIZACION PENSION 16%	FONDO PENSIONAL DE SOLIDARIDAD	FONDO PENSIONAL DE SUBSISTENCIA	COTIZACION SALUD 4% / 12,5%	COTIZACION ARL	APORTE CCF 4% / 2%	APORTE SENA 2%	APORTE ICBF 3%	VALOR DEL APORTE TOTAL	PERIODO DE PAGO SALUD	PERIODO DE PAGO PENSION	DIAS DE MORA
	Fabian oswaldo	Bonorquez Ramos	Director	V	80741991	$ 3.800.000,00				$ 480.000,00	$ 3.000.001,00	$ 3.000.001,00	$ 120.000,00	$ 205.800,00	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ 0.926.802,00	Septiembre	Agosto	
	Sandra Milena	Lopez Perez	Residente	V	70182693	$ 1.800.000,00				$ 256.800,00	$ 1.800.001,00	$ 1.800.001,00	$ 64.000,00	$ 111.400,00	$ 64.000,00	$ -	$ -	$ 3.895.402,00	Septiembre	Agosto	
	Viviana	Pulgarin Garcia	SST	V	70187693	$ 2.600.000,00				$ 448.800,00	$ 2.000.001,00	$ 2.800.001,00	$ 112.000,00	$ 194.900,00	$ 112.000,00	$ -	$ -	$ 6.406.902,00	Septiembre	Agosto	
	Nelky	Criales Buitrago	Asesor Eléctrico	V	7893309741	$ 2.500.000,00				$ 400.800,00	$ 2.500.001,00	$ 2.500.001,00	$ 160.000,00	$ 174.500,00	$ 160.000,00	$ -	$ -	$ 6.648.902,00	Septiembre	Agosto	
	Juan Sebastian	Plaza	Asesor redes	V	76780963	$ 2.800.000,00		x		$ 448.802,00	$ 2.800.001,00	$ 2.000.001,00	$ 350.000,00	$ 194.900,00	$ 56.000,00			$ 6.648.902,00	Septiembre	Agosto	
	Jorge Ivan	Herrera Roldan	Asesor Estructural	V	9455008154	$ 1.500.000,00		x		$ 240.800,00	$ 1.800.001,00	$ 1.500.001,00	$ 182.500,00	$ 104.400,00	$ 30.000,00	$ -	$ -	$ 3.561.902,00	Septiembre	Agosto	
	Oscar Javier	Pardo	Asesor geotecnico	V	88596537	$ 2.800.000,00		x		$ 448.800,00	$ 2.800.001,00	$ 2.000.001,00	$ 350.000,00	$ 194.900,00	$ 56.000,00			$ 6.648.902,00	Septiembre	Agosto	
	yilber	Vegas	Inspector de obra	V	70187693	$ 2.800.000,00				$ 416.800,00	$ 2.800.001,00	$ 2.000.001,00	$ 194.800,00	$ 161.000,00	$ 104.000,00	$ -	$ -	$ 6.005.002,00	Septiembre	Agosto	
						$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
PERSONAL ADICIONAL	Carlos	Martinez Mosquera	Apoyo	V	89741093	$ 1.800.000,00			5	256.800,00	$ 1.800.001,00	$ 1.800.001,00	$ 64.000,00	$ 111.400,00	$ 64.000,00	$ -	$ -	$ 3.895.402,00	Septiembre	Agosto	
	Edilberto	Cruz	Apoyo	V	76187693	$ 3.200.000,00				$ 416.800,00	$ 2.000.001,00	$ 2.600.001,00	$ 104.800,00	$ 161.000,00	$ 104.000,00	$ -	$ -	$ 6.005.002,00	Septiembre	Agosto	
OFICIAL OPERATIVO	Jose Alfonso	Herrera Herrera	Almacenista	V	70187693	$ 1.044.800,00				$ 167.100,00	$ 1.044.801,00	$ 1.044.001,00	$ 41.000,00	$ 72.700,00	$ 41.800,00	$ -	$ -	$ 2.411.902,00	Septiembre	Agosto	
	Aldimer	Bolaños Rodriguez	Ayudante	V	70187693	$ 1.160,00				$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.800,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Henry	Delgado	Ayudante	V	70187693	$ 1.160,00				$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.800,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Juan Camilo	Zeilez	Ayudante	V	70187693	$ 1.160,00				$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.800,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Sonia	Gonzalez	Almacenista	V	70187693	$ 1.160,00				$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.800,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Dayana	Tibavija	Topografia	V	0456335879	$ 1.160,00				$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.800,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Jose	Bayerdo	Aux Topograf	V	8456335879	$ 1.160,00				$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.800,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
SOBRESTANTES "A"	Henrriam	Torres	Operario vibro	V	9456039283	$ 1.500.000,00				$ 245.902,00	$ 1.500.001,00	$ 1.500.001,00	$ 60.800,00	$ 104.400,00	$ 60.800,00	$ -	$ -	$ 3.464.402,00	Septiembre	Agosto	
	Cristian	Blanco	Operario Mini Cargador	V	9454764515	$ 1.560.000,00			3	240.000,00	$ 1.800.001,00	$ 1.800.001,00	$ 60.800,00	$ 104.400,00	$ 60.800,00	$ -	$ -	$ 3.464.402,00	Septiembre	Agosto	
	Fabian	Beltran	Operario Retro	V	80796361	$ 1.500.000,00				$ 240.000,00	$ 1.800.001,00	$ 1.800.001,00	$ 60.800,00	$ 104.400,00	$ 60.800,00	$ -	$ -	$ 3.464.402,00	Septiembre	Agosto	
SOBRESTANTES "B"	Luis Miguel	Mesterage	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Belizario	Guaza Vargas	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 180,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Jeeli	Carrasco	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Manuel Enrique	Mesa	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 180,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Jihon Fredy	Montealegre	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Andres	Arrieta de la cruz	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Arsenio	Mora meza	Estructura	V	89831005	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Yorpis	Orlandez Quinones	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.800,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Yiver Enrique	Cliucho	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.800,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Oiare	Castillo Hernandez	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Neyder	Rincon Bantana	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Wilmar David	Centeno	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Diego Jose	Angulo Balleza	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Jose Wilton	Garzon	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Marco Antonio	Caballero	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Duvan Jose	Diaz	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Mareg Aurelio	Cano	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Sergia David	Huertas Martinez	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	
	Carlos Eduardo	Huerta	Estructura	V	89831085	$ 1.160,00	x			$ 200,00	$ 1.160,00	$ 1.160,00	$ 41.000,00	$ 100,00	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 103.820,00	Septiembre	Agosto	

ALEJANDRO NUÑEZ
No Mat. 25204-124092

EDGAR ANTONIO CARDENAS VALDERRAMA
RESIDENTE SST DE INTERVENTORIA
Licencia No 2[illegible]071-2015

VIVIANA PULGARIN GARCIA
RESIDENTE SST DE OBRA
Licencia No 2013

509

CONSORCIO
DS
INGENIERÍA

ANEXO 9

CARTA DE CERTIFICADO DE CONTADOR QUE ACREDITE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

INGEBYP

NIT: 830.121.507-2

CERTIFICADO ISO 9001:2000 ACREDITADO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA

Yo, JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ L., identificado con C.C. 79.894.001, en mi condición de Representante Legal de INGEBYP S.A.S. identificada con Nit 830.121.507-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía. legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ MONTAÑA, identificado con C.C. 74.270.019, y con Tarjeta Profesional No. 68242-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INGEBYP S.A.S. identificado con Nit 830.121.507-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía en el mes de septiembre, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (02) del mes de octubre de 2023.

ING. Msc – JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ L.
REPRESENTANTE LEGAL-INGEBYP S.A.S.
C.C. No 79.894.001 de Bogotá.

LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ MONTAÑA
REVISOR FISCAL INGEBYP S.A.S.
T.P. 68242- T

ELAEORO

APROBÓ

CONSORCIO
BS
INGENIERÍA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA

Yo, JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ L., identificado con C.C. 79.894.001, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO BS INGENIERIA identificado con Nit 901.590.075-2, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante el mes de septiembre. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50de la Ley 789 de 2002.

Dada en BOGOTÁ, a los 02 del mes de octubre de 2023

ING. Msc – JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ L.
REPRESENTANTE LEGAL-INGEBYP S.A.S.
C.C. No 79.894.001 de Bogotá.

572

ELABORO

APROBÓ

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 10

ACTA DE REUNIÓN DE COPASST

CONSORCIO DP INGENIERÍA	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATOS N°: FT-SST-013
	☑ **SG-SST**
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	

ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST

Fecha: 27 septiembre 2023	**Lugar: OBRA PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL**	
Hora Inicial: 9:00	**Hora Final:**	**Acta No 4**

Agenda	**ASISTENTES:**	**CARGOS:**
• Información de manejo de residuos en obra • Manejo de personal en obra y horarios de trabajo • Se informa sobre la capacitación de primeros auxilios para el mes de septiembre de manejo de extintores • Se realiza la recarga de los extintores con bomberos • Manejo de capacitaciones y charlas en obra	SANDRA MILENA LOPEZ PEREZ	Residente
	EDILBERTO CRUZ	Ingeniero de apoyo
	VIVIANA PULGARIN GARCIA	Asesor SST
	JOSE HERRERA	Oficial

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

- 1. **Información de manejo de residuos en obra**

Se informa sobre el manejo de residuos los puntos ecológicos y los días que pasa la basura en la vereda, esta pendiente de contratar la empresa de retiro de residuos en obra.

- 2. **Manejo de personal en obra y horarios de trabajo**

Se recuerda al grupo que conforma el grupo de COPASST se cuenta con horarios y el manejo de personal para ingreso a obra y actividades a realizar, se informa quien da los permisos en obra en este caso la residente de obra. Los permisos se deben solicita con tiempo y con soportes.

- **3. Se informa sobre la capacitación de primeros auxilios para el mes de septiembre se programa capacitación de manejo de extintores para el mes de octubre.**

Para el mes de septiembre se envía a recargar los extintores en bomberos y la capacitación quedo para el mes de octubre.

- 4. **Manejo de capacitaciones y charlas en obra**

Las capacitaciones y charas SST se realizan en el trascurso del mes cumpliendo con el pan de capacitaciones.

DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

La próxima reunión será para finales del mes de septiembre

CIERRE DE LA REUNIÓN.

Se agradece la asistencia y activa participación de la reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y a cada uno de los aportes realizados.

CONSORCIO DP INGENIERÍA	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATOS N°.	FT-SST-013
	SG-SST	
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Versión: 001

FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
SANDRA MILENA LOPEZ	52716243	Sandra M. Lopez
EDILBERTO CRUZ	1106780087	Edilberto Cruz
JOSE HERRERA	86052495 V/LLO	
VIVIANA PULGARIN	29674796	

517

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 11

REGISTRO DE GESTIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA

518

Recarga de extintores para el mes de septiembre, será entregados el día 10 de octubre con bomberos



Capacitación de manejo de extintores, quedo programado para el día 10 de octubre con bomberos



CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 12

INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO

520

INDUCCIÓN PERSONAL INGRESO SEPTIEMBRE

JPZ estructura				
	NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**
1	Diana Castillo Hernández	1078347869	Inspectora SST	JPZ
2	Neyder Rincón Santana	3121594	Ayudante	JPZ
3	Wilmar David Centeno	1023958971	Oficial	JPZ
4	Diego José Angulo Ballesta	986550	Oficial	JPZ
5	José William Garzón	80396967	Oficial	JPZ
6	Marco Antonio Caballero	3250057	Ayudante	JPZ
7	Duván José Diaz Arregocés	1192798347	Ayudante	JPZ
8	Marco Aurelio Cano	72290019	Ayudante	JPZ
9	Sergio David Huertas	1027521090	Ayudante	JPZ
10	Carlos Eduardo Huertas	1031157773	Ayudante	JPZ

CONSORCIO SD INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL INDUCCIÓN DEL SST/ REINDUCCIÓN DEL SST		
	VERSION:1	FTO-ING-021 SST F01	FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Diana Yasmin Castillo FECHA: 09-09-23

CARGO: Ing. SST. JEFE INMEDIATO:

TEMAS TRATADOS:

Generalidades de la Empresa	/
Políticas y objetivos	/
Aspectos Generales y legales en SST, Deberes y Derechos en SST	/
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo	/
Reglamento de higiene , seguridad Salud en el Trabajo	/
COPASST (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) - Comité de Convivencia	/
Plan de preparación, prevención y respuesta a emergencias.	/
Normas generales para trabajar	/
Factores de riesgos y sus controles	/
Aspectos e impactos ambientales	/
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea (permisos de trabajo, análisis de trabajo seguros)	/
Elementos de Proteccion personal	/
Procedimientos referenciados al proceso	/
Procedimientos de cumplimiento ambiental	/
Peligros y Riesgos inherentes del cargo y control de los mismos	/
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con mi cargo.	/
Reporte de Actos y condiciones Inseguras.	/
Perfil de cargo	/
Reglamento interno de trabajo	/
Reporte de accidentes e incidentes	/

OBSERVACIONES

CONSTANCIA INDUCCIÓN Y COMPROMISOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, Diana Yasmin Castillo identificado (a) con C.C. 1078347869 doy constancia que he recibido la inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. Me considero que estoy capacitado(a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las Normas de seguridad y salud en el trabajo, a utilizar durante mi labor los **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL** que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de Seguridad, la solicitud de entrega o cambio de éstos elementos, cuando se requiera. Igualmente a reportar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo. Cabe decir que **EL NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GENERA GRAVES SANCIONES DE TIPO DISCIPLINARIO Y/O LABORAL, YA QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** en

FIRMA DEL TRABAJADOR: Diana Yasmin

CC: 1078347869

522


CONSORCIO INGENIERIA	FORMATO
	EVALUACION INDUCCIÓN
VERSION -1	

NOMBRE:	Diana Yazmin Cobb	CEDULA:	1078347809
AREA/SECCION:		OFICIO:	

1.Relacione los siguientes Peligros con los Riesgos :

	1	Areas con poca Iluminacion			Torcedura, Esguince
	2	Cable en el piso del sendero peatonal.			Resbalon
	3	Puntilla Sobresaliente en Tabla			Caida de Altura
	4	Piso Humedo			Caida por falta de Iluminacion
	5	Desnivel de Piso y/o Plataforma			Punción o Pinchazo
	6	Lineas de Vida en mal estado			Lesión por caída

2. Mencione los elementos de protección personal que debe tener

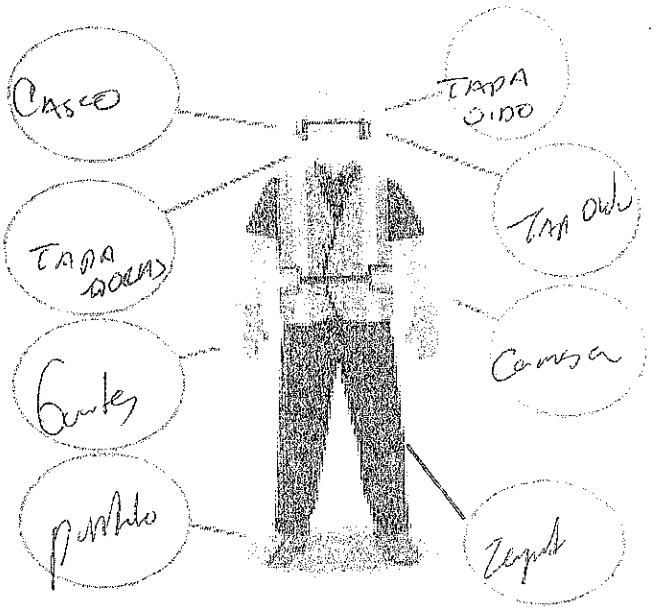

3.Despues de Reportar un Accidente de Trabajo, cual es la entidad que lo atiende marque con una X:

	a.	EPS		c.	Fondo de Pension
	b.	Caja de Compensacion Familiar		d. X	ARL

CONSORCIO DS INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL		
	INDUCCIÓN DEL SST/ REINDUCCIÓN DEL SST		
	VERSION:1	FTO-ING-021 SST F01	FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Neydel Centeno FECHA: 20-09-2023

CARGO: Auxiliar de obra JEFE INMEDIATO:

TEMAS TRATADOS:

Generalidades de la Empresa	✓
Políticas y objetivos	✓
Aspectos Generales y legales en SST, Deberes y Derechos en SST	✓
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓
Reglamento de higiene , seguridad Salud en el Trabajo	✓
COPASST (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) - Comité de Convivencia	
Plan de preparación, prevención y respuesta a emergencias.	✓
Normas generales para trabajar	✓
Factores de riesgos y sus controles	✓
Aspectos e impactos ambientales	✓
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea (permisos de trabajo, análisis de trabajo seguros)	✓
Elementos de Proteccion personal	✓
Procedimientos referenciados al proceso	✓
Procedimientos de cumplimiento ambiental	✓
Peligros y Riesgos inherentes del cargo y control de los mismos	✓
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con mi cargo.	✓
Reporte de Actos y condiciones Inseguras.	✓
Perfil de cargo	✓
Reglamento interno de trabajo	✓
Reporte de accidentes e incidentes	✓

OBSERVACIONES

CONSTANCIA INDUCCIÓN Y COMPROMISOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, Neydel Rincon Identificado (a) con C.C. 3121594, doy constancia que he recibido la inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. Me considero que estoy capacitado(a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las Normas de seguridad y salud en el trabajo, a utilizar durante mi labor los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de Seguridad, la solicitud de entrega o cambio de éstos elementos, cuando se requiera. Igualmente a reportar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo. Cabe decir que EL NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GENERA GRAVES SANCIONES DE TIPO DISCIPLINARIO Y/O LABORAL, YA QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO en

FIRMA DEL TRABAJADOR Neydel R S

CC: 3121594


CONSORCIO DS INGENIERÍA	FORMATO
	EVALUACION INDUCCIÓN
VERSION -1	

NOMBRE:	x Wesdel Rincón	CEDULA:	x 3121594
AREA/SECCION:		OFICIO:	x Auxiliar

1.Relacione los siguientes Peligros con los Riesgos :

	1	Areas con poca Iluminacion			Torcedura, Esguince
	2	Cable en el piso del sendero peatonal.			Resbalon
	3	Puntilla Sobresaliente en Tabla			Caida de Altura
	4	Piso Humedo			Caida por falta de Iluminacion
	5	Desnivel de Piso y/o Plataforma			Punción o Pinchazo
	6	Lineas de Vida en mal estado			Lesión por caída

2. Mencione los elementos de protección personal que debe tener

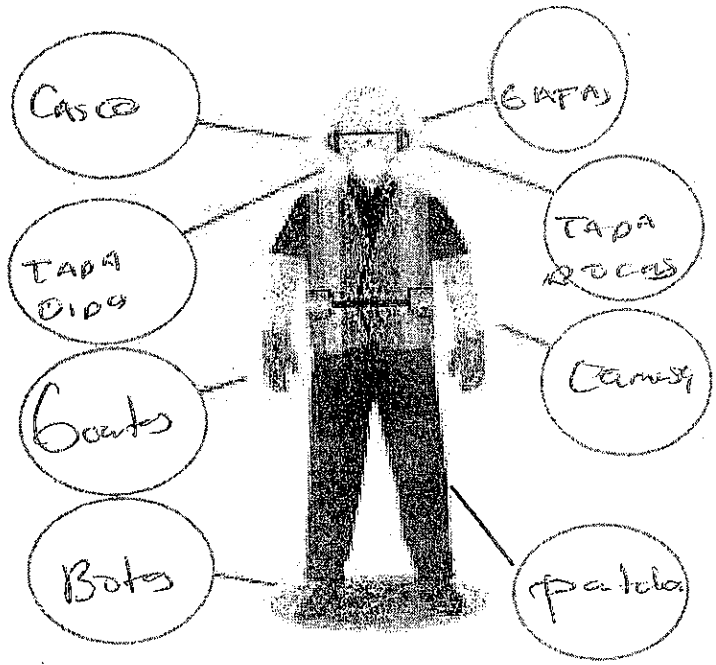

3.Despues de Reportar un Accidente de Trabajo, cual es la entidad que lo atiende marque con una X:

	a.	EPS		c.	Fondo de Pension
	b.	Caja de Compensacion Familiar		d. x	ARL

525

CONSORCIO DP INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL		
	INDUCCIÓN DEL SST/ REINDUCCIÓN DEL SST		
	VERSION:1	FTO-ING-021 SST F01	FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: yo wilma David centeno FECHA: 20 Sept

CARGO: yo JEFE INMEDIATO:

TEMAS TRATADOS:

Generalidades de la Empresa	✓
Políticas y objetivos	✓
Aspectos Generales y legales en SST, Deberes y Derechos en SST	✓
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓
Reglamento de higiene , seguridad Salud en el Trabajo	✓
COPASST (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) - Comité de Convivencia	✓
Plan de preparación, prevención y respuesta a emergencias.	✓
Normas generales para trabajar	✓
Factores de riesgos y sus controles	✓
Aspectos e impactos ambientales	✓
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea (permisos de trabajo, análisis de trabajo seguros)	✓
Elementos de Proteccion personal	✓
Procedimientos referenciados al proceso	✓
Procedimientos de cumplimiento ambiental	✓
Peligros y Riesgos inherentes del cargo y control de los mismos	✓
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con mi cargo.	✓
Reporte de Actos y condiciones Inseguras.	✓
Perfil de cargo	✓
Reglamento interno de trabajo	✓
Reporte de accidentes e incidentes	✓

OBSERVACIONES

CONSTANCIA INDUCCIÓN Y COMPROMISOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, yo wilma David centeno Identificado (a) con C.C. 1023958971, doy constancia que he recibido la inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. Me considero que estoy capacitado(a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las Normas de seguridad y salud en el trabajo, a utilizar durante mi labor los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de Seguridad, la solicitud de entrega o cambio de éstos elementos, cuando se requiera. Igualmente a reportar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo. Cabe decir que EL NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GENERA GRAVES SANCIONES DE TIPO DISCIPLINARIO Y/O LABORAL, YA QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO en

FIRMA DEL TRABAJADOR yo wilma


CC: 1023958971

CONSORCIO INGENIERÍA	FORMATO		
	EVALUACION INDUCCIÓN		
VERSION -1			
NOMBRE:	x william David cameno	CEDULA:	x 1022948411
AREA/SECCION:	x OFICAL lateente.	OFICIO:	x oficia

1.Relacione los siguientes Peligros con los Riesgos :

	1	Areas con poca Iluminacion			Torcedura, Esguince
	2	Cable en el piso del sendero peatonal.			Resbalon
	3	Puntilla Sobresaliente en Tabla			Caida de Altura
	4	Piso Humedo			Caida por falta de Iluminacion
	5	Desnivel de Piso y/o Plataforma			Punción o Pinchazo
	6	Lineas de Vida en mal estado			Lesión por caída

2. Mencione los elementos de protección personal que debe tener

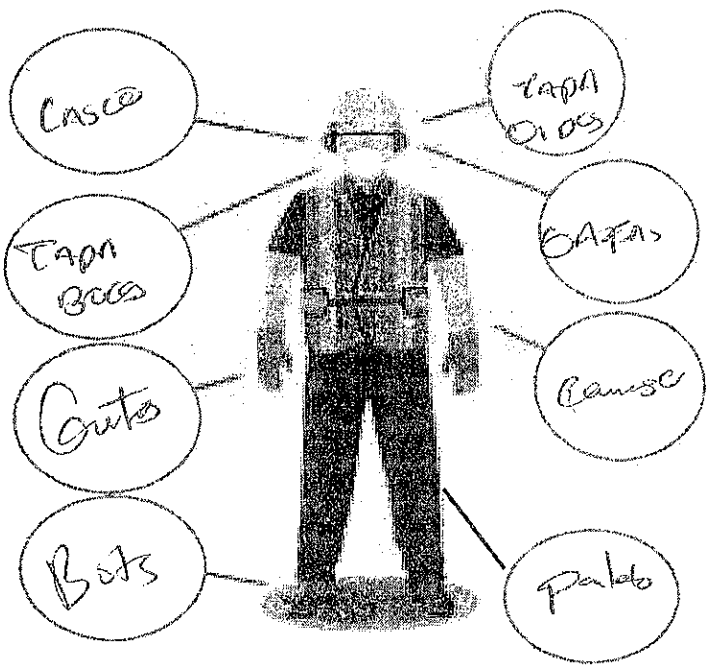

3.Despues de Reportar un Accidente de Trabajo, cual es la entidad que lo atiende marque con una X:

	a.	EPS		c.	Fondo de Pension
	b.	Caja de Compensacion Familiar		x d.	ARL

CONSORCIO DP INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL INDUCCIÓN DEL SST/ REINDUCCIÓN DEL SST		
	VERSION:1	FTO-ING-021 SST F01	FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Diego Angulo Ballesteros FECHA: 4 de octubre

CARGO: 4 de FISAC JEFE INMEDIATO:

TEMAS TRATADOS:

Generalidades de la Empresa	✓
Políticas y objetivos	✓
Aspectos Generales y legales en SST, Deberes y Derechos en SST	✓
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓
Reglamento de higiene , seguridad Salud en el Trabajo	✓
COPASST (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) - Comité de Convivencia	✓
Plan de preparación, prevención y respuesta a emergencias.	✓
Normas generales para trabajar	✓
Factores de riesgos y sus controles	✓
Aspectos e impactos ambientales	✓
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea (permisos de trabajo, análisis de trabajo seguros)	✓
Elementos de Proteccion personal	✓
Procedimientos referenciados al proceso	✓
Procedimientos de cumplimiento ambiental	✓
Peligros y Riesgos inherentes del cargo y control de los mismos	✓
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con mi cargo.	✓
Reporte de Actos y condiciones Inseguras.	✓
Perfil de cargo	✓
Reglamento interno de trabajo	✓
Reporte de accidentes e incidentes	✓

OBSERVACIONES

CONSTANCIA INDUCCIÓN Y COMPROMISOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, Diego Angulo Ballesteros Identificado (a) con C.C 1986550, doy constancia que he recibido la inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. Me considero que estoy capacitado(a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las Normas de seguridad y salud en el trabajo, a utilizar durante mi labor los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de Seguridad, la solicitud de entrega o cambio de éstos elementos, cuando se requiera. Igualmente a reportar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo. Cabe decir que EL NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GENERA GRAVES SANCIONES DE TIPO DISCIPLINARIO Y/O LABORAL, YA QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO en

FIRMA DEL TRABAJADOR:

CC: 1986550

528

CONSORCIO INGENIERÍA

FORMATO

EVALUACION INDUCCIÓN


VERSION -1

NOMBRE:	Diego Angulo	CEDULA:	98655 [illegible]
AREA/SECCION:	Y	OFICIO:	YOFISAR

1.Relácione los siguientes Peligros con los Riesgos :

	1	Areas con poca Iluminacion			Torcedura, Esguince
	2	Cable en el piso del sendero peatonal.			Resbalon
	3	Puntilla Sobresaliente en Tabla			Caida de Altura
	4	Piso Humedo			Caida por falta de Iluminacion
	5	Desnivel de Piso y/o Plataforma			Punción o Pinchazo
	6	Lineas de Vida en mal estado			Lesión por caída

2. Mencione los elementos de protección personal que debe tener

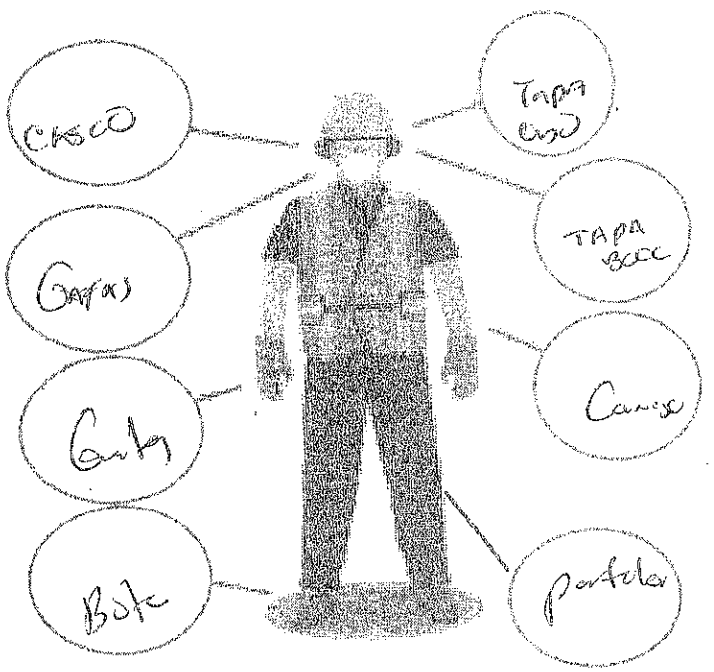

3.Despues de Reportar un Accidente de Trabajo, cual es la entidad que lo atiende marque con una X:

	a.	EPS		c.	Fondo de Pension
	b.	Caja de Compensacion Familiar		d.	ARL

529

CONSORCIO INGENIERIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL		
	INDUCCIÓN DEL SST/ REINDUCCIÓN DEL SST		
	VERSION:1	FTO-ING-021 SST F01	FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDUCCIÓN [ ] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Jose William Gonzalez FECHA: 26-09-2023

CARGO: Oficial JEFE INMEDIATO:

TEMAS TRATADOS:

Generalidades de la Empresa	✓
Políticas y objetivos	✓
Aspectos Generales y legales en SST, Deberes y Derechos en SST	✓
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓
Reglamento de higiene , seguridad Salud en el Trabajo	✓
COPASST (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) - Comité de Convivencia	✓
Plan de preparación, prevención y respuesta a emergencias.	✓
Normas generales para trabajar	✓
Factores de riesgos y sus controles	✓
Aspectos e impactos ambientales	✓
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea (permisos de trabajo, análisis de trabajo seguros)	✓
Elementos de Proteccion personal	✓
Procedimientos referenciados al proceso	✓
Procedimientos de cumplimiento ambiental	✓
Peligros y Riesgos inherentes del cargo y control de los mismos	✓
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con mi cargo.	✓
Reporte de Actos y condiciones Inseguras.	✓
Perfil de cargo	✓
Reglamento interno de trabajo	✓
Reporte de accidentes e incidentes	✓

OBSERVACIONES

CONSTANCIA INDUCCIÓN Y COMPROMISOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, Jose William Gonzalez Identificado (a) con C.C. 80396962 doy constancia que he recibido la inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. Me considero que estoy capacitado(a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las Normas de seguridad y salud en el trabajo, a utilizar durante mi labor los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de Seguridad, la solicitud de entrega o cambio de éstos elementos, cuando se requiera. Igualmente a reportar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo. Cabe decir que EL NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GENERA GRAVES SANCIONES DE TIPO DISCIPLINARIO Y/O LABORAL, YA QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO en

FIRMA DEL TRABAJADOR

CC: 80396962


CONSORCIO INGENIERÍA	FORMATO
	EVALUACION INDUCCIÓN
VERSION -1	

NOMBRE:	x Jose william Garzon	CEDULA:	80396962
AREA/SECCION:	Y Oficial la Tuna	OFICIO:	Varios

1.Relacione los siguientes Peligros con los Riesgos :

	1	Areas con poca Iluminacion		1	Torcedura, Esguince
	2	Cable en el piso del sendero peatonal.		4	Resbalon
	3	Puntilla Sobresaliente en Tabla		6	Caida de Altura
	4	Piso Humedo		2	Caida por falta de Iluminacion
	5	Desnivel de Piso y/o Plataforma		3	Punción o Pinchazo
	6	Lineas de Vida en mal estado		5	Lesión por caída

2. Mencione los elementos de protección personal que debe tener

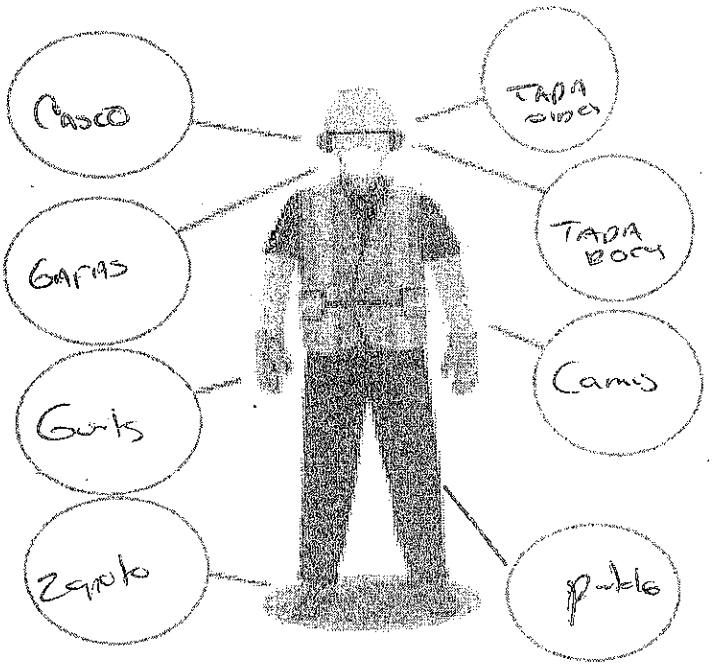

3.Despues de Reportar un Accidente de Trabajo, cual es la entidad que lo atiende marque con una X:

	a.	EPS		c.	Fondo de Pension
	b.	Caja de Compensacion Familiar		d. X	ARL

CONSORCIO BP INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL		
	INDUCCIÓN DEL SST/ REINDUCCIÓN DEL SST		
	VERSION:1	FTO-ING-021 SST F01	FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: y Marco Antonio Caballero R FECHA: 20-9 2023

CARGO: y Auxiliar JEFE INMEDIATO:

TEMAS TRATADOS:

Generalidades de la Empresa	✓
Políticas y objetivos	✓
Aspectos Generales y legales en SST, Deberes y Derechos en SST	✓
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓
Reglamento de higiene , seguridad Salud en el Trabajo	✓
COPASST (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) - Comité de Convivencia	✓
Plan de preparación, prevención y respuesta a emergencias.	✓
Normas generales para trabajar	✓
Factores de riesgos y sus controles	✓
Aspectos e impactos ambientales	✓
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea (permisos de trabajo, análisis de trabajo seguros)	✓
Elementos de Proteccion personal	✓
Procedimientos referenciados al proceso	✓
Procedimientos de cumplimiento ambiental	✓
Peligros y Riesgos inherentes del cargo y control de los mismos	✓
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con mi cargo.	✓
Reporte de Actos y condiciones Inseguras.	✓
Perfil de cargo	✓
Reglamento interno de trabajo	✓
Reporte de accidentes e incidentes	✓

OBSERVACIONES

CONSTANCIA INDUCCIÓN Y COMPROMISOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, y Marco A Caballero R Identificado (a) con C.C. 3.250.057 doy constancia que he recibido la inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. Me considero que estoy capacitado(a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las Normas de seguridad y salud en el trabajo, a utilizar durante mi labor los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de Seguridad, la solicitud de entrega o cambio de éstos elementos, cuando se requiera. Igualmente a reportar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo. Cabe decir que EL NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GENERA GRAVES SANCIONES DE TIPO DISCIPLINARIO Y/O LABORAL, YA QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO en

FIRMA DEL TRABAJADOR

CC: y 3.250.057


CONSORCIO DP INGENIERÍA	FORMATO
	EVALUACION INDUCCIÓN
VERSION -1	

NOMBRE:	X Marco A Caballero	CEDULA:	X 3250657
AREA/SECCION:	la fuente.	OFICIO:	X Aux. Piar

1.Relacione los siguientes Peligros con los Riesgos :

	1	Areas con poca Iluminacion			Torcedura, Esguince
	2	Cable en el piso del sendero peatonal.			Resbalon
	3	Puntilla Sobresaliente en Tabla			Caida de Altura
	4	Piso Humedo			Caida por falta de Iluminacion
	5	Desnivel de Piso y/o Plataforma			Punción o Pinchazo
	6	Lineas de Vida en mal estado			Lesión por caída

2. Mencione los elementos de protección personal que debe tener

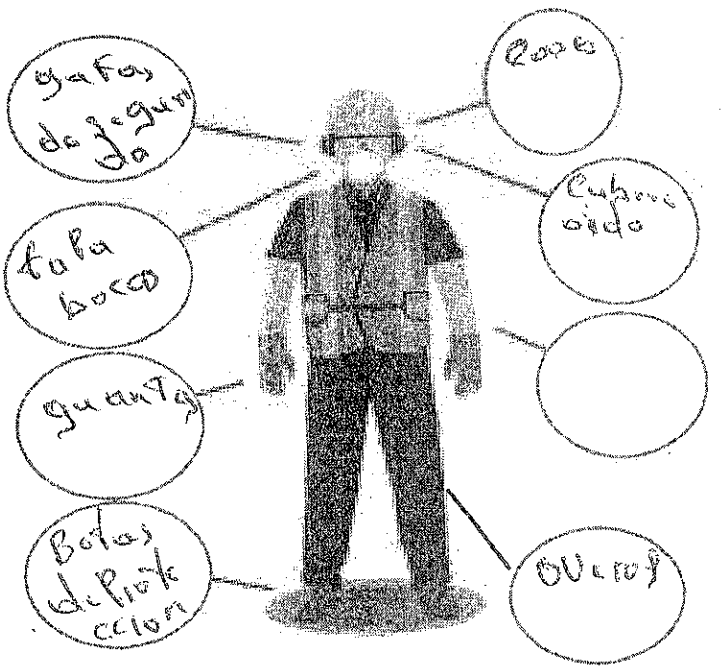

3.Despues de Reportar un Accidente de Trabajo, cual es la entidad que lo atiende marque con una X:

	a.	EPS		c.	Fondo de Pension
	b.	Caja de Compensacion Familiar		d. X	ARL

CONSORCIO ESP INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL		
	INDUCCIÓN DEL SST/ REINDUCCIÓN DEL SST		
	VERSION:1	FTO-ING-021 SST F01	FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: C Duran Soce FECHA: 20/09/2023

CARGO: Ayudante JEFE INMEDIATO:

TEMAS TRATADOS:

Generalidades de la Empresa	✓
Políticas y objetivos	✓
Aspectos Generales y legales en SST, Deberes y Derechos en SST	✓
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓
Reglamento de higiene , seguridad Salud en el Trabajo	✓
COPASST (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) - Comité de Convivencia	✓
Plan de preparación, prevención y respuesta a emergencias.	✓
Normas generales para trabajar	✓
Factores de riesgos y sus controles	✓
Aspectos e impactos ambientales	✓
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea (permisos de trabajo, análisis de trabajo seguros)	✓
Elementos de Proteccion personal	✓
Procedimientos referenciados al proceso	✓
Procedimientos de cumplimiento ambiental	✓
Peligros y Riesgos inherentes del cargo y control de los mismos	✓
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con mi cargo.	✓
Repórte de Actos y condiciones Inseguras.	✓
Perfil de cargo	✓
Reglamento interno de trabajo	✓
Reporte de accidentes e incidentes	✓

OBSERVACIONES

CONSTANCIA INDUCCIÓN Y COMPROMISOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, C Duran Soce Identificado (a) con C.C 1122798347 doy constancia que he recibido la inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. Me considero que estoy capacitado(a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las Normas de seguridad y salud en el trabajo, a utilizar durante mi labor los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de Seguridad, la solicitud de entrega o cambio de éstos elementos, cuando se requiera. Igualmente a reportar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo. Cabe decir que EL NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GENERA GRAVES SANCIONES DE TIPO DISCIPLINARIO Y/O LABORAL, YA QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO en

FIRMA DEL TRABAJADOR C Duran

CC: 1122798346


CONSORCIO INGENIERÍA	FORMATO
	EVALUACION INDUCCIÓN
VERSION -1	

NOMBRE:	Fabian	CEDULA:	1192798347
AREA/SECCION:	A la Fuente.	OFICIO:	Ayudante

1.Relacione los siguientes Peligros con los Riesgos :

	1	Areas con poca Iluminacion			Torcedura, Esguince
	2	Cable en el piso del sendero peatonal.			Resbalon
	3	Puntilla Sobresaliente en Tabla			Caida de Altura
	4	Piso Humedo			Caida por falta de Iluminacion
	5	Desnivel de Piso y/o Plataforma			Punción o Pinchazo
	6	Lineas de Vida en mal estado			Lesión por caída

2. Mencione los elementos de protección personal que debe tener

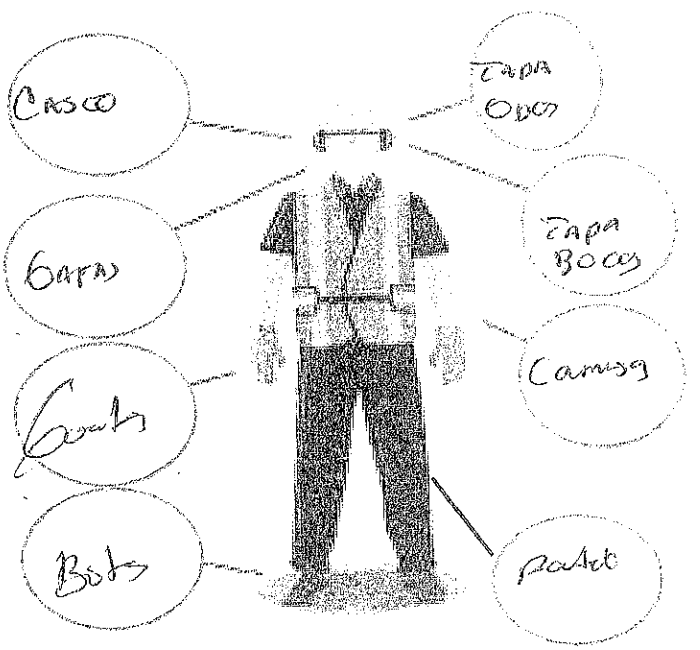

3.Despues de Reportar un Accidente de Trabajo, cual es la entidad que lo atiende marque con una X:

	a.	EPS		c.	Fondo de Pension
	b.	Caja de Compensacion Familiar		d. X	ARL

CONSORCIO ED INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL		
	INDUCCIÓN DEL SST/ REINDUCCIÓN DEL SST		
	VERSION:1	FTO-ING-021 SST F01	FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: X marco cano garcia FECHA: X 29/09/2023

CARGO: X Ayudante JEFE INMEDIATO:

TEMAS TRATADOS:

Generalidades de la Empresa	
Políticas y objetivos	
Aspectos Generales y legales en SST, Deberes y Derechos en SST	
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Reglamento de higiene , seguridad Salud en el Trabajo	
COPASST (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) - Comité de Convivencia	
Plan de preparación, prevención y respuesta a emergencias.	
Normas generales para trabajar	
Factores de riesgos y sus controles	
Aspectos e impactos ambientales	
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea (permisos de trabajo, análisis de trabajo seguros)	
Elementos de Proteccion personal	
Procedimientos referenciados al proceso	
Procedimientos de cumplimiento ambiental	
Peligros y Riesgos inherentes del cargo y control de los mismos	
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con mi cargo.	
Reporte de Actos y condiciones Inseguras.	
Perfil de cargo	
Reglamento interno de trabajo	
Reporte de accidentes e incidentes	

OBSERVACIONES

CONSTANCIA INDUCCIÓN Y COMPROMISOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, X marco cano garcia identificado (a) con C.C X 72290019, doy constancia que he recibido la inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. Me considero que estoy capacitado(a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las Normas de seguridad y salud en el trabajo, a utilizar durante mi labor los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de Seguridad, la solicitud de entrega o cambio de éstos elementos, cuando se requiera. Igualmente a reportar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo. Cabe decir que EL NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GENERA GRAVES SANCIONES DE TIPO DISCIPLINARIO Y/O LABORAL, YA QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO en

FIRMA DEL TRABAJADOR X marco cano garcia


CC: X 72290019

CONSORCIO INGENIERÍA	FORMATO
	EVALUACION INDUCCIÓN
VERSION -1	
NOMBRE: Omaro Cano Garcia	CEDULA: C.72.290.019
AREA/SECCION: Jardin la Fuente	OFICIO: Ayudante

1.Relacione los siguientes Peligros con los Riesgos :

	1	Areas con poca Iluminacion			Torcedura, Esguince
	2	Cable en el piso del sendero peatonal.			Resbalon
	3	Puntilla Sobresaliente en Tabla			Caida de Altura
	4	Piso Humedo			Caida por falta de Iluminacion
	5	Desnivel de Piso y/o Plataforma			Punción o Pinchazo
	6	Lineas de Vida en mal estado			Lesión por caída

2. Mencione los elementos de protección personal que debe tener

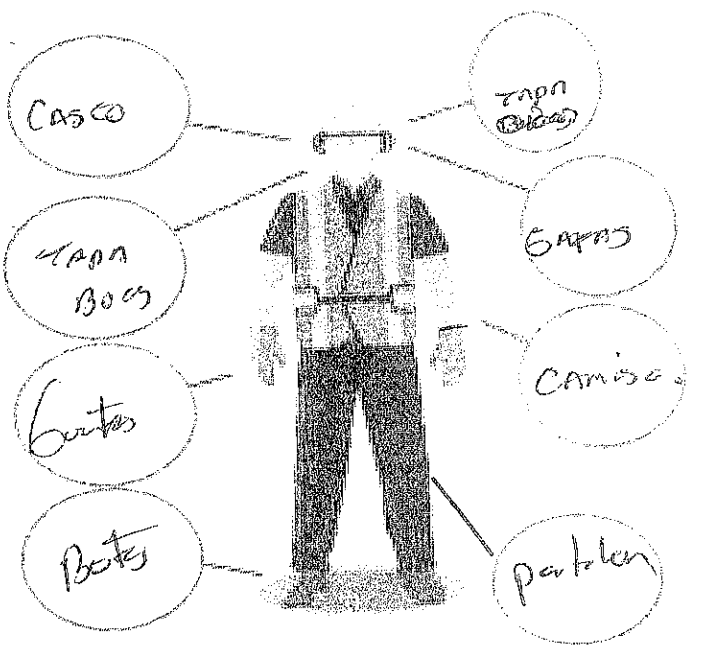

3.Despues de Reportar un Accidente de Trabajo, cual es la entidad que lo atiende marque con una X:

	a.	EPS		c.	Fondo de Pension
	b.	Caja de Compensacion Familiar		d.	X ARL

CONSORCIO DS INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL INDUCCIÓN DEL SST/ REINDUCCIÓN DEL SST		
	VERSION:1	FTO-ING-021 SST F01	FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Y Sergio David Hurtas martinez FECHA: Y 29/09/2023

CARGO: X Ayudante JEFE INMEDIATO: X

TEMAS TRATADOS:

Generalidades de la Empresa	
Políticas y objetivos	/
Aspectos Generales y legales en SST, Deberes y Derechos en SST	/
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo	/
Reglamento de higiene , seguridad Salud en el Trabajo	/
COPASST (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) - Comité de Convivencia	
Plan de preparación, prevención y respuesta a emergencias.	/
Normas generales para trabajar	/
Factores de riesgos y sus controles	/
Aspectos e impactos ambientales	/
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea (permisos de trabajo, análisis de trabajo seguros)	/
Elementos de Proteccion personal	/
Procedimientos referenciados al proceso	/
Procedimientos de cumplimiento ambiental	
Peligros y Riesgos inherentes del cargo y control de los mismos	/
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con mi cargo.	/
Reporte de Actos y condiciones Inseguras.	/
Perfil de cargo	/
Reglamento interno de trabajo	/
Reporte de accidentes e incidentes	/

OBSERVACIONES

CONSTANCIA INDUCCIÓN Y COMPROMISOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, Y Sergio DAVid Hurtas martinez Identificado (a) con C.C. X1027521090, doy constancia que he recibido la inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. Me considero que estoy capacitado(a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las Normas de seguridad y salud en el trabajo, a utilizar durante mi labor los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de Seguridad, la solicitud de entrega o cambio de éstos elementos, cuando se requiera. Igualmente a reportar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo. Cabe decir que EL NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GENERA GRAVES SANCIONES DE TIPO DISCIPLINARIO Y/O LABORAL, YA QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO en

FIRMA DEL TRABAJADOR: Y Sergio

CC: Y 1027521090


CONSORCIO SD INGENIERÍA	FORMATO
	EVALUACION INDUCCIÓN
VERSION -1	

NOMBRE:	Sergio DAVid Hurtas	CEDULA:	1027521090
AREA/SECCION:	Jan la fuente	OFICIO:	Ayudante

1.Relacione los siguientes Peligros con los Riesgos :

	1	Areas con poca Iluminacion		7	Torcedura, Esguince
	2	Cable en el piso del sendero peatonal.			Resbalon
	3	Puntilla Sobresaliente en Tabla			Caida de Altura
	4	Piso Humedo			Caida por falta de Iluminacion
	5	Desnivel de Piso y/o Plataforma			Punción o Pinchazo
	6	Lineas de Vida en mal estado			Lesión por caída

2. Mencione los elementos de protección personal que debe tener

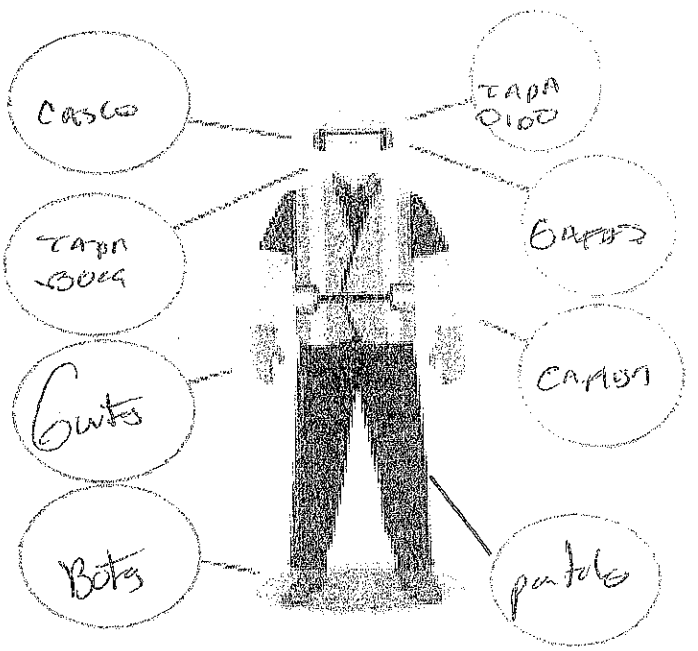

3.Despues de Reportar un Accidente de Trabajo, cual es la entidad que lo atiende marque con una X:

	a.	EPS		c.	Fondo de Pension
	b.	Caja de Compensacion Familiar		d.	ARL

Pal

10

CONSORCIO ESP INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL		
	INDUCCIÓN DEL SST/ REINDUCCIÓN DEL SST		
	VERSION:1	FTO-ING-021 SST F01	FECHA:06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Carlos Eduardo Huertas Martinez FECHA: 19-09-2023

CARGO: Ayudante de obra JEFE INMEDIATO:

TEMAS TRATADOS:

Generalidades de la Empresa	X
Políticas y objetivos	X
Aspectos Generales y legales en SST, Deberes y Derechos en SST	X
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo	X
Reglamento de higiene , seguridad Salud en el Trabajo	X
COPASST (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo) - Comité de Convivencia	X
Plan de preparación, prevención y respuesta a emergencias.	X
Normas generales para trabajar	X
Factores de riesgos y sus controles	X
Aspectos e impactos ambientales	X
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea (permisos de trabajo, análisis de trabajo seguros)	X
Elementos de Proteccion personal	X
Procedimientos referenciados al proceso	X
Procedimientos de cumplimiento ambiental	X
Peligros y Riesgos inherentes del cargo y control de los mismos	X
Aspectos e Impactos Ambientales relacionados con mi cargo.	X
Reporte de Actos y condiciones Inseguras.	X
Perfil de cargo	X
Reglamento interno de trabajo	X
Reporte de accidentes e incidentes	X

OBSERVACIONES

CONSTANCIA INDUCCIÓN Y COMPROMISOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo Carlos Eduardo Huertas Martinez identificado (a) con C.C. 1031157773, doy constancia que he recibido la inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. Me considero que estoy capacitado(a), para cumplir mi labor como me fue asignada de una manera segura y me comprometo a cumplir las Normas de seguridad y salud en el trabajo, a utilizar durante mi labor los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL que me han sido asignados, informarle a mis jefes inmediatos o al personal de Seguridad, la solicitud de entrega o cambio de éstos elementos, cuando se requiera. Igualmente a reportar los riesgos que puedan poner en peligro mi integridad física, mental y social y las de mis compañeros dentro del lugar de trabajo. Cabe decir que EL NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GENERA GRAVES SANCIONES DE TIPO DISCIPLINARIO Y/O LABORAL, YA QUE SE PUEDE CONSIDERAR COMO CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO en

FIRMA DEL TRABAJADOR Carlos Eduardo

CC: 1031157773


540

CONSORCIO SD INGENIERÍA	FORMATO
	EVALUACION INDUCCIÓN
VERSION -1	
NOMBRE:	Carlos Eduardo Herrera
CEDULA:	1031157773
AREA/SECCION:	Jefe la Fuente.
OFICIO:	Ayudante

1.Relacione los siguientes Peligros con los Riesgos :

	1	Areas con poca Iluminacion			Torcedura, Esguince
	2	Cable en el piso del sendero peatonal.			Resbalon
	3	Puntilla Sobresaliente en Tabla			Caida de Altura
	4	Piso Humedo			Caida por falta de Iluminacion
	5	Desnivel de Piso y/o Plataforma			Punción o Pinchazo
	6	Lineas de Vida en mal estado			Lesión por caída

2. Mencione los elementos de protección personal que debe tener

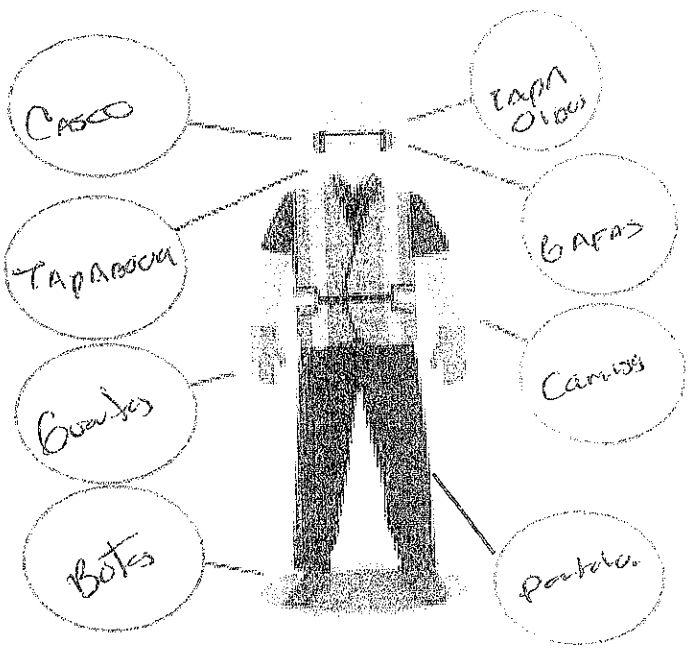

3.Despues de Reportar un Accidente de Trabajo, cual es la entidad que lo atiende marque con una X:

	a.	EPS		c.	Fondo de Pension
	b.	Caja de Compensacion Familiar		d.	ARL

547

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 13

NOTIFICACIÓN DE RIESGO

NOTIFICACIÓN DE RIESGO PERSONAL INGRESO SEPTIEMBRE

JPZ estructura				
	NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**
1	Diana Castillo Hernández	1078347869	Inspectora SST	JPZ
2	Neyder Rincón Santana	3121594	Ayudante	JPZ
3	Wilmar David Centeno	1023958971	Oficial	JPZ
4	Diego José Angulo Ballesta	986550	Oficial	JPZ
5	José William Garzón	80396967	Oficial	JPZ
6	Marco Antonio Caballero	3250057	Ayudante	JPZ
7	Duván José Diaz Arregocés	1192798347	Ayudante	JPZ
8	Marco Aurelio Cano	72290019	Ayudante	JPZ
9	Sergio David Huertas	1027521090	Ayudante	JPZ
10	Carlos Eduardo Huertas	1031157773	Ayudante	JPZ

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS		
	FTO-ING 059	VERSIÓN 01	SEPTIEMBRE -26--2022

OBRA /OFICINA	Jardín la Fuente		
CARGO A DESEMPEÑAR	SST		

FACTOR DE RIESGO	CONDICION O ACTO INSEGURO	FUENTE	ACCION CORRECTIVA
FÍSICOS	Calor, Frío	Medio ambiente (Clima) durante las labores de realizadas en actividades de interventoría	Para el calor, buscar zonas que sean frescas-activas sistemas de ventilación. Para el frío, utilizar chaquetas y elementos que garantice la temperatura adecuada para adelantar las labores de verificación.
	Ruido	Generado por las maquinaria que se encuentra dentro de la zona de intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas ruidosas innecesariamente. De acuerdo con el nivel de presión sonora que se pueda identificar utilizar elementos de protección auditiva durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Energía electromagnética	Iluminación de las luminarias en campamento provisional y definitivo.	Hacer micropausas durante el trabajo con video terminales como pantallas de computador (aproximadamente de cinco minutos por hora seguida de trabajo).
QUIMICOS	Sólidos	Pólvos orgánicos, Polvos inorgánicos, debido al movimiento de maquinaria, volquetas y equipos por las zonas de intervención y durante el cargue de escombros o descargue de materiales.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de material particulado innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Humos	Monoxido y dioxido de carbono generado por las volquetas y maquinaria dentro de la zona intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de humos de combustión innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Gases y vapores	Durante las labores de demolición, utilización de elementos químicos para el oxicorte	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de gases y vapores innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
BIOLOGICOS	Exposición a Hongos, virus y bacterias	Baños, recorridos de inpecciones de seguridad por pozos, sumideros.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con potencial de riesgo innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
ERGONOMICOS	Carga Estática,Posturas prolongadas,Alta carga de trabajo,Alteración en las relaciones interpersonales,Ordenes contradictorias,Trabajo monótono	Debido a la duración de las actividades frente a videoterminales.	Realizar pausas de trabajo durante las actividades realizadas. Considerar aspectos de higiene postural para la correcta posición en el puesto de trabajo. Acondicionamiento de elementos de ergonomía física que garanticen una postura adecuada.
PSICOLABORAL	Estrés laboral	Actividades múltiples diarias y de esfuerzo continuo. Organización en el trabajo. Multiplicidad de operaciones y requerimientos que generan gran cantidad de trabajos varios.	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervencion.
PSICOLABORAL	Organización del tiempo de trabajo	Trabajos que se requieren desarrollar en tapsos de tiempo determinado.	Programación de las actividades dia a dia, con establecimiento de tiempos de acuerdo con el manual de funciones y responsabilidades, programación y priorización de trabajos.
PSICOLABORAL	Relaciones Humanas	Relación con compañeros de trabajo, supervisores, jefe directo.	Mantener buenas relaciones y comunicación efectiva con colaboradores Actividades colectivas tales como ejercicios, recreación, talleres de relatación.
LOCATIVOS	Caida de personas al mismo nivel	Existen herramientas y otros elementos sobre el piso.	Areas de trabajo libres de objetos, Almacenamiento adecuado de objetos de trabajo, orden y limpieza en forma permanente. Durante la visita a zonas de intervención se sugiere el uso de calzado de seguridad o con suela antideslizante.
MECANICOS	Presencia de flujo vehicular y maquinaria en las áreas de intervención	Condición relacionada especificamente con el área de adelanto de obra	Definir y señalizar debidamente las áreas de trabajo. Realizar cruces y giros unicamente por las áreas autorizadas.
PÚBLICO	Delincuencia Desorden público Tránsito	Zona de influencia de las actividades constructivas	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. Señalizar las áreas de trabajo. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención si presenta eventos de desorden público como manifestaciones o marchas.
NATURALES	Deslizamientos Invndación Sismo Tormentas Electricas Granizadas	Condiciones del medio ambiente y la naturaleza que puedan presentarse en cualquier momento durante la jornada laboral	Identificar los puntos de encuentro dentro de la oficina y por fuera de ella durante las visitas a zonas de intervención estar atento a las condiciones ambientales que puedan presentarse, para retirarse de la zona inmediatamente.

Hago constar que me han informado las Funciones y Responsabilidades del cargo que desempeño, comprometiendome a cumplirlas. Igualmente, dejo constancia que recibí inducción y fui notificado de los Riesgos inherentes a mi cargo.

NOTIFICADO:		QUIEN NOTIFICA:	
FIRMA	Diana Yasmin C.	NOMBRE	Diana Yasmin Castillo Hernández
NOMBRE:	Diana Yasmin Castillo Hernández	CARGO	SST
	FECHA DE NOTIFICACIÓN: 09-09-23		

CONSORCIO INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

FTO-ING 059	VERSIÓN 01	SEPTIEMBRE -26--2022

OBRA /OFICINA: Jardín la Fuente

CARGO A DESEMPEÑAR: Auxiliar de obra

FACTOR DE RIESGO	CONDICION O ACTO INSEGURO	FUENTE	ACCION CORRECTIVA
FÍSICOS	Calor, Frio	Medio ambiente (Clima) durante las labores de realizadas en actividades de interventoria	Para el calor, buscar zonas que sean frescas activas sistemas de ventilacion. Para el frio, utilizar chaquetas y elementos que garantice la temperatura adecuada para adelantar las labores de verificación.
	Ruido	Generado por los maquinaria que se encuentra dentro de la zona de intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas ruidosas innecesariamente. De acuerdo con el nivel de presión sonora que se pueda identificar utilizar elementos de protección auditiva durante la permanencia en zonas de intervención.
	Energía electromagnética	Iluminación de las luminarias en campamento provisional y definitivo.	Hacer micropausas durante el trabajo con video terminales como pantallas de computador (aproximadamente de cinco minutos por hora seguida de trabajo).
QUIMICOS	Sólidos	Pólvos orgánicos, Polvos inorgánicos, debido al movimiento de maquinaria, volquetas y equipos por las zonas de intervención y durante el cargue de escombros o descargue de materiales.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de material particulado innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención
	Humos	Monoxido y dioxido de carbono generado por las volquetas y maquinaria dentro de la zona intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de humos de combustión innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
	Gases y vapores	Durante las labores de demolición, utilización de elementos químicos para el oxicorte	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de gases y vapores innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
BIOLOGICOS	Exposición a Hongos, virus y bacterias	Baños, recorridos de inpecciones de seguridad por pozos, sumideros.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con potencial de riesgo innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
ERGONOMICOS	Carga Estática,Posturas prolongadas,Alta carga de trabajo,Alteración en las relaciones interpersonales,Ordenes contradictorias,Trabajo monótono	Debido a la duración de las actiuidades frente a videoterminales.	Realizar pausas de trabajo durante las actividades realizadas. Considerar aspectos de higiene postural para la correcta posición en el puesto de trabajo. Acondicionamiento de elementos de ergonomia física que garanticen una postura adecuada.
PSICOLABORAL	Estrés laboral	Actividades múltiples diarias y de esfuerzo continuo. Organización en el trabajo. Multiplizidad de operaciones y requerimientos que generan gran cantidad de trabajos varios.	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. No descuidar sus objetos personales o elementos de trauajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervencion
PSICOLABORAL	Organización del tiempo de trabajo	Trabajos que se requieren desarrollar en lapsos de tiempo determinado.	Programación de las actividades día a día, con establecimiento de tiempos de acuerdo con el manual de funciones y responsabilidades, programación y priorización de trabajos.
PSICOLABORAL	Relaciones Humanas	Relación con compañeros de trabajo, supervisores, jefe directo.	Mantener buenas relaciones y comunicación efectiva con colaboradores Actividades colectivas tales como ejercicios, recreación, talleres de relalación.
LOCATIVOS	Caida de personas al mismo nivel	Existen herramientas y otros elemenos sobre el piso.	Areas de trabajo libres de objetos. Almacenamiento adecuado de objetos de trabajo, orden y limpieza en forma permanente Durante la visita a zonas de intervención se sugiere el uso de calzado de seguridad o con suela antideslizante.
MECANICOS	Presencia de Flujo vehicular y maquinaria en las áreas de intervención	Condición relacionada especificamente con el área de adelanto de obra	Definir y señalizar debidamente las áreas de trabajo. Realizar cruces y otros unicamente por las áreas autorizadas.
PÚBLICO	Delincuencia Desorden público Tránsito	Zona de influencia de las actividades constructivas	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. Señalizar las áreas de trabajo. No descuidar sus objetos personales ,o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención si presenta eventos de desorden público como manifestaciones o marchas.
NATURALES	Deslizamientos Inundación Sismo Tormentas Electricas Granizadas	Condiciones del medio ambiente y la naturaleza que puedan presentarse en cualquier momento durante la jornada laboral	Identificar los puntos de encuentro dentro de la oficina y por fuera de ella durante las visitas a zonas de intervención estar atento a las condiciones ambientales que puedan presentarse, para retirarse de la zona inmediatamente.

Hago constar que me han informado las Funciones y Responsabilidades del cargo que desempeño, comprometiendome a cumplirlas. Igualmente, dejo constancia que recibí inducción y fui notificado de los Riesgos inherentes a mi cargo.

NOTIFICADO:	QUIEN NOTIFICA:
FIRMA: Yurley Mendez R S	NOMBRE: Vivian P E
NOMBRE: Yurley Mendez	CARGO: SST
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 20-09-2023	

CONSORCIO 5 INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

FTO-ING 059	VERSIÓN 01	SEPTIEMBRE -26--2022

OBRA /OFICINA: Tadra la Fuente

CARGO A DESEMPEÑAR: OFICINA

FACTOR DE RIESGO	CONDICIÓN O ACTO INSEGURO	FUENTE	ACCION CORRECTIVA
FÍSICOS	Calor, Frío	Medio ambiente (Clima) durante las labores de realizadas en actividades de interventoría	Para el calor, buscar zonas que sean frescas-activas sistemas de ventilacion. Para el frio, utilizar chaquetas y elementos que garantice la temperatura adecuada para adelantar las labores de verificación.
	Ruido	Generado por los maquinaría que se encuentra dentro de la zona de intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas ruidosas innecesariamente. De acuerdo con el nivel de presión sonora que se pueda identificar utilizar elementos de protección auditiva durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Energía electromagnética	Iluminación de las luminarias en campamento provisional y definitivo.	Hacer micropausas durante el trabajo con video terminales como pantallas de computador (aproximadamente de cinco minutos por hora seguida de trabajo).
QUIMICOS	Sólidos	Polvos orgánicos, Polvos inorgánicos, debido al movimiento de maquinaria, volqvetas y equipos por las zonas de intervención y durante el cargue de escombros o descargue de materiales.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de material particulado innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Humos	Monoxido y dioxido de carbono generado por las volquetas y maquinaria dentro de la zona intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de humos de combustión innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Gases y vapores	Durante las labores de demolición, utilización de elementos químicos para el oxicorte	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de gases y vapores innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
BIOLOGICOS	Exposición a Hongos, virus y bacterias	Baños, recorridos de inpecciones de seguridad por pozos, sumideros.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con potencial de riesgo innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
ERGONOMICOS	Carga Estática,Posturas prolongadas,Alta carga de trabajo,Alteración en las relaciones interpersonales,Ordenes contradictorias,Trabajo monótono	Debido a la duración de las actividades frente a videoterminales.	Realizar pausas de trabajo durante las actividades realizadas. Considerar aspectos de higiene postural para la correcta posición en el puesto de trabajo. Acondicionamiento de elementos de ergonomía física que garanticen una postura adecuada.
PSICOLABORAL	Estrés laboral	Actividades múltiples diarias y de esfuerzo continuo. Organización en el trabajo. Multiplicidad de operaciones y requerimientos que generan gran cantidad de trabajos varios.	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención.
PSICOLABORAL	Organización del tiempo de trabajo	Trabajos que se requieren desarrollar en lapsos de tiempo determinado.	Programación de las actividades día a día, con establecimiento de tiempos de acuerdo con el manual de funciones y responsabilidades, programación y priorización de trabajos.
PSICOLABORAL	Relaciones Humanas	Relación con compañeros de trabajo, supervisores, jefe directo.	Mantener buenas relaciones y comunicación efectiva con colaboradores Actividades colectivas tales como ejercicios, recreación, talleres de relajación.
LOCATIVOS	Caida de personas al mismo nivel	Existen herramientas y otros elementos sobre el piso.	Areas de trabajo libres de objetos. Almacenamiento adecuado de objetos de trabajo, orden y limpieza en forma permanente. Durante la visita a zonas de intervención se sugiere el uso de calzado de seguridad o con suela antideslizante
MECANICOS	Presencia de Flujo vehicular y maquinaria en las áreas de intervención	Condición relacionada especificamente con el área de adelanto de obra	Definir y señalizar debidamente las áreas de trabajo. Realizar cruces y giros unicamente por las áreas autorizadas.
PÚBLICO	Delincuencia Desorden público Tránsito	Zona de influencia de las actividades constructivas	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. Señalizar las áreas de trabajo. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención si presenta eventos de desorden público como manifestaciones o marchas.
NATURALES	Deslizamientos Inundación Sismo Tormentas Electricas Granizadas	Condiciones del medio ambiente y la naturaleza que puedan presentarse en cualquier momento durante la jornada laboral	Identificar los puntos de encuentro dentro de la oficina y por fuera de ella durante las visitas a zonas de intervención estar atento a las condiciones ambientales que puedan presentarse, para retirarse de la zona inmediatamente.

Hago constar que me han informado las funciones y Responsabilidades del cargo que desempeño, comprometiendome a cumplirlas. Igualmente, dejo constancia que recibí inducción y fui notificado de los Riesgos Inherentes a mi cargo.

NOTIFICADO:	QUIEN NOTIFICA:
FIRMA: Jeimmy Centeno	NOMBRE:
NOMBRE:	CARGO: SST
FECHA DE NOTIFICACIÓN: 20-09-2023	

CONSORCIO SD INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

FTO-ING 059	VERSIÓN 01	SEPTIEMBRE -26--2022

OBRA /OFICINA: Leon la Fuente.

CARGO A DESEMPEÑAR: Of SST

FACTOR DE RIESGO	CONDICION O ACTO INSEGURO	FUENTE	ACCION CORRECTIVA
FÍSICOS	Calor, Frio	Medio ambiente (Clima) durante las labores de realizadas en actividades de interventoria	Para el calor, buscar zonas que sean frescas-activas sistemas de ventilacion. Para el frio, utilizar chaquetas y elementos que garantice la temperatura adecuada para adelantar las labores de verificación.
	Ruido	Generado por los maquinaria que se encuentra dentro de la zona de intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas ruidosas innecesariamente. De acuerdo con el nivel de presión sonora que se pueda identificar utilizar elementos de protección auditiva durante la permanencia en zonas de intreverción.
	Energía electromagnética	Iluminación de las luminarias en campamento provisional y definitivo.	Hacer micropausas durante el trabajo con video terminales como pantallas de computador (aproximadamente de cinco minutos por hora seguida de trabajo).
QUIMICOS	Sólidos	Póluos orgánicos, Polvos inorgánicos, debido al movimiento de maquinaria, volquetas y equipos por las zonas de intervención y durante el cargue de escombros o descargue de materiales.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de material particulado innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Humos	Monoxido y dioxido de carbono generado por las volquetas y maquinaria dentro de la zona intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de humos de combustión innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Gases y vapores	Durante las labores de demolición, utilización de elementos químicos para el oxicorte	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de gases y vapores innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
BIOLOGICOS	Exposición a Hongos, virus y bacterias	Baños, recorridos de inpecciones de seguridad por pozos, sumideros.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con potencial de riesgo innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
ERGONOMICOS	Carga Estática,Posturas prolongadas,Alta carga de trabajo,Alteración en las relaciones interpersonales,Ordenes contradictorias,Trabajo monótono	Debido a la duración de las actividades frente a videoterminales.	Realizar pausas de trabajo durante las actividades realizadas. Considerar aspectos de higiene postural para la correcta posición en el puesto de trabajo. Acondicionamiento de elementos de ergonomía física que garanticen una postura adecuada.
PSICOLABORAL	Estrés laboral	Actividades múltiples diarias y de esfuerzo continuo. Organización en el trabajo. Multiplicidad de operaciones y requerimientos que generan gran cantidad de trabajos varios.	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervencion.
PSICOLABORAL	Organización del tiempo de trabajo	Trabajos que se requieren desarrollar en tapsos de tiempo determinado.	Programación de las actividades día a día, con establecimiento de tiempos de acuerdo con el manual de funciones y responsabilidades, programación y priorización de trabajos.
PSICOLABORAL	Relaciones Humanas	Relación con compañeros de trabajo, supervisores, jefe directo.	Mantener buenas relaciones y comunicación efectiva con colaboradores Actividades colectivas tales como ejercicios, recreación, talleres de relajación.
LOCATIVOS	Caída de personas al mismo nivel	Existen herramientas y otros elementos sobre el piso.	Áreas de trabajo libres de objetos, Almacenamiento adecuado de objetos de trabajo, orden y limpieza en forma permanente. Durante la visita a zonas de intervención se sugiere el uso de calzado de seguridad o con suela antideslizante.
MECANICOS	Presencia de Flujo vehicular y maquinaria en las áreas de intervención	Condición relacionada específicamente con el área de adelanto de obra	Definir y señalizar debidamente las áreas de trabajo. Realizar cruces u giros unicamente por las áreas autorizadas. Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención.
PÚBLICO	Delincuencia Desorden público Tránsito	Zona de influencia de las actividades constructivas	Señalizar las áreas de trabajo. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención si presenta eventos de desorden público como manifestaciones o marchas.
NATURALES	Deslizamientos Inundación Sismo Tormentas Electricas Granizadas	Condiciones del medio ambiente y la naturaleza que puedan presentarse en cualquier momento durante la jornada laboral	Identificar los puntos de encuentro dentro de la oficina y por fuera de ella durante las visitas a zonas de intervención estar atento a las condiciones ambientales que puedan presentarse, para retirarse de la zona inmediatamente.



Hago constar que me han informado las Funciones y Responsabilidades del cargo que desempeño, comprometiéndome a cumplirlas. Igualmente, dejo constancia que recibí inducción y fui notificado de los Riesgos inherentes a mi cargo.

NOTIFICADO:		QUIEN NOTIFICA:
FIRMA:		NOMBRE:
NOMBRE: Diego Rubio.		CARGO: SST
	FECHA DE NOTIFICACIÓN:	

CONSORCIO 5D INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS		
	FTO-ING 059	VERSIÓN 01	SEPTIEMBRE -26--2022

OBRA /OFICINA	Obra		
CARGO A DESEMPEÑAR	Residente		
FACTOR DE RIESGO	CONDICIÓN O ACTO INSEGURO	FUENTE	ACCIÓN CORRECTIVA
FÍSICOS	Calor, Frío	Medio ambiente (Clima) durante las labores de realizadas en actividades de interventoria	Para el calor, buscar zonas que sean frescas-activas sistemas de ventilacion. Para el frío, utilizar chaquetas y elementos que garantice la temperatura adecuada para adelantar las labores de verificación.
	Ruido	Generado por los maquinaria que se encuentra dentro de la zona de intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas ruidosas innecesariamente. De acuerdo con el nivel de presión sonora que se pueda identificar utilizar elementos de protección auditiva durante la permanencia en zonas de intervención.
	Energía electromagnética	Iluminación de las luminarias en campamento provisional y definitivo.	Hacer micropausas durante el trabajo con video terminales como pantallas de computador (aproximadamente de cinco minutos por hora seguida de trabajo).
QUÍMICOS	Sólidos	Pólvos orgánicos, Polvos inorgánicos, debido al movimiento de maquinaria, volquetas y equipos por las zonas de intervención y durante el cargue de escombros o descargue de materiales.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de material particulado innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
	Humos	Monoxido y dioxido de carbono generado por las volquetas y maquinaria dentro de la zona intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de humos de combustión innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
	Gases y vapores	Durante las labores de demolición, utilización de elementos químicos para el oxicorte	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de gases y vapores innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
BIOLÓGICOS	Exposición a Hongos, virus y bacterias	Baños, recorridos de inpecciones de seguridad por pozos, sumideros.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con potencial de riesgo innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
ERGONÓMICOS	Carga Estática,Posturas prolongadas,Alta carga de trabajo,Alteración en las relaciones interpersonales,Ordenes contradictorias,Trabajo monótono	Debido a la duración de las actividades frente a videoterminales.	Realizar pausas de trabajo durante las actividades realizadas. Considerar aspectos de higiene postural para la correcta posición en el puesto de trabajo. Acondicionamiento de elementos de ergonomía física que garanticen una postura adecuada
PSICOLABORAL	Estrés laboral	Actividades múltiples diarias y de esfuerzo continuo. Organización en el trabajo. Multiplicidad de operaciones y requerimientos que generan gran cantidad de trabajos varios.	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervencion.
PSICOLABORAL	Organización del tiempo de trabajo	Trabajos que se requieren desarrollar en lapsos de tiempo determinado.	Programación de las actividades día a día, con establecimiento de tiempos de acuerdo con el manual de funciones y responsabilidades, programación y priorización de trabajos.
PSICOLABORAL	Relaciones Humanas	Relación con compañeros de trabajo, supervisores, jefe directo.	Mantener buenas relaciones y comunicación efectiva con colaboradores Actividades colectivas tales como ejercicios, recreación, talleres de relajación
LOCATIVOS	Caída de personas al mismo nivel	Existen herramientas y otros elementos sobre el piso	Areas de trabajo libres de objetos. Almacenamiento adecuado de objetos de trabajo, orden y limpieza en forma permanente. Durante la visita a zonas de intervención se sugiere el uso de calzado de seguridad o con suela antideslizante
MECÁNICOS	Presencia de Flujo vehicular y maquinaria en las áreas de intervención	Condición relacionada especificamente con el área de adelanto de obra	Definir y señalizar debidamente las áreas de trabajo. Realizar cruces y giros unicamente por las áreas autorizadas.
PÚBLICO	Delincuencia Desorden público Tránsito	Zona de influencia de las actividades constructivas	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. Señalizar las áreas de trabajo. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención si presenta eventos de desorden público como manifestaciones o marchas.
NATURALES	Deslizamientos Inundación Sismo Tormentas Electricas Granizadas	Condiciones del medio ambiente y la naturaleza que puedan presentarse en cualquier momento durante la jornada laboral	Identificar los puntos de encuentro dentro de la oficina y por fuera de ella durante las visitas a zonas de intervención estar atento a las condiciones ambientales que puedan presentarse, para retirarse de la zona inmediatamente.

Hago constar que me han informado las Funciones y Responsabilidades del cargo que desempeño, comprometiendome a cumplirlas lealmente, dejo constancia que recibí inducción y fui notificado de los Riesgos inherentes a mi cargo.

NOTIFICADO:			QUIEN NOTIFICA:
FIRMA			NOMBRE 
NOMBRE:	Jose William Cano		CARGO SST
	FECHA DE NOTIFICACIÓN:	20-09-2023	

CONSORCIO 5D INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

FTO-ING 059	VERSIÓN 01	SEPTIEMBRE -26--2022

OBRA /OFICINA: Lotn la Fruit.

CARGO A DESEMPEÑAR: x Auxiliar o Ayudante

FACTOR DE RIESGO	CONDICION O ACTO INSEGURO	FUENTE	ACCION CORRECTIVA
FÍSICOS	Calor, Frío	Medio ambiente (Clima) durante las labores de realizadas en actividades de interventoría	Para el calor, buscar zonas que sean frescas-activas sistemas de ventilacion. Para el frío, utilizar chaquetas y elementos que garantice la temperatura adecuada para adelantar las labores de verificación.
	Ruido	Generado por los maquinaria que se encuentra dentro de la zona de intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas ruidosas innecesariamente. De acuerdo con el nivel de presión sonora que se pueda identificar utilizar elementos de protección auditiva durante la permanencia en zonas de intreuención
	Energía electromagnética	Iluminación de las luminarias en campamento provisional y definitivo.	Hacer micropausas durante el trabajo con video terminales como pantallas de computador (aproximadamente de cinco minutos por hora seguida de trabajo).
QUIMICOS	Sólidas	Pólvos orgánicos, Polvos inorgánicos, debido al movimiento de maquinaria, volquetas y equipos por las zonas de intervención y durante el cargue de escombros o descargue de materiales.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de material particulado innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Humos	Monoxido y dioxido de carbono generado por las volquetas y maquinaria dentro de la zona intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de humos de combustión innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Gases y vapores	Durante las labores de demolición, utilización de elementos químicos para el oxicorte	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de gases y vapores innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
BIOLOGICOS	Exposición a Hongos, virus y bacterias	Baños, recorridos de inpecciones de seguridad por pozos, sumideros.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con potencial de riesgo innecesariamente. De acuerda con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
ERGONOMICOS	Carga Estática,Posturas prolongadas,Alta carga de trabajo,Alteración en las relaciones interpersonales,Ordenes contradictorias,Trabajo monótono	Debido a la duración de las actividades frente a videoterminales.	Realizar pausas de trabajo durante las actividades realizadas Considerar aspectos de higiene postural para la correcta posición en el puesto de trabajo. Acondicionamiento de elementos de ergonomía física que garanticen una postura adecuada.
PSICOLABORAL	Estrés laboral	Actividades múltiples diarias y de esfuerzo continuo. Organización en el trabajo. Multiplicidad de operaciones y requerimientos que generan gran cantidad de trabajos varios.	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención
PSICOLABORAL	Organización del tiempo de trabajo	Trabajos que se requieren desarrollar en lapsos de tiempo determinadn.	Programación de las actividades día a día, con establecimiento de tiempos de acuerdo con el manual de funciones y responsabilidades, programación y priorización de trabajos.
PSICOLABORAL	Relaciones Humanas	Relación con compañeros de trabaje, supervisores, jefe directo.	Mantener buenas relaciones y comunicación efectiva con colaboradores Actividades colectivas tales como ejercicios, recreación, Talleres de relajación.
LOCATIVOS	Caída de personas al mismo nivel	Existen herramientas y otros elementos sobre el piso.	Areas de trabajo libres de objetos, almacenamiento adecuado de objetos de trabajo, orden y limpieza en forma permanente. Durante la visita a zonas de intervención se sugiere el uso de calzado de seguridad o con suela antideslizante.
MECANICOS	Presencia de Flujo vehicular y maquinaria en las áreas de intervención	Condición relacionada especificamente con el área de adelanto de obra	Definir y señalizar debidamente las áreas de trabajo. Realizar cruces y giros unicamente por las áreas autorizadas.
PÚBLICO	Delincuencia Desorden público Tránsito	Zona de influencia de las actividades constructivas	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. Señalizar las áreas de trabajo. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención si presenta eventos de desorden público como manifestaciones o marchas
NATURALES	Deslizamientos Inundación Sismo Tormentas Electricas Granizadas	Condiciones del medio ambiente y la naturaleza que puedan presentarse en cualquier momento durante la jornada laboral	Identificar los puntos de encuentro dentro de la oficina y por fuera de ella durante las visitas a zonas de intervención estar atento a las condiciones ambientales que puedan presentarse, para retirarse de la zona inmediatamente.

Hago constar que me han informado las Funciones y Responsabilidades del cargo que desempeño, comprometiendome a cumplirlas. Igualmente, dejo constancia que recibí inducción y fui notificado de los Riesgos inherentes a mi cargo.

NOTIFICADO:	QUIEN NOTIFICA:
FIRMA: x	NOMBRE: Viviana Garcia
NOMBRE: x Marco Antonio Caballero Romero	CARGO: SST
FECHA DE NOTIFICACIÓN: x 20-9 2023	

CONSORCIO ESD INGENIERIA

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

FTO-ING 059	VERSIÓN 01	SEPTIEMBRE -26--2022

OBRA /OFICINA: f Jardin la Punta

CARGO A DESEMPEÑAR: f Ayudante

FACTOR DE RIESGO	CONDICION O ACTO INSEGURO	FUENTE	ACCION CORRECTIVA
FÍSICOS	Calor, Frío	Medio ambiente (Clima) durante las labores de realizadas en actividades de interventoría	Para el calor, buscar zonas que sean frescas-activas sistemas de ventilacion. Para el frío, utilizar chaquetas y elementos que garantice la temperatura adecuada para adelantar las labores de verificación.
	Ruido	Generado por los maquinaría que se encuentra dentro de la zona de intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas ruidosas innecesariamente. De acuerdo con el nivel de presión sonora que se pueda identificar utilizar elementos de protección auditiva durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Energía electromagnética	Iluminación de las luminarias en campamento provisional y definitivo.	Hacer micropausas durante el trabajo con uideo terminales como pantallas de computador (aproximadamente de cinco minutos por hora segvida de trabajo).
QUIMICOS	Sólidos	Pólvos orgánicos, Polvos inorgánicos, debido al movimiento de maquinaria, volquetas y equipos por las zonas de intervención y durante el cargue de escombros o descargue de materiales.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de material particulado innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Humos	Monoxido y dioxido de carbono generado por las volquetas y maquinaria dentro de la zona intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de humos de combustión innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Gases y vapores	Durante las labores de demolición, utilización de elementos químicos para el oxicorte	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de gases y vapores innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
BIOLOGICOS	Exposición a Hongos, virus y bacterias	Baños, recorridos de inpecciones de seguridad por pozos, sumideros.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con potenciat de riesgo innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar vtilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
ERGONOMICOS	Carga Estática,Posturas prolongadas,Alta carga de trabajo,Alteración en las relaciones interpersonales, Ordenes contradictorias,Trabajo monótono	Debido a la duración de las actividades frente a videoterminales.	Realizar pausas de trabajo durante las actiuidades realizadas. Considerar aspectos de higiene postural para la correcta posición en el puesto de trabajo. Acondicionamiento de elementos de ergonomía física que garanticen una postura adecuada.
PSICOLABORAL	Estrés laboral	Actividades múltiples diarias y de esfuerzo continuo. Organización en el trabajo. Multiplicidad de operaciones y requerimientos que generan gran cantidad de trabajos varios.	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervencion
PSICOLABORAL	Organización del tiempo de trabajo	Trabajos que se requieren desarrollar en lapsos de tiempo determinado.	Programación de las actividades día a dia, con establecimiento de tiempos de acuerdu con el manual de funciones y responsabilidades, programación y priorización de trabajos.
PSICOLABORAL	Relaciones Humanas	Relación con compañeros de trabajo, supervisores, jefe directo.	Mantener buenas relaciones y comunicación efectiva con colaboradores Actividades colectiuas tales como ejercicios, recreación, talleres de relaiación.
LOCATIVOS	Caída de personas al mismo nivel	Existen herramientas y otros elementos sobre el piso.	Areas de trabajo libres de objetos, Almacenamiento adecuado de objetos de trabajo, orden y limpieza en forma permanente. Durante la visita a zonas de intervención se sugiere el vso de calzado de seguridad o con suela antideslizante.
MECANICOS	Presencia de Flujo vehicular y maquinaria en las áreas de intervención	Condición relacionada especificamente con el área de adelanto de obra	Definir y señalizar debidamente las áreas de trabajo. Realizar cruces y giros unicamente por las áreas autorizadas.
PÚBLICO	Delincuencia Desorden público Tránsito	Zona de influencia de las actividades constructivas	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. Señalizar las áreas de trabajo. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención si presenta eventos de desorden público como manifestacinnes o marchas
NATURALES	Deslizamientos Inundación Sismo Tormentas Electricas Granizadas	Condiciones del medio ambiente y la naturaleza que puedan presentarse en cualquier momento durante la jornada laboral	Identificar los puntos de encuentro dentro de la oficina y por fuera de ella durante las visitas a zonas de intervención estar atento a las condiciones ambientales que puedan presentarse, para retirarse de la zona inmediatamente.

Hago constar que me han Informado las Funciones y Responsabilidades del cargo que desempeño, comprometiendome a cumplirlas. Igualmente, dejo constancia que recibí inducción y fui notificado de los Riesgos inherentes a mi cargo.

NOTIFICADO:

FIRMA: f Darwin Jose

NOMBRE: f Darwin

QUIEN NOTIFICA:

NOMBRE: Ivan F. Gan.

CARGO: SST

FECHA DE NOTIFICACIÓN: f 29 setiebre

CONSORCIO ESD INGENIERIA	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS		
	FTO-ING 059	VERSIÓN 01	SEPTIEMBRE -26--2022

OBRA /OFICINA	Jardín la Fuente		
CARGO A DESEMPEÑAR	X Ay.		
FACTOR DE RIESGO	CONDICION O ACTO INSEGURO	FUENTE	ACCION CORRECTIVA
FÍSICOS	Calor, Frío	Medio ambiente (Clima) durante las labores de realizadas en actividades de interventoría	Para el calor, buscar zonas que sean frescas-activas sistemas de ventilacion. Para el frío, utilizar chaquetas y elementos que garantice la temperatura adecuada para adelantar las labores de verificación.
	Ruido	Generado por los maquinaría que se encuentra dentro de la zona de intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas ruidosas innecesariamente. De acuerdo con el nivel de presión sonora que se pueda identificar utilizar elementos de protección auditiva durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Energía electromagnética	Iluminación de tas luminarias en campamento provisional y definitivo.	Hacer micropausas durante el trabajo con video terminales como pantallas de computador (aproximadamente de cinco minutos por hora seguida de trabajo).
QUIMICOS	Sólidos	Póluos orgánicos, Polvos inorgánicos, debido al movimiento de maquinaria, volquetas y equipos por las zonas de intervención y durante el cargue de escombros o descargue de materiales.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de material particulado innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Humos	Monoxido y dioxido de carbono generado por las volquetas y maquinaria dentro de la zona intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de humos de combustión innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
	Gases y vapores	Durante las labores de demolición, utilización de elementos químicos para el oxicorte	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de gases y vapores innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
BIOLOGICOS	Exposición a Hongos, virus y bacterias	Baños, recorridos de inpecciones de seguridad por pozos, sumideros.	Realizar las actiuidades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con potencial de riesgo innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intrevención.
ERGONOMICOS	Carga Estática,Posturas prolongadas,Alta carga de trabajo,Alteración en las relaciones interpersonales,Ordenes contradictorias,Trabajo monótono	Debido a la duración de las actividades frente a videoterminales.	Realizar pausas de trabajo durante las actividades realizadas. Considerar aspectos de higiene postural para la correcta posición en el puesto de trabajo. Acondicionamiento de elementos de ergonomía física que garanticen una postura adecuada.
PSICOLABORAL	Estrés laboral	Actividades múltiples diarias y de esfuerzo continuo. Organización en el trabajo. Multiplicidad de operaciones y requerimientos que generan gran cantidad de trabajos varios.	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo qve se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervencion.
PSICOLABORAL	Organización del tiempo de trabajo	Trabajos que se requieren desarrollar en lapsos de tiempo determinado.	Programación de las actividades día a día, con establecimiento de tiempos de acuerdo con el manual de funciones y responsabilidades, programación y priorización de trabajos.
PSICOLABORAL	Relaciones Humanas	Relación con compañeros de trabajo, supervisores, jefe directo.	Mantener buenas relaciones y comunicación efectiva con colaboradores Actividades colectivas tales como ejercicios, recreación, talleres de relaiación.
LOCATIVOS	Caida de personas al mismo nivel	Existen herramientas y otros elementos sobre el piso.	Areas de trabajo libres de objetos. Almacenamiento adecuado de objetos de trabajo, orden y limpieza en forma permanente. Durante la visita a zonas de intervención se sugiere el uso de calzado de seguridad o con suela antideslizante.
MECANICOS	Presencia de Flujo vehicular y maquinaria en las áreas de intervención	Condición relacionada especificamente con el área de adelanto de obra	Definir y señalizar debidamente las áreas de trabajo. Realizar cruces u giros unicamente por las áreas autorizadas.
PÚBLICO	Delincuencia Desorden público Tránsito	Zona de influencia de las actividades constructivas	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. Señalizar las áreas de trabajo. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención si presenta eventos de desorden público como manifestaciones o marchas.
NATURALES	Deslizamientos Inundación Sismo Tormentas Electricas Granizadas	Condiciones del medio ambiente y la naturaleza que puedan presentarse en cualquier momento durante la jornada laboral	Identificar los puntos de encuentro dentro de la oficina y por fuera de ella durante las visitas a zonas de intervención estar atento a las condiciones ambientales que puedan presentarse, para retirarse de la zona inmediatamente.

Hago constar que me han informado las Funciones y Responsabilidades del cargo que desempeño, comprometiendome a cumplirlas. Igualmente, dejo constancia que recibí inducción y fui notificado de los Riesgos inherentes a mi cargo.

NOTIFICADO:			QUIEN NOTIFICA:
FIRMA	X Marco Cano García		NOMBRE: Diana P. Cano
NOMBRE:	X Marco Cano García		CARGO: SST
	FECHA DE NOTIFICACIÓN:	X 29/09/2023	

CONSORCIO ESD INGENIERÍA	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS		
	FTO-ING 059	VERSIÓN 01	SEPTIEMBRE -26--2022

OBRA /OFICINA: Jardín la Fuente.

CARGO A DESEMPEÑAR: Ayudante

FACTOR DE RIESGO	CONDICION O ACTO INSEGURO	FUENTE	ACCION CORRECTIVA
FÍSICOS	Calor, Frío	Medio ambiente (Clima) durante las labores de realizadas en actividades de interventoría	Para el calor, buscar zonas que sean frescas-activas sistemas de ventilación. Para el frío, utilizar chaquetas y elementos que garantice la temperatura adecuada para adelantar las labores de verificación.
	Ruido	Generado por los maquinaría que se encuentra dentro de la zona de intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas ruidosas innecesariamente De acuerdo con el nivel de presión sonora que se pueda identificar utilizar elementos de protección auditiva durante la permanencia en zonas de intevención.
	Energía electromagnética	Iluminación de las luminarias en campamento provisional y definitivo.	Hacer micropausas durante el trabajo con video terminales como pantallas de computador (aproximadamente de cinco minutos por hora seguida de trabajo).
QUIMICOS	Sólidos	Pólvos orgánicos, Polvos inorgánicos, debido al movimiento de maquinaria, volquetas y equipos por las zonas de intervención y durante el cargue de escombros o descargue de materiales.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de material particulado innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
	Humos	Monoxido y dioxido de carbono generado por las volquetas y maquinaria dentro de la zona intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de humos de combustión innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
	Gases y vapores	Durante las labores de demolición, utilización de elementos químicos para el oxicorte	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de gases y vapores innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intevención.
BIOLOGICOS	Exposición a Hongos, virus y bacterias	Baños, recorridos de inspecciones de seguridad por pozos, sumideros.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con potencial de riesgo innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
ERGONOMICOS	Carga Estática,Posturas prolongadas,Alta carga de trabajo,Alteración en las relaciones interpersonales,Ordenes contradictorias,Trabajo monótono	Debido a la duración de las actividades frente a videoterminales.	Realizar pausas de trabajo durante las actividades realizadas. Considerar aspectos de higiene postural para la correcta posición en el puesto de trabajo. Acondicionamiento de elementos de ergonomía física que garanticen una postura adecuada
PSICOLABORAL	Estrés laboral	Actividades múltiples diarias y de esfuerzo continuo. Organización en el trabajo. Multiplicidad de operaciones y requerimientos que generan gran cantidad de trabajos varios.	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención.
PSICOLABORAL	Organización del tiempo de trabajo	Trabajos que se requieren desarrollar en lapsos de tiempo determinado.	Programación de las actividades día a día, con establecimiento de tiempos de acuerdo con el manejo de funciones y responsabilidades, programación y priorización de trabajos.
PSICOLABORAL	Relaciones Humanas	Relación con compañeros de trabajo, supervisores, jefe directo.	Mantener buenas relaciones y comunicación efectiva con colaboradores Actividades colectivas tales como ejercicios, recreación, talleres de relajación
LOCATIVOS	Caida de personas al mismo nivel	Existen herramientas y otros elementos sobre el piso.	Áreas de trabajo libres de objetos. Almacenamiento adecuado de objetos de trabajo, orden y limpieza en forma permanente. Durante la visita a zonas de intervención se sugiere el uso de calzado de seguridad o con suela antideslizante.
MECANICOS	Presencia de flujo vehicular y maquinaria en las áreas de intervención	Condición relacionada especificamente con el área de adelanto de obra	Definir y señalizar debidamente las áreas de trabajo. Realizar cruces y otros unicamente por las áreas autorizadas. Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención.
PÚBLICO	Delincuencia Desorden público Tránsito	Zona de influencia de las actividades constructivas	Señalizar las áreas de trabajo. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención si presenta eventos de desorden público como manifestaciones o marchas.
NATURALES	Deslizamientos Inundación Sismo Tormentas Electricas Granizadas	Condiciones del medio ambiente y la naturaleza que puedan presentarse en cualquier momento durante la jornada laboral	Identificar los puntos de encuentro dentro de la oficina y por fuera de ella durante las visitas a zonas de intervención estar atento a las condiciones ambientales que puedan presentarse, para retirarse de la zona inmediatamente.

Hago constar que me han informado las Funciones y Responsabilidades del cargo que desempeño, comprometiendome a cumplirlas. Igualmente, dejo constancia que recibí inducción y fui notificado de los Riesgos inherentes a mi cargo.

NOTIFICADO:		QUIEN NOTIFICA:
FIRMA: Sergio		NOMBRE: Diana P. 6 2022
NOMBRE: Sergio David Hurtas martinez		CARGO: SST
	FECHA DE NOTIFICACIÓN: X	

CONSORCIO ENGINEERING

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

FTO-ING 059 | VERSIÓN 01 | SEPTIEMBRE -26--2022

OBRA /OFICINA: Obra

CARGO A DESEMPEÑAR: Ayudante de obra

FACTOR DE RIESGO	CONDICION O ACTO INSEGURO	FUENTE	ACCION CORRECTIVA
FÍSICOS	Calor, Frío	Medio ambiente (Clima) durante las labores de realizadas en actividades de intervenroria	Para el calor, buscar zonas que sean frescas-activas sistemas de ventilación. Para el frío, utilizar chaquetas y elementos que garantice la temperatura adecuada para adelantar las labores de verificación.
	Ruido	Generado por los maquinaria que se encuentra dentro de la zona de intervención	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas ruidosas innecesariamente. De acuerdo con el nivel de presión sonora que se pueda identificar utilizar elementos de protección auditiva durante la permanencia en zonas de intervención.
	Energía electromagnética	Iluminación de las luminarias en campamento provisional y definitivo.	Hacer micropausas durante el trabajo con video terminales como pantallas de computadores (aproximadamente de cinco minutos por hora seguida de trabajo).
QUIMICOS	Sólidos	Pólvos orgánicos, Polvos inorgánicos, debido al movimiento de maquinaria, volquetas y equipos por las zonas de intervención y durante el cargue de escombros o descargue de materiales.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de material particulado innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
	Humos	Monoxido y dioxido de carbono generado por las volquetas y maquinaria dentro de la zona intervención.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de humos de combustión innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
	Gases y vapores	Durante las labores de demolición, utilización de elementos químicos para el oxicorte	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con presencia de gases y vapores innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
BIOLOGICOS	Exposición a Hongos, virus y bacterias	Baños, recorridos de inspecciones de seguridad por pozos, sumideros.	Realizar las actividades de verificación y no permanecer en las áreas o zonas con potencial de riesgo innecesariamente. De acuerdo con las concentraciones que se pueda identificar utilizar elementos de protección respiratoria durante la permanencia en zonas de intervención.
ERGONOMICOS	Carga Estática,Posturas prolongadas,Alta carga de trabajo,Alteración en las relaciones interpersonales,Ordenes contradictorias,Trabajo monótono	Debido a la duración de las actividades frente a videoterminales.	Realizar pausas de trabajo durante las actividades realizadas. Considerar aspectos de higiene postural para la correcta posición en el puesto de trabajo. Acondicionamiento de elementos de ergonomía física que garanticen una postura adecuada
PSICOLABORAL	Estrés laboral	Actividades múltiples diarias y de esfuerzo continuo. Organización en el trabajo. Multiplicidad de operaciones y requerimientos que generan gran cantidad de trabajos varios.	Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención
PSICOLABORAL	Organización del tiempo de trabajo	Trabajos que se requieren desarrollar en lapsos de tiempo determinado.	Programación de las actividades día a día, con establecimiento de tiempos de acuerdo con el manual de funciones y responsabilidades, programación y priorización de trabajos.
PSICOLABORAL	Relaciones Humanas	Relación con compañeros de trabajo, supervisores, jefe directo.	Mantener buenas relaciones y comunicación efectiva con colaboradores Actividades colectivas tales como ejercicios, recreación, talleres de relajación
LOCATIVOS	Caída de personas al mismo nivel	Existen herramientas y otros elementos sobre el piso.	Áreas de trabajo libres de objetos, almacenamiento adecuado de objetos de trabajo, orden y limpieza en forma permanente. Durante la visita a zonas de intervención se sugiere el uso de calzado de seguridad o con suela antideslizante.
MECANICOS	Presencia de Flujo vehicular y maquinaria en las áreas de intervención	Condición relacionada específicamente con el área de adelanto de obra	Definir y señalizar debidamente las áreas de trabajo. Realizar cruces y giros únicamente por las áreas autorizadas. Cumplir con las normas de tránsito establecidas en las zonas de intervención.
PÚBLICO	Delincuencia Desorden público Tránsito	Zona de influencia de las actividades constructivas	Señalizar las áreas de trabajo. No descuidar sus objetos personales o elementos de trabajo que se deban trasladar a la zona de intervención. Retirarse de la zona de intervención si presenta eventos de desorden público como manifestaciones o protestas.
NATURALES	Deslizamientos Inundación Sismo Tormentas Electricas Granizadas	Condiciones del medio ambiente y la naturaleza que puedan presentarse en cualquier momento durante la jornada laboral	Identificar los puntos de encuentro dentro de la oficina y por fuera de ella durante las visitas a zonas de intervención estar atento a las condiciones ambientales que puedan presentarse, para retirarse de la zona inmediatamente.

Hago constar que me han informado las Funciones y Responsabilidades del cargo que desempeño, comprometiéndome a cumplirlas. Igualmente, dejo constancia que recibí inducción y fui notificado de los Riesgos inherentes a mi cargo.

NOTIFICADO:	QUIEN NOTIFICA:
FIRMA: X Carlos Eduardo Herrias	NOMBRE: Diana Cano
NOMBRE: X 1031157773 . Carlos Eduardo Herrias	CARGO: SST
FECHA DE NOTIFICACIÓN: X 29 Septiembre 2023	

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 14

CHARLAS SST

CONSORCIO 5D INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
FTO-ING-02	Versión 01	Fecha 05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Doña la Fonte
TEMA: Trabajo en equipo
CAPACITADOR: Diana Rincon
FECHA: 5 Septiembre
DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	Bersaine Lara	72216962	encargado				
2	Alvaro Cortes	1073531475	OF				
3	ANDRES ARROYO	7376370	OF				ARROYO
4	Jhon Montealegre	1053753911	OFICIAL				
5	Neil madarriaga	1140436476	a				
6	Fredris Carrasco medina	1102861240	AYUdante				
7	Arcenio mora	73156498	OFICIAL				
8	Manuel Mejia	1079655776	oficial				
9	Robin Quiñones	1004600338	OFICIAL				
10	Juan camilo Ramirez R	1003814593	ayudante				
11	Henry Delgado	1082866	OF				
12	Aldinel Balanos	1030486139					
13	Jose Alfonso Herrera	86052493	OF				
14	SONIA GONZALEZ	21160491	Almacenista				
15	Harinson Rojas R	1120895	Operario				
			Totales				Asistentes
							Invitados
							Cobertura

FIRMA RESPONSABLE:
RESPONSABLE:
CARGO:

CONSORCIO DS INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
FTO-ING-02	Versión 01	Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA	Jardin la Fuente
TEMA:	Permisos en Horario laborales
CAPACITADOR:	Diana Patricia Cano
FECHA:	9-September
DURACIÓN:	

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	SONIA GONZALEZ	24167471	Almacenista				
2	ALDMER Bolaños	1030686159	ay				
3	Juan camilo Tellez B	1039295913	ayudante				Juan camilo Tellez
4	Jose Alonso Herrera	86052493	OF	✓			
5	Henry Delgado	18982CC	AY				
6	Fabian Beltran	1085347726	operador				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

Asistentes

Invitados

Cobertura

JP2	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-23
	FORMATO DE CAPACITACION	Versión 01
		21/04/2021

	FECHA 11-09-23	HORA 6:45	
EFECTUADA POR: Diana Castillo	CARGO Insp. SST	FIRMA Diana Castillo	
INDUCCION ☐	REINDUCCION ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐	CHARLA ☒	
TEMA:	Cuidado y Protección de manos		

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madarriaga	1100401076	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargado	Obra jardin la fuente	
Jeeifri Carrasco	1102861240	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Manuel Enrique Mejia	1079656576	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
John Fredy Montealegre	1033755912	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Andrés Arrolla de la hoz	73563565	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Arcenio Moro Meza	73564982	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yoibin Orlandez Quiñanes	1004200332	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yiver Enrique centena	1023931435	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

FTO-ING-02 | Versión 01 | Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Jardín la Fuente

TEMA: Política de Alcohol y Drogas

CAPACITADOR: Liliana Pulgarín Cruz

FECHA: 12-09-2023 | DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACION CAPACITACION BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	SONIA GONZALEZ	24697471	Almacenista				
2	Jose Alfonso Herrera	86052495	Of	✓			
3	Aldinor Bolaños	1032686659					
4	Henry Duque	1899266	Ay	—			
5	Juan camilo Tellez	1002874593	ayudante				
6	Carlos Eduardo Gallego	1199301844	Of				
7	Yeison Medrano	1104070076	Ay				
8	Jhon Fredy Montenegro	1033755990	Oficial				
9	ANDRES ARROYO	73563563	O				
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

Asistentes

Invitados

Cobertura

JP2	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-29
		Versión 01
	FORMATO DE CAPACITACION	21/04/2021

	FECHA: 12-09-23	HORA: 6:45	
EFECTUADA POR: (1) Diana Yasmin Castillo	CARGO: Inspl. SST	FIRMA (1) Diana Yasmin C	
INDUCCIÓN ☐	REINDUCCION ☐	SOCIALIZACIÓN ☐	CAPACITACIÓN ☐
			CHARLA ☒

TEMA: Cuidado y manipulacion de equipos

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madarriaga	1100401076	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargado	Obra jardin la fuente	
Jeeifri Carrasco	1102861240	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Manuel Enrique Mejía	1079656576	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
John Fredy Montealegre	1033755912	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Andrés Arrollo de la hoz	73563565	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Arcenio Mora Meza	73564982	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yaibin Orlandez Quiñanes	1004200332	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yiver Enrique centeno	1023931435	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	

559

Powered by CamScanner

JPZ	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-29
		Versión 01
	FORMATO DE CAPACITACION	21/04/2021

	FECHA: 13-09-23	HORA: 7:00 AM	
EFECTUADA POR: Diana Yasmin Castillo	CARGO: Insp SST	FIRMA: Diana Yasmin C	
INDUCCIÓN ☐	REINDUCCION ☐	SOCIALIZACIÓN ☐	CAPACITACIÓN ☐ CHARLA ☒
TEMA:	Actos y Condiciones inseguras		

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madariaga	1100401076	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargado	Obra jardin la fuente	
Jeeifri Carrasco	1102861240	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Manuel Enrique Mejia	1079656576	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
John Fredy Montealegre	1033755912	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Andrés Arrollo de la hoz	73563565	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Arcenio Mora Mezo	73564982	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yoibin Orlandez Quiñones	1004200332	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yiver Enrique centeno	1023931435	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

OBRA Y/O OFICINA:	Jardín La Fuente
TEMA:	Cuidado de Ojos El uso de gafas Protectoras
CAPACITADOR:	Ing. Diana Rosa Ibarra
FECHA:	14-09-2023
DURACIÓN:	

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	SONIA GONZALEZ	24169XXX	Almacenista				
2	Carlos Martinez P.	1122312202	Apoyo Obra				
3	Jose Alfonso Herrera	8052493	Of	V			
4	Juan camilo tellez R	1003491993	ayudante				
5	Henry Delgado	1049	ay				
6	Adalmer Bolaños	1030	ay				
7	Cleyon Hatoburrago	8087133	Of				
8	Harriman Lopez Rojo	1210895	Operador	—			
9	Fabian Beltran	1054372226	operador				
10							
11							
12							
13							
14							
15							

FIRMA RESPONSABLE:
RESPONSABLE:
CARGO:

Elaboró: Ing. María Isabel Perdomo Luna

JPZ JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES SAS	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-29
		Version 01
	FORMATO DE CAPACITACION	21/04/2021

FECHA: 14-09-23 HORA: 6:30AM

EFECTUADA POR: Diana Yasmin Castillo CARGO: Insp. SST. FIRMA: Diana Yasmin C

INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ SOCIALIZACION ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☒

TEMA: Recomendaciones de seguridad.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madariaga	1100401076	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargado	Obra jardin la fuente	
Jeeifri Carrasca	1102861240	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Manuel Enrique Mejía	1079656576	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
John Fredy Montealegre	1033755912	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Andrés Arrollo de la hoz	73563565	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	ABAYO
Arcenio Mora Mezo	73564982	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yoibin Orlandez Quiñones	1004200332	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yiver Enrique centeno	1023931435	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	

Powered by CamScanner

JPZ	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-29
		Versión 01
	FORMATO DE CAPACITACION	21/04/2021

FECHA: 15-09-23 HORA: 6:50AM

EFECTUADA POR: Diana Yasmin Castillo CARGO: Lsp, SST FIRMA: Diana Yasmin C

INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ SOCIALIZACION ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☒

TEMA: Accidente de trabajo ¿Que es?

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madorriaga	1100401076	Oficioles extructuro	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargada	Obra jardin la fuente	
Jeeifri Carrasca	1102861240	Oficioles extructuro	Obra jardin la fuente	
Manuel Enrique Mejia	1079656576	Oficioles extructuro	Obra jardin la fuente	
John Fredy Montealegre	1033755912	Oficioles extructuro	Obra jardin la fuente	
Andrés Arrolla de lo hoz	73563565	Oficioles extructuro	Obra jardin la fuente	
Arcenio Moro Meza	73564982	Oficioles extructuro	Obra jardin la fuente	
Yoibin Orlandez Quiñanes	1004200332	Oficioles extructuro	Obra jardin la fuente	
Yiver Enrique centeno	1023931435	Oficioles extructuro	Obra jardin la fuente	

563

Powered by CamScanner

JPZ JESUS PEREZ PORRO RIVERA SAS	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-29
	FORMATO DE CAPACITACION	Version 01
		21/04/2021

	FECHA: 16-09-23	HORA: 6:50 AM	
EFECTUADA POR: Diana Yasmin Castillo	CARGO: Inge. SST.	FIRMA: Diana Yasmin C.	
INDUCCION ☐	REINDUCCION ☐	SOCIALIZACION ☐	CAPACITACIÓN ☐
CHARLA ☒			

TEMA: MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS. "ACPM - GASOLINA"

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madariaga	1100401076	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargada	Obra jardin la fuente	Belisario Guiza
Jeeifri Carrasco	1102861240	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	JCarrasco
Manuel Enrique Mejia	1079656576	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	Manuel Mejia
John Fredy Montealegre	1033755912	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Andrés Arrollo de la hoz	73563565	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	ARROYO
Arcenio Maro Mezo	73564982	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yoibin Orlando Quiñanes	1004200332	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yiver Enrique centeno	1023931435	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	

564

Powered by CamScanner

CONSORCIO INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

FTO-ING-02 | Versión 01 | Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Con la Frente

TEMA: Uso adecuado de Elementos de Protección Personal

CAPACITADOR: Uvana Tobasio Cacua

FECHA: 18-09-2023 | DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	Bolivar Luna	7822402	encargado				
2	Jhon Montenegro	1102815598	Oficial				
3	Luis Madariaga	7906409796	of				
4	Bernardo Rios	3212675	Operario				
5	Hernan Delgado	1847266	Dx				
6	Aldimar Bolaños	1026876139	ay				
7	Giovanni Maldonado	80087133	of				
8	Juan camilo Tellez Pi	1026145493	ayudante				
9	Fabian Restrepo	1054992716	operador				
10	Jaime Montenegro H.	1065825021	topografo				
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

Asistentes

Invitados

Cobertura

CONSORCIO ES INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
FTO-ING-02	Versión 01	Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Vedra la fuente

TEMA: Formas y Responsabilidad

CAPACITADOR: Diana Pilar Cano

FECHA: 19-09-2023 DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACION CAPACITACIÓN BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
2	Jose Nieto Lora	96032455	Of.	X			
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
4	[illegible]	[illegible]	Ayudante				
5	[illegible]	1037135779	Trabajador				
6	[illegible]	1058601521					
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

Asistentes

Invitados

Cobertura

566

JPZ	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-29
	FORMATO DE CAPACITACION	Versión 01
		21/04/2021

	FECHA: 19-09-23	HORA: 6 a 7:30 a.m
EFECTUADA POR: Diana Yazmin Castillo	CARGO: LNSP.SST	FIRMA: Diana Yazmin

INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ SOCIALIZACION ☐ CAPACITACIÓN ☐ CHARLA ☒

TEMA: TAREAS DE ALTO RIESGO Y SUS CONTROLES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madariaga	1100401076	AYUDANTE	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargado	Obra jardin la fuente	Belisario Guiza
Jeeifri Corrasco	1102861240	AYUDANTE	Obra jardin la fuente	JEEIFRI3
Manuel Enrique Mejia	1079656576	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	Manuel Mejia
John Fredy Mantealegre	1033755912	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	John Mantealegre
Andrés Arrolla de la hoz	73563565	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	AARora
Arcenio Mora Meza	73564982	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yoibin Orlandez Quiñanes	1004200332	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yiver Enrique centeno	1023931435	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	

CONSORCIO INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
FTO-ING-02	Versión 01	Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA	Sede la Fuente
TEMA:	Manejo de Residuos en Obra uso de canecas
CAPACITADOR:	Viviana Moreno
FECHA:	20-09-2023
DURACIÓN:	

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACION CAPACITACION BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	Jose Alberto Herrera	1065	Of	V			
2	Santiago Gonzalez	1116	Almacenista				
3	Alexander Bolaños	1065	Of				
4	Jhon camilo Tejeda	1065	contratista				
5	Wilber Vargas C.T.E	1065	Trabajador				
6	Dayra Lisseth Tibaquira L	1057601521	TO Practicante				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:
RESPONSABLE:
CARGO:

Asistentes
Invitados
Cobertura

508

JPZ JESUS PEREZ ZOARO INVERSIONES SAS	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-29
	FORMATO DE CAPACITACION	Version 01
		21/04/2021

	FECHA: 20-09-23	HORA: 6:50 Am	
EFECTUADA POR: DIANA MACHINC	CARGO: INSP. SST	FIRMA: DIANA MACHIN C	

INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ SOCIALIZACION ☐ CAPACITACIÓN ☐ CHARLA ☒

TEMA: Riesgo locativo

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madariaga	1100401076	AYUDANTE	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargado	Obra jardin la fuente	
Jeeifri Carrosco	1102861240	AYUDANTE	Obra jardin la fuente	
Manuel Enrique Mejia	1079656576	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
John Fredy Manlealegre	1033755912	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Andrés Arrollo de la hoz	73563565	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Arcenio Mora Meza	73564982	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yoibin Orlondez Quiñones	1004200332	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yiver Enrique centeno	1023931435	Oficiales extructuro	Obra jardin la fuente	
willma centeno	1023958147	oficio		
Diego Arroyo	986550	oficios		
Marco Cabo	3250077	Ayudante		
Neydel Rincon	3121594	Auxiliar		
Jose William Cortes	9039697	oficio		

JP2	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-29
	FORMATO DE CAPACITACION	Version 01
		21/04/2021

FECHA: 21-09-23 HORA 6:50AM

EFECTUADA POR: Diana Yazmin Castillo CARGO: Insp. SST FIRMA: Diana Yazmin C.

INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ SOCIALIZACION ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☒

TEMA: RIESGO FISICO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madorriaga	1100401076	AYUDANTE	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargado	Obra jardin la fuente	
Jeeifri Carrasco	1102861240	AYUDANTE	Obra jardin la fuente	
Manuel Enrique Mejia	1079656576	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
John Fredy Manteolegre	1033755912	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Andrés Arrollo de la hoz	73563565	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Arcenio Mora Meza	73564982	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yaibin Orlandez Quiñanes	1004200332	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yiver Enrique centena	1023931435	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Diego Angel	98655a	Ofic.		
William David	1022958941	Ofic		
Jose William Gonzalez	80396163	Ofic		
Marco AP.	2.250.054	OFICIO		
Wendel Rincon	3121594	AUXILIAR		

570

CONSORCIO INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
FTO-ING-02	Versión 01	Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA:	Loma La Fuente
TEMA:	Pausas Activas
CAPACITADOR:	Viviana R. Garay
FECHA:	21-09-2023
DURACIÓN:	

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACION BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	SONIA GONZALEZ	24161991	Almacenista				
2	Aldimer Balanos	1038687139	ay				
3	Henry Delgado	1094926660	ay				
4	Juan camilo reyes R	1003845553	ayudante				
5	Dayana Estefa Tibaija	1098015211	Topografo.				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
			Totales				

FIRMA RESPONSABLE:
RESPONSABLE:
CARGO:

Asistentes
Invitados
Cobertura

JPZ	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-29
		Version.01
	FORMATO DE CAPACITACION	21/04/2021

	FECHA: 22-09-23	HORA: 6:50AM
EFECTUADA POR: DIANA YAZMIN CASTILLO	CARGO: LNSP. SST	FIRMA: DIANA YAZMIN C

INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ SOCIALIZACION ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☒

TEMA: Lavado de manos

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madariaga	1100401076	AYUDANTE	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargado	Obra jardin la fuente	Belisario Guiza
Jeeifri Carrasco	1102861240	AYUDANTE	Obra jardin la fuente	Jeeifri
Manuel Enrique Mejia	1079656576	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	Manuel Mejia
John Fredy Montealegre	1033755912	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Andrés Arrollo de la haz	73563565	Oficiales extructuro	Obra jardin la fuente	ARRoba
Arcenio Mora Meza	73564982	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yoibin Orlandez Quiñones	1004200332	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	—
Yiver Enrique centeno	1023931435	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Diego Angulo	786550	Oficial	Obra Jardin	
Marcos Caballero	3250057	Ayudante	Obra Jardin	
Neider Ramon	3121594	Ayudante	Obra Jardin	
Jose Garzon	80396967	Oficial	Obra Jardin	
Wilmar Centeno	1023958971	Oficial	Obra Jardin	Wilmar
NCS del Rincón		Ayudante	obra jardin	
Jose William Garzon		Oficial	obra Jardin	
		Ayudante	obra Jardin	

CONSORCIO INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
FTO-ING-02	Versión 01	Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Todo la Fuente

TEMA: La importancia de informar Un incidente o accidente en el

CAPACITADOR: Dwora R Cossa

FECHA: 22-09-2023 DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	Daniela Lopez Perez	52'216.243	Ing. Residentes				
2	Dayana Hernandez	1053601521	Topografo				
3	Carlos Martinez M.	1022732102	Apoyo Obra				
4	Sonia Gonzalez	2916747	Ambiental				
5	Juan camilo Tellez	1003894593	ayudante				
6	Jhon Romero Balanos	1030686139	ay				
7	Fabian Beltran	1054372729					
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

Asistentes

Invitados

Cobertura

573

CONSORCIO
DS
INGENIERÍA

ANEXO 15

CHARLAS CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA Y CAPACITACIONES

| CONSORCIO DS INGENIERIA | PLAN DE CAPACITACIÓN 2023-2024 EJECUCIÓN DEL PROYECTO | | |

CONSORCIO INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
FTO-ING-02	Versión 01	Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Toda la Fiesta

TEMA: Plan de Emergencia y Brigada de Emergencia Interna

CAPACITADOR: Omar Gaui

FECHA: 06-09-2023 DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACION CAPACITACION BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	Hassan Torres R.	1121085	operario compactador	✓			
2	SONIA GONTREE	24169491	Almacenista				
3	Jose Alfonso Herrera	8605749S	Of	✓			
4	ADEMER Bolaños	6306854459	oy				
5	Henry Delgado	1802760	op				
6	Juan Camilo Tellez R.	1038749593	ayudante				
7	Giovani Matabanchoy	86087133	Of				
8	Fabian Beltran	1059372725	operador				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:
RESPONSABLE:
CARGO:

Asistentes
Invitados
Cobertura

JPZ	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-28
	FORMATO DE CAPACITACION	Version 01
		21/04/2021

	FECHA: 06-09-23	HORA: 6:50 ATA	
EFECTUADA POR: Diana Yasmin Castillo	CARGO: Lider SST	FIRMA: DIANA YASMIN C.	
INDUCCION ☐	REINDUCCION ☐	SOCIALIZACION ☐	CAPACITACION ☐
TEMA:	Plan de Emergencia y Brigada de Emergencia Interna		

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madarriaga	1100401076	AYUDANTE	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargado	Obra jardin la fuente	
Jeeifri Carrasco	1102861240	AYUDANTE	Obra jardin la fuente	
Manuel Enrique Mejia	1079656576	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
John Fredy Montealegre	1033755912	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Andrés Arrolla de la haz	73563565	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Arcenio Mora Meza	73564982	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yoibin Orlondez Quiñones	1004200332	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yiver Enrique centeno	1023931435	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Wilmar Centeno	1023958971	OFICIAL	OBRA	
Diego Angulos	9860550	OFICIAL	Jardin	
Marco Caballero	3250057	AYUDANTE	Jardin	
Naider Rincon	3121594	AYUDANTE	Jardin	
Jose Garzon	80396967	OFICIAL	Jardin	

CONSORCIO INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

FTO-IPG-07 | Versión 01 | Fecha 02 de SEPTIEMBRE de 2021

OBRA Y/O OFICINA: Vereda la Fuente

TEMA: Uso de Herramienta y Almacenamiento EPP

CAPACITADOR: Juana Plaza

FECHA: 25-09-2023 | DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	SONIA GONZALEZ	24162491	Almacenista				
2	Aldimer Bolaños	1030686158	ay				
3	Juan camilo tellez	1003824593	ayudante				
4	Gravan Maldonado	8008433	of	✓			
5	David Blanco	1.073[illegible]	operador	✓			
6	Hasmun Lopez R	4210895	operario oficio	✓			
7	Henry Jimenez	1897269	u t.	—			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

Asistentes
Invitados
Capacitina

FIRMA RESPONSABLE:
RESPONSABLE:
CARGO:

578

CONSORCIO 5D INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

FTO-ING-02 | Versión 01 | Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Jardín Infantil

TEMA: Trabajo Seguro en Altura Uso Enganche

CAPACITADOR: Duvan F. Baez

FECHA: 08-09-2023 | DURACIÓN:

Nº	NOMBRE APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACION CAPACITACION BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	Carlos Arroyo Martinez	1.122.123.202	Apoyo Obra				
2	Yilber Jorge Ortiz	1031135149	Inspector				
3	[illegible]	1067800827	Despacho				
4	SONIA GONZALEZ	24167491	Almacenista				
5	Giovanni Maldonado	80087133	Of				
6	Jean camilo Tellez B	1003824593	Ayudante				
7	Jairo Hernandez	1057601521	Topografo				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

Asistentes

Invitados

Cobertura

579

CONSORCIO INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

FTO-ING-02 Versión 01 Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Avda la Fuente

TEMA: Riesgo Químico

CAPACITADOR: Oscar Lozada

FECHA: 20-09-2023 DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	Carlos Martinez M.	1122723702	Apoyo Obra				
2	Yilba Vargas Ortiz	103135119	Inspectora Obra				
3	edilberto cruz	1065808482	Instalador				
4	SONIA GONZALEZ	24164491	Almacenista				
5	Giovanni Maldonado	8008737	Of				
6	Henry Pardo	1897966	Of				
7	Juan camilo Tellez R.	1003874593	Ayudante				
8	Leyana Hernandez	1096061821	Topografo				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

Asistentes

Invitados

Cobertura

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

580

CONSORCIO INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

FTO-ING-02 | Versión 01 | Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Jardín la Fuente

TEMA: Alcoholismo y tabaquismo

CAPACITADOR: Viviana M. García

FECHA: 21-09-2023 | DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	Giovan. Mahabanchoy	80087133	Of	✓			
2	Aldimer Bolaños	1031886159	ay				
3	Henry Delgado	1049796	ay				
4	Juan camilo tellez A	1003814593	aprendiz				Juan camilo Te
5	SONIA GONZALEZ	24169471	Almacenista				
6	Yilber Vargas Ortiz	1031135149	Inspector				
7	Yolanda cruz	1085900	Ingeniero				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

Asistentes

Invitados

Cobertura

CONSORCIO ED INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
FTO-ING-02	Versión 01	Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Jardín La Fuente

TEMA: Inspecciones de Seguridad

CAPACITADOR: Viviana R. García

FECHA: 23-09-2023 DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACION CAPACITACION BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	Gruvan Matabanchoy	8008433	Of	✓			
2	Aldinea Balanos	1030686159	Ay				
3	SONIA GONZALEZ	24169471	Almacenista				
4	Juan camilo tellez B	1003894593	Ayudante				
5	Kenny Delgado	1093760	Of				
6	Yilber Vargas Ortiz	1031135149	Inspector				
7	Edilberto Cruz	1067800824	Instalador				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

Asistentes

Invitados

Cobertura

582

JPZ	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GSST-F-29
	FORMATO DE CAPACITACION	Version 01
		21/04/2021

	FECHA 26-09-23	HORA 6:50 PM
EFECTUADA POR: DIANA CASTILLO	CARGO INSP. SST	FIRMA DIANA YALENA C.

INDUCCION ☐ REINDUCCION ☐ SOCIALIZACION ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☑

TEMA: Plan de Emergencia y Contingencia

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR	FIRMA
Luis Miguel Madarriaga	1100401076	AYODANTE	Obra jardin la fuente	
Belisario Guiza Vargas	17221802	Encargado	Obra jardin la fuente	
Jeeifri Carrasca	1102861240	AYUDANTE	Obra jardin la fuente	
Manuel Enrique Mejia	1079656576	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
John Fredy Montealegre	1033755912	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Andrés Arrallo de la hoz	73563565	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Arcenio Mora Meza	73564982	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yoibin Orlandez Quiñones	1004200332	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	
Yiver Enrique centeno	1023931435	Oficiales extructura	Obra jardin la fuente	

CONSORCIO INGENIERIA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

FTO-ING-02 | Versión 01 | Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Jardin la Fuente

TEMA: Manejo de sustancias quimicas

CAPACITADOR: Viviana Rubiano Leon

FECHA: 22-Octubre | DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	David Blanco	1.015321645	operador	X			
2	Harrison Torres Rojas	1121084S	operario	X			
3	Daniel Reyes	1076565776	oficial				
4	Hicenio Pava	7735498	OF Say				
5	Jhon Montenegro	1053795976	OFICIAL				
6	ANDRES ARROYO	73563560	OF				ARROYO
7	Jairo Carrasco Medina	1102861240	Ayudante				
8	Yobin Cuevas	1004600332	OFICIAL				
9	Reinaldo Lopez	7721862	encargado				
10	Yenco cendes	1033714935	OF				
11	Will Maldonado	1004117076	of				
12	Jose Alfonso Uman	86052193	OF	V			
13	Henry Peluso	1094 894	OF	-			
14	Fabian Beltran	1054777776	operador				
15	Giovani Matabanchoy	1006413	of				

Totales

Asistentes

Invitados

Cobertura

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

CONSORCIO
INGENIERÍA

ANEXO 16

PERMISOS DE TRABAJO Y ATS

JESUS PEREZ ROMERO INVERSIONES SAS

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO EN TRABAJO CALIENTE			Version: 01
AREA: Obra	HORA INICIO: 7:00 AM	HORA FINAL: 5:00pm	21/04/2021

PROYECTO: Jardin — CONSECUTIVO PERMISO: # 3

VALIDO DESDE: 25-09-23 — VALIDO HASTA: 30-09-23

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Corte de Acero- Alambre entre otros

Identificar peligros y controles presentes en la realización de trabajos en caliente al realizar actividades de oxicorte

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	A	SI	NO	A	SI	NO	NA
Los trabajadores asistieron a la charla de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor han recibido instrucciones a seguir en la ejecución de la tarea de manera segura.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El trabajador tiene entrenamiento documentado para realizar trabajos en caliente.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El personal sabe a quien acudir en caso de emergencia.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El trabajador conoce las consecuencias para la salud y seguridad física, de el no uso de los EPPS.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El trabajador conoce las consecuencias del mal manejo de los equipos de corte (pulidora ,sierra circular)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El personal ejecutor no cuenta con anillos, relojes, celular u otros objetos que puedan generar un accidente.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICIONES GENERALES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se delimito el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extintor se encuentra ubicado en el area donde se va a ejecutar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Las condiciones climáticas, permiten el desarrollo de la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
En las zonas cercanas al área de trabajo no existe almacenamiento de material combustible.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Si el trabajo se va ha desarrollar en tanques o ductos, están lavados y limpios para evitar explosión.			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Si en el area de trabajo, se encuentran trabajadores ejecutando otras labores, las actividades han sido coordinadas para permitir la ejecución de forma segura.	✓			✓			✓			✓					✓			✓			
Se cuenta con un recipiente adecuado y rotulado para la recolección de los residuos sólidos generados en la actividad.			✓			✓			✓			✓	✓			✓					
CONDICION DE LOS EQUIPOS	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Los equipos usados tienen sus cables o conexiones eléctricas en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha verificado la puesta a tierra de todos los equipos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El equipo esta libre de grasa, aceite o material combustible.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Buen funcionamiento de la chispa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Las pulidoras cuentan con las guardas protectoras.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

JP2

PERMISO EN CALIENTE

DESCRIPCOON	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Casco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Protector de Cabeza tipo Monja			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Gafas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Careta Acrilica		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
capuchon		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Guantes de Carnaza	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
camisa manga larga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Ropa de trabajo de material adecuado. (Jean)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Botas punta de acero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se tienen todas las condiciones para empezar a trabajar?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se otorga el permiso de trabajo?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Nombre Supervisor SST:	Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo					
Firma Supervisor SST:	Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo					
Nombre del encargado y/o maestro	Benson Berroa			Benson Berroa			Benson Berroa			Benson Berroa			Benson Berroa								
Firma del encargado y/o maestro	Benson Berroa			Benson Berroa			Benson Berroa			Benson Berroa			Benson Berroa								

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

PERSONALMENTE HE VERIFICADO Y CERTIFICO QUE	SI	NO
EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO		
CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS		
PRESENCIA DE CONDICION INSEGURA EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD		
ACTOS INSEGUROS POR PARTE DEL PERSONAL QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD		

Nombre y Firma del supervisor SST:	Nombre y Firma de quien cierra el permiso:	Fecha de cierre del permiso

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Wesder Rincon	3121594							
2	Marco Cabal	3250057							
3	Jose William Cuervo	80396967							
4	Yolbin Quevedo	1000							
5	Diego Angulo	986550							
6	Bernardo Cuervo	7822802							
7	Yelver Anaya	1023931435							
8	Braian Mena	9356982							
9	Manuel Mejia	1049616576							
7	Wilmer Cuervo	1023958943							
8	ANDRES ARROYO	7361365							
9	Jeiferis Cuervo	1102 961 246							
10									
11	Hugo Trejo Cartagena	1083115391							
12	Marcos Cano	7229019							
13	Carlos Huertas	1031157773							
9	Sergio Huertas	1077521090							
10	Duvan Diaz	1192798347							
11									
12									
13									

JP2	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO EN TRABAJO CALIENTE			Codigo: GSST-F-20
				Version: 01
	AREA: Jardin.	HORA INICIO: 7:00 AM	HORA FINAL: 5:00 PM	21/04/2021

PROYECTO:	Jardin.	CONSECUTIVO PERMISO:	1
VALIDO DESDE:	11-09-23	VALIDO HASTA:	17-09-23

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Corte de acero: Alambre.

Identificar peligros y controles presentes en la realización de trabajos en caliente al realizar actividades de oxicorte

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	A	SI	NO	A	SI	NO	NA
Los trabajadores asistieron a la charla de seguridad							X			X			X			X					
La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor han recibido instrucciones a seguir en la ejecución de la tarea de manera segura.							X			X			X			X					
El trabajador tiene entrenamiento documentado para realizar trabajos en caliente.							X			X			X			X					
El personal sabe a quien acudir en caso de emergencia.							X			X			X			X					
El trabajador conoce las consecuencias para la salud y seguridad física, de el no uso de los EPPS.							X			X			X			X					
El trabador conoce las consecuencias del mal manejo de los equipos de corte (soldadora ,sierra circular)							X			X			X			X					
El personal ejecutor no cuenta con anillos, relojes, celular u otros objetos que puedan generar un accidente.							X			X			X			X					
CONDICIONES GENERALES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se delimito el área de trabajo.							X			X			X			X					
Extintor se encuentra ubicado en el area donde se va a ejecutar la actividad							X			X			X			X					
Las condiciones climáticas, permiten el desarrollo de la actividad.							X			X			X			X					
En las zonas cercanas al área de trabajo no existe almacenamiento de material combustible.							X			X			X			X					
Si el trabajo se va ha desarrollar en tanques o ductos, están lavados y limpios para evitar explosión.								X			X						X				
Si en el área de trabajo, se encuentran trabajadores ejecutando otras labores, las actividades han sido coordinadas para permitir la ejecución de forma segura.								X			X						X				
Se cuenta con un recipiente adecuado y rotulado para la recolección de los residuos sólidos generados en la actividad.							X			X			X			X					
CONDICION DE LOS EQUIPOS	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Los equipos usados tienen sus cables o conexiones eléctricas en buen estado.							X			X			X			X					
Se ha verificado la puesta a tierra de todos los equipos.							X			X			X			X					
El equipo está libre de grasa, aceite o material combustible.							X			X			X			X					
Buen funcionamiento de la chispa							X			X			X			X					
Las pulidoras cuentan con las guardas protectoras.							X			X			X			X					

JP2 PERMISO EN CALIENTE

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Casco							X			X			X			X					
Protector de Cabeza tipo Monja							X			X			X			X					
Gafas de seguridad							X			X			X			X					
Careta Acrilica								X			X			X			X				
tapabocas								X			X			X			X				
Chaquetas de Carnaza							X			X			X			X					
camisa manga larga							X			X			X			X					
Ropa de trabajo de material adecuado. (Jean)							X			X			X			X					
Botas punta de acero							X			X			X			X					
Se tienen todas las condiciones para empezar a trabajar?							X			X			X			X					
Se otorga el permiso de trabajo?							X			X			X			X					
Nombre Supervisor SST:							Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo					
Firma Supervisor SST:							Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo					
Nombre del encargado y/o maestro							Brayan Bolaños			Brayan			Brayan			Brayan					
Firma del encargado y/o maestro							Brayan Bolaños			Brayan			Brayan			Brayan					

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO		
PERSONALMENTE HE VERIFICADO Y CERTIFICO QUE	SI	NO
EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO		
CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS		
PRESENCIA DE CONDICION INSEGURA EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD		
ACTOS INSEGUROS POR PARTE DEL PERSONAL QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD		

Nombre y Firma del supervisor SST:	Nombre y Firma de quien cierra el permiso:	Fecha de cierre del permiso

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jeff Hernandez	1144076076							
2	ANDRES ARROYO	733635651					ARROYO	ARROYO	
3	Johan Montenegro	1053755912							
4	Reinaldo Cadiz	1122882402							
5	Arzamendi	733355492							
6									
7									
8									
9									
10									
11									

OBSERVACIONES

	SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO EN TRABAJO CALIENTE	Codigo:GSST-F-20
JP2		Version: 01
	AREA: HORA INICIO: 7:00 a m HORA FINAL: 5:00 p m	21/04/2021

PROYECTO: JARDIN CONSECUTIVO PERMISO: # 2

VALIDO DESDE: 18-09-23 VALIDO HASTA: 24-09-23

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Corte de acero - madera

Identificar peligros y controles presentes en la realización de trabajos en caliente al realizar actividades de soldeorte

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	A	SI	ND	A	SI	NO	NA
Los trabajadores asistieron a la charla de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor han recibido instrucciones a seguir en la ejecución de la tarea de manera segura.	✓			✓			✓			✓			✓								
El trabajador tiene entrenamiento documentado para realizar trabajos en caliente.	✓			✓			✓			✓			✓								
El personal sabe a quien acudir en caso de emergencia.	✓			✓			✓			✓			✓								
El trabajador conoce las consecuencias para la salud y seguridad física, de el no uso de los EPPS.	✓			✓			✓			✓			✓								
El trabador conoce las consecuencias del mal manejo de los equipos de corte (soldora ,sierra circular)	✓			✓			✓			✓			✓								
El personal ejecutor no cuenta con anillos, relojes, celular u otros objetos que puedan generar un accidente.	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICIONES GENERALES	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se delimito el área de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓								
Extintor se encuentren ubicado en el area donde se va a ejecutar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓								
Las condiciones climáticas, permiten el desarrollo de la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓								
En las zonas cercanas al área de trabajo no existe almacenamiento de material combustible.	✓			✓			✓			✓			✓								
Si el trabajo se va ha desarrollar en tanques o ductos, están lavados y limpios para evitar explosión.	✓			✓			✓			✓			✓								
Si en el área de trabajo, se encuentran trabajadores ejecutando otras labores, las actividades han sido coordinadas para permitir le ejecución de forma segura.	✓			✓			✓			✓			✓								
Se cuenta con un recipiente adecuado y rotulado para la recolección de los residuos sólidos generados en la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICION DE LOS EQUIPOS	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Los equipos usados tienen sus cables o conexiones eléctricas en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
Se ha verificado la puesta a tierra de todos los equipos.	✓			✓			✓			✓			✓								
El equipo está libre de grasa, aceite o material combustible.	✓			✓			✓			✓			✓								
Buen funcionamiento de la chispa	✓			✓			✓			✓			✓								
Las pulidoras cuentan con los guardas protectoras.	✓			✓			✓			✓			✓								

PERMISO EN CALIENTE

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	ND	NA	SI	NO	NA
Casco	✓			✓			✓			✓			✓								
Protector de Cabeza tipo Monja			✓			✓			✓			✓			✓						
Gafas de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
Careta Acrilica		✓				✓			✓			✓			✓						
tapabocas	✓			✓			✓			✓			✓								
Guantes de Carnaza	✓			✓			✓			✓			✓								
camisa manga larga	✓			✓			✓			✓			✓								
Respirador trabajo de material adecuado. (Jean)	✓			✓			✓			✓			✓								
Botas punta de acero	✓			✓			✓			✓			✓								
Se tienen todas las condiciones para empezar a trabajar?	✓			✓			✓			✓			✓								
Se otorga el permiso de trabajo?				✓			✓			✓			✓								
Nombre Supervisor SST:	Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo								
Firma Supervisor SST:	Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo								
Nombre del encargado y/o maestro	Ricardo			Ricardo			Ricardo			Ricardo			Ricardo								
Firma del encargado y/o maestro	Ricardo			Ricardo			Ricardo			Ricardo			Ricardo								

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

PERSONALMENTE HE VERIFICADO Y CERTIFICO QUE	SI	NO
EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO		
CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS		
PRESENCIA DE CONDICION INSEGURA EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD		
ACTOS INSEGUROS POR PARTE DEL PERSONAL QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD		

Nombre y Firma del supervisor SST:	Nombre y Firma de quien cierra el permiso:	Fecha de cierre del permiso

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Berisne Garcia	1822[illegible]	Berisne	Berisne	Berisne	Berisne	Berisne	Berisne	
2	Yelver Castro	023914955	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Manuel Mejia	70796[illegible]6	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	
4	ANDRES ARRAZOLA	823[illegible]63	ARRAZOLA	ARRAZOLA	ARRAZOLA	ARRAZOLA	ARRAZOLA	ARRAZOLA	
5	Jhon Montenegro	1[illegible]7[illegible]9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	Luis medina	7[illegible]76							
7	Jeaffris carmona	1102 96126	Jeaffris	Jeaffris	Jeaffris	Jeaffris	Jeaffris	Jeaffris	
8	Arcenio mejia	8[illegible]4982							
9	YOHAN [illegible]	1[illegible]					CARVAJAL		
10	Wilmo	1023[illegible]				Wilmo	Wilmo	Wilmo	

OBSERVACIONES

JP2 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROCESO	SG-SST
		VERSIÓN	2
		FECHA	[illegible]

Fecha de elaboración del ATS:	25-ene-23		
Trabajo a realizar:	CORTE DE ACERO, ENCOFRADO Y FUNDIDA	Equipo, área	[illegible]
Fecha de ejecución del trabajo:	Desde 28-09-2022	Hasta: 30-01-2023	
Herramientas y/o equipos a utilizar:	Barras - Palas - Carretilla - Arena - Polin - Ganchos - Andamios - Cinturón de seguridad - Taladro - Extensiones		
EPP Requeridos:	Guantes de carnaza - Casco - Botas de seguridad - Overoles de piezas - Gafas de seguridad - Tapabocas		

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO DEL RESPONSABLE
1	se realiza inspeccion visual de Herramientas y Area	*Condicion de seguridad: Accidentes de tránsito, Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo (caida de objetos). Mecánico: elementos o partes de herramientas	*Golpes *Fracturas *Esguinces Amputaciones *Muerte *Hematomas, laceraciones, contusiones *Golpes y caidas a diferente nivel Atrapamiento	*Acompañamiento SST *Presentaciones. *Charla de seguridad. *Tarjeta de seguridad. *Programa SVE. *Auditorias SST. *Mantenimiento preventivo y correctivo *Capacitacion	Inspector SST Trabajadores
2	Alistamiento y transporte de herramientas manuales y equipos	*Psicologico: trabajo en equipo - jornada de trabajo *Biomecánico: Esfuerzo. *Condiciones de seguridad: Accidentes de tránsito *Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo caida de objetos. *Físico: Ruido intermitente, continuo de impacto, Actividades adyacentes - Temperaturas extremas, radiaciones no ionizantes. *Químico: material particulado. (actividades adyacentes)	Golpes Fracturas *Amputacion *Esguinces, contusiones, golpes leves *Lumbalgias *Dermatitis, irritacion, alergias, ardor *Heridas, cortes Hematomas, fracturas, laceraciones, muerte *Golpes *Caidas *Muerte *Golpes a nivel y diferente nivel Posibles caidas de personas a mismo nivel Caida de objetos en manipulación *Dermatitis *Irritacion de piel y enfermedades respiratorias *Enfermedades respiratorias Golpes	*Acompañamiento SST *Presentaciones. *Charla de seguridad. *Tarjeta de seguridad. Programa SVE. *Certificados EPP. *Mantenimiento preventivo y correctivo *Capacitacion *Uso de EPP (guantes, gafas, botas, etc) *Calificacion de trabajo en alturas Capacitacion Uso de formaleta nueva	Inspector SST Trabajadores
3	excavacion para zapatas	*Condición de seguridad: Accidentes de tránsito, Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo (caida de objetos). *Psico: Ruido intermitente, continuo de impacto, actividades adyacentes), Temperaturas extremas y radiaciones no ionizantes. *Psicologico: trabajo en equipo - jornada de trabajo *Biomecanico: manipulacion de cargas, postura prolongada mantenida miembros superiores e inferiores fuera del angulo de confort, movimiento repetitivo	*Golpes *Fracturas *Amputacion Muerte *Caidas a nivel y diferente nivel *Golpes, caidas, atrapamientos a mismo nivel *Enfermedades respiratorias *Golpes *Caidas *Amputacion *Lumbalgia *Enfermedades respiratorias *Heridas diversas *Golpes, caidas, atrapamientos, muerte	*Acompañamiento SST. *Presentaciones. *Charla de seguridad. *Tarjeta de seguridad. *Programa SVE. *Certificados EPP. *Mantenimiento preventivo y correctivo *Capacitacion *Uso de EPP (guantes, gafas, botas, etc) *Calificacion de trabajo en alturas *Capacitacion *Uso de formaleta nueva	Inspector SST Trabajadores
4	corte y anclado de acero	*Psicologico: trabajo en equipo - jornada de trabajo *Biomecanico: manipulacion de cargas, postura prolongada mantenida miembros superiores e inferiores fuera del angulo de confort, movimiento repetitivo *Condiciones de seguridad: Accidentes de tránsito. *Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo, caida de objetos. *Fisico: Ruido intermitente, continuo de impacto, (actividades adyacentes), equipos propios de la actividad) Temperaturas extremas y radiaciones no ionizantes	*Golpes *Golpes *Amputacion *Muerte *Amputacion *Enfermedades respiratorias *Quemaduras, fracturas, golpes, muerte, amputacion *Golpes Fracturas Amputacion *Golpes, caidas, atrapamientos a mismo nivel *Enfermedades respiratorias Golpes, caidas, atrapamientos, muerte	*Uso de botas de cuero, guantes de carnaza, gafas de seguridad, tapabocas *Uso de casco de seguridad. *Cinturon de seguridad. *Autoridad. *Uso de cortadora manual de mano amiga *Apertura de actividad *Reducción tiempo de exposición. *Inspecciones *Uso de EPP (protectores auditivos tapaoidos, botas, EPP) *Capacitacion *Plan de emergencias *Extintores de incendio, botiquin, camilla *Uso de Guayacan rodo	Inspector SST Trabajadores

592

5	encofrado de vigas y zapatas y columnas	*Psicergonomía: trabajo en equipo - jornada de trabajo *Biomecánico: manipulación de cargas, postura prolongada mantenida miembros superiores e inferiores fuera del ángulo de confort, movimiento repetitivo. *Condiciones de seguridad: Accidentes de trabajo. *Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo caída de objetos. *Químico: material particulado (actividades adyacentes). *Físico: Ruido intermitente, continuo o de impacto, (actividades adyacentes- equipos propios de la actividad).Temperaturas extremas y radiaciones no ionizantes	*Caídas a *Golpes Atrapados *Derrumbes *Deslizamientos *Movimientos Hernias discales Lesiones osteomusculares, neurológicas, muscular-esqueléticas *Lumbalgias *Dermatitis irritativas, alérgicas, otras *Lesiones oculares Heridas con cortantes, punzantes, mixtas *Golpes Fracturas Esguinces *Caídas a nivel y diferente nivel Quemaduras de piel Irritación de los ojos *Pérdida auditiva ocupacional (hipoacusia neurosensorial) *Cáncer de piel y enfermedades malignas, otras *Enfermedades respiratorias	*Acompañamiento SST. Riesgo químico *Charlas de seguridad *Programa SOL. *Auditorias SST. *Mantenimiento preventivo y correctivo. *Autocuidado. *Capacitación terapia activa manual y/o mecánica. Alternancia de actividades. *Reducción tiempo de exposición. *Inspecciones. *Uso de E.P.P (protectores auditivos moldeados, tapones, botas P.A). *Gimnasia. (pausas activas de seguridad) *Examenes ocupacionales principales de ingreso, periódico, egreso	Inspector SST Trabajadores
6	fundida de zapatas y columnas	*Psicergonomía: trabajo en equipo - jornada de trabajo *Biomecánico: Postura prolongada (bipeda). *Condiciones de seguridad: Accidentes de trabajo. Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo caída de objetos. Químico: material particulado (actividades adyacentes). *Físico: Ruido intermitente, continuo o de impacto, (actividades adyacentes).Temperaturas extremas y radiaciones no ionizantes	*Caídas a *Golpes *Atrapados *Derrumbes Hernia discal Lesiones osteomusculares de tipo lumbalgias, lesiones *Mareos y vértigo Heridas con cortantes, punzantes, mixtas *Golpes Fracturas *Esguinces Caídas a nivel y diferente nivel Quemaduras de piel Irritación de los ojos *Pérdida auditiva (hipoacusia neurosensorial) *Cáncer de piel y enfermedades malignas *Enfermedades respiratorias	*Acompañamiento SST *Propaganda visuales. Charlas de seguridad *Trabajar por sendero *Programa SOL. Auditorias SST *Autocuidado *Uso de E.P.P (protectores auditivos moldeados, tapones, botas P.A). *Personal empleado *Examenes ocupacionales de ingreso, periódico, egreso *Uso de bloqueador solar.	Inspector SST Trabajadores
8	desencofrado de zapatas y vigas	*Psicergonomía: trabajo en equipo - jornada de trabajo *Químico: contacto directo con el producto, gases y vapores. *Físico: Ruido intermitente, continuo o de impacto. (actividades adyacentes- equipos propios de la actividad),temperaturas extremas radiaciones no ionizantes. *Condiciones de seguridad: orden y aseo. *Biomecánico: postura prolongada miembros superiores e inferiores fuera de ángulo de confort.	*Caídas a *Golpes *Atrapados Lesiones osteomusculares *Movimientos repetitivos en la piel *Pérdida auditiva (hipoacusia neurosensorial) *Cáncer de piel y enfermedades malignas *Enfermedades respiratorias *Tropezón *Golpes *Uso de E.P.P (protectores auditivos moldeados, tapones, botas P.A) *Personal empleado *Examenes ocupacionales de ingreso, periódico, egreso *Uso de bloqueador solar.	*Acompañamiento SST *Charlas de seguridad *Calistenia *Plan de emergencia (protectores de seguridad) *Alternancia de actividades *Reducción *tiempo de exposición *Uso de E.P.P (protectores auditivos moldeados, tapones, botas P.A) *Uso de bloqueador solar	Inspector SST Trabajadores
9	Todas la actividad en general	*Psicergonomía: características del grupo social de trabajo (trabajo en equipo, relaciones interpersonales) *Condición de seguridad: accidentes de trabajo. Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel. *Físico: ruido intermitente, continuo o de impacto, y radiaciones no ionizantes. *Biológico: Virus. *Químico: material particulado. *Fenómenos Naturales: sismo, precipitaciones líquidas granizadas.	*Caídas a *Golpes *Atrapados *Derrumbes *Sismos *Caídas a nivel y diferente nivel *Golpes por objetos caídos, suspendidos o en movimiento *Heridas por cortantes, punzantes, mixtas *Quemaduras de piel y enfermedades malignas *Enfermedades respiratorias *Irritación de los ojos *Quemaduras de la piel *Cáncer de piel y enfermedades malignas *Quemaduras	*Acompañamiento SST *Charlas de seguridad. *Programa SOL. *Auditorias SST. *Uso de E.P.P (protectores auditivos moldeados, tapones, botas P.A). *Protección por vecinos. *Sistema de vigilancia epidemiológica. *Uso de bloqueador solar.	Inspector SST Trabajadores

13	ruido y otros	Físico: Ruido intermitente, continuo o de impacto. (actividades aplicables).; Temperaturas extremas y calidades no tratadas; *Químicos: material particulado (actividades aplicables). *Condiciones de seguridad: Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, caída de objetos *Psicolaborales: trabajo en equipo jornada de trabajo	*Pausas activas (Higiene postural y manejo de cargas) *Uso de elementos de protección personal (Gafas, guantes, protección auditiva, respiradores) *Capacitación sobre la salud *Inducción *Reinducción *Charlas de seguridad *Charlas de prevención *Programa PVE *Auditoria: ASI *Uso de EPP (casco, botas, protección auditiva, respirador, guantes para todas las actividades) *Trabajo en equipo *Uso de las pausas activas	*Acompañamiento SST *Programa incluido *Charlas de seguridad *Tramitar por cualquier *Programa PVE *Auditoria: ASI *Uso de EPP (casco, botas, protección auditiva, respirador, guantes para todas las actividades) *Trabajo en equipo *Uso de las pausas activas	Supervisor SST trabajadores

ELABORACIÓN

Nombre	Cédula	Cargo	Firma
Diana Yasmin Castillo	1078347869	Insp. SST	Diana Yasmin C
Nombre			

594

APROBACION			
Nombre	Cedula	Cargo	Firma

ORIENTADOR A			
Nombre	Cedula	Cargo	Firma
Wesdel Rincon S	3121594	Auxiliar	
Mauro ACabalLero R	3.250.057	Auxiliar	
Jose Wilson Garzon	80396967	OFC-AF	
Jaider Quiñones	1004200493	Oficial	
Dixon Rodriguez	98655a	Oficial	
Benjamin Lopez	3126013453	encargado	
Yelver cortes	1039314935	OF	
Marcelo moran	7356982	OF	
Manuel Mejia	1079656576	of	
willmer David	1025925897	OF	
ANDRES ARRoyo	7356936	OF	
Orlando Carrasco	1102 861 210	Orlando	
	1700407076		
Jhon Montenegro	1033755911	Oficial	

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Wesdel R S	Wesdel R S	Wesdel R S	Wesdel R S	Wesdel R S	Wesdel R S	
Dixon	Dixon	Dixon	Dixon	Dixon	Dixon	
Benjamin Lopez	Benjamin Lopez	Benjamin Lopez	Benjamin Lopez	Benjamin Lopez	Benjamin Lopez	
Manuel Mejia	Manuel Mejia	Manuel Mejia	Manuel Mejia	Manuel Mejia	Manuel Mejia	
willmer	willmer	willmer	willmer	willmer	willmer	
ARRoyo	ARRoyo	ARRoyo	ARRoyo	ARRoyo	ARRoyo	

Yoibin Quiñones

JPZ

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

PROYECTO: JARDIN	AREA: JARDIN	SITIO DEL TRABAJO:	No. TRABAJADORES: 9
EMPRESA: JPZ	CIUDAD: TOCANCIPA	FECHA INICIAL: 15 SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA FINAL: 17 SEPTIEMBRE DE 2023
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: CANGURO, PALAS, PICAS, CARRETILLAS, HERRAMIENTAS MENORES, COMPACTADOR DOBLE RUEDA.			HORA INICIAL: 7:00 A M
REQUIERE PERMISO DE TRABAJO: SI: X NO:	CUAL: PERMISO EN CALIENTE CORTE DE ACERO Y CORTE DE MADERA SIERRA CIRCULAR		

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

DESCRIPCION PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	PELIGROS / RIESGOS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS / ACCION DE CONTROL	CARGO DEL RESPONSABLE
Actividad inspección visual de herramientas y Area.	*Condición de seguridad: Accidentes de tránsito, Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo (caída de objetos). *Mecánicos: el estamos o partes de herramientas.	*Golpes *Fracturas *Trauma *Amputaciones. *Muerte. *Hipotermias, luxaciones, esguinces. *Caídas a nivel y a diferente nivel. *Atrapamiento	*Acompañamientos SST. *Preoperacionales. *Charlas de seguridad. *Trabajar por sectores. *Programa SOL. *Auditorias ARL. *Adoptar medidas preventivas y/o correctivas. *Amonestación.	Inspector SST Trabajadores
Alistamiento y transporte de herramientas manuales y equipos	*Psicológicos: trabajo en equipo - jornada de trabajo *Biomecánicos: Esfuerzos. *Condiciones de seguridad: Accidentes de tránsito *Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo, caída de objetos. *Físicos: Ruido intermitente, continuo de impacto. (actividades adyacentes) Temperaturas extremas radiaciones no ionizantes *Químicos: material particulado (actividades adyacentes).	*Cefalea. *Estrés. *Ansiedad. *Trastornos musculo-esqueléticos *Lumbalgias. *Discopatías lumbares, ciáticas, sacras *Hernias discales. *Hematomas, fracturas, luxaciones, muerte. *Golpes *Fracturas *Traumas *Caídas a nivel y diferente nivel *Pérdida auditiva	*Acompañamientos SST. *Preoperacionales. *Charlas de seguridad. *Trabajar por sectores. *Programa SOL. *Auditorias ARL. *Mantenimiento preventivo y/o correctivo. *Amonestación. *Uso de E.P.I (protectores auditivos inserción, monogafas, botas P.A) *Capacitación manipulación manual y/o mecánico *Calistenia *Uso de bloqueador solar.	Inspector SST Trabajadores
Retirado y replanteo de topografía	*Condición de seguridad: Accidentes de tránsito, Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo (caída de objetos). *Físicos: Ruido intermitente, continuo de impacto. (actividades adyacentes). Temperaturas extremas y radiaciones no ionizantes *Psicológicos: trabajo en equipo - jornada de trabajo *Biomecánicos: manipulación de cargas, postura prolongada mantenida miembros superiores e inferiores fuera del angulo de confort, movimiento repetitivo.	*Golpes *Traumas *Fracturas *Muerte *Caídas a nivel y diferente nivel *Pérdida auditiva (Hipoacusia leve, moderada o severa). *Cancer de piel y quemaduras solares leves *Enfermedades respiratorias *Cefalea. *Estrés. *Ansiedad. *Lumbalgias.	*Acompañamientos SST. *Preoperacionales. *Charlas de seguridad. *Programa SOL. *Auditorias ARL. *Amonestación. *Capacitación manipulación manual y/o mecánico. *Alternancia de actividades. *Reducción tiempo de exposición. *Inspecciones. *Uso de E.P.I (protectores auditivos inserción, monogafas, botas P.A). *Calistenia *Plan de emergencias (protocolos de seguridad). *Examenes ocupacionales de ingreso, periodico, egreso. *Uso de bloqueador solar.	Inspector SST Trabajadores
PORRE DE PISO	*Psicológicos: trabajo en equipo - jornada de trabajo *Biomecánicos: manipulación de cargas, postura prolongada mantenida miembros superiores e inferiores fuera del angulo de confort, movimiento repetitivo. *Condiciones de seguridad: Accidentes de tránsito. *Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo, caída de objetos. *Físicos: Ruido intermitente, continuo e de impacto. (actividades adyacentes- equipos propios) de la actividad).Temperaturas extremas radiaciones no ionizantes. Vibración: Segmentaria.	*Cefalea. *Estrés. *Ansiedad. *Problemas cardiovasculares. *Trastornos vasculares, neurológicos, musculo-esqueléticos *Fenómeno de Raynaud o Dedo Blanco, artritis. *Lumbalgias *Discopatías lumbares, ciáticas, sacras. *Hernias discales. *Hematomas, fracturas, luxaciones, muerte. *Caídas a nivel	*Acompañamientos SST. *Preoperacionales. *Charlas de seguridad. *Programa SOL. *Auditorias ARL. *Amonestación. *Capacitación manipulación manual y/o mecánico. *Alternancia de actividades. *Reducción tiempo de exposición. *Inspecciones. *Uso de E.P.I (protectores auditivos inserción, monogafas, botas P.A). *Calistenia. *Plan de emergencias (protocolos de seguridad). *Examenes ocupacionales de ingreso, periodico, egreso. *Uso de bloqueador solar.	Inspector SST Trabajadores
ESCOGER ACERO - ANCLAJE DE ACERO	*Condición de seguridad: Accidentes de tránsito, Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo (caída de objetos). *Físicos: Ruido intermitente, continuo de impacto. (actividades adyacentes). Temperaturas extremas y radiaciones no ionizantes *Psicológicos: trabajo en equipo - jornada de trabajo. *Biomecánicos: manipulación de cargas, postura prolongada mantenida miembros superiores e inferiores fuera del angulo de confort, movimiento repetitivo.	*Golpes *Traumas *Fracturas *Muerte *Caídas a nivel y diferente nivel *Pérdida auditiva (Hipoacusia leve, moderada o severa). *Cancer de piel y quemaduras solares leve *Enfermedades respiratorias *Cefalea. *Estrés. *Ansiedad. *Lumbalgias.	*Acompañamientos SST. *Preoperacionales. *Charlas de seguridad. *Programa SOL. *Auditorias ARL. *Amonestación. *Capacitación manipulación manual y/o mecánico. *Alternancia de actividades. *Reducción tiempo de exposición. *Inspecciones. *Uso de E.P.I (protectores auditivos inserción, monogafas, botas P.A). *Calistenia. *Plan de emergencias (protocolos de seguridad). *Examenes ocupacionales de ingreso, periodico, egreso. *Uso de bloqueador solar.	Inspector SST Trabajadores
ENCOFRADO DE VIGAS Y FUNDIDAS	*Psicológicos: trabajo en equipo - jornada de trabajo *Biomecánicos: manipulación de cargas, postura prolongada mantenida, movimiento repetitivo, esfuerzo Mecánicos: atrapamiento por partes o materiales en movimiento, material proyectado sólido o fluido. *Condiciones de seguridad: Accidentes de tránsito. *Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes y con diferencia de nivel, orden y aseo, caída de objetos. Tecnológicos: incendios. *Químicos: material particulado (actividades adyacentes).	*Cefalea. *Estrés. *Ansiedad. *Problemas cardiovasculares *Trastornos vasculares, neurológicos, musculo-esqueléticos *Fenómeno de Raynaud o Dedo Blanco, artritis. *Lumbalgias. *Discopatías lumbares, ciáticas, sacras. *Hernias discales. *Hematomas, fracturas, luxaciones, muerte. *Atrapamientos *Quemaduras *Caídas a nivel y diferente nivel *Quemaduras 1°, 2° y 3°. *Irritación ocular	*Acompañamientos SST. *Preoperacionales. *Charlas de seguridad *Programa SOL. *Auditorias ARL. *Amonestación. *Capacitación manipulación manual y/o mecánico *Alternancia de actividades. *Reducción tiempo de exposición. *Inspecciones. *Uso de E.P.I (protectores auditivos inserción, monogafas, botas P.A). *Calistenia. *Plan de emergencias (protocolos de seguridad) *Examenes ocupacionales de ingreso, periodico, egreso. *Uso de bloqueador solar.	Inspector SST Trabajadores

NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DEL ATS

Nombres Completos	No. Cédula	CARGO	FIRMAS
Diana Yasmin Castillo	1028342949	LASO, SST	Diana Yasmin C.

tbs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	NÚMERO DOCUMENTO	CARGO	EPS	ARL	FONDO PENSIONES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Luis Madarriaga	1100401076	Oficial		Colpatria	Porvenir							
Melissa Vargas	1722802	Encargada	Sura	Colpatria	Porvenir							
Jeeifr Carrasco	1102861240	Oficial	Saludtotal	Colpatria	Colfondos							
Manuel Mejia	1079656576	Oficial	Saludtotal	Colpatria	Porvenir							
Jhon Montealegre	1033755912	Oficial	Nueva EPS	Colpatria	Porvenir							
Andres Arrollo	73563565	Oficial	Nueva EPS	Colpatria	Colfondos	ARROYO	ARROYO	ARROYO	ARROYO	ARROYO	ARROYO	
Arcenio Mora	73564982	Oficial	Famisanar	Colpatria	Colfondos							
Yaiba Quiñones	1004200332	Oficial	Famisanar	Colpatria	Porvenir							
Yiver Centeno	1023931435	Oficial	Compensar	Colpatria	Porvenir							

COMPROMISO: Cualquiera que cooperen al proceso ATS y reforma por su cumplimiento

DIRECTOR HST
NOMBRE: Diana Yazmin Castillo
CARGO: Ingeniera
FIRMA: Diana Yazmin C.

SUPERVISOR DE OBRA O ENCARGADO
NOMBRE: Benjamin Garcia
CARGO: Encargado
FIRMA: Benjamin Garcia

OBSERVACIONES
