SUBGERENCIA DE TURISMO - IDECUT
REPORTE DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE ACTIVIDADES SEMANAL

FECHA:	31 DE JULIO DE 2023	REPORTE No.	13	DEL	09 DE OCTUBRE DE 2023	AL	14 DE OCTUBRE DE 2023

DATOS GENERALES

Convenio No. 643 de 2023 **Resguardo** Comunidad Muisca del Municipio de Sesquilé **Avance de obra %** 39

Objeto: **Adecuación y mantenimiento de la infraestructura turistica del departamento de Cundinamarca.**

Valor total del Proyecto: $ 200.000.000,00

Fecha de Suscripcion Convenio 28 de Junio de 2023 **Fecha Acta de Inicio:** 17 de Julio de 2023

Fecha de Terminacion Convenio 16 de Diciembre de 2023 **Director de Obra:** Ing. Javier Andres Espitia Jiminez

Municipio: Sesquilé **Matricula profesional:** 25202176294 CND

Ubicación del proyecto: COMUNIDAD MUISCA DEL MUNICIPIO DE SESQUILE

INFORME TÉCNICO


ESTADO DEL PROYECTO:	PRESENTA RETRASO	SI	NO	

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO - SEMANA 1

* Se realiza ubicación la actividad de pintura sobre pañete en el Museo.
* Se da continuidad al mantenimiento de sendero en acabado en piedra laja.
* Se inicia con la actividad de empajado del la cubierta existente del kusmui.

REGISTRO FOTOGRAFICO

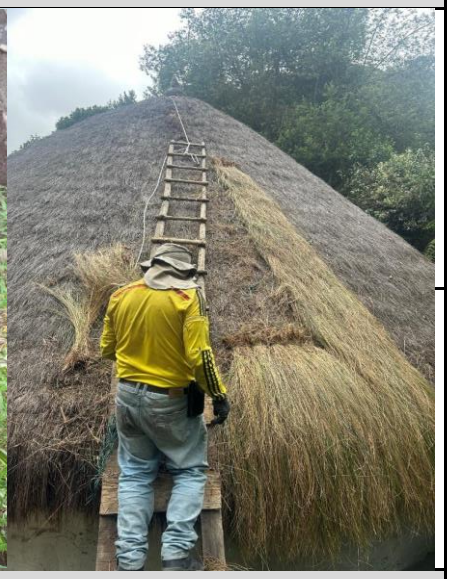

OBERVACIONES - COMENTARIOS - NOVEDADES

* Debido a las frecuentes lluvias durante el periodo ejecutado se han presentado atrazos de las actividades programadas.

RELACION DE VISITAS ADELANTADAS POR EL DIRECTOR DE OBRA DURANTE EL PERIODO RELACIONADO

Visita 1: 09 de octubre de 2023	Visita 2: 11 de octubre de 2023
Visita 3: 12 de octubre de 2023	Visita 4: 14 de octubre de 2023

ELABORÓ:

ING. / ING. JAVIER ANDRES ESPITIA JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRA - RESGUARDO MUISCA

REVISÓ:

LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO
SUPERVISOR DE PROYECTO - IDECUT
