CORTE DE OBRA No. 1

DIRECCIÓN EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ

PALACIO DE JUSTICIA

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUÍ

No. DE CONTRATO	054 del 2023
CONTRATISTA	GM INGENIERA Y CONCRETO S.A.S.
CONTRATANTE	LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO	$ 53.728.047,00

		BALANCE INICIAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE No 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	PRELIMINARES										
1.1	LIMPIEZA, RASPADO Y LAVADO MECÁNICO DE VIGA CANAL EN CONCRETO, ANCHO 0.20 - 0.30 m	m	7,87	$ 12.941,00	**$ 101.845,67**						
1.2	RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO	m^2	570,33	$ 3.346,00	**$ 1.908.324,18**	561,09	$ 1.877.407,14	561,09	$ 1.877.407,14	561,09	$ 1.877.407,14
1.3	DEMOLICIÓN PAÑETES	m^2	1,79	$ 5.041,00	**$ 9.023,39**	1,75	$ 8.821,75				
2	PAÑETES										
2.1	RESANE FILOS MUROS	m	97,37	$ 5.644,00	**$ 549.556,28**	95,46	$ 538.776,24				
2.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m^2	1,79	$ 20.805,00	**$ 37.240,95**	1,75	$ 36.408,75				
3	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS										
3.1	ARREGLO FILTRACIÓN TUBERÍA AGUA POTABLE 1 1/2"	UND	1,02	$ 114.391,00	**$ 116.678,82**	1,00	$ 114.391,00				
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA PARA AGUA LLUVIAS	m	8,12	$ 72.204,00	**$ 586.296,48**	7,96	$ 574.743,84				
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS + ACCESORIOS	m	7,12	$ 63.492,00	**$ 452.063,04**	6,98	$ 443.174,16				
4	PINTURA										
4.1	ANTIHUMEDAD FACHADAS TRANSPARENTE (2 CAPAS)	m^2	542,33	$ 19.299,00	**$ 10.466.426,67**	531,70	$ 10.261.278,30	531,70	$ 10.261.278,30	531,70	$ 10.261.278,30
4.2	ESTUCO MUROS	m^2	1,79	$ 7.366,00	**$ 13.185,14**	1,75	$ 12.890,50				
4.3	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES BLANCA, ROJA, AMARILLA, AZUL	m^2	585,91	$ 14.039,00	**$ 8.225.590,49**	574,42	$ 8.064.282,38	574,42	$ 8.064.282,38	574,42	$ 8.064.282,38
4.4	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO	m^2	626,93	$ 4.949,00	**$ 3.102.676,57**	614,64	$ 3.041.839,11	614,64	$ 3.041.853,36	614,64	$ 3.041.853,36
4.5	ESMALTE PUERTA EN PARALES METÁLICOS DOS MANOS (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m	350,06	$ 10.183,00	**$ 3.564.660,98**	343,20	$ 3.494.805,60				
4.6	ESMALTE MARCOS FACHADA (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m^2	24,61	$ 12.174,00	**$ 299.602,14**	24,13	$ 293.758,62				
5	CUBIERTAS										
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ASFÁLTICA	m	35,14	$ 11.421,00	**$ 401.333,94**	34,45	$ 393.453,45				
5.2	MANTENIMIENTO MANTO ASFÁLTICO	m^2	544,07	$ 20.973,00	**$ 11.410.780,11**	533,40	$ 11.186.998,20	525,80	$ 11.027.603,40	525,80	$ 11.027.603,40
6	CARPINTERÍA METÁLICA										
6.1	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA FACHADA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	m^2	7,44	$ 312.854,00	**$ 2.327.633,76**	7,29	$ 2.280.705,66				
6.2	DESMONTE VIDRIO TEMPLADO	m^2	1,51	$ 6.052,00	**$ 9.138,52**	1,48	$ 8.956,96				
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 5 mm	m^2	1,51	$ 81.668,00	**$ 123.318,68**	1,48	$ 120.868,64				
7	PAÑETES										
7.1	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 m CON AISLANTE ACÚSTICO	m^2	1,47	$ 87.896,00	**$ 129.207,12**	1,44	$ 126.570,24				
					$ -						
SUBTOTAL					**$ 43.834.583,00**		**$ 42.880.131,00**		**$ 34.272.425,00**		**$ 34.272.425,00**
ADMINISTRACION				15%	$ 6.575.187,00		$ 6.432.020,00	15%	$ 5.140.864,00		$ 5.140.864,00
IMPREVISTO				4%	$ 1.753.383,00		$ 1.715.205,00	4%	$ 1.370.897,00		$ 1.370.897,00
UTILIDAD				3%	$ 1.315.037,00		$ 1.286.404,00	3%	$ 1.028.173,00		$ 1.028.173,00
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	$ 249.857,00		$ 244.417,00	19%	$ 195.353,00		$ 195.353,00
COSTO TOTAL					**$ 53.728.047,00**		**$ 52.558.177,00**		**$ 42.007.712,00**		**$ 42.007.712,00**

REPRESENTANTE LEGAL
ING,. WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.

SUPERVISORA DEL CONTRATO
ING. SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUÍ

GM Ingeniería y Concreto

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	27	**MM**	11	**AA**	2023	**PERIODO:**				
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 054 del 2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUÍ**			
CONTRATANTE:	LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA						**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.								**561,09**		561,09
ITEM:	1.2	RASPADO DE SUPERFICIE DE MURO PINTADO EN VINILO					**UNID:**	m2	**UBICACIÓN:**		

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						561,09
Fachada recepción primer nivel, borde superior	1,00	25,63	0,40			10,25
Fachada lateral lateral derecha recepción	1,00	3,80	2,58			9,80
Vano puerta fachada lateral derecha recepción	1,00	0,90	2,00		Descuento de area	1,80
Fachada depósito	2,00	2,00	2,58			10,32
Fachada frontal primer nivel	2,00	3,13	0,40			2,50
	1,00	23,95	1,20			28,74
Fachada lateral derecho primer nivel	1,00	10,87	3,33			36,20
Marcos fachada lateral derecha primer piso	2,00	9,27	0,30			5,56
	2,00	1,73	0,30			1,04
Vano ventana fachada lateral derecha primer nivel	1,00	1,22	1,23		Descuento de area	1,50
Viga cubierta policarbonato primer nivel	1,00	34,45	0,40			13,78
Fachada frotal segundo nivel	1,00	23,95	1,10			26,35
Fachada lateral derecha segundo nivel	1,00	8,70	3,28			28,54
Vano ventana 1	1,00	0,61	1,85		Descuento de area	1,13
Vano ventana 2	1,00	1,84	1,85		Descuento de area	3,40
Vano ventana 3	1,00	3,58	1,50		Descuento de area	5,37
Marcos fachada lateral derecha segundo piso	2,00	8,30		1,10		18,26
Marcos fachada lateral derecha segundo piso	2,00		2,58	1,10		5,68
Fachada lateral izquierda segundo nivel	1,00	8,70	3,28			28,54
Fachada posterior segundo nivel (Auditorio y cafetería)	1,00	13,50	2,98			40,23
Fachada posterior segundo nivel (Salas audiencias y baños)	1,00	21,65	2,98			64,52
Vanos segundo nivel salas de audiencias	1,00	17,45	1,94		Descuento de area	33,85
Fachada frotal tercer nivel nivel	1,00	23,95	1,30			31,14
Fachada lateral derecho tercer nivel	1,00	10,92	3,33			36,36
Marcos fachada lateral derecha primer piso	2,00	9,32	0,30			5,59
	2,00	1,73	0,30			1,04
Vano ventana 1	1,00	1,85	1,85		Descuento de area	3,42
Vano ventana 2	1,00	3,60	1,85		Descuento de area	6,66
Vano ventana 3	1,00	0,45	1,85		Descuento de area	0,83
Fachada lateral izquierda tercer nivel	1,00	10,92	3,33			36,36
Fachada posterior tercer nivel (Juzgado Civil del Cto)	1,00	13,48	2,98			40,17
Vano ventana	1,00	12,41	1,94		Descuento de area	24,08
Fachada posterior tercer nivel (Juzgados y baño)	1,00	21,65	2,98			64,52
Vano ventana	1,00	17,55	1,94		Descuento de area	34,05
						0,00
Baños damas segundo nivel	1,00	15,19	0,92			13,94
						0,00
Subtotal						**561,09**
TOTAL						**561,09**

OBSERVACIONES:

ELABORO

RESIDENTE DE OBRA
ING. WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

PRESENTÓ:

REPRESENTANTE LEGAL
ING. WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

APROBÓ:

SUPERVISORA DEL CONTRATO
ING. SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUÍ


GM Ingeniería y Concreto

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	27	**MM**	11	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 054 del 2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUÍ**
CONTRATANTE:	LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.							**531,70** / 531,70
ITEM:	4.1	ANTIHUMEDAD FACHADAS TRANSPARENTE (2 CAPAS)					**UNID:**	m2 / **SERVITÁ**

ESQUEMA



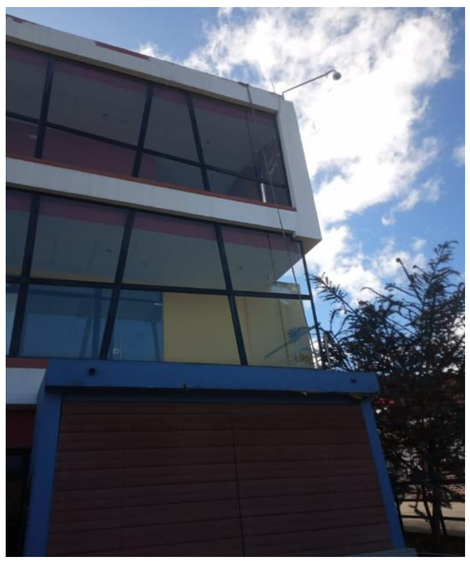



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	%	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							531,70
Fachada recepción primer nivel, borde superior	1,00	25,63	0,40		100%		10,25
Fachada lateral derecha recepción	1,00	3,80	2,58		100%		9,80
Vano puerta fachada lateral derecha recepción	1,00	0,90	2,00		100%	Descuento de area	1,80
Fachada depósito	2,00	2,00	2,58		100%		10,32
Fachada frontal primer nivel borde sup	2,00	3,13	0,40		100%		2,50
	1,00	23,95	1,20		100%		28,74
Fachada lateral derecho primer nivel	1,00	10,87	3,33		100%		36,20
Marcos fachada lateral derecha primer piso	2,00	9,27	0,30		100%		5,56
	2,00	1,73	0,30		100%		1,04
Vano ventana fachada lateral derecha primer nivel	1,00	1,22	1,23		100%	Descuento de area	1,50
Fachada frotal segundo nivel borde sup	1,00	23,95	1,10		100%		26,35
Fachada lateral derecha segundo nivel	1,00	8,70	3,28		100%		28,54
Vano ventana 1	1,00	0,61	1,85		100%	Descuento de area	1,13
Vano ventana 2	1,00	1,84	1,85		100%	Descuento de area	3,40
Vano ventana 3	1,00	3,58	1,85		100%	Descuento de area	6,62
Marcos fachada lateral derecha segundo piso	2,00	8,30		1,10	100%		18,26
Marcos fachada lateral derecha segundo piso	2,00		2,58	1,10	100%		5,68
Fachada lateral izquierda segundo nivel	1,00	8,70	3,28		100%		28,54
Fachada posterior segundo nivel (Auditorio y cafetería)	1,00	13,50	2,98		100%		40,23
Fachada posterior segundo nivel (Salas audiencias y baños)	1,00	21,65	2,98		100%		64,52
Vanos segundo nivel salas de audiencias	1,00	17,45	1,94		100%	Descuento de area	33,85
Fachada frontal tercer nivel borde sup	1,00	23,95	1,30		100%		31,14
Fachada lateral derecho tercer nivel	1,00	10,92	3,33		100%		36,36
Marcos fachada lateral derecha primer piso	2,00	9,32	0,30		100%		5,59
	2,00	1,73	0,30		100%		1,04
Vano ventana 1	1,00	1,85	1,85		100%	Descuento de area	3,42
Vano ventana 2	1,00	3,60	1,85		100%	Descuento de area	6,66
Vano ventana 3	1,00	0,45	1,85		100%	Descuento de area	0,83
Fachada lateral izquierda tercer nivel	1,00	10,92	3,33		100%		36,36
Fachada posterior tercer nivel (Juzgado Civil del Cto)	1,00	13,48	2,98		100%		40,17
Vano ventana	1,00	12,41	1,94		100%	Descuento de area	24,08
Fachada posterior tercer nivel (Juzgados y baño)	1,00	21,65	2,98		100%		64,52
Vano ventana	1,00	17,55	1,94		100%	Descuento de area	34,05
							0,00
Subtotal							**531,70**
TOTAL							**531,70**

OBSERVACIONES:

ELABORO

RESIDENTE DE OBRA
ING. WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

PRESENTÓ:

REPRESENTANTE LEGAL
ING. WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

APROBÓ:

SUPERVISORA DEL CONTRATO
ING. SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUÍ

GM Ingeniería y Concreto

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	27	**MM**	11	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 054 del 2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUÍ**

CONTRATANTE:	LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.		**574,42**	574,42

ITEM:	4.3	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES BLANCA, ROJA, AMARILLA, AZUL	**UNID:**	m2	**UBICACIÓN:**	

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						574,42
Fachada recepción primer nivel, borde superior	1,00	25,63	0,40			10,25
Fachada lateral lateral derecha recepción	1,00	3,80	2,58			9,80
Vano puerta fachada lateral derecha recepción	1,00	0,90	2,00		Descuento de area	1,80
Fachada depósito	2,00	2,00	2,58			10,32
Fachada frontal primer nivel	2,00	3,13	0,40			2,50
	1,00	23,95	1,20			28,74
Fachada lateral derecho primer nivel	1,00	10,87	3,33			36,20
Marcos fachada lateral derecha primer piso	2,00	9,27	0,30			5,56
	2,00	1,73	0,30			1,04
Vano ventana fachada lateral derecha primer nivel	1,00	1,22	1,23		Descuento de area	1,50
Fachada lateral izquierda primer nivel	1,00	9,02	2,58			23,27
Vano puerta planta eléctrica 1	1,00	3,20	2,58		Descuento de area	8,26
Vano puerta planta eléctrica 2	1,00	3,97	2,58		Descuento de area	10,24
Columnas frente a planta eléctrica	1,00	2,20	2,58			5,68
Viga cubierta policarbonato primer nivel	1,00	34,45	0,40			13,78
Fachada frotal segundo nivel	1,00	23,95	1,10			26,35
Fachada lateral derecha segundo nivel	1,00	8,70	3,28			28,54
Vano ventana 1	1,00	0,61	1,85		Descuento de area	1,13
Vano ventana 2	1,00	1,84	1,85		Descuento de area	3,40
Vano ventana 3	1,00	3,58	1,85		Descuento de area	6,62
Marcos fachada lateral derecha segundo piso	2,00	8,30		1,10		18,26
Marcos fachada lateral derecha segundo piso	2,00		2,58	1,10		5,68
Fachada lateral izquierda segundo nivel	1,00	8,70	3,28			28,54
Fachada posterior segundo nivel (Auditorio y cafetería)	1,00	13,50	2,98			40,23
Fachada posterior segundo nivel (Salas audiencias y baños)	1,00	21,65	2,98			64,52
Vanos segundo nivel salas de audiencias	1,00	17,45	1,94		Descuento de area	33,85
Fachada frotal tercer nivel nivel	1,00	23,95	1,30			31,14
Fachada lateral derecho tercer nivel	1,00	10,92	3,33			36,36
Marcos fachada lateral derecha primer piso	2,00	9,32	0,30			5,59
	2,00	1,73	0,30			1,04
Vano ventana 1	1,00	1,85	1,85		Descuento de area	3,42
Vano ventana 2	1,00	3,60	1,85		Descuento de area	6,66
Vano ventana 3	1,00	0,45	1,85		Descuento de area	0,83
Fachada lateral izquierda tercer nivel	1,00	10,92	3,33			36,36
Fachada posterior tercer nivel (Juzgado Civil del Cto)	1,00	13,48	2,98			40,17
Vano ventana	1,00	12,41	1,94		Descuento de area	24,08



Fachada posterior tercer nivel (Juzgados y baño)	1,00	21,65	2,98			64,52
Vano ventana	1,00	17,55	1,94		Descuento de area	34,05
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Subtotal			**574,42**
			TOTAL			**574,42**

OBSERVACIONES:

ELABORO

RESIDENTE DE OBRA
ING. WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

PRESENTÓ:

REPRESENTANTE LEGAL
ING. WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

APROBÓ:

SUPERVISORA DEL CONTRATO
ING. SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUÍ

GM Ingeniería y Concreto

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	27	**MM**	11	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 054 del 2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUÍ**
CONTRATANTE:	LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.							**614,64** / 614,64
ITEM:	4.4	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE DOS MANOS SOBRE ESTUCO					**UNID:** m2	**UBICACIÓN:**

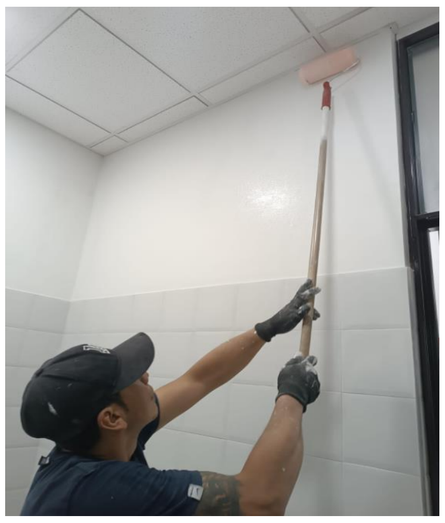





ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							614,64
	Muros internos Juzgado Civil del Circuito	1,00	36,54	2,58			94,27
		2,00	2,00	2,58			10,32
	Vano ventana	1,00	8,80	1,94		Descuento de area	17,07
	Vano ventanilla	1,00	2,29	1,53		Descuento de area	3,50
	Vano puerta	1,00	0,80	2,00		Descuento de area	1,60
							0,00
	Muros internos Juzgado Penal del circuito	1,00	27,12	2,58			69,97
	Vano ventana	1,00	3,81	1,94		Descuento de area	7,39
	Vano ventanilla	1,00	1,93	1,53		Descuento de area	2,95
	Vano puerta	1,00	0,80	2,00		Descuento de area	1,60
							0,00
	Muros internos Juzgado 1ro Promiscuo Municipal	1,00	27,12	2,58			69,97
	Vano ventana	1,00	4,58	1,94		Descuento de area	8,89
	Vano ventanilla	1,00	1,93	1,53		Descuento de area	2,95
	Vano puerta	1,00	0,80	2,00		Descuento de area	1,60
							0,00
	Muros internos Juzgado 2do Promiscuo Municipal	1,00	27,12	2,58			69,97
	Vano ventana	1,00	4,58	1,94		Descuento de area	8,89
	Vano ventanilla	1,00	1,93	1,53		Descuento de area	2,95
	Vano puerta	1,00	0,80	2,00		Descuento de area	1,60
							0,00
	Baños damas segundo nivel	1,00	15,19	0,80			12,15
							0,00
	Muros internos sala de Aud Juzgado Civil del Circuito	1,00	26,90	2,58			69,40
	Vano ventana	1,00	3,95	1,94		Descuento de area	7,66
	Vano puerta	1,00	0,80	2,00		Descuento de area	1,60
							0,00
	Muros internos sala de Aud Juzgado 2do Promiscuo Mpal	1,00	26,46	2,58			68,27
	Vano ventana	1,00	4,50	1,94		Descuento de area	8,73
	Vano puerta	1,00	0,80	2,00		Descuento de area	1,60
							0,00
	Muros internos sala de Aud Juzgado 1ro Promiscuo Mpal	1,00	26,46	2,58			68,27
	Vano ventana	1,00	4,50	1,94		Descuento de area	8,73
	Vano puerta	1,00	0,80	2,00		Descuento de area	1,60
							0,00
	Muros internos sala de Aud Juzgado Penal del Circuito	1,00	26,46	2,58			68,27
	Vano ventana	1,00	4,50	1,94		Descuento de area	8,73
	Vano puerta	1,00	0,80	2,00		Descuento de area	1,60
							0,00
	Viga cubierta policarbonato primer nivel	1,00	34,45	0,40			13,78
							0,00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**614,64**
	TOTAL						**614,64**

ELABORO

RESIDENTE DE OBRA
ING. WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

PRESENTÓ:

REPRESENTANTE LEGAL
ING. WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

APROBÓ:

SUPERVISORA DEL CONTRATO
ING. SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUÍ


GM Ingeniería y Concreto

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	27	**MM**	11	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 054 del 2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RAMIRIQUÍ**
CONTRATANTE:	LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.							**525,80** / 525,80
ITEM:	5.2	MANTENIMIENTO MANTO ASFÁLTICO					**UNID:** m2	**UBICACIÓN:**

ESQUEMA



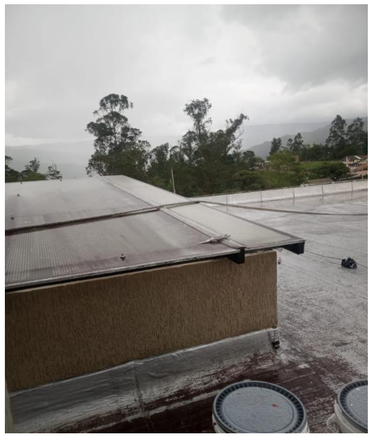



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						525,80
Cubierta recepcion	1,00			73,09		73,09
						0,00
Cubierta general	1,00	42,27	10,71			452,71
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Subtotal						**525,80**
TOTAL						**525,80**

OBSERVACIONES:

ELABORO

RESIDENTE DE OBRA
ING. WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

PRESENTÓ:

REPRESENTANTE LEGAL
ING. WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

APROBÓ:

SUPERVISORA DEL CONTRATO
ING. SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO
