INFORME FINAL DE INTERVENTORIA No.: 6

20 DE ENERO AL 19 DE JUNIO 2023

OBJETO:
Realizar actividades a todo costo que se desarrollen en el marco del proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", en cumplimiento al plan de acción 2020-2023 "Amazonas Vivas".

CONTRATO DE OBRA No 711 DE 2022



Leticia, JUNIO 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....4
2. INFORME DE AVANCE TECNICO 5
2.1. INFORMACIÓN GENERAL: 5
2.2. ACTUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CORPOAMAZONIA 2020-2023 AL QUE APORTA EL PROYECTO....7
2.2.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 7
2.2.2. Plan de Acción Institucional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonia Colombiana CORPOAMAZONIA....8
2.3. POBLACION BENEFICIARIA Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 10
2.4. INFORMACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA....12
2.5. OBJETIVO GENERAL.....13
2.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 13
2.7. METAS. 13
3. ANTECEDENTES DEL CONTRATO. 13
4. LOGROS Y ALCANCES DEL PROYECTO....14
5. EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO. 22
5.1. EVALUACIÓN PORCENTUAL POR COMPONENTE....20
5.2. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA....21
5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO....23
5.4. OBSERVACIONES....26
6. ANEXOS....26

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....5
TABLA 2. CONTROL DE PÓLIZAS 6
TABLA 3. INFORMACION Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO. 12
TABLA 4. BALANCE AVANCE FISICO-FINANCIERO 20
TABLA 5. AVANCE PORCENTUAL.....21

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Localizacion Satelital (origen Googlr earth).....11
Figura 2 Avance físico de la obra.....21
Figura 3 Porcentaje avance de obra 22
Figura 4 Porcentaje Ejecutado Vs % Programado 22

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, hace parte de las obligaciones contractuales adquiridas bajo el **CONTRATO INTERVENTORIA PARA OBRAS No. 718 DE 2022**, entre MARIO FERNANDO LÓPEZ MUÑOZ Y LA Corporación Para El Desarrollo Sostenible De La Amazonía - CORPOAMAZONIA, con el objeto de: Realizar la Interventoría externa en el marco del proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", en cumplimiento al plan de acción 2020-2023 "Amazonas Vivas".

Por lo tanto, este informe contiene toda la información necesaria para que CORPOAMAZONIA puedan verificar el cumplimiento de las obligaciones suscritas, en lo relativo a la ejecución física y financiera. En los anexos a este informe, se registran todos los controles realizados al proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Además, se presenta un resumen detallado de los procesos constructivos de las actividades ejecutadas por el contratista, los cuales se soportan con diagramas y gráficos los cuales representan el avance de obra a cierre de fecha, se relaciona personal, equipo y herramientas utilizadas durante el periodo que comprende el presente informe. También se presenta un registro fotográfico especificando la ubicación y fecha de las labores desarrolladas.

.

2. INFORME DE AVANCE TECNICO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL:

TABLA 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Proyecto		*Realizar actividades a todo costo que se desarrollen en el marco del proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", en cumplimiento al plan de acción 2020-2023 "Amazonas Vivas".*
No. De contrato		No 711 DE 2022
Plazo de ejecución		Seis (05) meses a partir de la firma de acta de inicio
Cooperantes		CORPOAMAZONIA
Valor total		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($277.134.520) MDA/CTE.
Aportes	**Efectivo**	APORTES CORPOAMAZONIA: $ 277.134.520 Al contrato de Obra $ 26.537.000 A la Interventoría
Fecha de inicio de acuerdo a acta de inicio		20/01/2023.
Fecha de terminación		19/06/2023
Ejecutor del proyecto		CORPOAMAZONIA
Interventor		MARIO FERNANDO LÓPEZ MUÑOZ
Supervisor obra civil		ANA LUCIA LOPEZ
Supervisor Forestal		JESUS DIAZ

Pólizas y garantías	VER TABLA 2. CONTROL DE POLIZAS

TABLA 2. CONTROL DE PÓLIZAS

ANEXO 0 (De Legalización del contrato)			
COMPAÑÍA MULDIAL DE SEGUROS S. A.	NV- 100080616	VIGENCIA	
CONCEPTO	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	27.713.452.00	30/12/2022	30/11/2023
ANTICIPO	138.567.260.00	30/12/2022	30/190/2023
PRESTACIONES SOCIALES	13.856.726	30/12/2022	31/05/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	27.713.452.00	30/12/2022	30/11/2023
ESTABILIDAD DE LA OBRA	27.713.452.00	30/12/2022	30/11/2023
ANEXO 1 (Actualización acta de inicio)			
COMPAÑÍA MULDIAL DE SEGUROS S. A.	NV- 100080616	VIGENCIA	
CONCEPTO	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	27.713.452.00	20/01/2023	21/12/2023
ANTICIPO	138.567.260.00	20/01/2023	21/10/2023
PRESTACIONES SOCIALES	13.856.726	20/01/2023	21/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	27.713.452.00	21/06/2023	21/12/2023
ESTABILIDAD DE LA OBRA	27.713.452.00	30/12/2022	21/06/2026

2.2. ACTUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CORPOAMAZONIA 2020-2023 AL QUE APORTA EL PROYECTO

2.2.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND)

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, expedido por medio de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.

El plan de desarrollo departamental 2020 - 2023 “PROGRESANDO CON EQUIDAD”, en el Sector de Medio ambiente, incluye el desarrollo de las siguientes estrategias y programas.

Línea estratégica 4	Componentes	Condiciones generales
Amazonas Económicamente Sostenible, Competitiva e Innovadora	Amazonas Competitiva y Productiva	Economía agropecuaria
		Economía forestal
		Negocios verdes
		Alianzas productivas
		Acceso a recursos financieros
		Agenda de competitividad e innovación
		Fondo de emprendimiento para el departamento
		Economía circular
		Impactos económicos por la pandemia
		Innovación para el progreso. Propuestas de participación ciudadana.
		Turismo como potenciador del desarrollo Sectores: Comercio, Industria y Turismo.

2.2.2 Plan de Acción de CORPOAMAZONIA vigencia 2020 – 2023. "Amazonias vivas".

En el plan de acción 2020 -2023, se articula con los procesos de planificación en el contexto del

Programa: 3202 Gestión Integral De La Biodiversidad Y Los Servicios Ecosistémicos
3203 gestión integral de recurso hídrico.

Proyecto: 3202-1 Gobernanza Forestal y Control de la Deforestación en el marco de la STC 4360 de 2018.
3202-2 Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
3203-1 Formulación e implementación de instrumentos de planificación y ordenación del recurso hídrico

Actividad: 3202-1-4 Restaurar y reforestar áreas bajo sistemas agroforestales o silvopastoriles, en cumplimiento de la STC 4360 de 2018 y de la iniciativa "Sembrar nos Une" (500 árboles/ha).
3202-2-3 Apoyar piloto de Biodiverciudad con enfoque urbano regional.
3203-1-2 Apoyar la Ejecución de POMCAS formulados y adoptados

Indicador: 3202-1-4-1 Número de hectáreas restauradas
3202-2-3-1 Número de Biodiverciudades apoyadas
3203-1-2-1 Número de POMCAS en ejecución.

Plan de Desarrollo Municipio de Leticia vigencia 2020 – 2023 *"Juntos por una Leticia mejor"*

En el Plan de Desarrollo Municipio de Leticia vigencia 2020 – 2023. ***"Juntos por una Leticia mejor",*** se incluye en su Línea Estratégica:

- Línea 1 que corresponde al DESARROLLO URBANO Y RURAL RESILIENTE, orientada a impulsar un desarrollo urbano y rural integral, comprometido con el ordenamiento territorial, el agua potable y saneamiento básico, la inversión en infraestructura vial, movilidad, viviendas, equipamientos y espacios públicos, armonizados con la rehabilitación y el uso sostenible de los ecosistemas naturales, con acciones coordinadas en pro de lucha contra el cambio climático y la gestión del riesgo a desastres.

En el Plan de desarrollo se define el Plan Estratégico y su relación con la secretaria de Competitividad, Medio Ambiente y Turismo, para el proyecto propuesto:

Plan de Gestión Ambiental de la Región del Sur de la Amazonia Colombiana, 2018-2038

3.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PLAN DE GESTIÓN 3.1.- VISIÓN Se mantiene vigente la visión propuesta para la región del sur de la Amazonia colombiana durante el proceso de formulación del plan de gestión ambiental regional 2002 2011. "El Sur de la Amazonia Colombiana como una "Región" Cohesionada social, cultural, económica y políticamente, por un sistema de valores fundamentado en el arraigo, la equidad, la armonía, el respeto, la tolerancia, la convivencia, la pervivencia y la responsabilidad; Consciente y orgullosa del valor de su diversidad étnica, biológica, cultural y paisajística; Con conocimiento, capacidad y autonomía para decidir responsablemente sobre el uso de sus recursos, para orientar las inversiones hacia el logro de un desarrollo integral que responda a sus necesidades y aspiraciones de mejor calidad de vida." 3.2.- PROPÓSITOS DEL PLAN DE GESTIÓN. 3.2.3.- Propender por el uso social sostenido y sostenible de la oferta ambiental y por la sostenibilidad social y económica de la región: Este propósito de desarrollo busca establecer pautas para una población humana local óptima (en términos de calidad y cantidad), e igualmente adoptar regulaciones para el aprovechamiento de la oferta ambiental local, que contemple incentivos y restricciones. Igualmente busca establecer un esquema marco-global que cubra los diferentes aspectos relacionados con la localización, el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, la sustitución, tanto de los equipamiento sociales (hospitales, escuelas, iglesias, centros comunales, instalaciones deportivas, parques, etc.), como de las infraestructuras (de transportes, de saneamiento ambiental básico, de generación y distribución de energía, de comunicaciones), de uso público, requeridos en la totalidad de la región. Línea Programática: 1. Manejo ambiental de las áreas funcionales ordenadas. 2. Equipamiento e infraestructura para la integración socioeconómica de las áreas funcionales.

Memorando de Entendimiento Leticia como Biodiverciudad, 2020- 2025

El 02 de diciembre de 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Sinchi, la Gobernación de Amazonas, la Alcaldía de Leticia y Corpoamazonia, celebraron memorando de entendimiento de Leticia como Biodiverciudad, considerando que una Biodiverciudad es aquella que reconoce, prioriza e integra la biodiversidad y sus beneficios hacia un desarrollo urbano regional sostenible. La designación de "Biodiverciudad" la merece un centro urbano que planifica, ordena su territorio y gestiona su desarrollo social y económico de forma sostenible e innovadora en armonía con su base natural de soporte y teniendo en cuenta los retos y oportunidades que plantea el cambio climático, reuniendo los siguientes atributos:

I. Cuida su biodiversidad y reconoce sus beneficios;

II. Incorpora en su planificación territorial la biodiversidad y sus beneficios;
III. Impulsa la economía sostenible;
IV. Adopta prácticas de consumo responsable.

Con el fin de consolidar el desarrollo de Biodiverciudades en Colombia y garantizar el cumplimiento del objetivo trazado, se plantean para la iniciativa los siguientes ejes transversales:

I. Estilos de vida saludable y mejora en la calidad de vida;
II. Fortalecimiento de capacidades de cada territorio;
III. Participación y cultura ciudadana;
IV. Educación Ambiental.

En este sentido se aúnan esfuerzos para la coordinación técnica que permita articular acciones entre ellas para desarrollar iniciativas que permitan que la ciudad de Leticia se transforme en una Biodiverciudad.

2.3. POBLACION BENEFICIARIA Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Amazonas, Municipio de Leticia, situado en se desarrollará en los tramos especificados de las quebradas San Antonio y Simón Bolívar, Municipio de Leticia Amazonas., que se encuentra entre las coordenadas Longitud:69°56'26.02" y Latitud: S4°12'55.01"

Leticia es un municipio fronterizo colombiano, es la capital del departamento del Amazonas. Se encuentra localizado en el extremo sur del país sobre las márgenes del río Amazonas, al sur del área no municipalizada de Tarapacá y al oriente del municipio de Puerto Nariño. Su extensión territorial es de 5968 km², su altura de 82 metros sobre el nivel del mar y su temperatura media entre 25° a 38 °C.[4]

Se ha consolidado como el principal destino turístico de selva del país, a pesar de estar alejada de los principales centros urbanos de Colombia, sin comunicación por carretera. Constituye un nexo comercial importante con Brasil, debido a su situación de ciudad limítrofe sobre el río Amazonas y formando el trifinio conocido como Tres Fronteras.

Figura1. Localización satelital municipio de Leticia



Localización: municipio de Leticia, Amazonas.
Fuente: https://earth.google.com.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE INTERVENIR LA ZONA
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LA QUEBRADA SIMÓN BOLÍVAR



ÁREAS DE RESTAURACIÓN EN EL SISTEMA HÍDRICO



2.4. INFORMACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

TABLA 3. INFORMACION Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.

Contratante	CORPOAMAZONIA
Contratista	CONSORCIO KOAMA INGENIERIA
Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No.: 711 DE 2022
Supervisor	Director Territorial Amazonas Geóloga: MARYORY PANTEVIS GIRON
Objeto	*Realizar actividades a todo costo que se desarrollen en el marco del proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", en cumplimiento al plan de acción 2020-2023 "Amazonas Vivas".*
Valor inicial	$ 277.134.520
Plazo	Cinco (05) meses a partir de la firma de acta de inicio.
Fecha de inicio de acuerdo a acta	20 de enero de 2023
Fecha de finalización	19 de junio de 2023

2.5. OBJETIVO GENERAL.

- ✓ Recuperación ambiental del sistema hídrico urbano, para Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector del municipio de Leticia.

2.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- ✓ Realizar Diagnostico y caracterización para la selección del área a intervenir.
- ✓ Realizar limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos del borde de la quebrada que pertenecen al Sistema Hídrico San Antonio y del río Amazonas a 10 m de la orilla.
- ✓ Aislar áreas seleccionadas, georreferenciadas y mapificadas para la conservación y protección
- ✓ Establecer áreas de restauración en el sistema hídrico.
- ✓ Realizar jornadas de sensibilización, concientización y orientación, a partir del reciclaje, con participación del grupo de vigías ambientales y grupos ecológicos
- ✓ Mejoramiento de espacios verdes en la quebrada Simón Bolívar.
- ✓ Producir contenido audiovisual y radial para informar sobre las áreas aisladas y restauradas.

2.7. METAS.

- ✓ Realizar la reforestación de las zonas a intervenir.
- ✓ Realizar senderos peatonales y plazoleta en la quebrada Simón Bolívar

3. ANTECEDENTES DEL CONTRATO.

- ✓ El contrato 711 de 2022, surge de la selección abreviada de menor cuantía No.: 007 de 2022, adelantada por CORPOAMAZONIA, entre los meses de noviembre y diciembre de 2022, y se formalizo durante el mes de diciembre de 2022.
- ✓ Se realiza comité técnico de inicio de obra con la participación del Director de Obra por parte del Contratista, el ingeniero forestal por parte del contratista, el director de interventoría en compañía de la ingeniera ambiental, quien hace el seguimiento de la parte forestal, por parte de la Interventoría y el acompañamiento de Corpoamazonía territorial Amazonas, en cabeza de su Directora Territorial y la acompañan los respectivos apoyos a la supervisión en la parte civil y en la parte forestal, este comité se realiza en la Territorial Amazonas en Leticia.
- ✓ Se firma acta de inicio el día 20 de enero de 2023, con fecha de finalización prevista al día 19 de junio del 2023.

4. LOGROS Y ALCANCES DEL PROYECTO

En este capítulo se presenta de manera clara, el avance de cada una de las metas establecidas mediante la descripción del avance de actividades desarrolladas para el cumplimiento de las mismas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN
1.1.1	Realizar Diagnostico y caracterización para la selección del área a intervenir.	Número de informes	1	1	10,2
1.1.2	Realizar limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos del borde de la quebrada que pertenecen al Sistema Hídrico San Antonio y del río Amazonas a 10 m de la orilla.	Número de metros lineales	308	308	12,2
1.1.3	Aislar áreas seleccionadas, georreferenciadas y mapificadas para la conservación y protección.	Hectárea	3	2.1	19,6
1.1.4	Establecer áreas de restauración en el sistema hídrico.	Hectárea	3	3	11,8
2.1.1	Producir contenido audiovisual y radial para informar sobre las áreas aisladas y restauradas.	Número de producciones audiovisuales y radiales realizadas	6	1.8	8,4
2.1.2	Realizar jornadas de sensibilización, concientización y orientación, a partir del reciclaje, con participación del grupo de vigías ambientales y grupos ecológicos.	Número de talleres	3	3	1,2
3.1.1	Mejoramiento de espacios verdes en la quebrada Simón Bolívar.	Número de infraestructura	1	0	36,6
SUMATORIA					100%

A continuación, se resume, el proceso y desarrollo de cada actividad:

- ✓ **Realizar Diagnostico y caracterización para la selección del área a intervenir.**

  Durante los días 20 al 23 de marzo de 2023, los profesionales contratados con apoyo de personal de la comunidad, se desplazaron a realizar las visitas de trabajo en campo en dos (02) puntos el Primero: parte del barrio La Unión en áreas de la quebrada San Antonio y parte de la quebrada el Porvenir, hasta la avenida tercera (3ra), donde se

estableció un transecto de observación, Segundo: comprende la parte posterior de la planta de energía del Amazonas, hasta la ribera del río Amazonas.

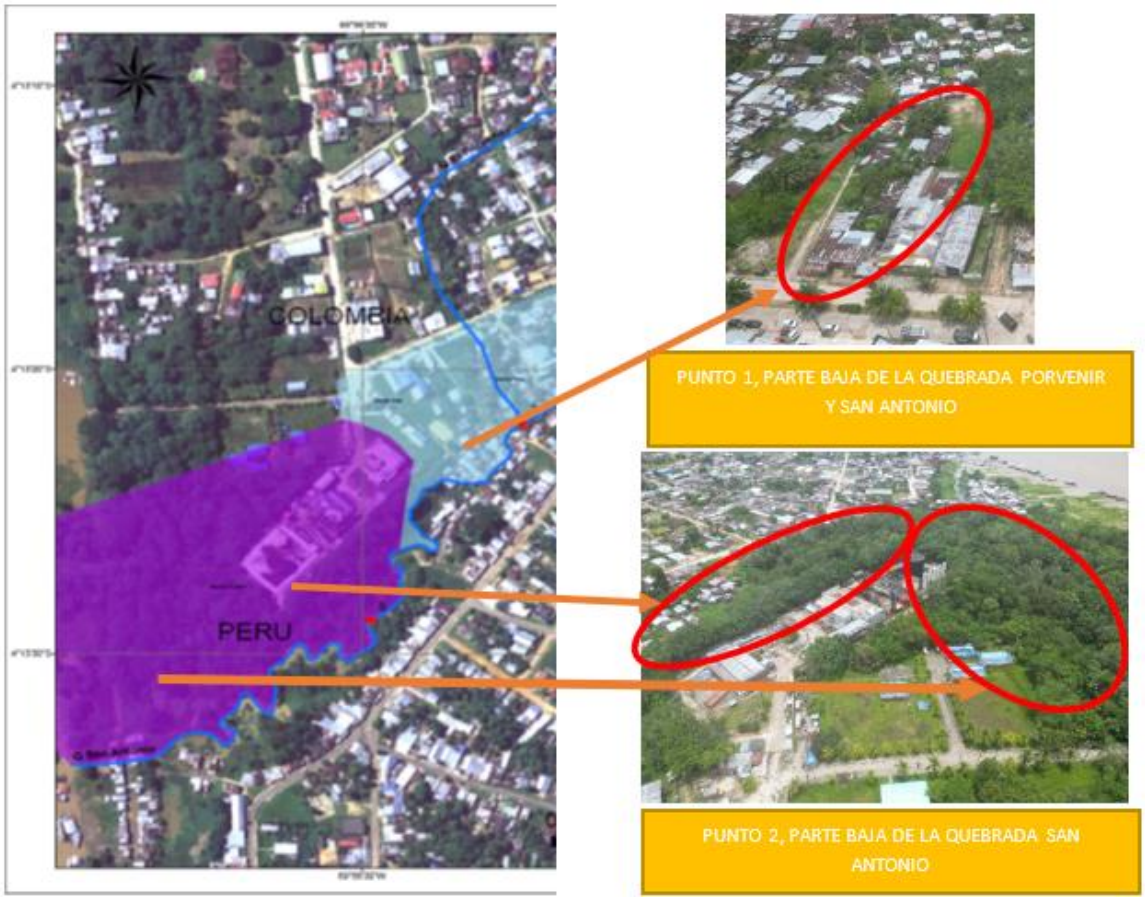


Foto 1. Parte baja del área del sistema hídrico San Antonio

Como resultado del inventario forestal se obtuvo un total de 276 individuos que corresponden a 31 especies, que tienen un volumen de 351.21 m³ de madera en pie aproximadamente, De lo anterior las especies que presentan el mayor número de individuos son *Cecropia distachya*, con un 44.2% y *Ficus benjamina L*. con un 12.3% respectivamente, y en menor cantidad *Theobroma cacao L*. y *Samanea saman (Jacq.) Merr.* con el 0.36 %.

Avance de la actividad: Actividad ejecutada en su totalidad

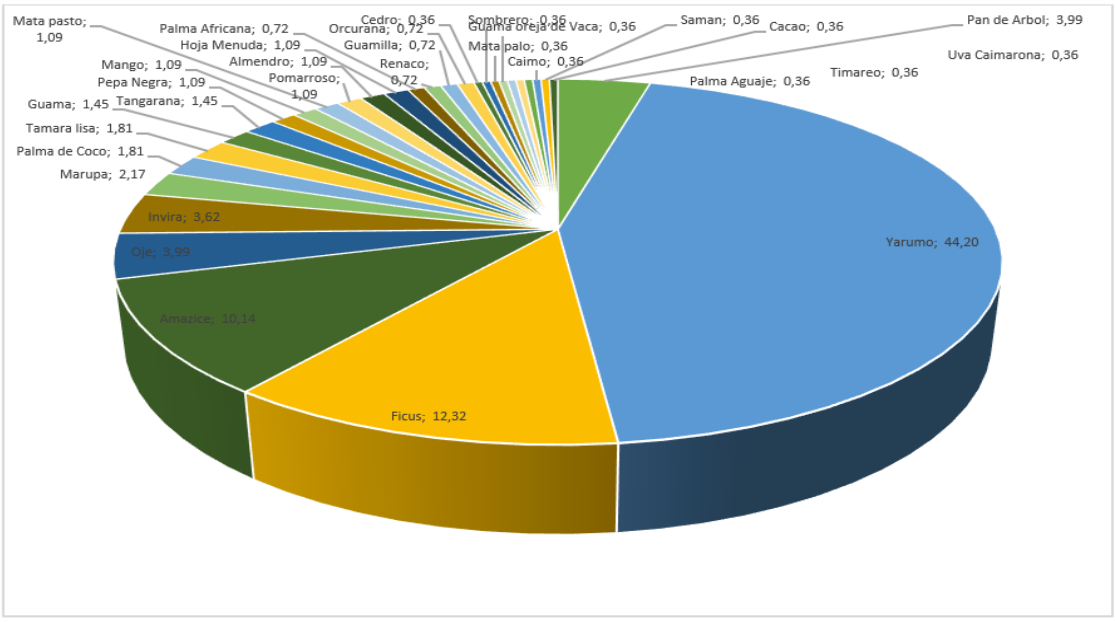


Ilustración 1. Distribución porcentual de especies forestales inventariadas

- ✓ **Realizar limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos del borde de la quebrada que pertenecen al Sistema Hídrico San Antonio y del río Amazonas a 10 m de la orilla**.

Para la ejecución de esta actividad se definió un cronograma de actividades, el cual hasta la fecha de corte presenta un 100% de avance en el desarrollo, realizando limpieza y recolección de residuos sólidos, quedando pendiente el retiro o transporte una parte de los residuos sólidos.

CONSORCIO KOAMA INGENIERIA	CONTRATO	711 DE 2022		FECHA DE INICIO	20/01/2023		FECHA DE TERMINACION:	19/06/2023		FECHA DE ELABORACIÓN:	14/04/2023	
	CONTRATANTE:	CORPOAMAZONIA										
	CONTRATISTA:	CONSORCIO KOAMA INGENIERIA										
	OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.											
				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES								
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ABRIL								
			Semana 1	% Avance Semanal	Semana 2	% Avance Semanal	Semana 3	% Avance Semanal	Semana 4	% Avance Semanal	% TOTAL	
			1-2		3-9		10-16		17-23			
GENERAL												
1.1.2. Realizar limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos del borde de la quebrada que pertenecen al Sistema Hídrico San Antonio y del río Amazonas a 10 m de la orilla.	número de metros lineales	308		10%		30%		30%		30%	100%	
ESPECÍFICOS												
1- Visita de reconocimiento al área para limpieza, recolección de residuos sólidos del borde de la quebrada Porvenir y San Antonio del Sistema Hídrico San Antonio y del río Amazonas a 10 m de la orilla		308		10%							10%	
2- Limpieza y recolección de residuos sólidos del borde de la quebrada Porvenir a 10 m de la orilla		100				30%					30%	
3- Limpieza y recolección de residuos sólidos del borde de la quebrada Porvenir del Sistema Hídrico San Antonio a 10 m de la orilla		100						30%			30%	
4- Limpieza y recolección de residuos sólidos del borde de la quebrada San Antonio del Sistema Hídrico San Antonio y del río Amazonas a 10 m de la orilla		108								20%	20%	
5- Transporte de residuos sólidos del borde de la quebrada Porvenir y San Antonio del Sistema Hídrico San Antonio y del río Amazonas a 10 m de la orilla		308								10%	10%	

- Personal: El personal empleado en esta actividad fue de los barrios San Antonio, La Unión y el Águila, en total se emplearon 11 personas.
- Selección del área: la limpieza se realizó en 2 tramos el primero en una distancia de 212 metros lineales, se encuentra ubicado en el barrio San Antonio y la segunda en el barrio La Unión en una distancia de 280, para un total de 492 m
- Limpieza: Consistió en la recolección de los residuos que se encontraban en una distancia a 10 m alrededor de la quebrada, incluyendo los que estaban sobre el cauce principal.
- Recolección: El material retirado se empacó en costales o lonas de nylon que se depositaron en puntos cercanos para la recolección con vehículos.
- Pesaje: Todos los bultos fueron pesados tanto de residuos plásticos y vegetales, en total fueron 5.5 Ton de residuos recolectados.
- Transporte. Se realizó inicialmente de manera manual a hombro, y otros en carretilla, posteriormente se hizo en vehículos.


Localización de ejecución de esta actividad:

A continuación, se localiza en que lugares se desarrolló esta actividad, teniendo en cuenta que se realizó en dos tramos los cuales son:

- Tramo 1: ubicado entre la calle 10 con Carrera 5 y calle 3 con carrera 10ª y carrera 11



- Tramo 2: ubicado entre la calle 3 con carrera 10ª y carrera 11, hacia el sector de frontera y río Amazonas

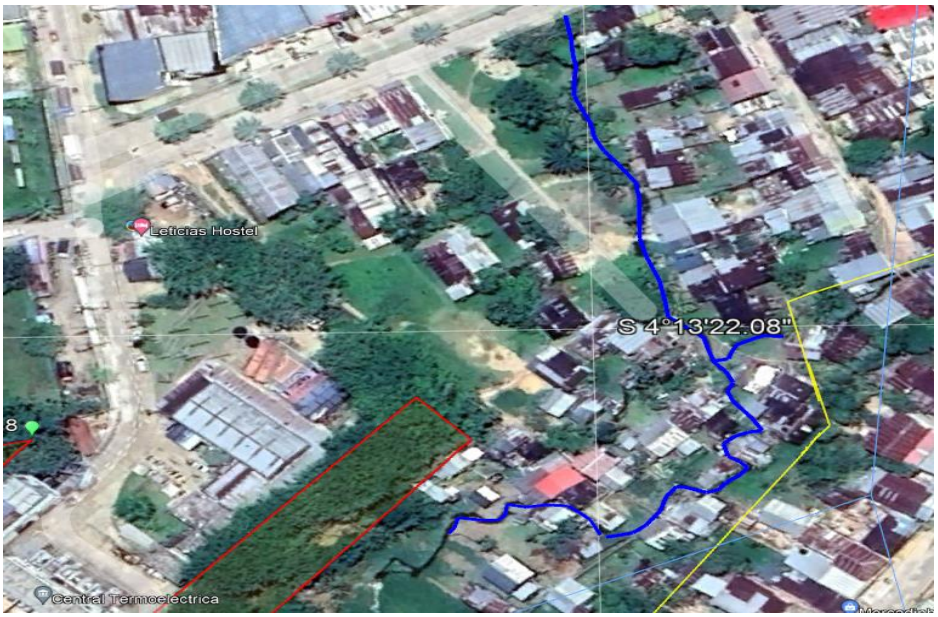

A continuación, se relaciona la cantidad de residuos recogidos hasta el 19 de abril del presente año:

Tabla 4. cantidad de residuos recogidos

DÍA	FECHA	CANTIDAD EN KG
DIA 1	04-04-2023	284
DIA 2	05-04-2023	617
DIA 3	06-04-2023	546
DIA 4	08-04-2023	310
DIA 5	10-04-2023	450
DIA 6	11-04-2023	369
DIA 7	12-04-2023	305
DIA 8	13-04-2023	481
DIA 9	14-04-2023	130
DIA 10	15-04-2023	235
DIA 11	17-04-2023	456
DIA 12	18-04-2023	798
DIA 13	19-04-2023	0

DIA 14	20-04-2023	142
DIA 15	22-04-2023	181
DIA 16	24-04-2023	278
TOTAL		**5582**

Avance de la actividad: Actividad ejecutada en su totalidad

- ✓ **Aislar áreas seleccionadas, georreferenciadas y mapificadas para la conservación y protección.**
  Se termino de aislar las áreas seleccionadas y se instaló la valla informativa de este proyecto para identificar la zona.

- ✓ **Producir contenido audiovisual y radial para informar sobre las áreas aisladas y restauradas.**
  Se instalaron todas las vallas que se contrataron de la parte forestal y se desarrolló en su totalidad las cuñas radiales y el contenido audiovisual.

- ✓ **Mejoramiento de espacios verdes en la quebrada Simón Bolívar**
  Para desarrollar este ítem se realizo un parque el cual tiene los siguientes ítems los cuales se ejecutaron en su totalidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
OBRAS DE RECUPERACIÓN RONDA HIDRICA LETICIA			
1,0	**PRELIMINARES**		
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	217,05
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	217,05
1,3	EXCAVACIONES VARIAS DE MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO)	M3	1,51
1,4	TERRAPLEN PARA NIVELACION SENDERO PEATONAL Y AREAS COMUNES	M3	48,76
2,0	**OBRAS DE ILUMINACION**		
2,1	CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI h=1,0 m X 0,40 m X 0,4 m	UND	3,00
2,2	POSTE PARA ILUMINACIÓN, EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO DE 4" C 12, LONG= 6 M, INCLUYE BRAZO PORTALAMPARAS, EN TUBO DE 2"X 2,5 MM, BASE EN LAMINA HR DE 5/8"CON PERFORACIONES DE 3/4", PERNOS DE ANCLAJE PINTURA BASE Y ESMALTE	ML	18,00
2,3	LAMPARA SOLAR DE 70 W, 7000 LUMENS, 6500 K (INCLUYE PANEL SOLAR)	UND	3,00
3,0	**CONSTRUCCION DE ZONAS DURAS**		
INP 1	CONCRETO COLOR INTEGRAL TEXTURIZADO 21 MPA PARA PLACAS DE PISO INCLUYE MALLA	M2	122,61
INP 2	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO CONCRETO SIMPLE 21 MPA 20X50CM	ML	53,01
INP 3	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO CONCRETO SIMPLE 21 MPA 10X30CM	ML	84,27
4,0	**MOBILIARIO PARA ZONAS DE RECREACIÓN PASIVA Y ZONAS VERDES**		
4,1	CESPEDON PARA ZONA VERDE	M2	33,73
4,2	JUEGO INFANTIL INDIVIDUAL; CULUMPIOS M2, SUBE Y BAJA M2	UND	1,00
4,3	TIERRA ABONADA PARA JARDINERAS Y ZONAS VERDES	M3	8,87
4,4	RECIPIENTE PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MATALICO	UND	3,00
4,5	SIEMBRA DE JARDINERA NATIVA	M2	39,69
4,6	BANCAS TIPO CUBO EN CONCRETO	M3	6,00

Descripción

1. PRELIMINARES

Este capitulo se desarrollo en su totalidad.

1.1 Localización y replanteo

Se realizo la localización y replanteo en el lote propuesto en el proyecto

1.2 Descapote y limpieza

Se hizo el descapote y la limpieza del sitio de la obra para empesar a desarrolar el los item del parque para el mejoramiento de espacios verdes en la quebrada Simón Bolivar.

1.3 Excavaciones varias de material común en seco a mano (incluye retiro)

Se desarrollo la excavaciones previas al desarrollo de las actividade a realizar

1.4 Terraplén para nivelación sendero peatonal y áreas comunes

Se realizo el terraplén para lograr los niveles requeridos para poder desarrollar la obra a realizar

2. OBRAS DE ILUMINACIÓN

Este capitulo se desarrollo en su totalidad

2.1 Construccion de pedestales en concreto de 3000 PSI h=1,0 m X 0,40 m X 0,4m

Se construyo el pedestal para soporte del poste.

2.2 Poste para iluminación, en tubo galvanizado tipo pesado de 4" c 12, long= 6 m, incluye brazo portalamparas, en tubo de 2"x 2,5 mm, base en lamina hr de 5/8"con perforaciones de 3/4", pernos de anclaje pintura base y esmalte.

Se suministra el tubo galvanizado y se instala en el sitio predeterminado.

2.3 Lámpara solar de 70 w, 7000 lumens, 6500 k (incluye panel solar)

Se suministra la lámpara solar de las especificaciones solicitadas y se la instala.

3. CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DURAS

3.1 Concreto color integral texturizado 21 mpa para placas de piso incluye malla

Se realiza en su totalidad este item

3.2 Sardinel fundido en sitio concreto simple 21 MPA 20X50cm

Se realiza en su totalidad este item

3.3 Sardinel fundido en sitio concreto simple 21 MPA 10X30CM

Se realiza en su totalidad este item

4. MOBILIARIO PARA ZONAS DE RECREACIÓN PASIVA Y ZONAS VERDES

4.1 Cespedon para zona verde

Se suministra e Instala el cespedon

4.2 Juego infantil individual; culumpios M2, sube y baja M2

Se suministra e instala los juegos infantiles-

4.3 Tierra abonada para jardineras y zonas verdes

Se suministra e instala la tierra abonada

4.5 Siembra de jardinera nativa

Se hace este item en su totalidad

4.6 Bancas tipo cubo en concreto

Se hizo la banca en el sitio desarrollado

5. EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO.

La Interventoría en cumplimiento de sus funciones Técnicas, Administrativas, Legal y Financiera, superviso las actividades desarrolladas durante este periodo y se constató que se cumplieran acorde a las especificaciones contratadas.

Se realizado el seguimiento en los componentes forestales y infraestructura y se constato que el contrato de obra se desarrollo en su totalidad, teniendo en cuenta que cada actividad contratada, se logró el objetivo general el cual es: Recuperación ambiental del sistema hídrico urbano, para Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector del municipio de Leticia. Y se alcanzo a desarrollar y conseguir los objetivos específicos:

- ✓ Realizar Diagnostico y caracterización para la selección del área a intervenir.
- ✓ Realizar limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos del borde de la quebrada que pertenecen al Sistema Hídrico San Antonio y del río Amazonas a 10 m de la orilla.
- ✓ Aislar áreas seleccionadas, georreferenciadas y mapificadas para la conservación y protección
- ✓ Establecer áreas de restauración en el sistema hídrico.
- ✓ Realizar jornadas de sensibilización, concientización y orientación, a partir del reciclaje, con participación del grupo de vigías ambientales y grupos ecológicos
- ✓ Mejoramiento de espacios verdes en la quebrada Simón Bolívar.
- ✓ Producir contenido audiovisual y radial para informar sobre las áreas aisladas y restauradas.
- ✓ Mejorar los espacios verdes en la quebrada Simón Bolivar

El avance correspondiente al contrato es de 100%

5.1. EVALUACIÓN PORCENTUAL POR COMPONENTE

TABLA 5. BALANCE AVANCE FISICO-FINANCIERO

UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE TOTAL	CANT EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Informe	1	21.700.000	21.700.000	10,2	1,00	21.700.000	10,2
ml	308	84.300	25.964.400	12,2	308,00	25.964.400	12,2
ha	3	13.952.000	41.856.000	19,6	3,00	41.856.000	19,6
ha	3	8.395.000	25.185.000	11,8	3	25.185.000	11,8
Número de producciones audiovisuales y radiales realizadas	6	2.970.000	17.820.000	8,4	6	17.820.000	8,4
Número de talleres	3	860.000	2.580.000	1,2	3	2.580.000	1,2
Número de infraestructura	1	78.075.000	78.075.000	36,6	1	78.075.000	36,6
	COSTOS DIRECTOS		213.180.400	100,0		213.180.400	100
	AD	24%	51.163.296			51.163.296	
	I	1%	2.131.804			2.131.804	
	U	5%	10.659.020			10.659.020	
		TOTAL	**277.134.520**		TOTAL	277.134.520	

5.2. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA

TABLA 6. AVANCE PORCENTUAL

VALOR OBRA CONTRATADA	$ 277.134.520	100 %
VALOR OBRA EJECUTADA 1 DEL 20-01-2023 AL 28-02-2023.	$ 277.134.520	100%
VALOR OBRA POR EJECUTAR.	$ 0	0 %

Estos valores y porcentajes, representan el total obtenido del reporte de actividades ejecutadas y terminadas, pero no reporta el avance implícito en las demás actividades y que se evidencia en la compra y acopio de materiales.

Figura 2. Avance físico de la obra

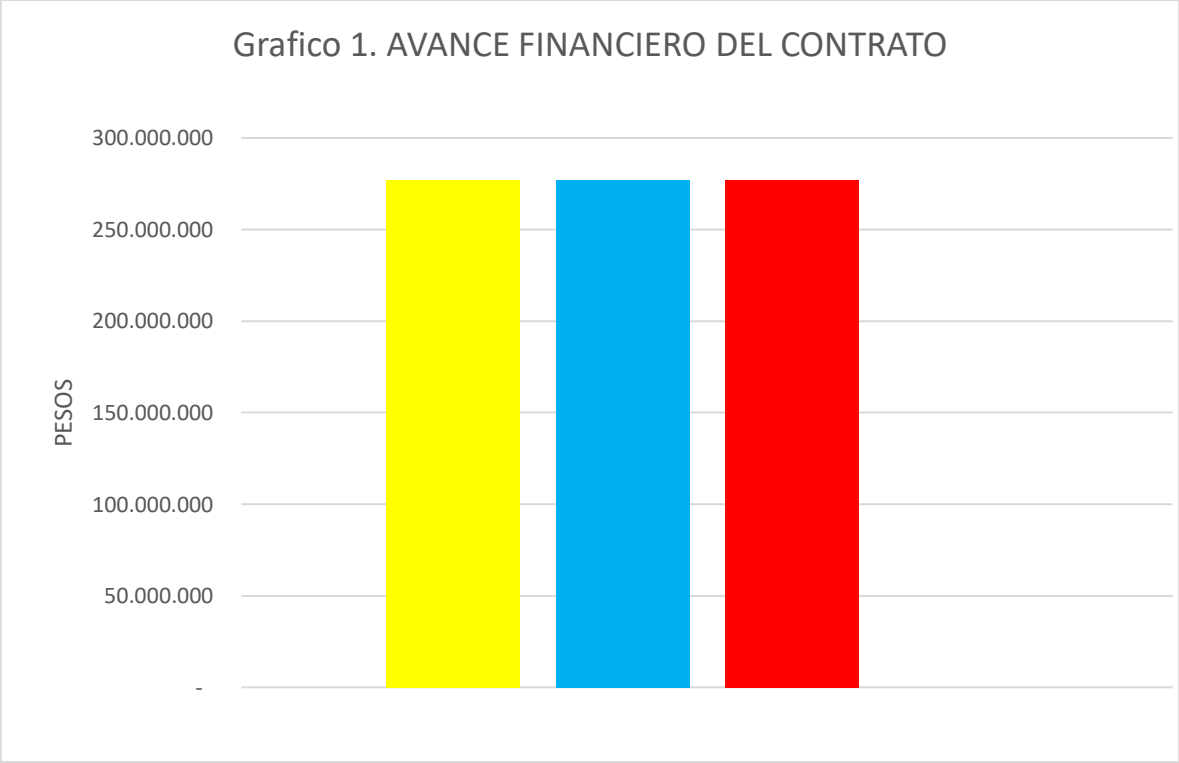


Figura 3. Porcentaje avance de obra


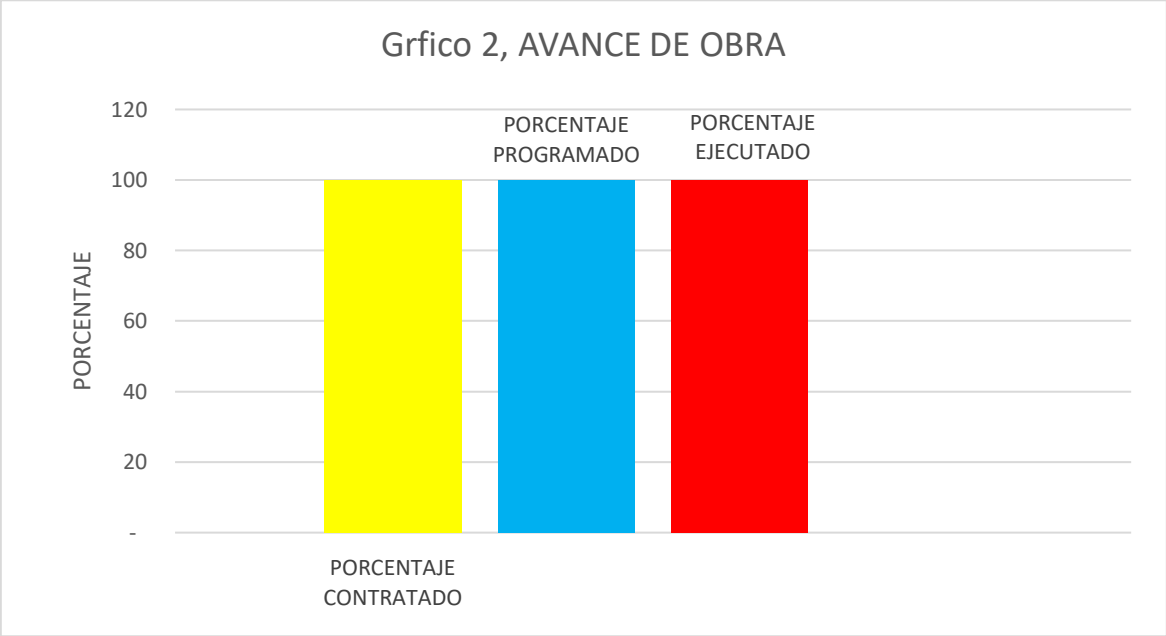


Figura 4. Porcentaje Ejecutado Vs % Programado

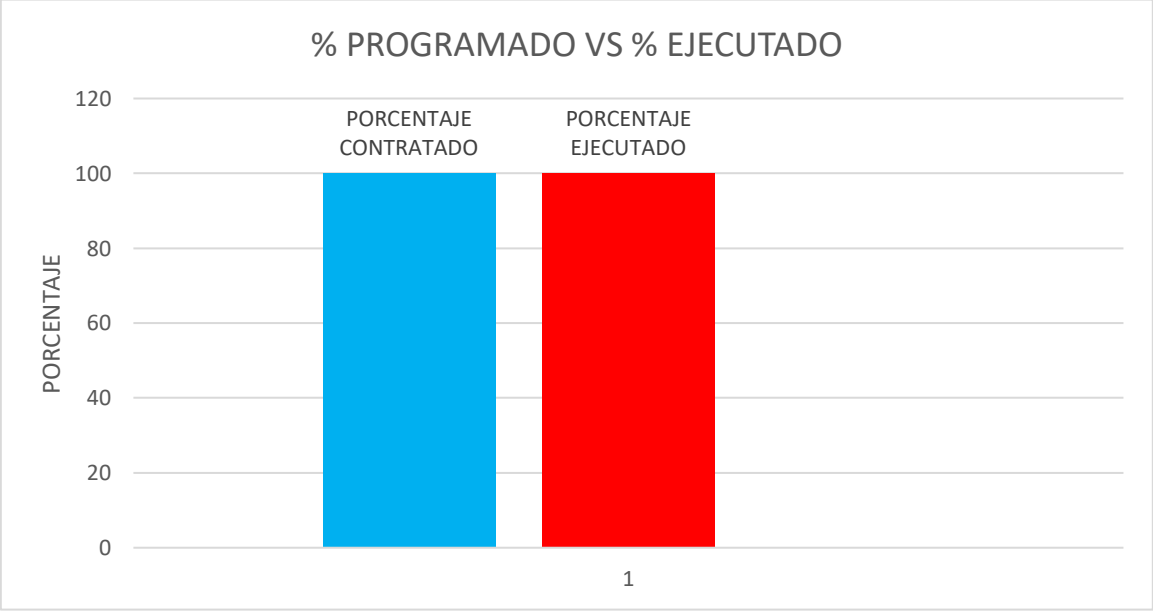

6. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Se hace recibo de obra y se presenta documentación para liquidar el centrado de obra

7. OBSERVACIONES

- ✓ Se ejecuto en su totalidad el contrato de obra, se recomienda a la entidad hacer el proceso de pago al contratista

8. ANEXOS.

- Registro fotográfico.

MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ
Interventor contrato 718 2022

ANEXOS.

- Registro fotográfico.

1.1. Realizar diagnóstico y caracterización para la selección del área a intervenir	
	
1.2. Realizar limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos del borde de la quebrada que pertenecen al sistema hídrico San Antonio y del río amazonas a 10 m de la orilla	
Tramo 1: ubicado entre la calle 10 con Carrera 5 y calle 3 con carrera 10ª y carrera 11	
	








K+AMA















Tramo 2: ubicado entre la calle 3 con carrera 10ª y carrera 11, hacia el sector de frontera y río Amazonas





















1.3. Aislar áreas seleccionadas, georefrenciadas y mapificadas para la conservación y protección





1.4. ESTABLECER ÁREAS DE RESTAURACIÓN EN EL SISTEMA HÍDRICO














✓ 2.1.1 **Producir contenido audiovisual y radial para informar sobre las áreas aisladas y restauradas.**







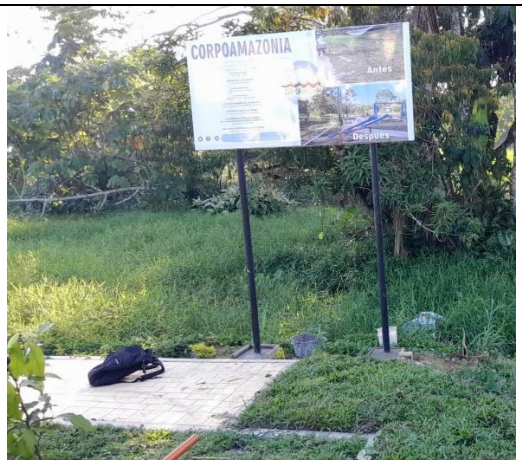





2.1.2 **Realizar jornadas de sensibilización, concientización y orientación, a partir del reciclaje, con participación del grupo de vigías ambientales y grupos ecológicos.**

Taller 1 (29 de abril de 2023)













Taller 2 (08 de mayo de 2023)













Taller 3 (08 de mayo de 2023).









3.1.1 Mejoramiento de espacios verdes en la quebrada Simón Bolívar.
















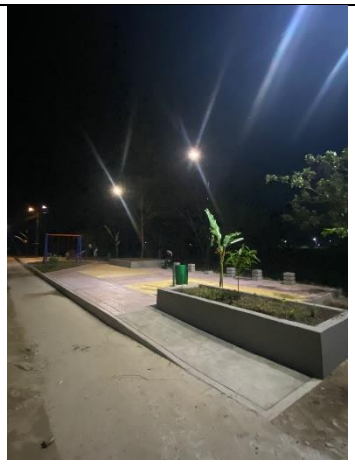

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98384454		LOPEZ MUÑOZ MARIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 18 NO.10B-67 BARRIO LOS PRADOS	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	47592792	9449098257	I	2023/02/13	2023/03/29	BANCO DE OCCIDENTE	44	$354,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	98384454	LOPEZ MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$9,900	$0	$195,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$9,900	$0	$195,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$400	$0	$6,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$400	$0	$6,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$7,700	$0	$152,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$7,700	$0	$152,700
TOTAL				1	$336,700	$18,000	$0	$354,700

2023/03/29 02:36 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98384454		LOPEZ MUÑOZ MARIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 18 NO.10B-67 BARRIO LOS PRADOS	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	69362320	9454177925	I	2023/08/14	2023/07/28	NEQUI	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	98384454	LOPEZ MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/07/27 11:31 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98384454		LOPEZ MUÑOZ MARIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 18 NO.10B-67 BARRIO LOS PRADOS	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	47597467	9449098275	I	2023/03/13	2023/03/29	BANCO DE OCCIDENTE	16	$343,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	98384454	LOPEZ MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,600	$0	$189,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$3,600	$0	$189,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$200	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$200	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$2,900	$0	$147,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$2,900	$0	$147,900
TOTAL				1	$336,700	$6,700	$0	$343,400

2023/03/29 02:37 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98384454		LOPEZ MUÑOZ MARIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 18 NO.10B-67 BARRIO LOS PRADOS	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	2135373391	9452245666	I	2023/07/14	2023/06/14	NEQUI	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	98384454	LOPEZ MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/06/13 10:53 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98384454		LOPEZ MUÑOZ MARIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 18 NO.10B-67 BARRIO LOS PRADOS	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2111224540	9451609067	I	2023/05/12	2023/06/01	NEQUI	20	$344,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	98384454	LOPEZ MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$4,400	$0	$190,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$4,400	$0	$190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$200	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$200	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$3,500	$0	$148,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$3,500	$0	$148,500
TOTAL				1	$336,700	$8,100	$0	$344,800

2023/05/31 08:34 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98384454		LOPEZ MUÑOZ MARIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 18 NO.10B-67 BARRIO LOS PRADOS	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	48000842	9449098306	I	2023/04/17	2023/03/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	98384454	LOPEZ MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/29 02:38 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27362122		CASTILLO MEZA NURY TARCILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VERGEL	ORITO-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1856661034	9445332658	I	2023/02/07	2023/01/10	BANCOLOMBIA	0	$347,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	27362122	CASTILLO NURY	230301	29	$1,121,334	$179,500	ESSC18	29	$1,121,334	$140,200		0	$0	$0	14-23	29	$1,121,334	$27,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,121,334**	**$179,500**			**$1,121,334**	**$140,200**			**$0**	**$0**			**$1,121,334**	**$27,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,500	$0	$0	$179,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$179,500	$0	$0	$179,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,400	$0	$0	$27,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$27,400	$0	$0	$27,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,200	$0	$0	$140,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				1	$347,100	$0	$0	$347,100

2023/03/29 05:43 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 98384454		LOPEZ MUÑOZ MARIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 18 NO.10B-67 BARRIO LOS PRADOS	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2111234803	9451575331	I	2023/06/14	2023/06/01	NEQUI	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	98384454	LOPEZ MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/05/31 08:34 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27362122		CASTILLO MEZA NURY TARCILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VERGEL	ORITO-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	12381296	9449100720	I	2023/03/07	2023/03/29	BANCO DE OCCIDENTE	22	$123,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	27362122	CASTILLO NURY	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC18	10	$386,667	$48,400		0	$0	$0	14-23	10	$386,667	$9,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$386,667**	**$61,900**			**$386,667**	**$48,400**			**$0**	**$0**			**$386,667**	**$9,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,900	$1,700	$0	$63,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$61,900	$1,700	$0	$63,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$300	$0	$9,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$300	$0	$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,400	$1,300	$0	$49,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$48,400	$1,300	$0	$49,700
TOTAL				**1**	**$119,800**	**$3,300**	**$0**	**$123,100**

2023/03/29 05:43 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27362122		CASTILLO MEZA NURY TARCILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VERGEL	ORITO-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	12385135	9449100812	I	2023/04/11	2023/03/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$119,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	27362122	CASTILLO NURY	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC18	10	$386,667	$48,400		0	$0	$0	14-23	10	$386,667	$9,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$386,667**	**$61,900**			**$386,667**	**$48,400**			**$0**	**$0**			**$386,667**	**$9,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,900	$0	$0	$61,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$61,900	$0	$0	$61,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$0	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,400	$0	$0	$48,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$48,400	$0	$0	$48,400
TOTAL				1	$119,800	$0	$0	$119,800

2023/03/29 05:43 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27362122		CASTILLO MEZA NURY TARCILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VERGEL	ORITO-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	74661982	9454286553	I	2023/05/08	2023/07/31	NEQUI	84	$131,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27362122	CASTILLO NURY	X	X																230301	10	$386,667	$61,900	ESSC18	10	$386,667	$48,400		0	$0	$0	14-23	10	$386,667	$9,500	0	$0	$0	No	$119,800
Total	**Afiliados(1)**																						$386,667	$61,900			$386,667	$48,400			$0	$0			$386,667	$9,500		$0	$0		$119,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27362122		CASTILLO MEZA NURY TARCILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VERGEL	ORITO-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	74661982	9454286553	I	2023/05/08	2023/07/31	NEQUI	84	$131,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,900	$6,100	$0	$68,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$61,900	$6,100	$0	$68,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$1,000	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$1,000	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,400	$4,800	$0	$53,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$48,400	$4,800	$0	$53,200
TOTAL				1	$119,800	$11,900	$0	$131,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27362122		CASTILLO MEZA NURY TARCILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VERGEL	ORITO-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	74668958	9454286590	I	2023/06/07	2023/07/31	NEQUI	54	$127,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27362122	CASTILLO NURY	X	X																230301	10	$386,667	$61,900	ESSC18	10	$386,667	$48,400		0	$0	$0	14-23	10	$386,667	$9,500	0	$0	$0	No	$119,800
Total	**Afiliados(1)**																						$386,667	$61,900			$386,667	$48,400			$0	$0			$386,667	$9,500		$0	$0		$119,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27362122		CASTILLO MEZA NURY TARCILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VERGEL	ORITO-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	74668958	9454286590	I	2023/06/07	2023/07/31	NEQUI	54	$127,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,900	$3,900	$0	$65,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$61,900	$3,900	$0	$65,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$600	$0	$10,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$600	$0	$10,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,400	$3,100	$0	$51,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$48,400	$3,100	$0	$51,500
TOTAL				**1**	**$119,800**	**$7,600**	**$0**	**$127,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27362122		CASTILLO MEZA NURY TARCILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VERGEL	ORITO-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	74697175	9454286619	I	2023/07/10	2023/07/31	NEQUI	21	$122,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27362122	CASTILLO NURY	X	X																230301	10	$386,667	$61,900	ESSC18	10	$386,667	$48,400		0	$0	$0	14-23	10	$386,667	$9,500	0	$0	$0	No	$119,800
Total	**Afiliados(1)**																						$386,667	$61,900			$386,667	$48,400			$0	$0			$386,667	$9,500		$0	$0		$119,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27362122		CASTILLO MEZA NURY TARCILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VERGEL	ORITO-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	74697175	9454286619	I	2023/07/10	2023/07/31	NEQUI	21	$122,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,900	$1,500	$0	$63,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$61,900	$1,500	$0	$63,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$300	$0	$9,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$300	$0	$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,400	$1,200	$0	$49,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$48,400	$1,200	$0	$49,600
TOTAL				**1**	**$119,800**	**$3,000**	**$0**	**$122,800**

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-003		**Versión:** 5 0-2022

LA DIRECTORA TERRITORIAL AMAZONAS (DTA)

CERTIFICA

Que MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98 384 454 de Pasto, ha cumplido con los requisitos de cumplimiento del contrato de interventoría No. 718 de 2022, por lo tanto es procedente el desembolso de la liquidación correspondiente al 50%, es importante aclarar que de acuerdo a la CLAUSULA TERCERA Valor Y Forma De Pago, de dicho contrato el contratista no adelanto ninguna acta parcial por lo tanto se le cancela el 50% del valor del contrato, y que corresponde a TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte. ($ 13.268.500,00).

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
CONTRATO No.	718 de 2022										
FUENTE DE FINANCIACIÓN	**SIIF NACION**		**RECURSOS PROPIOS**	X	**CONVENIO**		**OCAD**		**SGR**		
CDP No	1314		**Fecha;** 06/12/2022								
RP No	1986		**Fecha;** 30/12/2022								
OBJETO	Realizar la interventoría externa en el marco del proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ										
FECHA DE INICIO	20/01/2023										
FECHA DE TERMINACIÓN	19/06/2023										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26.537.000										
FORMA DE PAGO	a) Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, para lo cual deberá anexar, copia del contrato, documentos de legalización y ejecución del contrato, fotocopia del RUT, documento de identificación del contrato, plan de inversión del anticipo y certificación bancaria. En el evento que el contratista no alcanzare a amortizar la totalidad del anticipo, la suma adeudada deberá ser reintegrada a la CORPORACION. b) El cuarenta por ciento (40%) mediante actas parciales deacuerdo al porcentaje de avance del contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que el contratista haya presentado y radicado el informe de avance mensual de ejcución de la interventoría y certificación de cumplimiento parcial expedida por el supervisor del contrato. i) Informe resumen de las actividades ejecutadas por los contartistas del contrato vigilado, ii) actas parciales de avance elaboradas por el Contratista de la consultoría, y aprobadas por interventoría iii)										

Proyecto	ANA LUCIA LOPEZ ROJAS	Cargo	Apoyo supervisión	Firma	
Revisó	MARYORY PANTEVIS CIRON	Cargo	Directora Territorial Amazonas	Firma	

Powered by CamScanner

	Certificación del representante legal y/o revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, iv) Factura de venta, (v) informe técnico del grupo de seguimiento y control, y demás documentos soportes que se requieran para la legalización del pago. c) El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se pagará una vez perfeccionada el acta de liquidación del contrato.
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Leticia (Amazonas)
DURACION DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de CUMPLIMIENTO ante Entidades Estatales N° 41-44-101264324, expedida por la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobada por el Profesional Especializado de la Oficina Juridica, mediante certificados de fecha 30-12-2022.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES – SUSPENSIONES - CESIONES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A LA FECHA

Se reporta avance a la fecha del 100%, como consta en los siguientes documentos:

1. Certificado de pago aportes parafiscales
2. Acta de inicio de la interventoría
3. Certificación Bancaria
4. Copia RUT contratista de interventoría

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

Porcentaje avance físico programado	100 %
Porcentaje de avance físico real	100 %
Porcentaje de avance presupuestal programado	100 %
Porcentaje de avance presupuestal real	50 %
Valor de avance presupuestal programado	$ 26.537.000
Valor de avance presupuestal real	$ 13.268.500

VI. APLICACIONES DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES, MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

N/A

VII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

(Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los Requerimientos, Normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumple dentro del plazo establecido dentro del mismo contrato).

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

De conformidad con el artículo 244 de la Ley 1955 de 2020, Los trabajadores independientes con ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral,

Powered by CamScanner

Sobre una base mínima del 40% del valor de la mensualidad del contrato, sin incluir el valor del Impuestoal Valor Agregado (IVA).
Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para el inicio de la ejecución del contrato se verifica cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

IX. CUMPLIMIENTO SECOP II

De conformidad con el artículo 3 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal está obligada a publicar el presente informe de supervisión.

Se certifica que el presente informe y sus anexos mínimos requeridos para trámites de pago se encuentran registrado en estado ACEPTADO en plaforma SECOP II, al momento de radicar documentación en Subdirección Administrativa y Financiera.

X. OTRAS ACTIVIDADES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

OMITIDO

XI. CONCLUSIÓN

El Contrato de interventoría N° 718 de 2022 está en proceso de liquidación bilateral, a partir del 19/06/2023. Con un avance del 100% de ejecución, por lo tanto, se debe tramitar el pago de acta de liquidación por valor de $13.268.500, correspondiente al 50% adeudado.

La presente constancia se expide en Leticia – Amazonas, a los veintiuno (21) días del mes de septiembre de 2023 para efectos de pago.

MARYORY PANTEVIS GIRON
Directora Territorial Amazonas

Proyecto	ANA LUCIA LOPEZ ROJAS	Cargo	Apoyo supervisión	Firma	
Reviso	MARYORY PANTEVIS GIRON	Cargo	Directora Territorial Amazonas	Firma	

Powered by CamScanner

	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-002		**Versión:** 6.0-2022

ACTA No.		DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD					
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA				
CONTRATACIÓN DIRECTA			MINIMA CUANTIA		X			
FECHA DEL ACTA	22/09/2023	CONTRATO No.	718	AÑO	2022			

Contratista	MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ			PN	X	PJ
	Nit.	98.384.454	Domicilio	Mocoa - Putumayo		
Objeto del contrato	Realizar la interventoría externa en el marco del proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"					
Plazo inicial del contrato	**CINCO (5) MESES**			Valor inicial	$26.537.000	
Contrato amparado bajo registro presupuestal No.				1986 de 30/12/2022		

PN = Persona Natural; PJ = Persona Jurídica ; C.C.= Cedula

Fecha de suscripción de la minuta del contrato							**30/12/2022**	
Fecha aprobación de la póliza							**30/12/2022**	
Fecha del acta de inicio							**20/01/2023**	
Fecha terminación normal del plazo del contrato							**19/06/2023**	
Adicional en tiempo	Si		No	x	Tiempo		Fecha	
Adicional en valor	Si		No	x	Valor		Fecha	
Suspensión	Si		No	x	Plazo		Fecha	
Reinicio	Si		No	x	Fecha			
Cesión	Si		No	x	Fecha			
Nueva fecha de terminación del plazo del contrato								

En la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia "CORPOAMAZONIA" se reunieron: **LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS**, identificado con C.C. No. 79.600.573 de Bogotá DC, en su condición de Director General de CORPOAMAZONIA; **MARYORY PANTEVIS GIRON**, identificada con C.C. 1.121.208.166 de Leticia (Amazonas) en calidad de Directora Territorial Amazonas de CORPOAMAZONIA, y como tal actúa como supervisora del contrato de la referencia, y **MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ**, identificado con C.C. No. 98.384.454 de San Francisco - Putumayo, en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, con el fin de suscribir la presente acta de terminación y liquidación por mutuo acuerdo del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 60 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 60 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Dario Francisco Andrade Enriquez	Revisó parte técnica y/o administrativa	Maryory Pantevis Giron
Proyectó	Maryory Pantevis Giron – Ricardo Rodriguez		Directora Territorial Amazonas

Original	Expediente	Copia	Contratista

Powered by CamScanner

CORPOAMAZONIA	**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO**
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-CBS-002	**Versión:** 6.0-2022

ACTA No.		DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD				
LICITACIÓN PUBLICA			CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA		
CONTRATACIÓN DIRECTA			MINIMA CUANTIA		X		
FECHA DEL ACTA	22/09/2023		CONTRATO No.	718	AÑO	2022	

Que según plazo pactado en el contrato de CINCO (5) MESES, el cual venció normalmente el día 19/06/2023

Que el CONTRATISTA de la Interventoria durante el tiempo de ejecución del objeto contractual, según Certificaciones de cumplimiento e Informes de Resultados firmados por el supervisor, demuestra que cumplió de manera satisfactoria con el objeto y obligaciones contractuales previamente acordadas, la cual presentó los respectivos Informes de actividades según se detalla:

Documentos/Informes	Periodo o Mes correspondiente	% de cumplimiento
Acta de inicio contrato de Interventoria	20/01/2023	-
Plan de inversión del anticipo	14/03/2023	-
Informe de Interventoria No.01	20/01/2023 al 28/02/2023	9,83%
Informe de Interventoría No.02	01/03/2023 al 31/03/2023	22.14%
Informe de interventoría No.03	01/04/2023 al 30/04/2023	55%
Informe de interventoría No.04	01/05/2023 al 31/05/2023	71%
Informe de Interventoría No.05	01/06/2023 al 19/06/2023	100%
Informe de Interventoria No.06 de liquidación	20/01/2023 al 19/06/2023	100%
Total % de cumplimiento		100%

*A continuación se describe las obras y/o actividades ejecutadas por el Contratista, a la cual fue se realizó la presente Interventoría:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL	% POR ACTIVIDAD RESPECTO AL COSTO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO
1,1,1	Realizar Diagnostico y caracterización para la selección del área a intervenir	Número de informes	1	$ 21.700.000	$ 21.700.000	10,16%	1,00	$ 21.700.000
1,1,2	Realizar limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos del borde de la quebrada que pertenecen al	Número de metros lineales	308	$ 84.300	$ 25.964.400	12,16%	308,00	$ 25.964.400

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 66 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 508

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade Enríquez	Revisó parte técnica y/o administrativa	Maryory Pantevis Giron
Proyectó	Maryory Pantevis Giron – Ricardo Rodriguez		Directora Territorial Amazonas

Original	Expediente	Copia	Contratista

Powered by CamScanner

ACTA No.		DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD		
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA	
CONTRATACIÓN DIRECTA		MINIMA CUANTIA		X	
FECHA DEL ACTA	22/09/2023	CONTRATO No.	718	AÑO	2022

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL	% POR ACTIVIDAD RESPECTO AL COSTO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO
	Sistema Hídrico San Antonio y del río Amazonas a 10 m de la orilla							
1,1,3	Aislar áreas seleccionadas, georefrenciadas y mapificadas para la conservación y protección	Hectáreas	3	$ 13.952.000	$ 41.856.000	19,63%	3,000	$ 41.856.000
1,1,4	Establecer áreas de restauración en el sistema hídrico	Hectáreas	3	$ 8.395.000	$ 25.185.000	11,81%	3,00	$ 25.185.000
2,1,1	Producir contenido audivisual y radial para informar sobre las áreas aisladas y restauradas.	Número de producciones audiovisuales y radiales realizadas	6	$ 2.970.000	$ 17.820.000	8,36%	6,00	$ 17.820.000
2,1,2	Realizar jornadas de sensibilización, concientización y orientación, a partir del reciclaje, con participación del grupo de vigías ambientales y grupos ecológicos	Número de talleres	3	$ 860.000	$ 2.580.000	1,21%	3,00	$ 2.580.000
3,1,1	Mejoramiento de espacios verdes en la quebrada Simón Bolivar	Número de infraestructura	1	$ 78.075.000	$ 78.075.000	36,62%	1,000	$ 78.075.000
Subtotal					$ 213.180.400	100,00%	Subtotal	$ 213.180.400
Administración (A)				24%	$ 51.163.296		24%	$ 51.288.008,73
Imprevistos (I)				1%	$ 2.131.804		1%	$ 2.137.000,36
Utilidad (U)				5%	$ 10.659.020		5%	$ 10.686.001,82
Total					$ 277.134.520		Total	$ 277.134.520

Que en cumplimiento del inciso 1° del artículo 50 de la ley 789 de 2002 el contratista se obligó durante el plazo de ejecución del contrato cotizar ante el Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones, Riesgos laborales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA), obligación legal que quedó pactada en el contrato. Revisado el cumplimiento de esta obligación el

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico. correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Líneas de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Dario Francisco Andrade Enríquez	Revisó parte técnica y/o administrativa	Maryory Pantevis Giron
Proyectó	Maryory Pantevis Giron – Ricardo Rodriguez		Directora Territorial Amazonas

Original	Expediente	Copia	Contratista

Powered by CamScanner

	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-002		**Versión: 6.0-2022**

ACTA No.		DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD			
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA		
CONTRATACIÓN DIRECTA		MINIMA CUANTIA		X		
FECHA DEL ACTA	22/09/2023	CONTRATO No.	710	AÑO	2022	

contratista cumplió a cabalidad tal como lo demuestran los respectivos comprobantes de pago según se puede constatar en el expediente, y en las diferentes plataformas electrónicas.

Que el contratista cumplió a cabalidad la presente Interventoría como lo demuestran sus informes de ejecución, certificaciones y demás documentos anexos

Por lo anterior se acuerda efectuar la siguiente liquidación:

Valor asignado al contrato		$ 26.537.000,00
Valor total del contrato		**$ 26.537.000,00**
Pagos efectuados por CORPOAMAZONIA	$ 13.268.500,00	
Saldo a favor del CONTRATISTA	$ 13.268.500,00	
Saldo a favor de CORPOAMAZONIA	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 26.537.000,00**	**$ 26.537.000,00**

Por lo tanto, el valor final a pagar al contratista es de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 13.268.500,00) M/CTE.**

Las partes declaran encontrarse a paz y salvo una vez se cancele el valor adeudado a favor del CONTRATISTA.

En constancia se firma en Mocoa (Putumayo) y en Leticia (Amazonas), a los veintidós (22) días del mes septiembre de 2023

POR CORPOAMAZONIA	POR EL SUPERVISOR	POR EL CONTRATISTA
LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS	**MARYORY PANTEVIS GIRON**	**MARIO FERNANDO LOPEZ MUÑOZ**
Director General	Directora Territorial Amazonas	Interventor

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 62 67, Fax: (8) 4 29 62 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 58
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Dario Francisco Andrade Enriquez	Revisó parte técnica y/o administrativa	Maryory Pantevis Giron
Proyectó	Maryory Pantevis Giron – Ricardo Rodriguez		Directora Territorial Amazonas

Original	Expediente	Copia	Contratista

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e62bb18ef7a505fd6cd862a7f749c02d44fcab59b1a4de56c19ed0d6fb79bf542a7cc27e93733d8f104b75b1a934f041

Número de Factura: FE-11
Fecha de Emisión: 21/09/2023
Fecha de Vencimiento: 21/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPEZ MUÑOZ MARIO FERNANDO
Nombre Comercial: LOPEZ MUÑOZ MARIO FERNANDO
Nit del Emisor: 98384454
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CR 18 10 B 67 AP 302 BRR LOS PRADOS
Teléfono / Móvil: 3217009761
Correo: malomu1@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800252844
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CR 17 14 85 BRR LA ESMERALDA
Teléfono / Móvil: 984296641
Correo: correspondencia@corpoamazonia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	026	Contrato de interventoria No 718 de 2022	94	1,00	$ 22.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.237.000,00	19.00			$ 22.300.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Realizar la interventoría externa en el marco del proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS."
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-21 11:28:19
Documento generado el: 2023-09-21 11:28:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			22.300.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			22.300.000,00
IVA			4.237.000,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.237.000,00
Total neto factura (=)			26.537.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	26.537.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046223331 Rango desde: 6 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-09-21
