Gmail

INGESERVICE JL SAS <ingeservicejl@gmail.com>

ACTA MODIFICATORIA PARA FIRMA

1 mensaje

INGESERVICE JL SAS <ingeservicejl@gmail.com>
Para: suntreeconstructor@gmail.com, consorciosuntreecp1@gmail.com

5 de mayo de 2023, 17:11

--

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
GERENTE
INGESERVICE JL SAS

INGESERVICE
CONSTRUCCION
CONSULTIRIA
INTERVENTORIA
JL
S.A.S

Libre de virus.www.avast.com

ACTA MODIFICATORIA sedes educativas.xlsx
241K

Gmail

INGESERVICE JL SAS <ingeservicejl@gmail.com>

RESPUESTA LIQUIDACION RESIDENTE DE OBRA-

1 mensaje

INGESERVICE JL SAS <ingeservicejl@gmail.com>
Para: jfgomez@sedhuila.gov.co

23 de mayo de 2023, 08:49

Neiva, 23 de mayo de 2023

CIO 1586/2023- 06

Dra.
HELENA ARQUE CARDENAS
Profesional Universitario
Gobernación del Huila – secretaria de Educación

Referencia: contrato de obra Pública No. 1571-2022" MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asunto: Radicado 2023CS036466-1 Respuesta solicitud de residente de obra para pago de Liquidación

La presente es con el fin de dar respuesta a su solicitud sobre el pago de liquidación del ingeniero VÍCTOR ALFREDO JOSE GORDILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.706.289 de Neiva, quien realizó la labor de residente de obra del contrato de la referencia.

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
GERENTE
INGESERVICE JL SAS

INGESERVICE
CONSTRUCCION
CONSULTIRIA
INTERVENTORIA JL S.A.S

Libre de virus.www.avast.com

2 archivos adjuntos

LIQUIDACIÓN CONTRATO LABORAL - VICTOR ALVEAR (1).pdf
173K

SOPORTE CONSIGNACION.pdf
60K

Gmail

INGESERVICE JL SAS <ingeservicejl@gmail.com>

SOLICITUD DE SUSPENSION ACTA DE OBRA 1571 E INTERVENTORIA 1586 DE 2022

1 mensaje

INGESERVICE JL SAS <ingeservicejl@gmail.com>
Para: jfgomez@sedhuila.gov.co

1 de junio de 2023, 11:48

Cordial saludo, por medio de la presente me permito anexar solicitudes de suspensión de de los contratos de obra 1571 de 2022 e interventoría 1586 de 2022
--

atentamente,

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
GERENTE
INGESERVICE JL SAS

Libre de virus.www.avast.com

2 archivos adjuntos

oficio solicitud de suspension contrato obra 1571-2022.pdf
77K

SOLICITUD SUSPENSION OBRA CI1586-08-2023.pdf
123K

CONSORCIO
SUNTREE CP

Neiva, Huila 30 de mayo de 2023

Señora
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA SEDES EDUCATIVAS
NEIVA-HUILA

Ref: **SOLICITUD DE SUSPENSION AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1571 DE 2022**

Cordial Saludo;

Por medio de la presente, me permito manifestarles que como es de su conocimiento en cada una de las visitas de socialización se identificó que los presupuesto contractuales no se ajustaban a las necesidades reales del proyecto, ya que en algunas instituciones ya se habían desarrollado actividades como por ejemplo la reposición de cubiertas; igualmente la entidad contratante no suministro información como planos, diseños y especificaciones técnicas, lo anterior conllevo a plantear la necesidad de ajustar cantidades de obra y por ende balancear el mismo, lo cual requiere tiempo para realizar este ajuste. esta situación ha afectado el inicio de las actividades en algunas instituciones, prolongando los tiempos de ejecución contratados y retrasos en el mismo, afectando el normal desarrollo.

Por las razones expuestas anteriormente solicito una suspensión de veinte (20) días al contrato de la referencia que tiene por objeto: **"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, con el fin de tener el balance final y modificatoria del contrato, para subsanar todas las situaciones presentadas.

Cordialmente;

LAURA MARÍA HUELGAS QUITIAN
Representante Legal
CONSORCIO SUNTREE CP

Neiva, Huila 1 de junio de 2023

CIO 1586/2023- 08

Doctora
TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
Secretaria de Educación Gobernación del Huila
Ciudad

Referencia: contrato de obra Pública No. 1571-2022" MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION AL LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA No. 1571 DE 2022 E INTERVENTORIA no. 1586 DE 2022

Cordial Saludo;

Por medio de la presente, me permito solicitar de la manera más atenta evaluar la suspensión de los contratos de obra No. 1571 de 2022 e interventoría 1586 de 2022 cuyo objeto corresponde al "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", considerando pertinente la suspensión por un plazo de veinte (20) días calendario con el fin de realizar balance final de cantidades de obra de cada una de las instituciones educativas a intervenir atendiendo las necesidades identificadas en las visitas de socialización.

Anexo solicitud realizada por el contratista CONSORCIO SUNTRE CP del 30 de mayo de 2022

Cordialmente,

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
R.L. CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS 2022

Con copia. Jesús Fabian Gómez Velasco – Apoyo a Supervisor secretaria de Educación

Calle 18 No. 42 - 00 casa A1 Neiva (Huila); celular (311) 3235785141
e-mail:. ingeservicejl@gmail.com

Neiva, Huila 5 de junio de 2023

CIO 1586/2023- 09

Doctora
TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
Secretaria de Educación Gobernación del Huila
Ciudad

Recibí

Referencia: contrato de obra Pública No. 1571-2022" MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asunto: Entrega de nuevos Análisis de precios unitarios y sus anexos

Cordial Saludo;

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de APU con el fin de que sea incluidos dentro del presupuesto contractual, los mismos fueron revisados y analizados por esta interventoría; los APU que se encuentran dentro del rango de precios manejados en el contrato y los que no se consideran en el contrato son soportados mediante cotizaciones del mercado y se anexan en el presente oficio.

APU que se encuentran dentro del rango de precios manejados en el contrato:

- ADC1 Construcción de Viga en concreto 0,30 X 0,12 m, incluye acero
- ADC2 Construcción de placa de piso en concreto de 2500 psi e=0,08 con malla electrosoldada

APU que se requieren cotización y análisis de mercado:

- ADC3 Red eléctrica en tubería EMT de 1/2", incluye 2 No 12, para luminarias
- ADC4 Red eléctrica en tubería EMT de 1/2", incluye 1 línea No 10 + 1neutro No 10 + 1 Línea No 14
- ADC5 Luminaria 24 w para sobreponer o incrustar

MATERIAL	UN.	CANT	NASOL - CEL 3158788886	ELECTRICOS JJ NEIVA NIT 1.115.390	DISTRIELECTRICOS NIT: 17.627.558-1	DISTRIBUCIONES ENERHUILA NIT: 901.281.498-7	HOMCENTER	PROMEDIO
TUBO EMT 1/2" 3 M	TUBO	1	$ 19.823	$ 25.448	$ 29.006	$ 19.800	$ 26.900	$ 24.195
CURVA EMT DE 1/2"	UN	1	$ 1.505		$ 2.342			$ 1.924
UNION DE ACERO PARA TUBO EMT 1/2"	UN	1	$ 1.328		$ 1.340		$ 1.810	$ 1.493

Calle 18 No. 42 - 00 casa A1 Neiva (Huila); celular (311) 3235785141
e-mail: ingeservicejl@gmail.com

MATERIAL	UN.	CANT	NASOL - CEL 3158788886	ELECTRICOS JJ NEIVA NIT 1.115.390	DISTRIELECTRICOS NIT: 17.627.558-1	MUNDIAL DE ILUNIMACION	HOMCENTER	PROMEDIO
LAMPARA LED DE 24W INCRUSTADA	UN	1	$ 27.315		$ 21.737	$ 23.500	$ 49.900	$ 30.613
LAMPARA LED DE 24W SOBREPONER	UN	1	$ 30.328	$ 33.741	$ 25.953	$ 25.000	$ 59.900	$ 34.984
PROMEDIO LAMPARAS 24W								$ 32.799

Anexo APU (5 folios), cotizaciones (7 folios)

Cordialmente,

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
R.L. CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS 2022

Con copia. Jesús Fabian Gómez Velasco – Apoyo a Supervisor secretaria de Educación

6.1.2 Actas De Socialización

	GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA DE EDUCACION ACTA DE SOCIALIZACIÓN	

Fecha: 10 de Mayo de 2023 **HOJA:** 1 de

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO	x	ORDEN		CONVENIO	

Contrato número: 1571 de 2022

Objeto del Contrato/Convenio: " MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA AULAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

ASISTENTES	ENTIDAD	FIRMA
ING. JESUS FABIAN GOMEZ VELASCO	GOBERNACION	
ING. SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	INTERVENTORIA	
ING. JONATHAN BERNAL CRISTANCHO	CONTRATISTA	
ING. LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN	CONTRATISTA	

ANEXO ASISTENCIA MUNICIPIO DE SANTA MARIA IE SAN JOAQUIN SEDE EL DIAMANTE Y IE SANTA JUANA DE ARCO SEDE AMIRA PASTRANA

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realizaron la visitas según Programación realizada y convocada por el supervisor del contrato, en cada una de las instituciones; a las reuniones participaron directivos, profesores y padres de familia, se desarrolló el siguiente orden: identificación de área a intervenir conjuntamente, socialización del alcance de los trabajos atendiendo lo establecido en los presupuestos por sede contractualmente, asignación de integrantes de las veedurías que serán legalizada ante la personería municipal. A continuación, se relacionan las actividades realizadas en cada sede.

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8671300 ext 1400
FAX 8712767 e-mail: seducacion@huila.gov.co, sechuila@sedhuila.gov.co
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

	GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA DE EDUCACION ACTA DE SOCIALIZACIÓN	

1. **IE SAN JOAQUIN SEDE EL DIAMANTE - MUNICIPIO SANTA MARIA**


- Se realizó la reunión en la sede educativa donde participaron directivos, profesores y padres de familia
- Se identifico el área a intervenir
- Se socializaron actividades del presupuesto asignado para la proyección de la ejecución de las obras de la siguiente manera:

- Desmonte de cubiertas (Termoacústica en mal estado parte por golpe de balones).
- Instalación de tableros eléctricos según se requieran.
- Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v
- Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6
- Red eléctrica en tubería pvc para luminarias, tomas.
- Pañete impermeabilizado 1:4, para los vanos de ventanería sobre muros parcialmente tapados en los salones.
- Suministro e instalación de Cubierta.
- Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios.
- Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta.
- Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC.
- Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, II manos.
- Desmonte de ventanas
- Demolición placa de piso concreto e=0.10m, incluye retiro(para instalación de tubería de desagüe de la cubierta).
- Demolición de tablero en concreto para pizarra.
- Excavación manual h=2,9m(para instalación de tubería de desagüe).
- Relleno compactado con material de sitio(para instalación de la tubería de desagüe.
- Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 4 e=0.10m (Se contempla para taponar los huecos de la mampostería de ventanas al interior de los salones).
- Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 4" (para bajantes de cubierta)
- Suministro e instalación de tubería de desagüe en pvc 4"(para bajantes de cubierta)
- Suministro e instalación de tubería de desagüe en pvc 6"(tubería principal de desagüe de cubierta).
- Construcción de Caja de inspección de 60x60cm, ladrillo para los cambios de dirección de la tubería.
- Regata general pared(para instalaciones de tomas)
- Instalación de canal en Lámina galvanizada cal 22(para mejorar el canal existente y contemplar un canal en la parte posterior para la recolección de las aguas lluvia.
- Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.10 (se contempla para reponer el piso dañado en pasillo producto de la instalación de la tubería para aguas lluvia.
- Suministro e instalación de ventana metálica cal.18 y reja en tubo cuadrado
- Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventanería metálica
- Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lamina llena
- Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina

- Limpieza y retiro de escombros.
- Aseo final de obra.
- Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras.

En la visita se observan tres situaciones que deben considerarse una vez se entregue la obra:


- La cubierta del salón que da hacia el polideportivo está expuesta constantemente a golpes por los balones lanzados desde ahí y la gente se sube constantemente a ella para recuperar los balones, es necesario aclarar para que la institución debe tomar las medidas que garanticen la estabilidad y durabilidad de la cubierta.

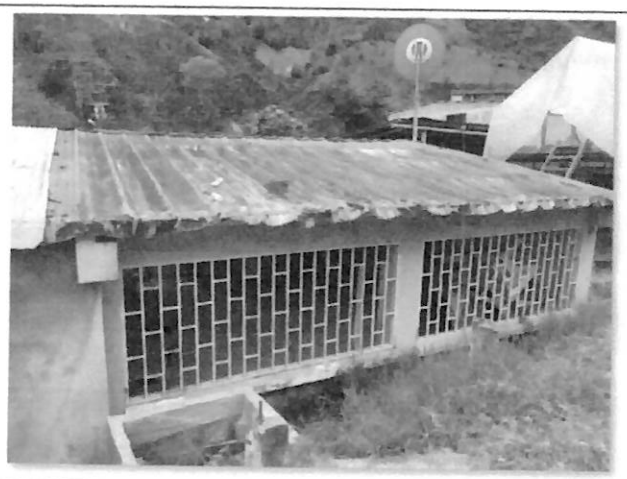



- Otra situación encontrada está en el talud que da contra el salón por la parte lateral que colinda con un vecino y posterior del salón (polideportivo), se observa que el vecino ha realizado relleno contra la pared lateral de tal modo que se presentan empujes hacia el muro lateral y en condiciones de terreno saturado de agua se ejerce mayor presión y condiciones de humedad que implicaría el deterioro de la superficie del muro interior, ante cualquier arreglo que se realice en el aula.


3/9

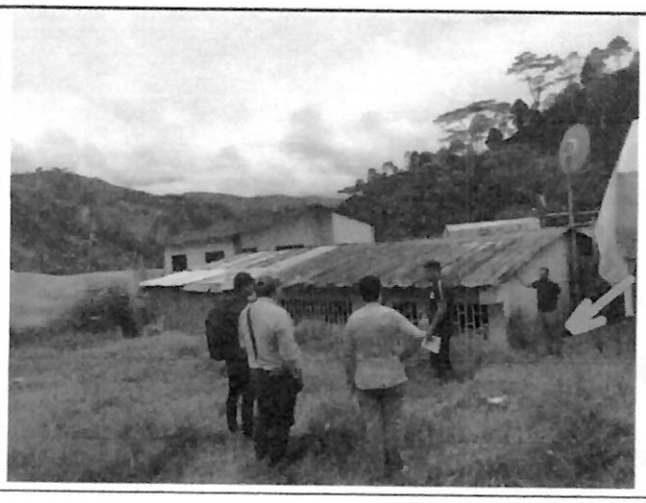



- También es de tener presente que por la parte posterior el terreno está más alto que el nivel del salón por lo que el nivel freático por el pendiente escurre hacia él. Se observa que actualmente pasa una tubería por debajo del piso de este salón y según nos informan es la tubería que recoge las aguas que filtra este terreno y las de la cubierta del polideportivo adyacente. El problema está es que cuando la tubería se tapona por los sedimentos acarreados implica que el agua se rebose por el terreno hacia los salones, sin embargo, los salones presentan un piso en buen estado, un poco manchado por esta situación, por lo que la actividad de desmanche de piso no se realizará teniendo en cuenta que se deben mitigar las causas que ocasionan esto y por lo tanto sería una actividad perdida. Se analizará para incluir en el presupuesto una caja de inspección que permita facilitar la evacuación de las aguas lluvia generada por la cubierta del salón y parte del agua que se pueda captar de la escorrentía.



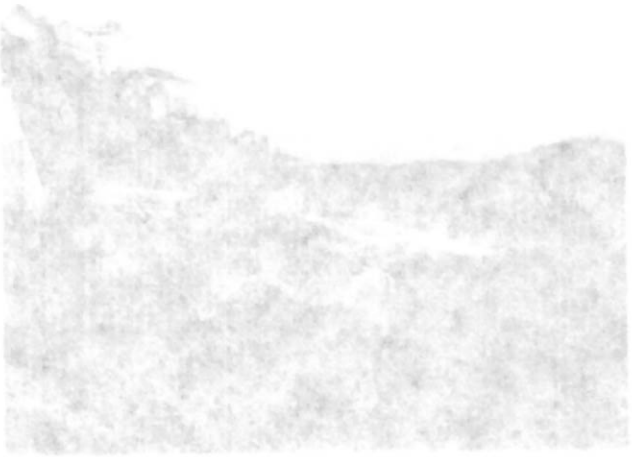

- ***Conformación de veeduría:***

1. Luz Aneida Sarmiento – Madre de familia (3123170277)
2. Alejandra Galindo– Docente (3223491965).



Imagen: socialización proyecto y aula a intervenir.

2. IE SANTA JUANA DE ARCO SEDE AMIRA PASTRANA - MUNICIPIO SANTA MARIA

- Se realizó la reunión en la sede educativa donde participaron directivos, profesores y padres de familia
- Se identifico el área a intervenir
- Se socializaron actividades del presupuesto asignado para la proyección de la ejecución de las obras de la siguiente manera:

- Desmonte de cubiertas (asbesto cemento).
  Suministro e Instalación de Acometida eléctrica iluminación monofásica.
- Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 12 circuitos. Incluye Tacos.
- Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6.
- Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias.
- instalación salida interruptor doble 110 V.
- Red electrica en tuberia pvc de 1/2"", incluye 1 linea No 10 + 1
- neutro No 10 + 1 Linea No 14.
- Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios.
- Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios
- Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC.
- Demolición pañete muro.
- Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v.

- Regata general pared (para instalación de tomas)
- Suministro y Aplicación de pañetes muros 1:4 incluye filo y dilataciones.
- Suministro e Instalación de Correas en perfil metálico 3"x1 1/2" Cal. 18
- Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, III manos.
- Suministro y Aplicación de Pintura Coraza para fachada.
- Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena.
- Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina.
- Suministro y Aplicación de pintura esmalte ventanería metálica.
- Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras.
- Limpieza y retiro de escombros.
- Aseo final de obra.

- ***Conformación de veeduría:***

1. Wilson Arley Romero – Padre de familia (3203000828).
2. Mayra Alejandra Durán– Docente (3142183711).
3. Edilma Rodríguez Perdomo-Docente-(3212224167).



Imagen: socialización proyecto y aula a intervenir.

6/9

	GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA DE EDUCACION ACTA DE SOCIALIZACIÓN	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO/CONVENIO

Actividad /Compromiso (De acuerdo al cronograma de trabajo)	**Estado de avance de la actividad / Compromiso** (% estimado)	**Justificación / Observación** (Relacionada con el estado de avance de la actividad)

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso – Santa María	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Actas de veeduría	6 de junio de 2023	Contratista e interventoría

Fecha de la próxima reunión		**de**		**de**	

7/9

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **ACTA DE SOCIALIZACIÓN**	

Fecha: 10 **de** Mayo **de** 2023 **HOJA:** **de**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	1571		De		2022

Objeto del Contrato/Convenio: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA AULAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
IE. SAN JOAQUIN SEDE El DIAMANTE - MUNICIPIO SANTA MARIA.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

ASISTENTES	**ENTIDAD**	**FIRMA**
Alejandra Galindo Sanabria	Docente	Alejandra Galindo S.
luz Aneida Sarmiento	Madre flia	luz Aneida Sarmiento
Jonathan Bernal Cristancho	Contratista	
ALEXANDER LOVERA YUSTRES	R. COALTRAISIN	
Luis Miguel Coquimbo	Re. Contratista	Luis Coquimbo
Ajny Enrique Lora Quinchia	Interventoria	
Leonor Izquierdo	Rectora	
Jesus Fabian Gomez V	SED	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACION

ACTA DE SOCIALIZACIÓN

Fecha: 10 **de** Mayo **de** 2023 **HOJA:** **de**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO	x	**ORDEN**	**CONVENIO**

Contrato número: 1571 De 2022

Objeto del Contrato/Convenio: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA AULAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
IE SANTA JUANA DE ARCO SEDE AMIRA PASTRANA - MUNICIPIO SANTA MARIA

ASISTENTES A LA REUNIÓN

ASISTENTES	**ENTIDAD**	**FIRMA**
Jonathan Bernal Cristancho	Contratista	
Luis Miguel Cagaimbo	Rc Contratista	Luis Cagaimbo
Mayra Alejandra Durán	docente	MAYRA A. DURAN C.
José Gildardo Andrade	Rector	
Edna Rocio Velasco		Edna Rocio Velasco.
Naudy liceth Betancurt	Padre de F.	Naudy L. Betancurt.
Yina Patricia Payoy	Padre de F.	YINA PATRICIA P.
Naudy Marcela Cruz.	padre f.	Naudy Marcela C.
Wilson Alley Romero	Padre F.	
ALEXANDER JOVEN YOSTIN	R. CONTRATISTA	
Fabian Gomez V	SED	
Ayny Enrique Lara Quintero	interventoria	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

	GOBERNACION DEL HUILA **SECRETARIA DE EDUCACION** **SOCIALIZACION**	

Fecha: 25 **de** mayo **de** 2023 **HOJA:** 1 **de**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATO x **ORDEN** **CONVENIO**

Contrato número: 1571 de 2022

Objeto del Contrato/Convenio: " MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA AULAS DE LA PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

ASISTENTES	ENTIDAD	FIRMA
ING. JESUS FABIAN GOMEZ VELASCO	GOBERNACION	
ING. SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	INTERVENTORIA	
ING. JONATHAN BERNAL CRISTANCHO	CONTRATISTA	
ING. LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN	CONTRATISTA	

ANEXO ASISTENCIA MUNICIPIO DE COLOMBIA IE PABLO VI SEDE GONZALEZ Y CIFUENTES

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

VISITAS DE SOCIALIZACION SEDES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE COLOMBIA

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realizaron la visitas según Programación realizada y convocada por el supervisor del contrato, en cada una de las instituciones a las reuniones participaron directivos, profesores y padres de familia, donde se desarrolló el siguiente orden: identificación de área a intervenir conjuntamente, socialización del alcance de los trabajos atendiendo lo establecido en los presupuestos por sede contractualmente, asignación de integrantes de las veedurías que serán legalizada ante la personería municipal. A continuación, se relacionan las actividades a evaluar para ejecutar en la sede.

1. IE PABLO VI SEDE GONZALEZ Y CIFUENTES - MUNICIPIO COLOMBIA

- Se realizó reunión en la sede educativa donde participaron directivos, profesores.
- Se identifico el área a intervenir
- Se socializaron actividades del presupuesto asignado y se contemplaron otras actividades para tener en cuenta en el momento de realizar el balance de las actividades a ejecutar y para lo cual relacionamos como sigue de manera general a continuación:

- Demolición enchape de piso.
- Demolición enchape muro.
- Desmonte aparatos sanitarios Incluye retiro.
- Desmonte marcos y puertas.
- Demolición muros e-0.15m, con retiro.
- Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 4 e=0.10m.
- Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 4 circuitos. Incluye tacos.
- Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v
- Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6.
- "Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo
- a tierra, varilla c. W. 2,40 ml"
- Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias
- instalación salida interruptor doble 110 V
- Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 línea No 10 + 1neutro No 10 + 1 Linea No 14
- Suministro e instalación de tubería de desagüe en pvc 4"
- Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios.(para cubierta baños nuevos).
- Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta(para cubierta baños nuevos).
- Suministro e Instalación de Correas en perfil metálico 3"x1 1/2" Cal. 18 (para cubierta baños nuevos).
- Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC.
- Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25.
- Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25.
- Construcción de Placa de piso en concreto.
- Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla.
- Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla.
- Suministro e Instalación de Luceta metálica en lamina cal 18-tubo cuadrados 1".
- Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica.
- Suministro e instalación de ventana metálica cal.18 y reja en tubo cuadrado.
