BITACORA INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE SAN FRANCISCO DE JESUS GARZON Y I.E. MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE MARGARITA MUNICIPIO DE RIVERA

Sede Mar-

Viernes 05 de Mayo
clima : Nublado.
Herramienta: menor
personal: 1 maestro. 3 oficiales, 6 ayudantes

sede Francisco: se termino la construccion del closet. la actividad del personal es baja, la carpintera metálica es necesaria para dar terminado a la pared del fondo..

Sede Margarita: se realiza excavacion para caja de inspeccion con el ánimo de encontrar la tuberia principal de alcantarillado de la sede. sin hasta este dia haber logrado encontrarla.

Residente de Interventoria

Residente de Obra

Sábado 06 de Mayo
clima : Nublado
Herramienta: menor
personal: 1 maestro, 2 ayudantes.

sede Villa del prado: con el personal se continua adecuando las superficie de los muros del aula y pintando, se opta por pintar la parte inferior de las paredes de otro color con el animo de preservar el estado y pintura de la pared al ser un tono mas oscuro.

Powered by CamScanner


En este momento se encuentra en el taller de ornamentación, la lucetas o Ventanas pendientes x instalar al igual que las puertas al instalar en los closets

Sede de Fuenta:
En esta sede se realiza labores de acondicionamiento de la superficie de los muros para la aplicación de la pintura

Sede de San Francisco.
continuamos con adecuación de la superficie y pintura del muro que se pañeto dentro del aula.
la carpintería metalica de aula en el momento se encuentra en fabricación y a la espera de ella para poder instalarla en los armarios y lucata para poder dar el terminado final de los muros a causa de su instalación.

Residente de interventoria

Residente de obra

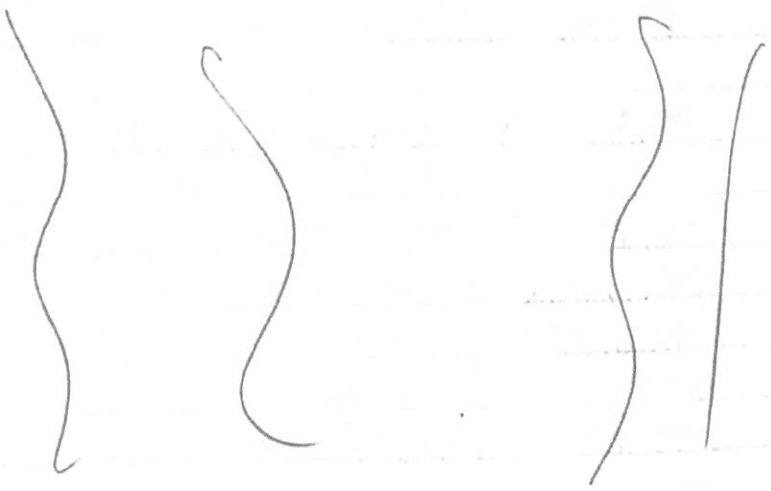

Lunes 8 de mayo de 2023

Clima :
Herramienta: Menor
Personal:

Sede Riverita:
Despues de aplicar capa de estuco sobre muro se da igualmente la aplicación de una capa de pintura a los muros

Sede Margarita:
Se ha realizado un trabajo de campo en relación al sistema de tuberias de desagüe Sanitaria, ya que no se cuenta con planos que muestren la conformación de redes dentro de la Institución. Hasta el momento ha sido complicado dar con alguna referencia para poder conectar las baterias a construir al sistema existente. Inicialmente se explorara con un apique a ver si se logra dar con alguna tubería sanitaria que permita conectar.

Residente Interventoria

Residente de Obra

Martes 9 de Mayo de 2023.

clima :
Herramiento:
Personal:

Sede de Margarita
Se continua con trabajos de exploración para encontrar alguna linea de tubería sanitaria

Powered by CamScanner

que permita conectar la red sanitaria de los baños infantiles al sistema de alcantarillado mediante el apique que se esta realizando, esta actividad se realiza durante toda la jornada

Sede Villa del Prado:
Esta en proceso de construcción la carpintería metalica para poder continuar las obras

Sede San Francisco:
Esta en proceso de fabricación las puertas y luceta para dar continuidad a las actividades.

Sede Riverita:
Se continua con las actividades de pintura sobre muro. No se realiza esta actividad en el area de los baños ya que el area sera intervenida con regatas para poder trasladar parte de las instalaciones electricas.

Residente Interventoria

Residente de Obra.

Miercoles 10 de Mayo de 2023.

Clima :
Herramienta
Personal

Sede de Margarita:
En el momento no se encontro con la exploración del apique alguna tuberia para conectar al Sistema, lo que ha contribuido tambien

Powered by CamScanner

al retraso del desarrollo de las actividades. Se realizan actividades para evacuación de los escombros producto de la exploración para encontrar la tubería sanitaria.

Residente Interventoria Residente de Obra.

Jueves 11 de Mayo de 2023.

No se realizan actividades.

Residente Interventoria Residente de Obra.

Viernes 12 de Mayo de 2023.
Sede Margarita
No se han ejecutado labores. Se esta buscando con las directivas la facilidad de poder encontrar planos. que nos logen Ubicar para la localizacion de redes. de la sede Margarita. y por lo tanto el personal se ha retirado para poder tener una mejor planeación en la ejecución de los trabajos.

Residente interventoria Residente Ob

Lunes 15 de Mayo de 2023

En el manento se han tenido dificultades para la adquisición de materiales debido a problemas de suministro por parte de los proveedores

Residente de Obra Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves 18 de Mayo 2023

Debido a problemas internos, el contratista maestro general que tenia a cargo el municipio de Rivera, renuncia a las labores que se han estado llevando a cabo y sale con todo el personal a su cargo. Se espera encontrar el nuevo personal para continuar las labores

Residente de Obra

Residente de Interventoria

(Marte) Martes 23 de Mayo 2023.

En virtud de la reunión efectuada con la comunida de la sede Margarita en especial, se ha planteado modificar la parte destinada a baterias para los ninos de primera infancia, de tal modo que sea aprovechado tanto para el servicio sanitario y tambien que se provee de un espacio para armario en los cuales se pueda guardar los elementos didacticos de los maestros y así garantizar la seguridad. Estas modificaciones seran tenidas en cuenta para el acta modificatoria que debe ser necesaria para contemplar todos los cambios que se preveen para la ejecución de la obra.

Residente Interventorio

Residente de Obra

Powered by CamScanner

Miercoles 24 de Mayo de 2023.

Se realiza el contacto del nuevo personal que laborara en las sedes de este municipio

Residente de Obra — Residente Interventoria

Jueves 25 de Mayo de 2023.

Se realiza recorrido por las diferentes sedes con el personal a laborar en esta zona

Residente Interventoira — Residente de Obra

Lunes 29 de Mayo de 2023

El nuevo contratista esta consiguiendo el personal para continuar con las labores en las diferentes instituciones a intervenir del municipio

Residente Interventoria — Residente de obra

Powered by CamScanner

Jueves 1 de Junio 2023.

Clima
Herramienta
Personal. 1 maestro, 2 Ayudantes y Residentes de Obra
Hora:

Sede Margarita:
Se realizan actividades de demolición de placa por el lado de la cuneta del lado exterior del bloque cerca al area de juegos con el animo de profundizarse para lograr encontrar una linea de tubería para conducir las aguas negras a una caja o punto de derivación hallada al lado puesta principal a la entrada de la sede

Residente Interventoria Residente de Obra.

Viernes 2 de Junio 2023

Clima
Herramiento
Personal: Residentes
Hora
Se continuan con las labores de demolición de placa al lado posterior del salón que queda en el callejon entre el salon de preescolar y el salón de Hogar infantil de colindancia vecino

Residente Interventoria Residente de Obra

Sabado 3 de Junio 2023.

Clima
Herramienta: Menor.
Personal: Residentes de Obra, 1 maestro, 2 ayudantes
Se realizan actividades de remoción y traslado hasta el punto de acopio de los escombros, producto de la demolición de la placa. y tambien se continua con demolición de placa para conectar tuberia entre la proyección de los cajos Sanitarias a construir en la sede de Margarita

Residente Interventoria — Residente de Obra

Lunes 5 de Junio de 2023

Clima
Herramienta
Personal: Residente, 1 maestro, 2 ayudantes

Sede Margarita:
Se realizan labores de replanteo en la toma de niveles en el area de los baños para la tubería de 4" para el inicio de las excavaciones para instalación de esta tuberia.

Residente Interventoria — Residente de Obra.

Powered by CamScanner
