ACTA No	01				
FECHA	06 de Marzo de 2023	**HORA INICIO**	11:30 AM	**HORA FINALIZACIÓN**	12:30 PM
ACTIVIDAD	Comité de obra 1			ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	
				SI ( )	NO (X)
ELABORADO POR:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ	**CONVOCADO POR**		ENTORNO CONSULTORIA S.A.S	
REFERENCIA:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 001-2023 – OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZOLETA EL ARTESANO				

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Eduardo Rafael Gutiérrez Ternera	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR	
Fernando Serna	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	APOYO SUPERVISIÓN	
Velkis Neivany Galeano Marín	EMPRESA AUTÓNOMA	GERENTE	
Karen Marín Martínez	EMPRESA AUTÓNOMA	APOYO SUPERVISIÓN	
John Alexander Correa Ocampo	ENTORNO CONSULTORIA S.A.S	CONTRATISTA	

DESARROLLO:

El objeto de este primer comité de obra es sugerir realizar el cambio de obra del ítem contractual #13 del contrato interadministrativo 001 del 2023 y dar claridad sobre algunos temas contractuales.

Orden del día:

1. Saludo – Información Contractual
2. Justificación
3. Acuerdan

1. Da inicio al comité, El contratista de Entorno consultoría S.A.S, John Alexander Correa Ocampo expone que se hace necesario realizar el cambio de obra del ítem contractual 13 en un 50%, que es:

Ítem 13 "Suministro de juegos de sillas y mesas redondas en madera, incluye base maciza y parasol con lona impermeable de tráfico pesado de exteriores"

2. Lo anterior se realiza puesto a que en el momento no se encuentra toda la cantidad contractual solo se cuenta con el 50% de las unidades contractuales de la forma contratada inicialmente (redonda) y el tiempo de fabricación de estas se prolongaría más allá de lo planeado para la fecha de terminación del contrato.

   Adicionalmente el proveedor se encuentra en la ciudad de bogota, lo que implica mayor tiempo en el transporte y entrega de este item.

   Por lo tanto, se propone que la cantidad faltante se complete con mesas de las mismas especificaciones cambiando solamente su forma a cuadrada.

3. Revisado lo anterior, la propuesta planteada por parte del contratista de ENTORNO CONSULTORIA S.A.S es aceptada por el secretario de Planeación y Obras Públicas y por la Empresa Autónoma de Guatapé.

   No siendo más se da por finalizado el comité de obra a las 12:30 am y se firma el acta por quienes asistieron.

INFORME FINAL
CONTRATO CD 025 - 2023

EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
ENTORNO CONSULTORIA S.A.S

ENTORNO
CONSULTORÍA AMBIENTAL

EAG
Empresa Autónoma de Guatapé
Sostenibilidad y Desarrollo para todos

INFORME FINAL
CONTRATO CD 025 - 2023

EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
ENTORNO CONSULTORIA S.A.S

ENTORNO
CONSULTORÍA AMBIENTAL

EAG
Empresa Autónoma de Guatapé
Sostenibilidad y Desarrollo para todos.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
2.1 LOCALIZACIÓN Y REFERENCIACIÓN DEL PROYECTO 3
3. COMPONENTE LEGAL 4
3.1 Contrato Contratista 4
4. COMPONENTE TÉCNICO 5
4.1 Mano de obra 5
5. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 6
5.1. EJECUCIÓN FINANCIERA 6
6. COMPONENTE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 8
6.1 Objetivos 8
6.2 Actividades desarrolladas durante el periodo. 9
6.3 Principales actividades SST realizadas durante el periodo: 9
6.3.1 Descripción De Las Actividades 11
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 12

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe pretende plasmar un registro documental y fotográfico, que permita a la entidad contratante, a los organismos de control y la comunidad en general, la consulta de los diferentes componentes plasmados en el informe. El periodo que comprende el presente informe se ubica entre el 24 de marzo al 24 de abril del año 2023.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN Y REFERENCIACIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Guatapé se encuentra ubicado en el departamento de Antioquia, forma parte de la subregión del oriente. Limita al norte con el municipio de Alejandría y concepción, por el este con los municipios de san Rafael y san Carlos, por el sur con los municipios de granada y el peñol y por oeste con el peñol. Su cabecera dista 79 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. EL proyecto se ejecutó en la calle 32 con carrera 29.



3. COMPONENTE LEGAL

3.1 Contrato Contratista

En el municipio de Guatapé, la EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPE bajo la modalidad de contratación CD-025-2023 adjudica al contratista ENTORNO CONSULTORIA SAS con NIT.901.551.640 - 6, la ejecución de la obra "EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ.", cuyo representante legal es JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO identificado con CC. 1.036.928.050 de Rionegro.

Las condiciones contractuales son las siguientes:

CONTRATANTE	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPE
CONTRATISTA DE OBRA	ENTORNO CONSULTORIA SAS
OBJETO DE CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ
CONTRATO	CD - 025 - 2023
OTROSÍ	
FECHA DE INICIO	
FECHA DE FINALIZACIÓN	
VALOR INICIAL	$81.868.579
PAGO ANTICIPADO	No Aplica

POLIZAS

ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS N°: 510 47 994000020962 Anexo: 1	FECHA DE EXPEDICION: 24/03/2023		
COBERTURAS	VIGENCIA (FECHAS)		VALOR
Cumplimiento pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones.	24/03/2023	24/04/2026	$16,373,715.80
Estabilidad de la obra y Calidad de la Obra	24/03/2023	24/04/2028	$16,373,715.80
Nota Aclaratoria: Amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a Aseguradora Solidaria.			$16,373,715.80
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: 510 74 994000004923	FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/03/2023		

COBERTURAS	VIGENCIA (FECHAS)		VALOR
Predios, Labores y operaciones – 15% valor de la perdida-mínimo 3 SMLV.	24/03/2023		$ 232.000.000.00

4. COMPONENTE TÉCNICO

De acuerdo a los diseños suministrados y el cronograma de actividades de obra, realizamos una breve descripción de los diferentes recursos aplicados en obra para el presente periodo, cuyos cuadros relacionaremos a continuación:

4.1 Mano de obra

A continuación, presentamos un cuadro en el que relacionamos el personal en obra y personal administrativo, la seguridad social se relaciona en el componente Legal.

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA	
CARGO	CANTIDAD
Residente de obra	1
TOTAL	1

5. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

A continuación, relacionamos el comportamiento de la obra ejecutada y pagada en cifras totales incluyendo el Desembolso inicial, lo que constituye el avance físico ejecutado del 99,44%

AVANCE FÍSICO DE OBRA		
AVANCE FÍSICO	VALOR	PORCENTAJE
Valor Contrato	$81.868.579	100%
Valor ACTA UNICA	$81.413.579	99,44%
Valor Acta menos Anticipo	$ 0	0%
Valor Pago Anticipo	$ 0	0%
Monto No ejecutado	$455.000	0,56%
Monto a liberar	$455.000	0,56%

5.1. EJECUCIÓN FINANCIERA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
1	Suministro, transporte e instalación de trensa en cable triplex No 4	m	25	$23.192	$579.807	25	$579.807
2	Suministro, transporte e instalación de acometida en cable de Cu 2x8+8 , cable antifraude, incluye grapas, abrazaderas y demás accessorios	m	10	$47.956	$479.563	10	$479.563
3	Suministro, transporte e instalación de medidor de energía 10-60A, cinluye protección principal de 2x40A, tuberia galvanizada de 1/2" y 1" (1,5m), descarga a tierra en cable ce du No4, varilla copper weld de 5/8 x 2.40, concector en C de Cu No 4/0 y No 4	und	1	$1.129.865	$1.129.865	1	$1.129.865
4	Suministro e instalación de Acometida en cable 2N°8+1N°10 AWG Cu THHN - THWN por Tubería de ø2" PVC - DB. No incluye tubería.	m	95	$29.337	$2.787.006	95	$2.787.006
5	Suministro, transporte e instalación de Tubería de ø2" PVC - DB en canalización subterránea por anden o zona verde. Incluye pega PVC y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	70	$35.928	$2.514.960	70	$2.514.960
6	Extensión Luces Led Exterior Terraza 15m 50bom	und	16	$582.695	$9.323.120	16	$9.323.120

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
7	Suministro, transporte e instalación de reflectivos tipo R6B de 100W para interperie	und	4	$350.000	$1.400.000	3	$1.050.000
8	Suministro, transporte e instalación de tablero de 4 cirtcuitos , tercol de sobreponer, incluye: 1 breaker de 2x20A, 1 breaker de 1x20A	und	4	$231.265	$925.062	4	$925.062
9	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo por tuberia EMT "	und	4	$138.653	$554.612	4	$554.612
10	Suministro, transporte e instalación de plafon de losa por tuberia EMT de 1/2"	und	4	$130.653	$522.612	4	$522.612
11	Suministro, transporte e instalación de toma doble con polo a tierra, por tubería EMT de 1/2"	und	4	$138.653	$554.612	4	$554.612
12	Suministro, transporte e instalación de toma 220 V por tubería EMT de 1/2"	und	4	$138.653	$554.612	4	$554.612
13	Suministro de juegos de sillas y mesas redonda en madera incluye, base maciza y parasol con lona impermeable de trafico pesado de exteriores.	und	16	$2.200.000	$35.200.000	16	$35.200.000
14	Trámites para legalización e instalación electrica	gl	1	$1.500.000	$1.500.000	1	$1.500.000
15	Suministo transporte e intalación de sistema unificado de sonido	un	1	$4.000.000	$4.000.000	1	$4.000.000
16	Suministo transporte e intalación de lavamanos resistente a la interperie, incluye grifería	un	1	$950.000	$950.000	1	$950.000
COSTO DIRECTO					$62.975.830		**$62.625.830**
				A.U 30%	$18.892.749		$18.787.749
VALOR TOTAL					$81.868.579		**$81.413.579**

ENTORNO
CONSULTORÍA AMBIENTAL

EAG
Empresa Autónoma de Guatapé
Sostenibilidad y Desarrollo para todos.

6. COMPONENTE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 Objetivos

Objetivo General

Realizar un seguimiento permanente y control adecuado de cada una de las actividades adelantadas del proyecto desde el 24 de marzo al 24 de abril del año 2023, con el propósito de garantizar el cumplimiento del componente de Seguridad y Salud en el trabajo para el proyecto.

Objetivos Específicos

- Cumplir satisfactoriamente con todos los requerimientos estipulados en los términos de referencia.
- Realizar actividades de ejecución de manera planeada, sistemática, oportuna y documentada, para asegurar la ejecución conforme a los términos del contrato de obra.
- Integrar los recursos humanos, materiales, técnicos, informáticos y financieros necesarios y calificados, para un óptimo resultado.
- Vigilar y controlar permanentemente el desarrollo de las obras garantizando que se cumplan los términos contractuales de las mismas y el objeto del contrato de construcción, privilegiando el actuar preventivo sobre el correctivo.
- Dar cumplimiento a la normatividad vigente, velar por la seguridad y salud de todas las personas que intervienen en la ejecución del proyecto

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como Propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo que puedan poner en peligro la integridad física del personal en obra.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) como una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. El objetivo de interventoría, como la del contratista es mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, que se presenten en el transcurso del proyecto, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los empleados.

Durante el periodo del 24 de marzo al 24 de abril del año 2023 se ejecutó el proceso de diseño e implementación de Matriz del Riesgo, en los frentes de trabajo, aunque las actividades realizadas fueron excavación mecánica y manual, instalación de tubería, llenos, compactación e instalación de las casetas entre otras.

6.2 Actividades desarrolladas durante el periodo.

Oficina

- Orden y aseo.

Actividades ejecutadas en campo

- ☐ Suministro, transporte e instalación de trensa en cable triplex No 4
- ☐ Suministro, transporte e instalación de acometida en cable de Cu 2x8+8 , cable antifraude, incluye grapas, abrazaderas y demás accessorios
- ☐ Suministro, transporte e instalación de medidor de energía 10-60A, cinluye protección principal de 2x40A, tuberia galvanizada de 1/2" y 1" (1,5m), descarga a tierra en cable ce du No4, varilla copper weld de 5/8 x 2.40, concector en C de Cu No 4/0 y No 4
- ☐ Suministro e instalación de Acometida en cable 2N°8+1N°10 AWG Cu THHN - THWN por Tubería de ø2" PVC - DB. No incluye tubería.
- ☐ Suministro, transporte e instalación de Tubería de ø2" PVC - DB en canalización subterránea por anden o zona verde. Incluye pega PVC y todo lo necesario para su correcta instalación.
- ☐ Extensión Luces Led Exterior Terraza 15m 50bom
- ☐ Suministro, transporte e instalación de reflectivos tipo R6B de 100W para interperie
- ☐ Suministro, transporte e instalación de tablero de 4 cirtcuitos , tercol de sobreponer, incluye: 1 breaker de 2x20A, 1 breaker de 1x20A
- ☐ Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo por tuberia EMT "
- ☐ Suministro, transporte e instalación de plafon de losa por tuberia EMT de 1/2"
- ☐ Suministro, transporte e instalación de toma doble con polo a tierra, por tubería EMT de 1/2"
- ☐ Suministro, transporte e instalación de toma 220 V por tubería EMT de 1/2"
- ☐ Suministro de juegos de sillas y mesas redonda en madera incluye, base maciza y parasol con lona impermeable de trafico pesado de exteriores.
- ☐ Trámites para legalización e instalación electrica
- ☐ Suministo transporte e intalación de sistema unificado de sonido
- ☐ Suministo transporte e intalación de lavamanos resistente a la interperie, incluye grifería

6.3 Principales actividades SST realizadas durante el periodo:

Las principales actividades desarrolladas durante el presente periodo fueron:

- ✓ Listado de personal operativo en obra.

- ✓ Verificación de las condiciones inseguras.
- ✓ Afiliaciones del personal nuevo y seguimiento a planilla de seguridad social (Administrativos y operativos).
- ✓ Implementación, seguimiento y verificación al cumplimiento de las normas y estándares de seguridad.


6.3.1 Descripción De Las Actividades

1. Describa material educativo elaborado o distribuido en el período (normas y estándares, manuales, cartillas).
Se realiza cartelera con las normas e inducción del personal.
2. Describa las actividades de Higiene, Medicina y de Seguridad ejecutadas en el período.
☐ Las charlas se realizaron con respecto a los riesgos expuestos y SST ☐ Verificación de la seguridad social y toda la documentación ☐ Recomendaciones en caso de un accidente de trabajo ☐ Acompañamiento en las inspecciones realizadas en el periodo
3. ACCIDENTALIDAD EN EL PERÍODO
No se registraron accidentes de origen laboral

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO





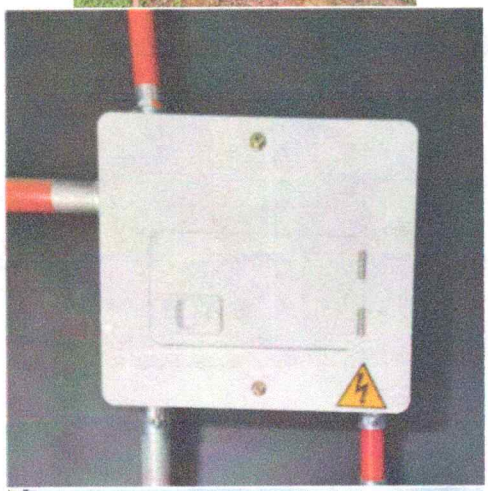







ENTORNO
CONSULTORÍA AMBIENTAL


EAG
Empresa Autónoma de Guatapé
Sostenibilidad y Desarrollo para todos.













JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
Representante Legal
ENTORNO CONSULTORIA S.A.S

ENTORNO
CONSULTORÍA AMBIENTAL

EAG
Empresa Autónoma de Guatapé
Sostenibilidad y Desarrollo para todos.

ANEXOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAPÉ DEPARTAMENTO ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO**	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ			
	CONTRATISTA:	ENTORNO CONSULTORIA SAS	NIT: 901.551.640 - 6		
	INTERVENTORIA:	EMPRESA AUTONOMA GUATAPÉ	NIT: 800.105.497-0		
	VALOR INICIAL :	$81,868,579	**PLAZO INICIAL:**		**PRORROGA:**
	VALOR ADICIONAL:		**FECHA DE INICIO:** 24 de marzo de 2023		
	VALOR FINAL:	$81,868,579	**FECHA DE ENTREGA:** 24 de abril de 2023		
	FECHA DEL ACTA :		**ACTA DE OBRA No.1**		

PRESUPUESTO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA DEL ARTEZANO CD - 025 - 2023


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
1	Suministro, transporte e instalación de trensa en cable triplex No 4	m	25	$23,192	$579,807	25	$579,807
2	Suministro, transporte e instalación de acometida en cable de Cu 2x8+8 , cable antifraude, incluye grapas, abrazaderas y demás accessorios	m	10	$47,956	$479,563	10	$479,563
3	Suministro, transporte e instalación de medidor de energia 10-60A, cinluye protección principal de 2x40A, tuberia galvanizada de 1/2" y 1" (1,5m), descarga a tierra en cable ce du No4, varilla copper weld de 5/8 x 2.40, concector en C de Cu No 4/0 y No 4	und	1	$1,129,865	$1,129,865	1	$1,129,865
4	Suministro e instalación de Acometida en cable 2N°8+1N°10 AWG Cu THHN - THWN por Tuberia de ø2" PVC - DB. No incluye tuberia.	m	95	$29,337	$2,787,006	95	$2,787,006
5	Suministro, transporte e instalación de Tuberia de ø2" PVC - DB en canalización subterránea por anden o zona verde. Incluye pega PVC y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	70	$35,928	$2,514,960	70	$2,514,960
6	Extensión Luces Led Exterior Terraza 15m 50bom	und	16	$582,695	$9,323,120	16	$9,323,120
7	Suministro, transporte e instalación de reflectivos tipo R6B de 100W para interperie	und	4	$350,000	$1,400,000	3	$1,050,000
8	Suministro, transporte e instalación de tablero de 4 cirtcuitos , tercol de sobreponer, incluye: 1 breaker de 2x20A, 1 breaker de 1x20A	und	4	$231,265	$925,062	4	$925,062
9	Suministro, transporte e instalación de interruptor sencillo por tuberia EMT "	und	4	$138,653	$554,612	4	$554,612
10	Suministro, transporte e instalación de plafon de losa por tuberia EMT de 1/2"	und	4	$130,653	$522,612	4	$522,612
11	Suministro, transporte e instalación de toma doble con polo a tierra, por tuberia EMT de 1/2"	und	4	$138,653	$554,612	4	$554,612
12	Suministro, transporte e instalación de toma 220 V por tuberia EMT de 1/2"	und	4	$138,653	$554,612	4	$554,612
13	Suministro de juegos de sillas y mesas redonda en madera incluye, base maciza y parasol con lona impermeable de trafico pesado de exteriores.	und	16	$2,200,000	$35,200,000	16	$35,200,000
14	Trámites para legalización e instalación electrica	gl	1	$1,500,000	$1,500,000	1	$1,500,000
15	Suministo transporte e intalación de sistema unificado de sonido	un	1	$4,000,000	$4,000,000	1	$4,000,000
16	Suministo transporte e intalación de lavamanos resistente a la interperie, incluye grifería	un	1	$950,000	$950,000	1	$950,000
	COSTO DIRECTO				**$62,975,830**		**$62,625,830**
			A.U	**30%**	**$18,892,749**		**$18,787,749**
	VALOR TOTAL				**$81,868,579**		**$81,413,579**

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

EDUARDO RAFAEL GUTIERREZ TERNERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

Municipio de Guatapé / EAG	**MEMORIAS DE CANTIDADES**					ENTORNO CONSULTORIA AMBIENTAL	
FECHA DE CORTE		**PERIODO DE CORTE**		A		**ACTA No.**	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ				**INTERVENTORIA**		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	1	Suministro, transporte e instalación de trensa en cable triplex No 4		**UNIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**CANTIDAD ACTA**	**CANTIDAD A PAGAR**
REGISTRO FOTOGRÁFICO				und	$ 579,806.82		

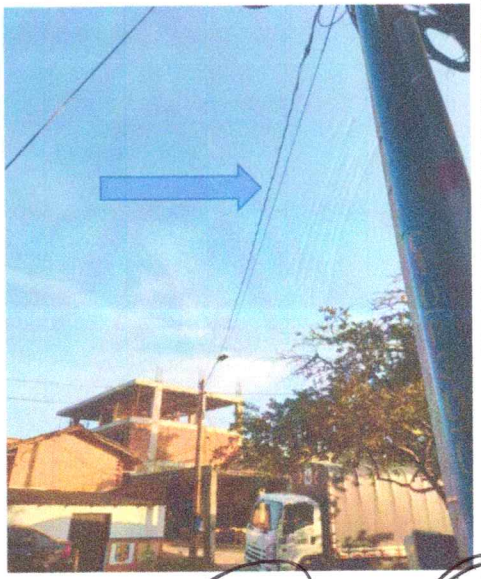

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
En postes existentes en la via principal	25	$23,192			$579,807
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
SUBTOTAL					**$579,807**


JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN

CONTRATISTA

GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

Municipio de Guatapé / EAG	**MEMORIAS DE CANTIDADES**					ENTORNO CONSULTORIA AMBIENTAL	
FECHA DE CORTE		**PERIODO DE CORTE**		A		**ACTA No.**	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ				**INTERVENTORIA**		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	1	Suministro, transporte e instalación de trensa en cable triplex No 4		**UNIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**CANTIDAD ACTA**	**CANTIDAD A PAGAR**
REGISTRO FOTOGRÁFICO				und	$ 579,806.82		

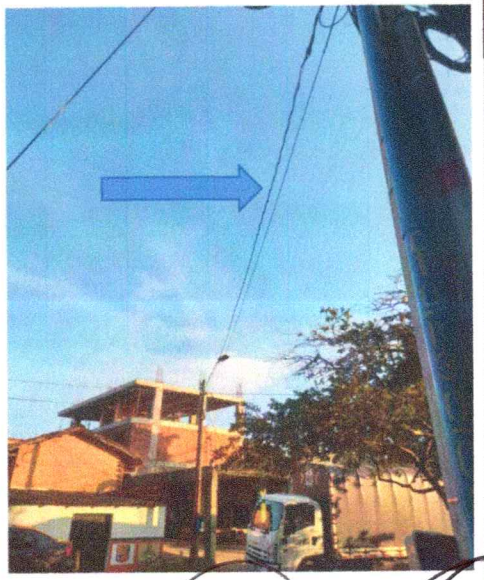

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
En postes existentes en la via principal	25	$23,192			$579,807
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
					$0
SUBTOTAL					**$579,807**

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA DE CORTE		PERIODO DE CORTE		A		ACTA No.	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO		OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ			INTERVENTORIA		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	2	Suministro, transporte e instalación de acometida en cable de Cu 2x8+8 , cable antifraude, incluye grapas, abrazaderas y demás accessorios		UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD ACTA	CANTIDAD A PAGAR
REGISTRO FOTOGRÁFICO				und	$ 479,262.60		



UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	m		$ -
En poste existente de la via principal	10	$ 47,926.26			$ 479,262.60
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ 479,262.60

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

MEMORIAS DE CANTIDADES


FECHA DE CORTE		PERIODO DE CORTE		A		ACTA No.	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO		OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ			INTERVENTORIA		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	3	Suministro, transporte e instalación de medidor de energia 10-60A, cinluye protección principal de 2x40A, tuberia galvanizada de 1/2" y 1" (1,5m), descarga a tierra en cable ce du No4, varilla copper weld de 5/8 x 2.40, concector en C de Cu No 4/0 y No 4	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD ACTA	CANTIDAD A PAGAR	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			und	$ 1,129,865.00			



UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
En poste existente de la via principal	1	$ 1,129,865.00			$ 1,129,865.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ 1,129,865.00

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE



MEMORIAS DE CANTIDADES


FECHA DE CORTE		PERIODO DE CORTE		A		ACTA No.	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO		OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ			INTERVENTORIA		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	4	Suministro e instalación de Acometida en cable 2N°8+1N°10 AWG Cu THHN - THWN por Tubería de ø2" PVC - DB. No incluye tubería.		UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD ACTA	CANTIDAD A PAGAR
REGISTRO FOTOGRÁFICO				und	$ 2,787,005.50		



UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	m		$ -
desde medidor de energía, hasta tableros de distribución en casetas	95	$ 29,336.90			$ 2,787,005.50
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ 2,787,005.50

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE



Municipio de Guatapé / EAG		**MEMORIAS DE CANTIDADES**				ENTORNO CONSULTORIA AMBIENTAL	
FECHA DE CORTE		**PERIODO DE CORTE**		A		**ACTA No.**	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO		OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ			**INTERVENTORIA**		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	5	Suministro, transporte e instalación de Tubería de ø2" PVC - DB en canalización subterránea por anden o zona verde. Incluye pega PVC y todo lo necesario para su correcta instalación.	**UNIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**CANTIDAD ACTA**	**CANTIDAD A PAGAR**	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			**und**	**$ 2,514,960.00**			





UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	m		$ -
en zona verde y plazoleta	70	$ 35,928.00			$ 2,514,960.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					**$ 2,514,960.00**

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

Municipio de Guatapé / EAG	**MEMORIAS DE CANTIDADES**					ENTORNO CONSULTORIA AMBIENTAL	
FECHA DE CORTE		**PERIODO DE CORTE**		A		**ACTA No.**	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ				**INTERVENTORIA**		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	6	Extensión Luces Led Exterior Terraza 15m 50bom		**UNIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**CANTIDAD ACTA**	**CANTIDAD A PAGAR**
REGISTRO FOTOGRÁFICO				**und**	**$ 9,323,120.00**		






UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
en plazoleta, se conectan desde la caseta hacia unos postes perimetrales	16	$ 582,695.00			$ 9,323,120.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					**$ 9,323,120.00**


JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE



MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA DE CORTE		PERIODO DE CORTE		A		ACTA No.	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO		OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ			INTERVENTORIA		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	7	Suministro, transporte e instalación de reflectivos tipo R6B de 100W para interperie	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA		CANTIDAD ACTA	CANTIDAD A PAGAR
REGISTRO FOTOGRÁFICO			und	$ 1,050,000.00			

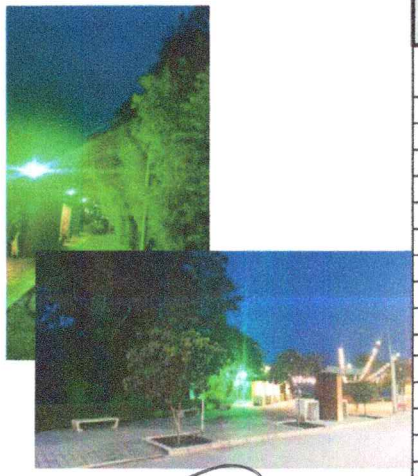

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
En la parte trasera de la plazoleta iluminando los bambu	3	$ 350,000.00			$ 1,050,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ 1,050,000.00

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE



MEMORIAS DE CANTIDADES


FECHA DE CORTE		PERIODO DE CORTE		A		ACTA No.	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO		OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ			INTERVENTORIA		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	8	Suministro, transporte e instalación de tablero de 4 cirtcuitos , tercol de sobreponer, incluye: 1 breaker de 2x20A, 1 breaker de 1x20A		UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD ACTA	CANTIDAD A PAGAR
REGISTRO FOTOGRÁFICO				und	$ 925,061.82		



UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
al interior de la caseta	4	$ 231,265.45			$ 925,061.82
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ 925,061.82

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE



Municipio de Guatapé / EAG	**MEMORIAS DE CANTIDADES**					ENTORNO CONSULTORÍA AMBIENTAL	
FECHA DE CORTE		**PERIODO DE CORTE**		A		**ACTA No.**	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ				**INTERVENTORIA**		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS

ACTIVIDAD	9	Suministro, transporte e instalación de salida de interruptor sencillo, expuesta, en tubería EMT de 1/2", 15 A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye interruptor, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT de 1/2", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, chazos y tornillos, CABLE 12 AWG Cu, 750V 80°C , y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	**UNIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**CANTIDAD ACTA**	**CANTIDAD A PAGAR**
REGISTRO FOTOGRÁFICO			**und**	**$ 554,612.00**		



UBICACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
		UNIDAD	**un**		**$ -**
en casetas y baños	4	$ 138,653.00			$ 554,612.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					**$ 554,612.00**

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA DE CORTE		PERIODO DE CORTE		A	ACTA No.	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ				INTERVENTORIA	
					CONTRATISTA	ENTORNO CONSULTORIA SAS


ACTIVIDAD	10	Suministro, transporte e instalación de salida de plafón de losa, expuesta, en tubería EMT de 1/2", 15 A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye interruptor, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT de 1/2", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, chazos y tornillos, CABLE 12 AWG Cu, 750V 80°C , y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD ACTA	CANTIDAD A PAGAR
REGISTRO FOTOGRÁFICO			und	$ 522,612.00		



UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
en casetas y baños	4	$ 130,653.00			$ 522,612.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ 522,612.00


JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE



Municipio de Guatapé / EAG	**MEMORIAS DE CANTIDADES**					ENTORNO CONSULTORIA AMBIENTAL	
FECHA DE CORTE		**PERIODO DE CORTE**		**A**		**ACTA No.**	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ				**INTERVENTORIA**		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS

ACTIVIDAD	11	Suministro, transporte e instalación de salida de toma doble con polo a tierra, expuesta, en tubería EMT de 1/2", 15 A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye interruptor, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT de 1/2", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, chazos y tornillos, CABLE 12 AWG Cu, 750V 80°C , y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	**UNIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**CANTIDAD ACTA**	**CANTIDAD A PAGAR**
REGISTRO FOTOGRÁFICO			**und**	**$ 554,612.00**		



UBICACIÓN	**CANT**	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
		UNIDAD	**un**		**$ -**
en casetas	4	$ 138,653.00			$ 554,612.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					**$ 554,612.00**


JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA DE CORTE		PERIODO DE CORTE		A	ACTA No.	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ				INTERVENTORIA	
					CONTRATISTA	ENTORNO CONSULTORIA SAS

ACTIVIDAD	12	Suministro, transporte e instalación de salida de toma 220V con polo a tierra, expuesta, en tubería EMT de 1/2", 15 A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye interruptor, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT de 1/2", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, chazos y tornillos, CABLE 12 AWG Cu, 750V 80°C , y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD ACTA	CANTIDAD A PAGAR
REGISTRO FOTOGRÁFICO			und	$ 554,612.00		

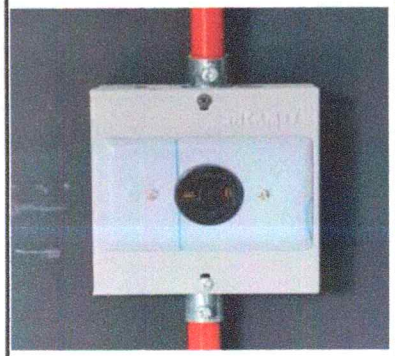

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
en casetas	4	$ 138,653.00			$ 554,612.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ 554,612.00

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE


Municipio de Guatapé / EAG	**MEMORIAS DE CANTIDADES**					ENTORNO CONSULTORIA AMBIENTAL	
FECHA DE CORTE		**PERIODO DE CORTE**		A		**ACTA No.**	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ				**INTERVENTORIA**		
					CONTRATISTA		ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	13	Suministro de juegos de sillas y mesas redonda en madera incluye, base maciza y parasol con lona impermeable de trafico pesado de exteriores.		**UNIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**CANTIDAD ACTA**	**CANTIDAD A PAGAR**
REGISTRO FOTOGRÁFICO				und	$ 35,200,000.00		



UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
en casetas	16	$ 2,200,000.00			$ 35,200,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					**$ 35,200,000.00**

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE



MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA DE CORTE		PERIODO DE CORTE		A	ACTA No.	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ				INTERVENTORIA	
					CONTRATISTA	ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	14	Trámites para legalización e instalación electrica	UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD ACTA	CANTIDAD A PAGAR
REGISTRO FOTOGRÁFICO			und	$ 1,500,000.00		


UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
en casetas	1	$ 1,500,000.00			$ 1,500,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ 1,500,000.00

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

MEMORIAS DE CANTIDADES


FECHA DE CORTE		PERIODO DE CORTE		A	ACTA No.	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ				INTERVENTORIA	
					CONTRATISTA	ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD 14	Suministo transporte e intalación de sistema unificado de sonido		UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD ACTA	CANTIDAD A PAGAR
REGISTRO FOTOGRÁFICO			und	$ 4,000,000.00		

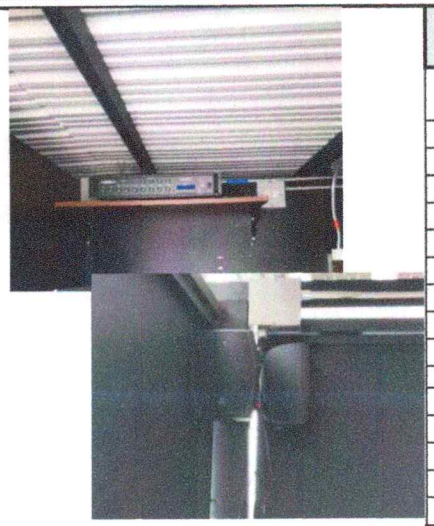

UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
en casetas	1	$ 4,000,000.00			$ 4,000,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ 4,000,000.00

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE



MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA DE CORTE		PERIODO DE CORTE		A	ACTA No.	No. 01
NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ				INTERVENTORIA	
					CONTRATISTA	ENTORNO CONSULTORIA SAS
ACTIVIDAD	16	Suministo transporte e intalación de lavamanos resistente a la interperie, incluye griferia		UNIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD ACTA	CANTIDAD A PAGAR
REGISTRO FOTOGRÁFICO				und	$ 950,000.00		



UBICACIÓN	CANT	DIMENSIONES			TOTAL
		UNIDAD	un		$ -
en baños	1	$ 950,000.00			$ 950,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
SUBTOTAL					$ 950,000.00

JOHN ALEXANDER CORREA OCAMPO
CONTRATISTA

VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN
GERENTE EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

ENTORNO CONSULTORIA, DISEÑO Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS
NIT 901.551.640-6
CR 46 39 60 URB EL ROSAL
Tel: (034) 3122172413
Rionegro - Colombia
johncorreaa@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEC 18

Señores	EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE		
NIT	800.105.497-0	**Teléfono**	(604) 8610555
Dirección	CL 31 30 4	**Ciudad**	Guatape - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/11/2023, 15:55
Expedición	21/11/2023, 16:14
Vencimiento	21/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BASE AIU	1.00	62,352,439.00	62,352,439.00
2	INGRESO POR ADMINISTRACION	1.00	16,835,159.00	16,835,159.00
3	INGRESO POR UTILIDAD	1.00	1,870,573.00	2,225,981.87

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochenta y un millones cuatrocientos trece mil quinientos setenta y nueve pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Total Bruto	81,058,171.00
IVA 19%	355,408.87
Total a Pagar	81,413,579.87

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 81,413,579.87

Observaciones:
Contrato CD 025 - 2023 - Ejecución de obras complementarias de la plazoleta El Artesano del Municipio de Guatapé

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041441561 aprobado en 20221216 prefijo ELEC desde el número 12 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
CUFE: 4508424e9fcad0ceca7c917e9eab4c0e8604866f3b4b6e274464ce650bffef15342b0568c8e9844dc6d52c335f3699d3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1036928050		CORREA OCAMPO JOHN ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	km 2.5 via llanogrande	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5122430	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1970959864	9448078896	I	2023/04/17	2023/03/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$162,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$84,200	$0	$0	$84,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$84,200	$0	$0	$84,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,900	$0	$0	$12,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,900	$0	$0	$12,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,800	$0	$0	$65,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$65,800	$0	$0	$65,800
TOTAL				**1**	**$162,900**	**$0**	**$0**	**$162,900**

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1036928050		CORREA OCAMPO JOHN ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	km 2.5 via llanogrande	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5122430	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1970959864	9448078896	I	2023/04/17	2023/03/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$162,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1036928050	CORREA JOHN		X																231001	7	$525,676	$84,200	EPS010	7	$525,676	$65,800		0	$0	$0	14-11	7	$525,676	$12,900	0	$0	$0	No	$162,900
Total	**Afiliados(1)**																						$525,676	$84,200			$525,676	$65,800			$0	$0			$525,676	$12,900		$0	$0		$162,900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901551640
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			ENTORNO CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 50C CALLE 46 -08	TELÉFONO:	6147962
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7875828853	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2055946404

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185,600**	**$ 0**	**$ 185,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 46,400
SUBTOTALES:													**$ 46,400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									**$ 6,100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6,100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 46,400	$ 0	$ 46,400
SUBTOTALES:			**$ 46,400**	**$ 0**	**$ 46,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP																									
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 39455495	GARCIA BENJUMEA OMAIRA DEL SOCORRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	30																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.160.000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 6,100	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 284.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901551640
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENTORNO CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 50C CALLE 46 -08	TELÉFONO:	6147962
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, cientificas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7874287700	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1994884951

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										$ 185,600	$ 0	$ 185,600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 46,400
SUBTOTALES:													$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 46,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 46,400	$ 0	$ 46,400
SUBTOTALES:			$ 46,400	$ 0	$ 46,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 39455495	GARCIA RENJUMEA DIANIRA DEL SOCORRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000		$ 6,100	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 284,500
