GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**5**	FECHA:	**24**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**			
PERIODO:	DEL	**1**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**	AL	**31**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**
CONVENIO No:		**2057**	DE	**2023**							

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE El MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

LOCALIZACIÓN:

EL ESPINO - BOYACÁ

INFORMACION DEL CONVENIO	
ENTIDAD TERRITORIAL	
MUNICIPIO DE EL ESPINO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA Teléfono: 7420150 Dirección **Cl. 20 #9-90**	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 24/04/2023	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 100.010.525,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 100.010.525,00**

OBSERVACIÓN: Para la ejecución del presente convenio, a) EL MUNICIPIO aporta el Direccionamiento y seguimiento técnico de las obras mediante asignación de supervisión: El municipio deberá identificar los puntos de atención prioritaria, que serán atendidos con la maquinaria. Realizara el control y seguimiento de las actividades a realizar en cada sector. b) EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ aporta la suma de CIEN MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($100.010.525.00). M/CTE

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No ELESP-SA-MC-No. 007-2023	1/08/2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	1/08/2023
Estudios Previos	1/08/2023
Proyecto de pliego de condiciones	9/08/2023
Pliego de condiciones definitivos	24/08/2023
Acto de adjudicación	24/08/2023

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	
Aviso de Convocatoria o Invitación	
Estudios Previos	
Proyecto de pliego de condiciones	
Pliego de condiciones definitivos	
Acto de adjudicación	


GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
		$ 0,00	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección	Teléfono:	Dirección

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
		$ 0,00	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	26	5	2023	18	9	2023			
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES			DOS (2) MESES					
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	25	11	2023	18	11	2023			
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	25	11	2023						

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**39,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**86,3%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Para el presente periodo se continúa con la intervención en la vía Santa Ana - San Joaquin - Pozo Seco- Batallón, en actividades correspondients a limpieza de derrumbes, cuneteo y prfilado d la banca existente, ademas de extendida de material en una longitud de 1,6 km. Se utilizó maquinaria, retroexcavadora, motoniveladora y volquetas. Para este periodo se realizó visita al muncipio constatando lo reportado.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	26	5	2023	
Acta de Inicio contrato de Alquiler	18	9	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	31526000189-8	BANCO:	BANCO AGRARIO	SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2057 DE 2023, ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE El MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	90%	14	9	2023	$ 90.009.473,00
Desembolso No 2.	10%				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Se inicio la ejecución de actividades en el sector La Burrera . Santa Ana - San Joaquin	0+000 - 6+067
Intervencion en vía Santa Ana-San Joaquin.Pozo Seco- Batallon	6+067 - 8+266

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO

(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
27/04/2023	SUPERVISOR DEPARTAMENTO	DIRECTRICES PARA INIIO	SE REMITE AL MUNICIPIO PARA SU TRÁMITE
24/05/2023	MUNICIPIO	PLAN DE TRABAJO	SE RECIBE DOCUEMNTO
23/06/2023	MUNICIPIO	SOLICITUD DE DESEMBOLSO	SE REGRESA PARA AJUSTE
30/08/2023	SUPERVISOR DEPARTAMENTO	INFORMES MENSUALES	SE REMITE OFICO CON DIRECTRICES PARA PRESENTACION
14/08/2023	SUPERVISOR DEPARTAMENTO	DESEMBOLSO INICIAL	Se remite solicitud de desembolso inicial

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	26	5	2023	2	8	2023	Cargado en el Secop II
Informe de Supervisión No. 2	3	8	2023	31	8	2023	Cargado en el Secop II
Informe de Supervisión No. 3	1	9	2023	30	9	2023	Cargado en el Secop II
Informe de Supervisión No. 4	1	10	2023	31	10	2023	Presente Informe

OBSERVACIONES:

1. Se anexa Informe N° 4 presentado por el Municipio de El Espino.
2. Se realizó visita al Municipio, en donde se evidenció los trabajos que adelanta la maquinaria alquilada para el cumplimiento del objeto del convenio 2057 de 2023





CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	VERIFICACION	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra		
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio		
Copia del Contrato de obra e interventoría		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría		
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría		
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE: TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**4**		FECHA:	**31**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**		
PERIODO:	DEL	**1**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**	AL	**31**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**
CONVENIO No:	**2057**		DE	**2023**							

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTP Y EL MUNICIPIO DE ELE ESPINO PARA FORTALECEMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE EL ESPINO - BOYACA

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINO BOYACA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
JORGE ALBERTO HURTADO LEON Teléfono: 7420150 Ext 2254 Dirección **Gobernacion Boyaca**	direccion,infraestructuravial@boyaca.gov.co
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	24/04/2023

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 100.010.525'00	**$ 0'00**	**$ 0'00**	**$ 100.010.525'00**

OBSERVACIÓN: Para la ejecución del presente Convenio: a) EL MUNICIPIO aporta el Direccionamiento y seguimiento técnico de las obras mediante asignación de supervision quien será ejecida por la Secretaria de Planeación e Infraestructura, asi mismo el Municipio de El espino identifico los puntos de atención prioritariaque se atenderán con maquinaria y se remitieron a la Gobernación de Boyaca.

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE ALQUILER

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso Selección Abreviada Subasta Inversa No ELESP-SA-MC-No. 007-2023	01/08/2023	PUBLICACION REALIZADA
Aviso de Convocatoria o Invitación	01/08/2023	PUBLICACION REALIZADA
Estudios Previos	01/08/2023	PUBLICACION REALIZADA
Proyecto de pliego de condiciones	01/08/2023	PUBLICACION REALIZADA
Pliego de condiciones definitivos	09/08/2023	PUBLICACION REALIZADA
Acto de adjudicación	24/08/2023	PUBLICACION REALIZADA

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		NO APLICA LA SUPERVISION SERA DESARROLLADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO
Aviso de Convocatoria o Invitación		

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

Estudios Previos		
Proyecto de pliego de condiciones		
Pliego de condiciones definitivos		
Acto de adjudicación		

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
MUNICIPIO DE EL ESPINO		**$100´010.525**	
OBJETO:			
"ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ"			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO VIAS EL ESPINO		**JUAN ANDRES SALAZAR MESA**	
Teléfono: **3102714462**	Dirección: CALLE 9 No. 4-02 SOATA	Teléfono: **3102714462**	Dirección: CALLE 9 No. 4-02 SOATA


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
NA			
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	26	5	2023	18	9	2023			
	SEIS (06) MESES			DOS (02) MESES					
PLAZO INICIAL									
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	25	11	2023	18	11	2023			
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	25	11	2023						

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**39'0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**83'3%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90'0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**38'97%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**75'0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0'0%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**0'0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**0'0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0'0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

1. El convenio No. 2057 de 2023 fue suscrito el día 24 de ABRIL de 2023.
2. Para la celebración del convenio, existió certificado de disponibilidad presupuestal No. 2755. y Registro presupuestal No. 3898 del 25 de abril de 2023.
3. El Municipio de El Espino el día 24 de Mayo de 2023 remitio a la supervisión del Convenio el Plan de Trabajo de las actividades a ejecutar, la Localización de los tramos y/o puntos a intervenir y el Cronograma de Actividades.
4. El acta de inicio fue suscrita el día 26/05/2023
5. Que el Municipio de El Espino generó el certificado de disponibilidad presupuestal No. 202308001 de fecha 001 de Agosto de 2023 para realizar la apertura del proceso contractual mediante el cual se seleccionara el contratista que alquile la maquinaria solicitada al Municiio de El Espino.
6. Que se elaboraron los Estudios previos, Estudios del Sector y proyecto de pliegos de condiciones para la contratación del alquiler de

la maquinaria y desarrollar las acciones contempladas en el Convenio 2057 de 2023, publicandose el proceso ELESP SA-MC-007 DE 2023 El Día 01 de Agosto de 2023. 7' Que el día 02 de Agosto de 2023 se remitieron los documentos solicitados al Supervisor del departamento para solicitar la Gestión del Desembolso del 90% de los recursos contratados al Municipio en concordancia con lo estipulado en la CLAUSUAL 5 DEL CONVENIO 2057 DE 2023.

8' El día 24 de Agosto se adjudica el proceso Contractual No. ELESP-SA-MC-007-2023 con el Objeto ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ a la firma CONSORCIO VIAS EL ESPINO Representada legalmente por JUAN ANDRES MESA por el valor de CIEN MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($100'010.525'00) M/CTE.

8) EL dia 11 de Septiembre de 2023 se suscribió el Contrato No. ELESP-SA-MC-007-2023. 9) El dia 13 de Septiembre de 2023 se expidieron las garantías que ampara el contrato y asi mismo fueron aprobadas por el Municipio de El Espino.

10) El día dieciocho de septiembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del Contrato ELESP-SA-MC-007-2023, 11) se realizo intervención en la Vía La Burrera-Santa-Ana-San Joaquin realizando un mantenimineto que comprende en limpieza de derrumbes, cuneteo y perfilado de la Banca existente en una longitud de 6.67km

12) se realizo intervención en la Vía Santa-Ana-San Joaquin- Pozo Seco - Batallón, realizando un mantenimineto que comprende en limpieza de derrumbes, cuneteo y perfilado de la Banca existente y cargue y extendidad de material de afirmado en una longitud de 1.596km

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	26	5	2023	N.A
CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	18	9	2023	N.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
				N.A

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	980-47-994000025925	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							13	9	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11	9	2023	11	3	2023	$ 10.001.052'50

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11	9	2023	11	11	2023	$ 10.001.052'50
CALIDAD DEL SERVICIO	11	9	2023	11	3	2024	$ 10.001.052'50

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	980-74-99400001036	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							13	9	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Predios, labores y operaciones	11	9	2023	11	11	2023	$ 232.000.000'00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1			
2			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0'00	

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1			
2			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0'00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1			
2			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0'00	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	31528000092-4	BANCO:	BANCO AGRARIO	SUCURSAL:		
NOMBRE CUENTA:	PROYECTO VIS VIVIENDA RURAL					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	90%	14	8	2023	$ 90.009.473'00
Desembolso No 2.	10%				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 90.009.473'00**

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				**$ 0'00**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				**$ 0'00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
se realizo intervención en la Vía La Burrera-Santa-Ana-San Joaquin realizando un mantenimineto que comprende en limpieza de derrumbes, cuneteo y perfilado de la Banca existente en una longitud de 6.67km con una intensidad horaria de 19.30 horas de Retroexcavadora y Motoniveladora.	DESDE EL K0+00 AL K6+67 Km
se realizo intervención en la Vía Santa-Ana-San Joaquin-Batallón-Pozo Seco, realizando un mantenimineto que comprende en limpieza de derrumbes, cuneteo y perfilado de la Banca existente en una longitud de 1.596km con una intensidad horaria de 37'12 horas de Retroexcavadora y Motoniveladora; y 56'42 horas de 02 volquetas	DESDE EL K6+67 AL K8+266 Km

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	26	5	2023	2	8	2023	NA
Informe de Supervisión No. 2	3	8	2023	31	8	2023	NA
Informe de Supervisión No. 3	1	9	2023	30	9	2023	NA
Informe de Supervisión No. 4	1	10	2023	31	10	2023	NA

OBSERVACIONES: **Son se han presentado imprevistos en la ejecución del Contrato**

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	NO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	2
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	NO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	NO	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	NO	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	

Generales		
Registro fotográfico	SI	1
Correspondencia enviada y recibida	YA SE RADICO	
Registro de instalación Valla informativa	NO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	YA SE RADICO	
Correspondencia enviada y recibida	SI	1

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:



Alcalde Municipal

NOMBRE:	EDBERTO JOSE JAIME COCUNUBO

REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPIO DE EL ESPINO

CONVENIO N°	20XX DE 2023	**ACTA DE INICIO:**	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA		

CONTRATO N°		**ACTA DE INICIO:**	
OBJETO:			

SUPERVISOR MUNICIPIO	**ANGELA MARITZA ESTEBAN**



PERIODO A REPORTAR: 01/10/2023 AL 31/10/2023


EQUIPO	PLACA Y/O SERIE
RETROEXCAVADORA BL60B Ó SIMILAR	EC265828
EXCAVADORA ORUA 220 Ó SIMILAR	
VIBROCOMPACTADOR SD70 O SIMILAR	
MOTONIVELADORA G930 Ó SIMILAR	4HD01940
VOLQUETA	SUA 408
VOLQUETA	FIJ 561

OPERARIO	PLANILLA N°
RAMIRO GUALTEROA AYALA	8626677369
WILSON LACHE	8627554923
GUILLERMO QUIÑONES	
OMAR SIERRA	

CÓD VÍA:		**NOMBRE DE LA VÍA:**	Vía La Burrera-Santa-Ana-San Joaquin-Batallon-Pozo Seco	**ADMINISTRADOR:**	

ACTIVIDADES EJECUTADAS	KM INTERVENIDOS	FOTO INICIAL	FOTO FINAL	COORDENADAS	
				INICAL LAT,LONG	FINAL LAT, LONG
MANTENIMEINTO DE VIA POZO SECO BATTALON, EXTENDIDA DE MATERIAL, ADECUACION DE SUBRASANTE, Y UBICACIÓN DE MATERIAL EN LA ZONA,, AMPLIACION Y LIPIEZA DE LA VIA	0'369			6°31'03"N 72°26'49"W	6°31'12"N 72°26'55"W

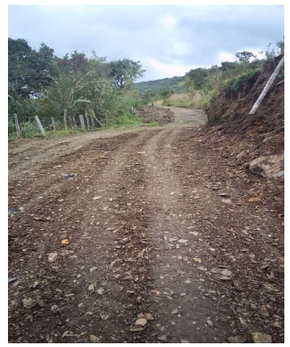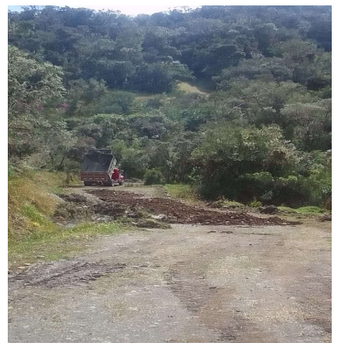MANTENIMEINTO DE VIA POZO SECO BATTALON, EXTENDIDA DE MATERIAL, ADECUACION DE SUBRASANTE, Y UBICACIÓN DE MATERIAL EN LA ZONA,, AMPLIACION Y LIPIEZA DE LA VIA	0'232			6°31'03"N 72°26'49"W	6°31'03"N 72°26'49"W
MANTENIMEINTO DE VIA POZO SECO BATTALON, EXTENDIDA DE MATERIAL, ADECUACION DE SUBRASANTE, Y UBICACIÓN DE MATERIAL EN LA ZONA,, AMPLIACION Y LIPIEZA DE LA VIA	0'201			6°31'03"N 72°26'49"W	6°31'30"N 72°27'12"W
MANTENIMEINTO DE VIA POZO SECO BATTALON, EXTENDIDA DE MATERIAL, ADECUACION DE SUBRASANTE, Y UBICACIÓN DE MATERIAL EN LA ZONA,, AMPLIACION Y LIPIEZA DE LA VIA	0'245			6°31'30"N 72°27'12"W	6°31'35"N 72°27'17"W

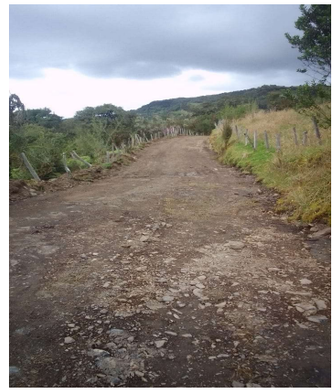MANTENIMEINTO DE VIA POZO SECO BATTALON, EXTENDIDA DE MATERIAL, ADECUACION DE SUBRASANTE, Y UBICACIÓN DE MATERIAL EN LA ZONA,, AMPLIACION Y LIPIEZA DE LA VIA	0'220			6°31'35"N 72°27'17"W	6°31'34"N 72°27'22"W
MANTENIMEINTO DE VIA POZO SECO BATTALON, EXTENDIDA DE MATERIAL, ADECUACION DE SUBRASANTE, Y UBICACIÓN DE MATERIAL EN LA ZONA,, AMPLIACION Y LIPIEZA DE LA VIA	0'329			6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W
MANTENIMEINTO DE VIA POZO SECO BATTALON, EXTENDIDA DE MATERIAL, ADECUACION DE SUBRASANTE, Y UBICACIÓN DE MATERIAL EN LA ZONA,, AMPLIACION Y LIPIEZA DE LA VIA	0'329			6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W

MANTENIMEINTO DE VIA POZO SECO BATTALON, EXTENDIDA DE MATERIAL, ADECUACION DE SUBRASANTE, Y UBICACIÓN DE MATERIAL EN LA ZONA,, AMPLIACION Y LIPIEZA DE LA VIA	0'329			6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W
MANTENIMEINTO DE VIA POZO SECO BATTALON, EXTENDIDA DE MATERIAL, ADECUACION DE SUBRASANTE, Y UBICACIÓN DE MATERIAL EN LA ZONA,, AMPLIACION Y LIPIEZA DE LA VIA	0'329			6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W

CONSORCIO VIAS EL ESPINO
JUAN ANDRES SALAZAR MESA
CONTRATISTA

ING ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA
SUPERVISOR MUNICIPIO

GOBERNACIÓN DE Boyacá

FORMATO DIARIO DE CONTROL DE MAQUINARIA

MUNICIPIO	EL ESPINO, BOYACÁ		
CONVENIO No.	2057 DE 2023		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	ACTA DE INICIO	2023-05-26

Información del contrato suscrito por el municipio			
CONTRATO No.	No. ELESP –SA-MC- 007 DE 2023	FECHA DE INICIO	2023-09-18
CONTRATISTA			
OBJETO	OBJETO "ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ"		

COORDENADAS	
INICAL LAT,LONG	FINAL LAT, LONG
6°31'03"N 72°26'49"W	6°31'12"N 72°26'55"W

CÓD VÍA		NOMBRE DE LA VÍA	SANTA ANA-SAN JOAQUIN - POZO SECO	ADMINISTRADOR	MUNICIPIO EL ESPINO
VEREDA	SANTA ANA	SECTOR	SANTA ANA POZO SECO SAN JOAQUIN	FECHA	2023-10-02

EQUIPO	No. SERIE/PLACA	OPERARIO	IDENTIFICACIÓN	HOROMETRO		TOTAL HORAS	ACTIVIDAD EJECUTADA
				INICIAL	FINAL		
RETROEXCAVADORA	EC265828	RAMIRO WALTEROS	4,117,207	9480'2	9489'6	9'4	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
EXCAVADORA DE ORUGA							
VIBROCOMPACTADOR							
MOTONIVELADORA	4HD01940	WILSON LACHE	89,842,167	9480'2	9489'6	9'4	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	SUA 408	GUILLERMO QUIÑONES	13,921,794			9'4	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	FIJ 561	OMAR SIERRA				9'4	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña

OBSERVACIONES: Para el caso puntual de la volqueta, se debera indicar el material, # de viajes que fueron transportados en la casilla actividad ejecutada.

RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA JORNADA:

KM INTERVENIDOS	0'369

OBSERVACIONES:	Seha realizado un trabo parcial en la via que conduce del sector pozo seco al batallon de alta montaña, trabajos realizados con dos volquetas las cuales se relacionana en el el formato anterior, una retroexcavdora

CONSORCIO VIAS EL ESPINO
JUAN ANDRES SALAZAR MESA
CONTRATISTA

ING. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA
SUPERVISOR MUNICIPIO

GOBERNACIÓN DE Boyacá

FORMATO DIARIO DE CONTROL DE MAQUINARIA

MUNICIPIO	EL ESPINO, BOYACÁ		
CONVENIO No.	2057 DE 2023		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	ACTA DE INICIO	2023-05-26

Información del contrato suscrito por el municipio			
CONTRATO No.	No. ELESP –SA-MC- 007 DE 2023	FECHA DE INICIO	2023-09-18
CONTRATISTA			
OBJETO	OBJETO "ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ"		

COORDENADAS	
INICAL LAT,LONG	FINAL LAT, LONG
6°31'03"N 72°26'49"W	6°31'26"N 72°27'07"W

CÓD VÍA		NOMBRE DE LA VÍA	SANTA ANA-SAN JOAQUIN - POZO SECO	ADMINISTRADOR	MUNICIPIO EL ESPINO
VEREDA	SANTA ANA	SECTOR	SANTA ANA POZO SECO SAN JOAQUIN	FECHA	2023-10-03

EQUIPO	No. SERIE/PLACA	OPERARIO	IDENTIFICACIÓN	HOROMETRO		TOTAL HORAS	ACTIVIDAD EJECUTADA
				INICIAL	FINAL		
RETROEXCAVADORA	EC265828	RAMIRO WALTEROS	4,117,207	9489'6	9493'4	3'8	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
EXCAVADORA DE ORUGA							
VIBROCOMPACTADOR							
MOTONIVELADORA	4HD01940	WILSON LACHE	89,842,167	9489'6	9493'4	3'8	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	SUA 408	GUILLERMO QUIÑONES	13,921,794			3'8	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	FIJ 561	OMAR SIERRA				3'8	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña

OBSERVACIONES: Para el caso puntual de la volqueta, se debera indicar el material, # de viajes que fueron transportados en la casilla actividad ejecutada.

RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA JORNADA:

KM INTERVENIDOS	0'232

OBSERVACIONES:	Seha realizado un trabo parcial en la via que conduce del sector pozo seco al batallon de alta montaña, trabajos realizados con dos volquetas las cuales se relacionana en el el formato anterior, una retroexcavdora

CONSORCIO VIAS EL ESPINO
JUAN ANDRES SALAZAR MESA
CONTRATISTA

ING. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA
SUPERVISOR MUNICIPIO

GOBERNACIÓN DE Boyacá

FORMATO DIARIO DE CONTROL DE MAQUINARIA

MUNICIPIO	EL ESPINO, BOYACÁ		
CONVENIO No.	2057 DE 2023		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	ACTA DE INICIO	2023-05-26

Información del contrato suscrito por el municipio			
CONTRATO No.	No. ELESP –SA-MC- 007 DE 2023	FECHA DE INICIO	2023-09-18
CONTRATISTA			
OBJETO	OBJETO "ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ"		

COORDENADAS	
INICAL LAT,LONG	FINAL LAT, LONG
[LRI]6°31'26"N[PDI] [LRI]72°27'07"W[PDI]	[LRI]6°31'30"N[PDI] [LRI]72°27'12"W[PDI]

CÓD VÍA		NOMBRE DE LA VÍA	SANTA ANA-SAN JOAQUIN - POZO SECO	ADMINISTRADOR	MUNICIPIO EL ESPINO
VEREDA	SANTA ANA	SECTOR	SANTA ANA POZO SECO SAN JOAQUIN	FECHA	2023-10-04

EQUIPO	No. SERIE/PLACA	OPERARIO	IDENTIFICACIÓN	HOROMETRO		TOTAL HORAS	ACTIVIDAD EJECUTADA
				INICIAL	FINAL		
RETROEXCAVADORA	EC265828	RAMIRO WALTEROS	4,117,207	9493'4	9498'9	5'5	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
EXCAVADORA DE ORUGA							
VIBROCOMPACTADOR							
MOTONIVELADORA	4HD01940	WILSON LACHE	89,842,167	9493'4	9498'9	5'5	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	SUA 408	GUILLERMO QUIÑONES	13,921,794			5'5	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	FIJ 561	OMAR SIERRA				5'5	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña

OBSERVACIONES: Para el caso puntual de la volqueta, se debera indicar el material, # de viajes que fueron transportados en la casilla actividad ejecutada.

RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA JORNADA:

KM INTERVENIDOS	0'201

OBSERVACIONES:	Seha realizado un trabo parcial en la via que conduce del sector pozo seco al batallon de alta montaña, trabajos realizados con dos volquetas las cuales se relacionana en el el formato anterior, una retroexcavdora

CONSORCIO VIAS EL ESPINO
JUAN ANDRES SALAZAR MESA
CONTRATISTA

ING. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA
SUPERVISOR MUNICIPIO

GOBERNACIÓN DE Boyacá

FORMATO DIARIO DE CONTROL DE MAQUINARIA

MUNICIPIO	**EL ESPINO, BOYACÁ**		
CONVENIO No.	**2057 DE 2023**		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	**ACTA DE INICIO**	**2023-05-26**

Información del contrato suscrito por el municipio			
CONTRATO No.	**No. ELESP –SA-MC- 007 DE 2023**	**FECHA DE INICIO**	2023-09-18
CONTRATISTA			
OBJETO	**OBJETO "ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ"**		

COORDENADAS	
INICAL LAT,LONG	**FINAL LAT, LONG**
6°31'30"N 72°27'12"W	6°31'35"N 72°27'17"W

CÓD VÍA		**NOMBRE DE LA VÍA**	SANTA ANA-SAN JOAQUIN -POZO SECO	**ADMINISTRADOR**	MUNICIPIO EL ESPINO
VEREDA	SANTA ANA	**SECTOR**	SANTA ANA POZO SECO SAN JOAQUIN	**FECHA**	2023-10-05

EQUIPO	**No. SERIE/PLACA**	**OPERARIO**	**IDENTIFICACIÓN**	**HOROMETRO**		**TOTAL HORAS**	**ACTIVIDAD EJECUTADA**
				INICIAL	**FINAL**		
RETROEXCAVADORA	**EC265828**	**RAMIRO WALTEROS**	**4,117,207**	**9498'9**	**9503'4**	**4'5**	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
EXCAVADORA DE ORUGA							
VIBROCOMPACTADOR							
MOTONIVELADORA	**4HD01940**	**WILSON LACHE**	**89,842,167**	**9498'9**	**9503'4**	**4'5**	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	**SUA 408**	**GUILLERMO QUIÑONES**	**13,921,794**			**4'5**	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	**FIJ 561**	**OMAR SIERRA**				**4'5**	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña

OBSERVACIONES: Para el caso puntual de la volqueta, se debera indicar el material, # de viajes que fueron transportados en la casilla actividad ejecutada.

RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA JORNADA:

KM INTERVENIDOS	0'245

OBSERVACIONES:	Seha realizado un trabo parcial en la via que conduce del sector pozo seco al batallon de alta montaña, trabajos realizados con dos volquetas las cuales se relacionana en el el formato anterior, una retroexcavdora

CONSORCIO VIAS EL ESPINO
JUAN ANDRES SALAZAR MESA
CONTRATISTA

ING. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA
SUPERVISOR MUNICIPIO

GOBERNACIÓN DE Boyacá

FORMATO DIARIO DE CONTROL DE MAQUINARIA

MUNICIPIO	EL ESPINO, BOYACÁ		
CONVENIO No.	2057 DE 2023		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	ACTA DE INICIO	2023-05-26

Información del contrato suscrito por el municipio			
CONTRATO No.	No. ELESP –SA-MC- 007 DE 2023	FECHA DE INICIO	2023-09-18
CONTRATISTA			
OBJETO	OBJETO "ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ"		

COORDENADAS	
INICAL LAT,LONG	FINAL LAT, LONG
[LRI]6°31'35"N[PDI] [LRI]72°27'17"W[PDI]	[LRI]6°31'34"N[PDI] [LRI]72°27'22"W[PDI]

CÓD VÍA		NOMBRE DE LA VÍA	SANTA ANA-SAN JOAQUIN - POZO SECO	ADMINISTRADOR	MUNICIPIO EL ESPINO
VEREDA	SANTA ANA	SECTOR	SANTA ANA POZO SECO SAN JOAQUIN	FECHA	2023-10-06

EQUIPO	No. SERIE/PLACA	OPERARIO	IDENTIFICACIÓN	HOROMETRO		TOTAL HORAS	ACTIVIDAD EJECUTADA
				INICIAL	FINAL		
RETROEXCAVADORA	EC265828	RAMIRO WALTEROS	4,117,207	9503'4	9510'6	7'2	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
EXCAVADORA DE ORUGA							
VIBROCOMPACTADOR							
MOTONIVELADORA	4HD01940	WILSON LACHE	89,842,167	9503'4	9510'6	7'2	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	SUA 408	GUILLERMO QUIÑONES	13,921,794			7'2	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	FIJ 561	OMAR SIERRA				7'2	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña

OBSERVACIONES: Para el caso puntual de la volqueta, se debera indicar el material, # de viajes que fueron transportados en la casilla actividad ejecutada.

RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA JORNADA:

KM INTERVENIDOS	0'22

OBSERVACIONES:	Seha realizado un trabo parcial en la via que conduce del sector pozo seco al batallon de alta montaña, trabajos realizados con dos volquetas las cuales se relacionana en el el formato anterior, una retroexcavdora

CONSORCIO VIAS EL ESPINO
JUAN ANDRES SALAZAR MESA
CONTRATISTA

ING. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA
SUPERVISOR MUNICIPIO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

FORMATO DIARIO DE CONTROL DE MAQUINARIA

MUNICIPIO	EL ESPINO, BOYACÁ		
CONVENIO No.	2057 DE 2023		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	ACTA DE INICIO	2023-05-26

Información del contrato suscrito por el municipio			
CONTRATO No.	No. ELESP –SA-MC- 007 DE 2023	FECHA DE INICIO	2023-09-18
CONTRATISTA			
OBJETO	OBJETO "ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ"		

CÓD VÍA		NOMBRE DE LA VÍA	SANTA ANA-SAN JOAQUIN - POZO SECO	ADMINISTRADOR	MUNICIPIO EL ESPINO
VEREDA	SANTA ANA	SECTOR	SANTA ANA POZO SECO SAN JOAQUIN	FECHA	2023-10-09

COORDENADAS	
INICAL LAT,LONG	FINAL LAT, LONG
6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W

EQUIPO	No. SERIE/PLACA	OPERARIO	IDENTIFICACIÓN	HOROMETRO		TOTAL HORAS	ACTIVIDAD EJECUTADA
				INICIAL	FINAL		
RETROEXCAVADORA	EC265828	RAMIRO WALTEROS	4,117,207	9510'6	9517'3	6'7	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
EXCAVADORA DE ORUGA							
VIBROCOMPACTADOR							
MOTONIVELADORA	4HD01940	WILSON LACHE	89,842,167	9510'6	9517'3	6'7	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	SUA 408	GUILLERMO QUIÑONES	13,921,794			6'7	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	FIJ 561	OMAR SIERRA				6'7	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña

OBSERVACIONES: Para el caso puntual de la volqueta, se debera indicar el material, # de viajes que fueron transportados en la casilla actividad ejecutada.

RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA JORNADA:

KM INTERVENIDOS	0'329

OBSERVACIONES:	Seha realizado un trabo parcial en la via que conduce del sector pozo seco al batallon de alta montaña, trabajos realizados con dos volquetas las cuales se relacionana en el el formato anterior, una retroexcavdora

CONSORCIO VIAS EL ESPINO
JUAN ANDRES SALAZAR MESA
CONTRATISTA

ING. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA
SUPERVISOR MUNICIPIO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

FORMATO DIARIO DE CONTROL DE MAQUINARIA

MUNICIPIO	EL ESPINO, BOYACÁ		
CONVENIO No.	2057 DE 2023		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	ACTA DE INICIO	2023-05-26

Información del contrato suscrito por el municipio			
CONTRATO No.	No. ELESP –SA-MC- 007 DE 2023	FECHA DE INICIO	2023-09-18
CONTRATISTA			
OBJETO	OBJETO "ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ"		

COORDENADAS	
INICAL LAT,LONG	FINAL LAT, LONG
6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W

CÓD VÍA		NOMBRE DE LA VÍA	SANTA ANA-SAN JOAQUIN - POZO SECO	ADMINISTRADOR	MUNICIPIO EL ESPINO
VEREDA	SANTA ANA	SECTOR	SANTA ANA POZO SECO SAN JOAQUIN	FECHA	2023-10-10

EQUIPO	No. SERIE/PLACA	OPERARIO	IDENTIFICACIÓN	HOROMETRO		TOTAL HORAS	ACTIVIDAD EJECUTADA
				INICIAL	FINAL		
RETROEXCAVADORA	EC265828	RAMIRO WALTEROS	4,117,207				Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
EXCAVADORA DE ORUGA							
VIBROCOMPACTADOR							
MOTONIVELADORA	4HD01940	WILSON LACHE	89,842,167				Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	SUA 408	GUILLERMO QUIÑONES	13,921,794			7	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	FIJ 561	OMAR SIERRA	1.049.432.280			7	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña

OBSERVACIONES: Para el caso puntual de la volqueta, se debera indicar el material, # de viajes que fueron transportados en la casilla actividad ejecutada.

RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA JORNADA:

KM INTERVENIDOS	0'329

OBSERVACIONES:	Seha realizado un trabo parcial en la via que conduce del sector pozo seco al batallon de alta montaña, trabajos realizados con dos volquetas las cuales se relacionana en el el formato anterior, una retroexcavdora

CONSORCIO VIAS EL ESPINO
JUAN ANDRES SALAZAR MESA
CONTRATISTA

ING. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA
SUPERVISOR MUNICIPIO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

FORMATO DIARIO DE CONTROL DE MAQUINARIA

MUNICIPIO	EL ESPINO, BOYACÁ		
CONVENIO No.	2057 DE 2023		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	ACTA DE INICIO	2023-05-26

Información del contrato suscrito por el municipio			
CONTRATO No.	No. ELESP –SA-MC- 007 DE 2023	FECHA DE INICIO	2023-09-18
CONTRATISTA			
OBJETO	OBJETO "ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ"		

COORDENADAS	
INICAL LAT,LONG	FINAL LAT, LONG
6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W

CÓD VÍA		NOMBRE DE LA VÍA	SANTA ANA-SAN JOAQUIN - POZO SECO	ADMINISTRADOR	MUNICIPIO EL ESPINO
VEREDA	SANTA ANA	SECTOR	SANTA ANA POZO SECO SAN JOAQUIN	FECHA	2023-10-11

EQUIPO	No. SERIE/PLACA	OPERARIO	IDENTIFICACIÓN	HOROMETRO		TOTAL HORAS	ACTIVIDAD EJECUTADA
				INICIAL	FINAL		
RETROEXCAVADORA	EC265828	RAMIRO WALTEROS	4,117,207				Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
EXCAVADORA DE ORUGA							
VIBROCOMPACTADOR							
MOTONIVELADORA	4HD01940	WILSON LACHE	89,842,167				Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	SUA 408	GUILLERMO QUIÑONES	13,921,794			7	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	FIJ 561	OMAR SIERRA	1.049.432.280			7	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña

OBSERVACIONES: Para el caso puntual de la volqueta, se debera indicar el material, # de viajes que fueron transportados en la casilla actividad ejecutada.

RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA JORNADA:

KM INTERVENIDOS	0'329

OBSERVACIONES:	Seha realizado un trabo parcial en la via que conduce del sector pozo seco al batallon de alta montaña, trabajos realizados con dos volquetas las cuales se relacionana en el el formato anterior, una retroexcavdora

CONSORCIO VIAS EL ESPINO
JUAN ANDRES SALAZAR MESA
CONTRATISTA

ING. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA
SUPERVISOR MUNICIPIO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

FORMATO DIARIO DE CONTROL DE MAQUINARIA

MUNICIPIO	EL ESPINO, BOYACÁ		
CONVENIO No.	2057 DE 2023		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	ACTA DE INICIO	2023-05-26

Información del contrato suscrito por el municipio			
CONTRATO No.	No. ELESP –SA-MC- 007 DE 2023	FECHA DE INICIO	2023-09-18
CONTRATISTA			
OBJETO	OBJETO "ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ"		

COORDENADAS	
INICAL LAT,LONG	FINAL LAT, LONG
6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W

CÓD VÍA		NOMBRE DE LA VÍA	SANTA ANA-SAN JOAQUIN - POZO SECO	ADMINISTRADOR	MUNICIPIO EL ESPINO
VEREDA	SANTA ANA	SECTOR	SANTA ANA POZO SECO SAN JOAQUIN	FECHA	2023-10-12

EQUIPO	No. SERIE/PLACA	OPERARIO	IDENTIFICACIÓN	HOROMETRO		TOTAL HORAS	ACTIVIDAD EJECUTADA
				INICIAL	FINAL		
RETROEXCAVADORA	EC265828	RAMIRO WALTEROS	4,117,207				Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
EXCAVADORA DE ORUGA							
VIBROCOMPACTADOR							
MOTONIVELADORA	4HD01940	WILSON LACHE	89,842,167				Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	SUA 408	GUILLERMO QUIÑONES	13,921,794			5'3	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña
VOLQUETA	FIJ 561	OMAR SIERRA	1.049.432.280			5'3	Mantenimiento y mejoramiento de via San joaquin , pozo seco batallon de alta montaña

OBSERVACIONES: Para el caso puntual de la volqueta, se debera indicar el material, # de viajes que fueron transportados en la casilla actividad ejecutada.

RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DE LA JORNADA:

KM INTERVENIDOS	0'329

OBSERVACIONES:	Seha realizado un trabo parcial en la via que conduce del sector pozo seco al batallon de alta montaña, trabajos realizados con dos volquetas las cuales se relacionana en el el formato anterior, una retroexcavdora

CONSORCIO VIAS EL ESPINO
JUAN ANDRES SALAZAR MESA
CONTRATISTA

ING. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA
SUPERVISOR MUNICIPIO


REGISTRO FOTOGRAFICO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO	**EL ESPINO**		
CONVENIO No.	**2057 DE 2023**		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO PARA FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA	**ACTA DE INICIO**	

Información del contrato suscrito por el municipio			
CONTRATO No.	ELESP-SA-MC-007-2023	**FECHA DE INICIO**	2023-09-18
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS EL ESPINO		
OBJETO	"ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL FIN DE APOYAR LA ATENCION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA DE GUTIERREZ"		

CÓD VÍA		**NOMBRE DE LA VÍA**	Vía La Burrera-Santa-Ana-San Joaquin-Batallon-Pozo Seco	**ADMINISTRADOR**	MUNICIPIO
VEREDA	SANTA ANA	**SECTOR**	Batallon-Pozo Seco	**PERIODO DE REPORTE**	**2/10/2023-09/10/2023**

FECHA	KM INTERVENIDOS	**FOTO INICIAL**	**FOTO FINAL**	**COORDENADAS**	
				INICAL LAT,LONG	**FINAL LAT, LONG**
2023-10-02	0'369			6°31'03"N 72°26'49"W	6°31'12"N 72°26'55"W
2023-10-03	0'232			6°31'03"N 72°26'49"W	6°31'03"N 72°26'49"W

2023-10-04	0'201			6°31'03"N 72°26'49"W	6°31'30"N 72°27'12"W
2023-10-05	0'245			6°31'30"N 72°27'12"W	6°31'35"N 72°27'17"W
2023-10-06	0'220			6°31'35"N 72°27'17"W	6°31'34"N 72°27'22"W

2023-10-09	0'329			6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W
2023-10-10	0'329			6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W
2023-10-11	0'329			6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W
2023-10-12	0'329			6°31'34"N 72°27'22"W	6°31'31"N 72°27'30"W

CONSORCIO VIAS EL ESPINO
JUAN ANDRES SALAZAR MESA
CONTRATISTA

ING. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA
SUPERVISOR MUNICIPIO
