	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 24/10/2023

Señores:
EJE CONTAINERS

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	Adquisición Instalación y Puesta en funcionamiento de un sistema modular adecuado para sala de descanso EQUIPO DE PROTECCION A PERSONAJE (EPP) para el Grupo Protección Alto mando (GRUPA), conforme a la ficha técnica.	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	Cotización valida por 90 días	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Ver Especificaciones Técnicas	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 29 de diciembre de 2023.
	FORMA DE PAGO	Un solo pago con cargo al PAC de diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre 2024 de acuerdo con disponibilidad de recursos. Previo el cumplimiento de los requisitos administrativos y legales pertinentes. De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal en el cual se establecerá.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique). 6. Se realizará verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, así como contravencionales. 7. Formatos jurídicos solicitados a través de la plataforma SECOP II.
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	**1.** RUT **2.** Certificación cuenta bancaria. **3.** Formato creación beneficiario cuenta
VALOR OFRECIDO	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

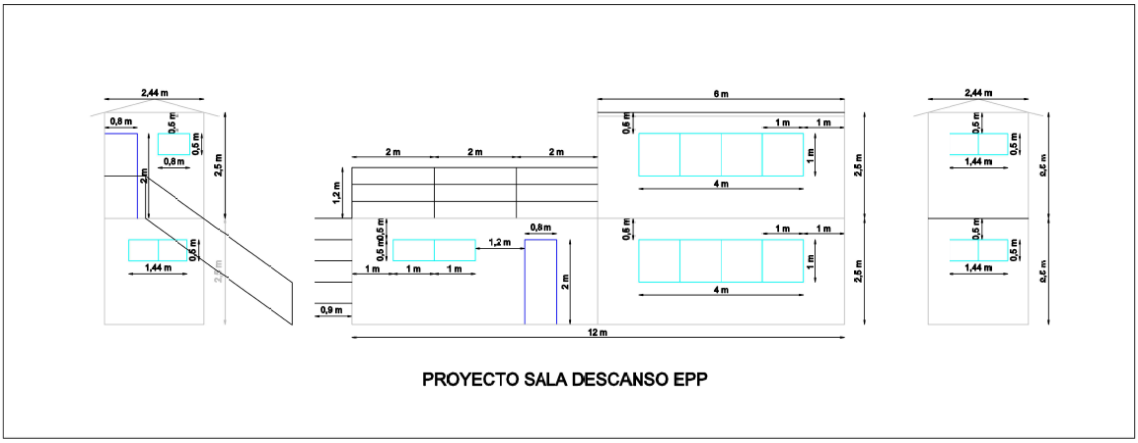
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	El interesado cuenta con un plazo de máximo una semana para presentar la cotización respectiva, la cual debe ser remitida al correo erika.gomez@fac.mil.co o German.sanchez@fac.mil.co a más tardar el día 31/10/2023



MY. IVAN MAURICIO FERREIRA CARDENAS
Firma Gerente Proyecto

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

Ficha Técnica:

FICHA TÉCNICA "ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA MODULAR ADECUADO PARA SALA DE DESCANSO EQUIPO DE PROTECCIÓN A PERSONAJE (EPP) PARA EL GRUPO PROTECCIÓN ALTO MANDO (GRUPA), CONFORME A LA FICHA TÉCNICA."
RUBRO 02-01-01-001-001-04-REC10 AANF-Viviendas viviendas móviles-
 PROYECTO SALA DESCANSO EPP
Adquisición de un sistema modular compuesto por (3) tres contenedores nuevos que incluyan escaleras externas para el segundo piso, elaborado con tubería estructural cuadrada calibre 2.0 mm o 2.5 mm , las paredes en lamina cool rolled de 20 mm con dobleces iguales a las de un contendor marítimo, soldadura con buenos terminados y realizada por soldadores certificados, los contenedores deben ser totalmente herméticos, de tal forma que no tengan ningún tipo de acceso a roedores, vectores o goteras que afecten la estructura y provoquen algún tipo de falla o afectación en la misma.

ITEM	DESCRIPCIÓN
Dimensiones por Contenedor	Longitud Externa: Largo 6 mts Ancho 2,44 mts Alto 2,5 mts
Puertas	(2) dos de los contenedores deben contar con puerta de apertura hacia exterior de 1 hoja, las cuales deben tener esquinas cuadradas, cada puerta con cuatro bisagras de acero inoxidable de bronce y cerradura con manija, marcos en tubería rectangular de 3 x 1 ½ calibre 18.

	Medidas sin marco: 2 mts de alto x 0,8 mts de ancho.
Ventanas	Las Unidades deben contar con ventanas corredizas, los marcos se realizarán en tubería rectangular de 3 x 1 ½ calibre 18, vidrio laminado de 6mm (película opalizada para las ventanas grandes). Medidas: De acuerdo con el diseño guía para la unión modular.
Piso	Láminas de fibrocemento calibre 14 mm, diseñadas y aprobadas para el uso requerido, sobre módulos metálicos estructurales autoportantes. Recubrimiento final de piso con laminado en madera PVC de tráfico pesado, antideslizante y antibacterial, debe incluir guarda escoba en PVC plástico de mediacaña de aproximadamente 6 cm.
Cielo Raso	Con perfilería a la vista de color negro.
Pintura	Los exteriores e interiores deben estar pintados en su totalidad con anticorrosivo línea epóxica y anticorrosivo 2 en 1 respectivamente, el interior acabado con pintura color blanco y para el exterior pintura resistente a la intemperie (Pintura Epóxica) acabado color gris claro.
Techo	El contenedor superior deberá contar con un techo de inclinación acorde a la instalación que permita la caída de agua a un canal, para conducir el agua lluvia y no afecte las paredes exteriores, ni la parte superior del mismo.

Escalera	Escalera metálica de acceso a segundo nivel, con baranda lateral en tubo metálico, peldaños con huella en malla expandida, con protección anticorrosiva y esmalte negro.
Terraza	Barandas: En tubo metálico con protección anticorrosiva y esmalte negro. Piso: PISO DECK WPC, superficie antideslizante, resistente a la humedad, luz solar y ataque de insectos.
Sistema Eléctrico	Sistema eléctrico instalado con tubería conduit metálica, 3 luces led (por cada modular) y tres interruptores (1 por cada modular), 12 puntos de corriente doble (04 por cada modular) de 110 voltios con polo a tierra, debe tener un tablero de distribución, con un (1) plug bifásico externos con amperaje suficiente para realizar la conexión eléctrica de los contenedores con el punto existente en el sitio de instalación. La instalación deberá cumplir con las normas vigentes RETIE. Nota: Para la distribución de los puntos de corriente se debe tener en cuenta la ubicación de los televisores y hornos microondas.
Transporte Cargue y Descargue	El oferente se compromete a suministrar el transporte de la unidad modular compuesta por 3 contenedores al sitio estimado, previendo toda la logística para su ubicación, coordinando previamente con el supervisor del contrato el tipo de transporte y la forma de descargue, teniendo en

	cuenta la infraestructura, espacio y vías con las que cuenta la unidad.
Montaje	El oferente deberá suministrar e instalar (8) ocho polines en concreto armado, los cuales deben soportar el peso vivo, más el peso muerto de la unidad modular compuesta por los 3 contenedores, en el sitio designado por el supervisor del contrato.
Instalación	El oferente se compromete a entregar la unidad modular compuesta por los 3 contenedores instalados en el sitio designado por el supervisor del contrato en la cuidad de Bogotá instalaciones completo militar CAN ubicado CRA 54 # 26-25.

MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA SISTEMA MODULAR ADECUADO PARA SALA DE DESCANSO EQUIPO DE PROTECCIÓN A PERSONAJE (EPP) PARA EL GRUPO PROTECCIÓN ALTO MANDO (GRUPA), CONFORME A LA FICHA TÉCNICA.











El oferente se compromete a entregar todo el mobiliario instalado y funcionando.

RUBRO: 02-01-01-004-007-03-REC10 Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Televisores	2 (dos) televisores de 50 pulgadas, tipo pantalla QLED, diseño de pantalla plana, con puertos HDMI y USB, Smart TV.

RUBRO: 02-01-01-003-008-01-1-REC10 AANF-Asientos

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Sofás	9 (nueve) sofás de 3 puestos, estructura en madera sajo, patas flor morado, espuma rosada densidad 26, en tela vinílica con diseño tipo cuero composición PVC, color gris oscuro o negro Medidas: 1.80 largo x 80cm ancho x 90 cm alto.
Sillas Tipo Barra	18 (dieciocho) sillas tipo barra en madera, con asiento tapizado en tela vinílica con diseño tipo cuero composición pvc, color gris oscuro o negro

RUBRO: 02-01-01-003-008-01-6-REC10 Partes y piezas de muebles

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Barra Comedor Lineal	09 (nueve) secciones lineales con estructura metálica y soporte en tablero MDP con recubrimiento melaminico, color madera de gran resistencia, calibre mínimo de 25 mm. Medidas: 1,20 mts de largo x 40 cm de ancho.
Repisas Microondas	

	3 (tres) repisas flotantes en color madera, con soportes metálicos y con una resistencia mínima de 35 Kg. Medidas Mínimas: 60 cm de largo x 40 cm de ancho (Puede variar de acuerdo con el tamaño del microondas que se adquiera).
RUBRO: 002-01-01-003-008-01-4-REC10 Otros muebles n. C. P.	
ELEMENTO	**ELEMENTO**
Comedor para Exterior	Comedor para exterior conformado por 1 (una) Mesa y 4 (cuatro) sillas elaboradas en aluminio fundido, 01parasol elaborado en lona poliéster con tubo en acero, con perilla para recoger, con su respectiva base en hierro colado resistente al exterior.
RUBRO: 02-01-01-004-004-08- REC10 Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	
ELEMENTO	**DESCRIPCIÓN**
Hornos Microondas	3 (tres) hornos microondas, capacidad mínima 31 litros, de potencia mínima de 1000 W, voltaje 120 voltios.
