
MATERIALES EN SITIO	MS
REVISION GENERAL	RG
INICIO ACTIVIDAD	IA
DESARROLLO ACTIVIDAD	X
FIN ACTIVIDAD	FA

CRONOGRAMA - PERGOLAS 8VO PISO SEDE SUPERSERVICIOS

Ítem	Suministro e instalación de estructura con cubierta con pendiente en VIDRIO			Días Hábiles		
No.	Descripción	Unidad	Cant	Inicio	Fin	Duración
1	REPLANTEO Y LOCALIZACION TERRAZA FRONTAL Y POSTERIOR	UND	1	9-oct	3-oct	2 dias
2	ALISTAMIENTO DE MATERIALES,HERRAMIENTA Y ENVIO PARCIAL DE COMPONENTES ESTRUCTURALES	UN	1	9-oct	13-oct	5 dias
3	TERRAZA POSTERIOR -INSTALACION DE PLATINAS DE COLUMNAS Y APOYOS DE MURO PARA PERFILES ELEVADOS	M2	120,32	9-oct	14-oct	6 dias
3,1	TERRAZA POSTERIOR-INSTALACION DE COLUMNAS .	M2	120,32	13-oct	25-oct	8 dias
3,2	TERRAZA POSTERIOR-SUNISTRO E INSTALACION DE VIGAS,VIGUETAS,RIOSTRAS Y DEMAS ELEMENTOS ELEVADOS SEGUN DISENO ESTRUCTURAL	M2	120,32	24-oct	7-nov	13 dias
3,3	TERRAZA POSTERIOR -FABRICACIÓN DE VIDRIOS TEMPLADOS E INSTALACION DE PELICULA DE PROTECCION UV	M2	120,32	20-oct	27-oct	9 dias
3,4	TERRAZA POSTERIOR-INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO	M2	120,32	28-oct	11-nov	10 dias
4	TERRAZA FRONTAL-INSTALACION DE PLATINAS DE COLUMNAS Y APOYOS DE MURO PARA PERFILES ELEVADOS	M2	111,52	19-oct	26-oct	7 dias
4,1	TERRAZA FRONTAL-INSTALACION DE COLUMNAS .	M2	111,52	25-oct	16-nov	12 dias
4,2	TERRAZA FRONTAL-SUNISTRO E INSTALACION DE VIGAS,VIGUETAS,RIOSTRAS Y DEMAS ELEMENTOS ELEVADOS SEGUN DISENO ESTRUCTURAL	M2	111,52	17-nov	30-nov	13 dias
4,3	TERRAZA FRONTAL -FABRICACION,TEMPLADO Y E INSTALACION DE PELICULA PROTECCION UV	M2	111,52	22-nov	3-dic	12 dias
4,4	TERRAZA FRONTAL-INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO	M2	111,52	4-dic	10-dic	7 dias
5	ASEO Y LIMPIEZA	UND	2	9-dic	10-dic	2 dias
6	ENTREGA INFORMES PARCIALES (IP)	UN	2		11-dic	1 DIA
7	ENTREGA INFORME FINAL (IF)	UN	1		11-dic	1 DIA

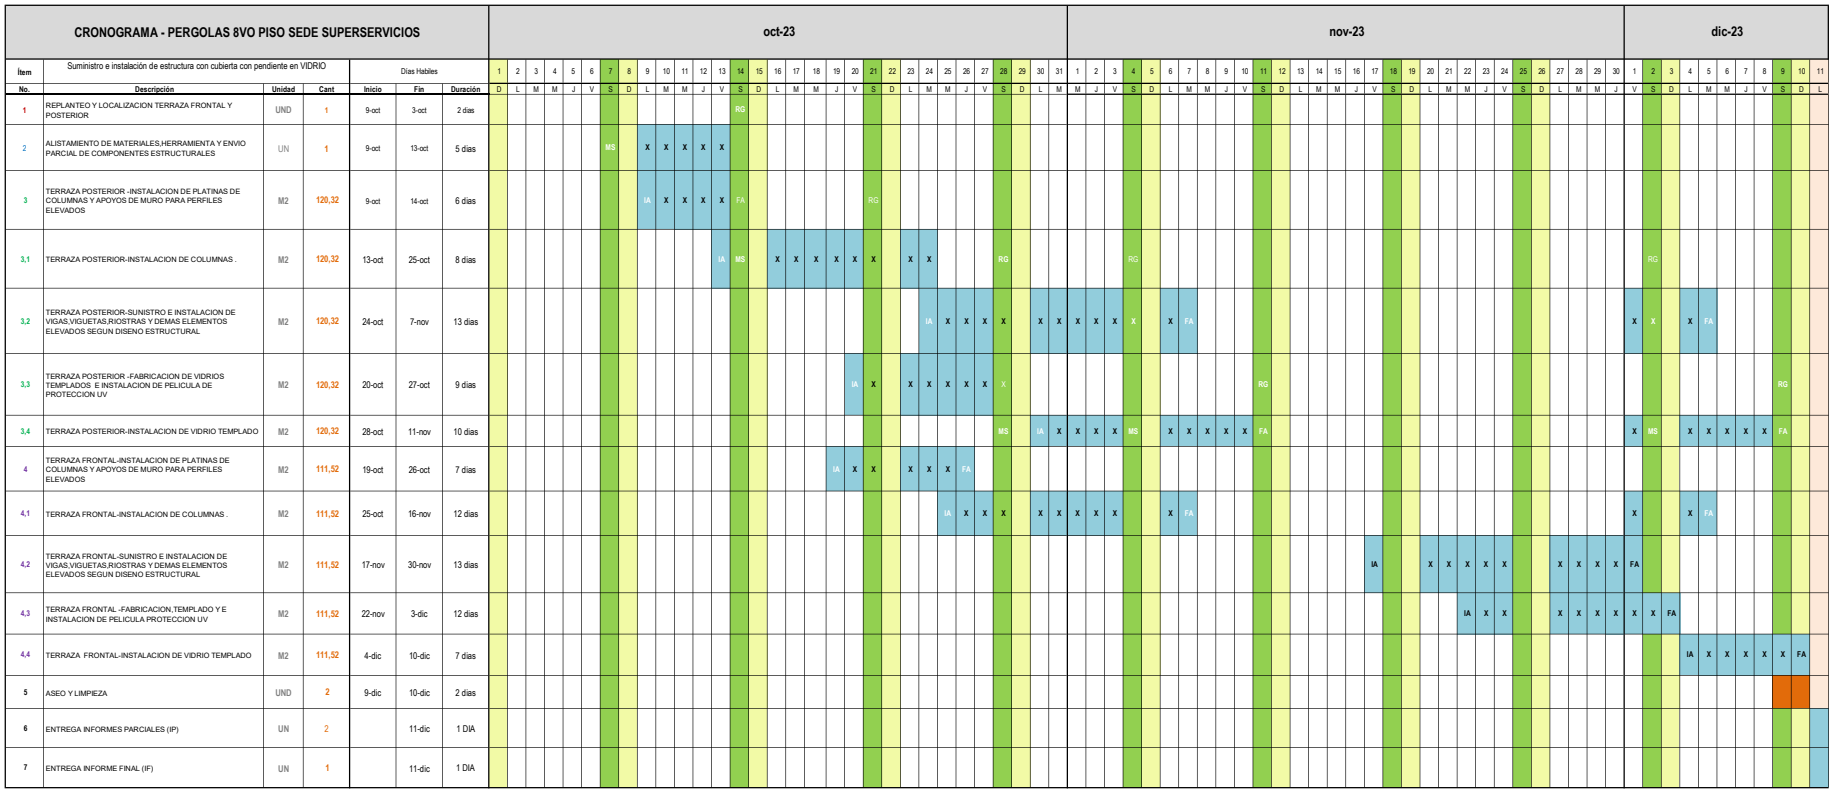

TIEMPO EJECUCION ACTIVIDAD
DÍA NO HABIL
ENTREGA FINAL (EF)
MEDIO TIEMPO

NOTA 1:	Para la ejecución de las actividades, se plantea la opción de desarrollarlas los días no habiles, con el fin de obtener el rendimineto deseado.
NOTA 2:	El tiempo descrito para las actividades y su desarrollo, estan sujetos a operacion y logistica interna de la obra y a las condiciones climaticas.
