Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

de Occidente S.A.S
INGENIERÍA Y DISEÑO

IYD – 01

ACTA DE REUNION

Entidad: Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura,

Contrato No.: *CE 31-2023*

CONSECUTIVO ACTA	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
01	9-10-2023	9:00	10:00	Palacio de Justicia Fanny Gonzalez

P

Observaciones y definiciones acerca del proyecto CE-30-2022 correspondiente a la modernización de la iluminación de las oficinas del palacio de justicia FANNY GONZALEZ FRANCO de la ciudad de Manizales piso 2 y 3 .

RESPONSABLE DE LA REUNION
ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
ING ALEXANDER BEDOYA	ING DIRECTOR DE INTERVENTORIA IYD
ING WILLIAM SANCHEZ N	ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD
ING WILLIAM HERNANDEZ	ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ	ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL
ING RICARDO MONCAYO SANTACRUZ	ING DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO RJM
ING JORGE ORLANDO MOLINA	ING RESIDENTE CONSORCIO RJM
ING GERARDO MONCAYO	ING CONSORCIO RJM
FERNANDO GALLEGO	SISO CONSORCIO RJM

AGENDA

1.

DESARROLLO DE LA REUNION

TEMA

1. Se inicia la reunión mostrando tranquilidad por el inicio del contrato, dada la firma del acta de inicio , se ha visto avance en la logística y contratación de personal profesional y técnico idóneo en el proyecto, el contratista Consorcio RJM 1 2023 .argumenta que se ha realizado en el tiempo transcurrido una organización documental , contratación del personal idóneo establecido en el pliego de condiciones y la revisión de ingeniería en conjunto con la interventoría para dar el aval de la consecución del suministro de luminarias , sensores provolt y botoneras.

Powered by CamScanner

2. Se socializo el cronograma de trabajo en conjunto con los supervisores de la Rama Judicial, la interventoría, administración del edificio y el contratista, dando su visto bueno para el inicio de las obras el 03 de Octubre..
3. Se coordina desde la interventoría él envió de la siguiente información a los supervisores de la rama: 1 Listado del personal del contratista e interventoría. 2 Solicitud del requerimiento de espacio en el parqueadero para dar inicio a las obras. 3 Chek list del personal profesional del consorcio y la interventoría, cumpliendo con el pliego de condiciones.
4. Se socializa el cronograma de obra y se socializa la llegada de luminarias al proyecto en base a la información dada por el proveedor.
5. En la verificación de los diseños y mejoras encontradas al mismo se deben de tener muy en cuenta los APU"S que cambien para su posterior estudio y aprobación por parte de la interventoría y la Rama Judicial. .
6. Se socializa la llegada de material como cable de control y eléctrico y materiales de obra civil necesarios para el proyecto y la llegada de luminarias.
7. Se solicita al consorcio , exponer el avance en la disposición de uso final de los residuos del contrato para dar cumplimiento al alcance ambiental.

TAREAS Y/O COMPROMISOS		
TAREA Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
Socializar el documento de proveedores de equipos y fechas de entrega	Consorcio RJM 1	16-10-2023-Pendiente
Socializar fichas técnicas de Luminarias y sensores	Consorcio RJM 1	16-10-2023-Pendiente
Socializar contacto de colombianet para la recolección de la disposición final de luminarias, para el cumplimiento ambiental.	Consorcio RJM 1	16-10-2023-Pendiente

FIRMAS		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING ALEXANDER BEDOYA	ING DIRECTOR DE	

Powered by CamScanner

	INTERVENTORIA IYD	
ING WILLIAM SANCHEZ N	ING RESIDENTE INTERVENTORIA IYD	
ING WILLIAM HERNANDEZ	ING SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ARQ RONEY YALLY BARTOLO FLOREZ	ARQ SUPERVISOR RAMA JUDICIAL	
ING RICARDO MONCAYO SANTACRUZ	ING DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO RJM	
ING JORGE ORLANDO MOLINA	ING RESIDENTE CONSORCIO RJM	
FERNANDO GALLEGO	SISO CONSORCIO RJM	

Jenifer Jimenez Martinez SySO interventoria

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME EJECUTIVO 1 -1 DE OCTUBRE AL 9 DE OCTUBRE

RESUMEN GERENCIAL


I&D de Occidente S
INGENIERÍA Y DISE
NIT. 900448366-9

INFORME DE INTERVENTORIA No.:	1	FECHA DEL INFORME:	lunes, 09 de octubre de 2023

CONTRATO DE OBRA


CE-31-2023

Objeto:	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS Las obras de ejecución de la primera fase de la modernización energética del edificio de la Dirección Seccional y Torre Juzgados Penales De Manizales Caldas, que comprende la modernización de la subestación eléctrica, sistema de apantallamiento y sistema de puesta a tierra.	
Contrato No:		CE-31-2023
Contratista:		CONSORCIO RMJ 1
Nit:		
Valor Inicial:	$	526.202.419
Adición 1	$	-
Adición 2	$	-
Valor total del contrato:	$	526.202.419
Plazo		60
Fecha de inicio		lunes, 02 de octubre de 2023
Fecha de vencimiento:		jueves, 30 de noviembre de 2023
Plazo total del contrato:		60

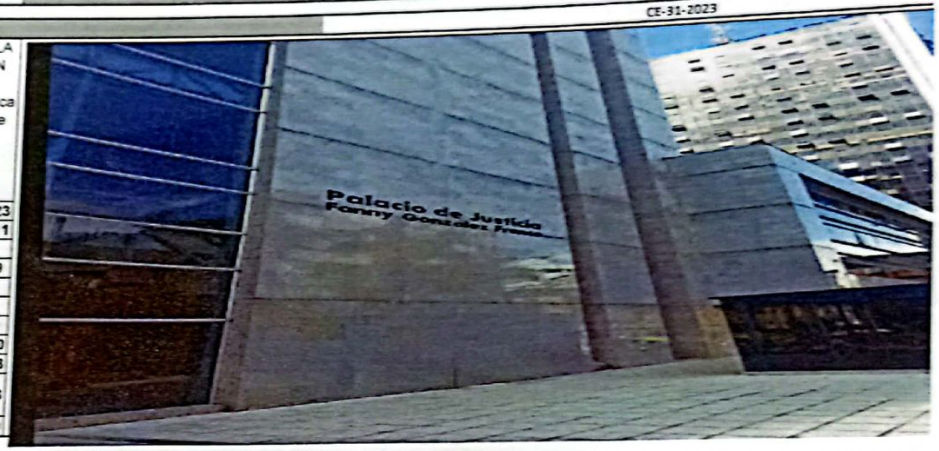

AVANCES DEL CONTRATO

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

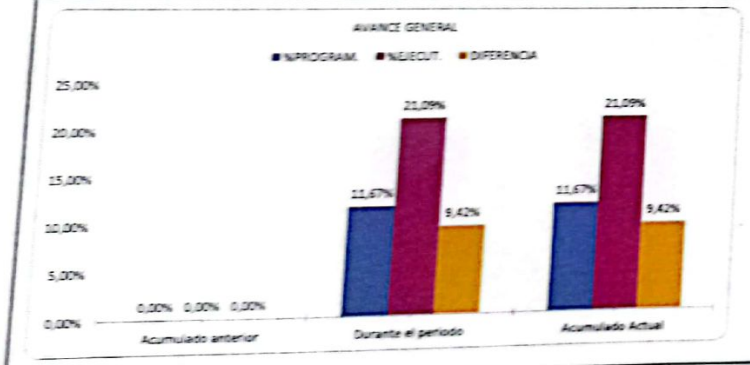

	%PROGRAM.	%EJECUT.	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el período	11,67%	21,09%	9,42%
Acumulado Actual	11,67%	21,09%	9,42%

EJECUCION EN PLAZO

CONTRACTUAL	EJECUCION	%
60	7	11,67

DATOS FINANCIEROS

Vr. CONTRATO:	$ 526.202.419,00
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 0,00
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 526.202.419
Vr. ANTICIPO:	$ 0
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	COSTO DIRECTO	AIU	IVA	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN
1	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
2	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
3	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
6	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
7	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
8	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
9	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
10	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
11	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
12	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
13	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
14	$ 0	$ 0		$ 0	0,00%
TOTALES	$0	$0		$0	0,00%

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Valor facturado a la fecha es de:	$ 0	Equivalente al:	0,00
El valor por ejecutar a la fecha es de:	$ 526.202.419	Equivalente al:	100,0

SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN POR CAPITULOS

Powered by CamScanner
