LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Ejemplares de este documento han sido enviados a las siguientes dependencias:

	DEPENDENCIAS	No. COPIAS
Original Impreso	Secretaría de Vivienda y Territorio, Gobernación del Caldas.	1
Copia 1 Medio Digital	Secretaría de Vivienda y Territorio, Gobernación del Caldas.	1

CUADRO DE CONTROL

VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Versión inicial	18 de Agosto de 2023	Interventoría de Obra Mary Gamarra Carvajal _____ Firma	Clara Lucía Gutiérrez Urueña Ingeniero secretaria de Vivienda y Agua _____ Firma	Ingeniero secretaria de Vivienda y Agua _____ Firma

COPIA CONTROLADA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN..... 2
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... 2
1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 4
2. RESUMEN EJECUTIVO..... 5
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA..... 5
2.2 RESUMEN AVANCE FISICO..... 5
2.3 RESUMEN INVERSIONES..... 16
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA..... 17
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL..... 17
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA..... 18
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL..... 18
4.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS..... 19
4.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN..... 20
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS..... 21
6. AVANCE DE OBRA E INVERSIONES..... 21
7. PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES..... 21
7.1 PERSONAL PROMEDIO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA..... 21
7.2 PERSONAL PROMEDIO EMPLEADO POR LA INTERVENTORÍA..... 21
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 22
9. ANEXOS..... 23
9.1. INFORME FOTOGRAFICO 24
9.2. CORRESPONDENCIA 27
9.3. COPIA MEDIO MAGNETICO 30

1. INTRODUCCIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El Municipio de Neira en su territorio tiene una extensión de 364 km2, que equivale al 4.61% del total departamental. El municipio se divide en 16 sectores o barrios en la zona urbana (Centro Histórico, La Cuchilla, El Cementerio, La Unión, Los Pinos, Plaza de Ferias, La Variante, La Castellana, Ciudad Jardín, La Ilusión, Los Robles, Carlos Parra, La Divisa, Panorama, Camino La Ladrillera, Camino al Cementerio) y 52 veredas (Aguacatal, Alto Ceilán, Armenia, Bajo Ceilán, Buenos Aires, Cantadelicia, Cholo, Chupaderos, Cuba, El Cardal, El Corozo, El Crucero, El Descanso, El Higuerón, El Jardín, El Laurel, El Limón, El Río, El Yunque, El Zanjón, El Guineo, El Bohío, El Bosque, Fonditos, Guacaica, Hoyo Frío, Juntas, La Cristalina, La Esperanza, La Felicia, La Isla, La Gregorita, La Partida de la Mesa, Las Penas, Llano Grande, Los Zainos, Manga Bonita, Morro Azul, Palermo, Pan de azúcar, Pueblo Rico, Pueblo Viejo, Quebrada Negra, Neira, San Pablo, Santa Isabel, Shangai, Tareas, Tapias, Trocaderos, Verdún).

La administración municipal decide priorizar dentro de su plan de acción los ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO MUTIVEREDAL DEL MUNICIPIO DE NEIRA. Debido a su importancia y necesidad se plantea la ejecución del proyecto por Fases, esta primera fase se prioriza debido la enorme necesidad de contar con servicio de agua potable de algunas veredas ubicadas en la zona occidental del municipio, correspondiente a las zonas cálidas del municipio cota más baja cercana a los 1000 m.s.n.m., veredas y sectores en donde a lo largo de su historia, sus fuentes abastecedoras son altamente golpeadas por el fenómeno del niño, reduciéndose sus caudales de tal manera que se deben programar racionamiento del servicio y donde, de acuerdo con la caracterización realizada, la comunidad tiene grandes expectativas respecto a contar con el servicio de agua potable. Estos aspectos se observan reflejados en la Caracterización de la Población realizada por el Área de Gestión Social – PDA.

Los sistemas de acueducto que existen en la zona son soluciones dispersas en su mayoría construidos con finalidad primaria de tipo productivo y secundariamente para consumo humano por lo cual no se encuentran eficientes sistemas para tal fin, siendo lo usual la compra de agua que se almacena en las propiedades.


El proyecto CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE NEIRA – FASE 1 busca, a partir de la Planta de tratamiento de agua potable municipal que sirve el casco urbano, prestar el servicio de acueducto en la zona occidente municipio de Neria en las siguientes veredas: El rio, La Isla, San José, Zanjón, Laurel, corozo, Llano grande, el Higuerón y los sectores como Juntas, Palermo, la estrella, el 41, zonas donde se han asentado importante número de viviendas. Adicional a lo anterior la administración municipal manifiesta que esta zona tiene un potencial de desarrollo importante debido a las obras que se están ejecutando de la concesión Pacifico III, dicho corredor vial conectará el centro del país con el puerto de Buenaventura, lo que atraerá un polo de desarrollo en esta zona rural que requiere contar con los servicios públicos como es el acceso al agua potable.

La población beneficiada por el proyecto se encuentra al occidente del casco urbano y se compone de las siguientes veredas: Llano grande, El Higuerón y los sectores como Juntas, Palermo, La Estrella, zonas donde se han asentado un importante número de viviendas.

Zona	Viviendas	Sector	Viviendas
Condominio Bosque de la Florida 1	43	Palermo	254
Condominio Bosque de la Florida 2	54		
Florida del rio	110		
Palermo	47		
Macadamia 1	55	Estrella	170
Macadamia 2	97		
Baru	18		
Sector Tapias – Irra (proyectado)	25	Tapias - Irra	25
Higueron	20	Higuerón	20
Llano grande	25	Llano grande	25
Juntas	30	Juntas	30
TOTAL	**524**		**524**

524	VIVIENDAS CATASTRO 2022
SE ESTIMAN 4 HABITANTES POR VIVIENDA	
TOTAL POBLACION 2022 (HAB)	2096

Mapa político con la Cobertura de veredas proyectada en la fase 1.

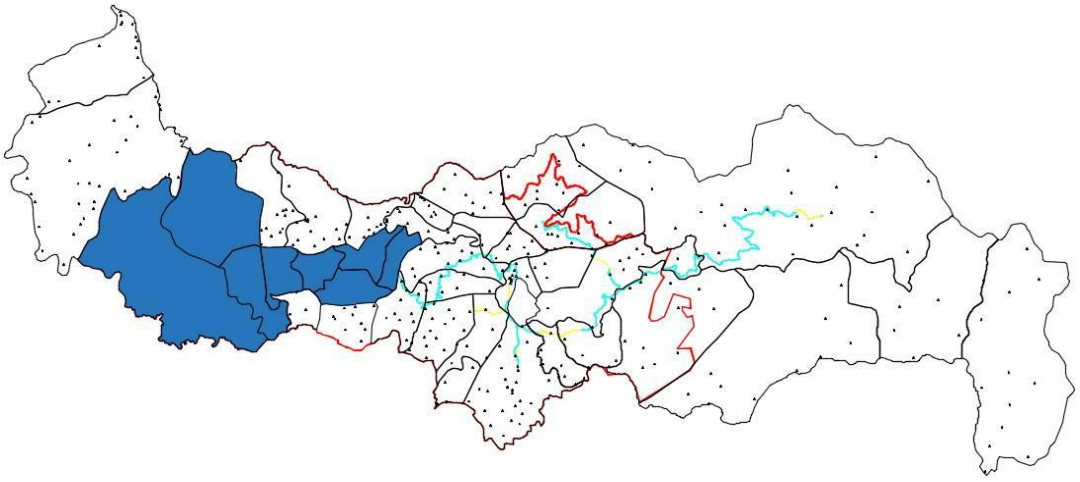

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El alcance del proyecto se localiza en el municipio de Neira.



Ilustración 1. Ubicación del municipio de Neira en Colombia y Caldas. Fuente: Wikipedia.

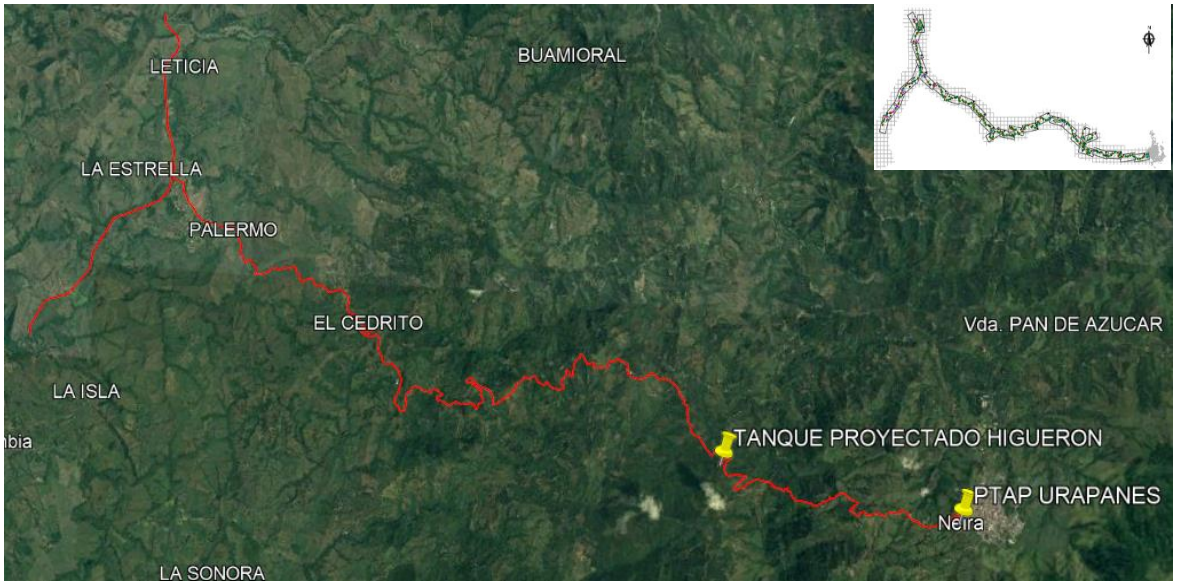


Ilustración 2. Mapa satelital Neira con esquema de conducción del acueducto multiveredal Fase I

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

- NÚMERO DE CONTRATO: LP-SV-002-2023--08052023-0824
- OBJETO DEL CONTRATO **"***CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE NEIRA FASE I".*
- VALOR CONTRATO: $ 5.316'752.739,83 COP
- FECHA DE INICIACIÓN: Aun sin firmar acta de inicio
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 MESES.
- VALOR FACTURADO A LA FECHA: $ 0 COP

2.2. RESUMEN AVANCE FÍSICO.

A la fecha de corte del presente informe 18 de agosto de 2023, no se ha realizado ninguna de las actividades del componente físico esto debido a que la firma del acta de inicio de obra se pospuso hasta el 14 del presente mes.

Cuadro N.º 01. Cantidades de obra ejecutadas en el presente período.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	
CAP-1	**PRELIMINARES**				**$ 0**	**0**
PDA 32-080	Localización y Replanteo Infraestructura, Incluye Comisión de Topografía.	M2	225,00	$ 2.600	**$ 585.000**	**0**
PDA 1-085	Localización y Replanteo Redes, Incluye Comisión de Topografía.	Ml	25860,00	$ 2.400	**$ 62.064.000**	**0**
PDA 1-049	Suministro, Transporte e Instalación de Cerramiento en Yute H=2,10mts.	Ml	80,00	$ 9.950	**$ 796.000**	**0**
PDA 1-054	Suministro, Transporte e Instalación Señal Preventiva Reglamentaria.	Un	12,00	$ 169.300	**$ 2.031.600**	**0**
PDA 1-056	Suministro, Transporte e Instalación Barrera con Bombones en Guadua y Base de Concreto (Incluye cinta de Señalización).	Ml	4500,00	$ 5.990	**$ 26.955.000**	**0**
PDA 1-058	Suministro, Transporte e Instalación de Puente Peatonal Provisional en Madera.	Ml	42,00	$ 38.300	**$ 1.608.600**	**0**
PDA 1-061	Suministro, Transporte e Instalación de Cordón Suelo	Ml	90,00	$ 5.300	**$ 477.000**	**0**

	Cemento para Control de Aguas Lluvias.					
PDA 1-044	Descapote Mecánico e=0,20mts (Sin retiro).	M2	225,00	$ 16.200	**$ 3.645.000**	**0**
PDA 1-045	Nivelación y Limpieza (Sin retiro).	M2	225,00	$ 5.100	**$ 1.147.500**	**0**
					$ 0	**0**
CAP-2	**DEMOLICIONES**				**$ 0**	**0**
PDA 29-029	Demolición de Placa de Contrapiso hasta h=0,15.	M2	63,00	$ 21.600	**$ 1.360.800**	**0**
					$ 0	**0**
CAP-3	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 0**	**0**
PDA 2-001	Excavación en Zanja Material Común 0,00-2,00 m.	M3	7144,87	$ 23.292	**$ 166.418.312**	**0**
PDA 2-004	Excavación en Zanja Material Conglomerado 0,00-2,00 m.	M3	3089,07	$ 31.300	**$ 96.687.891**	**0**
PDA 2-007	Excavación en Zanja Material Roca 0,00-2,00 m con explosivos.	M3	102,96	$ 293.800	**$ 30.249.648**	**0**
PDA 2-012	Excavación Manual para Estructuras - Material Conglomerado de 0,00-2,00m	M3	12,00	$ 27.950	**$ 335.400**	**0**
PDA 2-022	Conformación de Taludes en Tierra.	M3	6,00	$ 23.192	**$ 139.152**	**0**
PDA 2-031	Suministro, Transporte e Instalación Entibado Horizontal/Vertical con Tablero 1,40x0,70.	M2	154,00	$ 33.660	**$ 5.183.640**	**0**
PDA 2-050	Relleno Compactado con Material Seleccionado proveniente de la Excavación.	M3	9309,60	$ 23.000	**$ 214.120.800**	**0**
PDA 2-053	Relleno Compactado con Material de Préstamo.	M3	1034,40	$ 56.800	**$ 58.753.920**	**0**
					$ 0	**0**
CAP-4	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y SOBREACARREOS**				**$ 0**	**0**
PDA 2-032	Retiro de Material Sobrante en Vehículo Automotor, Cargue Manual.	M3	859,80	$ 30.515	**$ 26.236.797**	**0**
PDA 2-057	Repaleo Manual (Regada de Material).	M3	258,60	$ 6.524	**$ 1.687.106**	**0**
PDA 1-088	Sobreacarreo en Vehículo Automotor con cargue Manual.	M3	66,00	$ 35.351	**$ 2.333.166**	**0**
PDA 1-083	Sobreacarreo en Vehículo No Automotor al Hombro, por cada 100 metros.	M3	76,00	$ 30.896	**$ 2.348.096**	**0**

PDA 1-082	Sobreacarreo en Vehículo no Automotor de Tracción Animal. Carga Max 125 Kg. Hasta 500 Mts.	M3	54,00	$ 94.100	**$ 5.081.400**	**0**
					$ 0	**0**
CAP-5	**AFIRMADO, BASES Y SUBBASES**				**$ 0**	**0**
PDA 4-013	Suministro, Transporte e Instalación Afirmado Compactado para Estructuras. (transporte hasta sitio de instalación)	M3	29,80	$ 201.162	**$ 5.994.628**	**0**
PDA 2A-014	Suministro, Transporte e Instalación Sustitución con Afirmado Compactado. (transporte hasta sitio de instalación)	M3	12,00	$ 201.162	**$ 2.413.944**	**0**
PDA 3-038A	Suministro, Transporte e Instalación Encamado de Arena P/Acueducto (Incluye Extendida y Compactación)	M3	258,60	$ 79.306	**$ 20.508.532**	**0**
					$ 0	**0**
CAP-6	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 0**	**0**
PDA 4-003	Suministro, Transporte e Instalación Polietileno Cal. 6 (Impermeabilización Piso). (transporte hasta sitio de instalación)	M2	160,00	$ 7.000	**$ 1.120.000**	**0**
PDA 5-061	Suministro, Transporte e Instalación Losa de Cimentación Concreto 28 Mpa 4000 PSI. (transporte hasta sitio de instalación)	M3	22,98	$ 905.000	**$ 20.796.900**	**0**
PDA 5-054	Suministro, Transporte e Instalación Cinta PVC V 15cm, para Juntas. (transporte hasta sitio de instalación)	Ml	36,00	$ 30.973	**$ 1.115.028**	**0**
PDA 5-065	Suministro, Transporte e Instalación Muro en Concreto 28Mpa - 4000 PSI. (transporte hasta sitio de instalación)	M3	38,88	$ 1.189.711	**$ 46.255.964**	**0**
PDA 5-108	Suministro, Transporte e Instalación Chaflán en Concreto 28Mpa - 4000 PSI. (transporte hasta sitio de instalación)	Ml	36,00	$ 47.883	**$ 1.723.788**	**0**
PDA 5-011	Suministro, Transporte e Instalación Placa de Contrapiso en Concreto e=0,15, 21Mpa - 3000 PSI. Tipo Invias (transporte hasta sitio de instalación)	M2	63,00	$ 72.000	**$ 4.536.000**	**0**

PDA 5-015	Suministro, Transporte e Instalación Viga Aérea en Concreto 28Mpa - 4000 PSI. (transporte hasta sitio de instalación)	M3	2,21	$ 1.293.411	**$ 2.858.438**	**0**
PDA 5-016	Suministro, Transporte e Instalación Viga Cimentacion en Concreto 28Mpa - 4000 PSI. (transporte hasta sitio de instalación)	M3	5,48	$ 905.000	**$ 4.959.400**	**0**
PDA 5-017	Suministro, Transporte e Instalación Zapata en Concreto 28Mpa - 4000 PSI. (transporte hasta sitio de instalación)	M3	4,80	$ 890.000	**$ 4.272.000**	**0**
PDA 5-030	Suministro, Transporte e Instalación Placa Maciza Aérea Concreto 28Mpa - 4000 PSI. (transporte hasta sitio de instalación)	M2	76,59	$ 170.335	**$ 13.045.958**	**0**
PDA 5-068	Suministro, Transporte e Instalación Ménsula de Apoyo en Concreto 28 Mpa - 4000 PSI. (transporte hasta sitio de instalación)	M3	0,80	$ 1.241.580	**$ 993.264**	**0**
PDA 6-034	Suministro, Transporte e Instalación Anclaje Epóxico 1/2"-5/8" L=15cm (Incluye Perforación y Adhesivo Epóxico). (transporte hasta sitio de instalación)	Un	50,00	$ 19.200	**$ 960.000**	**0**
					$ 0	**0**
CAP-7	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 0**	**0**
PDA 32-138	Suministro, Transporte e Instalación Acero de Refuerzo 60.000 PSI (Incluye Corte y Figurado). transporte hasta sitio de instalación	Kg	6690,59	$ 7.600	**$ 50.848.458**	**0**
					$ 0	**0**
CAP-8	**INSTALACIONES ACUEDUCTO**				**$ 0**	**0**
PDA 25-001A	Suministro, Transporte e Instalación Tubería Polietileno 63mm PE 100/PN 10 RDE 17 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	617,00	$ 22.765	**$ 14.046.005**	**0**
PDA 25-001B	Suministro, Transporte e Instalación Tubería Polietileno 63mm PE 100 / PN 12,5 RDE 13,6 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	550,00	$ 25.600	**$ 14.080.000**	**0**

PDA 25-001D	Transporte e Instalación Tubería Polietileno 110mm PE 100 / PN 16 RDE 11 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	3810,00	$ 65.706	**$ 250.339.860**	**0**
PDA 25-001E	Suministro, Transporte e Instalación Tubería Polietileno 63mm PE 100 / PN 20 RDE 9 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	1253,00	$ 32.149	**$ 40.282.697**	**0**
PDA 25-001F	Suministro, Transporte e Instalación Tubería Polietileno 63mm PE 100 / PN 25 RDE 7,4 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	630,00	$ 37.657	**$ 23.723.910**	**0**
PDA 25-001G	Suministro, Transporte e Instalación Tubería Polietileno 63mm PE 100 / PN 8 RDE 21(Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	880,00	$ 30.822	**$ 27.123.360**	**0**
PDA 25-001H	Transporte e Instalación Tubería Polietileno 110mm PE 100 / PN 20 RDE 9 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	4370,00	$ 75.526	**$ 330.048.620**	**0**
PDA 25-001I	Transporte e Instalación Tubería Polietileno 110mm PE 100 / PN 25 RDE 7,4 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	2886,00	$ 92.318	**$ 266.429.748**	**0**
PDA 25-001J	Transporte e Instalación Tubería Polietileno 110mm PE 100 / PN 12,5 RDE 13,6 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	2911,00	$ 55.428	**$ 161.350.908**	**0**
PDA 25-001K	Transporte e Instalación Tubería Polietileno 110mm PE 100 / PN 10 RDE 17 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	2230,00	$ 47.059	**$ 104.941.570**	**0**
PDA 25-001L	Transporte e Instalación Tubería Polietileno 110mm PE 100 / PN 8 RDE 21 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	4774,00	$ 40.722	**$ 194.406.828**	**0**

PDA 25-001M	Transporte e Instalación Tubería Polietileno 110mm PE 100 / PN 6 RDE 26 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	949,00	$ 35.268	**$ 33.469.332**	**0**
PDA 25-088	Suministro, Transporte e Instalación Válvula de Compuerta Elástica Vástago No Ascendente Extremo Liso HD de 4" P/Acueducto. (Plano Detalles)	Un	5,00	$ 1.243.342	**$ 6.216.710**	**0**
PDA 25A-100	Suministro, Transporte e Instalación Válvula de Compuerta Elástica Vástago No Ascendente Extremo Liso HD de 2" P/Acueducto. (Plano Detalles)	Un	5,00	$ 682.281	**$ 3.411.405**	**0**
PDA 7A-090	Suministro, Transporte e Instalación de Válvula Ventosa 2" Doble Cámara Triple Efecto. Incluye Tee 4"x2" (Plano Detalles)	Un	74,00	$ 2.459.816	**$ 182.026.384**	**0**
PDA 7B-090	Suministro, Transporte e Instalación de Válvula de Purga 4". (Plano Detalles)	Un	66,00	$ 2.323.822	**$ 153.372.252**	**0**
PDA 7C-090	Suministro, Transporte e Instalación de Válvula Reguladora de Presión 4" Estación de control. (Plano Detalles)	Un	7,00	$ 25.390.607	**$ 177.734.249**	**0**
PDA 7D-090	Suministro, Transporte e Instalación de Válvula Reguladora de Caudal 4" Estación de control. (Plano Detalles)	Un	2,00	$ 9.717.416	**$ 19.434.832**	**0**
PDA 7F-090	Suministro, Transporte e Instalación de Válvula Control de nivel 4" y estación control entrada a tanque El Higueron	Un	1,00	$ 15.182.559	**$ 15.182.559**	**0**
PDA 7G-090	Suministro, Transporte e Instalación de Válvula Ventosa 1" Doble Cámara Triple Efecto. Incluye Tee 2"x1" (Plano Detalle)	Un	14,00	$ 1.790.900	**$ 25.072.600**	**0**
PDA 7H-090	Suministro, Transporte e Instalación de Válvula de Purga 2". (Plano Detalles)	Un	12,00	$ 1.058.489	**$ 12.701.868**	**0**
PDA 7I-090	Suministro, Transporte e Instalación de Válvula Reguladora de Presión 2" Estación de control. (Plano Detalles)	Un	5,00	$ 17.748.413	**$ 88.742.065**	**0**

PDA 3-005	Suministro, Transporte e Instalación de Caja de valvula de 1,10x1,40x1,40 en Concreto 28 Mpa 4000 PSI (Incluye Tapa en Concreto con Marco Metálico y reforzada, Incluye Platina 2"x1/4", Parrilla Var. 3/8"@0,15, acero de refuerzo).	Un	175,00	$ 1.145.810	**$ 200.516.750**	**0**
PDA 3A-006	Suministro e Instalación de Caja de Valvulas de 2,35*1,40*1,40 en Concreto Reforzado 28 Mpa 4000 PSI (Incluye Tapa en Concreto con Marco Metálico y reforzada, Incluye Platina 2"x1/4", Parrilla Var. 3/8"@0,15, acero de refuerzo)	Un	3,00	$ 2.174.933	**$ 6.524.799**	**0**
PDA 3A-007	Suministro e Instalación de Caja de Valvulas de 3,80*1,20*1,40 en Concreto Reforzado 28 Mpa 4000 PSI (Incluye Tapa en Concreto con Marco Metálico y reforzada, Incluye Platina 2"x1/4", Var. 3/8"@0,15, acero de refuerzo)	Un	2,00	$ 2.785.806	**$ 5.571.612**	**0**
PDA 3-005A	Suministro, Transporte e Instalación de Caja de Inspección de 1,00x1,00x,1,30 en Concreto 28 Mpa 4000 PSI (No Incluye Tapa).	Un	2,00	$ 720.847	**$ 1.441.694**	**0**
PDA 3A-005B	Suministro, Transporte e Instalación de Caja de Inspección de 1,70x1,80x,1,30 en Concreto 28 Mpa 4000 PSI (No Incluye Tapa).	Un	2,00	$ 1.127.829	**$ 2.255.658**	**0**
PDA 3A-008	Suministro e Instalación de Caja de Valvulas de 4,20*1,85*1,4 en Concreto Reforzado 28 Mpa 4000 PSI Incluye Tapa en Concreto con Marco Metálico y reforzada, Incluye Platina 2"x1/4", Var. 3/8"@0,15, acero de refuerzo)	Un	12,00	$ 5.257.277	**$ 63.087.324**	**0**
PDA 25-112	Suministro, Transporte e Instalación de Tee 4"x2" HD Extremos Lisos P/Acueducto.	Un	8,00	$ 232.974	**$ 1.863.792**	**0**
PDA 25-113	Suministro, Transporte e Instalación de Tee 2"x2" HD	Un	4,00	$ 130.135	**$ 520.540**	**0**

	Extremos Lisos P/Acueducto.					
PDA 25-114	Suministro, Transporte e Instalación de Tapón Hembra HD 4" Junta Rápida P/Acueducto.	Un	2,00	$ 116.132	**$ 232.264**	**0**
PDA 25-115	Suministro, Transporte e Instalación de Tapón Hembra HD 2" Junta Rápida P/Acueducto.	Un	6,00	$ 75.228	**$ 451.368**	**0**
PDA 3-030	Suministro, Transporte e Instalación de Tubería PVC-S 6" Rebose Tanque (Incluye Accesorios).	Ml	8,00	$ 80.446	**$ 643.568**	**0**
PDA 3-060	Suministro, Transporte e Instalación Filtro Drenaje de 0,50x0,50 Tubo de Drenaje 4" (Incluye Piedra Filtro y Geotextil NT 3000).	ML	36,00	$ 73.584	**$ 2.649.024**	**0**
PDA 2A-052	Suministro, Transporte e Instalación de Filtro en Piedra (Tubo de Drenaje 4", Piedra Filtro y Geotextil NT 3000).	M3	4,32	$ 237.008	**$ 1.023.875**	**0**
PDA 32-167	Suministro, Transporte e Instalación de Respiraderos en Tubería HG 3" (Incluye Accesorios y Rejilla de Protección HG).	Un	4,00	$ 68.492	**$ 273.968**	**0**
PDA 8B-055	Suministro, Transporte e Instalación de Abrazadera de fijación Tubería 4" (Incluye platina 1 1/2" en U y Pernos de Fijación 1/2".	Un	30,00	$ 33.362	**$ 1.000.860**	**0**
PDA 25-116	Suministro, Transporte e Instalación de Anclaje Tub. HG 2" y Concreto 28Mpa 4000PSI.	Un	18,22	$ 182.956	**$ 3.333.458**	**0**
PDA 25-117	Suministro, Transporte e Instalación de Empalme de Tubería PVC 4" a Tanque Existente (Incluye Pasa Muro HD de 4", Niple Bridado extremo liso 4").	Un	1,00	$ 579.250	**$ 579.250**	**0**
PDA 25-118	Suministro, Transporte e Instalación de Estación de Macromedición de 4" (Ver Detalle plano).	Un	2,00	$ 12.250.677	**$ 24.501.354**	**0**
PDA 25-033	Suministro, Transporte e Instalación Empalme Collar de derivación PEAD de 63 mm x1/2" P/Acueducto.	Un	524,00	$ 25.473	**$ 13.347.852**	**0**
PDA 25-081	Suministro, Transporte e Instalación Registro de Incorporación de 1/2" P/Acueducto.	Un	524,00	$ 34.473	**$ 18.063.852**	**0**

PDA 25-031	Suministro, Transporte e Instalación Tubería Pf + UAD de 1/2" para Acometida de Acueducto.	Ml	1572,00	$ 3.496	**$ 5.495.712**	**0**
PDA 25-119	Suministro, Transporte e Instalación de Medidor de Agua Chorro Único Mecánico Plástico R160(Incluye Accesorios).	Un	524,00	$ 124.338	**$ 65.153.112**	**0**
PDA 25-85A	Suministro, Transporte e Instalación de Registro tipo Red White de 1/2".	Un	524,00	$ 52.470	**$ 27.494.280**	**0**
PDA 25-106	Suministro, Transporte e Instalación de Caja para Medidor de 1/2" HF P/Acueducto.	Un	524,00	$ 109.330	**$ 57.288.920**	**0**
					$ 0	**0**
CAP-9	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 0**	**0**
PDA 6-035	Suministro, transporte e Instalación Pasamanos tuberia negra de 2", pintados con anticorrosiva y amarillo transito tipo intemperie, incluye accesorios.	Ml	80,00	$ 87.305	**$ 6.984.400**	**0**
PDA 6-036	Suministro, Transporte e Instalación escalera en Estructura Metálica con Desarrollo de 3m, Altura 3m. Superficie en Malla Expandida EXR 40mm Cal. 12 con Resistencia de 300kg/M², Baranda en Tubería Metálica AN. De 1 1/2", Uniones Soldadas Ancladas a Pasarela con Altura 1.18m, Ancho: 0.70m. Soportes en Perfil IPE 4". De Acuerdo a los Planos Donde se Requieren Dichas Estructuras, Escalera Tipo Gato con Guarda Hombre para Acceso a la Pasarela. Acabado Tipo Estructura 2 Capas de Anticorrosivo y Esmalte Epóxica. Riostras (Tipo Cruceta y Platina de Centro) en Tubería HG 3".	und	1,00	$ 4.275.478	**$ 4.275.478**	**0**
PDA 033-153	Suministro, Transporte e Instalación Escalón o Peldaño (Escaleras de Gato) para Cámara en Acero Liso 5/8", desarrollo 75 cm (Incluye Perforación, Solución Epóxica para	Un	15,00	$ 38.467	**$ 577.005**	**0**

	Anclaje, Anticorrosivo y Recubrimiento epóxico.					
PDA 17-119	Suministro, Transporte e Instalación de Marco Tapa en Angulo y Lámina de Alfajor 1,00x1,00.	Un	1,00	$ 507.880	**$ 507.880**	**0**
PDA 17-120	Suministro, Transporte e Instalación de Marco Tapa en Angulo y Lámina de Alfajor 1,80x1,70.	Un	1,00	$ 1.454.111	**$ 1.454.111**	**0**
PDA 17-121	Suministro, Transporte e Instalación de Marco Tapa en Angulo, reforzado y Concreto para registro de 0,70x0,70.	Un	2,00	$ 258.259	**$ 516.518**	**0**
					$ 0	**0**
CAP-10	**OBRAS ESPECIALES (PACIFICO 3)**				**$ 0**	**0**
	PRELIMINARES				**$ 0**	**0**
PDA 1-085	Localización y Replanteo Redes, Incluye Comisión de Topografía.	Ml	6368,34	$ 2.400	**$ 15.284.016**	**0**
	EXCAVACIONES				**$ 0**	**0**
PDA 2-001	Excavación en Zanja Material Común 0,00-2,00 m.	M3	1757,66	$ 23.292	**$ 40.939.417**	**0**
PDA 2-004	Excavación en Zanja Material Conglomerado 0,00-2,00 m.	M3	764,20	$ 31.300	**$ 23.919.460**	**0**
PDA 2-007	Excavación en Zanja Material Roca 0,00-2,00 m con explosivos.	M3	25,47	$ 293.800	**$ 7.483.086**	**0**
PDA 2-050	Relleno Compactado con Material Seleccionado proveniente de la Excavación.	M3	2292,60	$ 23.000	**$ 52.729.800**	**0**
PDA 2-053	Relleno Compactado con Material de Préstamo.	M3	254,73	$ 56.800	**$ 14.468.664**	**0**
	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y SOBREACARREOS				**$ 0**	**0**
PDA 2-032	Retiro de Material Sobrante en Vehículo Automotor, Cargue Manual.	M3	191,05	$ 30.515	**$ 5.829.891**	**0**
PDA 2-057	Repaleo Manual (Regada de Material).	M3	63,68	$ 6.524	**$ 415.448**	**0**
PDA 3-038A	Suministro, Transporte e Instalación Encamado de Arena P/Acueducto (Incluye Extendida y Compactación)	M3	63,68	$ 79.306	**$ 5.050.206**	**0**
	INSTALACIONES ACUEDUCTO				**$ 0**	**0**

PDA 25-001A	Suministro, Transporte e Instalación Tubería Polietileno 63mm PE 100/PN 10 RDE 17 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	1228,64	$ 22.765	**$ 27.969.990**	**0**
PDA 25-001C	Suministro, Transporte e Instalación Tubería Polietileno 63mm PE 100 / PN 16 RDE 11 (Incluye Transporte hasta Sitio de Obra y Pega Termofusión)	Ml	5139,70	$ 28.596	**$ 146.974.861**	**0**
PDA 25A-100	Suministro, Transporte e Instalación Válvula de Compuerta Elástica Vástago No Ascendente Extremo Liso HD de 2" P/Acueducto. (Plano Detalles)	Un	3,00	$ 682.281	**$ 2.046.843**	**0**
PDA 7H-090	Suministro, Transporte e Instalación de Válvula de Purga 2". (Plano Detalles)	Un	14,00	$ 1.058.489	**$ 14.818.846**	**0**
PDA 7I-090	Suministro, Transporte e Instalación de Válvula Reguladora de Presión 2" Estación de control. (Plano Detalles)	Un	1,00	$ 17.748.413	**$ 17.748.413**	**0**
PDA 7G-090	Suministro, Transporte e Instalación de Válvula Ventosa 1" Doble Cámara Triple Efecto. Incluye Tee 2"x1" (Plano Detalle)	Un	15,00	$ 1.790.900	**$ 26.863.500**	**0**
PDA 3-005	Suministro, Transporte e Instalación de Caja de valvula de 1,10x1,40x1,40 en Concreto 28 Mpa 4000 PSI (Incluye Tapa en Concreto con Marco Metálico y reforzada, Incluye Platina 2"x1/4", Parrilla Var. 3/8"@0,15, acero de refuerzo).	Un	32,00	$ 1.145.810	**$ 36.665.920**	**0**
PDA 3A-008	Suministro e Instalación de Caja de Valvulas de 4,20*1,85*1,4 en Concreto Reforzado 28 Mpa 4000 PSI Incluye Tapa en Concreto con Marco Metálico y reforzada, Incluye Platina 2"x1/4", Var. 3/8"@0,15, acero de refuerzo)	Un	1,00	$ 5.257.277	**$ 5.257.277**	**0**
	OBRAS ESPECIALES				**$ 0**	**0**
PDA 17-122	Demolición de cunetas - bordillo en concreto reforzado Tipo INVIAS	ML	530,00	$ 45.100	**$ 23.903.000**	**0**

PDA 17-123	Suministro, Transporte e Instalación Cuneta - Bordillo en concreto reforzado Tipo INVIAS 21 Mpa, incluye refuerzo, excavación y sub-base, modelo igual al afectado por los obras, ancho aproximado 1m,.	ML	530,00	$ 295.000	**$ 156.350.000**	**0**
PDA 17-124	Perforación horizontal dirigida, incluye pozo de acceso para tubería 63mm PEAD, profundidad promedio 2,5m.	Ml	71,00	$ 200.000	**$ 14.200.000**	**0**
PDA 17-125	Abrazadera de fijación Tubería 2" (Incluye platina 1 1/4" en U y Pernos de Fijación 1/2".	Und	35,00	$ 43.634	**$ 1.527.190**	
8/	Plan de Manejo de trafico (Dispositivos, señalizacion y equipos)	ML	6368,34	$ 4.600	**$ 29.294.364**	

COSTO DIRECTO =					**$ 4.224.156.361**
ADMINISTRACIÓN =				19,87%	839.146.972
IMPREVISTOS =				1,00%	42.241.564
UTILIDADES =				5,00%	211.207.818
TOTAL =					**$ 5.316.752.715**

2.3. RESUMEN INVERSIONES.

Inversión programada con corte al 18 de agosto de 2023 (Según reprogramación aprobada):

$.0 (0%)

Inversión ejecutada con corte al 18 de agosto de 2023:

$ 0 (0%)

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	LP-SV-002-2023--08052023-0824
Objeto:	“CONTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL NEIRA FASE I”
Contratista:	CONSORCIO ACUEDUCTO FASE I
Ing. Residente de Obra	JOHANN SABOGAL
Interventor:	GS VIAS Y ESTRUCTURAS
Ing. Residente de Interventoría:	CRISTINA OBANDO
Fecha del Contrato:	08 MAYO DE 2023
Plazo:	10 MESES
Valor Inicial:	5.316.752.739,83
Fecha de Iniciación:	14 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de Terminación Contractual:	13 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 1	
Fecha de Autorización:	
Período Autorizado :	
Motivo:	
CONTRATO ADICIONAL	
Número de Contrato Adicional:	
Fecha:	
Plazo Adicional:	
Valor Adicional:	
SUSPENSIÓN DEL PLAZO No. 1:	
Acta de suspensión N.º:	
Fecha de Suspensión:	
Fecha de Reiniciación:	
Motivo:	
Días de Suspensión:	

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	**CM-SV-006-2023—28062023-1158**
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, ambiental y legal al contrato de obra derivado del Proceso de Licitación Pública LP-SV-002-2023--08052023-0824 para la construcción del acueducto Inter veredal Fase I del Municipio de Neira , Caldas
Contratista:	GS VIAS Y ESTRUTURAS
Interventor:	SAMUEL CASTILLO
Ing. Residente de Interventoría:	CRISTINA OBANDO
Fecha del Contrato:	18 DE JULIO DE 2023
Plazo:	10 MESES
Valor Inicial:	$ 246.228.414
Fecha de Iniciación:	18 DE JULIO DE 2023
Fecha de Terminación Contractual:	18 DE MAYO DE 2024
PRÓRROGA No. 1	
Fecha de Autorización:	
Período Autorizado :	
Motivo:	
PRÓRROGA No. 2	
Fecha de Autorización:	
Período Autorizado :	
Motivo:	
CONTRATO ADICIONAL	
Número de Contrato Adicional:	
Fecha:	
Plazo Adicional:	
Valor Adicional:	
SUSPENSIÓN DEL PLAZO No. 1:	
Acta de suspensión Nº:	
Fecha de Suspensión:	
Fecha de Reiniciación:	
Motivo:	
Días de Suspensión:	

4.2. ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS.

Cuadro N.º 02. Control de Pólizas Contrato de Obra

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO PÓLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101201837	2/05/2023	2/06/2024	$265,837,636.99
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101201837	2/05/2023	2/06/2024	$1,595,025,821.95
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101201837	2/05/2023	2/03/2027	$265,837,636.99
ESTABILIDAD	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101201837	2/05/2023	2/03/2029	$1,063,350,547.97
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101053171	2/05/2023	2/03/2024	$464,000,000.00

Cuadro N.º 02A. Control de Pólizas Contrato de Interventoría.

TIPO DE AMPARO	% CUBRIMIENTO	VALOR	N° DE POLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
Cumplimiento incluido amparo de posibles multas y la cláusula penal pecuniaria.	20% del valor del contrato	$49’245.682.82	94-44-101182747	SEGUROS DEL ESTADO SA	26/06/2023	26/10/2024
Calidad del servicio.	20% del valor del Contrato.	$49’245.682.82	94-44-101182747	SEGUROS DEL ESTADO SA	04/07/2023	26/06/2028
Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales.	20% del valor del contrato	$49’245.682.82	94-44-101182747	SEGUROS DEL ESTADO SA	04/07/2023	26/04/2027


4.3. ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

A la fecha del informe no se ha presentado un acta de cobro

Cuadro N.º 03. Balance del contrato de obra

ACTA DE OBRA No.	FECHA DEL ACTA	BALANCE DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO		
		PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO CONTRATO	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO POR AMORTIZAR
1		$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0
2		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Gráfica N.º 01. Relación de Facturación

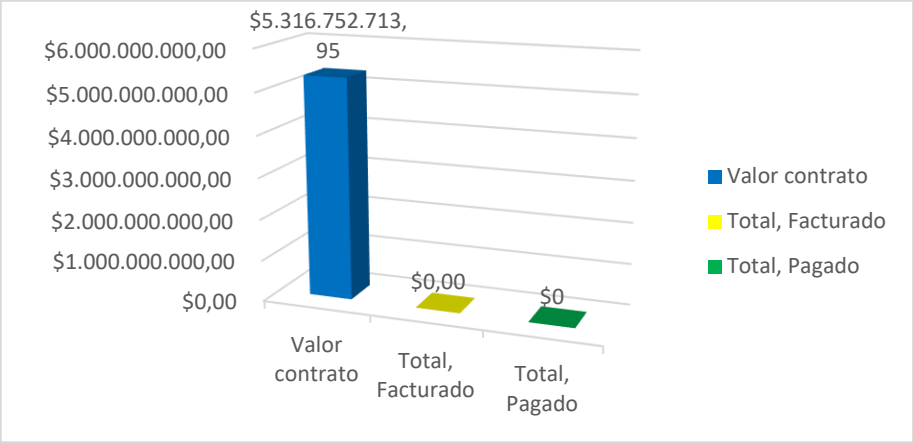

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de $)
Valor contrato	$ 5.316.752.713,95
Total, Facturado	$ 0,00
Índice de Facturación	0%
Total, Pagado	$ 0
Índice de Pagos	0%
Saldo por pagar a la fecha	$ 5.316.752.713,95

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden al contrato de obra Nº LP-SV-002-2023--08052023-0824 a ejecutarse en el Municipio de Neira (Caldas)

Durante el presente mes se realizaron:

- visitas de campo
- revisión de documentación, formatos y diseños del proyecto
- reuniones técnicas, con el equipo de trabajo social y con la supervisión.
- Socializaciones del proyecto con la comunidad.
- Actas de vecindad y entorno

6. AVANCE DE OBRA E INVERSIONES

Cuadro N.º 04 Control de Avance Físico

ACTIVIDADES		**AVANCE FÍSICO (%)**	
		18-Jul. 18-Ago.	**TOTALES**
MES	PROGRAMADO	0%	0%
	EJECUTADO	0%	0%
ACUMULADO	PROGRAMADO	**0%**	**0%**
	EJECUTADO	**0%**	**0%**

7. PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES

7.1 PERSONAL PROMEDIO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA.

EQUIPO	18 julio 2023 - 18 agosto. 2023
Ingeniero director	1
Ingeniero Residente	1
Maestro de Obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Comisión Topográfica	0
Socióloga	1

7.2 PERSONAL PROMEDIO EMPLEADO POR LA INTERVENTORÍA.

EQUIPO	18 julio 2023 - 18 agosto. 2023
Ingeniero director	1
Ingeniero Residente	1
Socióloga	1

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se tiene contemplado iniciar con las actividades preliminares del proyecto
- Se tiene contemplado iniciar con la caracterización y las actas de vecindad
- Se tiene contemplado ubicar la oficina de contratista de obra e interventoría en el sector intermedio del trazado del proyecto

9. ANEXOS

9.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME FOTOGRAFICO**	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019




OBSERVACIONES: LUGAR DE SOCIALIZACION	
BARRIO O SECTOR: COLEGIO LLANO GRANDE	
MUNICIPIO: NEIRA	
CONTRATO No: LP-SV-002-2023--08052023-0824	FECHA: 25 de julio de 2023



OBSERVACIONES: Reunion de socializacion con las veredas	
BARRIO O SECTOR: llano grande	
MUNICIPIO: Neira	
CONTRATO No: LP-SV-002-2023--08052023-0824	FECHA: 25 de julio de 2023



OBSERVACIONES:	
BARRIO O SECTOR: llano grande	
MUNICIPIO: Neira	
CONTRATO No: LP-SV-002-2023--08052023-0824	FECHA: 25 de julio de 2023



OBSERVACIONES: asistencia(muchos de los asistentes no saben escribir y por ende no firman)	
BARRIO O SECTOR: Llano grande	
MUNICIPIO: Neira	
CONTRATO No: LP-SV-002-2023--08052023-0824	FECHA: 25 de julio de 2023

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME FOTOGRAFICO**	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019




OBSERVACIONES: Segunda socializacion del proyecto a la comunnidad	
BARRIO O SECTOR: Fonda palermo	
MUNICIPIO: Neira	
CONTRATO No:	FECHA: 4 de agosto de 2023



OBSERVACIONES: Segunda socializacion del proyecto a la comunnidad	
BARRIO O SECTOR: Fonda palermo	
MUNICIPIO: Neira	
CONTRATO No:	FECHA: 4 de agosto de 2023




OBSERVACIONES: Segunda socializacion del proyecto a la comunnidad	
BARRIO O SECTOR: Fonda palermo	
MUNICIPIO: Neira	
CONTRATO No:	FECHA: 4 de agosto de 2023

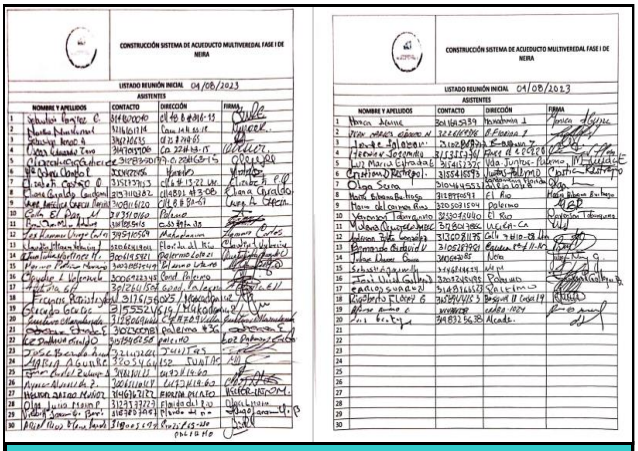


OBSERVACIONES: Asistencia de la segunda socializacion del proyecto a la comunidad	
BARRIO O SECTOR: Fonda Palermo	
MUNICIPIO: Neira	
CONTRATO No:	FECHA: 4 de agosto de 2023

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME FOTOGRAFICO**	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

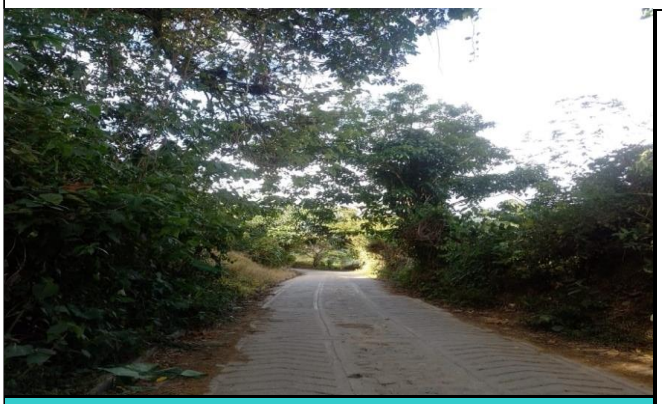

OBSERVACIONES: Recorrido de veredas		
BARRIO O SECTOR:		
MUNICIPIO: Neira		
CONTRATO No:	FECHA:	10 de agosto de 2023

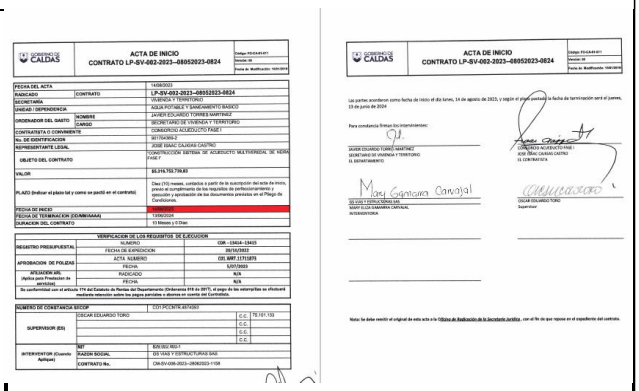

ACTA DE INICIO
CONTRATO LP-SV-002-2023--08052023-0824

FECHA DEL ACTA	14/08/2023
RADICADO	CONTRATO LP-SV-002-2023--08052023-0824
SECRETARIA	VIVIENDA Y TERRITORIO
UNIDAD / DEPENDENCIA	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE	JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO CARGO	SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO
CONTRATISTA O CONVINIENTE	CONSORCIO ACUEDUCTO FASE I
No. DE IDENTIFICACION	901754369-2
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ISAAC CALDERA CASTRO
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION SISTEMA "DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE NEIRA FASE I
VALOR	$5,316,753,739.83
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)	Cinco (11) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA DE INICIO	14/08/2023
FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)	13/09/2024
DURACION DEL CONTRATO	11 Meses y 0 Dias

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION

REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	CDR – 13416– 13425
	FECHA DE EXPEDICION	28/10/2023
APROBACION DE POLIZA	ACTA NUMERO	CO1.MRT.1171870
	FECHA	1/07/2023
APLICACION ART. (Aplica para Prestación de servicios)	RADICADO	N/A
	FECHA	N/A

No conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 419 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abono en cuenta del Contratista.

NUMERO DE CONSTANCIA SECOP		CO1 PICAPTR.1874383	
SUPERVISOR (ES)	OSCAR EDUARDO TORO	C.C.	75.151.133
		C.C.	
		C.C.	
		C.C.	
INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT	830.552.493-1	
	RAZON SOCIAL	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	
	CONTRATO No.	CM-GV-VIN-2022--10082023-1109	

ACTA DE INICIO
CONTRATO LP-SV-002-2023--08052023-0824

Las partes acordaron como fecha de inicio el día lunes, 14 de agosto de 2023, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el jueves, 13 de junio de 2024

Para constancia firman los intervinientes:

JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ
SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO
EL ESTATUTARIO


JOSE ISAAC CALDERA CASTRO
CONSORCIO ACUEDUCTO FASE I
EL CONTRATISTA

MARY GUIA CAMARGO CARVAJAL
GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS
INTERVENTORA

OSCAR EDUARDO TORO
Supervisor

Nota: Se debe anexar el original de esta acta a la Oficina de Radicación de la Secretaría Jurídica, con el fin de que repose en el expediente del contrato.

OBSERVACIONES: Acta de inicio con firmas correspondientes		
BARRIO O SECTOR:		
MUNICIPIO: Neira		
CONTRATO No:	FECHA:	14 de agosto de 2023

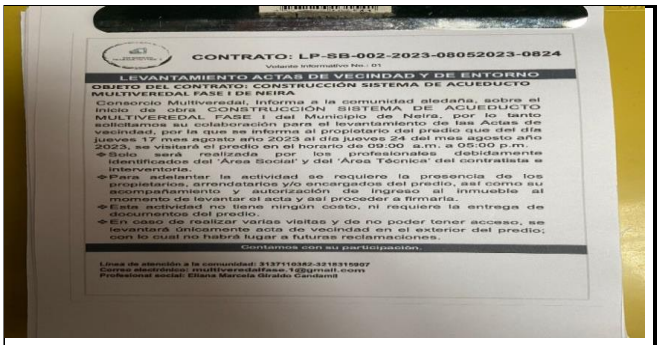

CONTRATO: LP-SB-002-2023-08052023-0824
Volante Informativo No.: 01

LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD Y DE ENTORNO

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL FASE I DE NEIRA

Consorcio Multiveredal, informa a la comunidad aledaña, sobre el inicio de obra CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL FASE I del Municipio de Neira, por lo tanto solicitamos su colaboración para el levantamiento de las Actas de vecindad, por la que se informa al propietario del predio que del día jueves 17 mes agosto año 2023 al día jueves 24 del mes agosto año 2023, se visitará el predio en el horario de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.

- Solo será realizada por los profesionales debidamente identificados del 'Área Social' y del 'Área Técnica' del contratista e interventoría.
- Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta y así proceder a firmarla.
- Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio.
- En caso de realizar varias visitas y de no poder tener acceso, se levantará únicamente acta de vecindad en el exterior del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

Contamos con su participación.

Línea de atención a la comunidad: 3137110382-3218315027
Correo electrónico: multiveredalfase.1@gmail.com
Profesional social: Eliana Marcela Giraldo Candamil

OBSERVACIONES: Volante entregado a la comunidad		
BARRIO O SECTOR: veredas		
MUNICIPIO: Neira		
CONTRATO No:	FECHA:	15 de agosto de 2023



OBSERVACIONES: entrega de volantes		
BARRIO O SECTOR:		
MUNICIPIO: Neira		
CONTRATO No:	FECHA:	15 de mayo de 2023



OBSERVACIONES: Entrega de volantes a comunidad		
BARRIO O SECTOR: veredas		
MUNICIPIO: Neira		
CONTRATO No:	FECHA:	15 de agosto de 2023



OBSERVACIONES: Asistencia de la segunda socializacion del proyecto a la comunidad		
BARRIO O SECTOR: Fonda Palermo		
MUNICIPIO: Neira		
CONTRATO No:	FECHA:	15 de mayo de 2023

9.2. CORRESPONDENCIA

9.3. COPIA MEDIO MAGNÉTICO
