INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Diciembre 2023	**Numero de contrato:**	**CD-12-2023-7062**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	CYNDY MELISA MEDINA PALACIO C.C.1.010.064.294		
Periodo del informe:	Informe correspondiente a las actividades al 30 de noviembre de 2023	Informe número:	01
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($13.750.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

asesoría durante la supervisión por parte de la Secretaría Distrital de Obras Públicas en el proceso de Contratación de las obras incluidas en el Plan Parcial El Volador, en lo referente a la obra de carga general del diseño y construcción del Intercambiador de la **avenida Circunvalar con la Cra 43, frente a Alameda del Río**

Supervisión de los Estudios y Diseños para la recuperación integral de **los caños Mercado y la Ahuyama**, dentro del alcance del contrato CD-12-2023-1444, ejecutado por Puerta de Oro bajo la supervisión de la Secretaría Distrital de Obras Públicas

Coordinación durante la supervisión y revisión de las obras que se ejecutan dentro del contrato de Canalización del Arroyo de la Cra 65, desde la **Cra 45 con Cll 62 hasta la Cra 65 con la Vía 40,** dentro del alcance del contrato FROIH 933-2016.

Participación en el Comité de seguimiento del Contrato de Estudios y diseños para la recuperación de la **Ciénaga de Mallorquín** UF-4 de manera virtual.
Temas tratados:

A. Revisión de los compromisos del Acta anterior.
B. Ambiental: El segundo informe de avance lo entregan hoy 17/10 en horas de la tarde. Queda pendiente la entrega del Plan de Manejo Ambiental y la Evaluación de Riesgos. Según el Cronograma la fecha de entrega era el 28 de agosto. Hay plazo máximo hasta finales del mes.
C. Arquitectura: El REVIT depurado lo entregan en el transcurso del día. LA cubierta planteada para el parque lineal, lo hacen con pórticos cada 5.00 m en madera, con alturas máximas de 7.00 m y cubierta en lona tensada que tiene protección UV. El proveedor sugerido sería Calypso. La viabilidad técnica de la Tirolesa, siguen pendientes de la respuesta del técnico (César Porto). Falta la entrega del diseño de los planos de evacuación y parqueaderos. El parqueadero lo escogieron en el predio vecino hacia el occidente donde ya hay uno existente, para no afectar más mangles. Habría que incluirlo en la gestión de predios para Mallorquín el próximo año.
D. Eléctrico-Alumbrado-Telecomunicaciones: Solicitan definir la cantidad y potencia de las motobombas a instalar. El parqueadero no lo tenían previsto. Entregan avances concretos la próxima semana.
E. Aires y Extracción: Tienen consulta sobre las zonas 11 de refrigeración y 8 de cocción en el área del Loop Principal. Se aclara que el Ecoparque no debe llevar redes de gas natural. Arquitectura debe rediseñar esa área. La entregan el próximo 20/10.

Supervisión durante los recorridos en campo para la Supervisión de las obras que se adelantan **en la CALLE 30** como parte del Contrato ADI 375-2018, en diferentes frentes de trabajo así:

1. Cuadrillas trabajando en el espacio público, instalando tuberías sanitarias para acometidas, construcción de registros domiciliarios, instalación de ductos eléctricos, rellenos compactados, mezcla y colocación de suelo-cemento de base para las losetas, colocación de la cama de arena como apoyo a las losetas y colocación de estas, ya sean placas guías, táctiles o normales, según su ubicación. **En la Cra 23 entre Clle 29 y 30, entre Cra 29 y 30 lado oriental, en la esquina de la Cra 29 oriental, en la esquina de la Cra 30 nororiental, en la esquina de la Cra 35, entre Cra 33 y 35 lado oriental, entre Cra 28 y 29 lado oriental**.

2. Reparación de placas de pavimento en la **Calle 30 entre Cra 35 y 46**. 3. Fundida de pavimento MR45 en las placas del sector de la **Cra 46**. 4. Cuadrilla eléctrica realizando trabajos en la media tensión y en el sondeo de los ductos para el alumbrado público. 5. Cuadrilla haciendo el sondeo y marcación del banco de ductos para entregarlo a los operadores entre las **Cra 32 y 33 calzada oriental**

Inspección durante la supervisión de las obras que se adelantan en la CALLE 30 como parte del Contrato ADI 375-2018, en diferentes frentes de trabajo así: 1. Cuadrillas trabajando en el espacio público, instalando tuberías sanitarias para acometidas, construcción de registros domiciliarios, instalación de ductos eléctricos, rellenos compactados, mezcla y colocación de suelo-cemento de base para las losetas, colocación de la cama de arena como apoyo a las losetas y colocación de las mismas, ya sean placas guías, táctiles o normales, según su ubicación. En la Cra 23 entre Clle 29 y 30, entre Cra 29 y 30 lado oriental, en la esquina de la Cra 29 oriental, en la esquina de la Cra 30 nororiental, en la esquina de la Cra 35, entre Cra 33 y 35 lado oriental, entre Cra 28 y 29 lado oriental.

FIRMA

Cyndy Medina Palacio

CYNDY MELISA MEDINA PALACIO
1.010.064.294

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO



Supervisión de construcción del pavimento reforzado en el radio de giro para empalmar con Cll 30




Supervisión de la instalación de losetas en el espacio público entre Cra 29 y 30 oriental



Supervisión de trabajos en el espacio público en Clle 30 entre Cra 29 y 30 oriental




Supervisión de obras de construcción de pavimento en la intersección de la Cra 46 con Vía 40

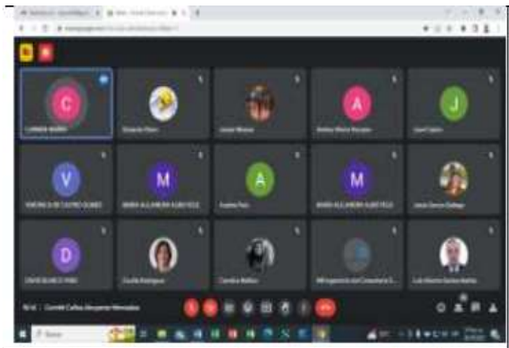

Participación en el Comité de seguimiento a Estudios y diseños de Caños Ahuyama y Mercado el 26/10/2023



Participación en Comité de seguimiento a Estudios y Diseños de Ecoparque Mallorquín UF-4 el 31/10/2023

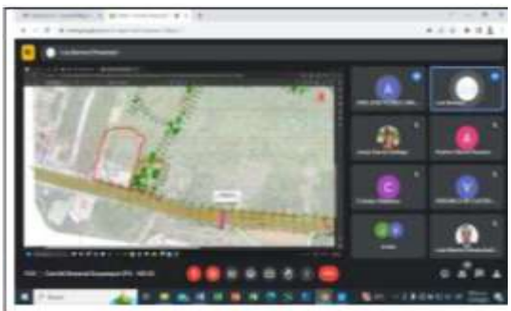

Comité de seguimiento a Estudios y Diseños de Ecoparque Mallorquín UF-4 el 17/10/2023



Participación en el Comité de seguimiento Estudios y Diseños Caños Ahuyama y Mercado el 19/10/2023
