ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 16, semana del 8 de mayo al 14 de mayo de 2023; 2022-2025	
FECHA 18/05/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Laura Catalina Henao Corredor	SDM/DIT
Edwin Novoa Arévalo	SDM-DIT
Camilo Ardila	TPD
Jose Fernando Sanchez	TPD
Julieth Chacon Archila	TPD
Luis Nicolai Wilches Palomo	SDM-DIT-SS
Alfredo Ardila	TPD

2. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de generalidades del contrato
2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila
3. Recomendaciones y conclusiones
4. Temas de la SDM – Ingeniero Nicolas Wilches

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de generalidades del contrato

El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:

- Contrato 2025 de 2022
- Contratista: TPD Ingeniería S.A.S.
- Acta de inicio del 16 de enero de 2023
- Duración: 10 meses

2. Informe de seguimiento de avance semanal

El director del proyecto informa que se recibieron los tramos 4_13 Transversal 6B Este entre calle 40 Sur y diagonal 39B Sur, 4_14 Transversal 6B Este entre Diagonal 39D Sur y calle 40B Sur, 4_17 Calle 39 Sur por carrera 12A Este, 4_18 Carrera 11 Este entre calle 40 Sur y calle 39C Sur y 4_19 Calle 39 entre carrera 12 Este y calle 40B Bis Sur, así mismo se presentó el informe en versión 0 de la etapa 1 de los tramos 5_7 Carrera 16 Este por calle 80A sur, 19_9 Carrera 46 por Diagonal 68G Sur y Carrera 14 Este por Diagonal 47 Bis Sur, durante la semana reportada no se pudieron realizar las actividades de campo en el tramo 19_21 Calle 72G Bis Sur entre carrera 26C y Carrera 26C Bis debido a problemas de seguridad, por consiguiente se solicitó el acompañamiento de la policía y se espera respuesta al requerimiento.


.

TEMA	**Comité Semanal 16, semana del 8 de mayo al 14 de mayo de 2023; 2022-2025**	
FECHA 18/05/2023	**HORA 07:00**	**LUGAR Virtual :** https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Se presenta el avance por metas



Total tramos en proceso: 33

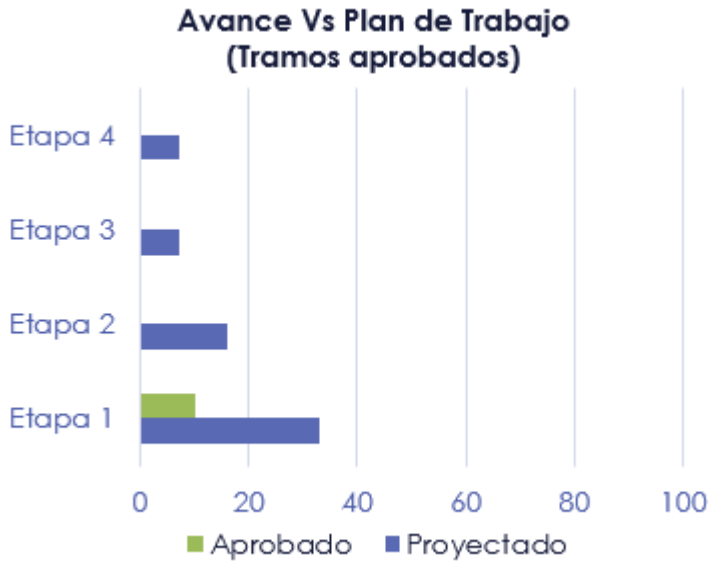


Avance ejecución financiera

TEMA	Comité Semanal 16, semana del 8 de mayo al 14 de mayo de 2023; 2022-2025	
FECHA 18/05/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Presupuesto total
$853,808,304 (Inc. IVA)

Ejecutado etapa 1: $ 8.131.508
Ejecutado etapa 2: $ 0.0
Ejecutado etapa 3: $ 0.0
Ejecutado etapa 4: $ 0.0

Total ejecutado: $ 8.131.508

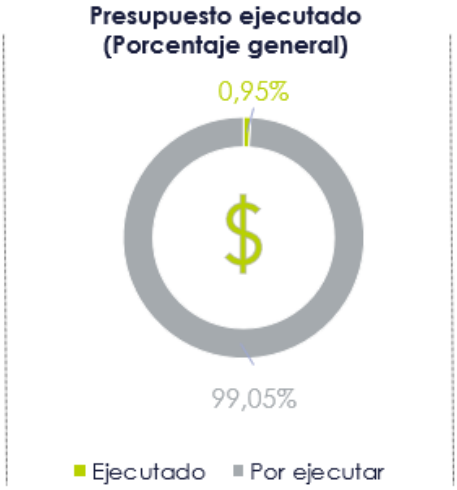



3. Recomendaciones y conclusiones

- Se tiene programado recibir observaciones o aprobación a los informes de etapa 1 de los tramos 3_26, 3_27, 3_28, 3_21, 3_15, 2_36, 3_38, 3_37, 3_36, 3_35, 3_34, 3_33, 3_13 , 3_5, 1_38, 1_44, 1_45, 11_3 y 1_5.
- Se tiene programado la entrega del informe en versión 0 de la etapa 2 de los tramos 3_23, 3_24 y 3_25.
- Se tiene programado recibir observaciones del informe en versión 0 de la etapa 1 de los tramos 2_27, 3_8, 4_15, 4_16, 5_7, 19_9, 4_7, 4_13, 4_14, 4_17, 4_18 y 4_19.
- Se tiene programado recibir observaciones a los informes de la versión 0 de la etapa 2 de los tramos 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 Y 19_20.
- Se tiene programado recibir observaciones del informe en versión 2 de la etapa 2 del tramo 11_16 Y 3_32.

4. Temas de la SDM

La supervisión del contrato informa que se encuentra revisando el diagnóstico de la etapa 2 del tramo 11_16.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Entregar las observaciones del diagnóstico de la etapa 2 del tramo 11_16	SDM	16/05/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA	**Comité Semanal 16, semana del 8 de mayo al 14 de mayo de 2023; 2022-2025**	
FECHA 18/05/2023	**HORA 07:00**	**LUGAR Virtual :** https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

APROBADO

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025
