ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 17, semana del 15 de mayo al 21 de mayo de 2023; 2022-2025	
FECHA 25/05/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Laura Catalina Henao Corredor	SDM/DIT
Edwin Novoa Arévalo	SDM-DIT
Camilo Ardila	TPD
Jose Fernando Sanchez	TPD
Julieth Chacon Archila	TPD
Luis Nicolai Wilches Palomo	SDM-DIT-SS
Alfredo Ardila	TPD

2. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de generalidades del contrato
2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila
3. Recomendaciones y conclusiones
4. Temas de la SDM – Ingeniero Nicolas Wilches

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de generalidades del contrato

El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:

- Contrato 2025 de 2022
- Contratista: TPD Ingeniería S.A.S.
- Acta de inicio del 16 de enero de 2023
- Duración: 10 meses

2. Informe de seguimiento de avance semanal

El director del proyecto informa que se recibieron los tramos 3_39 Vía Choachí Kilómetro 2+700, 3_40 Vía Choachí Kilómetro 3+250, 3_41 Vía Choachí Kilómetro 3+300 y 3_42 Vía Choachí Kilómetro 3+550, se recibieron observaciones a los informes de etapa 1 de los tramos 3_26 Vía Choachí Kilómetro 7+450, 3_27 Vía Choachí Kilómetro 5+350, 3_28 Vía Choachí Kilómetro 4+550, 3_21 Vía Choachí Kilómetrro 1+150, 3_15 Calle 26 por carrera 3, 2_36 Avenida Circunvalar por diagonal 57, 3_38 Vía Choachí Kilómetro 1+650, 3_37 Vía Choachí Kilómetro 1+585, 3_36 Vía Choachí Kilómetro 1+410, 3_35 Vía Choachí kilómetro 1+275, 3_34 Vía Choachí Kilómetro 0+930, 3_33 Vía Choachí Kilómetro 0+770, 3_13 Carrera 1 por Calle 18, 3_5 Carrera 1 por calle 19A, 2_27 Avenida Circunvalar por calle 78, 3_8 Avenida Circunvalar por calle 26 Bis, 4_15 Carrera 13E por calle 17A Sur y 4_16 Carrera 13 Este por calle 18 Sur y se solicitó acompañamiento policial para adelantar actividades de etapa 1 del tramo 19_21 Calle 72G Bis Sur entre carrera 26C y Carrera 26C Bis debido a problemas de seguridad.
.

TEMA	Comité Semanal 17, semana del 15 de mayo al 21 de mayo de 2023; 2022-2025	
FECHA 25/05/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Se presenta el avance por metas


Etapa 1 Informe de visita técnica, inventario e identificación de riesgos	Etapa 2 Estudio y diagnóstico de sistemas de contención vehicular	Etapa 3 Diseño de sistemas de contención vehicular	Etapa 4 Dibujo y presentación geográfica de planos de diseño de sistemas de contención vehicular
Versión 0: 13 Versión 1: 17 Versión 2: 6	Versión 0: 5 Versión 1: 0 Versión 2: 2	Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0	Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0
Aprobados: 10	Aprobados: 0	Aprobados: 0	Aprobados: 0

Total tramos en proceso: 46 tramos en proceso de diseño

Completos en las 4 Etapas de diseño: 0 tramos finalizados

GERENCIA EN VÍA | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

Total tramos en proceso: 33

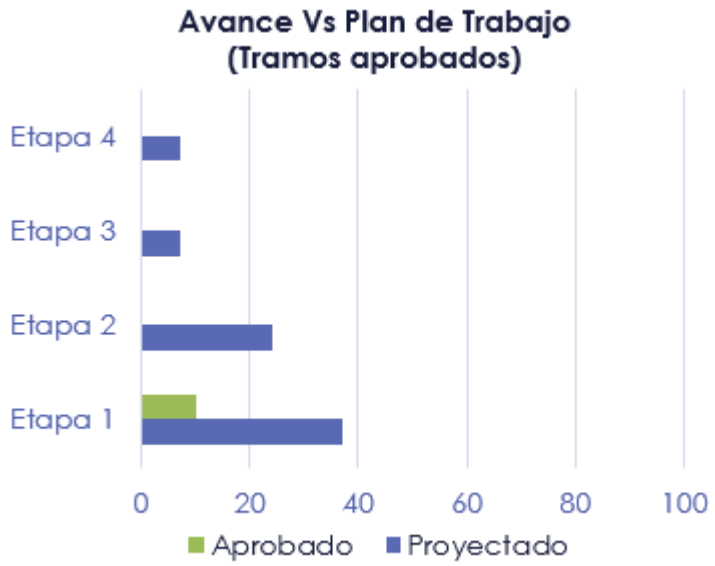


TEMA	**Comité Semanal 17, semana del 15 de mayo al 21 de mayo de 2023; 2022-2025**	
FECHA 25/05/2023	**HORA 07:00**	**LUGAR Virtual :** https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq


Avance ejecución financiera

Presupuesto total
$853,808,304 (Inc. IVA)

Ejecutado etapa 1: $ 8.131.508
Ejecutado etapa 2: $ 0.0
Ejecutado etapa 3: $ 0.0
Ejecutado etapa 4: $ 0.0

Total ejecutado: $ 8.131.508

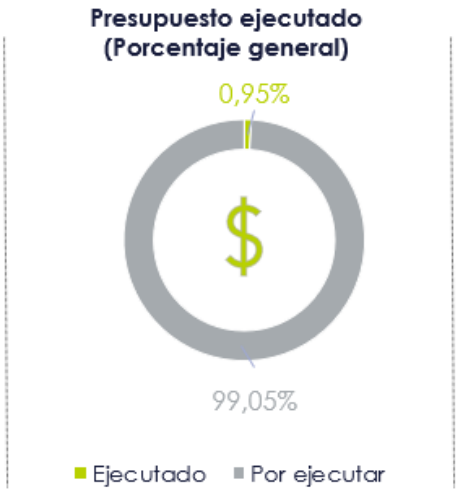

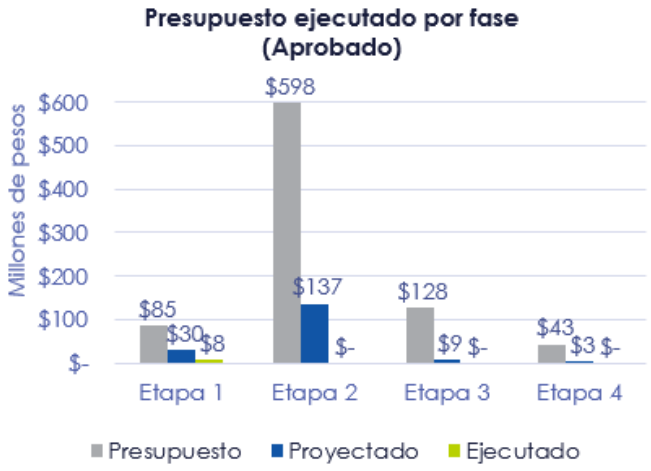

3. Recomendaciones y conclusiones

- Se tiene programado la entrega de atención de observaciones de etapa 1 de los tramos 3_26, 3_27, 3_28, 3_21, 3_15, 2_36, 3_38, 3_37, 3_36, 3_35, 3_34, 3_33, 3_13, 3_5, 2_27, 3_8, 4_15, 4_16.
- Se tiene programado la entrega del informe en versión 0 de la etapa 1 de los tramos 3_39, 3_40, 3_41, 3_42.
- Se tiene programado la entrega del informe en versión 0 de la etapa 2 de los tramos 3_23, 3_24 y 3_25.
- Se tiene programado recibir observaciones o aprobación de los informes de etapa 1 de los tramos 1_38, 1_44, 1_45, 11_3, 1_5, 5_7, 19_9, 4_7, 4_13, 4_14, 4_17, 4_18, 4_19.
- Se tiene programado recibir observaciones a los informes de la versión 0 de la etapa 2 de los tramos 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 Y 19_20.
- Se tiene programado recibir observaciones del informe en versión 2 de la etapa 2 del tramo 11_16 Y 3_32

4. Temas de la SDM

La supervisión del contrato informa que se encuentra revisando el diagnóstico de la etapa 2 del tramo 11_16.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 17, semana del 15 de mayo al 21 de mayo de 2023; 2022-2025	
FECHA 25/05/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Entregar las observaciones del diagnóstico de la etapa 2 del tramo 11_16	SDM	25/05/2023

APROBADO

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025
