ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Rep Legales 5	
FECHA 30/05/2023	HORA 16:15	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Sáenz	TPD
Alfredo Ardila	TPD
Camilo Ardila	TPD
Mario G Carbonell Gutiérrez	SDM
Luis Nicolai Wilches Palomo	SDM
Laura Catalina Henao	SDM

2. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de generalidades del contrato
2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila
3. Recomendaciones y conclusiones
4. Temas de la SDM – Ingeniero Nicolas Wilches

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de generalidades del contrato

El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:

2. Contrato 2025 de 2022
3. Contratista: TPD Ingeniería S.A.S.
4. Acta de inicio del 16 de enero de 2023
5. Duración: 10 meses

6. Estado y Avance Físico del contrato

Actualmente el proyecto se encuentra adelantando documentos correspondientes a Etapa 2 y Etapa 1 de los tramos solicitados por la entidad.
Sobre todos los tramos, en la Etapa 1, se han generado las visitas de campo junto con levantamientos de georreferenciación y topografía que alimentarán los procesos de etapas posteriores. Lo anterior, independiente de la cartografía encontrada en la entidad.

TEMA	Comité Rep Legales 5	
FECHA 30/05/2023	HORA 16:15	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

TRAMO	ID	TRAMO_NOM	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3
1	11_16	CI 170 ENTRE KR 90 y 92		V2	
2	3_32	AV CIRCUNVALAR FRENTE A UDFJC		V2	
3	5_6	CALLE 84 SUR ENTRE VIA AL LLANO)		V0	
4	4_12	AV CARRERA 10 ENTRE CL 35 A SUR Y CL 37 SUR		V0	
5	2_73	CALLE 59 CON TV 1A (ACCESO A ESTACION DE POLICIA)		V0	
6	18_6	CARRERA 9A (BARRIO VILLA GLAYS)		V0	
7	19_20	VIA MOCHUELO (Grupo Empresarial de Mochuelo S.A.S.)		V0	
8	3_23	VÍA CHOACHI KM 14+300		V0	
9	3_24	VÍA CHOACHI KM 14+0		V0	
10	3_25	VÍA CHOACHI KM 13+550		V0	
11	3_26	VÍA CHOACHI KM 7+450		V0	
12	3_27	VÍA CHOACHI KM 5+350		V0	
13	3_28	VÍA CHOACHI KM 4+550		V0	
14	3_21	VÍA CHOACHI KM 1+150	V2		
15	3_15	CALLE 26 X CARRERA 3	V2		
16	2_36	AVENIDA CIRCUNVALAR X DIAGONAL 57	V2		
17	3_38	VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 1+650	V2		
18	3_37	VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 1+585	V2		
19	3_36	VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 1+410	V2		
20	3_35	VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 1+275	V2		
21	3_34	VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 0+930	V2		
22	3_33	VÍA CHOACHÍ KILÓMETRO 0+770	V2		
23	3_13	CARRERA 1 X CALLE 18	V2		

TRAMO	ID	TRAMO_NOM	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3
24	3_5	CARRERA 1 X CALLE 19A	V2		
25	1_38	AV CODITO - LA CABAÑITA X CALLE 3	V1		
26	1_44	AV CODITO - LA CABAÑITA	V1		
27	1_45	CALLE 185 X CARRERA 2 ESTE	V1		
28	11_3	CARRERA 86 ENTRE CALLE 147B Y CALLE 146B	V1		
29	1_5	CARRERA 19 ENTRE CALLE 127B Y CALLE 127B BIS	V1		
30	2_27	AVENIDA CIRCUNVALAR POR CALLE 78	V1		
31	3_8	AVENIDA CIRCUNVALAR POR CALLE 26 BIS	V1		
32	4_15	CARRERA 13 ESTE X CALLE 17A SUR	V1		
33	4_16	CARRERA 13 ESTE X CALLE 18 SUR	V1		
34	5_7	CARRERA 13 ESTE X CALLE 80A SUR	V1		
35	19_21	CALLE 72G BIS SUR ENTRE CARRERA 26C Y CARRERA 26C BIS			
36	19_9	CARRERA 46 X DIAGONAL 68G SUR	V1		
37	4_7	CARRERA 14 ESTE X DIAGONAL 47 BIS SUR	V1		
38	4_13	TRANSVERSAL 6B ESTE ENTRE CALLE 40 SUR Y DIAGONAL 39B SUR	V1		
39	4_14	TRANSVERSAL 6B ESTE ENTRE DIAGONAL 39D SUR Y CALLE 40B BIS SUR	V1		
40	4_17	CALLE 39 SUR POR CARRERA 12 ESTE	V1		
41	4_18	CARRERA 11 ESTE ENTRE CAKKE 40 SUR Y CAKKE 39C SUR	V1		

TPD
SDM

GERENCIA EN VÍA

TRAMO	ID	TRAMO_NOM	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3
42	4_19	CALLE 39 SUR POR CARRERA 12 ESTE	V1		
43	3_39	VÍA CHOACHÍ KM 2+700	V0		
44	3_40	VÍA CHOACHÍ KM 3+250	V0		
45	3_41	VÍA CHOACHÍ KM 3+300	V0		
46	3_42	VÍA CHOACHÍ KM 3+550	V0		
47	3_43	VÍA CHOACHÍ KM 3+700	V0		
48	3_44	VÍA CHOACHÍ KM 3+855	V0		
49	3_45	VÍA CHOACHÍ KM 4+400	V0		
50	3_46	VÍA CHOACHÍ KM 6+650	V0		

TPD
SDM

Etapa 1
Informe de visita técnica, inventario e identificación de riesgos

Versión 0: 4
Versión 1: 17
Versión 2: 11

Aprobados: 13

Etapa 2
Estudio y diagnóstico de sistemas de contención vehicular

Versión 0: 5
Versión 1: 0
Versión 2: 2

Aprobados: 0

Etapa 3
Diseño de sistemas de contención vehicular

Versión 0: 0
Versión 1: 0
Versión 2: 0

Aprobados: 0


Etapa 4
Dibujo y presentación geográfica de planos de diseño de sistemas de contención vehicular

Versión 0: 0
Versión 1: 0
Versión 2: 0

Aprobados: 0

Total tramos en proceso: 50 tramos en proceso de diseño

TEMA	Comité Rep Legales 5	
FECHA 30/05/2023	HORA 16:15	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

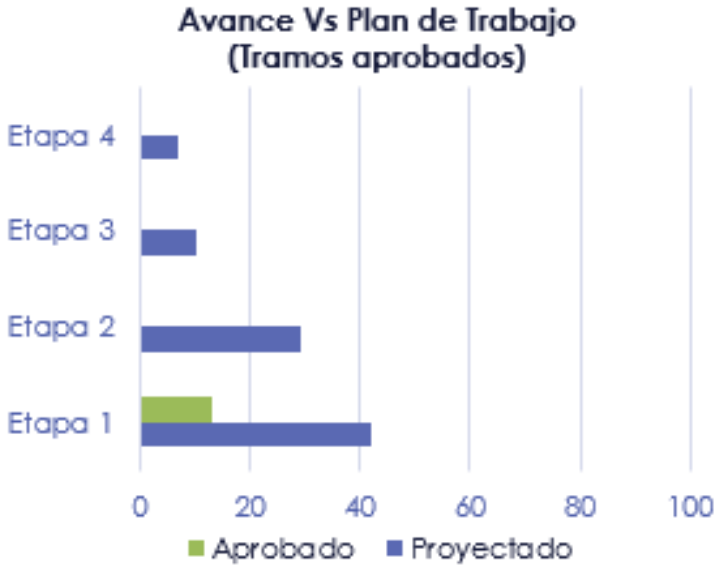

Avance ejecución financiera

Presupuesto total
$853,808,304 (Inc. IVA)


Ejecutado etapa 1: $ 10.570.960
Ejecutado etapa 2: $ 0.0
Ejecutado etapa 3: $ 0.0
Ejecutado etapa 4: $ 0.0

Total ejecutado: $ 10.570.960

Pagado: $ 5.692.055
Por facturar: $ 4.878.905



Por ajustarse con modificación de plan de trabajo concertada

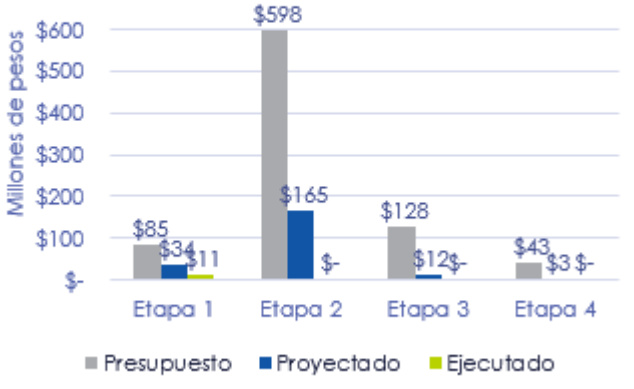

7. Recomendaciones y conclusiones

- Se ha logrado establecer los alcances y presentación de las temáticas en Etapa 1, lo que se ha venido incluyendo en las entregas de los nuevos tramos en el proyecto.

TEMA	Comité Rep Legales 5	
FECHA 30/05/2023	HORA 16:15	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

- Se ha realizado levantamiento topográfico en todos los tramos entregados desde la SDM para trabajo por parte de consultoría.
- Se espera revisión de la organización propuesta para los documentos de Etapa 2, para incluir dicho acuerdo en la producción de las nuevas versiones.
- Hasta la fecha no ha sido descartado ningún tramo de los presentados por la SDM para diagnóstico y diseño.
- Por problemas de seguridad no ha sido posible adelantar actividades de Etapa 1 del tramo 19_21, pero ya se hizo la solicitud ante SDM pidiendo acompañamiento por parte de la policía.

8. **Temas de la SDM**

La supervisión del contrato reitera que está a disposición del consultor para cualquier inquietud o mesa de trabajo que se solicite. Se está revisando la posibilidad del acompañamiento por parte de las autoridades para el punto solicitado.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
N/A	N/A	N/A

APROBADO

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025
