ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 19, semana del 29 de mayo al 04 de JUNIO de 2023; 2022-2025	
FECHA 08/06/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Laura Catalina Henao Corredor	SDM/DIT
Edwin Novoa Arévalo	SDM-DIT
Camilo Ardila	TPD
Jose Fernando Sanchez	TPD
Julieth Chacon Archila	TPD
Luis Nicolai Wilches Palomo	SDM-DIT-SS
Alfredo Ardila	TPD

2. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de generalidades del contrato
2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila
3. Recomendaciones y conclusiones
4. Temas de la SDM – Ingeniero Nicolas Wilches

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de generalidades del contrato

El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:

2. Contrato 2025 de 2022
3. Contratista: TPD Ingeniería S.A.S.
4. Acta de inicio del 16 de enero de 2023
5. Duración: 10 meses

6. Informe de seguimiento de avance semanal

El director del proyecto informa que se Durante la semana reportada se recibieron observaciones al informe de etapa 2 del tramo 11_16, conforme a la mesa de trabajo celebrada el día 01/06/2023 y como resultado de lo concertado en las diferentes mesas de trabajo relacionadas con la elaboración, desarrollo, armonización y socialización de observaciones del producto Etapa 2.
Durante la semana reportada se entregó la atención de observaciones a los informes de etapa 1 de los tramos 3_21, 3_15, 2_36, 1_38, 1_44, 1_45, 11_3, 1_5, 2_27, 3_8, 4_15, 4_16. Durante la semana reportada se presentó los informes de etapa 1 en versión 0 de los tramos 3_43, 3_44, 3_45, 3_46.
Durante la semana reportada se recibieron observaciones a los informes de etapa 1 de los tramos 3_38, 3_37, 3_36, 3_35, 3_34, 3_33, 3_13, 3_5, 5_7, 19_9, 4_7, 4_13, 4_14, 4_17, 4_18, 4_19.
.

TEMA	Comité Semanal 19, semana del 29 de mayo al 04 de JUNIO de 2023; 2022-2025	
FECHA 08/06/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq


Se presenta el avance por metas

Etapa 1 Informe de visita técnica, inventario e identificación de riesgos	Etapa 2 Estudio y diagnóstico de sistemas de contención vehicular	Etapa 3 Diseño de sistemas de contención vehicular	Etapa 4 Dibujo y presentación geográfica de planos de diseño de sistemas de contención vehicular
Versión 0: 17 Versión 1: 10 Versión 2: 10	Versión 0: 5 Versión 1: 0 Versión 2: 2	Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0	Versión 0: 0 Versión 1: 0 Versión 2: 0
Aprobados: 13	Aprobados: 0	Aprobados: 0	Aprobados: 0

Total tramos en proceso: 50 tramos en proceso de diseño

Completos en las 4 Etapas de diseño: 0 tramos finalizados

Total tramos en proceso: 50

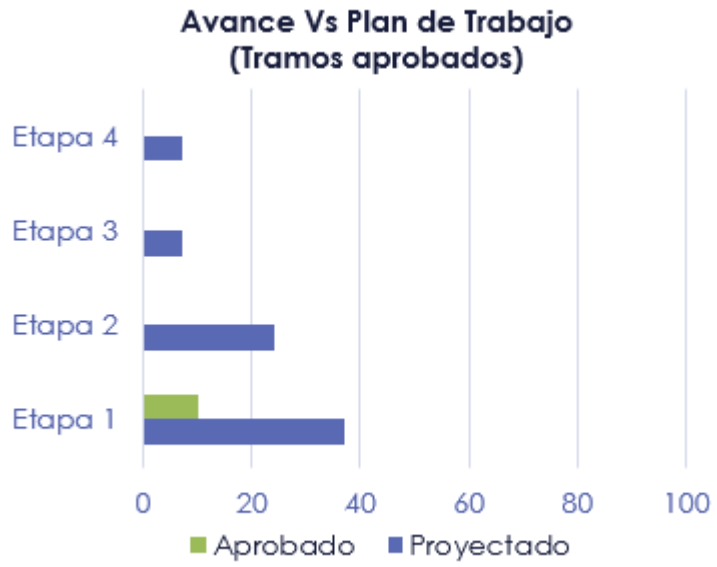


TEMA	Comité Semanal 19, semana del 29 de mayo al 04 de JUNIO de 2023; 2022-2025	
FECHA 08/06/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Avance ejecución financiera

ıpuesto total
.808,304 (Inc. IVA)

tado etapa 1: $ 10.570.960
tado etapa 2: $ 0.0
tado etapa 3: $ 0.0
tado etapa 4: $ 0.0

ejecutado: $ 10.570.960

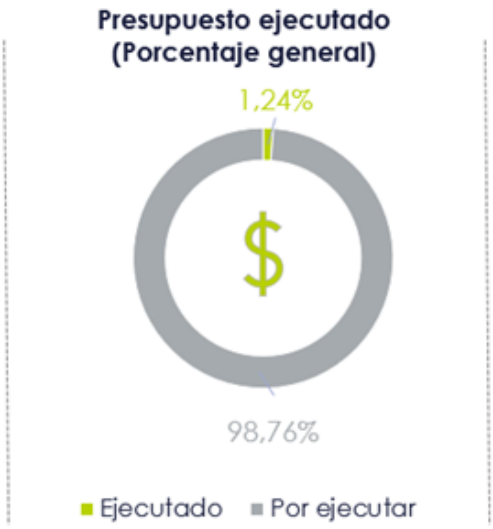



7. Recomendaciones y conclusiones

- Se tiene programado la entrega del informe en versión 0 de la etapa 2 de los tramos 3_23, 3_24, 3_25, 3_26, 3_27 y 3_28, así como la atención de observaciones de los informes adelantados de etapa 2 de los tramos 11_16, 3_32, 5_6, 4_12, 2_73, 18_6 Y 19_20 .
- Se tiene programado la entrega de atención de observaciones de etapa 1 de los tramos 3_38, 3_37, 3_36, 3_35, 3_34, 3_33, 3_13, 3_5, 5_7, 19_9, 4_7, 4_13, 4_14, 4_17, 4_18, 4_19.
- Se tiene programado recibir observaciones o aprobación de los informes de etapa 1 de los tramos 3_21, 3_15, 2_36, 1_38, 1_44, 1_45, 11_3, 1_5, 2_27, 3_8, 4_15, 4_16, 3_40, 3_39, 3_41, 3_42, 3_43, 3_44, 3_45, 3_46.

8. Temas de la SDM

Sin comentarios adicionales.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA	**Comité Semanal 19, semana del 29 de mayo al 04 de JUNIO de 2023; 2022-2025**	
FECHA 08/06/2023	**HORA 07:00**	**LUGAR Virtual :** https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025
