ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 36, semana del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 05/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Laura Catalina Henao Corredor	SDM/DIT
Edwin Novoa Arévalo	SDM-DIT
Camilo Ardila	TPD
José Fernando Sánchez	TPD
Julieth Chacón Archila	TPD
Luis Nicolai Wilches Palomo	SDM-DIT-SS
Alfredo Ardila	TPD

2. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de generalidades del contrato
2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila
3. Recomendaciones y conclusiones
4. Temas de la SDM – Ingeniero Nicolas Wilches

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de generalidades del contrato

El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:

2. Contrato 2025 de 2022
3. Contratista: TPD Ingeniería S.A.S.
4. Acta de inicio del 16 de enero de 2023
5. Duración: 10 meses

6. Informe de seguimiento de avance semanal

Durante la semana reportada se enviaron 4 tramos etapa [1] dando alcance a las precisiones y aclaración de observaciones tratadas en las diferentes mesas de trabajo, tramos 8_26, 2_75, 2_76 y 18_8.
Durante la semana reportada se enviaron 32 tramos etapa [2] acoplados al tramo 3_21 dando alcance a las precisiones y aclaración de observaciones tratadas en las diferentes mesas de trabajo durante los días 10 y 11 de agosto de 2023 así como la atención de observaciones, tramos 3_24, 3_25, 3_26, 3_8, 3_55, 3_58, 3_59, 3_61, 3_63, 3_64, 19_10, 19_22, 19_23, 19_24, 19_25, 19_26, 19_27, 19_28, 19_31, 19_36, 18_7, 2_75, 11_18, 11_19, 3_65, 3_67, 3_69, 11_20, 11_21, 3_70, 19_37 y 3_79.
Durante la semana reportada se envió versión 0 y atención de observaciones de los tramos etapa [3] 18_6, 3_23, 3_27, 3_28, 3_36, 3_35, 3_34, 3_33, 4_16, 4_13, 4_17, 4_19, 3_39, 3_40, 3_41, 3_42, 3_45, 3_46, 3_51, 3_52, 3_54, 19_29, 2_74, 19_32, 19_33 [25_tramos].


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0


TEMA	Comité Semanal 36, semana del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 05/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Se presenta el avance por metas



Total tramos en proceso: 50

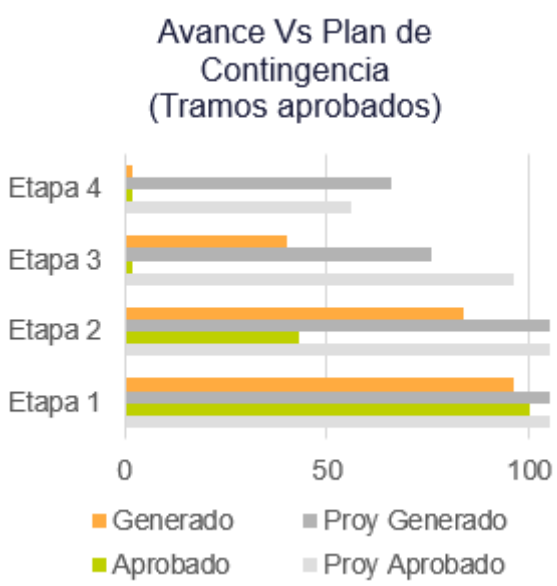

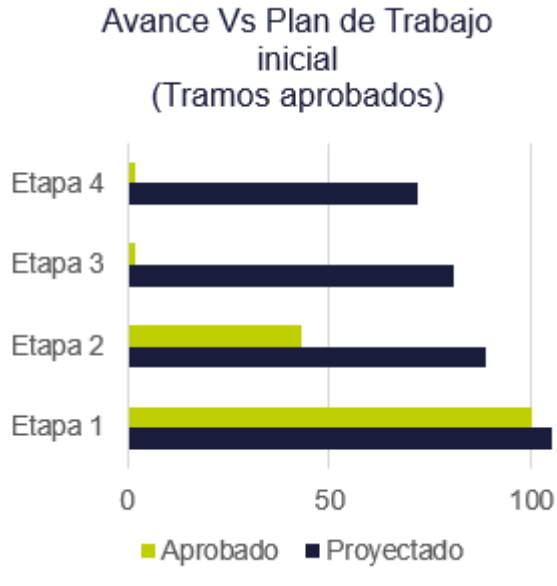

Avance ejecución financiera

TEMA	Comité Semanal 36, semana del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 05/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Presupuesto total

$853,808,304 (Inc. IVA)


Ejecutado etapa 1:$81.315.077

Ejecutado etapa 2: $244.758.380

Ejecutado etapa 3: $2.439.452

Ejecutado etapa 4: $813.151

Total ejecutado: $ 329.326.060

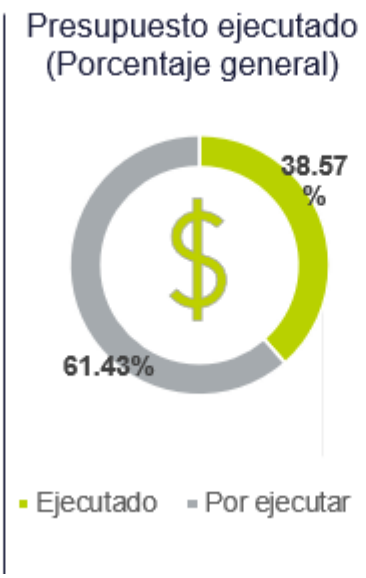



7. **Recomendaciones y conclusiones**

- Se tiene programado la entrega del producto en versión 0 de la etapa 3 de tramos en proceso
- Se tiene programado la entrega del producto en versión 0 de la etapa 1 del tramo 3_72 [1 Tramo].
- Se tiene programado la entrega de 25 informes etapa [2] acoplados al tramo 3_21 dando alcance a las precisiones y aclaración de observaciones tratadas en las diferentes mesas de trabajo durante los días 10 y 11 de agosto de 2023 así como la atención de observaciones, tramos 11_16, 2_36, 1_45, 11_3, 2_27, 4_15, 19_21, 19_9, 4_7, 8_26, 8_26, 19_34, 2_76, 3_66, 3_68, 11_22, 11_23, 3_71, 3_73, 3_74, 3_75, 3_76, 3_77, 18_8, 5_8.
- La semana reportada no tiene mayores cambios en los números de aprobación, debido al énfasis en producción de faltantes. La semana en curso y la siguiente se enfocarán en aprobación para el corte.
- Se propone realizar mesas de trabajo una vez entregados los informes de etapa 2 anunciados con el fin de lograr las aprobaciones programadas previo al corte del próximo 15 de octubre.
- Para la revisión de los entregables de Etapa 3 por venir, se propone la realización de mesa de trabajo conjunta con el fin de acordar ajustes que permitan cerrar los diseños en la siguiente versión entregada. (Requiere alta disponibilidad)
-

8. **Temas de la SDM**

La entidad menciona que aún no se ha enviado la comunicación que se había anunciado previamente sobre el avance en relación con el plan de contingencia, pero que dicha comunicación se sigue trabajando internamente en la entidad.
Sin embargo, se considera que el avance ha sido bueno en las últimas semanas.
Se solicita que la mesa de trabajo solicitada por el consultor para mesa 3 se haga después de las observaciones

TEMA	Comité Semanal 36, semana del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 05/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

enviadas por parte de la entidad en los tramos. Se menciona por parte del contratista que en la mesa de trabajo del martes previo se evidenciaron algunos temas que ya debían haber sido ajustados, pero también algunas observaciones que por parte de la entidad no aplicaban a los entregables revisados.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Revisar la atención de observaciones a Etapa 3 para solicitar la mesa de trabajo.	TPD-SDM	NA

APROBADO

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025
