ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 39, semana del 16 de octubre al 22 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 26/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Laura Catalina Henao Corredor	SDM/DIT
Edwin Novoa Arévalo	SDM-DIT
Camilo Ardila	TPD
Jose Fernando Sanchez	TPD
Julieth Chacon Archila	TPD
Luis Nicolai Wilches Palomo	SDM-DIT-SS
Alfredo Ardila	TPD

2. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de generalidades del contrato
2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila
3. Recomendaciones y conclusiones
4. Temas de la SDM – Ingeniero Nicolas Wilches

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de generalidades del contrato


El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:

2. Contrato 2025 de 2022
3. Contratista: TPD Ingeniería S.A.S.
4. Acta de inicio del 16 de enero de 2023
5. Duración: 10 meses


6. Informe de seguimiento de avance semanal

Durante la semana reportada se recibieron aprobaciones de los tramos etapa [2] 3_26, 3_63, 3_64, 19_27, 19_28, 2_75, 3_67, 11_20, 11_21, 11_22, 3_71, 3_73, 3_75, 3_76, 3_77, 19_37 y 5_8, [17_tramos] para comenzar etapa 3.
Durante la semana reportada se recibió aprobación del tramo etapa [3] 3_23, [1_tramo] para comenzar etapa 4.
Durante la semana reportada se enviaron 17 tramos etapa [2], tramos 11_16, 2_36, 1_45, 3_8, 4_15, 19_21, 4_7, 8_26, 8_26, 19_34, 2_76, 3_66, 3_68, 3_69, 11_23, 3_74 y 18_8.
Durante la semana reportada se envió versión 0 y atención a observaciones recibidas de los tramos etapa [3] 3_32, 4_12, 2_73, 3_25, 3_28, 3_38, 3_36, 3_33, 3_13, 3_5, 1_38, 1_44, 4_13, 4_19, 3_43, 3_44, 3_46, 3_50, 3_51, 3_52, 3_54, 19_31 y 19_33 [23_tramos].

TEMA	Comité Semanal 39, semana del 16 de octubre al 22 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 26/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

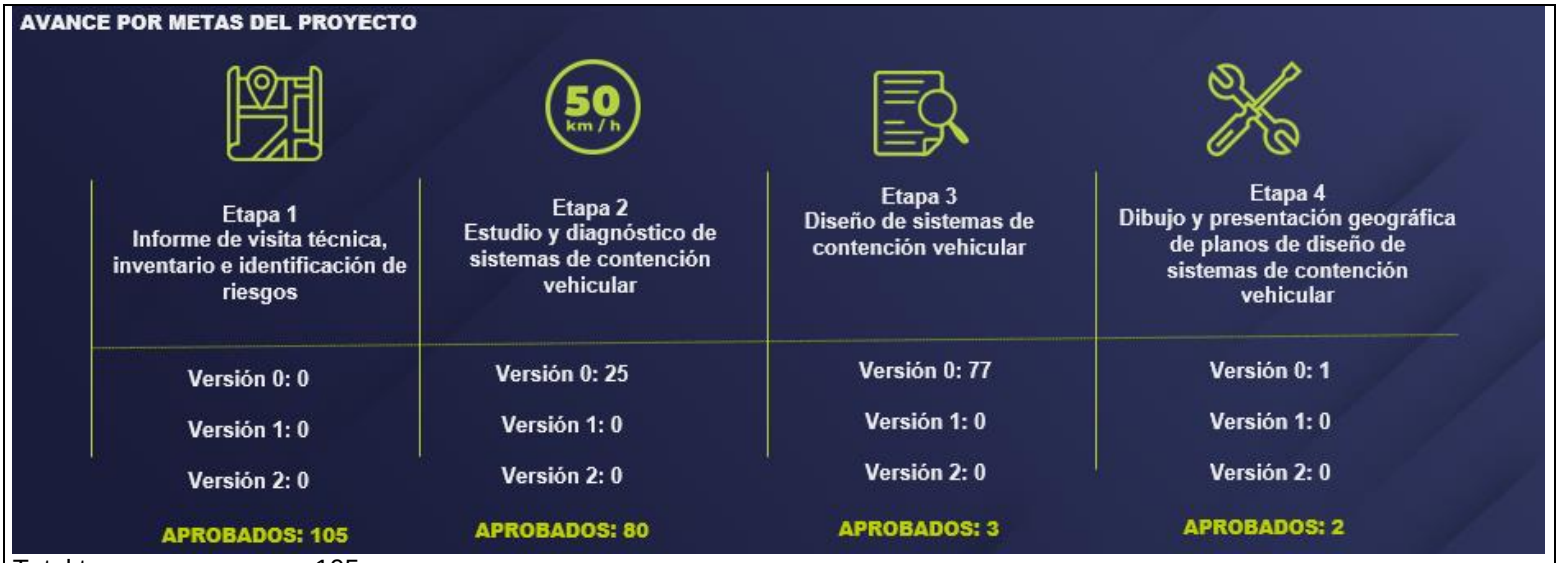

Total tramos en proceso: 105

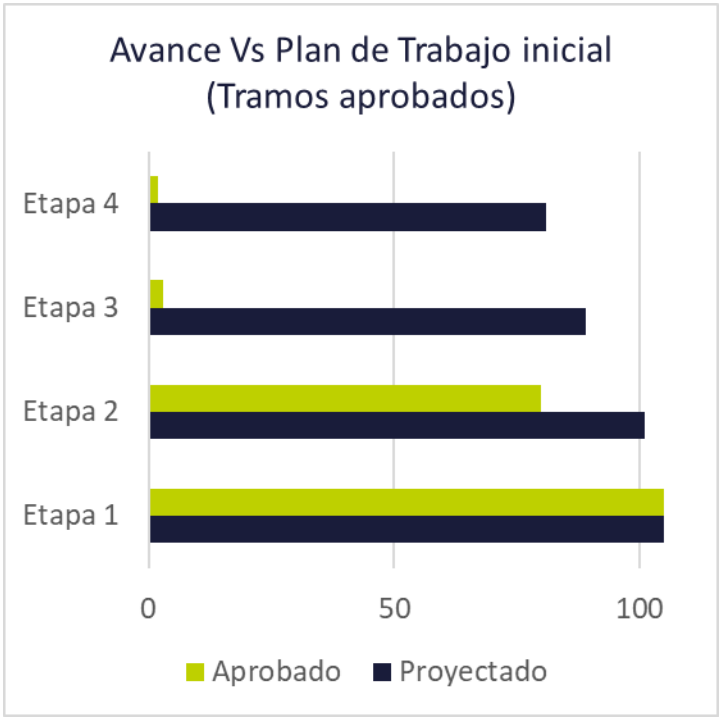

Avance ejecución financiera

TEMA	Comité Semanal 39, semana del 16 de octubre al 22 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 26/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Presupuesto total

$853,808,304 (Inc. IVA)


Ejecutado etapa 1:$85.380.830


Ejecutado etapa 2: $455.364.429

Ejecutado etapa 3: $3.659.178

Ejecutado etapa 4: $813.151

Total ejecutado: $ 545.217.588

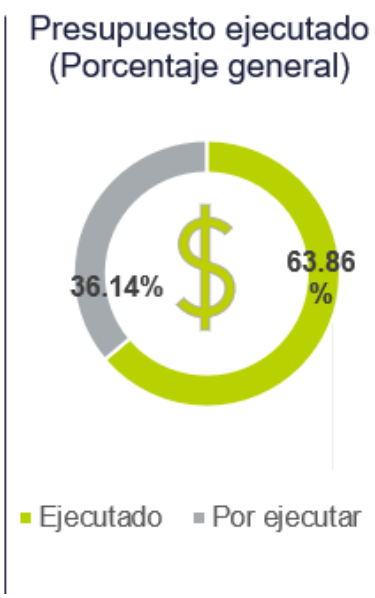

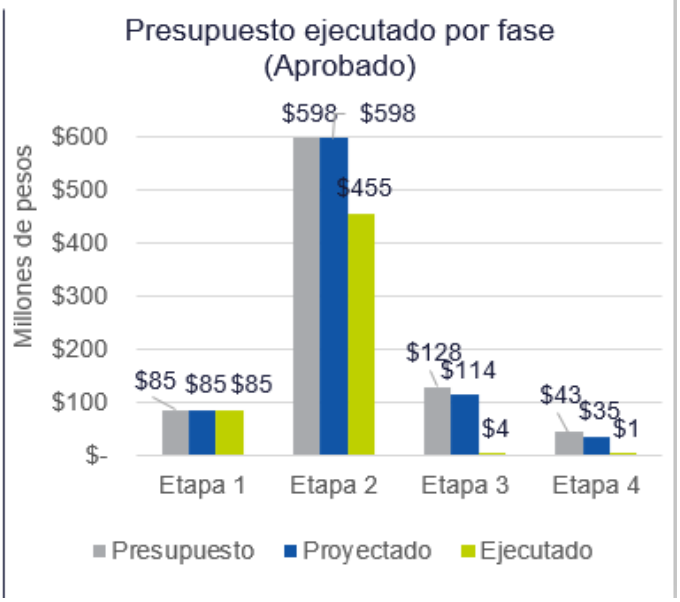

7. **Recomendaciones y conclusiones**

- Se tiene programado la entrega del producto en versión 0 de la etapa 3 de tramos en proceso
- Se tiene programado la entrega de 3 informes etapa [2] acoplados al tramo 3_21 dando alcance a las precisiones y aclaración de observaciones tratadas en las diferentes mesas de trabajo durante los días 10 y 11 de agosto de 2023 así como la atención de observaciones, tramos 11_3, 2_27 y 19_9.
- Se propone iniciar con la realización de mesas de trabajo para Etapa 3, con el fin de agilizar la generación de los ajustes en cada entregable. Se propone agenda diaria por los próximos 12 días.

El objeto es cerrar Etapa 3 antes del 15 de noviembre cierre del proyecto.

El equipo se esta ampliando para que se pueda cerrar esta etapa antes de la culminación

Se recibió el apremio al cual se genero respuesta ayer en línea con el primero

Se recibió correo dese el equipo SIG con situación en línea con lo ya conversado, con tramos de Choachí

8. **Temas de la SDM**

La entidad menciona que ellos siguen enviando directamente a Etapa 4 lo que va quedando aprobado en Etapa 3 para que el equipo SIG proceda a la revisión. Se menciona tiene un buen avance en lo últimos días y que se ha evidenciado un proceso acelerado en la atención de observaciones y generación de Etapa 3, lo que ha permitido buen número de aprobaciones.

En este momento no se considera pertinente mesa de trabajo en Etapa 3, como lo ha solicitado la consultoría, ya que se quiere concentrar en las revisiones realizadas por parte del equipo de la SDM de lo ya enviado por el consultor.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 39, semana del 16 de octubre al 22 de octubre de 2023; 2022-2025	
FECHA 26/10/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Se menciona desde la supervisión del contrato que se ha llevado el mensaje a las directivas de un buen avance en los últimos días, lo que genera un balance positivo para las semanas que quedan del contrato en relación con la culminación de las labores pendientes. Se anuncia que el día de hoy se tiene prevista una reunión con el equipo legal para revisar la posibilidad de la prórroga solicitada por el consultor en los oficios respuesta a los apremios enviados por la entidad.

En esta línea, el consultor menciona que se prevé que las últimas generaciones de Etapa 3 se realicen la próxima semana, una vez estén aprobados los últimos tramos de Etapa 2. Y que el mensaje que se debe llevar al equipo legal en relación con la prorroga es que esta está más asociada a la revisión de Etapa 4 que a la generación de productos, ya que todos los productos se proyecta que estén generados antes de la fecha de terminación del contrato.

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025
