Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA**	Código.: SIVEYC.FTO.35-1 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

CONTRATO No.: GN3046-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS CON MAQUINARIA PESADA EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, GENERADAS POR LA PRIMERA TEMPORADA INVERNAL 2023"

INFORME DE SUPERVISION No.: 2

PERIODO: 31/10/2023 AL 30/11/2023

San Juan de Pasto, 30 noviembre de 2023

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:	30/11/2023		CON CORTE :		30/11/2023
1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS					
PROCESO LICITATORIO:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?c				
CONVENIO MACRO No:	GN3046-2023				
CDP No.:	2023050210	FECHA:	16 MAYO DE 2023	$	142.676.414
CDP No.:	2023000521	FECHA:	5 MAYO DE 2023	$	5.000.000
REGISTRO No:	2023060359	FECHA:	9 JUNIO DE 2023	$	142.676.414
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS CON MAQUINARIA PESADA EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, GENERADAS POR LA PRIMERA TEMPORADA INVERNAL 2023"				
CONTRATISTA DE OBRA:	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO				
SUPERVISOR	SONIA ALEJANDRA VELASCO				
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	LUIS EDUARDO VILLARREAL				
VALOR DEL CONTRATO:	$ 147.676.413,54				
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 147.676.413,54				
FECHA DE INICIACION:	31 JULIO DE 2023				
PLAZO DEL CONTRATO:	5 MESES				
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DICIEMBRE DE 2023				
PORCENTEJE ANTICIPO	40%				
TOTAL ANTICIPO	$ 59.070.565,42				
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ 147.676.413,54				
GARANTIAS:	ASEGURADORA SOLIDARIA				
Póliza No.:	346-47-994000058718				
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	100,00%	% EJECUTADO:		100%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	100,00%	% EJECUTADO		100,00%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35- Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: Tras revisar las actividades ejecutadas por el contratista, se constata que se llevaron a cabo las labores de movimiento de tierras que obstaculizaban el paso vehicular, así como el dragado y la conformación de diques para dirigir el río y prevenir la socavación de las vías afectadas. Estas acciones se realizaron dentro del plazo establecido, utilizando la maquinaria especificada en el contrato y en concordancia con los parámetros de los anexos técnicos.

Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de la documentación técnica, la disposición de recursos humanos técnicos y administrativos, así como la correcta liquidación de todos los impuestos y retenciones conforme a la normativa vigente. Con estos aspectos cubiertos, se concluye de manera satisfactoria el desarrollo y la ejecución del proyecto.

ASPECTOS FINANCIEROS : Se realiza el pago correspondiente al anticipo por el 40% del aporte de la gobernación de Nariño que equivale a 57'070.565,42 pesos con registro de egreso No. 2023008294 de 22 de agosto de 2023

Se encuentra en tramite segundo desembolso y pago final de la siguiente forma:

VALOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	$ 147'676.413,54
VALOR APORTE DEPTO OBRA CIVIL:	$ 129'960.168,74
VALOR APORTE DEPTO OBRA INTERVENTORIA	$ 12'716.244,80
VALOR EJECUTADO APORTE DEPTO:	$ 142'676.413,54
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 57'070.565,42
VALOR DESEMBOLSO FINAL:	**$ 85'605.848,12**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : El municipio liquida a satisfacción los contratos derivados contratados para cumplir con el alcance del convenio.

CONTRATISTA DE OBRA N° 103.1 - 20-10-08 ASOCIACIÓN ARENAS DEL MAYO - NIT 900849479-3
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA N° UM 103.1 -20-10-09 DANIEL SEBASTIÁN RIASCOS MONTILLA CC. 1087960922

ASPECTOS LEGALES : Certificado de legalización 19 de julio de 2023
Se suscribe acta de inicio el dia 31 de julio de 2023
La ejecución del contrato se realizo dentro de los parametros legales y cumplimiento de las obligaciones pactadas, por lo cual se suscribre acta de desembolso final del convenio, donde se certifica la terminación del mismo con fecha de 30 de noviembre de 2023.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Recomendaciones:
1. Evaluación Continua de Desempeño: Se sugiere implementar un sistema de evaluación continua del desempeño de la maquinaria alquilada. Esto puede incluir inspecciones periódicas, mantenimiento preventivo y registros detallados de la productividad para garantizar un rendimiento óptimo.
2. Actualización de Documentación: Mantener actualizada toda la documentación relacionada con la maquinaria, incluyendo certificados de seguro, informes de inspección y cualquier otra documentación legal y técnica relevante.

Conclusiones:
1. Satisfacción de Obligaciones Contractuales: El contratista ha cumplido de manera satisfactoria con todas las obligaciones contractuales, llevando a cabo las labores de mantenimiento de vías de acuerdo con los términos, condiciones y maquinaria estipulados en el contrato.
2. Rendimiento Eficiente de la Maquinaria: La maquinaria alquilada ha demostrado un rendimiento eficiente y confiable durante el período de alquiler, contribuyendo de manera significativa al éxito de las operaciones de mantenimiento de vías.
3. Cumplimiento de Normativas y Seguridad: Se destaca el compromiso continuo con el cumplimiento de normativas y estándares de seguridad, asegurando un entorno de trabajo seguro y el cumplimiento de regulaciones medioambientales.
4. Eficiencia en la Administración de Recursos: La eficiencia en la administración de recursos, incluyendo el personal técnico y administrativo, ha contribuido al logro de los objetivos del proyecto de mantenimiento de vías.

En general, se considera que la ejecución del contrato ha sido exitosa, y se espera que estas recomendaciones contribuyan a mantener altos estándares en futuras colaboraciones entre las partes involucradas.

Proyecto: Luis Eduardo Villarreal Enriquez
Contratista Profesional - SIMD
Apoyo a la Supervisión - Gobernacion de Nariño

Revisó: Jorge Rene Artega Palacios
Sub- Secretario de Infraestructira y Vias - SIMD
Gobernacion de Nariño

Revisó: Sonia Alejandra Velasco Rodriguez
Secretaria de Infraestructira y Minas - SIMD
Gobernacion de Nariño

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - REGISTRO FOTOGRAFICO	Código.: SIVEYC.FTO.35-4 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto1: SAN PABLO - VEREDA LAS JUNTAS - SECTOR PUENTE RIO MAYO

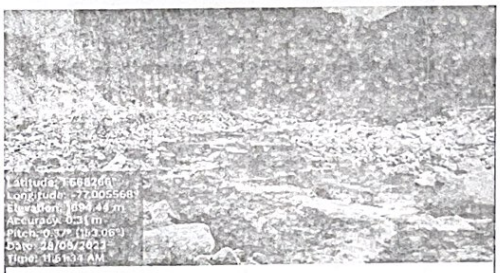


Foto2: SAN PABLO - VEREDA LAS JUNTAS - SECTOR PUENTE RIO MAYO

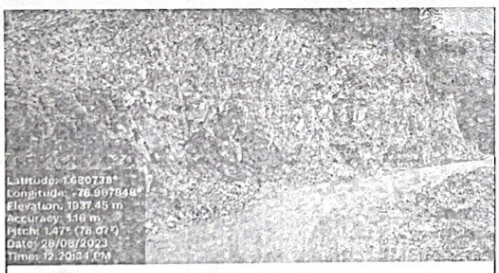


Foto3: SAN PABLO - VEREDA PRADITOS - SECTOR EL GUAYABO

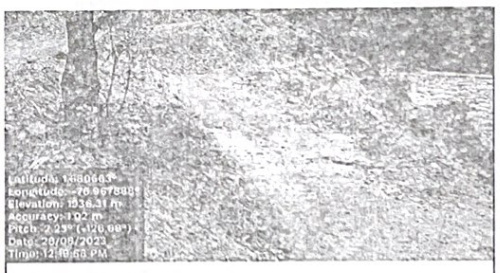


Foto4: SAN PABLO - VEREDA PRADITOS - SECTOR EL GUAYABO

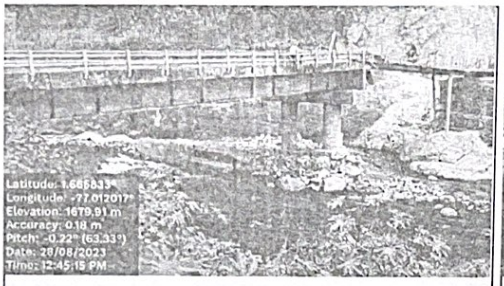


Foto5: SAN PABLO - VEREDA LA VEGA QUITO - SECTOR PUENTE RIO MAYO



Foto6:SAN PABLO - VEREDA LA VEGA QUITO - SECTOR PUENTE RIO MAYO



Foto7: SAN PABLO - VEREDA PLAYA BAJA - SECTOR TARABITA

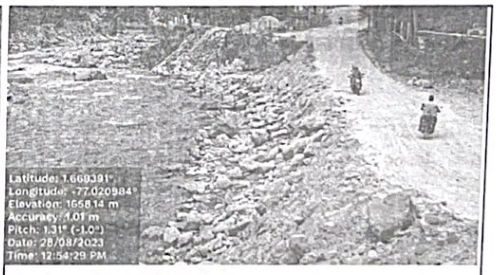


Foto8: SAN PABLO - VEREDA PLAYA BAJA - SECTOR TARABITA

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO.35-5 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	GN3046-2023

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO	22/08/2023	$ 57.070.565,42			$ 59.070.565,42	$ 59.070.565,42	$ 0,00	2023008294	22/08/2023
Acta Final No 01	1/12/2023	$ 142.676.413,54	$ 199.746.978,96	$ 57.070.565,42	$ 85.605.848,12	$ 85.605.848,12	$ 0,00		
TOTAL		$ 142.676.413,54		$ 57.070.565,42	$ 144.676.413,54		$ 0,00		

AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	100%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO.35-6 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No GN3046-2023

GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria
Póliza No.:	346-47-994000058718

ANEXO 0	FECHA APROBACION	13/06/2023	FECHA EXPEDICION	13/06/2023	

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 44.302.924	30%	9-jun-23	9-may-24		160
Buen manejo de Anticipado	$ 44.302.924	30%	9-jun-23	9-may-24		160

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO	FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 44.302.924	30%	9-jun-23	9-may-24	Actulizacion Acta Incio	160
Buen manejo de Anticipado	$ 44.302.924	30%	9-jun-23	9-may-24	Actulizacion Acta Incio	160


Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION	Código.: SIVEYC.FTO.35-7 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION (ESTADO FINAL)

CONTRATO No.: GN3046-2023

CAP.	ACT	DETALLE -ACTIVIDADES	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	1	Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1,5 m3	$ 29.389.906,00	$ 29.389.906,00	$ -	0%
2	2	Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm y una altura de 5.680 mm	$ 27.454.800,00	$ 27.454.800,00	$ -	0%
3	3	Transporte de Equipo en Camión	$ 2.061.900,00	$ 2.061.900,00	$ -	0%
4	4	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton	$ 31.177.069,00	$ 31.177.069,00	$ -	0%
5	5	Transporte de material proveniente de derrumbes	$ 13.731.839,42	$ 13.731.839,42	$ -	0%
		COSTO TOTAL	**$ 103.815.514,42**	**$ 103.815.514,42**	$ -	0%

INSERTAR GRAFICO DE BARRAS

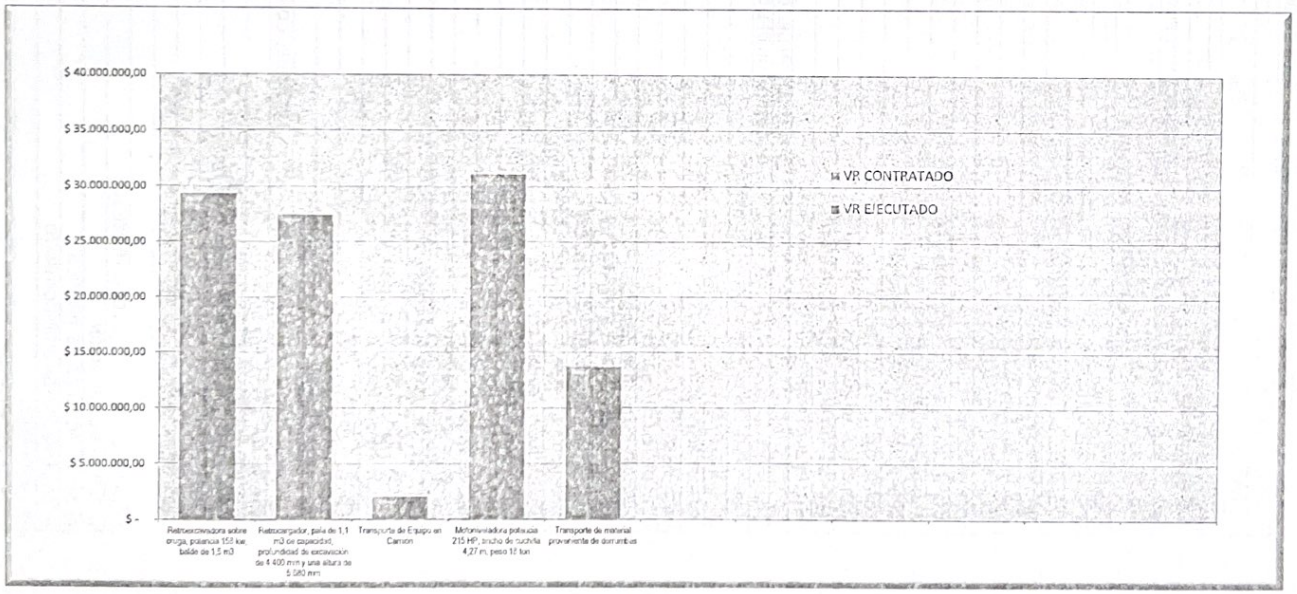

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Código.: SIVEYC.FTO.17 Versión: 1.0
	FORMATO: LISTA DE CHEQUEO PARA RECIBO DE CONVENIO Y CONTRATOS	Vig: 23/02/15

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONVENIO Y / O CONTRATO No. : GN3046-2023

FECHA DE REVISION:

DOCUMENTOS DEL CONVENIO

DESCRIPCION DEL REQUISITO	SI	NO	NO APLICA
PROYECTO INICIAL	X		
ACTA DE INICIO	X		
POLIZA ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO	X		
APROBACION DE POLIZA	X		
ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL			X
ACTA DE RECIBO EN SITIO	X		
ACTA DE DESEMBOLSO FINAL	X		
ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD DEL CONVENIO	X		
VALORACION APORTE MUNICIPIO			
VALORACION APORTE COMUNIDAD			
COMPROBANTES DE EGRESO	X		
EXTRACTOS BANCARIOS			X
BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO	X		
ACTA RESUMEN DE EJECUCION CONVENIO	X		
INFORMACION DEL CONTRATO			
DOCUMENTOS DEL CONTRATO			
ACUERDO DE INCORPORACION DE RECURSOS	X		
ESTUDIOS PREVIOS	X		
ACTA DE APERTURA PROCESO			X
INFORME DE EVALUACION			X
ACTA DE ADJUDICACION	X		
DISPONBILIDADES DEL MUNICIPIO	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO	X		
CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO	X		
PROPUESTA DEL CONTRATISTA DEL MUNICIPIO	X		
CRONOGRAMA APROBADO	X		
ADICIONAL EN TIEMPO			X
ADICONAL EN VALOR	X		
POLIZAS INICIAL			X
APROBACION DE POLIZA			X
POLIZA ACTULAIZADA ACTA DE INICIO			X
APROBACION DE POLIZA			X
POLIZA PARA ADICIONAL			X
APROBACION DE POLIZA			X
POLIZA ESTABILIDAD			X
APROBACION DE POLIZA DE ESTABILIDAD			X
ACTAS DEL CONTRATO			
ACTA INICIO	X		
ACTA DE CONFORMACION COMITÉ VEEDOR	X		
ACTA SUSPENSION			X
ACTA REINICIO			X
PREACTA	X		
ACTAS PARCIALES	X		
ACTA DE CONFORMACION COMITÉ VEEDOR	X		
ACTAS DE MODIFICACION			X
ACTAS DE ACUERDO DE PRECIOS			X
ACTA DE RECIBO EN SITIO CONTRATO			X
PREACTA FINAL	X		
ACTA DE RECIBO FINAL	X		
ACTA RESUMEN DE EJECUCION DE OBRA	X		

ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD CONTRATO	X		
ACTA LIQUIDACION CONTRATO	X		
DOCUMENTACION FINANCIERA			
COMPROBANTES DE EGRESO	X		
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	X		
SOPORTES DE PAGO SENA Y FIC	X		
DOCUMENTOS TECNICOS			
INFORMES DE INTERVENTORIA MENSUALES	X		
INFORMES DE INTERVENTORIA SEMANALES	X		
INFORMES DE VISITA DE SUPERVISIÓN	X		
RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO	X		
FOTOGRAFIA VALLA			X
BITACORA	X		
PAGOS DE SEGUNRIDAD SOCIAL	X		
CERTIFICACION DEL INTERVENTOR DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
CERTIFICACION DEL INTERVENTOR DE CALIDAD Y ESPECIFICACION DE MATERIALES			X
