FECHA DE ELABORACIÓN	30/NOVIEMBRE/2023		INFORME No.	08
TIPO DE INFORME	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO DE OBRA No.	2223-2022			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	0176-2023			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/2023		FECHA ACTA DE INICIO	24/02/2023
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."			
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL BUENOS AIRES 2023		NIT. No.	901.612.242-0
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALBERTO MARÍN MORALES		C.C. No.	5´577.128
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS		NIT. No.	901.666.013-2
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA		C.C. No.	80'037.941
SUPERVISOR	ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO		CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

VALOR	INICIAL		$ 2.320´220.350,0	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
		N/A	N/A	N/A
	MODIFICATORIO No. 01		N/A	
PLAZO	INICIAL		TRECE (13) MESES	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	FECHA
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES		No.	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACIÓN
		N/A	N/A	N/A

PÓLIZAS CONTRATO INICIAL				
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL No. 3872 DE 2022				
Póliza de cumplimiento No: 15-44-101273310 del 28 de diciembre de 2022. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 3872 de 2022.				
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A. Nit. 860.009.578-6	23-12-2022	23-05-2024	$ 464´044.070,00
Calidad del servicio		23-12-2022	23-01-2029	$ 232´022.035,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		23-12-2022	23-01-2027	$ 116´011.018,00
PÓLIZAS OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0176-2023				
GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza de cumplimiento No: 15-44-101273310 del 16 de enero de 2023. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 0176 de 2023.				
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A. Nit. 860.009.578-6	10-01-2023	10-06-2024	$ 464´044.070,00
Calidad del servicio		10-02-2024	10-02-2029	$ 232´022.035,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		10-01-2023	10-02-2027	$ 116´011.018,00

Nota: El contrato suscrito se perfeccionó con la firma electrónica de la parte contratante el día 10 de enero de 2023, pero el clausulado complementario contenía el número 3872-2022 que correspondía a la vigencia pasada (2022), por tal motivo se hace necesario aclarar que, para todos los efectos, el número de contrato asignado corresponde al 0176-2023.

PÓLIZAS ACTA DE INICIO				
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza de cumplimiento No: 15-44-101273310 del 2 de marzo de 2023. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 0176 de 2023.				
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A. Nit. 860.009.578-6	24-02-2023	25-07-2024	$ 464´044.070,00
Calidad del servicio		26-03-2024	27-03-2029	$ 232´022.035,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		24-02-2023	27-03-2027	$ 116´011.018,00

REGISTRO PRESUPUESTAL	No.	FECHA	VALOR	VALOR EJECUTADO
	41523	22/02/2023	$2.320´220.350	$ 223´580.003

De conformidad con el Inciso 4 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría.

Según las labores desarrolladas por el suscrito Supervisor y los documentos y actas entregados por el apoyo a la supervisión de la Gobernación del Cauca se presenta la siguiente información:

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (Reuniones, socializaciones, comités y/o visitas realizadas)

FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
24 OCTUBRE A 23 DE NOV. DE 2023	El avance del proyecto es el siguiente: Actividades de localización y replanteo con un alcance desde la abscisa k12+440 al k23+560; las actividades de explanación de la vía cuentan con un avance desde la abscisa k13+350 al k14+510, del k15+120 al k16+610, del k16+680 al k18+570, del k19+000 al k19+200, del k19+400 al k21+520 y del k21+710 al k23+580. Construcción de terraplen para mejoramiento de subrasante desde la abscisa k13+350 al k14+510, del k15+120 al k16+610, del k16+680 al k18+570, del k19+000 al k19+200, del k19+400 al k21+520 y del k21+700 al k23+560. Instalación de subbase granular desde el k15+120 al k16+500, del k16+680 al k17+300, del k19+730 al k21+520 y del k22+130 al k23+350, instalación de base granular desde la abscisa k19+730 al k21+520 y del k22+200 al k23+350. Instalación de mezcla asfáltica desde la abscisa k19+800 al k20+310, del k20+379 al k21+555, del k22+202 al k23+330 lado derecho y del k19+900 al k21+555 y k22+242 al k23+335 lado izquierdo. Construcción de veintiocho (28) alcantarillas de las cincuenta y seis (56) proyectas. Construcción zarpa, dentellón y vástago de muros ubicados desde la abscisa k15+533 al k15+580 izq talud; del k17+322 al k17+329 izq; del k17+588 al k17+623 der; del k18+057 al k18+063 izq; del k18+400 al k18+467 izq; del k19+465 al k19+483 izq; del k19+500 al k19+549 izq, del k19+525 al k19+536 der; del k19+568 al k19+574 izq; del k19+580 al k19+590 der; del k19+586 al k19+606 izq; del	Para el periodo de ejecución, que va hasta el 23 de noviembre de 2023, se tiene un plazo de 9 meses transcurrido de los 12 pactados contractualmente para un total de plazo transcurrido del 74.8%, para lo cual el Contratista presenta un avance de ejecución físico-financiera acumulado del 52.73% que corresponde $ 20.455´4 millones contra un porcentaje de obra programada acumulada del 63.17% que corresponde a un valor de $ 24.504´6 millones, de acuerdo con el Programa de Inversiones Vigente; este avance está representado en las siguientes actividades: localización y replanteo, totalidad de la explanación para la ampliación de la vía, obras de drenaje representado en construcción de alcantarillas y subdrenes longitudinales, conformación de subrasante y terraplenes, así como la construcción de las estructura de pavimento: capas de subbase granular, base granular así como la extensión de carpeta asfáltica en una longitud de 2870 ml para un porcentaje de avance en esta actividad del 27.5%, construcción de muros de contención y cunetas, además se avanza en la construcción del puente vehicular sobre quebrada grande, obras de mitigación ambientales y sociales, implementación del plan de manejo de tránsito. Las lluvias presentadas en los meses de octubre y noviembre que afectaron los rendimientos en las actividades de obra

	k19+607 al k19+620 der; del k19+632 al k19+645 der; del k19+705 al k19+730 der; del k20+244 al k20+285 izq; k20+438 al k20+454 der; del k20+491 al k20+503 der; del k20+575 al k20+650 der; del k20+570 al k20+570 der; del k20+594 al k20+619 izq; del k20+770 al k20+790 izq; del k20+833 al k20+845 izq; del k20+865 al k20+925 izq; del k20+968 al k20+993 izq; del k21+040 al k21+090 izq; del k21+230 al k21+244 izq; del k21+260 al k21+275 izq; del k21+351 al k21+358 izq; del k21+420 al k21+500 izq; del k21+830 al k21+850 der; del k21+872 al k21+880 der; del k21+885 al k21+900 der; del k21+897 al k21+950 izq talud; del k21+867 al k22+010 izq talud; del k22+078 al k22+085 der; del k22+095 al k22+161 der; del k22+161 al k22+167 der; del k22+396 al k22+402 izq; del k22+445 al k22+465 izq; del k22+528 al k22+552 izq; del k22+884 al k22+908 der; del k23+105 al k23+125 der y del k23+133 al k23+139 der. Construcción de 6107 ml de subdren longitudinal en los tramos requeridos entre las abscisas k15+120 al k15+960, del k16+680 al k18+376, del k19+100 al k19+180, del k19+790 al k21+350 y del k22+135 al k23+455. Instalación de tubería de 36" de diámetro en cuerpo completo en veintiocho (28) alcantarillas. Construcción de cunetas desde la abscisa k20+597 al k21+346, del k22+217 al k23+295 lado derecho y del k22+240 al k23+307 lado izquierdo. Construcción de estribos 1 y 2, losas de aproximación, muros espaldar, topes sísmicos, vigas 1, 2, 3 y 4, riostras en los estribos 1 y 2, riostra central y losa del pónton ubicado sobre la quebrada grande en la abscisa k23+460.	especialmente en el K23+436 – Puente Quebrada Grande, fue necesario la implementación de acciones inmediatas como remoción de derrumbes, conformación del paso provisional por la quebrada Grande y protección de la subrasante con material de terraplén, esto con el fin de mantener el paso por todo el corredor en intervención. La Interventoría y Contratista de obra presentaron para revisión y fines pertinentes de la Entidad Contratante, la solicitud formal de ADICIÓN Y AJUSTE No. 1 al contrato de obra No. 2223 DE 2022 y el contrato de Interventoría No. 0176-2023, por medio de la comunicación No. C01762023 – CIP – 072 con fecha 19 de octubre de 2023, en donde por la situación geomorfológica de la zona, sumado a la intensa ola invernal presentada en la región, se han acelerado los procesos erosivos en el corredor vial intervenido, resultando 5 sitios críticos los cuales presentan situaciones particulares de inestabilidad de la banca existente y grandes movimientos en masa, que deben ser atendidos en aras de velar por la estabilidad del proyecto y como medida provisional se ha evitado la intervención en estos sitios.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

2.2.1. RECURSOS COMPROMETIDOS

ENTIDAD	NACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL
Recursos iniciales	$2.320´220.350				$2.320´220.350
Recursos adicionales					
Total recursos comprometidos					$2.320´220.350

2.2.2. MANEJO DEL ANTICIPO

ENTIDAD	NACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL
Anticipo entregado	N/A				
Anticipo amortizado	N/A				
Anticipo sin amortizar	N/A				

2.2.3. BALANCE DE PAGOS

ACTA DE PAGO No.	FECHA	VALOR ACTA / DESEMBOLSO
1	23/03/2023	$ 108´100.851
2	23/04/2023	$ 115´479.152
3	23/05/2023	$ 103´367.602
4	23/06/2023	$ 115´618.364
5	08/08/2023	$ 192´221.333
6	23/09/2023	$ 201´966.257
7	23/10/2023	$ 141.929.664
8	23/11/2023	$ 140´537.532
TOTALES		**$ 1.119´220.755**
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.320´220.350,00**

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

3. ANEXOS Y OBSERVACIONES

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 24 de octubre al 23 de noviembre de 2023, se presentan lluvias aisladas moderadas a fuertes generando derrumbes y emergencias en la vía las cuales fueron atendidas por el contratista de obra.

Para el periodo de ejecución, que va hasta el 23 de noviembre de 2023, se tiene un plazo de 9 meses transcurrido de los 12 pactados contractualmente para un total de plazo transcurrido del 74.8%, para lo cual el Contratista presenta un avance de ejecución físico-financiera acumulado del 52.73% que corresponde $ 20.455´4 millones contra un porcentaje de obra programada acumulada del 63.17% que corresponde a un valor de $ 24.504´6 millones, de acuerdo con el Programa de Inversiones Vigente; este avance está representado en las siguientes actividades: localización y replanteo, totalidad de la explanación para la ampliación de la vía, obras de drenaje representado en construcción de alcantarillas y subdrenes longitudinales, conformación de subrasante y terraplenes, así como la construcción de las estructura de pavimento: capas de subbase granular, base granular así como la extensión de carpeta asfáltica en una longitud de 2870 ml para un porcentaje de avance en esta actividad del 27.5%, construcción de muros de contención y cunetas, además se avanza en la construcción del puente vehicular sobre quebrada grande, obras de mitigación ambientales y sociales, implementación del plan de manejo de tránsito.

Las lluvias presentadas en los meses de octubre y noviembre que afectaron los rendimientos en las actividades de obra especialmente en el K23+436 – Puente Quebrada Grande, fue necesario la implementación de acciones inmediatas como remoción de derrumbes, conformación del paso provisional por la qbda Grande y protección de la subrasante con material de terraplén, esto con el fin de mantener el paso por todo el corredor en intervención.

La Interventoría y Contratista de obra presentaron a la Entidad Contratante, la solicitud formal de ADICIÓN Y AJUSTE No. 1 al contrato de obra No. 2223 DE 2022 y el contrato de Interventoría No. 0176-2023, por medio de la comunicación No. C01762023 – CIP – 072 con fecha 19 de octubre de 2023, en donde por la situación geomorfológica de la zona, sumado a la intensa ola invernal presentada en la región, se han acelerado los procesos erosivos en el corredor vial intervenido, resultando 5 sitios críticos los cuales presentan situaciones particulares de inestabilidad de la banca existente y grandes movimientos en masa, que deben ser atendidos en aras de velar por la estabilidad del proyecto y como medida provisional se ha evitado la intervención en estos sitios.

A pesar que el contratista cuenta con el suficiente equipo y logística para el desarrollo del proyecto, esta interventoría le ha solicitado la implementación de acciones para incrementar los rendimientos en cada una de las actividades de obra dado el limitado plazo faltante, por lo que se viene realizando un control a la ejecución de las obras para lograr el cumplimiento de los compromisos contractualmente establecidos.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.







TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN.





TERRAPLENES, MATERIAL TIPO SUELO SELECCIONADO





SUBBASE GRANULAR (SUMINISTRO, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTADO)










TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR.



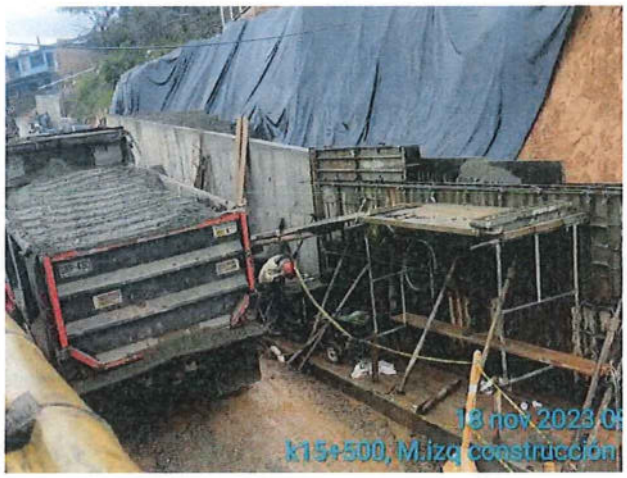

EXCAVACIONES VARIAS PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN SECO.






CONCRETO CLASE C (28 MPa) (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).






CONCRETO CLASE D (21 MPA), CLASE F (14 MPA)- INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.



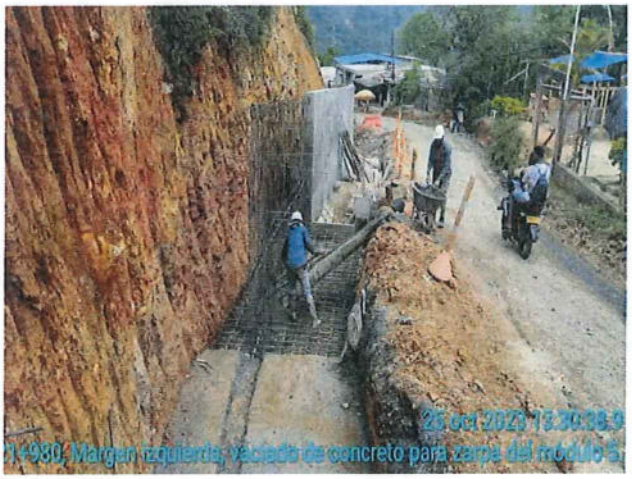



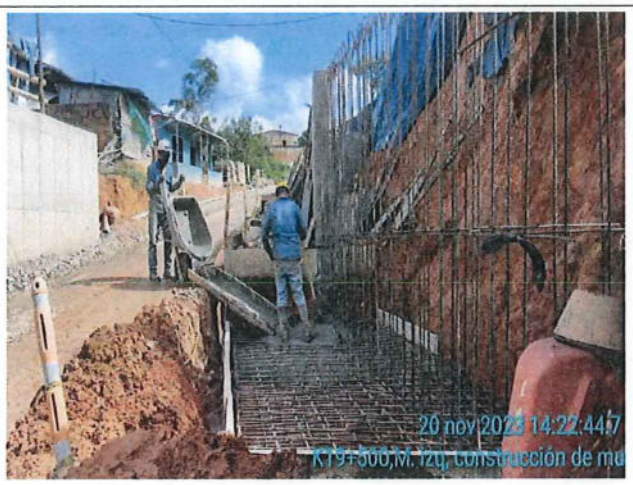

SUMINISTRO, FIGURADO ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA PARA ALCANTARILLA









TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 900 MM DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).





RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HEMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN).









CUNETA DE CONCRETO CLASE D (21 MPa) VACIADA IN SITU.





ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO
Supervisor

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO Nº 08

42 Motivos para avanzar

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATO N° 0176-2023	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - R/L RAFAEL VILLAR OSPINA	
SUPERVISOR	ING. ANDRES ARTURO MEJIA M.	
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2,320,220,350	Incluido el IVA (19%)
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,320,220,350	Incluido el IVA (19%)
PLAZO TOTAL	13 MESES	

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los VEINTISIETE (27) días del mes de NOVIEMBRE de 2023, se reunieron los Ingenieros: ANDRÉS ARTURO MEJIA M. en su calidad de Supervisor por parte de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca y RAFAEL VILLAR OSPINA en su calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS, en su calidad de Interventor, con el fin de elaborar la presenta ACTA DE RECIBO Nº 08 del contrato mencionado anteriormente.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	10 DE ENERO DE 2023
PLAZO CONTRACTUAL	13 MESES
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	24 DE FEBRERO DE 2023
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	24 DE MARZO DE 2024

4. VALOR CONSULTORIA CONTRATADA

VALOR CONTRATO Nº 0176-2023	$2,320,220,350.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA CONTRATADA	$2,320,220,350.00

5. VALOR INTERVENTORIA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA

CANT	DESCRIPCION	FORMA DE PAGO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	POR CUOTA FIJA 25% VR. CTO INTERVE. (13 CUOTAS MENSUALES)	# CUOTA	# CUOTAS ACUMULADA
			1.0	9.0
		POR PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 60% VR. CONTRATO INTERV,	% AVANCE OBRA MES	% AVANCE OBRA ACUMULADO
			6.89%	51.55%
		PROVISION LIQUIDACIÓN 15% VR. CONTRATO INTERV,	PAGO ACTA. LIQ	PAGO ACTA. LIQ
			0.000%	0.000%

Para constancia se firma por los que intervienen.

ING. RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
R.L. CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS
Contratista de Interventoria

ING. ANDRES ARTURO MEJIA M.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DPTO DEL CAUCA
Supervisor del Contrato

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

PLAZO INICIAL	13 MESES	VR CONTRATO	$ 2.320.350
INICIO	24-feb-2023		
TERMINACIÓN	24-mar-2024		
PLAZO TOTAL	13 MESES	VALOR TOTAL	$ 2.320.220.350

CONTRATO N° 0176-2023

ACTA DE PAGO No. 8

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

PERIODO DE PAGO: 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

42 Motivos para avanzar

SUPERVISOR: ING. ANDRES ARTURO MEJIA M.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - REPRESENTANTE LEGAL Ing. RAFAEL VILLAR OSPINA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

ITEM	DESCRIPCION DE LA INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	GLOBAL	1,00	$ 2.320.220.350	$ 2.320.220.350

INTERVENTORIA EJECUTADA

FORMA DE PAGO - CONTRATO INICIAL	PORCENTAJE	VALOR TOTAL	VALOR POR MES o POR ACTA	PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
				MESES	% AVANCE OBRA	VALOR	MESES	% AVANCE OBRA	VALOR
MEDIANTE PAGOS FIJOS MENSUALES	25,0%	$ 487.441.249,0	$ 37.495.481,0	1,00		$ 37.495.481,0	9,00		$ 337.459.329,0
AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	60,0%	$ 1.169.859.000,0			6,89%	$ 80.603.285,0		51,55%	$ 603.062.314,0
AL RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	15,0%	$ 292.464.751,0							
SUBTOTAL COSTO BÁSICO:	100,0%	$ 1.949.765.000,0		Vr. Básico Acta de Costos		$ 118.098.766,0	Vr. Total Básico Costos		$ 940.521.643,0
VALOR IVA:	19,0%	$ 370.455.350,0		Vr. IVA 19%		$ 22.438.766,0	Vr. Total IVA 19%		$ 178.699.112,0
VALOR TOTAL:		$ 2.320.220.350,0		Vr. Presente Acta		$ 140.537.532,0	Vr. Total Ejecutado		$ 1.119.220.755,0

RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORIA

ESTADO DEL ANTICIPO :		ESTADO DEL CONTRATO :	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	N.A.	VALOR CONTRATO PRINCIPAL $	2.320.220.350,00
VALOR ACUMULADO AMORTIZADO ACTA ANTERIOR	N.A.	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $	-
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	N.A.	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA $	140.537.532,00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	N.A.	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA $	1.119.220.755,00
SALDO POR AMORTIZAR	N.A.	SALDO POR EJECUTAR $	1.200.999.595,00

NOTAS: EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A: *CUOTA FIJA: 1 MES (24 DE OCTUBREE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023) *POR AVANCE DE OBRA: 6.89% (AVANCE DE OBRA REPORTADO MES DE NOVIEMBRE DE 2023, PARA UN AVANCE TOTAL EJECUTADO DE 51.55%

La presente acta no exime al contratista e interventor de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE PAGO	$140.537.532,00	CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

REGIMEN: COMUN

CONSIGNAR : CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No.19200003551 A NOMBRE DE: CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS NIT. 901.666.013-2

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y del supervisor conforme al acta de recibo correspondiente.
La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.
El Supervisor del Departamento únicamente certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento

Aprobado para pago:

ING. RAFAEL VILLAR OSPINA
R.L. CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS
INTERVENTOR

ING. ANDRES ARTURO MEJIA M.
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Vo./Bo.
ING. JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO
SECRETARIO DE INFRESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

*Yo, **RAFAEL VILLAR OSPINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.037.941, actuando como Representante Legal del CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS identificado con NIT. 901.666.013-2 (Integrantes IAR PROYECTOS SAS NIT. 900.709.306-8 y PROYECTOS IAR SAS NIT. 900.974.559-9), certifico de acuerdo con las planillas correspondientes, el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente al mes de noviembre de 2023, exigidos por la ley, y que el Consorcio y sus integrantes se encuentran al día por todo concepto relacionado con dichos aportes cuando a ello haya lugar en desarrollo del contrato de Interventoría No. 0176-2023 suscrito con la Gobernación del Cauca.*

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., a los Veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023.

RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal

C.C. Archivo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901666013-2	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS		ED CONEX OF 511 VIA CHIA - CAJICA	3154541593	iarproyectos.servicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	BUENOS AIRES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	72097312	$7.576.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	600.000	0		0		0	0	0	0	600.000	6
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.959.500	0	0	0	0	0	0		1.959.500	6
231001	Colfondos	800227940-6	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.648.000	0	0	25.000	25.000	0	0		1.698.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.687.900				1.687.900	0	0	1.687.900			16.879	1.687.900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	989.400	0	0	989.400	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	969.900	969.900
Pensión	3	3.929.500	3.929.500
Riesgos Laborales	1	1.687.900	1.687.900
CCF	1	989.400	989.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7.576.700	7.576.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901666013-2	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS		ED CONEX OF 511 VIA CHIA - CAJICA	3154541593	iarproyectos.servicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	BUENOS AIRES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	72097312	$7.576.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. extranjero	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	94360644	GALINDO LOPEZ JAIR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS037	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	5	348.000	CCF14	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
2	CC	10294226	SOLARTE ASTAIZA EDGAR ALBERTO	1	0			S																	230301	1,700,000	272.000	0	0	0	0	EPS018	1,700,000	68.000	14-4	1,700,000	5	118.400	CCF14	1,700,000	68.000	0	0	0	0	0
3	CC	1061600183	FLOREZ TOBAR CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	5	194.900	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
4	CC	1080265100	OSPINA CHAVEZ LAURA MARGARITA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	11224916	VARGAS PEREZ OSCAR ALFONSO	1	0			S																	231001	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1,700.000	68.000	14-4	1,700.000	5	118.400	CCF14	1,700.000	68.000	0	0	0	0	0
6	CC	76320960	ORDOÑEZ GRIJALBA JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3,500.000	140.000	14-4	3,500.000	5	243.600	CCF14	3,500.000	140.000	0	0	0	0	0
7	CC	76322879	PERDOMO BENAVIDES GUSTAVO ADOLFO	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	93389742	SOSA CHISCO JUAN MIGUEL	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	5	194.900	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
9	CC	76316526	SANDOVAL LOPEZ JEIMY	1	0			S	X																230301	46.667	7.500	0	0	0	0	ESSC62	46.667	1.900	14-4	46.667	5	3.300	CCF14	533.667	21.400	0	0	0	0	0
10	CC	91103520	MURCIA CARREÑO JUSTO PASTOR	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

IAR PROYECTOS SAS

Certificación – 008

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, CAROLINA ÁLVAREZ OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.713.914, actuando como Representante Legal de IAR PROYECTOS S.A.S y ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO identificado con C.C. No. 79.314.459. de Bogotá y T.P. No. 18011-T, certificamos que la empresa IAR PROYECTOS SAS identificado con NIT. No. 900.709.306-8 se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de aportes de empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (art. 50 de la ley 789 de 2002) y aportes a las cajas de compensación familiar, durante el mes de noviembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma tributaria) y el decreto 1828 de 2013.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,

ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO
Revisor Fiscal
T.P. No. 18011-T

CAROLINA ÁLVAREZ OSPINA
C.C. No. 52.713.914 de Bogotá
Representante Legal

C.C. Archivo

NO SIRVE COMO DOCUMENTO PARA IDENTIFICACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79314459

JARAMILLO BUITRAGO
APELLIDOS

JESUS ESTEBAN
NOMBRES

FIRMA



AUTENTICACION DE COPIA DE ORIGINAL COMO NOTARIA TRECE ENCARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. CERTIFICO QUE PREVIO EL COTEJO RESPECTIVO LA PRESENTE COPIA ES FIEL Y COINCIDE CON EL ORIGINAL TENIDO A LA VISTA.

LUIS VALOSSA COLINA



FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1963
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500103-42098135-M-0079314459-20020226 06811 02056A 02 111066340

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



1801 1-T

JESUS ESTEBAN
JARAMILLO BUITRAGO
C.C. 79314459
RESOLUCION INSCRIPCION 1331 FECHA 04/06/87
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE
ELGA INES SANCHEZ CORTES 25545

AUTENTICACION DE COPIA DE ORIGINAL QUE SE PRESENTO
NOTARIA TRECE ENCARGADA
BOGOTA D.C. EL CONTENIDO DE ESTE FOLIO ES FIEL Y COPIA
CONCUERDA TAMBIEN EN LA FIRMA Y HUELLA QUE APARECE
EN EL ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA
27 ABR 2010
LILIANA OSSA COLINA
NOTARIA TRECE (E)

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

000517

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2E511F49768274A5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79314459 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 18011-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900709306-8	IAR PROYECTOS SAS		CRA 46 # 22 B 20 OFICINA 507	3145384	RAFAELVILLAROSPINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	71916622	$6.305.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	840.000	0		0		0	1	900	0	840.900	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	48.000	0		0		0	1	100	0	48.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.152.000	0	0	30.000	30.000	1	1.200	200	1.213.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.680.000	0	0	42.500	42.500	1	1.700	200	1.766.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.545.200				1.545.200	1	1.600	1.546.800			15.452	1.546.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	48.000	1	100	48.100	1
CCF21	Cafam	860013570-3	840.000	1	900	840.900	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	888.000	889.000
Pensión	2	2.977.000	2.980.300
Riesgos Laborales	1	1.545.200	1.546.800
CCF	2	888.000	889.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	6.298.200	6.305.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900709306-8	IAR PROYECTOS SAS		CRA 46 # 22 B 20 OFICINA 507	3145384	RAFAELVILLAROSPINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	71916622	$6.305.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	36164388	OSPINA DE ALVAREZ BERTHA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS001	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF21	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
2	CC	52713914	ALVAREZ OSPINA CAROLINA	1	0			S																	230301	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS001	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	CCF21	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
3	CC	60380952	ALVAREZ OSPINA DIANA MARCELA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	80037941	VILLAR OSPINA RAFAEL ALFREDO	1	0			S																	25-14	8.500.000	1.360.000	0	0	42.500	42.500	EPS001	8.500.000	340.000	14-4	8.500.000	5	591.600	CCF21	8.500.000	340.000	0	0	0	0	0
5	CC	9976664	GIRALDO GALVIS JULIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF11	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PROYECTOS IAR SAS

Certificación – 008

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, RAFAEL VILLAR OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.037.941 expedida en Bogotá D.C., actuando como Representante Legal Suplente, certifico que la empresa PROYECTOS IAR SAS identificada con NIT. No. 900.974.559-9, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de aportes de empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (art. 50 de la ley 789 de 2002) y aportes a las cajas de compensación familiar, durante el mes de noviembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma tributaria) y el decreto 1828 de 2013.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,

RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal Suplente

C.C. Archivo

Carrera 7A No. 21N-65 Barrio Ciudad Jardín – Teléfono (602)8354773 – Popayán (Cauca)
Edificio CONEX Of. 511 Vía Chía – Cajicá km 1.5 Sector Bombero – Chía (Cundinamarca) – Cel. 3154541593
Correo electrónico: iarproyectos.servicios@gmail.com - cintervialproyectos@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900974559-9	PROYECTOS IAR SAS		CARRERA 46 No. 22B - 20 OFICINA 507	3154541593	rafaelvillarospina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	07/11/2023	72097791	$2.545.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	322.000	0		0		0	0	0	0	322.000	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	504.000	0	0	0	0	0	0		504.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	784.000	0	0	0	0	0	0		784.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	560.400				560.400	0	0	560.400			5.604	560.400	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	374.600	0	0	374.600	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	322.000	322.000
Pensión	2	1.288.000	1.288.000
Riesgos Laborales	1	560.400	560.400
CCF	1	374.600	374.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	2.545.000	2.545.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900974559-9	PROYECTOS IAR SAS		CARRERA 46 No. 22B - 20 OFICINA 507	3154541593	rafaelvillarospina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	07/11/2023	72097791	$2.545.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	34317522	GARCIA LOPEZ ANA MARIA	1	0			S		X															230301	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS005	150.000	6.000	14-4	150.000	5	10.500	CCF14	1.463.000	58.600	0	0	0	0	0
2	CC	1061746224	CHAVEZ FLOREZ CARLOS ALFREDO	1	0			S	X	X															230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF14	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
3	CC	1061805223	RINCON RUIZ FRANCISCO JAVIER	1	0			S	X	X															25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	5	132.300	CCF14	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
4	CC	1113311186	SEGURA LONDOÑO VALENTINA	1	0			S	X	X															25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF14	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
