ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

Valledupar, Ciudad de los Santos Reyes, 27 de Noviembre de 2023 **VA-SOPM-11507-2023**

Para: **CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO**
Secretario de Hacienda Municipal

DE: **CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE**
Supervisor del contrato

Asunto: **Remisión de cuenta de cobro.**

ALCALDIA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECEPCIÓN
RECIBIDO 30 NOV 2023
12:05 pm
RECIBIDO

Cordial Saludo:

Comedidamente y en atención al asunto de la referencia, me permito remitir los documentos necesarios para la realización del pago del Acta de Recibo Parcial de Obras No. 002, es decir, la suma de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 83/100 ($5.581.299.969,83) M. L., correspondiente al Contrato de Obras No. 011-SOP de 2023, cuyo objeto es: **CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.**

Para los efectos se envía:

- Copia de minuta del respectivo contrato.
- Informe de supervisión e Interventoría.
- Acta de Recibo Parcial de Obras No. 002.
- Cuenta de Cobro.
- Certificación Bancaria.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Registro Presupuestal de Compromiso.
- Constancia del pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
- Recibos de pago correspondiente a los impuestos municipal, (Estampilla pro cultura, Estampilla pro anciano y estampilla pro universidad y copia de pago de los impuestos Departamentales).
- Copia de Pólizas y resolución de aprobación.

Lo anterior se envía para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ING. CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE
Secretario de Obras Públicas Municipal

Proyectó: **Arq. GERIN FERNANDO PICALUA MONTERO**
Profesional Universitario - Apoyo de la Supervisión
Secretaría de Obras Públicas Municipal

Arq. OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA
Contratista - Apoyo de la Supervisión
Secretaría de Obras Públicas Municipal

Asunto ·901683967;CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022;FEV2;01;CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022

De CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022 <facturacion@siigo.com>

Para obraspublicas@valledupar-cesar.gov.co <obraspublicas@valledupar-cesar.gov.co>

Fecha martes, 28 de noviembre de 2023 20:53:12

CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022

Señor (a) **Efrain Alfredo Quintero Ternera**

CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022 le informa que se generó la siguiente factura

Número de factura	**FV-2-2**
A nombre de	**MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**
Valor total	**$ 7.860.985.873**

Ver factura o Enviar comentarios

Este es un email generado automáticamente. Por favor no lo responda.
Si desea ponerse en contacto con www.siigo.com/ haga click aquí

Factura elaborada y enviada a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad Contáctenos

Archivos adjuntos
z09016839670082300000002.zip (103 kB)



CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
NIT 901.683.967-5
CR 11 15 65
Tel: (605) 3225771156
Valledupar - Colombia
Consorcioplazadevendedores2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 2

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR			**Generación**	19/11/2023, 08:49
NIT	800.098.911-8	**Teléfono**	(605) 5885761 - Ext. 000	**Expedición**	28/11/2023, 20:53
Dirección	CR 5 15 69 BRR ALFONSO LOPEZ	**Ciudad**	Valledupar - Colombia	**Vencimiento**	09/11/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA N°02 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 CON UN AVANCE IGUAL AL 16,88% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA N°011-SOP DE 2023, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022 Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.	1.00	5,955,292,328.00
2	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA	1.00	119,105,847.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Siete mil ochocientos sesenta millones novecientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y tres pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. CC-1-1 vence el 2023-04-21 por $ 2,279,685,903.17
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-09 por $ 5,581,299,970.23

Total Bruto	6,074,398,175.00
Administración 24.00%	1,429,270,158.72
Imprevistos 1.00%	59,552,923.28
Utilidad 5.00%	297,764,616.40
Total a Pagar	7,860,985,873.40

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045762556 aprobado en 20230310 prefijo FEV desde el número 1 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8b299068a11278ba1022b7c100b7c1cfa2629743a180c42ff6488ed267912e8b9b6cc1e5543835e81748871f39e97b2f

Fabricado Software y Tecnología - Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

54

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO: PLAZA DE MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS			**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	01-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402.00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840.00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936.58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920.10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520.60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840.20	17/03/2025	17/03/202A

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras publicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873.00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14		SUB TOTAL CAPITULOS										
		VALOR COSTO DIRECTO				$ 35.102.847.224.00		$ 8.787.444.449.00		$ 5.955.292.328.00		$ 14.237.736.869.00
		ADMINISTRACION			24%	$ 8.424.683.346.00		$ 1.987.786.668.00		$ 1.429.270.159.00		$ 3.417.056.849.00
		IMPREVISTOS			1%	$ 351.028.479.00		$ 87.874.446.00		$ 59.552.923.00		$ 142.377.369.00
		UTILIDAD			5%	$ 1.755.142.364.00		$ 434.777.225.00		$ 297.764.616.00		$ 711.886.843.00
		PGIO			2%	$ 702.056.945.00		$ 165.645.889.00		$ 119.105.847.00		$ 284.754.737.00
		TOTAL AIU + PGIO			32%	$ 11.232.911.128.00		$ 2.450.382.224.00		$ 1.905.693.545.00		$ 4.556.075.798.00
		VALOR COSTO DIRECTO + INDIRECTO				$ 46.335.758.402.00		$ 10.932.826.673.00		$ 7.860.985.873.00		$ 18.793.812.667.00
		CERTIFICACIONES ELECTRICAS				$ 229.600.000.00						
14	14.1	CERTIFICACION RETIE	UND	1	$ 176.800.000.00	$ 176.800.000.00						
14	14.2	CERTIFICACION RETILAP	UND	1	$ 52.800.000.00	$ 52.800.000.00						
		VALOR CONTRATO DE OBRA				$ 46.565.358.402.00		$ 10.932.826.673.00		$ 7.860.985.873.00		$ 18.793.812.667.00
		ANTICIPO		29%		$ 13.503.953.936.58						
		AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA		29%				$ 3.170.519.735.17		$ 2.279.685.903.17		$ 5.450.205.673.43
		VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA						$ 7.762.306.937.83		$ 5.581.299.969.83		$ 13.343.606.993.57
								% de Avance acumulado Actual 23.48%		% de Avance presente Acta 16.88%		% Avance Acumulado 40.36%

SECRETARIO DE OBRAS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
ING. CARLOS DE LA OSSA LACOUTURE	ING. DAVINSON GRAVINI POLO	ING CHESMAN BARROS PIMIENTA	GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO	OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA
ALCALDIA MUNICIPAL	CONSORCIO INTERPLAZA 2023	CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRA	SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS



CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022 NIT 901483947-4

Valledupar, Cesar 15 de noviembre 2023

CMV-091-2023

Señores

CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023
ING. DAVINSON GRAVINI POLO
REPRESENTANTE LEGAL

Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra Pública No. 011-SOP-DE 2023, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.

Asunto: Remisión Acta de cobro N°2

Cordial saludo

Nos dirigimos a ustedes por medio de la presente, con la finalidad de radicar el acta de cobro parcial N°2 del proyecto en referencia, de acuerdo con lo estipulado en el convenio.

Adjunto se envían los anexos que hacen parte de los soportes del acta de cobro.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA
C.C: 7.045.081
REPRESENTANTE LEGAL

CC. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
ING. CARLOS DE LA OSSA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
NIT 901.683.967-5
CR 11 15 66
Tel: (605) 3225771156
Valledupar - Colombia
Consorcioplazadevendedores2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 2

Señores	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800.098.911-8	**Teléfono**	(605) 5885761 - Ext. 000
Dirección	CR 5 16 69 BRR ALFONSO LOPEZ	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2023, 08:49
Expedición	28/11/2023, 20:53
Vencimiento	09/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA N°02 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 CON UN AVANCE IGUAL AL 16,88% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA N°011-SOP DE 2023, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022 Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.	1.00	5,955,292,328.00
2	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA	1.00	119,105,847.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Siete mil ochocientos sesenta millones novecientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y tres pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. CC-1-1 vence el 2023-04-21 por $ 2,279,685,903.17
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-09 por $ 5,581,299,970.23

Total Bruto	6,074,398,175.00
Administración 24.00%	1,429,270,158.72
Imprevistos 1.00%	59,552,923.28
Utilidad 5.00%	297,764,616.40
Total a Pagar	7,860,985,873.40

Observaciones:

A este factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y matenalmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045762556 aprobado en 20230310 prefijo FEV desde el número 1 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8b299068e11278ba1022c7c100b7c1cfa2629743a180c42ff6488ed267912e8b9b6cc1e5543835e8174887 1f39a97b2f

Factura Electrónica de Venta, Desarrollo Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica vea en el XML



CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
NIT 901.683.967-5
CR 11 15 66
Tel: (605) 3225771156
Valledupar - Colombia
Consorcioplazadevendedores2023@gmail.com

Detalle de producto
No. FEV 2

Señores	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR			**Fecha**
NIT	800.098.911-8	**Teléfono**	(605) 5885761 - Ext. 000	2023-11-09
Dirección	CR 5 15 69 BRR ALFONSO LOPEZ	**Ciudad**	Valledupar - Colombia	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA N°02 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 CON UN AVANCE IGUAL AL 16,88% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA N°011-SOP DE 2023, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022 Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.	1.00	5,953,969,782.00
2	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA	1.00	119,079,396.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Siete mil ochocientos cincuenta y nueve millones doscientos cuarenta mil ciento doce pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. CC-1-1 vence el 2023-04-21 por	$ 2,279,179,632.65
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-09 por	$ 5,580,060,479.95

Total Bruto	6,073,049,178.00
Administración 24.00%	1,428,952,747.68
Imprevistos 1.00%	59,539,697.82
Utilidad 5.00%	297,698,489.10
Total a Pagar	7,859,240,112.60

Observaciones:

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.602,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	At	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1		**LOCALES COMERCIALES, BAÑOS**				**$ 5.857.981.963,00**		**$ 1.717.833.359,00**		**$ 578.177.023,00**		**$ 2.296.008.688,00**
1,1		**MOVIMIENTOS DE TIERRAS**				**$ 133.704.616,00**		**$ 83.977.369,00**		**$ 1.536.930,00**		**$ 85.514.155,00**
	111	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m. MEDIDO EN SITIO	M3	1976,25	$ 39.785,00	$ 78.625.106,00	1.302,96	$ 51.838.184,00	0,00	$	1.302,96	$ 51 838 264,00
	112	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	1010,58	$ 21 537,00	$ 21.764.861,00	988,39	$ 21.287.042,00		$	988,39	$ 21.286.955,00
	113	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6,0M3). MEDIDO EN SITIO.	M3/KM	965,67	$ 34.499,00	$ 33.314.649,00	314,56	$ 10.852 143,00	44,55	$ 1.536.930,00	359,11	$ 12.388.938,00
		SUBTOTAL CAP. 1,1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS:				**$ 133.704.616,00**		**$ 83.977.369,00**		**$ 1.536.930,00**		**$ 85.514.155,00**
1,2		**CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO**				**$ 844.067.798,00**		**$ 346.376.617,00**		**$ 231.927.674,00**		**$ 578.302.989,00**
	121	CONCRETO PARA SOLADOS E=5 0cms f'c=2 500 PSI	M3	16,54	$ 600.195,00	$ 9.927.225,00	16,28	$ 9.772.675,00		$	16,28	$ 9.771.175,00
	122	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLOPLEO 60% F'C=2000PSI Y 40% PIEDRA 1"	M3	178,79	$ 524.252,00	$ 93.731.015,00	70,41	$ 36.911.535,00	58,75	$ 30.800 854,00	129,16	$ 67.712.388,00
	123	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO	M3	101,76	$ 902.639,00	$ 91.852.545,00	53,89	$ 48 640.959,00	43,98	$ 39.700.320,00	97,87	$ 88 341.279,00
	124	ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO	M3	84,61	$ 701.953,00	$ 59.392.243,00	47,01	$ 32.997.407,00	37,60	$ 26.394.837,00	84,61	$ 59.392.243,00
	126	PEDESTAL EN CONCRETO F'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO VIBRADO Y CURADO	M3	16,42	$ 994.419,00	$ 16.328.360,00		$	16,42	$ 16.328.360,00	16,42	$ 16.328.360,00
	126	CONCRETO F'c=3000PSI PARA COLUMNAS INCLUYE VIBRADO	M3	12,28	$ 814.950,00	$ 10.007.586,00		$		$		$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO					22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UNO	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	1.2.7	MESON EN CONCRETO REFORZADO DE FC=3.000 PSI ANCHO = 0.35M E=0.07M PARA BARRA DE SERVICIO SEGUN DISEÑO	ML	45,76	$ 126.339,00	$ 5.779.121,00		$ -		$ -		$ -
	1.2.8	MESON EN CONCRETO REFORZADO DE FC=3.000 PSI ANCHO = 0.60M E=0.07M PARA LAVAMANOS SEGUN DISEÑO	ML	58,29	$ 145.693,00	$ 8.638.138,00		$ -		$ -		$ -
	1.2.9	ACERO DE REFUERZO PDR-60 FY=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE FIGURADO E INSTALACION	KG	23959,21	$ 9.102,00	$ 218.076.729,00	20.009,94	$ 182.130.481,00	2469,77	$ 22.479.639,00	22.479,71	$ 204.610.320,00
	1.2.10	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO A	UND	198	$ 625.628,00	$ 123.874.344,00	57,42	$ 35.923.560,00	140,58	$ 87.950.784,00	198,00	$ 123.874.344,00
	1.2.11	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO B	UND	8	$ 1.034.110,00	$ 8.272.880,00		$ -	8,00	$ 8.272.880,00	8,00	$ 8.272.880,00
	1.2.12	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO D	UND	306	$ 106.477,00	$ 32.581.962,00		$ -		$ -		$ -
	1.2.13	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO E	UND	198	$ 89.464,00	$ 17.713.872,00		$ -		$ -		$ -
	1.2.14	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO F	UND	214	$ 355.415,00	$ 76.058.810,00		$ -		$ -		$ -
	1.2.15	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO G	UND	106	$ 259.357,00	$ 27.491.842,00		$ -		$ -		$ -
	1.2.16	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO H	UND	252	$ 104.175,00	$ 26.252.100,00		$ -		$ -		$ -
	1.2.17	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO I	UND	360	$ 74.955,00	$ 26.983.800,00		$ -		$ -		$ -
	1.2.18	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO L	UND	4	$ 126.594,00	$ 506.376,00		$ -		$ -		$ -
	1.2.19	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO M	UND	4	$ 158.936,00	$ 635.744,00		$ -		$ -		$ -
	1.2.20	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 0.10X0.10 M	ML	88,4	$ 112.784,00	$ 9.970.106,00		$ -		$ -		$ -
												$ -
		SUBTOTAL CAP. 1.2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERTO:				$ 844.047.798,00		$ 346.376.617,00		$ 231.927.874,00		$ 578.302.989,00
1.3		PISOS Y ACABADOS				$ 357.376.533,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	1.3.1	PISO ESMALTADO EN CONCRETO 3.000 PSI E= 0.10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	2115,37	$ 122.372,00	$ 258.862.058,00		$ -		$ -		$ -
	1.3.2	MORTERO DE NIVELACION EN = 0.05M	M2	613,57	$ 32.446,00	$ 19.907.892,00		$ -		$ -		$ -
	1.3.3	PISO EN PORCELANATO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	624,77	$ 100.099,00	$ 62.538.852,00		$ -		$ -		$ -
	1.3.4	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA PISOS Y ZONA DE MESONES DE BAÑOS Y LOCALES INCLUYE ENDURECEDOR DE CUARZO	ML	452,36	$ 35.564,00	$ 16.087.731,00		$ -		$ -		$ -
								$ -		$ -		$ -

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.325.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra. DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor . como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi.

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
					SUBTOTAL CAP. 1.3 PISOS Y ACABADOS:	$ 357.396.533,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1,4	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL Y DIVISIONES					$ 566.664.956,00		$ 0,00		$ 0,00		[illegible]
	1.4.1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO PORTANTE PARA FACHADAS COLOR TERRACOTA	M2	3453,49	$ 147.201,00	$ 508.357.181,00		$ -		$ -	0	$ -
	1.4.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO PORTANTE PARA FACHADAS COLOR CAPUCHINO H 145	M2	284,23	$ 199.308,00	$ 56.649.313,00					0	$ -
	1.4.3	DINTEL EN CONCRETO 0.2X0.1 M	ML	[illegible]	$ 28.883,00	$ 1.656.462,00					0	$ -
												$ -
					SUBTOTAL CAP. 1,4 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL Y DIVISIONES:	$ 566.664.956,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1,5	PAÑETE, ENCHAPES Y PINTURA					$ 141.601.181,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	1.5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS.	M2	896,18	$ 41.340,00	$ 37.048.081,00					0	
	1.5.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES.	Ml	222,2	$ 11.493,00	$ 2.553.300,00					0	
	1.5.3	ENCHAPE EN CERAMICA	M2	849,27	$ 84.354,00	$ 71.639.322,00					0	
	1.5.4	ACABADO EN GRANITO PULIDO PARA MESONES	ML	[illegible]	$ 134.941,00	$ 1.765.028,00					0	
	1.5.5	PINTURA VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES	M2	[illegible]	$ 19.259,00	$ 1.579.045,00					0	
	1.5.6	ESTUCO PLASTICO-TIPO ACRILICO PARA EXTERIORES	M2	91,95	$ 22.890,00	$ 2.104.736,00					0	
	1.5.7	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA O SIMILAR	M2	91,95	$ 25.322,00	$ 2.328.358,00					0	
	1.5.8	CIELO RASO PLANO DRYWALL . INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	M2	262,56	$ 86.012,00	$ 22.583.311,00					0	
					SUBTOTAL CAP. 1,5 PAÑETE, ENCHAPES Y PINTURA:	$ 141.601.181,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
1,6	CARPINTERIA METALICA					$ 2.003.277.317,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.409,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860 985 873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN PERMANA METÁLICA ENROLLABLE	M2	2006,52	$ 698.216,00	$ 1.400.984.368,00					0	
	1.6.2	DIVISIONES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON UNA ALTURA DE 2.00m. DE ACUERDO A LA NORMA PARA BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOCOMOTRIZ Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. LAS DIVISIONES INCLUYEN EL ACABADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS.	M2	87,57	$ 1.067.494,00	$ 93.480.458,00					0	
	1.6.3	DIVISIÓN PARA ORINALES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20, O EQUIVALENTE, CON DIMENSIONES 1.48MX0.44M, INCLUYE FIJACIONES Y TODOS LOS	UND	5	$ 968.565,00	$ 4.842.825,00					0	
	1.6.4	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20. SEGUN MEDIDAS, CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y COLOCACION.	M2	22,88	$ 675.613,00	$ 15.458.025,00					0	
	1.6.5	PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD, EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM	M2	3,99	$ 741.005,00	$ 2.956.610,00					0	
	1.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 3" X 1/2" CAL 20 PARA FALSO CIELO	ML	12081,2	$ 37.500,00	$ 453.045.000,00					0	
	1.6.7	VENTANA EN ALUMINIO SISTEMA 744 INCLUYE VIDRIO INCOLORO 6mm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACION Y ACABADO ESTÉTICO.	M2	7,36	$ 382.369,00	$ 2.812.764,00					0	
	1.6.8	PERSIANA PLANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL, CON SU RESPECTIVO MARCO EN 3X1, DIVIDIDO EN SECCIONES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.	M2	9,69	$ 831.286,00	$ 8.055.161,00					0	
	1.6.9	VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO INCOLORO 6MM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.	M2	6,07	$ 593.740,00	$ 3.604.007,00					0	
	1.6.10	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM	M2	18,36	$ 982.468,00	$ 18.038.112,00					0	
					SUBTOTAL CAP. 1,6 CARPINTERIA METALICA:	$ 2.003.277.317,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.7		**ACCESORIOS, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA**				$ 45.777.247,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	1.7.1	ESPEJO DE ESPESOR 4+4 MM PARA BAÑOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.	M2	6,52	$ 158.074,00	$ 1.029.962,00					0	
	1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO, BRIDA Y ASIENTO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE.	UND	19	$ 1.724.615,00	$ 32.771.485,00					0	
	1.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO Y GRIFERIA TIPO PUSH	UND	6	$ 1.338.114,00	$ 8.028.684,00					0	
	1.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO PARA PERSONA CON MOVILIDAD REDUCIDA, COLOR BLANCO, COLOR BLANCO CORONA O EQUIVALENTE.	UND	2	$ 889.174,00	$ 1.778.348,00					0	
	1.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DISCAPACITADOS CORONA DE REF 706590001 O EQUIVALENTE, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	2	$ 774.923,00	$ 1.549.846,00					0	
	1.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS CORONA DE 24" REF 706560001 O EQUIVALENTE, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	2	$ 239.733,00	$ 479.466,00					0	
	1.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE 45X50CM + GRIFERÍA.	UND	26	$ 359.193,00	$ 9.339.018,00					0	
	1.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL COLOR BLANCO O EQUIVALENTE	UND	3	$ 364.652,00	$ 1.093.956,00					0	
	1.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR PARA MINUSVALIDOS COLOR BLANCO + GRIFERÍA O EQUIVALENTE.	UND	2	$ 583.715,00	$ 1.167.430,00					0	
	1.7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR COLOR BLANCO O EQUIVALENTE.	UND	16	$ 341.609,00	$ 5.465.744,00					0	
	1.7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS CON DESAGUE O EQUIVALENTE.	UND	16	$ 192.138,00	$ 3.074.208,00					0	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan así:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023 AL 31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UNO	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
		SUBTOTAL CAP 1.7 ACCESORIOS, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA:				$ 65.777.247,00				$ 0,00		$ 0,00
1,8		ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA				$ 1.725.492.315,00		$ 1.287.479.373,00		$ 344.712.219,00		$ 1.632.191.544,00
	1.8.1	LOSA COMPUESTA METALDECK CON LAMINA COLABORANTE	M2	35,97	$ 353.083,00	$ 12.700.396,00		$		$		$
	1.8.2	ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50CM, CONECTORES Y ACABADO FINAL	KG	77184,08	$ 22.191,00	$ 1.712.791.919,00	58.018,09	$ 1.287.479.373,00	15533,87	$ 344.712.219,00	73.551,96	$ 1.632.191.544,00
		SUBTOTAL CAP. 1,8 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA:				$ 1.725.492.315,00		$ 1.287.479.373,00		$ 344.712.219,00		$ 1.632.191.544,00
2		CUARTOS TÉCNICOS				$ 484.409.774,00		$ 277.467.365,00		$ 217.719.857,00		$ 495.187.222,00
2,1		MOVIMIENTOS DE TIERRA CUARTOS TECNICOS				$ 14.939.498,00		$ 11.620.054,00		$ 2.659.822,00		$ 14.279.877,00
	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.	M3	216,5	$ 39.785,00	$ 8.613.453,00	197,38	$ 7.852.763,00	19,12	$ 760.689,00	216,50	$ 8.633.453,00
	2.1.2	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	88,18	$ 21.537,00	$ 1.899.133,00		$	88,18	$ 1.899.133,00	88,18	$ 1.899.133,00
	2.1.3	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3), MEDIDO EN SITIO.	M3/KM	128,32	$ 34.499,00	$ 4.426.912,00	109,20	$ 3.767.291,00		$	109,20	$ 3.767.291,00
		SUBTOTAL CAP. 2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CUARTOS TECNICOS:				$ 14.939.498,00		$ 11.620.054,00		$ 2.659.822,00		$ 14.279.877,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.407,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860 985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.2	CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUER20					$ 107.672.512,00		$ 22.731.744,00		$ 73.263.513,00		$ 95.995.257,00
	2.2.1	CONCRETO PARA SOLADOS E=5.0cmts, f'c=2.500 PSI.	M3	2,17	$ 600.195,00	$ 1.302.423,00		$	2,17	$ 1.302.423,00	2,17	$ 1.302.423,00
	2.2.2	CONCRETO CICLOPEO 60% F'C=2000PSI Y 40% PIEDRA 1"	M3	30,42	454 072,00	$ 13.812.870,00		$	30,42	$ 13.812.870,00	30,42	$ 13.812.870,00
	2.2.3	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	17,37	902 639,00	$ 15.678.839,00		$	17,37	$ 15.678.839,00	17,37	$ 15.678.839,00
	2.2.4	ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	13,52	701 953,00	$ 9.490.405,00		$	13,52	$ 9 490 405,00	13,52	$ 9.490.405,00
	2.2.5	PEDESTAL EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	2,43	994.419,00	$ 2.416.438,00		$	2,43	$ 2 416.438,00	2,43	$ 2.416.438,00
	2.2.6	CONCRETO PARA RELLENO DE COLUMNAS 35 MPA	M3	2,52	1 255.826,00	$ 3.164.682,00		$		$	0	$
	2.2.7	ACERO DE REFUERZO PDR-60, FY=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	3582,96	9 102,00	$ 32.612.102,00	2.497,45	$ 22.731.764,00	1085,51	$ 9.880 338,00	3582,96	$ 32 612.102,00
	2.2.8	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO B	UND	20	1.034.310,00	$ 20.682.200,00		$	20,00	$ 20.682.200,00	20	$ 20 682 200,00
	2.2.9	DINTEL EN CONCRETO 0.2X0.1 M	ML	47,6	78.883,00	$ 1.374.831,00		$		$	0	$
	2.2.10	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 0.10X0.10 M	ML	62,4	112 784,00	$ 7.037.722,00		$		$	0	$
		SUBTOTAL CAP. 2.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO:				$ 107.672.512,00		$ 22 731 744,00		$ 73.263.513,00		$ 95 995.277,00
2.3	PISOS Y ACABADOS					$ 36.834.332,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	2.3.1	PISO ESMALTADO EN CONCRETO 3.000 PSI E= 0.10 MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	268,14	122.372,00	$ 32.812.828,00		$		$	0	$
	2.3.2	PISO EN PORCELANATO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	24,33	100 099,00	$ 2.435.409,00		$		$	0	$
	2.3.3	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4, PARA PISOS Y ZONA DE MESONES DE BAÑOS, Y LOCALES, INCLUYE ENDURECEDOR DE CUARZO.	ML	16,48	35 564,00	$ 586.095,00		$		$	0	$
						$ 0,00						

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022. Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
				SUBTOTAL CAP. 2,3 PISOS Y ACABADOS:		$ 35.834.332,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2,4		MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL Y DIVISONES				$ 53.260.220,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	2.4.1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-10 EN MORTERO 1:4.	M2	749,58	$ 66.442,00	$ 49.803.594,00		$		$	0	$
	2.4.2	ALFAJIA EN CONCRETO 0,25X0,1	ML	112,59	$ 30.701,00	$ 3.456.626,00		$		$	0	$
				SUBTOTAL CAP. 2,4 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL Y DIVISONES:		$ 53.260.220,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2,5		PAÑETE, ENCHAPES Y PINTURA				$ 56.923.475,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	2.5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS.	M2	750,28	$ 41.340,00	$ 31.012.441,00		$		$	0	$
	2.5.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES.	ML	114	$ 11.491,00	$ 1.309.974,00		$		$	0	$
	2.5.3	ENCHAPE EN CERAMICA.	M2	29,47	$ 84.354,00	$ 2.485.912,00		$		$	0	$
	2.5.4	PINTURA VINILO TIPO 1. MUROS INTERIORES	M2	391,89	$ 19.259,00	$ 7.547.410,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.409,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	Al	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	2.5.5	ESTUCO PLASTICO-TIPO ACRILICO PARA EXTERIORES	M2	302,16	$ 22.890,00	$ 6.916.442,00		$		$	0	$
	2.5.8	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA O SIMILAR	M2	302,16	$ 25.322,00	$ 7.651.296,00		$		$	0	$
					SUBTOTAL CAP. 2.5 PAÑETE, ENCHAPES Y PINTURA:	$ 54.923.475,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2,6		CARPINTERIA METALICA				$ 30.967.471,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	2.6.1	VENTANAS EN ALUMINIO 5520 DE CORREDERA INCLUYE VIDRIO	M2	27,63	$ 320.426,00	$ 8.853.370,00		$		$	0	$
	2.6.2	PUERTA EN ALUMINIO 110 PERSIANA DOBLE BATIENTE CORTAFUEGOS	M2	13,2	$ 1.112.315,00	$ 14.682.558,00		$		$	0	$
	2.6.3	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20, SEGÚN MEDIDAS, CERRADURA TIPO YALE, ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y COLOCACION.	M2	11	$ 675.613,00	$ 7.431.743,00		$		$	0	$
					SUBTOTAL CAP. 2,6 CARPINTERIA METALICA:	$ 30.967.471,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
2,7		ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA				$ 384.912.068,00		$ 243.115.547,00		$ 141.796.522,00		$ 384.912.068,00
	2.7.1	ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON PINTURA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WLST ARCO E70.18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - 1=50CM CONECTORES Y ACABADO FINAL	KG	12333,42	$ 22.193,00	$ 273.690.923,00	10.956,59	$ 243.115.547,00	1377,83	$ 30.575.377,00	12.333,42	$ 273.690.923,00
	2.7.2	LOSA COMPUESTA METALDECK CON LAMINA COLABORANTE	M2	315	$ 353.083,00	$ 111.221.145,00		$	315,00	$ 111.221.145,00	315,00	$ 111.221.145,00
					SUBTOTAL CAP. 2,7 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA:	$ 384.912.068,00		$ 243.115.547,00		$ 141.796.522,00		$ 384.912.068,00
3		CUBIERTA PRINCIPAL				$ 13.911.474.065,00		$ 5.020.672.508,00		$ 4.218.995.303,00		$ 9.239.849.830,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR				
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS					
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.403,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan así:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023 AL 31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UNO	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.1		**MOVIMIENTOS DE TIERRA CUBIERTA PRINCIPAL**				**$ 208.368.016,00**		**$ 134.521.894,00**		**$ 73.846.122,00**		**$ 208.368.016,00**
	3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m. MEDIDO EN SITIO	M3	2895,2	$ 39.785,00	$ 115.185.532,00	2.804,41	$ 111.573.452,00	90,79	$ 3.612.080,00	2.895,20	$ 115.185.532,00
	3.1.2	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE	M3	516,82	$ 21.537,00	$ 11.130.752,00	504,12	$ 10.857.232,00	12,70	$ 273.520,00	516,82	$ 11.130.752,00
	3.1.3	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3). MEDIDO EN SITIO.	M3/KM	2378,38	$ 34.499,00	$ 82.051.732,00	350,48	$ 12.091.210,00	2027,90	$ 69.960.522,00	2.378,38	$ 82.051.732,00
					SUBTOTAL CAP. 3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CUBIERTA PRINCIPAL:	**$ 208.368.016,00**		**$ 134.521.894,00**		**$ 73.846.122,00**		**$ 208.368.016,00**
3.2		**CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 1.226.689.134,00**		**$ 744.924.757,00**		**$ 0,00**		**$ 744.927.471,00**
	3.2.1	CONCRETO PARA SOLADOS E=5.0cmts, f'c=2.500 PSI.	M3	43,61	$ 600.195,00	$ 26.174.504,00	43,41	$ 26.054.465,00		$ -	43,41	$ 26.054.465,00
	3.2.2	CONCRETO CICLOPEO 60% F'C=3000PSI Y 40% PIEDRA	M3	168,75	$ 454.072,00	$ 76.624.650,00		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	3.2.3	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO VIBRADO Y CURADO.	M3	163,25	$ 902.639,00	$ 147.355.817,00	87,09	$ 78.610.966,00		$ -	87,09	$ 78.610.831,00
	3.2.4	ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	393,75	$ 701.953,00	$ 276.393.994,00	223,13	$ 156.623.283,00		$ -	223,13	$ 156.626.773,00
	3.2.5	PEDESTAL EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	55,69	$ 994.419,00	$ 55.379.194,00	32,99	$ 32.806.904,00		$ -	32,99	$ 32.805.883,00
	3.2.6	CONCRETO f'c=3000PSI PARA COLUMNAS INCLUYE VIBRADO	M3	40,16	$ 814.950,00	$ 32.728.392,00		$ -		$ -	-	$ -
	3.2.7	ACERO DE REFUERZO PDR-60, Fy=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACION.	KG	49907,68	$ 9.102,00	$ 454.259.703,00	32.196,95	$ 293.056.679,00		$ -	32.196,95	$ 293.056.639,00
	3.2.8	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO C	UND	45	$ 3.506.064,00	$ 157.772.880,00	45,00	$ 157.772.880,00		$ -	45,00	$ 157.772.880,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UNO	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
		SUBTOTAL CAP. 3.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO:				$ 1.226.489.134,00		$ 744.924.767,00		$ 0,00		$ 744.927.471,00
3.3		ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS				$ 12.476.416.915,00		$ 4.141.425.857,00		$ 4.145.149.181,00		$ 8.286.574.343,00
	3.3.1	CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH	M2	8889,88	$ 295.570,00	$ 2.627.581.832,00		$	5051,11	$ 1.492.957.174,00	5051,11	$ 1.492.956.583,00
	3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES METALICOS	ML	444,8	$ 234.134,00	$ 104.142.803,00		$		$	0	$
	3.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MULTIPERFORADA	M2	1433,75	$ 563.194,00	$ 807.479.398,00		$		$	0	$
	3.3.4	ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WESI ARCO E70:18, LAMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=90CM, CONECTORES Y ACABADO FINAL	KG	402740,43	$ 22.191,00	$ 8.937.212.882,00	186.426,37	$ 4.141.425.857,00	119316,56	$ 2.652.192.007,00	306142,93	$ 6.793.617.760,00
						$ 0,00		$		$	0	$
											0	
		SUBTOTAL CAP. 3.3 ESTRUCTURAS METALICAS Y DE CUBIERTAS				$ 12.476.416.915,00		$ 4.141.425.857,00		$ 4.145.149.181,00		$ 8.286.574.343,00
4		ZONAS EXTERIORES Y PAISAJISMO				$ 2.096.845.316,00		$ 62.100.252,00		$ 118.065.497,00		$ 180.165.748,00
4.1		URBANISMO Y ZONAS EXTERIORES				$ 1.841.588.859,00		$ 62.100.252,00		$ 118.065.497,00		$ 180.165.748,00
	4.1.1	CONFORMACION Y NIVELACION EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	9431,61	$ 18.946,00	$ 178.691.283,00	3.277,75	$ 62.100.252,00	6153,86	$ 116.591.032,00	9.431,61	$ 178.691.283,00
	4.1.2	SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	2829,48	$ 103.583,00	$ 293.086.027,00		$		$		$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor . como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan así.

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	Al	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	4.1.3	PISO EN CONCRETO PARA CICULACIÓN PEATONAL DE ESPESOR E=0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	2377,79	$ 137.081,00	$ 325.949.831,00		$		$		$
	4.1.4	LOSETA PODO TACTIL TIPO PEATONAL, DE 40X40CM - E=6CM. JUNTA PERDIDA. CON ARENA (VER PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS).	ML	891	$ 44.516,00	$ 39.663.756,00		$		$		$
	4.1.5	LOSETA TIPO TOPEROL, DE 40X40CM - E=6CM. JUNTA PERDIDA CON ARENA (VER PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS).	ML	70	$ 44.516,00	$ 3.116.120,00		$		$		$
	4.1.6	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO DE 20X10X6CM, CON MORTERO DE BASE 1:4 (E= 0.04), COMPACTACIÓN E INSTALACION.	M2	7053,82	$ 125.768,00	$ 887.144.834,00		$		$		$
	4.1.7	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO FC=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15X45CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4X3/8" Y FLEJES DE 1/4"@20CM.	ML	1579,45	$ 71.403,00	$ 112.777.468,00		$	20,93	$ 1.494.465,00	20,93	$ 1.494.465,00
	4.1.8	RAMPAS DISCAPACITADOS - E=10CM. CONCRETO CLASE D (FC=3.000PSI) - SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO.	M2	17,28	$ 67.103,00	$ 1.159.540,00		$		$		$
								$		$		$
					SUBTOTAL CAP. 4.1 URBANISMO Y ZONAS EXTERIORES:	$ 1.641.388.869,00		$ 42.100.262,00		$ 116.085.497,00		$ 180.185.765,00
4.2		PAISAJISMO				$ 255.276.457,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	4.2.1	CONTENEDOR PARA LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES, INCLUYE EXCAVACION, EN LOS SITIOS DONDE SE PLANTARAN LOS NUEVOS ÁRBOLES, SE PROCEDERÁ A FUNDIR UN ANILLO CONTENEDOR DE RAICES EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI (210 KG/ M2) A UNA PROFUNDIDAD DE 1,30 MTS Y UN DIÁMETRO DE 1,50 MTS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO SUMINISTRO Y SIEMBRA ARBOLES NATIVOS-2,50 MT ALTURA	UND	47	$ 630.816,00	$ 29.648.352,00				$	0	$
	4.2.2	EMPRADIZACION ZONAS VERDES, INCLUYE SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LA GRAMA, TIERRA NEGRA Y FERTILIZANTES.	M2	4029,19	$ 45.823,00	$ 184.629.573,00				$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras publicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	4.2.3	BANCA DE CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M-30, INCLUYE BASES EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UND	20	$ 1.168.225,00	$ 23.774.500,00				$	0	$
	4.2.4	CANECA PARA BASURAS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE BASES EN CONCRETO DE F'C=3.000 PSI, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.	UND	16	$ 1.079.627,00	$ 17.274.032,00				$	0	$
												$
					SUBTOTAL CAP. 4.2 PAISAJISMO:	$ 255.274.457,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
5		PARQUEADEROS				$ 2.103.800.445,00		$ 0,00		$ 309.030.549,00		$ 309.030.593,00
5.1		PARQUEADERO				$ 2.103.800.445,00		$ 0,00		$ 309.030.549,00		$ 309.030.593,00
	5.1.1	CONFORMACION Y NIVELACION EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	7306,97	$ 18.946,00	$ 138.437.854,00			7056,75	$ 133.697.186,00	7056,75	$ 133.697.186,00
	5.1.2	SUB BASE GRANULAR, CLASE C, ESPESOR 20 CM	M3	1461,39	$ 105.321,00	$ 153.915.056,00			1461,39	$ 153.915.056,00	1461,39	$ 153.915.056,00
	5.1.3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4,2 E= 17 CM.	M2	7306,97	$ 161.521,00	$ 1.180.229.101,00			57,00	$ 9.206.697,00	57	$ 9.206.697,00
	5.1.4	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE 10 MM, INCLUYE CORTE DE 5MM DE ANCHO X 3,0 A 5 CMS DE PROFUNDIDAD.	ML	4700,54	$ 16.599,00	$ 78.024.263,00				$	0	$
	5.1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0,0 A 2,0M MEDIDO EN SITIO.	M3	53,69	$ 37.660,00	$ 2.021.965,00			53,69	$ 2.021.965,00	53,69	$ 2.021.965,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.569.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 20X50X80CM	Mt	894,83	$ 115.552,00	$ 103.399.396,00				$	0	$
	5.1.7	ACERO DE REFUERZO PDR-60 FY=420 MPA PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	18487,24	$ 9.102,00	$ 168.270.856,00			1119,50	$ 10.189.645,00	1119,5	$ 10.189.669,00
	5.1.8	MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X 15 - 6,0 MM	KG	21847,84	$ 11.678,00	$ 255.095.380,00			0,00	$	0	$
	5.1.9	DEMARCACIÓN SOBRE PISO EN CONCRETO PARA PARQUEADERO PINTURA TIPO TRAFICO CON RETRO UV AL 80%	Mt	1247,75	$ 5.824,00	$ 7.266.896,00				$	0	$
	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	UND	464	$ 36.939,00	$ 17.139.696,00				$	0	$
					SUBTOTAL CAP. 4,1 URBANISMO Y ZONAS EXTERIORES:	$ 2.103.800.465,00		$ 0,00		$ 309.030.549,00		$ 309.030.593,00
6		**CERRAMIENTO EXTERIOR**				**$ 805.893.912,00**		**$ 0,00**		**$ 79.523.799,00**		**$ 79.523.810,00**
6,1		**MOVIMIENTOS DE TIERRA CERRAMIENTO**				**$ 19.037.616,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	6.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0,0 A 2,0m MEDIDO EN SITIO.	M3	272,45	$ 39.785,00	$ 10.839.423,00				$	0	$
	6.1.2	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE:	M3	92,66	$ 21.537,00	$ 1.995.618,00				$	0	$
	6.1.3	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO	M3/KM	179,79	$ 34.499,00	$ 6.202.575,00				$	0	$
					SUBTOTAL CAP. 6,1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CERRAMIENTO:	$ 19.037.616,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
6.2		**CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**				**$ 493.241.408,00**		**$ 0,00**		**$ 79.523.799,00**		**$ 79.523.810,00**
	6.2.1	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	96,06	$ 902.639,00	$ 86.707.502,00					0	$
	6.2.2	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO CICLOPEO 60% F'C=2000PSI Y 40% PEDRA 1"	M3	27,78	$ 524.252,00	$ 14.563.721,00					0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	6.2.3	ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO FC=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	72,07	$ 701.953,00	$ 50.589.753,00					0	$
	6.2.4	PEDESTAL EN CONCRETO FC=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	14,89	$ 994.419,00	$ 14.806.899,00					0	$
	6.2.5	COLUMNAS EN CONCRETO FC=3000PSI, INCLUYE FORMALETA.	M3	42,47	$ 1.056.798,00	$ 44.867.211,00					0	$
	6.2.6	VIGAS CINTA EN CONCRETO FC=3000PSI, INCLUYE FORMALETA.	M3	5,12	$ 1.040.265,00	$ 5.326.157,00					0	$
	6.2.7	VIGAS CORONA EN CONCRETO FC=3000PSI, INCLUYE FORMALETA.	M3	42,42	$ 1.353.525,00	$ 57.416.531,00					0	$
	6.2.8	ACERO DE REFUERZO PDR-60 FY=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	24057,2	$ 9.102,00	$ 218.968.634,00			8736,96	$ 79.523.799,00	8736,96	$ 79.523.810,00
		SUBTOTAL CAP. 6.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO:				$ 493.261.408,00		$ 0,00		$ 79.523.799,00		$ 79.523.810,00
6.3		MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL				$ 138.531.315,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	6.3.1	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL LISO E=12CM, F'U=10.0MPA, BLOQUE DE 0.12X0.19X0.39M, COLOR GRIS CLARO LISO, JUNTA RANURADA EN MORTERO 1:4	M2	1164,18	$ 95.217,00	$ 110.849.727,00					0	$
	6.3.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO SPLIT E=15CM, F'U=10.0MPA, BLOQUE DE 0.15X0.19X0.39M, COLOR GRIS CLARO ABUZARDADO EXTERIOR - LISO INTERIOR, JUNTA RANURADA EN MORTERO 1:4.	M2	138,91	$ 107.590,00	$ 14.945.227,00					0	$
	6.3.3	DOVELAS CON GROUTING DE F'C=3.000 PSI FLUIDO CON AGREGADO DE 1/2" PARA RELLENO EN ZONA DE MAMPOSTERIA.	M3	13,36	$ 806.986,00	$ 10.781.333,00					0	$
	6.3.4	ACERO DE REFUERZO PDR-60 FY=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACION.	KG	214,78	$ 9.102,00	$ 1.954.928,00					0	$
						$ 0,00						

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS					
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,38	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi.

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
					SUBTOTAL CAP. 6,3 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL:	$ 138.531.315,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
6,4		CERRAMIENTO METALICO				$ 155.043.573,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	6.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" PARA ALTURA DE 2.40MT Y APOYOS SEPARADOSM CADA 12CM	ML	231,51	$ 576.463,00	$ 133.456.949,00					0	$
	6.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON DE ACCESO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" ESQUINAS EN TUBO GALVANIZADO DE 4"Y PERFIL HORIZONAL METALICO ALTURA DE 2.60MT Y APOYOS SEPARADOS CADA 12CM.	ML	16	$ 773.951,00	$ 12.383.216,00					0	$
	6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESO PEATONAL EN TUBO GALVANIZADO DE 2" PARA CERRAMIENTO. ALTURA DE 2.40MT Y APOYOS SEPARADOSM CADA 12CM	ML	16	$ 576.463,00	$ 9.223.408,00					0	$
					SUBTOTAL CAP. 6,4 CERRAMIENTO METALICO:	$ 155.043.573,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7		TANQUE SUBTERRANEO				$ 439.397.681,00		$ 139.744.605,00		$ 169.366.778,00		$ 309.131.172,00
7,1		MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 17.107.127,00		$ 16.708.552,00		$ 0,00		$ 16.708.357,00
	7.1.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN PARA TANQUE	M3	325,62	$ 18.470,00	$ 6.014.201,00	320,66	$ 5.922.664,00		$	320,66	$ 5.922.590,00
	7.1.2	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES SELECCIONADO, INCLUYE:	M3	10,85	$ 21.537,00	$ 233.676,00		$		$		$
	7.1.3	CARGUE TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO	M3/KM	314,77	$ 34.499,00	$ 10.859.250,00	312,64	$ 10.785.888,00		$	312,64	$ 10.785.767,00
					SUBTOTAL CAP. 7,1 MOVIMIENTO DE TIERRA:	$ 17.107.127,00		$ 16.708.552,00		$ 0,00		$ 16.708.357,00
7,2		CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO				$ 422.290.554,00		$ 123.036.053,00		$ 169.366.778,00		$ 292.402.815,00

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS					
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALITACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,59	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	14/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan así:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	7.2.1	CONCRETO PARA SOLADOS F=5,0cmts, f'c=2.500 PSI	M3	5,43	$ 600.195,00	$ 3.259.059,00		$	5,43	$ 3.259.059,00	5,43	$ 3.259.059,00
	7.2.2	CONCRETO FC=4000PSI IMPERMEABILIZADO PARA LOSA DE FONDO, MUROS Y LOSA SUPERIOR, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	124	$ 888.709,00	$ 110.199.916,00		$	124,00	$ 110.199.916,00	124	$ 110.199.916,00
	7.2.3	VIGAS AEREAS EN CONCRETO f'c=3000PSI, INCLUYE FORMALETA.	M3	13,28	$ 1.358.608,00	$ 18.047.314,00		$		$	0	$
	7.2.4	ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO	M3	0,4	$ 701.953,00	$ 280.781,00		$	0,00	$	0	$
	7.2.5	COLUMNAS EN CONCRETO f'c=3000PSI, INCLUYE FORMALETA.	M3	0,93	$ 1.056.798,00	$ 982.822,00		$	0,00	$	0	$
	7.2.6	CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO PARA LOSA SUPERIOR, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M2	108,54	$ 989.547,00	$ 107.405.431,00		$		$	0	$
	7.2.7	CINTA PVC O-22 PARA JUNTAS DE TANQUES	ML	60,4	$ 93.468,00	$ 5.645.467,00		$	60,40	$ 5.645.467,00	60,4	$ 5.645.467,00
	7.2.8	ACERO DE REFUERZO POR-60; FY=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	19388,57	$ 9.102,00	$ 176.474.764,00	13.519,67	$ 123.056.053,00	5522,12	$ 50.262.336,00	19041,79	$ 173.318.373,00
			SUBTOTAL CAP. 7.2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO:			$ 422.290.554,00		$ 123.056.053,00		$ 169.366.778,00		$ 292.422.815,00
8		GARITAS DE ACCESO				$ 64.902.442,00		$ 8.771.956,00		$ 0,00		$ 8.771.880,00
8.1		MOVIMIENTOS DE TIERRAS				$ 1.823.402,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	8.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0,0 A 2,0m, MEDIDO EN SITIO	M3	26,56	$ 39.785,00	$ 1.056.690,00		$		$	0	$
	8.1.2	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	M3	11,54	$ 21.537,00	$ 248.537,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.:	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

	POLIZAS		VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan así:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	8.1.3	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3), MEDIDO EN SITIO.	M3/KM	15,02	$ 34.499,00	$ 518.175,00		$		$	0	$
					SUBTOTAL CAP. 8,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS:	$ 1.803.402,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
8,2	CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO					$ 24.941.418,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	8.2.1	CONCRETO PARA SOLADOS f=5.0cm/h. Fc=2.500 PSI.	M3	2,2	$ 600.195,00	$ 1.320.429,00		$		$	0	$
	8.2.2	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLOPEO 60% FC=2000PSI Y 40% PIEDRA 1"	M3	7,2	$ 524.252,00	$ 3.774.614,00		$		$	0	$
	8.2.3	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO Fc=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	0,66	$ 902.639,00	$ 595.742,00		$		$	0	$
	8.2.4	ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO Fc=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	3,2	$ 701.953,00	$ 2.246.250,00		$		$	0	$
	8.2.5	PEDESTAL EN CONCRETO Fc=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	0,59	$ 994.419,00	$ 586.707,00		$		$	0	$
	8.2.6	CONCRETO Fc=3000PSI PARA COLUMNAS, INCLUYE VIBRADO	M3	0,12	$ 814.950,00	$ 97.794,00		$		$	0	$
	8.2.7	ACERO DE REFUERZO PDR-60, Fy=420 MPA PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	KG	149,71	$ 9.102,00	$ 1.362.660,00		$		$	0	$
	8.2.8	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO A	UND	8	$ 625.628,00	$ 5.005.024,00		$		$	0	$
	8.2.9	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO E	UND	16	$ 89.464,00	$ 1.431.424,00		$		$	0	$
	8.2.10	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO G	UND	16	$ 259.357,00	$ 4.149.712,00		$		$	0	$
	8.2.11	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 0.10X0.10 M	ML	36,4	$ 112.784,00	$ 4.105.338,00		$		$	0	$
	8.2.12	DINTEL EN CONCRETO 0.2X0.1 M	ML	9,2	$ 28.883,00	$ 265.724,00		$		$	0	$
					SUBTOTAL CAP. 1,2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO:	$ 24.941.418,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	14/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8.3		PISOS Y ACABADOS				$ 1.841.118,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	8.3.1	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4, PARA PISOS Y ZONA DE MESONES DE BAÑOS, Y LOCALES. INCLUYE ENDURECEDOR DE CUARZO.	ML	20,4	$ 35.564,00	$ 725.506,00		$		$	0	$
	8.3.2	PISO ESMALTADO EN CONCRETO 3.000 PSI e= 0.10 MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	9,28	$ 122.372,00	$ 1.135.612,00		$		$	0	$
					SUBTOTAL CAP. 8.3 PISOS Y ACABADOS:	$ 1.841.118,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
8.4		MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL Y DIVISIONES				$ 3.892.237,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	8.4.1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-10 EN MORTERO 1:4.	M2	52,72	$ 68.359,00	$ 3.603.886,00		$		$	0	$
	8.4.2	ALTAJAS EN CONCRETO SEGUN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI SECCION 10x20	ML	9	$ 32.039,00	$ 288.351,00		$		$	0	$
					SUBTOTAL CAP. 8.4 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL:	$ 3.892.237,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
8.5		PAÑETE, ENCHAPES Y PINTURA				$ 6.044.671,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	8.5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES.	ML	46,98	$ 11.491,00	$ 539.847,00		$		$	0	$
	8.5.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS.	M2	52,72	$ 29.816,00	$ 1.571.900,00		$		$	0	$
	8.5.3	ENCHAPE PARA MUROS DE CORONA O EQUIVALENTE, INCLUYE PEGACOR Y RETRAGUE CON CONCOLOR BLANCO.	M2	10,92	$ 95.025,00	$ 1.037.673,00		$		$	0	$
	8.5.4	ESTUCO PLASTICO-TIPO ACRILICO PARA EXTERIORES	M2	46,98	$ 22.890,00	$ 1.075.372,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.558.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.903.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar. a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor . como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi.

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	8.5.5	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA O SIMILAR	M2	46,98	$ 25.322,00	$ 1.189.628,00		$ -		$ -	0	$ -
	8.5.6	CIELO RASO PLANO DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO	M2	7,56	$ 86.012,00	$ 650.251,00		$ -		$ -	0	$ -
					SUBTOTAL CAP. 8.5 PAÑETE, ENCHAPE Y PINTURA:	$ 6.044.671,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
8.6		CARPINTERIA METALICA				$ 6.361.426,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	8.6.1	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20. SEGÚN MEDIDAS, CERRADURA TIPO YALE. ANTICORROSIVO. PINTURA EN ESMALTE Y COLOCACION.	M2	7,04	$ 675.813,00	$ 4.756.316,00		$ -		$ -	0	$ -
	8.6.2	VENTANA EN ALUMINIO SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO INCOLORO 6mm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.	M2	4,2	$ 382.169,00	$ 1.605.110,00		$ -		$ -	0	$ -
					SUBTOTAL CAP. 8.6 CARPINTERIA METALICA:	$ 6.361.426,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.407-00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO				22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8,7		ACCESORIOS, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA				$ 4.262.754,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	8.7.1	REJILLA DE SOSCO DE 3"X2", INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2	$ 41.910,00	$ 83.820,00		$		$	0	$
	8.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL COLOR BLANCO O EQUIVALENTE	UND	2	$ 364.652,00	$ 729.304,00		$		$	0	$
	8.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO, BRIDA Y ASIENTO INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE.	UND	2	$ 1.724.815,00	$ 3.449.630,00		$		$	0	$
			SUBTOTAL CAP. 1,7 ACCESORIOS, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA:			$ 4.262.754,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
8,8		ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA				$ 15.695.416,00		$ 8.771.956,00		$ 0,00		$ 8.771.880,00
	8.8.1	LOSA COMPUESTA METALDECK CON LAMINA COLABORANTE	M2	4,64	$ 353.083,00	$ 1.638.305,00		$		$	0	$
	8.8.2	ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WESTARCO E70-18, LÁMINAS F=1", ANCLAJE SAE 1040 - F=50CM CONECTORES Y ACABADO FINAL	KG	633,46	$ 22.191,00	$ 14.057.111,00	395,29	$ 8.771.956,00		$	395,29	$ 8.771.880,00
			SUBTOTAL CAP. 8.8 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA:			$ 15.695.416,00		$ 8.771.956,00		$ 0,00		$ 8.771.880,00
9		CICLOVIA				$ 99.282.429,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9,1		CICLO VIA				$ 99.282.429,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	9.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0,0 A 2,0m MEDIDO EN SITIO	M3	189,88	$ 39.785,00	$ 7.554.376,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.** / **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** / **PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023 / $ 46.565.358.402,00 / 24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.** / **FECHA DE INICIO** / **FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023 / 17 DE MARZO DE 2023 / 17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022. Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor . como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	1	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	9.1.2	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6 0M3). MEDIDO EN SITIO.	M3/KM	189,88	$ 34.459,00	$ 6.550.670,00		$		$	0	$
	9.1.3	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO f'c=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15x45cm, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4x3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20cm.	ML	269,32	71.402,00	$ 19.229.987,00		$		$	0	$
	9.1.4	CONFORMACIÓN Y NIVELACION EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	M2	429,25	18.946,00	$ 8.132.571,00		$		$	0	$
	9.1.5	SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	85,85	103.583,00	$ 8.892.601,00		$		$	0	$
	9.1.6	BASE GRANULAR, CBR >80%	M3	85,85	130.772,00	$ 11.226.776,00		$		$	0	$
	9.1.7	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	429,25	8.251,00	$ 3.541.742,00		$		$	0	$
	9.1.8	CONCRETO ASFALTICO E=0,05m, INCLUYE ACARREO 10KM Y COMPACTACION, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO.	M2	429,25	67.920,00	$ 29.154.660,00		$		$	0	$
	9.1.9	DEMARCACIÓN SOBRE PISO EN DE CICLOVIA, TIPO TRAHCO CON FILTRO UV AL 80%	ML	858,5	5.823,00	$ 4.999.046,00		$		$	0	$
					SUBTOTAL CAP. 9,1 CICLO VIA:	$ 99.282.429,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
10		**RAMPA EXTERIOR Y ESCALERAS**				$ 44.129.782,00		$ 0,00		$ 4.266.147,00		$ 4.266.147,00
10,1		**RAMPA EXTERIOR Y ESCALERA**				$ 44.129.782,00		$ 0,00		$ 4.266.147,00		$ 4.266.147,00
	10.1.1	RAMPA ACCESO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA, EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA FC=3000PSI DE ESPESOR E=10CM,INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM	M2	61,92	104.950,00	$ 6.498.504,00		$		$	0	$

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



Consorcio Interplaza

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,56	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	10.1.2	BARANDA EN Ø 1 1/2" + 4 UN TUBO HORIZONTALES DE 1 1/2" EN TUBO GALVANIZADO AGUA 1 1/2" - 3MM. REFUERZO VERTICAL EN ANGULO DOBLE DE 2 X 1/8" CADA 1.50 - ACABADO EN ESMALTE-H= 1,10	ML	21,96	$ 361.240,00	$ 7.932.830,00		$ -		$ -	0	$ -
	10.1.3	ESCALERAS EN CONCRETO F'C=3000PSI. INCLUYE FORMALETA.	M3	18,99	$ 1.339.247,00	$ 25.432.301,00		$ -		$ -	0	$ -
	10.1.4	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO F'C=3000PSI, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	M3	5,64	$ 756.409,00	$ 4.266.147,00		$ -	5,64	$ 4.266.147,00	5,64	$ 4.266.147,00
					SUBTOTAL CAP. 10.1 RAMPA EXTERIOR Y ESCALERA:	$ 44.129.782,00		$ 0,00		$ 4.266.147,00		$ 4.266.147,00
11		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				$ 1.207.625.884,00		$ 0,00		$ 5.759.660,00		$ 5.759.660,00
11,1		**RED AGUA POTABLE**				$ 314.917.691,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	11.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.	M3	1567,28	$ 34.854,00	$ 54.625.977,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.1.2	RELLENO COMPACTADO MATERIAL COMUN	M3	96,45	$ 126.240,00	$ 12.175.848,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.1.3	ACOMETIDA TUBERÍA 2" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1	$ 1.381.931,00	$ 1.381.931,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.1.4	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	160	$ 66.583,00	$ 10.653.280,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" RDE-13,5 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	537,3	$ 26.412,00	$ 14.191.168,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50,92	$ 29.004,00	$ 1.476.884,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	116	$ 32.932,00	$ 3.820.112,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1 1/2" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	121	$ 43.986,00	$ 5.323.306,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	228	$ 51.743,00	$ 11.797.404,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CONTROL 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1	$ 4.170.728,00	$ 4.170.728,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS UNIVERSALES AL EN PVC, D= 1"	UND	10	$ 102.910,00	$ 1.029.100,00		$ -		$ -	0	$ -

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022. Contratista de Obra. DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023. Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision. OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO				22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UNO	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS UNIVERSALES AT EN PVC. D= 2"	UND	2	$ 165.694,00	$ 331.388,00		$		$	0	$
	11.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CONTROL 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	49	$ 1.056.072,00	$ 51.747.528,00		$		$	0	$
	11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE AIRE EN TUBERIA 1/2" GALVANIZADA (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	160	$ 122.099,00	$ 19.535.840,00		$		$	0	$
	11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1	$ 106.143.753,00	$ 106.143.753,00		$		$	0	$
	11.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRONEUMATICO (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2	$ 8.635.670,00	$ 17.271.340,00		$		$	0	$
	11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILACION TANQUE ALMACENAMIENTO EN CUELLO DE GANSO 4" HIERRO	UND	8	$ 185.638,00	$ 1.485.104,00		$		$	0	$
					SUBTOTAL	$ 314.917.691,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
11.2		**RED DESAGUE AGUA RESIDUALES**				$ 191.545.694,00		$ 0,00		$ 5.759.660,00		$ 5.759.660,00
	11.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	191,7	$ 43.141,00	$ 8.270.130,00		$		$	0	$
	11.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 3"	ML	737	$ 53.345,00	$ 39.315.265,00		$		$	0	$
	11.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	175	$ 63.435,00	$ 11.101.125,00		$	61,95	$ 3.929.798,00	61,95	$ 3.929.798,00
	11.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 6"	ML	182	$ 109.089,00	$ 19.854.198,00		$		$	0	$
	11.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC. D = 2"	ML	70	$ 43.141,00	$ 3.019.870,00		$		$	0	$
	11.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC. D = 3"	ML	14	$ 53.345,00	$ 746.830,00		$		$	0	$
	11.2.7	PUNTO VENTILACION 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	7	$ 110.628,00	$ 774.396,00		$		$	0	$
	11.2.8	PUNTO VENTILACION 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2	$ 151.222,00	$ 302.444,00		$		$	0	$
	11.2.9	PUNTO SANITARIO 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	105	$ 125.943,00	$ 13.224.015,00		$		$	0	$
	11.2.10	PUNTO SANITARIO 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	43	$ 166.181,00	$ 7.145.783,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



Consorcio Interplaza

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	041-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi.

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	11.2.11	SIFON DE PISO 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	80	$ 47.392,00	$ 3.791.360,00		$		$	0	$
	11.2.12	SIFON DE PISO 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	48	$ 64.643,00	$ 3.102.864,00		$		$	0	$
	11.2.13	CONEXION RED SANITARIA A POZO EXISTENTE	UND	1	$ 596.061,00	$ 596.061,00		$	1,00	$ 596.061,00	1	$ 596.061,00
	11.2.14	DESAGUE TANQUES ELEVADOS	UND	2	$ 404.945,00	$ 809.890,00		$		$	0	$
	11.2.15	TRAMPA DE GRASAS DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI EPARED=10CM; EPISO=10CM; ETAPA=10CM, (INCLUYE MARCO EN ANGULO DE 2"*3/16" Y TAPA EN PLATINA DE 2 1/2"*3/16)	UND	56	$ 1.006.107,00	$ 56.341.992,00		$		$	0	$
	11.2.16	CAJA DE INSPECCION DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI CON SECCIÓN DE 80X80 Y ALTURA MENOR A 1.15 M; EPARED=10CM; EPISO=10CM; ETAPA=6CM, (INCLUYE MARCO EN ANGULO DE 2"*3/16" Y TAPA EN PLATINA DE 2 1/2"*3/16)	UND	6	$ 1.144.683,00	$ 6.868.098,00		$		$	0	$
	11.2.17	CAJA DE INSPECCION DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI CON SECCIÓN DE 80X80 Y ALTURA ENTRE 1.15 M Y 1.50 M; EPARED=15CM; EPISO=10CM; ETAPA=6CM, (INCLUYE MARCO EN ANGULO DE 2"*3/16" Y TAPA EN PLATINA DE 2 1/2"*3/16)	UND	2	$ 1.233.801,00	$ 2.467.602,00		$	1,00	$ 1.233.801,00	1	$ 1.233.801,00
	11.2.18	CAJA DE INSPECCION DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI CON SECCIÓN DE 80X80 Y ALTURA ENTRE 1.51 M Y 2.00 M; EPARED=20 CM; EPISO=10CM; ETAPA=6 CM, (INCLUYE MARCO EN ANGULO DE 2"*3/16" Y TAPA EN PLATINA DE 2 1/2"*3/16)	UND	3	$ 2.092.522,00	$ 6.277.566,00		$		$	0	$
	11.2.19	CAJA DE INSPECCION DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI CON SECCIÓN DE 80X80 Y ALTURA ENTRE 2,01 M Y 2.5 M; EPARED=20 CM; EPISO=10CM; ETAPA=6CM, (INCLUYE MARCO EN ANGULO DE 2"*3/16" Y TAPA EN PLATINA DE 2 1/2"*3/16)	UND	3	$ 2.512.069,00	$ 7.536.207,00		$		$	0	$
					SUBTOTAL	$ 191.545.696,00		$ 0,00		$ 5.739.660,00		$ 5.739.660,00
11,3		RED DESAGUE AGUAS LLUVIAS				$ 699.162.497,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	11.3.1	PUNTO AGUAS LLUVIA 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	20	$ 287.705,00	$ 5.754.100,00		$		$	0	$
	11.3.2	PUNTO AGUAS LLUVIA 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	8	$ 353.698,00	$ 2.829.584,00		$		$	0	$
	11.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA BAJANTE AGUAS LLUVIA 4" ACERO ASTM-A795 - SCH 10 GALVANIZADA (INCLUYE ACCESORIOS INSTALACION, WASH PRIMER Y PINTURA)	ML	360	$ 132.901,00	$ 47.844.360,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.558.407,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor . como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	11.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA BAJANTE AGUAS LLUVIA 6" ACERO ASTM-A/93 - SCH 10 GALVANIZADA (INCLUYE ACCESORIOS INSTALACION, WASH PRIMER Y PINTURA)	ML	144	$ 160.670,00	$ 23.136.480,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUAS LLUVIA PVC 4"	ML	30	$ 71.434,00	$ 2.143.020,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUAS LLUVIA PVC 6"	ML	16	$ 139.086,00	$ 2.225.376,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.7	CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, H=30cm; LONGITUD DE DESARROLLO 1=1.20m	ML	964	$ 400.267,00	$ 385.857.388,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.8	CODO 90° ACERO RANURADA 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	100	$ 242.059,00	$ 24.205.900,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.9	CODO 90° ACERO RANURADA 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	40	$ 297.054,00	$ 11.882.160,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.10	UNION UNIVERSAL ACERO A PVC 4"	UND	20	$ 75.247,00	$ 1.504.940,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.11	UNION UNIVERSAL ACERO A PVC 6"	UND	8	$ 97.245,00	$ 777.960,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.12	SOPORTE VERTICAL TIPO PERA TUBERIA METALICA 4"	UND	100	$ 56.718,00	$ 5.671.800,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.13	SOPORTE VERTICAL TIPO PERA TUBERIA METALICA 6"	UND	40	$ 63.158,00	$ 2.526.320,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.14	SOPORTE ANTISISMICO 4"	UND	60	$ 389.374,00	$ 23.362.440,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.15	SOPORTE ANTISISMICO 6"	UND	24	$ 455.368,00	$ 10.928.832,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.16	ABRAZADERA METALICA 4"	UND	120	$ 106.763,00	$ 12.811.560,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.17	ABRAZADERA METALICA 6"	UND	48	$ 139.759,00	$ 6.708.432,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.18	CARCAMO RECOLECCIÓN AGUA LLUVIA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI CON MARCO Y REJILLA METALICA (ANCHO TOTAL=0.60M ALTO=0.300M) E= 0.10 M	ML	480	$ 267.371,00	$ 128.338.080,00		$ -		$ -	0	$ -
	11.3.19	SIFON DE PISO 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	5	$ 130.753,00	$ 653.765,00		$ -		$ -	0	$ -
						$ 0,00						
			SUBTOTAL CAP. 6.3 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL:			$ 699.162.497,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.398.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan así

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
12		**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 5.603.821.074,00**		**$ 1.055.634.404,00**		**$ 254.367.715,00**		**$ 1.310.002.119,00**
12.1		**ACOMETIDA DE MEDIA TENSION**				**$ 480.423.864,00**		**$ 7.578.151,00**		**$ 236.893.102,00**		**$ 244.471.253,00**
	12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 12 M 1050 KGF	UND	1	$ 3.199.680,00	$ 3.199.680,00		$ -	1,00	$ 3.199.680,00	1	$ 3.199.680,00
	12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADECUACIÓN POSTE ARRANQUE RED MT, INCLUYE CRUCETAS DE PROTECCIÓN, CRUCETAS SOPORTE EQUIPOS DE MEDIDA	UND	1	4.675.837,00	$ 4.675.837,00		$ -	1,00	$ 4.675.837,00	1	$ [illegible]
	12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS CORTACIRCUITO CON CÁMARA APAGACHISPAS	UND	3	879.495,00	$ 2.638.485,00		$ -	2,00	$ 1.758.990,00	2	$ 1.758.990,00
	12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS 15KV 10KA	UND	3	694.534,00	$ 2.083.602,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN MT TIPO VEHICULAR (1,5 X 1,5X2M)	UND	3	3.515.098,00	$ 10.545.294,00		$ -	3,00	$ 10.545.294,00	3	$ 10.545.294,00
	12.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE IMC 1X4" PARA ACOMETIDA PRINCIPAL DE MEDIA TENSIÓN	UND	1	1.310.726,00	$ 1.310.726,00	0,56	$ 734.007,00		$ -	0,56	$ 734.007,00
	12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE IMC 1X1" PARA SEÑALES DE TENSIÓN Y CORRIENTE (LOS DUCTOS DE SEÑALES DE TENSIÓN Y CORRIENTE DEBEN SER INDEPENDIENTES)	UND	2	516.303,00	$ 1.032.606,00	0,7	$ 361.412,00		$ -	0,7	$ 361.412,00
	[illegible]	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC 2X1" PARA SEÑALES DE TENSIÓN Y CORRIENTE (LOS DUCTOS DE SEÑALES DE TENSIÓN Y CORRIENTE DEBEN SER INDEPENDIENTES)	ML	10	69.355,00	$ 693.550,00	0,16	$ 11.097,00		$ -	0,16	$ 11.097,00
	12.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3X4" PARA CANALIZACIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN	ML	96	219.053,00	$ 21.029.088,00	38,4	$ 8.411.635,00	57,60	$ 12.617.453,00	96	$ 21.029.088,00
	12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3(1/0 AWG XLPE 15 kv, AL 100% 1350 H19 CLASE B	ML	260	229.127,00	$ 59.573.020,00		$ -		$ -	0	$ -
	[illegible]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES PREMOLDEADOS 15KV TIPO EXTERIOR CABLE 1/0 AWG AL	UND	3	1.321.060,00	$ 3.963.180,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES PREMOLDEADOS 15KV TIPO INTERIOR CABLE 1/0 AWG AL	UND	9	874.754,00	$ 7.872.786,00		$ -		$ -	0	$ -

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	041-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.303.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO				22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 500KVA, TENSIÓN PRIMARIA: 13200, TENSION SECUNDARIA:	UND	1	$ 66.268.173,00	$ 66.268.173,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR	UND	1	$ 12.638.736,00	$ 12.638.736,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE REMONTE 24KV	UND	2	$ 7.120.224,00	$ 14.240.448,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE SECCIONAMIENTO CON FUSIBLE, OPERACIÓN BAJO CARGA, INCLUYE DISPOSITIVO	UND	1	$ 24.792.720,00	$ 24.792.720,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO DE 20X60CM, INCLUYE TAPA AL FAJOR 60 CM	ML	22	$ 409.639,00	$ 9.012.058,00		$ -	22,00	$ 9.012.058,00	22	$ 9.012.058,00
	12.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE 110X60CM PARA CARCAMO BANDEJA MALLA EJ 105* 600MM	ML	22	$ 386.331,00	$ 8.499.282,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA 200KVA CON CARINA INSONORA 65DB Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1	$ 199.065.092,00	$ 199.065.092,00		$ -	1,0	$ 195.082.790,00	0,98	$ 195.082.790,00
	12.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESFOGUE DE PLANTA ELECTRICA 200KVA.	ML	20	$ 750.509,00	$ 15.010.180,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE VENTILACIÓN PARA PLANTA DE EMERGENCIA	UND	1	$ 12.279.321,00	$ 12.279.321,00		$ -		$ -	0	$ -
					SUBTOTAL	$ 480.423.864,00		$ 9.518.161,00		$ 336.893.102,00		$ 246.411.253,00
12.2		INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS 220V ACOMETIDAS BT				$ 1.329.052.544,00		$ 400.783.240,00		$ 0,00		$ 400.783.240,00
	12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR 500 KVA A TRANSFERENCIA AUTOMATICA 220V EN ELECTROBARRA 1600A, INCLUYE CURVAS 1600A HORIZONTAL Y VERTICAL, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTALACIÓN	ML	8	$ 4.961.860,00	$ 39.694.880,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TGBT EN ELECTROBARRA 1600A, INCLUYE CURVAS 1600A HORIZONTAL Y VERTICAL, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTALACIÓN.	ML	4	$ 4.522.663,00	$ 18.090.652,00		$ -		$ -	0	$ -

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS					
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	[illegible]	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO	[illegible]	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 220V A PLANTA EMERGENCIA EN ELECTROBARRA 1600A INCLUYE CURVAS 1600A HORIZONTAL Y VERTICAL, CAJA TERMINAL DE CONEXIÓN 1600A PUERTA CIEGA, BISAGRA, CHAPA MUÉRTA, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	18	$ 4.652.946,00	$ 83.753.028,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DESDE TDC A TABLERO DE BOMBA DE CONSUMO (TBCON) (3X1/0F+(1X1/0N+1X2/0T)AL S8000 EN TUBERIA PVC DB 2"	ML	86	$ 111.960,00	$ 9.628.560,00	32,68	$ 3.658.853,00		$ -	32,68	$ 3.658.853,00
	12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DESDE TGBT A TABLERO DE SERVICIOS GENERALES (TSG) 2X(3X350F+1X350N+1X2/0T)AL S8000 EN CARCAMO	ML	15	$ 279.685,00	$ 4.195.275,00	11,7	$ 3.272.315,00		$ -	11,7	$ [illegible]
	12.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DESDE TGBT A TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS ZONA 1 (GA1 2(3X250F+1X250N+1X2/0T)AL S8000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, TUBERÍA PVC DB 2X3"	ML	59	$ 335.981,00	$ 19.822.879,00	42,48	$ 14.272.473,00		$ -	42,48	$ 14.272.473,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventora de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DESDE TGBT A TABLERO GENERAL AUXILIAR ZONA 2 TGA2 3(3X350F+1X350N+1X2/0)AL S8000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, TUBERIA PVC DB 3X4"	ML	128	$ 530.003,00	$ 67.840.384,00	106,24	$ 56.307.519,00		$	106,24	$ 56.307.519,00
	12.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DESDE TGBT A TABLERO GENERAL AUXILIAR ZONA 3 TGA3 3(3X500F+1X500N+1X4/0)AL S8000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, TUBERÍA PVC DB 3X4"	ML	230	745.685,00	$ 171.507.550,00		$		$	0	$
	12.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DESDE TGBT A TABLERO GENERAL AUXILIAR ZONA 4 TGA4 2(3X500F+1X500N+1X4/0)AL S8000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, TUBERÍA PVC DB 2X4"	ML	152	614.524,00	$ 93.407.648,00		$		$	0	$
	12.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL AUXILIAR A TABLEROS DE MEDIDA: TGA1 A TM1-3,TM1-5,TM1-6,TM1-7, TM2-5,TM2-8,TGA3 A TM3-3, TM3-5 / TGA4 A TM4-1,TM4-5,TM4-6, (3X6F+1X6N+1X6T) AL S8000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS EN TUBERIA PVC DB 1 1/4"	ML	235	65.308,00	$ 15.347.380,00	37	$ 2.416.396,00		$	37	$ 2.416.396,00
	12.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL AUXILIAR A TABLEROS DE MEDIDA: TGA1 A TM1-2,TM1-4,TM1-8,TGA2 A TM2-3, TM2-4, TM2-6, TM2-7, TM3-2,TM4-7, (3X4F+1X4N+1X4T)AL S8000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS EN TUBERIA PVC DB 1 1/2"	ML	290	71.074,00	$ 20.611.460,00	108,1	$ 7.683.099,00		$	108,1	$ 7.683.099,00
	12.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL AUXILIAR A TABLEROS DE MEDIDA: TM2-1,TM3-4,TM3-6, TM4-2, (3X2F+1X2N+1X4T)AL S8000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS EN TUBERIA PVC DB 1 1/2"	ML	170	73.132,00	$ 12.432.440,00	13,8	$ 1.009.222,00		$	13,8	$ 1.009.222,00
	12.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL AUXILIAR A TABLEROS DE MEDIDA: TM1-1,TM3-1,TM3-7,TM3-8,TM4-2,TM4-4, (3X1/0F+1X1/0N+1X2F)AL S8000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS EN TUBERIA PVC DB 2"	ML	450	94.564,00	$ 42.553.800,00	33,6	$ 3.177.350,00		$	33,6	$ 3.177.350,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

	POLIZAS		VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision. y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de reviser la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL AUXILIAR A TABLEROS DE MEDIDA; TGA3 A TM3-9...2X(3X1/0F+1X1/0N+1X2)AL 58000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS EN TUBERIA PVC DB 2X2"	ML	45	$ 161.948,00	$ 7.287.660,00		$		$	0	$
	12.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFÁSICA BIFILAR DESDE TABLEROS DE MEDIDA (TM) A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE LOCALES (TD) (1X6F+1X6N+1X6T)AL CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, EN TUBERÍA PVC, DB 1X1", DISTANCIA PROMEDIO 30 M	ML	12568	$ 28.132,00	$ 353.562.976,00	3393,36	$ 95.462.004,00		$	3393,36	$ 95.462.004,00
	12.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA TRIFILAR DESDE TABLEROS DE MEDIDA (TM) A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE LOCALES DE COMIDA Y BURBUJAS (TD) (2X6F+1X6N+1X6T)AL CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, EN TUBERÍA PVC, DB 1X1".	ML	1650	$ 29.249,00	$ 48.260.850,00	528	$ 15.443.472,00		$	528	$ 15.443.472,00
	12.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL AUXILIAR A TABLEROS DE MEDIDA; TGA2 A TM2-2,TM4-3, (3X2/0F+1X2/0N+1X2T)AL 58000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS EN [illegible]	ML	90	$ 145.395,00	$ 13.085.550,00	25	$ 3.634.875,00		$	25	$ 3.634.875,00
	12.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL AUXILIAR A TABLEROS DE MEDIDA; TGA2 A TM2-2,2X(3X2/0F+1X2/0N+1X2T)AL 58000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS [illegible]	ML	80	$ 225.478,00	$ 18.038.240,00	46,4	$ 10.462.179,00		$	46,4	$ 10.462.179,00
	12.2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TABLERO SERVICIOS GENERALES A TABLEROS DE ZONAS COMUNES; TSG A ITC...2(3X250F+1X250N+1X1/0T)AL 58000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS EN TUBERIA PVC DB 2X3"	ML	60	$ 298.314,00	$ 17.898.840,00	37,8	$ 11.276.269,00		$	37,8	$ 11.276.269,00
	12.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE BORNES FRAICO 500KVA A TBCI-PLANTA EMERGENCIA-TBCI-BCI [illegible]	ML	310	$ 562.523,00	$ 174.381.310,00	266,6	$ 149.968.099,00		$	266,6	$ 149.968.099,00
	12.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA [illegible] BOMBAS TB A BOMBA AGUA POTABLE 3#10F+1#N+1#T HP (DOS BOMBAS) TUBERIA EMT [illegible] Y BOMBA JOCKEY	ML	80	$ 58.671,00	$ 4.693.680,00	49,6	$ 2.910.082,00		$	49,6	$ 2.910.082,00
	12.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A TABLERO ITC-A-TADM2 2(3X4/0F+1X4/0N+1X2)AL 58000 CABLE LIBRE DE HALÓGENOS EN TUBERIA PVC DB 2X3"	ML	125	$ 310.665,00	$ 38.833.125,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra. GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.2.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE TSG A TI 3#6F+6N+6I AL S 8000 EN TUBERIA EMT 1 1/4"	ML	18	$ 79.204,00	$ 1.425.672,00	9,36	$ 741.349,00		$	9,36	$ 741.349,00
	12.2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TSG A TSUB 3#6+4N+6I AL S 8000 EN TUBERÍA EMT 1 1/2"	ML	18	93.611,00	$ 1.684.998,00	7,92	$ 741.399,00		$	7,92	$ 741.399,00
	12.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TSG A TADMINI 3#250F+250N+2I AL S 8000 EN TUBERÍA PVC 3"	ML	87	223.896,00	$ 19.481.352,00	43,5	$ 9.730.776,00		$	43,5	$ 9.730.776,00
	12.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TADMINI A TII 3#2F+2N+8I CU THHN-THWN-2 EN TUBERÍA EMT 2"	ML	15	190.307,00	$ 2.854.605,00	9,15	$ 1.741.309,00		$	9,15	$ 1.741.309,00
	12.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TADMINI A III 3#4F+4N+4T AL S8000 EN TUBERÍA PVC 1 1/2"	ML	95	66.123,00	$ 6.281.685,00	45,6	$ 3.015.209,00		$	45,6	$ 3.015.209,00
	12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE TADMIN2 A III2 3#2F+2N+8I CU THHN-THWN-2 EN TUBERÍA EMT 2"	ML	15	190.307,00	$ 2.854.605,00		$		$	0	$
	12.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PORTERÍA I y PORTERÍA 2 2#2F+2N+2I AL S8000 EN TUBERÍA PVC 1 1/2"	ML	200	87.243,00	$ 17.448.600,00	36	$ 3.140.748,00		$	36	$ 3.140.748,00
	12.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ADMINI-UPS 5KVA-TRFGULADO 1 -Y ITDAMIN 2-UPS 5KVA-TRFGULADO 2: 2#10F+10N+10TCU THHN-THWN-2 EN TUBERÍA EMT 3/4"	ML	40	52.812,00	$ 2.112.480,00	13,6	$ 718.243,00		$	13,6	$ 718.243,00
					SUBTOTAL	$ 1.329.052.564,00		$ 400.783.240,00		$ 0,00		$ 400.783.240,00
12,3		TRANSFERENCIAS Y TABLEROS				$ 1.489.008.337,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	12.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDIDA INCLUYE MEDIDOR CLASE 0,5S, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA MEDIDA BOMBA CONTRA INCENDIO	UND	1	25.707.866,00	$ 25.707.866,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE SERVICIOS GENERALES TSG, INCLUYE MEDIDA SEMIDIRECTA PARA ZONAS COMUNES, MEDIDOR SEMIDIRECTA CLASE 0,5S, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5A, SEÑALES DE TENSIÓN Y CORRIENTE, TOTALIZADOR PROTECCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1	$ 21.444.854,00	$ 21.444.854,00		$		$	0	$
	12.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE ZONA COMÚN T/C	UND	1	$ 10.192.982,00	$ 10.192.982,00		$		$	0	$
	12.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BOMBA CONSUMO	UND	1	$ 3.613.826,00	$ 3.613.826,00		$		$	0	$
	12.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE CONTROL DE BOMBA CONTRA INCENDIOS 125 HP	UND	1	$ 88.756.911,00	$ 88.756.911,00		$		$	0	$
	12.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE CONTROL DE BOMBA JOCKEY 1.8 HP	UND	1	$ 7.311.894,00	$ 7.311.894,00		$		$	0	$
	12.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJES, DPS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1	$ 47.777.376,00	$ 47.777.376,00		$		$	0	$
	12.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS MÓDULO 1 TGA 1	UND	1	$ 16.304.189,00	$ 16.304.189,00		$		$	0	$
	12.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS MÓDULO 2 TGA 2	UND	1	$ 18.410.755,00	$ 18.410.755,00		$		$	0	$
	12.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS MÓDULO 3 TGA 3	UND	1	$ 16.489.247,00	$ 16.489.247,00		$		$	0	$
	12.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS MÓDULO 4 TGA 4	UND	1	$ 16.190.995,00	$ 16.190.995,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022. Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.986.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS, TM1-4 INCLUYE MEDIDORES BIFÁSICOS TRIFILARES Y MONOFÁSICOS BIFILARES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, TECNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA EN SITIO.	UND	1	$ 22.048.948,00	$ 22.048.948,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS, TM1-8 INCLUYE MEDIDORES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, TECNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA EN SITIO.	UND	1	$ 22.922.232,00	$ 22.922.232,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS, TM2-1 INCLUYE MEDIDORES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, TECNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA EN SITIO.	UND	1	$ 21.970.040,00	$ 21.970.040,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS, TM2-2 INCLUYE MEDIDORES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, TECNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA EN SITIO.	UND	1	$ 21.417.736,00	$ 21.417.736,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS, TM3-3 INCLUYE MEDIDORES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, TECNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA EN SITIO.	UND	1	$ 23.941.624,00	$ 23.941.624,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS, TM3-8 INCLUYE MEDIDORES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, TECNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA EN SITIO.	UND	1	$ 20.971.021,00	$ 20.971.021,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS, TM3-9 INCLUYE MEDIDORES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, TECNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA EN SITIO.	UND	1	$ 21.792.668,00	$ 21.792.668,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS, TM4-3 INCLUYE MEDIDORES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, TECNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA EN SITIO.	UND	1	$ 22.312.191,00	$ 22.312.191,00		$ -		$ -	0	$ -

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



Consorcio Interplaza

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.338.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventora de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi;

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.3.20	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS, TM4-4 INCLUYE MEDIDORES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, TECNIFICACIÓN Y COMUNICACION DE LA MEDIDA EN SITIO.	UND	1	$ 21.334.830,00	$ 21.334.830,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS, SÓLO MEDIDORES MONOFÁSICOS. TM1-1,TM1-2,TM1-3,TM2-3,TM2-6,TM2-7,TM3-1,TM3-2,TM3-4,TM3-5,TM3-6,TM3-7,TM4-1,TM4-2,TM4-5,TM4-7 INCLUYE MEDIDORES 24 MEDIDORES MONOFÁSICOS RIFLARES. INSTALACIÓN DE MEDIDORES, TECNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA EN SITIO	UND	19	$ 33.403.874,00	$ 634.673.606,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDORES 24 CUENTAS, TM1-5,TM3-5 INCLUYE 23 MEDIDORES MEDIDORES, INSTALACIÓN DE MEDIDORES, TECNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA EN SITIO.	UND	2	$ 31.996.358,00	$ 63.992.716,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDORES 12 CUENTAS, TM2-8,TM4-6INCLUYE TECNIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA EN SITIO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA	UND	2	$ 16.265.382,00	$ 32.530.764,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA PARA LA BOMBA CONTRA INCENDIOS, MAGNÉTICA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1	$ 13.172.076,00	$ 13.172.076,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA PRINCIPAL 220V 1500A	UND	1	$ 45.629.997,00	$ 45.629.997,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS MONOFASICA DE 5 KVA, INCLUYE BATERÍAS AUTONOMIA 5MIN, SOFTWARE CONTROL Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	2	$ 7.188.271,00	$ 14.376.542,00		$ -		$ -	0	$ -
	12.3.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO QUE INCLUYE PROTECCIONES, GABINETE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1	$ 578.910,00	$ 578.910,00		$ -		$ -	0	$ -

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	040-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan así:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCION TD PARA PORTERIA BIFÁSICOS 12 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOS	UND	2	$ 1.101.563,00	$ 2.203.126,00		$		$	0	$
	12.3.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN	UND	4	$ 16.353.352,00	$ 65.413.408,00		$		$	0	$
	12.3.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCION TD BIFASICO DE 6 PUESTOS PARA LOCALES DE COMIDAS INCLUYE PROTECCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	30	$ 448.518,00	$ 13.455.540,00		$		$	0	$
	12.3.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCION TD MONOFASICO DE 4 PUESTOS PARA LOCALES GENERALES, INCLUYE PROTECCIONES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	364	$ 341.610,00	$ 124.346.040,00		$		$	0	$
	12.3.32	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA, 4H, 250 AMPERIOS, 208 VOLTIOS, INCLUYE: OBRA CIVIL, RETIRO DE ESCOMBROS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (INCLUYE PROTECCIONES) (TDADMIN1, TDADMIN2, TSUB)	UND	3	$ 1.907.809,00	$ 5.723.427,00		$		$	0	$
						$ 0,00		$		$		$
		SUBTOTAL CAP. 6.3 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL:				$ 1.469.006.337,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
								$		$		$
12.4		INSTALACIONES INTERNAS				$ 2.171.831.845,00		$ 619.922.635,00		$ 0,00		$ 619.922.635,00
								$		$		$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS					
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	040-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	3	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACION QUE INCLUYE: TUBERIA 3/4EMT A LA VISTA, TUBERÍA 3/4 PVC EMBEBIDA, CABLE 3#12 LIBRE DE HALÓGENOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN [DISTANCIA PROMEDIO 8M] PARA SALIDAS DE LAMPARAS HERMETICAS 40W (35), HERMÉTICA 2X(8)4), EMERGENCIA(282), SENSORES(26), LED PANEL 18W(70),LUMINARIA PANEL RC 40 W(22)	UND	413	$ 268.854,00	$ 110.954.102,00	137,8	$ 37.020.521,00		$	137,8	$ 37.020.521,00
	12.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA QUE INCLUYE: TOMACORRIENTE, TUBERIA 3/4 PVC EMBEBIDO EN MURO, CABLE 3#12 LIBRE DE HALÓGENOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PARA LOCALES, ADMINISTRACIÓN 1, ADMINISTRACIÓN 2, PORTERÍAS Y CUARTOS TÉCNICOS[DISTANCIA PROMEDIO 8M]	UND	1456	$ 176.815,00	$ 257.442.640,00	430,08	$ 76.044.595,00		$	430,08	$ 76.044.595,00
	12.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADO INCLUYE: TOMACORRIENTE, TUBERÍA 3/4 PVC EMBEBIDO EN MURO, CABLE 3#12 LIBRE DE HALÓGENOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN,[DISTANCIA PROMEDIO 15M]	UND	14	$ 178.867,00	$ 2.504.138,00	6,16	$ 1.101.821,00		$	6,16	$ 1.101.821,00
	12.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO QUE INCLUYE: INTERRUPTOR, TUBERIA 3/4 PVC EMBEBIDO EN MURO, CABLE 3#12 LIBRE DE HALÓGENOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN [DISTANCIA PROMEDIO 5M]	UND	770	$ 88.356,00	$ 68.034.120,00	107,8	$ 9.524.777,00		$	107,8	$ 9.524.777,00
	12.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE QUE INCLUYE: INTERRUPTOR, TUBERIA 3/4 PVC EMBEBIDO EN MURO, CABLE 3#12 LIBRE DE HALÓGENOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN [DISTANCIA PROMEDIO 6M]	UND	7	$ 114.639,00	$ 802.473,00	1,2	$ 137.567,00		$	1,2	$ 137.567,00

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



Consorcio Interplaza

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.585.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022. Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE QUE INCLUYE: INTERRUPTOR TRIPLE, TUBERIA 3/4 PVC EMBEBIDO EN MURO, CABLE 5#12 LIBRE DE HALÓGENOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (DISTANCIA PROMEDIO 6M)	UND	4	$ 108.906,00	$ 435.624,00	0,88	$ 95.837,00		$	0,88	$ 95.837,00
	12.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTABLE QUE INCLUYE: INTERRUPTOR CONMUTABLE, TUBERIA 3/4 PVC EMBEBIDO EN MURO, CABLE 4#12 LIBRE DE HALÓGENOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (DISTANCIA PROMEDIO 6M)	UND	4	$ 110.827,00	$ 443.308,00	2,04	$ 226.087,00		$	2,04	$ 226.087,00
	12.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES PARA ILUMINACIÓN	UND	26	$ 126.321,00	$ 3.284.346,00	4,03	$ 509.074,00		$	4,03	$ 509.074,00
	12.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DECTINCLUYE: TOMACORRIENTE, TUBERIA 3/4 PVC EMBEBIDO EN MURO, CABLE 3#12 LIBRE DE HALOGENOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	169	$ 206.213,00	$ 34.849.997,00	22,88	$ 4.718.153,00		$	22,88	$ 4.718.153,00
	12.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA 40 W	UND	35	$ 268.794,00	$ 9.407.790,00	30,1	$ 8.090.699,00		$	30,1	$ 8.090.699,00
	12.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA 2X18 W	UND	4	$ 248.556,00	$ 994.224,00	1,68	$ 417.574,00		$	1,68	$ 417.574,00
	12.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA EMERGENCIA	UND	282	$ 232.907,00	$ 65.679.774,00	98,9	$ 23.034.502,00		$	98,9	$ 23.034.502,00
	12.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LED LINEAL 32W	UND	708	$ 150.395,00	$ 106.479.660,00	283,2	$ 42.591.864,00		$	283,2	$ 42.591.864,00
	12.4.14	SUMINISTRO E INSTALACION LED STREET LIGHT 66W	UND	115	$ 1.050.895,00	$ 120.852.925,00	80,19	$ 84.271.270,00		$	80,19	$ 84.271.270,00
	12.4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LED STREET 45-90W	UND	35	$ 1.477.467,00	$ 51.711.345,00	29,4	$ 43.437.530,00		$	29,4	$ 43.437.530,00
	12.4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LED PANEL RD 18W DI MM SP	UND	70	$ 58.947,00	$ 4.126.290,00	33,6	$ 1.980.619,00		$	33,6	$ 1.980.619,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	8Q-100066095	$ 4 656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	8Q-100066095	$ 13.503.953.936,56	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	8Q-100066095	$ 2 328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	8Q-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	8Q-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LED PANEL RC 40W DE 100-277V	UND	22	$ 219.744,00	$ 4.834.368,00	9,02	$ 1.982.091,00		$	9,02	$ 1.982.091,00
	12.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LED REFLECTOR 200W	UND	30	$ 548.433,00	$ 16.452.990,00	15	$ 8.226.495,00		$	15	$ 8.226.495,00
	12.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LED HIGHBAY 200W	UND	10	$ 850.006,00	$ 8.500.060,00	8	$ 6.800.048,00		$	8	$ 6.800.048,00
	12.4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LED LUMINARIA TIPO FAROL 80W	UND	12	$ 1.468.305,00	$ 17.619.660,00	5,52	$ 8.105.044,00		$	5,52	$ 8.105.044,00
	12.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACION QUE INCLUYE: TUBERIA 3/4 PVC, CABLE 2#8+1#10F CU LIBRE HALOGENOS, EMPALME TIPO GEL Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (DISTANCIA PROMEDIO 19M) PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR.	UND	150	$ 815.618,00	$ 122.342.700,00	85,76	$ 69.947.400,00		$	85,76	$ 69.947.400,00
	12.4.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACION QUE INCLUYE: TUBERIA 3/4 EMT A LA VISTA,3/4 PVC EMBEBIDA , CABLE 3#10 THHN Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (DISTANCIA PROMEDIO 26M) PARA ILUMINACIÓN CON REFLECTORES DE 200W EN CUBIERTA	UND	30	$ 876.289,00	$ 26.288.670,00	16,2	$ 14.195.882,00		$	16,2	$ 14.195.882,00
	12.4.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACION QUE INCLUYE: TUBERIA 3/4 EMT, CABLE 3#10 THHN Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (DISTANCIA PROMEDIO 27M) PARA ILUMINACIÓN HIGHBAY 200W	UND	10	$ 771.736,00	$ 7.717.160,00	7,6	$ 5.865.042,00		$	7,6	$ 5.865.042,00
	12.4.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACION QUE INCLUYE: TUBERIA 3/4EMT, CABLE 3#12 LIBRE DE HALÓGENOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (DISTANCIA PROMEDIO 4 M) PARA SALIDAS DE LAMPARAS LED PANEL 24W LOCALES Y PORTERIA (1478)	UND	1478	$ 163.663,00	$ 241.893.914,00	332,55	$ 54.426.131,00		$	332,55	$ 54.426.131,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.365.358.602,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi.

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	12.4.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACION QUE INCLUYE: TUBERIA 3/4EMT, CABLE 3#12 LIBRE DE HALÓGENOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (DISTANCIA PROMEDIO 8 M) PARA SALIDAS DE LAMPARAS LED LINEAL 32W (708)	UND	708	$ 294.582,00	$ 208.564.056,00	233,64	$ 68.826.138,00		$	233,64	$ 68.826.138,00
	12.4.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ILUMINACION QUE INCLUYE: TUBERIA 3/4 PVC, CABLE #10F+10N+10T LIBRE DE HALÓGENOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (DISTANCIA PROMEDIO 8 M) PARA SALIDAS DE LAMPARAS TIPO FAROL (12)	UND	12	$ 424.130,00	$ 5.089.560,00	2,16	$ 916.121,00		$	2,16	$ 916.121,00
	12.4.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE BRAZO SENCILLO 6M, INCLUYE VARILLA DE PUESTA A TIERRA, CABLE DE CONEXIÓN A VARILLA, SOLDADURA EXOTERMICA, CANASTILLA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNO	97	$ 2.426.529,00	$ 235.373.313,00		$		$	0	$
	12.4.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE BRAZO DOBLE 6M, INCLUYE VARILLA DE PUESTA A TIERRA, CABLE DE CONEXIÓN A VARILLA, SOLDADURA EXOTERMICA, CANASTILLA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	24	$ 3.117.871,00	$ 74.828.904,00		$		$	0	$
	12.4.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 4M, INCLUYE VARILLA DE PUESTA A TIERRA, CABLE DE CONEXIÓN A VARILLA, SOLDADURA EXOTERMICA, CANASTILLA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	12	$ 2.145.169,00	$ 25.742.028,00		$		$	0	$
	12.4.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL RD 24 W DI	UND	1478	$ 75.225,00	$ 111.182.550,00	391,67	$ 29.463.376,00		$	391,67	$ 29.463.376,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.368.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	13.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3/4" PVC	ML	45	$ 14.608,00	$ 657.270,00		$		$	0	$
	13.1.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS INTELIGENTE 2 LAZOS 500 DISPOSITIVOS, 4 NACS CON INTERFAZ ETHERNET, 2 X BATERÍA, MODULOS DE EXPANSION PARA 500	UND	1	$ 11.306.331,00	$ 11.306.331,00		$		$	0	$
	13.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DUAL HUMO Y TÉRMICO, INCLUYE BASE	UND	4	$ 270.479,00	$ 1.081.916,00		$		$	0	$
	13.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 40, D = 6"	ML	2280	$ 59.316,00	$ 135.240.480,00		$		$	0	$
	13.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 40, D = 1-1/2"	ML	370	$ 92.768,00	$ 34.324.160,00		$		$	0	$
	13.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 10, D = 2"	ML	280	$ 96.283,00	$ 26.959.240,00		$		$	0	$
	13.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 10, D = 2-1/2"	ML	653	$ 116.283,00	$ 77.237.493,00		$		$	0	$
	13.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 10, D = 3"	ML	160	$ 140.378,00	$ 22.460.480,00		$		$	0	$
	13.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 10, D = 4"	ML	428	$ 189.473,00	$ 81.094.444,00		$		$	0	$
	13.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 10, D = 6"	ML	180	$ 209.334,00	$ 37.680.120,00		$		$	0	$
	13.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA D=6" PVC RDE-21	ML	255	$ 236.555,00	$ 60.321.525,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

	PÓLIZAS		VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	13.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° ROSCADO, D=1"	UND	894	$ 34.233,00	$ 30.604.302,00		$		$	0	$
	13.1.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° ROSCADO, D=1-1/2"	UND	6	$ 42.537,00	$ 255.222,00		$		$	0	$
	13.1.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° RANURADO, D=2"	UND	4	$ 48.559,00	$ 194.236,00		$		$	0	$
	13.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° RANURADO, D=2-1/2"	UND	30	$ 57.158,00	$ 1.714.740,00		$		$	0	$
	13.1.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° RANURADO, D=4"	UND	6	$ 88.419,00	$ 530.514,00		$		$	0	$
	13.1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° RANURADO, D=6"	UND	4	$ 181.808,00	$ 727.232,00		$		$	0	$
	13.1.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ROSCADA 1"	UND	894	$ 39.408,00	$ 35.226.282,00		$		$	0	$
	13.1.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ROSCADA 1 1/2"	UND	10	$ 44.022,00	$ 440.220,00		$		$	0	$
	13.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA 2"	UND	25	$ 66.919,00	$ 1.672.975,00		$		$	0	$
	13.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA 2-1/2"	UND	40	$ 74.298,00	$ 2.971.920,00		$		$	0	$
	13.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RANURADA 4"	UND	25	$ 122.024,00	$ 3.050.600,00		$		$	0	$

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



Consorcio Interplaza

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.409,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

	POLIZAS		VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan así:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO				22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	13.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA 6"	UND	12	$ 152.850,00	$ 1.834.200,00		$		$	0	$
	13.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION RANURADA 6" X 4"	UND	10	$ 167.499,00	$ 1.674.990,00		$		$	0	$
	13.1.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION RANURADA 6" X 3"	UND	10	$ 157.875,00	$ 1.578.750,00		$		$	0	$
	13.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION RANURADA 6" X 2"	UND	10	$ 152.980,00	$ 1.529.800,00		$		$	0	$
	13.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION RANURADA 4" X 3"	UND	10	$ 129.993,00	$ 1.299.930,00		$		$	0	$
	13.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION RANURADA 4" X 2 1/2"	UND	10	$ 125.043,00	$ 1.250.430,00		$		$	0	$
	13.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION RANURADA 4" X 2"	UND	10	$ 115.804,00	$ 1.158.040,00		$		$	0	$
	13.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION RANURADA 3" X 2 1/2"	UND	10	$ 122.846,00	$ 1.228.460,00		$		$	0	$
	13.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION RANURADA 2 1/2" X	UND	10	$ 100.884,00	$ 1.008.840,00		$		$	0	$
	13.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN RANURA ROSCA 2 1/2" A 1 1/2"	UND	40	$ 80.998,00	$ 3.239.920,00		$		$	0	$
	13.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN RANURA ROSCA 3" A 1 1/2"	UND	40	$ 88.037,00	$ 3.521.480,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICIÓN**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	013-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-10006095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-10006095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-10006095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-10006095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-10006095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor . como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan así:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	A1	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	13.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN RANURA ROSCA 3" A 1 1/2"	UND	40	$ 82.098,00	$ 3.283.920,00		$		$	0	$
	13.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN RANURA ROSCA 2" A	UND	80	$ 63.271,00	$ 5.061.680,00		$		$	0	$
	13.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ROSCADA 1"	UND	80	$ 30.578,00	$ 2.446.240,00		$		$	0	$
	13.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION ROSCADA 1 1/2"	UND	80	$ 34.537,00	$ 2.762.960,00		$		$	0	$
	13.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RANURADA 2"	UND	50	$ 45.184,00	$ 2.259.200,00		$		$	0	$
	13.1.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RANURADA 2 1/2"	UND	50	$ 50.794,00	$ 2.539.700,00		$		$	0	$
	13.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RANURADA DE 3"	UND	16	$ 62.645,00	$ 1.002.320,00		$		$	0	$
	13.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RANURADA DE 4"	UND	20	$ 71.104,00	$ 1.422.080,00		$		$	0	$
	13.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION RANURADA DE 6"	UND	20	$ 102.700,00	$ 2.054.000,00		$		$	0	$
	13.1.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ RANURADA 3"	UND	12	$ 216.559,00	$ 2.598.708,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,36	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	13.1.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ RANURADA 4"	UND	30	$ 334.277,00	$ 10.028.310,00		$		$	0	$
	13.1.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ RANURADA 6"	UND	20	$ 373.318,00	$ 7.466.360,00		$		$	0	$
	13.1.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA RANURADA 6"x 2 1/2"	UND	20	$ 239.332,00	$ 4.786.640,00		$		$	0	$
	13.1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA RANURADA 6"x 2"	UND	20	$ 227.343,00	$ 4.546.860,00		$		$	0	$
	13.1.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA ROSCADA 6"x 1 1/2"	UND	20	$ 219.171,00	$ 4.383.420,00		$		$	0	$
	13.1.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA RANURADA 4"X 1 1/2"	UND	8	$ 225.268,00	$ 1.802.144,00		$		$	0	$
	13.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA ROSCADA 4" X 1"	UND	12	$ 200.488,00	$ 2.405.856,00		$		$	0	$
	13.1.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA ROSCADA 4" X 1 1/2"	UND	10	$ 210.387,00	$ 2.103.870,00		$		$	0	$
	13.1.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA ROSCADA 3" X 1 1/2"	UND	12	$ 190.049,00	$ 2.280.588,00		$		$	0	$
	13.1.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA ROSCADA 3" X 1"	UND	10	$ 185.099,00	$ 1.850.990,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.303.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	13.1.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE MECANICA ROSCADA 2 1/2 "X1 1/2"	UND	64	$ 157.027,00	$ 10.049.728,00		$		$	0	$
	13.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE MECANICA ROSCADA 2 1/2"X1"	UND	20	148.338,00	$ 2.966.760,00		$		$	0	$
	13.1.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III	UND	16	$ 3.751.411,00	$ 60.022.576,00		$		$	0	$
	13.1.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA IND-SUP 2 1/2" RAN	UND	20	973.311,00	$ 19.466.220,00		$		$	0	$
	13.1.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SALIDA DE MANGUERAS 2 1/2" CON TAPA Y CADENA EN BRONCE	UND	16	954.990,00	$ 15.279.840,00		$		$	0	$
	13.1.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDIENTE FACTOR K5.6 DE 10 PSI	UND	1277	96.298,00	$ 122.972.546,00		$		$	0	$
	13.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE 1" X1/2" ROSCADO	UND	894	17.232,00	$ 15.405.408,00		$		$	0	$
	13.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE 1 1/2" X 1 " ROSCADO	UND	248	26.321,00	$ 6.527.608,00		$		$	0	$
	13.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO UL/FM 2 1/2"	UND	2	491.129,00	$ 982.258,00		$		$	0	$
	13.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO UL/FM 3"	UND	8	546.124,00	$ 4.368.992,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	13.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO UL/FM 4"	UND	8	$ 647.204,00	$ 5.177.632,00		$		$	0	$
	13.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBA DE 6"	UND	1	$ 8.328.900,00	$ 8.328.900,00		$		$	0	$
	13.1.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 4"x2 1/2" x2 1/2" COMPLETA PLACA EN BRONCE	UND	2	$ 3.127.021,00	$ 6.254.042,00		$		$	0	$
	13.1.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TRANSVERSAL 6"	UND	90	$ 158.865,00	$ 14.297.850,00		$		$	0	$
	13.1.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TRANSVERSAL 4"	UND	214	$ 146.767,00	$ 31.408.138,00		$		$	0	$
	13.1.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TRANSVERSAL 3"	UND	76	$ 141.047,00	$ 10.719.572,00		$		$	0	$
	13.1.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TRANSVERSAL 2 1/2"	UND	190	$ 113.640,00	$ 21.591.600,00		$		$	0	$
	13.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TRANSVERSAL 2"	UND	90	$ 106.711,00	$ 9.603.990,00		$		$	0	$
	13.1.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TRANSVERSAL 1 1/2"	UND	168	$ 84.103,00	$ 14.129.304,00		$		$	0	$
	13.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TRANSVERSAL 1"	UND	338	$ 76.844,00	$ 25.979.584,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

	POLIZAS		VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor . como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	13.1.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 1"	UND	894	$ 48.456,00	$ 43.319.664,00		$		$	0	$
	13.1.84	INSTALACION SISTEMA EQUIPO DE BOMBEO RED CONTRAINCENDIOS, SUMINISTRO DE HIDRONEUMATICO DE RED CONTRAINCENDIOS (INCLUYE BOMBA JOCKEY , SISTEMA DE BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA	UND	1	$ 380.531.356,00	$ 380.531.356,00		$		$	0	$
	13.1.85	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE 3" HD ROJO - EXTREMO LISO.	UND	1	$ 5.555.278,00	$ 5.555.278,00		$		$	0	$
	13.1.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE 0 A 200 PSI CON GLICERINA	UND	10	$ 161.075,00	$ 1.610.750,00		$		$	0	$
	13.1.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRUEBA 3" UL/FM	UND	2	$ 1.524.189,00	$ 3.048.378,00		$		$	0	$
	13.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE VASTAGO ASCENDENTE 6"	UND	2	$ 1.184.635,00	$ 2.369.270,00		$		$	0	$
	13.1.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE ALIVIO 1"	UND	2	$ 440.967,00	$ 881.934,00		$		$	0	$
	13.1.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 1"	UND	2	$ 408.637,00	$ 817.274,00		$		$	0	$
	13.1.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DESAIREADORA 1"	UND	2	$ 438.554,00	$ 877.108,00		$		$	0	$
	13.1.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA PRUEBA DRENAJE 1"	UND	2	$ 319.544,00	$ 639.088,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:			OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICION**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.545.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022. Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	13.1 93	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE BOSTRAP 1" X 1/2" ROSCADA	UND	40	$ 142.961,00	$ 5.718.440,00		$		$	0	$
	13.1 94	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR 20 LB	UND	20	262.610,00	$ 5.252.200,00		$		$	0	$
	13.1 95	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA IND-SUP 6" RAN	UND	6	1.907.425,00	$ 11.444.550,00		$		$	0	$
	13.1 96	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA IND-SUP 4" RAN	UND	6	1 135.782,00	$ 6.814.692,00		$		$	0	$
	13.1 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA POR UNIVERSAL HD DE 6"	UND	2	745.661,00	$ 1.491.322,00		$		$	0	$
	13.1 98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR BRIDA POR RANURA DE 6"	UND	2	674.828,00	$ 1.349.656,00		$		$	0	$
	13.1 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HD 6"X 90 EXTREMO LISO	UND	6	763.087,00	$ 4 578.522,00		$		$	0	$
	13.1 100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD 6" EXTREMO LISO	UND	3	903.432,00	$ 2.710.296,00		$		$	0	$
	13.1 101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RÁPIDA DESLIZANTE DE 6"	UND	14	433.052,00	$ 6.062.728,00		$		$	0	$
	13.1 102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION HD 6"x4"	UND	1	687 597,00	$ 687.597,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INCIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi:

ACTA No.	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	Al	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	13.1.103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA POR UNIVERSAL HD DE 4"	UND	2	$ 654.055,00	$ 1.308.110,00		$		$	0	$
	13.1.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR BRIDA POR RANURA DE 4"	UND	2	$ 594.936,00	$ 1.189.872,00		$		$	0	$
	13.1.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RÁPIDA DESLIZANTE DE 4"	UND	2	$ 411.805,00	$ 823.610,00		$		$	0	$
	13.1.106	PINTURA TUBERIA METALICA 1"-1 1/2"	ML	2650	$ 26.637,00	$ 70.588.050,00		$		$	0	$
	13.1.107	PINTURA TUBERIA METALICA 2"-2 1/2"	ML	933	$ 36.725,00	$ 34.264.425,00		$		$	0	$
	13.1.108	PINTURA TUBERIA METALICA 3"-4"	ML	588	$ 46.978,00	$ 27.623.064,00		$		$	0	$
	13.1.109	PINTURA TUBERIA METALICA 6"	ML	180	$ 56.465,00	$ 10.163.700,00		$		$	0	$
	13.1.110	ANCLAJE ESTRUCTUAL CON PLATINA TIPO J	UND	912	$ 56.830,00	$ 51.828.960,00		$		$	0	$
	13.1.111	ANCLAJE ESTRUCTUAL CON PLATINA TIPO K	UND	8	$ 58.064,00	$ 464.512,00		$		$	0	$
	13.1.112	CERCHA SOPORTE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO 4	ML	46,2	$ 175.564,00	$ 8.111.057,00		$		$	0	$
	13.1.113	CERCHA SOPORTE PARA RED CONTRA INCÉNDIOS TIPO 5	ML	38	$ 175.134,00	$ 6.655.092,00		$		$	0	$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2



PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				

CONTRATISTA DE OBRA:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	PRORROGA	PLAZO ACUMULADO	ADICION	FECHA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 44.565.398.402,00	24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.955.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022. Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023, Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor . como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan así

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.660.985.873,00	VALOR ACUMULADO			22/08/2023	AL	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	13.1.110	ANCLAJE ESTRUCTUTAL CON PLATINA TIPO I	UND	912	$ 56.830,00	$ 51.828.960,00		$		$	0	$
	13.1.111	ANCLAJE ESTRUCTUTAL CON PLATINA TIPO II	UND	8	58.064,00	$ 464.512,00		$		$	0	$
	13.1.112	CERCHA SOPORTE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO 4	ML	46,2	175.564,00	$ 8.111.057,00		$		$	0	$
	13.1.113	CERCHA SOPORTE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO 5	ML	38	175.134,00	$ 6.655.092,00		$		$	0	$
	13.1.114	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS (ANCLAJES, CORREAS, ANGULOS, PLATINAS, TENSORES, ARANDULA)	KG	10625,71	23.292,00	$ 247.494.037,00		$		$	0	$
					SUBTOTAL	$ 2.183.242.485,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 2

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR			
PLAZA DE MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS				
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONTRATO DE OBRA No.** / **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** / **PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	**PRORROGA**	**PLAZO ACUMULADO**	**ADICIÓN**	**FECHA**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023 / $ 46.565.358.402,00 / 24 meses	N/A	N/A	N/A	N/A
INTERVENTORIA:	**CONTRATO No.** / **FECHA DE INCIO** / **FECHA DE FINALIZACION**	**SUSPENSION**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ACUMULADO**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2020 / 17 DE MARZO DE 2023 / 17 DE MARZO DE 2025	N/A	N/A	N/A	

POLIZAS			VIGENCIA	
AMPAROS	**NUMERO DE POLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,00	17/03/2023	14/09/2025
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	BQ-100066095	$ 13.503.953.936,58	17/03/2023	14/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100066095	$ 2.328.267.920,10	17/03/2023	16/03/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100066095	$ 13.969.607.520,60	17/03/2025	17/03/2030
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	BQ-100066095	$ 4.656.535.840,20	17/03/2025	17/03/2026

En el municipio de valledupar, a los 15 quince días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores CHESMAN BARROS PIMIENTA como Representante Legal del CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022. Contratista de Obra, DAVINSON GRAVINI POLO como Representante Legal de CONSORCIO INTERPLAZA 2023. Interventoria de obra, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervsion, OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Apoyo de la Supervision, y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta cobro de obras del CONTRATO la cual se relacionan asi

ACTA No	2	VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.860.985.873,00	VALOR ACUMULADO		22/08/2023	Al	31/10/2023	FECHA	31/10/2023

CAP	ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO TOTAL CANT	ACUMULADO TOTAL VALOR
		SUB TOTAL CAPITULOS										
		VALOR COSTO DIRECTO				$ 35.102.847.774,00		$ 8.282.444.447,00		$ 5.955.292.328,00		$ 14.237.736.869,00
		ADMINISTRACION			24%	$ 8.424.683.346,00		$ 1.987.786.668,00		$ 1.429.270.159,00		$ 3.417.056.849,00
		IMPREVISTOS			1%	$ 351.028.473,00		$ 82.824.444,00		$ 59.552.925,00		$ 142.377.369,00
	14	UTILIDAD			5%	$ 1.755.142.364,00		$ 414.122.222,00		$ 297.764.616,00		$ 711.886.143,00
		PGIO			2%	$ 702.056.945,00		$ 165.648.889,00		$ 119.105.847,00		$ 284.754.737,00
		TOTAL AIU + PGIO			32%	$ 11.232.911.128,00		$ 2.650.382.224,00		$ 1.905.693.345,00		$ 4.556.075.298,00
		VALOR COSTO DIRECTO + INDIRECTO				$ 46.335.758.402,00		$ 10.932.826.673,00		$ 7.860.985.873,00		$ 18.793.812.667,00
		CERTIFICACIONES ELECTRICAS				$ 229.600.000,00						
14	14.1	CERTIFICACION RETIE	UND	1	$ 176.800.000,00	$ 176.800.000,00						
14	14.2	CERTIFICACION RETILAP	UND	1	$ 52.800.000,00	$ 52.800.000,00						

VALOR CONTRATO DE OBRA		**$ 46.565.358.402,00**		
ANTICIPO	29%	**$ 13.503.953.936,58**		
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	29%		**$ 10.932.826.673,00**	**$ 7.860.985.873,00** / **$ 18.793.812.667,00**
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 3.170.519.735,17**	**$ 2.279.685.903,17** / **$ 5.450.205.673,43**
			$ 7.762.306.937,83	**$ 5.581.299.969,83** / **$ 13.343.606.993,57**
			% de Avance acumulado Actual: 23,48%	% de Avance presente Acta: 16,88% / % Avance Acumulado: 40,36%

SECRETARIO DE OBRAS	INTERVENTORIA	CONTRATISTA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
ING. CARLOS DE LA OSSA LACOUTURE	ING. DAVINSON GRAVINI POLO	ING CHESMAN BARROS PIMIENTA	ARQ. GERIN PICAZA MONTERO	OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA
ALCALDIA MUNICIPAL	CONSORCIO INTERPLAZA 2023	CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Consorcio Interplaza 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 DE CONTRATO DE OBRA No. 011-SOP DE 2023

CONTRATO No	No. 011-SOP DE 2023
FECHA DE CONTRATO	21 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022 NIT. 901.683.967-5
OBJETO	CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTICUATRO (24) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A
FECHA DE REINICIO	N.A
VALOR INICIAL	CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 46.565.358.402,00) incluido AIU
ADICION 1	N.A
VALOR ADICIONAL	N.A
PLAZO ADICIONAL	N.A
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023

En Valledupar, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron los señores: **Ing. CARLOS DE LA OSSA LACOUTURE,** SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL de Valledupar en su calidad de supervisor del contrato, el señor **CHESMAN BARROS PIMIENTA,** en su calidad de representante legal del contratista del **CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022** y el señor **DAVINSON JESUS GRAVINI POLO**, en calidad de Representante Legal del interventor **CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023** con el objeto de recibir los trabajos de acuerdo con el avance de actividades registradas en el Acta de recibo Parcial No. 2 y dejar constancia de:

1. VALOR EJECUTADO

El valor total ejecutado en la presente Acta es de **SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.L. ($ 7.860.985.873,00)**, de acuerdo con el cuadro de cantidades anexo.

2. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto		Valor
Valor del contrato	$	46.565.358.402,00
Valor total contratado	$	46.565.358.402,00
Valor Acta Parcial 1	$	10.932.826.673,00
Valor Acta Parcial 2	$	7.860.985.873,00
Valor Total Acumulado	$	18.793.812.667,00
Valor por ejecutar	$	27.771.545.735,00



Consorcio Interplaza 2023

3. ESTADO DE CUENTAS DEL ANTICIPO

El estado de cuenta del anticipo contrato inicial a la fecha es de:

Concepto	Valor
Valor del anticipo contrato inicial	$ 13.503.953.936,58
Valor amortizado en acta de Recibo Parcial 1	**$ 3.170.519.735,17**
Valor amortizado en acta de Recibo Parcial 2	**$ 2.279.685.903,17**
Valor por amortizar	$ 8.053.748.298,24

4. VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA

El valor a cancelar en la presente Acta se determina de la siguiente manera:

Valor ejecutado en la presente acta	$	7.860.985.873,00
Menos amortización del anticipo	$	2.279.685.903,17
Valor a pagar al Contratista Presente Acta	**$**	**5.581.299.969,83**

El valor a cancelar en la presente acta es **CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTE Y TRES CENTAVOS M.L. ($ 5.581.299.969,83).**

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

CHESMAN BARROS PIMIENTA
Representante Legal
Consorcio Mercado Valledupar 2022

DAVINSON JESUS GRAVINI POLO
Representante Legal
Consorcio Interplaza Valledupar 2023

CARLOS DE LA OSSA LACOUTURE
Secretario de obras públicas municipal
Supervisor

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE VALLEDUPAR

CERTIFICA:

Que **CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA,** Representante Legal del Contratista **"CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022",** identificado con C.C. No. **13.745.081** de Bucaramanga **– NIT. No. 901.683.967-5**, ha ejecutado parcialmente las labores pactadas en el Contrato de Obras No. **011-SOP DE 2023** cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.**

La ejecución de dichas labores se realizaron en el periodo comprendido entre Veintitrés (23) del mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023) y el Treinta y Uno (31) del mes de Octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Es preciso señalar que el contratista suscribió acta de compromiso para que conforme al Artículo Segundo de la Ordenanza No. 226 de 26 de Febrero de 2021 el cual modifica la Ordenanza No. 066 de 2012 "ESTATUTTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR" para que se realice el descuento el Impuesto Departamental y el Decreto No 00062 del 27 de Enero de 2023 según Parágrafo del Artículo Segundo se descuente en cada cuenta de cobro de acuerdo al porcentaje de avance el valor correspondiente los impuestos (estampilla pro cultura, estampilla bienestar adulto mayor, estampilla universidad popular del cesar y estampilla pro deporte y recreación).

Igualmente, se deja constancia del cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral, frente a los Aportes Parafiscales y demás obligaciones derivadas del contrato.

Se expide esta certificación para trámite de cuenta de Acta de Recibo Parcial de Obras No. 002.

Para constancia, se firma la presente Certificación, en Valledupar, Cesar, a los Veintisiete (27) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023)

ING. CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE
Secretario de Obras Públicas Municipal

INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.:	011-SOP DE 2023
PROCESO No.:	LOP-SOP-015-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR NIT. 800.098.911-8
CONTRATISTA:	CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022 NIT. 901.683.967-5
REPRESENTANTE LEGAL:	CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA CC. 13.745.081 de Bucaramanga
SUPERVISOR:	ING. CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Secretario de Obras Públicas Municipal
APOYO SUPERVISIÓN:	Arq. GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Profesional Universitario SOPM
APOYO SUPERVISIÓN:	Arq. OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Contratista - Apoyo de la Supervisión
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023 NIT. 901.689.310-4
REPRESENTANTE LEGAL:	DAVINSON JESUS GRAVINI POLO CC. 1.129.575.456 de Barranquilla
VALOR INICIAL:	El presente contrato tiene un valor de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 46.565.358.402,00) incluidos AIU.
PLAZO:	VEINTICUATRO (24) MESES
DOMICILIO:	El lugar de ejecución del Contrato será el Municipio de Valledupar. Para todos los efectos derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, el domicilio contractual será el Municipio de Valledupar.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Diecisiete (17) del mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023)

De acuerdo con lo contemplado en la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del Contrato de Obras No. 011-SOP DE 2023, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (constitución y aprobación de la garantía única del contrato y registro presupuestal), Presentación de la Cuenta Bancaria y Constancia del pago de

Aportes al Sistema de Seguridad Social, Impuesto Departamental, impuesto a la Sobretasa Deportiva para el fomento del deporte y la recreación INDER y Parafiscales, documentos que se exigen para proceder al pago parcial No. 002 del Contrato de Obras, los cuales fueron entregados en medio físico a satisfacción de la Secretaría de Obras públicas; por consiguiente, se puede proceder al pago del Acta de Recibo Parcial de Obras No. 002, es decir, la suma de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 83/100 ($5.581.299.969,83) M. L.

TOTAL COSTO NETO		**7.860.985.873,00**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**29%**	**2.279.685.903,17**
TOTAL NETO A PAGAR		**5.581.299.969,83**

La ejecución de dichas labores se realizaron en el periodo comprendido entre el Veintitrés (23) del mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023) y el Treinta y Uno (31) del mes de Octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Para constancia, se firma en Valledupar, Cesar, a los Veintisiete (27) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

ING. CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE
Secretario de Obras Públicas Municipal

Proyectó: Arq. **GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO**
Profesional Universitario - Apoyo de la Supervisión
Secretaría de Obras Públicas Municipal

Arq. OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA
Contratista - Apoyo de la Supervisión
Secretaría de Obras Públicas Municipal

INFORME DE SUPERVISIÓN DE APOYO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.:	011-SOP DE 2023
PROCESO No.:	LOP-SOP-015-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR NIT. 800.098.911-8
CONTRATISTA:	CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022 NIT. 901.683.967-5
REPRESENTANTE LEGAL:	CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA CC. 13.745.081 de Bucaramanga
SUPERVISOR:	ING. CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Secretario de Obras Públicas Municipal
APOYO SUPERVISIÓN:	Arq. GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Profesional Universitario SOPM
APOYO SUPERVISIÓN:	Arq. OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA Contratista - Apoyo de la Supervisión
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023 NIT. 901.689.310-4
REPRESENTANTE LEGAL:	DAVINSON JESUS GRAVINI POLO CC. 1.129.575.456 de Barranquilla
VALOR INICIAL:	El presente contrato tiene un valor de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 46.565.358.402,00) incluidos AIU.
PLAZO:	VEINTICUATRO (24) MESES
DOMICILIO:	El lugar de ejecución del Contrato será el Municipio de Valledupar. Para todos los efectos derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, el domicilio contractual será el Municipio de Valledupar.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Diecisiete (17) del mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023)

Mediante la presente el supervisor de Apoyo deja constancia que de acuerdo con las especificaciones técnicas de los ítems relacionados en la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte de este contrato, y dichas especificaciones se encuentran descritas en el Acta de Recibo Parcial de Obras No. 002, suscrita por las partes, la cual es la constancia que los

trabajos ejecutados parcialmente se recibieron a satisfacción por el señor DAVINSON JESUS GRAVINI POLO, Representante Legal del Contratista Interventoria "CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023", quien certifica que el CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022, ha ejecutado a satisfacción las cantidades de obras de cada una de las actividades descrita en la respectiva Acta de Recibo Parcial de Obra No. 002, tal como lo contempla el Contrato en mención y las cantidades de obras realmente ejecutadas, que son necesarias para la normal y correcta ejecución de los trabajos contemplados en el objeto del contrato.

El contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones derivadas del contrato No. 011-SOP DE 2023, de acuerdo al Acta de Recibo Parcial de Obras No. 002 del contrato; por consiguiente, se deja constancia que las obligaciones contractuales de las partes se vienen desarrollando y se está cumpliendo de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

Se deja constancia que el recibo parcial de las obras que se protocoliza mediante la presente Acta de Recibo Parcial No. 002, no releva al Contratista de las responsabilidades y obligaciones previstas en las normas legales y en el Contrato.

Para constancia, se firma el presente Informe de Supervisión de Obras, en Valledupar, Cesar, el Veintisiete (27) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Arq. GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO
Profesional Universitario - Apoyo de la Supervisión
Secretaria de Obras Públicas Municipal

Arq. OSCAR ALBERTO ESCOBAR ACOSTA
Contratista - Apoyo de la Supervisión
Secretaria de Obras Públicas Municipal

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.356.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.204.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 1 LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	**SUB CAPITULO N°** 1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS	**ITEM:** 1.1.3	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3), MEDIDO EN SITIO.			**UNIDAD**	M3

CAPITULO	CAP. 1.1: MOVIMIENTOS DE TIERRAS							UNIDAD:	M3
ITEM	1.1.3	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3), MEDIDO EN SITIO.						CANTIDAD:	965,67
AREA O LUGAR	**DIMENSIONES**				**V. PARCIAL**	**N° DE ELEMENTO**	**UNIDAD**	**TOTAL**	
	M3	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**					
MOVIMIENTOS DE TIERRAS									
EXCAVACIONES	1.302,96				1.302,96	1	m3/km	1.302,96	
RELLENOS	- 943,84				- 943,84	1	m3/km	943,84	
							M3 BRUTO	359,11	
						Coeficiente de expansión	30%		
				Aproxima Resultado			TOTAL EJECUTADO	359,11	
							TOTAL ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	314,56	
							TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	44,55	
							TOTAL PRESUP	965,67	



VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafaña Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Dira Piedrahita Cespedes
Firma

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORÍA:

Consorcio Interplaza


PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.336.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**3/11/2023**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:	UNIDAD	
1 LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	1.2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	1.2.2 VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLOPLEO 60% F'C=2000PSI Y 40% PIEDRA 1"	UNIDAD	M3

CAP. 1.2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO — UNIDAD: M3

ITEM: fundido de zapatas en concreto ciclopeo 60% F'C=3000PSI Y 40% PIEDRA mediana — CANTIDAD: a.REF

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
Cimentacion Mod T1B 2BL	1,25		0,40	10				6,25
Cimentacion Mod T2B 2AL		1,25	0,40	10	6,25			6,25
Cimentacion Mod T3B 2DL	1,25	1,25	0,40	10				6,25
Cimentacion Mod T4A 16L	1,25		0,40		5,00			55,00
Cimentacion Mod T4B 16L	1,25		0,40		5,00			5,00
Cimentacion Mod T4C 18L	1,25	1,25	0,40		6,00			5,00
Cimentacion Mod T5B 14L	1,25	1,25	0,40		5,00			5,00
Cimentacion Mod T6A 12L	1,25	1,25	0,40		3,75			
Cimentacion Mod T6B 12L	1,25		0,40		3,75			7,50
Cimentacion Mod T7B 8L		1,25	0,40		2,50			2,50
Cimentacion Mod T920L+B superior	1,25		0,40					5,00
Cimentacion Mod T920L+B inferior		1,25	0,40		7,50			
Cimentacion Mod T8B 2L+A	1,25	1,25	0,40		5,00			5,00
Cimentacion central de cubierta	1,30	1,30						
				Aproxima Resultado		2 Decimales		129,16
						TOTAL ACUMULADO ACTAS ANTERIO		70,41
						TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		
							TOTAL PRESUP	

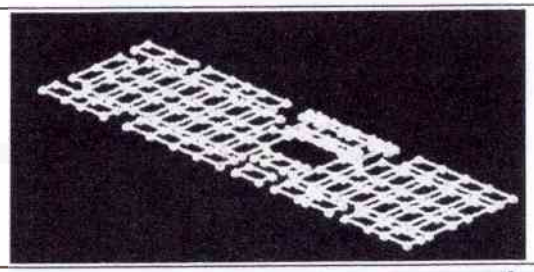



VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villalaña Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ing. Ciro Piedrahita Cespedes
Firma

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:


Consorcio Interplaza
Valledupar 2023

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR.				
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS					

CONTRATISTA DE OBRAS:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION	FECHA DEL ACTA	VERSION
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.545.338.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**3/11/2023**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:	UNIDAD	
LOCALES COMERCIALES. BAÑOS	1.2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	1.2.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	UNIDAD	M3

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
Viga de cimentacion Mod T1B 26L	6.50	0.25	0.3	8	3.9	1	m3	3.9
	3.42	0.25	0.3	5	1.2825	1	m3	1.2825
Viga de cimentacion Mod T2B 24L	6.50	0.25	0.3	8	3.9	1	m3	3.9
	3.36	0.25	0.3	5	1.26	1	m3	1.26
Viga de cimentacion Mod T3B 20L	6.50	0.25	0.3	4	1.95	1	m3	1.95
	4.00	0.25	0.3	4	1.2	1	m3	1.2
	3.36	0.25	0.3	5	1.26	1	m3	1.26
Viga de cimentacion Mod T4A 16L	6.50	0.25	0.3	4	1.95	11	m3	21.45
	4.00	0.25	0.3	2	0.6	11	m3	6.6
	3.96	0.25	0.3	4	1.188	11	m3	13.068
Viga de cimentacion Mod T4B 18L	6.50	0.25	0.3	4	1.95	1	m3	1.95
	4.00	0.25	0.3	2	0.6	1	m3	0.6
	3.42	0.25	0.3	4	1.026	1	m3	1.026
Viga de cimentacion Mod T4C 15L	6.50	0.25	0.3	2	0.975	1	m3	0.975
	6.15	0.25	0.3	2	0.9225	1	m3	0.9225
	4.00	0.25	0.3	2	0.6	1	m3	0.6
	3.36	0.25	0.3	4	1.008	1	m3	1.008
Viga de cimentacion Mod T5B 14L	6.50	0.25	0.3	4	1.95	1	m3	1.95
	1.50	0.25	0.3	2	0.225	1	m3	0.225
	3.42	0.25	0.3	4	1.026	1	m3	1.026
Viga de cimentacion Mod T6A 12L	6.50	0.25	0.3	4	1.95	2	m3	3.9
	3.96	0.25	0.3	3	0.891	2	m3	1.782
Viga de cimentacion Mod T6B 12L	6.50	0.25	0.3	2	0.975	2	m3	1.95
	6.20	0.25	0.3	2	0.93	2	m3	1.86
	3.36	0.25	0.3	3	0.756	2	m3	1.512
Viga de cimentacion Mod T7B 6L	6.50	0.25	0.3	2	0.975	1	m3	0.975
	3.36	0.25	0.3	2	0.504	1	m3	0.504
Viga de cimentacion Mod T920L+B superior	6.50	0.25	0.3	4	1.95	1	m3	1.95
	1.50	0.25	0.3	6	0.675	1	m3	0.675
Viga de cimentacion Mod T920L+B inferior	4.00	0.25	0.3	4	1.2	1	m3	1.2
	6.50	0.25	0.3	4	1.95	1	m3	1.95
	1.50	0.25	0.3	8	0.9	1	m3	0.9
Viga de cimentacion Mod T8B 2L+A	2.00	0.25	0.3	2	0.3	1	m3	0.3
	4.88	0.25	0.3	2	0.732	1	m3	0.732
	2.60	0.25	0.3	2	0.39	1	m3	0.39
	3.52	0.25	0.3	4	1.056	1	m3	1.056
VIGA DE CIMENTACION CUBIERTA CENTRAL	11.2	0.35	0.4	2	3.136	1	m3	3.136
	3.7	0.35	0.4	4	2.072	1	M3	2.072
	8.7	0.35	0.4	4	4.872	1	m3	4.872

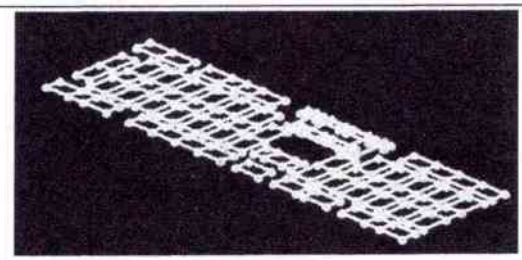







Aproxima Resultad: 2 Decimale:

TOTAL EJECUTADO	97.87
TOTAL ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	51.89
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	[illegible]
TOTAL PRESUP	101.76

VoBo CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Ortes Villafañe Cadrazco
Firma _____

VoBo CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedranita Cespedes
Firma _____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:




INTERVENTORIA:

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	CONTRATO DE OBRA No. 011-SOP DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 46.565.358.402,00	PLAZO DE EJECUCION 24 meses	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2023	FECHA DE FINALIZACION 17 DE MARZO DE 2025	FECHA DEL ACTA	VERSION
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	CONTRATO No. 043-SOP DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 3.206.361.090,22	PLAZO DE EJECUCION 24 meses	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2023	FECHA DE FINALIZACION 17 DE MARZO DE 2025	3/11/2023	

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:		
1 LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	1.2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	1.2.4	ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	UNIDAD: M3

CAPITULO:	CAP. 1.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	UNIDAD:	M3
ITEM:	1.2.4 ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	CANTIDAD:	37,60

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
ZAPATAS Mod T1B 26L	1,00	1,00	0,40	10	4,00	1	M3	4,00
ZAPATAS Mod T2B 24L	1,00	1,00	0,40	10	4,00	1	M3	4,00
ZAPATAS Mod T3B 20L	1,00	1,00	0,40	10	4,00	1	M3	4,00
ZAPATAS Mod T4A 16L	1,00	1,00	0,40	8	3,20	11	M3	35,20
ZAPATAS Mod T4B 16L	1,00	1,00	0,40	8	3,20	1	M3	3,20
ZAPATAS Mod T4C 18L	1,00	1,00	0,40	8	3,20	1	M3	3,20
ZAPATAS Mod T5B 14L	1,00	1,00	0,40	8	3,20	1	M3	3,20
ZAPATAS Mod T6A 12L	1,00	1,00	0,40	6	2,40	2	M3	4,80
ZAPATAS Mod T6B 12L	1,00	1,00	0,40	6	2,40	2	M3	4,80
ZAPATAS Mod T7B 6L	1,00	1,00	0,40	4	1,60	1	M3	1,60
ZAPATAS Mod T920L+B superior	1,00	1,00	0,40	8	3,20	1	M3	3,20
ZAPATAS Mod T920L+B inferior	1,00	1,00	0,40	12	4,80	1	M3	4,80
ZAPATAS Mod T8B 2L+A	1,00	1,00	0,40	8	3,20	1	M3	3,20
ZAPATAS central de cubierta	1,30	1,30	0,40	8	5,41	1	M3	5,41
						TOTAL EJECUTADO		84,61
						TOTAL ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		[illegible]
						TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		37,60
						TOTAL PRESUP		[illegible]

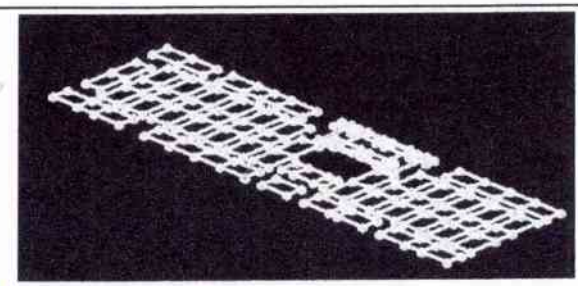





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORÍA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2026	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 1 LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	**SUB CAPITULO N°** 03 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 1.2.5 PEDESTAL EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.				**UNIDAD**	M3

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PARCIAL	UNIDAD	TOTAL
PEDESTALES Mod T1B 26L	0,35		0,80	10			
PEDESTALES Mod T2B 24L							0,74
PEDESTALES Mod T3B 20L			0,60	10			0,74
PEDESTALES Mod T4A 16L		0,35	0,60				6,47
PEDESTALES Mod T4B 16L	0,35	0,35	0,60				
PEDESTALES Mod T4C 16L	0,35	0,35			0,59		0,59
PEDESTALES Mod T5B 14L			0,60		0,59		
PEDESTALES Mod T6A 12L		0,35					
PEDESTALES Mod T6B 12L							
PEDESTALES Mod T7B 6L							
PEDESTALES Mod T920L+B superior		0,35					
PEDESTALES Mod T920L+B inferior		0,35					
PEDESTALES Mod T8B 2L+A			0,60				0,59
PEDESTALES Cimentacion central de cubierta							1,86
		Aproxima Resultado		2 Decimales		TOTAL EJECUTADO	16,42
						TOTAL PRESUP	16,42





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:





INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR.				
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46,565,358,402.00	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA** / **VERSIÓN**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3,206,361,090.22	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**
CAPITULO N° 1 LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	**SUB CAPITULO N°** 1.2 CIMENTACIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 1.2.9 ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.			**UNIDAD**	kg

AREA O LUGAR		DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES PESO	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
REFUERZO ZAPATA									
Acero de refuerzo zapata T1 transv - Mod		1/2"	0.994	1.3	7	9.05	198	Kg	1790.99
Acero de refuerzo zapata T1 long - Mod		1/2"	0.994	1.3	7	9.05	198	Kg	1790.99
Acero de refuerzo zapata T2 transv - cubierta central		5/8"	1.552	1.7	9	23.75	8	Kg	189.96
Acero de refuerzo zapata T2 long - cubierta central		5/8"	1.552	1.7	9	23.75	8	Kg	189.96
REFUERZO PEDESTALES									
PD01	Acero de refuerzo pedestales T1 long- Mod	5/8"	1.55	1.35	8	18.76	198	Kg	3318.80
PD02	Acero de refuerzo pedestales T1 estribos - Mod	3/8"	0.56	1.3	12	8.74	198	Kg	1729.73
PD03	Acero de refuerzo pedestales T2 long- cubierta central	5/8"	1.55	1.9	12	35.39	8	Kg	283.08
PD04	Acero de refuerzo pedestales T2 estbos - cubierta central	3/8"	0.56	2.85	20	31.92	8	Kg	255.36
REFUERZO MODULO T3B 20L									
VC010		1/2"	0.994	7.45	2	14.81	2		29.62
VC011		1/2"	0.994	12	2	23.85	2		47.71
VC012		1/2"	0.994	7.45	2	14.81	2		29.62
VC013		1/2"	0.994	12	2	23.88	2		47.71
VC014		1/2"	0.994	2.85	2	5.67	2		11.33
VC015		1/2"	0.994	12	2	23.88	2		47.71
VC016		1/2"	0.994	5	2	9.94	5		49.70
VC017		1/2"	0.994	5	2	9.94	5		49.70
VE009		3/8"	0.56	0.93	196	102.08	2		204.15
VE004		3/8"	0.56	0.93	33	17.19	5		85.93
								Peso	10152.07

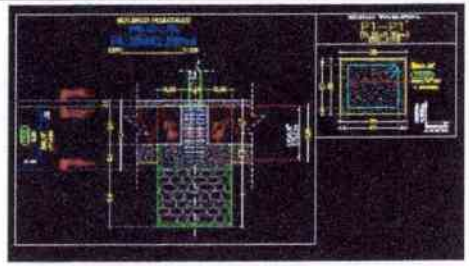

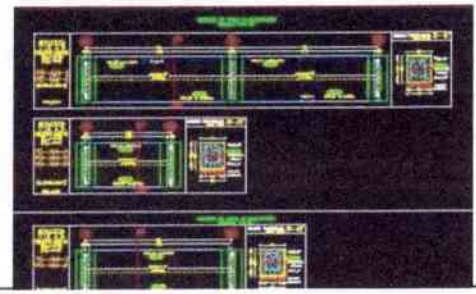

VoBo CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Otis Villalaíe Cadrazco
Firma _____


VoBo CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Gran Pedrahita Cespedes
Firma _____


VALLEDUPAR EN ORDEN	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.545.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA** / **VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**

CAPITULO N° 1 LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	**SUB CAPITULO N°** 1.2 CIMENTACIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 1.2.9	ACERO DE REFUERZO PDR-60; FY=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	**UNIDAD** kg

								Viene	10152,07
REFUERZO MODULO T4B 18L									
VC018		1/2"	0.994	9.25	2	18.39	2		36,78
VC019		1/2"	0.994	12	2	23.86	2		47,71
VC020		1/2"	0.994	12	2	23.86	2		47,71
VC021		1/2"	0.994	9.25	2	18.39	2		36,78
VC022		1/2"	0.994	5.6	2	11.13	4		44,53
VC023		1/2"	0.994	5.6	2	11.13	4		44,53
VE005		3/8"	0.56	0.93	157	81.77	2		163,53
VE006		3/8"	0.56	0.93	39	20.31	4		81,24
REFUERZO MODULO T4A 18L									
VC014		1/2"	0.994	9.25	2	18.39	22		404,56
VC025		1/2"	0.994	12	2	23.86	22		524,83
VC026		1/2"	0.994	12	2	23.86	22		524,83
VC027		1/2"	0.994	9.25	2	18.39	22		404,58
VC028		1/2"	0.994	5.6	2	11.13	44		489,84
VC029		1/2"	0.994	5.6	2	11.13	44		488,84
VE007		3/8"	0.56	0.93	157	81.77	22		1798,84
VE008		3/8"	0.56	0.93	39	20.31	44		893,69
REFUERZO MODULO T4C 18L									
VC024		1/2"	0.994	9.25	2	18.39	2		36,78
VC025		1/2"	0.994	12	2	23.86	2		47,71
VC026		1/2"	0.994	12	2	23.86	2		47,71
VC027		1/2"	0.994	9.25	2	18.39	2		36,78
VC028		1/2"	0.994	5	2	9.94	4		39,76
VC029		1/2"	0.994	5	2	9.94	4		39,76
VE007		3/8"	0,56	0.93	157	81.77	2		163,53
VE008		3/8"	0.56	0.93	39	20,31	4		81,24
REFUERZO MODULO T5B 14L									
VC030		1/2"	0.994	6.75	2	13.42	2		26,84
VC031		1/2"	0.994	12	2	23.86	2		47,71
VC032		1/2"	0.994	12	2	23.86	2		47,71
VC033		1/2"	0.994	6.75	2	13.42	2		26,84
VC034		1/2"	0.994	5	2	9.94	4		39,76
VC035		1/2"	0,994	5	2	9.94	4		39,76
VE009		3/8"	0.56	0.93	136	70.83	2		141,66
VE010		3/8"	0.56	0.93	33	17.19	4		68,76
								Pasan	17119,18

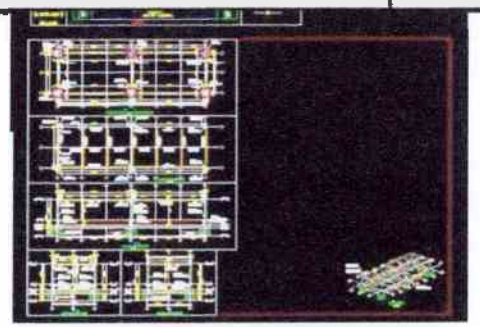

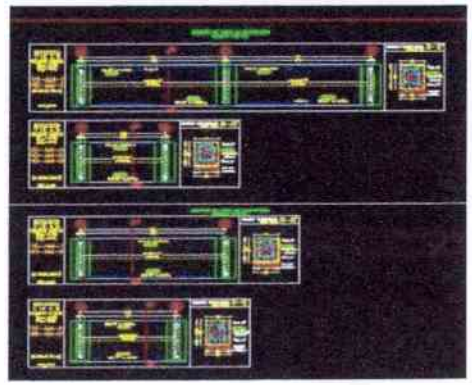

VoBo CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:




INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	CONTRATO DE OBRA No. 011-SOP DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 46.545.258.402,00	PLAZO DE EJECUCION 24 meses	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2023	FECHA DE FINALIZACION 17 DE MARZO DE 2025	FECHA DEL ACTA	VERSION
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	CONTRATO No. 043-SOP DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 3.206.361.090,22	PLAZO DE EJECUCION 24 meses	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2023	FECHA DE FINALIZACION 17 DE MARZO DE 2025	3/11/2023	

CAPITULO N°		SUB CAPITULO N°		ITEM:			
1	LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	1.2	CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	1.2.9	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	UNIDAD	kg

								Vienen	17118,18
REFUERZO MODULO T6A 12L									
VC036		1/2"	0,994	4,25	2	8,45	4		33,80
VC037		1/2"	0,994	12	2	23,86	4		95,42
VC038		1/2"	0,994	12	2	23,86	4		95,42
VC039		1/2"	0,994	6,75	2	13,42	4		53,68
VC040		1/2"	0,994	5,6	2	11,13	6		66,80
VC041		1/2"	0,994	5,6	2	11,13	6		66,80
VE011		3/8"	0,56	0,93	118	61,45	4		245,82
VE012		3/8"	0,56	0,93	39	20,31	6		121,87
REFUERZO MODULO T6B 12L									
VC042		1/2"	0,994	4,25	2	8,45	4		33,80
VC043		1/2"	0,994	12	2	23,86	4		95,42
VC044		1/2"	0,994	12	2	23,86	4		95,42
VC045		1/2"	0,994	6,75	2	13,42	4		53,68
VC046		1/2"	0,994	5	2	9,94	6		59,64
VC047		1/2"	0,994	5	2	9,94	6		59,64
VE013		3/8"	0,56	0,93	118	61,45	4		245,82
VE014		3/8"	0,56	0,93	33	17,19	6		103,12
REFUERZO MODULO T7B 6L									
VC048		1/2"	0,994	8,15	2	16,20	2		32,40
VC049		1/2"	0,994	8,15	2	16,20	2		32,40
VC050		1/2"	0,994	5,6	2	11,13	2		22,27
VC051		1/2"	0,994	5,6	2	11,13	2		22,27
VE015		3/8"	0,56	0,93	59	30,73	2		61,45
VE016		3/8"	0,56	0,93	39	20,31	2		40,62
REFUERZO MODULO T8B 12L+A									
VC060		1/2"	0,994	12	2	23,86	2		47,71
VC061		1/2"	0,994	1,75	2	3,48	2		6,96
VC062		1/2"	0,994	1,75	2	3,48	2		6,96
VC063		1/2"	0,994	12	2	23,86	2		47,71
VC064		1/2"	0,994	5,15	2	10,24	4		40,95
VC065		1/2"	0,994	5,15	2	10,24	4		40,95
VE019		3/8"	0,56	0,93	85	44,27	2		88,54
VE020		3/8"	0,56	0,93	35	18,23	4		72,91
								Pasan	19208,44

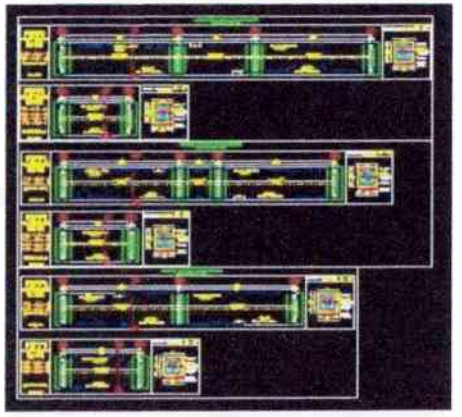



VoBo CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villalaña Cadrazco
Firma_____

VoBo CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Patricia Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORÍA:

Consorcio Interplaza
Valledupar 2023

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR					
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSIÓN**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.545.358.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORÍA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	3/11/2023	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	040-SOP DE 2023	$ 3.906.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:			
1 LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	1.2 CIMENTACIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	1.2.9	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	UNIDAD	kg

									Vienen	19208,44
REFUERZO MODULO ZONA SUPERIOR T8 20L+B										0,00
VC070		1/2"	0.994	3.15	2	6.26	4			25.05
VC071		1/2"	0.994	3.15	2	6.26	4			25.05
VC072		1/2"	0.994	12	2	23.86	2			47.71
VC073		1/2"	0.994	6.75	2	13.42	2			26.84
VC074		1/2"	0.994	6.75	2	13.42	2			26.84
VC075		1/2"	0.994	12	2	23.86	2			47.71
VE023		3/8"	0.56	0.93	19	9.90	4			39.58
VE024		3/8"	0.56	0.93	135	70.31	2			140.62
REFUERZO MODULO ZONA INFERIOR T8 20L+B										
VC076		1/2"	0.994	3.15	2	6.26	6			37.57
VC077		1/2"	0.994	3.15	2	6.26	6			37.57
VC078		1/2"	0.994	12	2	23.86	2			47.71
VC079		1/2"	0.994	6.75	2	13.42	2			26.84
VC080		1/2"	0.994	5.35	2	10.64	2			21.27
VC081		1/2"	0.994	5.35	2	10.64	2			21.27
VC082		1/2"	0.994	6.75	2	13.42	2			26.84
VC083		1/2"	0.994	12	2	23.86	2			47.71
VE025		3/8"	0.56	0.93	19	9.90	6			59.37
VE026		3/8"	0.56	0.93	213	110.93	2			221.86
REFUERZO MODULO T1B 20L, MODULO T2B 24L										
VC001		1/2"	0.994	3.25	2	6.46	4			25.84
VC002		1/2"	0.994	12	2	23.86	4			95.42
VC003		1/2"	0.994	12	2	23.86	4			95.42
VC004		1/2"	0.994	5.5	2	10.93	4			43.74
VC005		1/2"	0.994	12	2	23.86	4			95.42
VC006		1/2"	0.994	7.85	2	15.61	4			62.42
VC007		1/2"	0.994	12	2	23.86	4			95.42
VC008		1/2"	0.994	5	2	9.94	10			99.40
VC009		1/2"	0.994	5	2	9.94	10			99.40
VE001		3/8"	0.56	0.93	238	122.91	4			491.64
VE002		3/8"	0.56	0.93	33	17.19	10			171.86
									Pasan	21511,03





VoBo CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Otis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Melinahita Espedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORÍA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS					

CONTRATISTA DE OBRAS:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION	FECHA DEL ACTA	VERSION
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.545.358.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025	3/11/2023	
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**		
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:		UNIDAD	
1 LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	1.2.9	ACERO DE REFUERZO FDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	UNIDAD	kg

								Vienen	21511,85
REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION DE CUBIERTA CENTRAL									
VCD52		5/8"	1,552	10,85	2	33,68	4		134,71
VCD53		5/8"	1,552	10,85	2	33,68	4		134,71
VCD54		5/8"	1,552	6	2	18,62	2		37,25
VCD55		5/8"	1,552	12	2	37,25	2		74,50
VCD56		5/8"	1,552	6,8	2	21,11	2		42,21
VCD57		5/8"	1,552	12	2	37,25	2		74,50
VCD58		5/8"	1,552	6,85	2	21,26	2		42,52
VCD59		5/8"	1,552	6	2	18,62	2		37,25
VED35		3/8"	0,56	1,3	64	46,59	4		186,37
VED36		3/8"	0,56	1,3	140	101,92	2		203,84
								TOTAL EJECUTADO	22.479,71
								TOTAL ACUMULADO ACTAS ANTERIOR	20.009,94
								TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.469,77
								TOTAL PRESUP	23.959,21





VoBo CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma


VoBo CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedad Rita Cervantes
Firma

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 1 LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	**SUB CAPITULO N°** 1.2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 1.2.10 ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO A				**UNIDAD**	UND

CAPITULO:	CAP. 1.2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	UNIDAD:	UND
ITEM:	1.2.10 ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO A	CANTIDAD:	198,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	UBICACIÓN	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
MODULOS								
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T1B			10	10,00	1	UND	10,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T2B			10	10,00	1	UND	10,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T3B			10	10,00	1	UND	10,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T4A			8	8,00	11	UND	88,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T4B			8	8,00	1	UND	8,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T4C			8	8,00	1	UND	8,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T5B			6	6,00	1	UND	6,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T6A			6	6,00	2	UND	12,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T6B			6	6,00	2	UND	12,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T7B			4	4,00	1	UND	4,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T8B			8	8,00	1	UND	8,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T9 Superior			8	8,00	1	UND	8,00
Anclaje pedestales tipo 1 con columnas PTE150X150X4	T9 Inferior			12	12,00	1	UND	12,00
			Aproxima Resultado a :	2 Decimales		TOTAL EJECUTADO		198,00
					por suministro que esta en obra, se recibió el 29%	29%		57,42
							TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA 71%	140,58
							TOTAL PRESUP	198,00

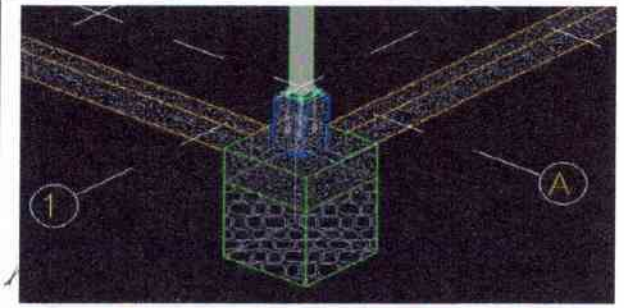




VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafaña Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ciro Piedrahita Cespedes
Firma_____

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 1 LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	**SUB CAPITULO N°** 1.2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 1.2.11 ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO B				**UNIDAD**	UND

	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	UBICACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
MODULOS								
Anclaje pedestales tipo 2 con columnas PTE200X1200X5	Cubierta Central			4	8,00	[illegible]	UND	[illegible]
			Aproxima Resultado a		Decimales	TOTAL ejecutado		8,00
						TOTAL PRESUP		8,00

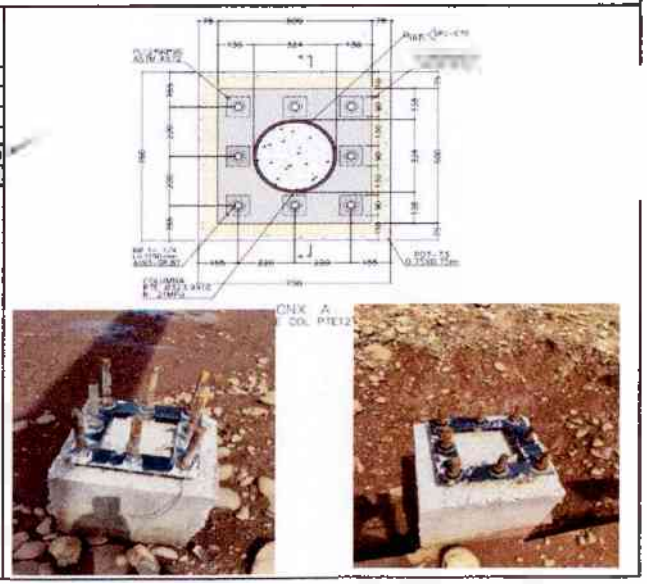

VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____


VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VELEDORES ESTACIONAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 01 SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.365.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 1° DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 1° DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 1.250.341.064	**PLAZO DE EJECUCION** 24	**FECHA DE INICIO** 1° DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 1° DE MARZO DE 2025	3/11/2023	

CAPITULO N° 1 LOCALES COMERCIALES, BAÑOS	**SUB CAPITULO N°** 1.8 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	**ITEM:** 1.8.2	ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS Esp1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50CM, CONECTORES Y ACABADO FINAL	**UNIDAD**	kg

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	DIÁMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD				
LOCALES								
Modulo T1B 28L	fabricacion de Alma llena	5063.48			5063.48	1	KG	5063.48
Modulo T2B 24L	fabricacion de Alma llena	4678.28			4678.28	1	KG	4678.28
Modulo T4A 16L	fabricacion de Alma llena	3198.90			3198.90	11	KG	35187.90
Modulo T4B 16L	fabricacion de Alma llena	3157.98			3157.98	1	KG	3157.98
Modulo T4C 16L	fabricacion de Alma llena	3157.98			3157.98	1	KG	3157.98
Modulo T5B 14L		2985.37			2985.37	1	KG	2985.37
Modulo T6A 12L	fabricacion de Alma llena	2669.76			2669.76	2	KG	5339.52
Modulo T6B 12L	fabricacion de Alma llena	2628.05			2628.05	2	KG	5256.09
Modulo T7B 8L	fabricacion de Alma llena	1627.40			1627.40	1	KG	1627.40
Modulo T8B 2L+A	fabricacion de Alma llena	2782.03			2782.03	1	KG	2782.03
Modulo T9 20L+B Superior	fabricacion de Alma llena	4139.57			4139.57	1	KG	4139.57
Modulo T9 20L+B Inferior	fabricacion de Alma llena	3208.45			3208.45	1	KG	3208.45
Modulo Central	fabricacion de Alma llena	13365.28			13365.28	1	KG	13365.28
Modulo T3B 20L	fabricacion de Alma llena	3848.28			3848.28	1	KG	3848.28
			Aproxima Resultado a :		2 Decimales	TOTAL		93.577,56
			Se recibió en el acta 1 el suministro por el porcentaje del 62% de acuerdo al desglose del unitario			62%		58.018,09
			TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA 16,36% de la cantidad total a ejecutar			16,60%		15.533,87
							TOTAL PRESUP	77.184,08







VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafaña Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ciro Piedrahita Cespedes
Firma

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza


PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS		**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 66.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.098,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 2 CUARTOS TÉCNICOS	**SUB CAPITULO N°** 2,1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CUARTOS TECNICOS	**ITEM:** 2.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.			**UNIDAD**	m3	

ZAPATAS EN CONCRETO CICLOPLEO

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
CUARTO TECNICO	1,8	1,8	0,9	20	58,32	1	M3	58,32

VIGAS CIMENTACION 0.35cm x 0.40cm

AREA O LUGAR		DIMENSIONES AREA	VOLUMEN	ALTO	CANTIDAD	[illegible]	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
EXCAVACION GENERAL						0			0,00
	estación								
	0+000,00	0,00							
	0+005,00	9,39	23,47			23,47		M3	
	0+010,00	8,79	46,46			69,93		M3	
	0+015,00	8,81	44,01			112,94		M3	
	0+020,00	8,81	44,05			156,99		M3	
Corte general para implantación	0+025,00	8,72	43,84			200,83		M3	
	0+030,00	8,13	42,13			242,96		M3	
	0+035,00	7,56	39,23			282,19		M3	
	0+040,00	6,83	35,98			318,17		M3	
	0+045,00	5,94	31,92			350,09		M3	
	0+050,00	4,93	27,18			377,28		M3	
	0+051,63	0,00	4,02			381,30	1	M3	381,3

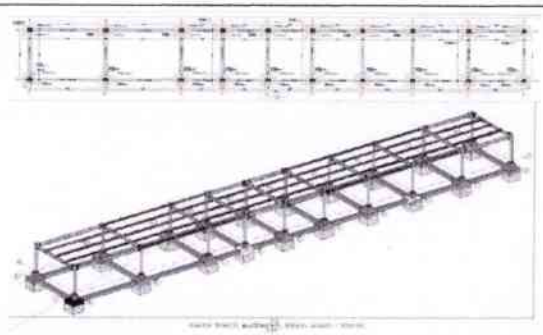





Aproxima Resultado	Decimales
TOTAL EJECUTADO	438,62
TOTAL ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	197,38
SALDO TOTAL POR COBRAR	242,24
CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL	18,12
TOTAL PRESUP	216,50

VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ciro Piedrahita Cespedes
Firma

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.545.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 2 CUARTOS TÉCNICOS	**SUB CAPITULO N°** 2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CUARTOS TECNICOS	**ITEM:** 2.1.2	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO. INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN SITIO.			**UNIDAD**	m3

ZAPATAS EN CONCRETO CICLOPEO

AREA O LUGAR		DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
TOTAL EXCAVACIONES ESTRUCTURAS						58,32	1	M3	58,32
LLENO DE MATERIAL COMUN DE LA COTA 167,118; HASTA LA 167,865		51,07	7,39	0,76	286,829548	288,83	1	M3	288,829548
DEDUCCIONES	CICLOPEO	1,3	1,3	0,9	-20	-30,42	1	M3	-30,42
	ZAPATAS	1,3	1,3	0,4	-20	-13,52	1	M3	-13,52
	PEDESTALES	0,45	0,45	0,76	-20	-3,078	1	M3	-3,078
	VIGAS DE CIMENTACION EJES DEL A AL J	38,07	0,35	0,4	-2	-10,6596	1	M3	-10,66
	VIGAS DE CIMENTACION EJES 1 Y 3	4,79	0,35	0,4	-10	-6,706	1	M3	-6,71
						0			
								TOTAL EJECUTADO	280,77
					CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL				80,18
								TOTAL PRESUP	80,18







VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Fitzgerald Céspedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:


Consorcio Interplaza

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR					
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.356.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**3/11/2023**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:		
2 CUARTOS TÉCNICOS	2.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	2.2.1 CONCRETO PARA SOLADOS E=5.0cmts. f'c=2.500 PSI.	UNIDAD	m3

ZAPATAS EN CONCRETO CICLOPLEO

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
CUARTOS TECNICOS								
VIGAS DE CIMENTACION EJES DEL A AL J	38,07	0,50	0,05	2,00	1,90	1	M3	1,90
VIGAS DE CIMENTACION EJES 1 Y 3	4,79	0,50	0,05	10,00	1,20	1	M3	1,20
						TOTAL EJECUTADO		3,10
						CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL		2,17
						TOTAL PRESUP.		2,17

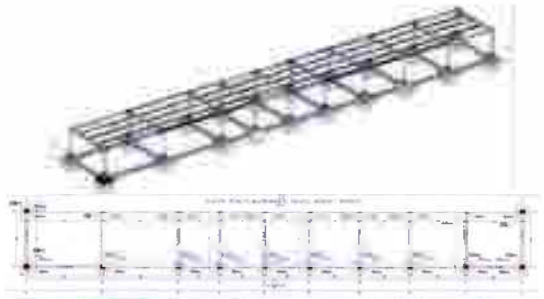



VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:




INTERVENTORIA:

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.356.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 2 CUARTOS TÉCNICOS	**SUB CAPITULO N°** 2.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 2.2.2 CONCRETO CICLOPLEO 60% F'C=2000PSI Y 40% PIEDRA 1"				**UNIDAD**	m3

CUARTOS TECNICOS

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
CIMIENTACION CUARTOS TÉCNICOS	1,30	1,30	0,9	20,00	30,42	1	M3	30,42
						TOTAL EJECUTADO		30,42
						TOTAL PRESUP		30,42

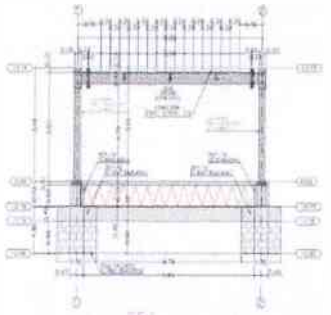



VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ciro Piedrahita Cesnales
Firma_____

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 2 CUARTOS TÉCNICOS	**SUB CAPITULO N°** 2.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 2.2.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.				**UNIDAD**	m3

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
CUERTOS TECNICOS								
VIGAS DE CIMENTACION EJES DEL A AL J	38.07	0,35	0,40	2,00	10,66	1	M3	10,66
VIGAS DE CIMENTACION EJES 1 Y 3	4.79	0.35	0,40	10,00	6,71	1	M3	6,71
						TOTAL EJECUTADO		17,37
						TOTAL PRESUP		17,37





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ciss Piedrahita Cepedes
Firma


VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	

CAPITULO N° 2 CUARTOS TÉCNICOS	**SUB CAPITULO N°** 2.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 2.2.4 ZAPATAS AISLADAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	**UNIDAD**	m3

CUARTOS TECNICOS

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
CIMIENTACIÓN CUARTOS TÉCNICOS	1,30	1,30	0,4	20,00	13,52	1	M3	13,52
						TOTAL EJECUTADO		13,52
						TOTAL PRESUP		13,52

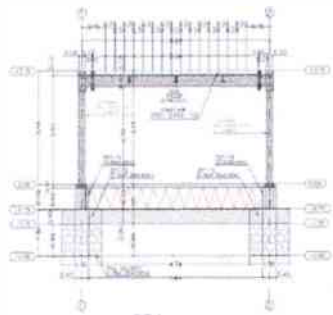





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Caspedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza 2023

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR					
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**3/11/2023**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.261.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:		
2 CUARTOS TÉCNICOS	2,2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	2.2.5	PEDESTAL EN CONCRETO f'c=3000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	UNIDAD m3

CUARTOS TECNICOS

	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
PEDESTALES CUARTOS TECNICOS POT-T4	0.45	0.45	0.60	20.00	2.43	1	M3	2.43
						TOTAL EJECUTADO		2.43
						TOTAL PRESUP		2.43







VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Pedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46 566.058.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3 206 361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 2 CUARTOS TÉCNICOS	**SUB CAPITULO N°** 2.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 2.2.7	ACERO DE REFUERZO PDR-60; FY=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.			**UNIDAD**	KG


AREA O LUGAR		DIMENSIONES DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
ZPT2		5/8"	1,55	1,70	9,00	23,75	20,00	KG	474,91
		5/8"	1,55	1,70	9,00	23,75	20,00	KG	474,91

PEDESTALES

AREA O LUGAR		DIMENSIONES DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
PD01	REFUERZO LONGITUDINAL PDT-T4	5/8"	1,55	1,35	12,00	25,14	20,00	KG	502,85
PD02	REFUERZO TRASNVERSAL (ESTRIBOS) Y GANCHOS	3/8"	0,56	2,85	12,00	19,15	20,00	KG	383,04

VIGAS DE CIMENTACIÓN

AREA O LUGAR		DIMENSIONES DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
VC01	VIGAS AM1 Y AM2	5/8"	1,55	12,00	2,00	37,25	2,00	KG	74,50
VC02		5/8"	1,55	12,00	2,00	37,25	2,00	KG	74,50
VC03		5/8"	1,55	12,00	2,00	37,25	2,00		74,50
VC04		5/8"	1,55	12,00	2,00	37,25	2,00		74,50
VC05		5/8"	1,55	5,95	2,00	18,47	2,00		36,94
VC06		5/8"	1,55	5,95	2,00	18,47	2,00		36,94
VC07		5/8"	1,55	12,00	2,00	37,25	2,00		74,50
VC08		5/8"	1,55	12,00	2,00	37,25	2,00		74,50
VC09		5/8"	1,55	12,00	2,00	37,25	2,00		74,50
VC10		5/8"	1,55	12,00	2,00	37,25	2,00		74,50
VE01		3/8"	0,56	1,25	309,00	216,30	2,00		432,60
VC11	VIGAS AM (A, B, C,D,E,F,G,H I, J)	5/8"	1,55	6,93	2,00	21,51	10,00		215,11
VC12		5/8"	1,55	6,93	2,00	21,51	10,00		215,11
VE02		3/8"	0,56	1,25	37,00	25,90	10,00		259,00
								TOTAL	3.627,37
		Cantidad recibida acta 1							2.497,45
		CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL							1.085,61
								TOTAL PRESUP	3.582,98

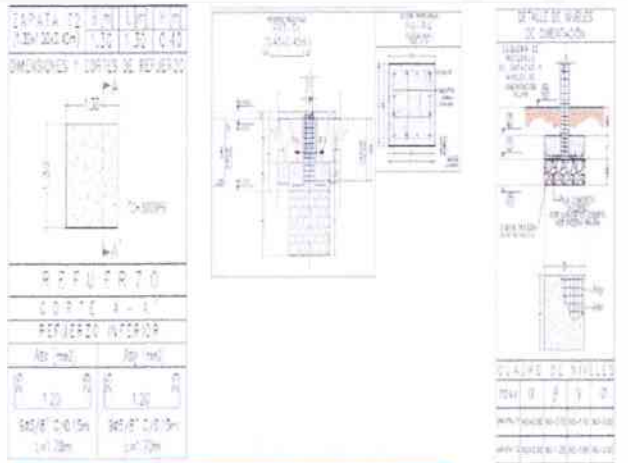



VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ciro Piedrahita Cespedes
Firma


VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza	

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	

CAPITULO N° 2 CUARTOS TÉCNICOS	**SUB CAPITULO N°** 2.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 2.2.8 ANCLAJE ESTRUCTURAL CON PLATINA TIPO B		**UNIDAD**	und

CUARTOS TECNICOS

	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
Anclaje pedestales PDT-T4 con columnas PTE200X200X7				20,00	20,00	1	UND	20,00
						TOTAL EJECUTADO		20,00
						TOTAL PRESUP		20,00







VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Pipe Ahita Castaldes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza 2023

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS		**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 2 CUARTOS TÉCNICOS	**SUB CAPITULO N°** 2.7 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		**ITEM:** 2.7.1 ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50CM, CONECTORES Y ACABADO FINAL		**UNIDAD**	kg

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD				
LOCALES								
MODULO DE CUARTOS TENICOS	fabricacion de Alma llena	17670,31			17870,31	1	KG	17670,31
			Aproxima Resultado a		2 Decimales	TOTAL EJECUTADO		17.670,31
		CANTIDAD RECIBIDA ACTA N° 1						[illegible]
	CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL							1.377,83
						TOTAL PRESUP		12.333,42







VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Civ. Piedrahita Cespedes
Firma

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza


PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.204.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	

CAPITULO N° 2 CUARTOS TÉCNICOS	**SUB CAPITULO N°** 2.7 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	**ITEM:** 2.7.2 LOSA COMPUESTA METALDECK CON LAMINA COLABORANTE	**UNIDAD**	M2

CUARTOS TECNICOS

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
CUBIERTA	50.00		6.30	1.00	315.00	1	M2	315.00
			Aproxima Resultado	2 Decimales		TOTAL EJECUTADO		315.00
						TOTAL PRESUP		315.00





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ciro Piedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.365.358.402,00
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22
CAPITULO N° 3 **CUBIERTA PRINCIPAL**	**SUB CAPITULO N°** 3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CUBIERTA PRINCIPAL	

AREA O LUGAR		DIMENSIONES			
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD
CUBIERTA PRINCIPAL					
etapa 2					
ORE EL EJE 6 ETA	A6. O6. P6. O6. N6. M6	2,8	2.8	1,7	6
IRE EL EJE 6' ETA	A-5 D-6 E-6 G-6 .	2,8	2.8	1.7	4
Etapa 1					
ORE EL EJE 6 ETAF	A6; D6. E6. G6 M6; N6; O6; P6; Q6; A6	2,8	2.8	1,7	10
EJE 5 ETAPA 1	A5; Q5	2.8	2.8	1,7	2
EJE 4 ETAPA 1	D 4 ; G 4	2.8	2.8	1.7	2
EJE 4 ETAPA 1	A4; Q4	2.8	2.8	1,7	2
EJE 3 ETAPA 1	D 3 ; G 3 H 3	2.8	2.8	1,7	3
EJE 3 ETAPA 1	A3; J3; Q3	2.8	2.8	1,7	3
EJE 2 ETAPA 1	D 2 ; H 2	2.8	2.8	1,7	2
EJE 2 ETAPA 1	A2; Q2	2.8	2.8	1,7	2
EJE 1 ETAPA 1	D 1 ; H 1	2.8	2.8	1,7	2
EJE 1 ETAPA 1	A1; B1 C1; D1; E1; F1. G1; H1, I1. J1; K1; L1; M1; N1. O1; P1; Q1	2.8	2.8	1,7	17
VIGAS DE CIMENTACIÓN					
ETAPA 1	VIGA (AM-A) DEL EJE 1 AL 6	5	1	1,3	5
	VIGA (AM-3) DEL EJE G AL H	5	1	1,3	1
	VIGA AM-6	20	1	1,3	1
		5	1	1,3	1
		12,5	1	1,3	1
	VIGA AM-5	5	1	1,3	5
	VIGA AM-G'	5	1	1,3	1
		3,8	1	1,3	1
	VIGA AM-D	4,3	1	1,3	1
	VIGA AM-D	6,81	1	1,3	1
		5	1	1,3	3
	VIGA AM-E	6,81	1	1,3	1
	VIGA AMA-E	4,3	1	1,3	1
	VIGA AM-H	4,3	1	1,3	1
	VIGA AM-1	5	1	1,3	16
	VIGA AM- I	4,3	1	1,3	1
	VIGA (AM-H')	5	1	1,3	2
		3,5	1	1,3	1
	VIGA AMA-J	12,5	1	1,3	1
	VIGA AM-DIAGONAL 2	28,7	1	1,65	1
	VIGA AM-DIAGONAL 1	28,7	1	1,65	1

VoBo: CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cedrazco
Firma_____


CONTRATISTA DE OBRA:	INTERVENTORIA:
	Consorcio Interplaza 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.

PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION	FECHA DEL ACTA	VERSION
24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION	3/11/2023	
24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

ITEM:			
3.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.	UNIDAD	M3

V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
79,97	1	M3	79,97
53,31	1	M3	53,31
133,28	1	M3	133,28
26,66	1	M3	26,66
26,66	1	M3	26,66
26,66	1	M3	26,66
39,98	1	M3	39,98
39,98	1	M3	39,98
26,66	1	M3	26,66
26,66	1	M3	26,66
26,66	1	M3	26,66
226,58	1	M3	226,58
0,00	1	M3	0,00
		M3	0,00
32,50	1	M3	32,50
6,50	1	M3	6,50
30,00	1	M3	30,00
6,50	1	M3	6,50
16,25	1	M3	16,25
32,50	1	M3	32,50
6,50	1	M3	6,50
4,94	1	M3	4,94
5,59	1	M3	5,59
8,85	1	M3	8,85
19,50	1	M3	19,50
8,85	1	M3	8,85
5,59	1	M3	5,59
5,59	1	M3	5,59
104,00	1	M3	104,00
5,59	1	M3	5,59
13,00	1	M3	13,00
4,55	1	M3	4,55
16,25	1	M3	16,25
47,36	1	M3	47,36
47,36	1	M3	47,36







VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO ACTA PARCIAL No 2**		CONTRATISTA DE OBRA: 		INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza 2023				
PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS		**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.						
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**		
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	3/11/2023			
CAPITULO N° 3 **CUBIERTA PRINCIPAL**	**SUB CAPITULO N°** 3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CUBIERTA PRINCIPAL		I.M 3.1.1	**EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.**			**UNIDAD**	M3	
				PASAN 1.180,81					

VoBo· CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orils Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo· CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

VALLEDUPAR EN ORDEN	**MEMORIAS DE CÁLCULO ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza Valledupar 2023	

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	3/11/2023	
CAPITULO N° 3 CUBIERTA PRINCIPAL	**SUB CAPITULO N°** 3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CUBIERTA PRINCIPAL	**ITEM:** 3.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m, MEDIDO EN SITIO.		**UNIDAD**	M3	

								VIENEN	1.160,81
ENTRE ETAPA 1 Y	VIGA (AM-A) DEL EJE 6 DE LA ETAPA 1 AL AL EJE 8 DE LA ETAPA 2	20	1	1,3	2	52,00	1	M3	52,00
	VIGA AMA-O	20	1	1,4	2	56,00	1	M3	56,00
	VIGA AMA-N	20	1	1,4	2	56,00	1	M3	56,00
	VIGA AM-DIAGONAL 2	28,7	1	1,65	1	47,36	1	M3	47,36
	VIGA AM-DIAGONAL 1	28,7	1	1,65	1	47,36	1	M3	47,36
	VIGA AM-B	5	1	1,3	5	32,50	1	M3	32,50
	VIGA AM-B	20	1	1,5	1	30,00	1	M3	30,00
		5	1	1,3	1	6,50	1	M3	6,50
		12,5	1	1,3	1	16,25	1	M3	16,25
EXCAVACION GENERAL					m2				
Corte de terreno desde la cota INICIAL DE TRRENO hasta +0.05 para capa de relleno seleccionado y placa de contrapiso				0,7	4818,98	3373,29	2	m3	6746,57
								TOTAL EJECUCION	8.253,34
								TOTAL ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	2.804,41
								CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL	90,79
								TOTAL PRESUP	2.895,20



VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

PROYECTO:	CONTRATANTE:	
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.5a5.358.402,00
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22
CAPITULO N°	**SUB CAPITULO N°**	
3 CUBIERTA PRINCIPAL	3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CUBIERTA PRINCIPAL	

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			
	AREA ZAPATA	AREA PEDESTAL	ALTO	AREA RELLENO
CUBIERTA PRINCIPAL				
EXCAVACIÓN ZAPATAS DE SUPER CUBIERTA	733.04		1	733,04
DEDUCCIONES — SOLADO Y ZAPATAS	2,5	2,5	0.8	5
PEDESTALES	0.75	0.75	1.15	0.646875

VIGAS DE CIMENTACIÓN		DIMENSIONES			
		LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD
EXCAVACIONES DE VIGAS DE AMARRES				1	771,73
ETAPA 1	VIGA (AM-A) DEL EJE 1 AL 6	5	0.35	0.4	5
	VIGA (AM-3) DEL EJE G AL H	5	0,35	0.4	1
	VIGA AM-5	20	0.35	0.6	1
		5	0.35	0.4	1
		12.5	0,35	0.4	1
	VIGA AM-5	5	0.35	0.4	5
	VIGA AM-D	4.3	0,35	0.4	1
	VIGA AM-D	5.81	0,35	0.4	1
		5	0,35	0.4	3
	VIGA AM-E	5.81	0,35	0.4	1
	VIGA AMA-E	4.3	0.35	0.4	1
	VIGA AMA- G	5	0.35	0.4	1
		3.8	0.35	0.4	1
	VIGA AM-H	4.3	0.35	0.4	1
	VIGA AM-1	5	0.35	0.4	16
	VIGA AM- 1	4.3	0.35	0.4	1
	VIGA (AM-H)	5	0.35	0.4	2
		3.8	0.35	0.4	1
	VIGA AMA-J	12.8	0.35	0.6	1
	VIGA AM-DIAGONAL 2	28.7	0.35	0.8	-
	VIGA AM-DIAGONAL 1	28.7	0,35	0.8	-

VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____


CONTRATISTA DE OBRA:	INTERVENTORIA:
	Consorcio Interplan 2022

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.

PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION	FECHA DEL ACTA	VERSION
24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION	3/11/2023	
[illegible]	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

ITEM:			
3.1.3	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO.	UNIDAD	M3

V. PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
733,04	1	M3	733,04
5,00	-55	M3	-275,00
0,65	-55	M3	-35,58
V. PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
771,73	1	M3	771,73
3,50	-1	M3	-3,50
0,70	-1	M3	-0,70
4,20	-1	M3	-4,20
0,70	-1	M3	-0,70
1,75	-1	M3	-1,75
3,50	-1	M3	-3,50
0,60	-1	M3	-0,60
0,95	-1	M3	-0,95
2,10	-1	M3	-2,10
0,95	-1	M3	-0,95
0,60	-1	M3	-0,60
0,70	-1	M3	-0,70
0,53	-1		-0,53
0,60	-1	M3	-0,60
11,20	-1	M3	-11,20
0,60	-1	M3	-0,60
1,40	-1	M3	-1,40
0,49	-1		-0,49
2,63	-1		-2,63
8,04	-1	M3	-8,04
8,04	-1		-8,04
		PASAN	3.140,80

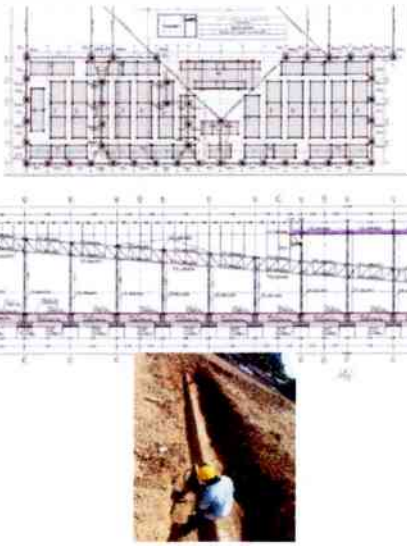

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORÍA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR				
CONTRATISTA DE OBRAS	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACION**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSIÓN**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.5o5.358.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**3/11/2023**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090 22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	**SUB CAPITULO N°**	**ITEM**		**UNIDAD**	M3
3 CUBIERTA PRINCIPAL	3,1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CUBIERTA PRINCIPAL	3.1.2	RELLENOS COMPACTADOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, SELECCIONADO, INCLUYE: COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO. MEDIDO EN SITIO.		

								VIENEN	1.140,40
NTRE ETAPA 1 Y	VIGA (AM-A) DEL EJE 6 DE LA ETAPA 1 AL AL EJE 5 DE LA ETAPA 2	20	0,35	0.6	2	8.40	-1	M3	-8,40
	VIGA AMA-O	20	0,35	0.6	2	8.40	-1		-8,40
	VIGA AMA-N	20	0,35	0.6	2	8.40	-1		-8,40
	VIGA AM-DIAGONAL 2	28.6	0,35	0.8	1	8.01	-1	M3	-8,01
	VIGA AM-DIAGONAL 1	28.6	0,35	0.8	1	8.01	-1		-8,01
	VIGA AM-6	5	0,35	0.4	5	3.50	-1	M3	-3,50
	VIGA AM-6	20	0,35	0.6	1	4.20	-1	M3	-4,20
		5	0,35	0.4	1	0.70	-1	M3	-0,70
		12,5	0,35	0.4	1	1.75	-1	M3	-1,75
			Aproxime Resultado a			Decimales		TOTAL	1.089,04
			TOTAL ACUMULADO ACTAS ANTERIORES						504,32
			CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL						12,70
								TOTAL PRESUP	516,82

VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq Orlis Villafaña Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ciro Piedrahita Cespedes
Firma

VALLEDUPAR EN ORDEN	**MEMORIAS DE CÁLCULO ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS		**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR				
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.545.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	

CAPITULO N°	**SUB CAPITULO N°**	**ITEM:**		
3 CUBIERTA PRINCIPAL	3,1 MOVIMIENTOS DE TIERRA CUBIERTA PRINCIPAL	3.1.3 CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3). MEDIDO EN SITIO.	**UNIDAD**	M3

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
MOVIMIENTOS DE TIERRAS								
EXCAVACIONES	8,251.34				8,251.34	1	m3/km	8,251.34
RELLENOS	1,089.04				1,089.04	1	m3/km	1,089.04
							TOTAL	7,162.30
							TOTAL ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	350.48
					CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL			2,027.90
							TOTAL PRESUP	2378.38






VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafaña Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO ACTA PARCIAL No 2**		CONTRATISTA DE OBRA: 		INTERVENTORÍA: Consorcio Interplaza			
PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS		**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.585.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**	
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**		
CAPITULO N° 3 CUBIERTA PRINCIPAL	**SUB CAPITULO N°** 3.3 ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS		**ITEM:** 3.3.1 CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH			**UNIDAD**	M2	

CUARTOS TECNICOS

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
CUBIERTA				6.646,20	6.646,20	1	M2	6646,20
Aproxima Resultado				2 Decimales		TOTAL EJECUTADO		6.646,20
Se recibe el suministro por el porcentaje del 76% de acuerdo al desgloce del unitario						76%		5.051,11
						TOTAL PRESUP		8.889,88

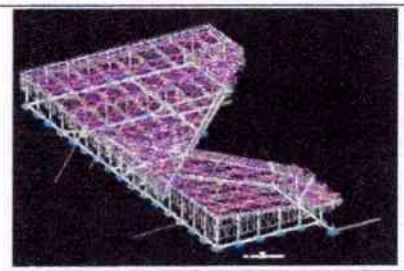



VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____


VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

VALLEDUPAR EN ORDEN	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46 565 358.402.00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3 206 361 090.22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	

CAPITULO N° 3 CUBIERTA PRINCIPAL	**SUB CAPITULO N°** 3.3 ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS	**ITEM:** 3.3.4	ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, PROTECCIÓN CONTRA CORROSION CON LIMPIEZA TIPO MECÁNICA SSPC SP-3, SOLDADURA WEST ARCO E70:18, LÁMINAS E=1", ANCLAJE SAE 1040 - L=50CM, CONECTORES Y ACABADO FINAL	**UNIDAD**	kg

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	DIÁMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD				
SUPERCUBIERTA								
SUPERCUBIERTA	fabricacion de Alma llena	301010.28			301010,28	1	KG	301010,28
ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MICROPERFORADOS		11423.00			11423.00	1	KG	11423.00
	Aproxima Resultado a			2 Decimales		TOTAL A EJECUTAR		312.433,28
	Cantidad Acumulada actas anteriores							186.626,37
	Se recibe porcentaje de avance del 32,25% de la cantidad actualizada a ejecutar				38,25%			119.516,56
						TOTAL PRESUP		402.740,43















VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____


VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ilva Piedrahita Cespedes
Firma_____

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	

CAPITULO N° 4 ZONAS EXTERIORES Y PAISAJISMO	**SUB CAPITULO N°** URBANISMO Y ZONAS EXTERIORES	**ITEM:** CONFORMACION Y NIVELACION EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.	**UNIDAD**	m3

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	[illegible]	ANCHO	ALTO	AREA				
CONFORMACION, AREA DE ADOQUINADO				5.880,15	5.880,15		M2	5880,15
RAMPAS EXTERIOR PROYECTO				23,04	23,04		M2	23,04
GRADAS INTERIOR PROYECTO				212,044	212,04		M2	212,044
ZONAS VERDES				3.666,59	3.666,59		M2	3666,59
RAMPAS INTERIOR PROYECTO				292,18	292,18		M2	292,18
ANDENES				979,58	979,58		M2	979,58
							TOTAL	11.053,58
					CANTIDAD ACUMULADA ACTAS ANTERIORES			5.277,75
					CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL			5.153,83
							TOTAL PRESUP	5.431,81

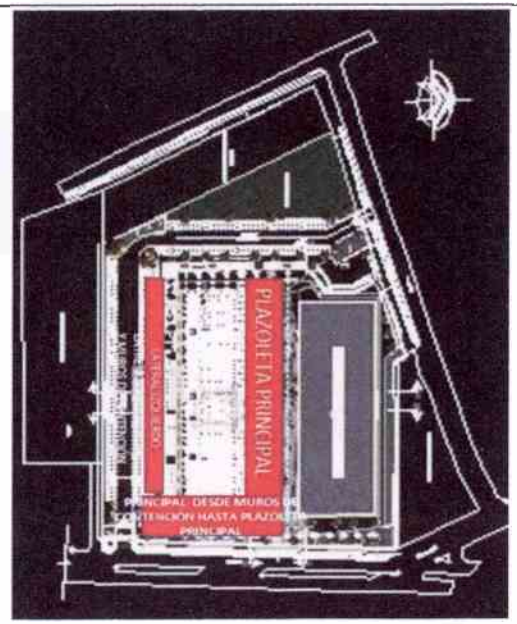

VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Delgadillo
Firma_____

VALLEDUPAR EN ORDEN

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza
Valledupar 2023

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS		**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 4 ZONAS EXTERIORES Y PAISAJISMO	**SUB CAPITULO N°** 4.1 URBANISMO Y ZONAS EXTERIORES	**ITEM:** 4.1.7	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PISOS DUROS PARA CIRCULACIONES EN CONCRETO F'C=3.000PSI, FUNDIDO EN SITIO, DE 15X45CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4X3/8" Y FLEJES DE 1/4"/20CM.			**UNIDAD**	ML

AREA O LUGAR		DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	ÁREA	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
KRA 7A-	REPOSICIÓN DE BORDILLOS POR INSTALACION DE ACOMETIDA SANITARIA	20,93				20,93	1	M2	20,93
					Aproxima Resultado	2 Decimales		TOTAL EJECUTADO	20,93
								TOTAL PRESUP	1.579,45







VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafaña Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:




INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** [illegible]	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 042-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.391.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 5 PARQUEADEROS	**SUB CAPITULO N°** 5.1 PARQUEADERO	**ITEM:** 5.1.1 CONFORMACION Y NIVELACION EN PLANTA DE LA ZONA A INTERVENIR. INCLUYE MANO DE OBRA. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS.				**UNIDAD**	M2

AREA O LUGAR		DIMENSIONES [illegible]	ANCHO	[illegible]	AREA	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
VIA INTERNA	AREA A CONFORMAR DE ACUERDO A LEVANTAMIENTO				7.056,75	7.056,75	1	M2	7056,75
				Aproxima Resultado		2 Decimales		TOTAL EJECUTADO	7.056,75
								TOTAL PRESUP	7.306,07

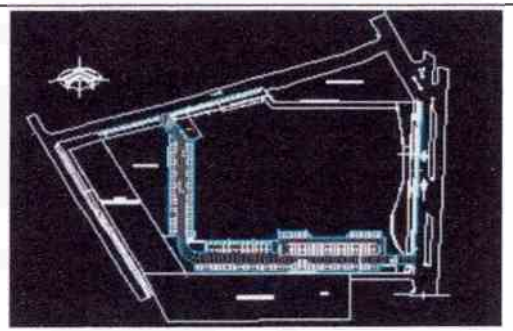





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villalaña Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ilsa Pedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:




INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS		OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	3/11/2023	
CAPITULO N° 5 PARQUEADEROS	**SUB CAPITULO N°** 5.1 PARQUEADERO	**ITEM:** 5.1.2 SUB BASE GRANULAR, CLASE C, ESPESOR 20 CM				**UNIDAD**	M3

AREA O LUGAR		DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	V. PARCIAL	% DE EJECUCIÓN	UNIDAD	TOTAL
VIA INTERNA	AREA A CONFORMAR DE ACUERDO A LEVANTAMIENTO								
Aproxima Resultado							TOTAL EJECUTADO		
				CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL					
							TOTAL PRESUP		1.461,39

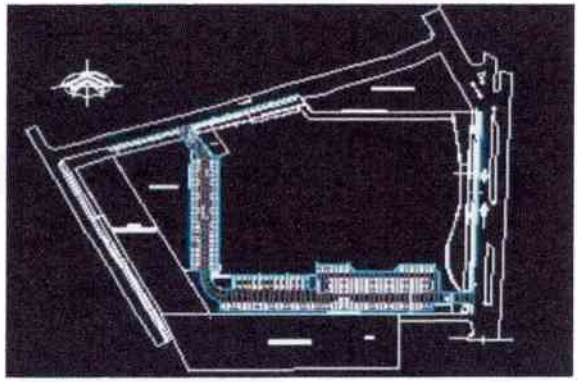





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafane Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza
Valledupar 2023

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. CESAR.				
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS					

CONTRATISTA DE OBRAS:	CONTRATO DE OBRA No.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION	FECHA DEL ACTA	VERSION
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	3/11/2023	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:		
5 PARQUEADEROS	5.1 PARQUEADERO	5.1.3 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4.2 E= 17 CM	UNIDAD	M2

AREA O LUGAR		DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	AREA	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
KRA 7A	REPOSICION DE PAVIMENTO POR INSTALACION DE ACOMETIDA SANITARIA 3 PLACAS DE PAVIMENTO				57,00	57,00	1	M2	57,00
								TOTAL EJECUTADO	57,00
								TOTAL PRESUP	7.308,97







VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ciro Piedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:


Consorcio Interplaza
Valledupar 2023

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**3/11/2023**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:		
5 PARQUEADEROS	5.1 PARQUEADERO	5.1.5 EXCAVACIÓN MANUAL, EN MATERIAL COMPACTADO CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0M, MEDIDO EN SITIO.	UNIDAD	M3

AREA O LUGAR	PERFIL	DIMENSIONES ABCISADO	DISTANCIA	AREA	VOLUMEN	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
VIA INTERNA	1	0,00		17,79					
			20		379,20	379,20	1		379,20
	2	20,00		20,13		-			0,00
			20		338,70	338,70	1		338,70
	3	40,00		13,74		-			0,00
			20		225,60	225,60	1		225,60
	4	60,00		8,82		-			0,00
			20		276,10	276,10	1		275,10
	5	80,00		16,69		-			0,00
			20		325,60	325,60	1		325,60
	6	100,00		13,87		-			0,00
			20		281,20	281,20	1		281,20
	7	120,00		14,25		-			0,00
			20		241,10	241,10	1		241,10
	8	140,00		9,86		-			0,00
			20		200,90	200,90	1		200,90
	9	160,00		10,23		-			0,00
			20		143,80	143,80	1		143,80
	10	180,00		4,15		-			0,00
			20		134,50	134,50	1		134,50
	11	200,00		9,3		-			0,00
			20		295,30	295,30	1		295,30
	12	220,00		20,23		-			0,00
			20		425,90	425,90	1		425,90
	13	240,00		22,36		-			0,00
			20		418,60	418,60	1		418,60
	14	260,00		19,52		-			0,00
			20		326,9	326,90	1		326,90
	15	280,00		13,17					

AREA O LUGAR	PERFIL	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	AREA				
SARDINELES	EXCAVACIÓN PARA SARDINEL	966,89	0,20	0,30		58,01	1	M2	58,01
					Aproxima Resultado	2 Decimales		TOTAL EJECUTADO	4.070,61
					CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL				53,69
								TOTAL PRESUP	53,69

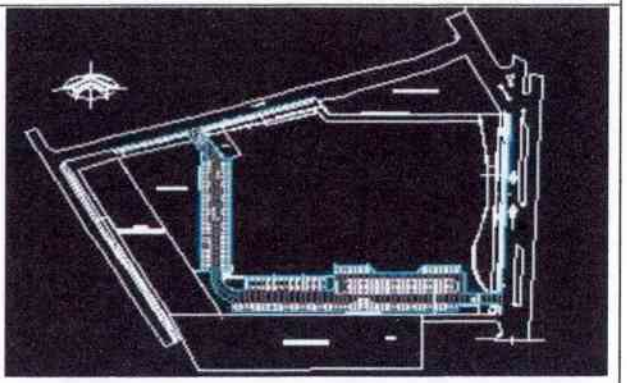





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:




INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza 2023

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.602,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 5 PARQUEADEROS	**SUB CAPITULO N°** 5.1 PARQUEADERO	**ITEM:** 5.1.7	ACERO DE REFUERZO PDR-60; FY=420 MPA PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.			**UNIDAD**	KG

PLACAS DE PAVIMENTO DE REPOSICIÓN POR INSTALACIONES SANITARIAS

AREA O LUGAR		DIMENSIONES DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
KRA 7A	REFUERZO LONGITUDINAL	1/2	0,99	4,00	22,00	87,47	1,00	KG	87,47
	REFUERZO TRASNVERSAL	1/2	0,99	5,00	17,00	84,49	1,00	KG	84,49
	ACERO DE TRANSFERENCIA	1"	3,78	0,35	20	26,53	3	KG	79,59
VIGAS DE CIMENTACIÓN									
VIA INTERNA	ACERO PARA TRANSFERENCIA Y ANCLAJES	1/4	0,25	6,00	1.100,00	1.650,00	1,00	KG	1650,00
		1/2	0,99	6,00	300,00	1.789,20	1,00	KG	1789,20
		1"	3,78	6,00	330,00	7.604,20	1,00	KG	7504,20
				Aproxima Resultado		2 Decimales		TOTAL	11.184,95
				CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A AVANCE DE OBRA			10%		1.119,50
								TOTAL PRESUP	18.487,24

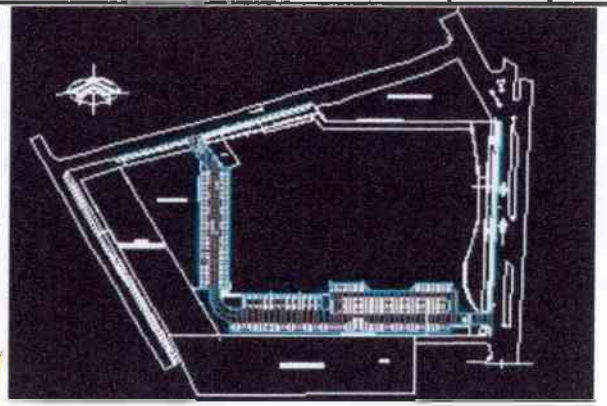



VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATIVO DE INTERVENTORIA
_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 6 CUARTOS TÉCNICOS	**SUB CAPITULO N°** 6.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 6.2.8	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.			**UNIDAD**	KG

VIGA CIMENTACION - CERRAMIENTO MAMPOSTERIA

AREA O LUGAR		DIMENSIONES DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
MURO DE CIERRE EN MAMPOSTERIA POR EL LADO NORTE	TRAMO 4 ARRIBA	5/8"	1.55	12	2	37.25	6	KG	223.49
	TRAMO 4 ABAJO	5/8"	1.55	4.55	2	14.12	6	KG	84.74
		5/8"	1.55	12	2	37.25	6	KG	223.49
		5/8"	1.55	4.55	2	14.12	6	KG	84.74
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1.2	90	60.48	6	KG	362.88
	TRAMO 3 ARRIBA	5/8"	1.55	0.7	2	2.17	1	KG	2.17
	TRAMO 3 ABAJO	5/8"	1.55	0.7	2	2.17	1	KG	2.17
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1.2	4	2.69	1	KG	2.69
	TRAMO 2 ARRIBA	5/8"	1.55	2.5	2	7.76	5	KG	38.80
	TRAMO 2 ABAJO	5/8"	1.55	2.5	2	7.76	5	KG	38.80
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1.2	15	10.08	5	KG	50.40
	TRAMO 1 ARRIBA	5/8"	1.55	7.45	2	23.12	5	KG	115.62
	TRAMO 1 ABAJO	5/8"	1.55	7.45	2	23.12	5	KG	115.62
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1.2	47	31.58	5	KG	157.92
MURO DE CIERRE EN MAMPOSTERIA POR EL LADO SUR		5/8"	1.55	12	2	37.25	11	KG	409.73
	TRAMO 1A ARRIBA	5/8"	1.55	4.6	2	14.80	11	KG	163.69
	TRAMO 1A ABAJO	5/8"	1.55	12	2	37.25	11	KG	409.73
		5/8"	1.55	4.6	2	14.80	11	KG	163.69
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1.2	98	84.51	11	KG	709.63

COLUMNETAS - CERRAMIENTO MAMPOSTERIA

AREA O LUGAR	DIMENSIONES DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
BARRA	3/8"	0.56	3.7	4	8.29	127	KG	1052.58
ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.75	20	3.75	127	KG	476.25
							PARAM	4888,23



VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Civil Piedad Maria Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza 2023

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**3/11/2023**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:			
6 CUARTOS TÉCNICOS	6.2 CIMENTACION ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	6.2.8	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	UNIDAD	KG


VIGA SUPERIOR - CERRAMIENTO MAMPOSTERIA

VIENEN 4889,23

AREA O LUGAR		DIMENSIONES DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
MURO DE CIERRE EN MAMPOSTERIA POR EL LADO NORTE	TRAMO 4 ARRIBA	3/8"	0.56	12	2	13.44	6	KG	80.64
		3/8"	0.56	4.2	2	4.70	6	KG	28,22
	TRAMO 4 ABAJO	3/8"	0.56	12	2	13.44	6	KG	80.64
		3/8"	0.56	4.2	2	4.70	6	KG	28,22
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.75	90	16.88	6	KG	101,25
	TRAMO 3 ARRIBA	3/8"	0.56	0,7	2	0.78	1	KG	0,78
	TRAMO 3 ABAJO	3/8"	0.56	0.7	2	0.78	1	KG	0,78
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.75	4	0.75	1	KG	0,75
	TRAMO 2 ARRIBA	3/8"	0.56	2.5	2	2.80	5	KG	14,00
	TRAMO 2 ABAJO	3/8"	0.56	2.5	2	2.80	5	KG	14,00
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.75	15	2.81	5	KG	14,06
	TRAMO 1 ARRIBA	3/8"	0.56	7.45	2	8.34	5	KG	41,72
	TRAMO 1 ABAJO	3/8"	0.56	7.45	2	8.34	5	KG	41,72
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.75	47	8.81	5	KG	44,06
MURO DE CIERRE EN MAMPOSTERIA POR EL LADO SUR	TRAMO 1A ARRIBA	3/8"	0.56	12	2	13.44	11	KG	147,84
		3/8"	0.56	4.45	2	4.98	11	KG	54,82
	TRAMO 1A ABAJO	3/8"	0.56	12	2	13.44	11	KG	147,84
		3/8"	0.56	4.45	2	4.98	11	KG	54,82
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.75	96	18.00	11	KG	198.00

VIGA CIMENTACION - CERRAMIENTO TUBULAR

AREA O LUGAR		DIMENSIONES DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	TRAMO 1 ARRIBA	5/8"	1.55	12	3	55.87	2	KG	111,74
		5/8"	1.55	7.15	3	33.29	2	KG	66.58
	TRAMO 1 ABAJO	5/8"	1.55	12	3	37.25	2	KG	74,50
		5/8"	1.55	7.15	2	22.19	2	KG	44,39
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	100	56.00	2	KG	112,00
	TRAMO 2 ARRIBA	5/8"	1.55	12	3	55.87	1	KG	55.87
		5/8"	1.55	5.05	2	15.68	1	KG	15,68
	TRAMO 2 ABAJO	5/8"	1.55	12	2	37.25	2	KG	74,50
		5/8"	1.55	5,05	2	15.68	2	KG	31,35
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	164	91.84	1	KG	91.84
	TRAMO 3 ARRIBA	5/8"	1.55	7.4	2	22.97	1	KG	22,97
	TRAMO 3 ABAJO	5/8"	1.55	7.4	2	22.97	1	KG	22,97
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	47	26.32	1	KG	26,32
	TRAMO 4A ARRIBA	5/8"	1.55	11	3	51.22	1	KG	51,22
	TRAMO 4A ABAJO	5/8"	1.55	11	2	34.14	1	KG	34,14
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	72	40.32	1	KG	40,32
								PARAN	4998,90

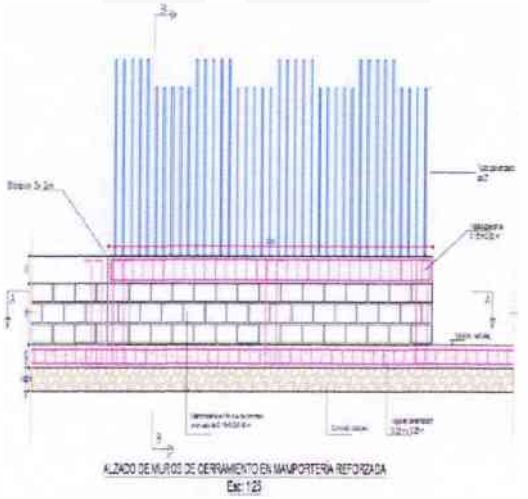

ALZADO DE MUROS DE CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA REFORZADA
Esc: 1:25

VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Redondo Redondo
Firma

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

PROYECTO:	CONTRATANTE:	
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SUP DE 2023	$ 46.565.358.402,00
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	040-SOP DE 2023	$ 3.206 361 090 22
CAPITULO N°	**SUB CAPITULO N°**	
6 CUARTOS TÉCNICOS	6.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	

MURO DE CIERRE EN TUBO ENTRADA PRINCIPAL	TRAMO 4B ARRIBA	5/8"	1.55	8.9	3
	TRAMO 4B ABAJO	5/8"	1.55	8.9	2
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	57
	TRAMO 4C ARRIBA	5/8"	1.55	8,35	3
	TRAMO 4C ABAJO	5/8"	1.55	8.35	2
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	54
	TRAMO 4D ARRIBA	5/8"	1.55	7.8	3
	TRAMO 4D ABAJO	5/8"	1.55	7.8	2
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	51
	TRAMO 4E ARRIBA	5/8"	1.55	6	3
	TRAMO 4E ABAJO	5/8"	1.55	6	2
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	38
	TRAMO 4F ARRIBA	5/8"	1.55	12	6
		5/8"	1.55	5.55	3
	TRAMO 4F ABAJO	5/8"	1.55	12	4
		5/8"	1.55	5.55	2
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	187
	TRAMO 4G ARRIBA	5/8"	1.55	8.4	3
	TRAMO 4G ABAJO	5/8"	1.55	8.4	2
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	54
	TRAMO 4H ARRIBA	5/8"	1.55	12	3
		5/8"	1.55	2.3	3
	TRAMO 4H ABAJO	5/8"	1.55	12	2
		5/8"	1.55	2.3	2
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	68
	TRAMO 4I ARRIBA	5/8"	1.55	12	3
		5/8"	1.55	2.45	3
	TRAMO 4I ABAJO	5/8"	1.55	12	2
		5/8"	1.55	2.45	2
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	88
	TRAMO 4J ARRIBA	5/8"	1.55	12	6
		5/8"	1.55	5.5	3
	TRAMO 4J ABAJO	5/8"	1.55	12	4
		5/8"	1.55	5.5	2
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	111
		5/8"	1.55	12	3
	TRAMO 1 ARRIBA	5/8"	1.55	7.75	3
	[illegible]	5/8"	1.55	12	2
		5/8"	1.55	7.75	2
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	105
	TRAMO 2 ARRIBA	5/8"	1.55	4.8	3
	TRAMO 2 ABAJO	5/8"	1.55	4.8	2
	ESTRIBOS	3/8"	0.56	1	31

VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.

PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION	FECHA DEL ACTA	VERSION
24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION	3/11/2023	
24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

ITEM:			
6.2.8	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	UNIDAD	KG

		VIENEN	8650,80
41,44	1	KG	41,44
27,63	1	KG	27,63
31,92	1	KG	31,92
38,88	1	KG	38,88
25,92	1	KG	25,92
30,24	1	KG	30,24
36,32	1	KG	36,32
24,21	1	KG	24,21
28,56	1	KG	28,56
27,94	1	KG	27,94
18,62	1	KG	18,62
21,28	1	KG	21,28
111,74	1	KG	111,74
25,84	1		25,84
74,50	1	KG	74,50
17,23	1		17,23
104,72	1	KG	104,72
39,11	1	KG	39,11
26,07	1	KG	26,07
30,24	1	KG	30,24
55,87	1	KG	55,87
10,71	1		10,71
37,25	1	KG	37,25
7,14	1		7,14
46,28	1	KG	46,28
55,87	1	KG	55,87
11,41	1		11,41
37,25	1	KG	37,25
7,60	1		7,60
49,84	1	KG	49,84
111,74	2	KG	223,49
25,61	2		51,22
74,50	2	KG	148,99
17,07	2		34,14
62,16	2	KG	124,32
55,87	2	KG	111,74
36,08	2	KG	72,17
37,25	2	KG	74,50
24,06	2	KG	48,11
58,80	2	KG	117,60
22,35	1	KG	22,35
14,90	1	KG	14,90
17,36	1	KG	17,36
		PASAN	9025,31

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma

VALLEDUPAR

MEMORIAS DE CALCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	013-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	3/11/2023	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:			
6 CUARTOS TÉCNICOS	CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	6.2.8	ACERO DE REFUERZO PDR-60; F'Y=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	UNIDAD	KG

AREA O LUGAR		DIMENSIONES DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
								VIENEN	
MURO DE CIERRE EN TUBO ENTRADA POSTERIOR	TRAMO 3 ARRIBA	5/8"	1.55				6	KG	278.36
		5/8"	1.55		3		6		169.94
	TRAMO 3 ABAJO	5/8"	1.55	12	2			KG	186.24
		5/8"	1.55		2				113.30
	ESTRIBOS	3/8"	0.56		102				285.60
	TRAMO 4 ARRIBA	5/8"	1.55		2	27.00		KG	27.00
	TRAMO 4 ABAJO	5/8"	1.55		2	27.00		KG	27.00
	ESTRIBOS	3/8"	0.56		87	32.48		KG	32.48
	TRAMO 5 ARRIBA	1/2"	0.99		3	25.05		KG	25.05
	TRAMO 5 ABAJO	1/2"	0.99		2	16.70		KG	16.70
	ESTRIBOS	3/8"	0.56		97	30.80		KG	30.80
	[illegible]	5/8"	1.55	12	3	55.87		KG	[illegible]
		5/8"	1.55		3	[illegible]			156.44
	TRAMO 6 ABAJO	5/8"	1.55		2	37.35		KG	148.99
		5/8"	1.55		2	26.07			104.28
	ESTRIBOS	3/8"	0.56		97	54.32		KG	217.28

VIGA SUPERIOR - CERRAMIENTO TUBULAR

AREA O LUGAR		DIMENSIONES DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	TRAMO 1 ARRIBA	3/8"	0.56	12	2	13.44	2	KG	26.88
		3/8"	0.56	7	2	7.84	2	KG	15.68
	TRAMO 4A ABAJO	3/8"	0.56	12	2	13.44	2	KG	26.88
		3/8"	0.56	7	2	7.84	2	KG	15.68
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.75	91	17.06	2	KG	34.13
	TRAMO 2 ARRIBA	3/8"	0.56	7.6	2	8.51	1	KG	8.51
	TRAMO 2 ABAJO	3/8"	0.56	7.6	2	8.51	1	KG	8.51
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.75	36	6.75	1	KG	6.75
	TRAMO 3 ARRIBA	3/8"	0.56	7.4	2	8.29	1	KG	8.29
	TRAMO 3 ABAJO	3/8"	0.56	7.4	2	8.29	1	KG	8.29
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.75	36	6.75	1	KG	6.75
	TRAMO 4A ARRIBA	3/8"	0.56	11	2	12.32	1	KG	12.32
	TRAMO 4A ABAJO	3/8"	0.56	11	2	12.32	1	KG	12.32
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.8	43	8.60	1	KG	8.60
	TRAMO 4B ARRIBA	3/8"	0.56	8.9	2	9.97	1	KG	9.97
	TRAMO 4B ABAJO	3/8"	0.56	8.9	2	9.97	1	KG	9.97
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.8	43	8.60	1	KG	8.60
	TRAMO 4C ARRIBA	3/8"	0.56	8.35	2	9.35	1	KG	9.35
	TRAMO 4C ABAJO	3/8"	0.56	8.35	2	9.35	1	KG	9.35
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.8	40	8.00	1	KG	8.00
	TRAMO 4D ARRIBA	3/8"	0.56	7.8	2	8.74	1	KG	8.74
	TRAMO 4D ABAJO	3/8"	0.56	7.8	2	8.74	1	KG	8.74
	ESTRIBOS	1/4"	0.25	0.8	38	7.60	1	KG	7.60
MURO DE [illegible]								PASAN	11349,19

VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Céspedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA** / **VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**
CAPITULO N° 6 CUARTOS TÉCNICOS	**SUB CAPITULO N°** 6.2 CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 6.2.8 ACERO DE REFUERZO PDR-60: F'Y=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.			**UNIDAD**	KG

									VIENEN	11346,18
TUBO ENTRADA PRINCIPAL	TRAMO 4E ARRIBA			6	2				KG	6,72
	TRAMO 4E ABAJO	3/8"		6	2				KG	6,72
	ESTRIBOS				28	5,60			KG	5,60
	TRAMO 4F ARRIBA					26,88			KG	
		3/8"			2	6,05				6,05
	TRAMO 4F ABAJO	3/8"		12		26,88			KG	26,88
		3/8"			2	6,05				6,05
	ESTRIBOS	1/4"			91	20,48			KG	
	TRAMO 4G ARRIBA	3/8"			2	5,04			KG	5,04
	TRAMO 4G ABAJO	3/8"			2	5,04			KG	5,04
	ESTRIBOS	1/4"							KG	
	TRAMO 4H ARRIBA	3/8"	0,56	9,45	2				KG	10,58
	TRAMO 4H ABAJO	1/4"		8,45	2				KG	10,58
	ESTRIBOS	1/4"							KG	9,20
	TRAMO 4I ARRIBA	3/8"		12					KG	13,44
		3/8"		2,3						2,58
	TRAMO 4I ABAJO	3/8"		12					KG	13,44
		3/8"								2,58
	ESTRIBOS	1/4"							KG	13,40
	TRAMO 4J ARRIBA	3/8"		12	2		2		KG	26,88
		3/8"		5,5	2		2			12,32
	TRAMO 4J ABAJO	3/8"		12	2		2		KG	26,88
		3/8"		5,5	2	6,16	2			12,32
	ESTRIBOS	1/4"				16,60			KG	33,20
		3/8"		12	2		2		KG	
MURO DE CIERRE EN TUBO ENTRADA POSTERIOR	TRAMO 1 ARRIBA	3/8"			2	8,51	2		KG	17,02
	TRAMO 4a ABAJO	3/8"			2		2		KG	26,88
		3/8"					2		KG	16,13
	ESTRIBOS	1/4"				18,80	2		KG	37,60
	TRAMO 2 ARRIBA	3/8"			2				KG	5,38
	TRAMO 2 ABAJO	3/8"							KG	5,38
	ESTRIBOS	1/4"							KG	4,60
	TRAMO 3 ARRIBA	3/8"					5		KG	67,20
					2	4,01	5			40,04
	TRAMO 3 ABAJO	3/8"			2				KG	67,20
		3/8"			2		5			40,04
	ESTRIBOS	1/4"			35		5		KG	35,00
	TRAMO 4 ARRIBA	3/8"			2				KG	9,74
	TRAMO 4 ABAJO	3/8"			2				KG	9,74
	ESTRIBOS	1/4"			42				KG	8,40
	TRAMO 6BARRIBA	3/8"		10,5	2				KG	11,76
	TRAMO 6B ABAJO	3/8"		10,5	2				KG	11,76
	ESTRIBOS	1/4"			52				KG	10,40
									PASAN	13107,38

VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Otilis Villafañe Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Ciro Piedrahita Lasprilla
Firma

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza 2023

PROYECTO:	CONTRATANTE:		OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-GOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	3/11/2023	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-GOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:			
6 CUARTOS TECNICOS	CIMENTACION, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	6.2.8	ACERO DE REFUERZO PDR-60; FY=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	UNIDAD	KG

								VIENEN	12107,38
TRAMO 5C ARRIBA	3/8"	0,56	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]		KG	26,88
	3/8"	0,56	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]			18,70
TRAMO 5c ABAJO	3/8"	0,56	12	2	[illegible]	[illegible]		KG	[illegible]
	3/8"	0,56	9,35	2	9,35	2			18,70
ESTRIBOS	1/4"	0,25	[illegible]	97	19,40	[illegible]		KG	35,80
TRAMO 6AARRIBA	3/8"	0,56	12	2	[illegible]	[illegible]		KG	13,44
	3/8"	0,56	9,35	2	10,47	[illegible]			10,47
TRAMO 6A ABAJO	3/8"	0,56	12	2	[illegible]	[illegible]		KG	[illegible]
	3/8"	0,56	9,35	2	10,47	[illegible]			10,47
ESTRIBOS	1/4"	0,25	0,8	102	20,40	[illegible]		KG	20,40
			Aproxima Resultado a		2 Decimales			TOTAL A EJECUTAR	12.365,58
			porcentaje de avance del 71% de la cantidad a ejecutar					71%	8.738,96
								TOTAL PRESUP	24.087,20


VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____


VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 7 TANQUE SUBTERRANEO	**SUB CAPITULO N°** 7.2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 7.2.1 CONCRETO PARA SOLADOS E=5.0cmts, f'c=2.500 PSI.				**UNIDAD**	m3

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
AREA TANQUE AGUA	17.80	10,80	0,10	1.00	19.22	1	M3	19,22
							TOTAL	19,22
					CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL			5.43
							TOTAL PRESUP	5,43









VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villalaña Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CALCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:





INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS		**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 7 TANQUE SUBTERRANEO	**SUB CAPITULO N°** 7.2 CIMENTACIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 7.2.2	CONCRETO F'C=4000PSI IMPERMEABILIZADO PARA LOSA DE FONDO, MUROS Y LOSA SUPERIOR, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO			**UNIDAD**	m3

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
LOSA DE FONDO								
LOSA DE FONDO - AREA 1	16,80	3,73	0,30	1,00	18,77	1,00	M3	18,77
LOSA DE FONDO - AREA 2	16,80	0,71	0,30	1,00	3,58	1,00	M3	3,58
LOSA DE FONDO - AREA 3	16,80	5,70	0,30	1,00	28,73	1,00	M3	28,73
					-1,26			-1,26
MURO 13	16,80		0,30		-1,51	1,00	M3	-1,51
MUROS Y MEDIA CAÑA								
MT1 - AL 3.7M	0,30	3,90	3,70	2,00	8,66	1,00	M3	8,66
MT1 - AL 3.7M-3.2M	0,30	0,50	3,45	2,00	1,04	1,00	M3	1,04
MT1 - AL 3.2M	0,30	6,00	3,20	2,00	11,52	1,00	M3	11,52
MT2 - AL 3.7M	0,30	0,80	3,70	2,00	1,78	1,00	M3	1,78
MT2 - AL 3.7M-3.2M	0,30	0,50	3,45	2,00	1,04	1,00	M3	1,04
MT2 - AL 3.2M	0,30	6,00	3,20	2,00	11,52	1,00	M3	11,52
MT3	16,80	0,3	3,7	2	37,30	1,00	M3	37,30
MT4	16,80	0,3	3,2	1	16,13	1,00	M3	16,13
MEDIA CAÑA	75,66	0,25	0,25	1	2,36	1,00	M3	2,36
							TOTAL	138,64
			CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL					124,00
							TOTAL PRESUP	124,00









VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____


VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

VALLEDUPAR EN ORDEN	**MEMORIAS DE CÁLCULO ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	

CAPITULO N° 7 TANQUE SUBTERRANEO	**SUB CAPITULO N°** 7.2 CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	**ITEM:** 7.2.7 CINTA PVC O-22 PARA JUNTAS DE TANQUES		**UNIDAD**	ML

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
MURO T1	10.50			2.00	21.00		ML	
MURO T2	7.70			2.00	15.40		ML	
MURO T3	17.50			2.00	35.00		ML	
MURO T4	17.50			1.00	17.50		ML	
TRASLAPOS	0.40			6.00	2.40			
				Aproxima Resultado a	2 Decimales			
			CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL					
							TOTAL PRESUP	

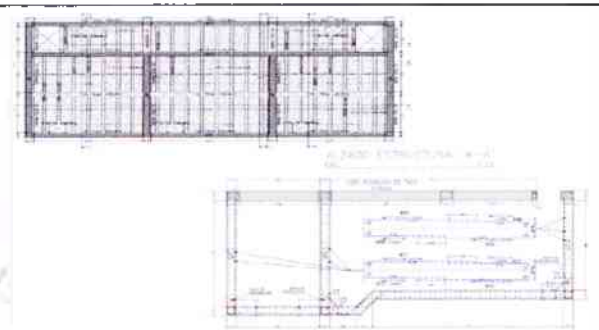



VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Civ. Piedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:


Consorcio Interplaza

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	041-SOP DE 2023	$ 46.545.358.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**3/11/2023**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:		
7 TANQUE SUBTERRANEO	CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACEROS DE REFUERZO	7.2.8	ACERO DE REFUERZO FDR-60; FY=420 MPA PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN.	UNIDAD KG

ACCESO AL TANQUE

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD				
ESCALERA-MT04	1"	3,97	1,1	42	83,414	1	KG	183,41
VIGAS								
AREA O LUGAR	**DIMENSIONES**				**V. PARCIAL**	**N° DE ELEMENTO**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	DIAMETRO	**PESO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**				
REF LOGITUDINAL SUPERIOR - TNQ1	5/8"	1,552	18,6	2	57,7344		KG	173,20
REF LOGITUDINAL INFERIOR - TNQ1	5/8"	1,552	18,6	2	57,7344		KG	173,20
REF TRANSVERSAL - TNQ1	3/8"	0,66	1,2	156	104,16		KG	312,48
REF LOGITUDINAL SUPERIOR - TNQ2	5/8"	1,552	38,6	2	119,8144		KG	119,81
REF LOGITUDINAL INFERIOR - TNQ2	5/8"	1,552	38,6	2	119,8144		KG	119,8
REF TRANSVERSAL - TNQ2	3/8"	0,66	1,2	155	104,16		KG	104,16
REF LOGITUDINAL SUPERIOR - TNQ3	5/8"	1,552	10,75	2	33,368		KG	133,47
REF LOGITUDINAL INFERIOR - TNQ3	5/8"	1,552	10,75	2	33,368		KG	133,47
REF TRANSVERSAL - TNQ3	3/8"	0,66	1,2	86	67,12		KG	228,48
REF LOGITUDINAL SUPERIOR - VTA-T1	1/2"	0,994	10,65	2	21,1722		KG	296,41
REF LOGITUDINAL INFERIOR - VTA-T1	1/2"	0,994	10,65	2	21,1722		KG	296,41
REF TRANSVERSAL - VTA-T1	3/8"	0,56	0,78	85	37,128		KG	519,79
REF LOGITUDINAL SUPERIOR - VTA-T2	1/2"	0,994	9,45	2	18,7866		KG	37,57
REF LOGITUDINAL INFERIOR - VTA-T2	1/2"	0,994	9,45	2	18,7866		KG	37,57
REF TRANSVERSAL - VTA-T2	3/8"	0,56	0,78	79	34,5072		KG	69,01
REF LOGITUDINAL SUPERIOR - VTA-T3		0,994		2	15,7052		KG	47,12
REF LOGITUDINAL INFERIOR - VTA-T3		0,994		2	15,7052		KG	
REF TRANSVERSAL - VTA-T3	3/8		0,78	60	26,208		KG	78,62
REF LOGITUDINAL SUPERIOR - VTA-T4	1/2"	0,994	9,45	2	18,7866	2	KG	37,57
REF LOGITUDINAL INFERIOR - VTA-T4	1/2"	0,994		2	18,7866	2	KG	37,57
REF TRANSVERSAL - VTA-T4	3/8"	0,56	0,78	78	34,0704	2	KG	68,14
REF LOGITUDINAL SUPERIOR - VTA-T5	1/2"	0,994		2	13,3196		KG	13,32
REF LOGITUDINAL INFERIOR - VTA-T5	1/2"	0,994		2	13,3196		KG	13,32
REF TRANSVERSAL - VTA-T5	3/8"	0,56	0,78		23,5872		KG	23,59
REF LOGITUDINAL SUPERIOR - VTA-T6		0,994		2	3,5784	5	KG	17,89
REF LOGITUDINAL INFERIOR - VTA-T6	1/2"	0,994		2	3,5784	5	KG	17,89
REF TRANSVERSAL - VTA-T6	3/8"	0,56	0,78	14	6,1152	5	KG	30,58
REF LOGITUDINAL SUPERIOR - VTA-T7	1/2"	0,994		2	6,7592	2	KG	13,52
REF LOGITUDINAL INFERIOR - VTA-T7	1/2"	0,994		2	6,7592	2	KG	13,52
REF TRANSVERSAL - VTA-T7	3/8"	0,56	0,78	25	10,92	2	KG	21,84
								3419,88





VoBo CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Sara Blanquicett Cespedes
Firma_____

MURO

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			
	DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD
MURO T1 REF FRONTAL - MT21	[illegible]	0,994	3,85	40
MURO T1 REF POSTERIOR - MT22	1/2"	0,994	3,85	40
MURO T1 REF FRONTAL - MT23	1/2"	0,994	4,15	4
MURO T1 REF POSTERIOR - MT24	1/2"	0,994	4,15	4
MURO T1 REF FRONTAL - MT25	1/2"	0,994	4,35	26
MURO T1 REF POSTERIOR - MT26	1/2"	0,994	4,35	26
MURO T1 REF SUPERIOR - MT27	1/2"	0,994	10,8	19
MURO T1 REF INFERIOR - MT28	1/2"	0,994	10,8	19
MURO T1 REF SUPERIOR - MT29	1/2"	0,994	4,75	5
MURO T1 REF INFERIOR - MT30	1/2"	0,994	4,75	5
MURO T2 REF SUPERIOR - MT35	1/2"	0,994	8,05	19
MURO T2 REF INFERIOR - MT36	1/2"	0,994	8,05	19
MURO T2 REF SUPERIOR - MT37	1/2"	0,994	1,95	5
MURO T2 REF INFERIOR - MT38	1/2"	0,994	1,95	5
MURO T2 REF FRONTAL - MT39	1/2"	0,994	4,35	6
MURO T2 REF POSTERIOR - MT40	1/2"	0,994	4,35	6
MURO T2 REF FRONTAL - MT41	1/2"	0,994	4,15	4
MURO T2 REF POSTERIOR - MT42	1/2"	0,994	4,15	4
MURO T2 REF SUPERIOR - MT43	1/2"	0,994	3,85	40
MURO T2 REF INFERIOR - MT44	1/2"	0,994	3,85	40
MURO T3 REF FRONTAL - MT05	1/2"	0,994	4,35	112
MURO T3 REF POSTERIOR - MT06	1/2"	0,994	4,35	112
MURO T3 REF SUPERIOR - MT11	1/2"	0,994	12	22
MURO T3 REF SUPERIOR - MT12	1/2"	0,994	6,65	22
MURO T3 REF INFERIOR - MT13	1/2"	0,994	6,65	22
MURO T3 REF INFERIOR - MT14	1/2"	0,994	12	22
MURO T4 REF SUPERIOR - MT07	1/2"	0,994	12	19
MURO T4 REF SUPERIOR - MT08	1/2"	0,994	6,65	19
MURO T4 REF INFERIOR - MT09	1/2"	0,994	6,65	19
MURO T4 REF INFERIOR - MT10	1/2"	0,994	12	19
MURO T4 REF FRONTAL - MT15	1/2"	0,994	3,85	112
MURO T4 REF POSTERIOR - MT16	1/2"	0,994	3,85	112

LOSA DE FONDO

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			
	DIAMETRO	PESO	LONGITUD	CANTIDAD
REF MEDIA CAÑA - MT01	3/8"	0,56	0,97	516
REF MEDIA CAÑA - MT02	1/2"	0,994	1,30	516
REF ESQUINA TANQUE - MT03	1/2"	0,994	0,75	187
LOSA DE FONDO REF SUPERIOR - MT17	1/2"	0,994	1,45	116
LOSA DE FONDO REF SUPERIOR - MT18	1/2"	0,994	10,9	116
LOSA DE FONDO REF INFERIOR - MT19	1/2"	0,994	10,9	116
LOSA DE FONDO REF INFERIOR - MT20	1/2"	0,994	1,45	116
LOSA DE FONDO REF SUPERIOR - MT31	1/2"	0,994	11,2	74
LOSA DE FONDO REF SUPERIOR - MT32	1/2"	0,994	7,3	74
LOSA DE FONDO REF INFERIOR - MT33	1/2"	0,994	7,3	70
LOSA DE FONDO REF INFERIOR - MT34	1/2"	0,994	11,2	70
LOSA DE FONDO REF SUPERIOR - MC01	1/2"	0,994	8,05	12

LOSA SUPERIOR

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			
	DIAMETRO	PESO	AREA	CANTIDAD
MALLA 5MM - C/.15M (M131)	5MM	2,078014184	174,72	1


Cantidad Resultado	
Cantidad Acumulada actas anteriores	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	


VoBo CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Otilis Villafañe Cadrazco
Firma_____

V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
153.076	2	KG	306.15
153.076	2	KG	306.15
16.5004	2	KG	33.00
16.5004	2	KG	33.00
112.4214	2	KG	224.84
112.4214	2	KG	224.84
203.9688	2	KG	407.94
203.9688	2	KG	407.94
23.6075	2	KG	47.22
23.6075	2	KG	47.22
152.0323	2	KG	304.06
152.0323	2	KG	304.06
9.6915	2	KG	19.38
9.6915	2	KG	19.38
25.9434	2	KG	51.89
25.9434	2	KG	51.89
16.5004	2	KG	33.00
16.5004	2	KG	33.00
153.076	2	KG	306.15
153.076	2	KG	306.15
484.2768	2	KG	968.55
484.2768	2	KG	968.55
262.416	2	KG	524.83
145.4222	2	KG	290.84
145.4222	2	KG	290.84
262.416	2	KG	524.83
226.632	1	KG	226.63
125.5919	1	KG	125.59
125.5919	1	KG	125.59
226.632	1	KG	226.63
428.6128	1	KG	428.61
428.6128	1	KG	428.61

V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
280.2912	1	KG	280.29
666.7752	1	KG	666.78
146.8635	1	KG	146.86
165.7495	1	KG	165.75
1245.979	1	KG	1245.98
1245.979	1	KG	1245.98
165.7495	1	KG	165.75
823.8272	1	KG	823.83
536.9588	1	KG	536.96
507.934	1	KG	507.93
779.296	1	KG	779.30
96.0204	1	KG	96.02

V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
363.070638	[illegible]	KG	363.07
		TOTAL	19.041.79
			13.519.67
			5.522.12
		TOTAL PRESUP	18.389.57

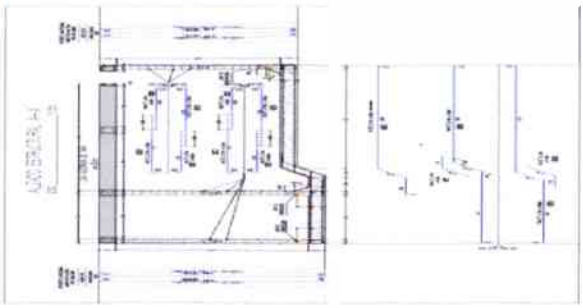

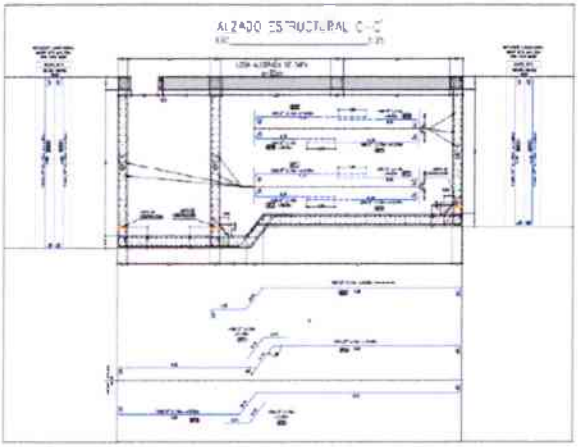



VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Civil Piedrahita Cespedes
Firma

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:




INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza
Vallelunar 2023

PROYECTO:	CONTRATANTE:	OBJETO DEL CONTRATO. CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO.**	**FECHA DE FINALIZACION**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.565.358.402,00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO.**	**FECHA DE FINALIZACION**	**3/11/2023**	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:		
10 RAMPA EXTERIOR Y ESCALERAS	RAMPA EXTERIOR Y ESCALERA	10.1.4 MURO DE CONTENCION EN CONCRETO F'C=3000PSI, INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y CURADO	UNIDAD	M3

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
MUROS TIPO 1							
		Promedio Vastago					
De la absc- 395 a la 451,46 incluye los muros interiores para la conformacion de las rampasa y las escaleras	60,78		0,2	0	1	M3	16,156
		Promedio Zapata de Muro					
	60,78		0,24	0	1	M3	19,3872
MUROS TIPO 2							
		Promedio Vastago					
De la absc- 0 a la 25 y de la 355 a la 395 incluye los muros interiores para la conformación de las rampasa y las escaleras	89,3		0,26	0	1	M3	23,218
		Promedio Zapata de Muro					
	89,3		0,27	0	1	M3	24,111
MUROS TIPO 3							
		Promedio Vastago					
De la absc- 65 a la 260 incluye los muros interiores para la conformación de las rampasa y las escaleras	344,07		0,54	0	1	M3	185,7978
		Promedio Zapata de Muro					
	344,07		0,82	0	1	M3	282,1374
MUROS TIPO 4							
		Promedio Vastago					
De la absc- 25 a la 65 y de la 260 a la 355 incluye los muros interiores para la conformación de las rampasa y las escaleras	166,6		0,32	0	1	M3	53,312
		Promedio Zapata de Muro					
	166,6		0,32	0	1	M3	53,312
						TOTAL	857,43
			CANTIDAD A COBRAR PRESENTE ACTA, DE ACUERDO A CANTIDAD CONTRACTUAL				5,64
						TOTAL PRESUP	5,64

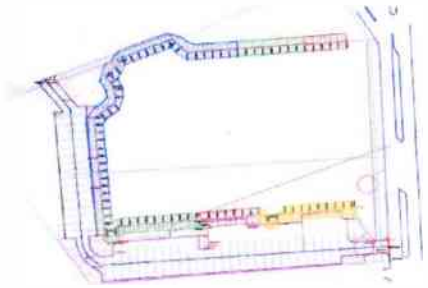





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Otra Piedrahita Cesendes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:




INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO: [illegible]	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.5e5.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**SUB CAPITULO N°** 11.2 RED DESAGUE AGUA RESIDUALES	**ITEM:** 11.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"				**UNIDAD**	ML

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
ACOMETIDAS INTERNAS								
Tuberia sanitaria pvc de 4" de la CJ-8 a la CJ-9	[illegible]			1	49,95	1	ML	49,95
Tuberia sanitaria pvc de 4" de la CJ-26 AL PZ-27	[illegible]			1	12,00	1		12,00
								0,00
				Aproxima Resultado	2 Decimales		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	61,95
							TOTAL PRESUP	175,00

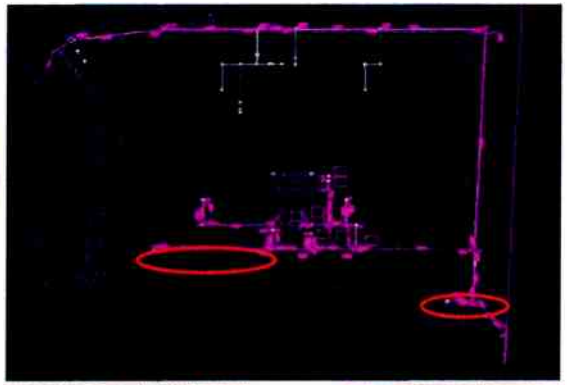





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cepedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:




INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS		**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR				
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.365.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	3/11/2023	
CAPITULO N° 11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**SUB CAPITULO N°** [illegible] RED DESAGUE AGUA RESIDUALES		**ITEM:** 11.2.13 CONEXIÓN RED SANITARIA A POZO EXISTENTE			**UNIDAD**	UND

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	[illegible]
KRA 7A								
CONEXIÓN DE MANHOL NUEVO A TUBERIA SANITARIA EXISTENTE RED PRINCIPAL				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Aproxima Resultado	2 Decimales		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		1,00
						TOTAL PRESUP		1,00

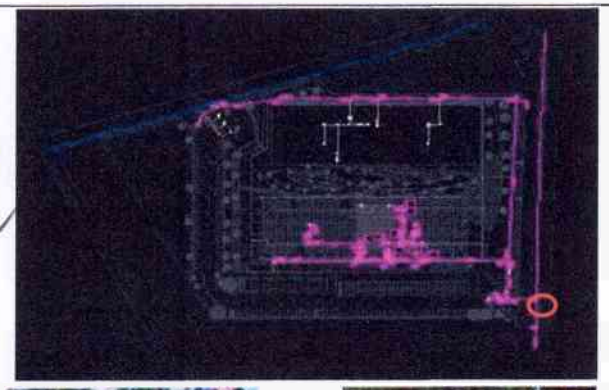





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Dris Villafane Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Civ. Piedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:




INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza 2023

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 46.605.358.402,00	PLAZO DE EJECUCION [illegible]	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2023	FECHA DE FINALIZACIÓN 17 DE MARZO DE 2025	FECHA DEL ACTA	VERSION
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 3.206.361.090,22	PLAZO DE EJECUCION [illegible]	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2023	FECHA DE FINALIZACION 17 DE MARZO DE 2025	3/11/2023	

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:			
11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	[illegible] RED DESAGUE AGUA RESIDUALES	11.2.17	CAJA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI CON SECCIÓN DE 80X80 Y ALTURA ENTRE 1,15 M Y 1,50 M. EPARED=15CM; EPISO=10CM; ETAPA=6CM, (INCLUYE MARCO EN ANGULO DE 2""3/16" Y TAPA EN PLATINA DE 2 1/2""3/16")	UNIDAD	UND

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
INTERIOR PROYECTO								
CAJA DE INSPECCION N° 26				1	1,00	1	UND	1,00
Aproxima Resultado				2 Decimales			TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00
							TOTAL PRESUP	2,00

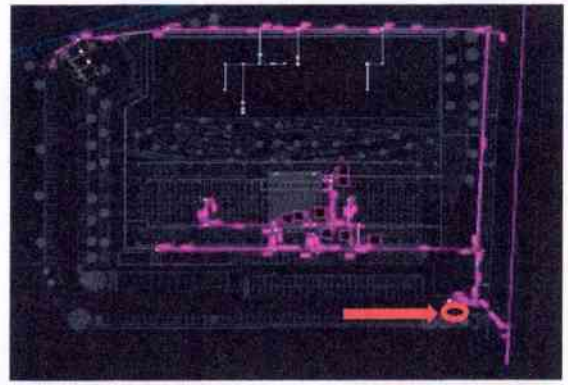





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTE
Ing. Cira Pardrah

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA




INTERVENTORIA

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.5o5.356.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	3/11/2023	

CAPITULO N°	**SUB CAPITULO N°**	**ITEM:**		
12 INSTALACIONES ELECTRICAS	12.1 ACOMETIDA DE MEDIA TENSION	12.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 12 M 1050 KGF	**UNIDAD**	UND

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
POSTE PROYECTADO								
POSTE PROYECTADO				1	1,00	1	UND	1,00
				Aproxima Resultado	2 Decimales		TOTAL	1,00
							TOTAL PRESUP	1,00

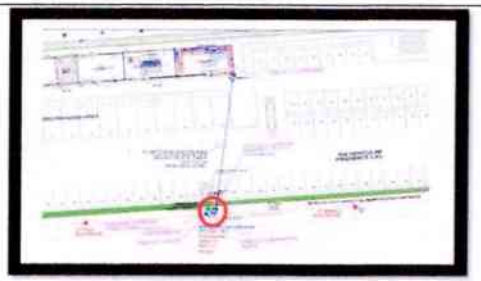



VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Pedrahita Céspedes
Firma_____

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza 2023

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.5o5.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	

CAPITULO N° 12 INSTALACIONES ELECTRICAS	**SUB CAPITULO N°** 12.1 ACOMETIDA DE MEDIA TENSION	**ITEM:** 12.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADECUACIÓN POSTE ARRANQUE RED MT. INCLUYE CRUCETAS DE PROTECCIÓN, CRUCETAS SOPORTE EQUIPOS DE MEDIDA	**UNIDAD**	UND	

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
[illegible]								
ARRANQUE RED MT. INCLUYE CRUCETAS DE PROTECCION CRUCETAS SOPORTES DE EQUIPOS DE MEDIA				1	1,00	1	UND	1,00
			Aproxim. Resultado		2 Decimales		TOTAL	1,00
							TOTAL PRESUP	1,00





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma _____


VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cesares
Firma _____

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza 2023

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 46.5e5.358.402 00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** [illegible]	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	
CAPITULO N° 12 INSTALACIONES ELECTRICAS	**SUB CAPITULO N°** 12.1 ACOMETIDA DE MEDIA TENSION	**ITEM:** 12.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS CORTACIRCUITO CON CÁMARA APAGACHISPAS				**UNIDAD**	UND

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
POSTE PROYECTADO								
CAJA DE CORTACIRCUITOS CON CAMARA APAGA CHISPAS				2	2,00	1	ML	2,00
Aproxima Resultado				2 Decimales			TOTAL	2,00
							TOTAL PRESUP	3,00



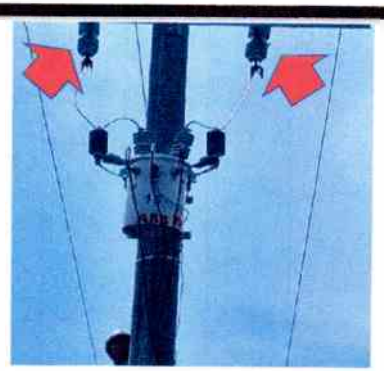

VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafane Cadrazco
Firma

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Dira Piedrahita Cespedes
Firma

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.356.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSIÓN**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	

CAPITULO N° 12 INSTALACIONES ELECTRICAS	**SUB CAPITULO N°** 12.1 ACOMETIDA DE MEDIA TENSION	**ITEM:** 12.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN MT TIPO VEHICULAR (1,5 X 1.5X2M)	**UNIDAD**	UND

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
INTERIOR PROYECTO								
CAJAS DE INSPECCION MT TIPO VEHICULAR 1.5*1.5M				3	3,00	1	ML	3,00
			Aproxima Resultado		2 Decimales		TOTAL	3,00
							TOTAL PRESUP	3,00









VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Pedrahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:



INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN** 17 DE MARZO DE 2025	3/11/2023	

CAPITULO N°	**SUB CAPITULO N°**	**ITEM:**		
12 INSTALACIONES ELECTRICAS	12.1 ACOMETIDA DE MÉDIA TENSION	12.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3X4" PARA CANALIZACIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN	**UNIDAD**	ML

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
INTERIOR PROYECTO								
DESDE EL POSTE HASTA LA SUB ESTACION ELECTRICA	57,60			57,60	3,00	1	ML	57,60
Aproxima: Resultad							TOTAL	57,60
							TOTAL PRESUP	96,00





VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____


VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Hedrahita Cespedes
Firma_____

VALLEDUPAR	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 4o.565.358.402,00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	

CAPITULO N°	**SUB CAPITULO N°**	**ITEM:**		
12 INSTALACIONES ELECTRICAS	12.1 ACOMETIDA DE MEDIA TENSION	12.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO DE 20X60CM, INCLUYE TAPA ALFAJOR 60 CM	**UNIDAD** ML

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
INTERIOR PROYECTO								
CUARTOS TECNICOS- SUB ESTACION ELECTRICA	57,60			22,00	22,00	1	ML	22,00
							TOTAL	**22,00**
							TOTAL PRESUP	22,00

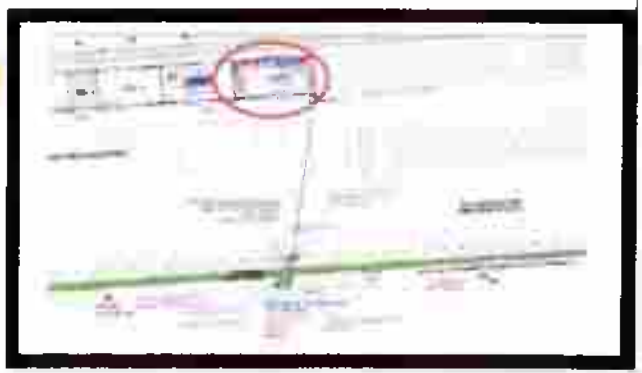

VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrezco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Piedrahita Cespedes
Firma_____

VALLEDUPAR EN ORDEN	**MEMORIAS DE CÁLCULO** **ACTA PARCIAL No 2**	CONTRATISTA DE OBRA: 	INTERVENTORIA: Consorcio Interplaza Valledupar 2023

PROYECTO: PLAZA MERCADO	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR					
CONTRATISTA DE OBRAS: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	**CONTRATO DE OBRA No.** 011-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 46.5n5.358.402 00	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO:** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	**CONTRATO No.** 043-SOP DE 2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 3.206.361.090,22	**PLAZO DE EJECUCION** 24 meses	**FECHA DE INICIO** 17 DE MARZO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACION** 17 DE MARZO DE 2025	**3/11/2023**	

CAPITULO N° 12 INSTALACIONES ELECTRICAS	**SUB CAPITULO N°** 12.1 ACOMETIDA DE MEDIA TENSION	**ITEM:** 12.1.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 200KVA CON CABINA INSONORA 55DB Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**UNIDAD**	UND

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD				
INTERIOR PROYECTO								
CUERTOS TECNICOS, SUB ESTACION ELECTRICA				0,98	1,00	1	ML	0,98
Aproxima Resultado				2 Decimales			TOTAL	0,98
							TOTAL PRESUP	1,00







VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq. Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Bedirahita Cespedes
Firma_____

MEMORIAS DE CÁLCULO
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATISTA DE OBRA:




INTERVENTORIA:

Consorcio Interplaza

PROYECTO:	CONTRATANTE:		OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.				
PLAZA MERCADO	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARIA DE OBRAS						
CONTRATISTA DE OBRAS:	**CONTRATO DE OBRA No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	**FECHA DEL ACTA**	**VERSION**
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	011-SOP DE 2023	$ 46.5a5.358.402 00	24 meses	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		
INTERVENTORIA	**CONTRATO No.**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**PLAZO DE EJECUCION**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION**	3/11/2023	
CONSORCIO INTERPLAZA VALLEDUPAR 2023	043-SOP DE 2023	$ 3.206.361.090,22	[illegible]	17 DE MARZO DE 2023	17 DE MARZO DE 2025		

CAPITULO N°	SUB CAPITULO N°	ITEM:		
12 INSTALACIONES ELECTRICAS	12 5 SPT Y APANTALLAMIENTO	12.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA	**UNIDAD**	UND

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL
SUB ESTACION ELECTRICA								
MALLA DE PUESTA A TIERRA EN SUBESTACION				1,00	1,00	1	UND	1,00
							TOTAL	1,00
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES								0 24
TOTAL PRESENTA ACTA						76%		0,76
							TOTAL PRESUP	1 00







VoBo- CONTRATISTA DE OBRAS
Arq Orlis Villafañe Cadrazco
Firma_____

VoBo- CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Ing. Cira Pietrahita Cepedes
Firma_____



CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022

NIT: 901.683.967-5

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **CHESMAN HOBBIE PIMIENTA BARROS** identificado con cédula de ciudadanía N° 13.745.081, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022** identificado con NIT : 901.683.967-5, certifico el pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, por lo tanto, declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

Dada en Valledupar, a los (03) días del mes de noviembre 2023

CHESMAN HOBBIE PIMIENTA

Representante Legal Principal

C.C 13.745.081

WENDY LORAINE BUENO MENDOZA

Contador publico

C.C No 1.065.806.517

Tarjeta profesional. 246181-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901083087
NOMBRE O RAZON SOCIAL			CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CRA 11 # 15-68	TELEFONO	4322420
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7897975426	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2023
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/10/04	NUMERO AUTORIZACIÓN			200261540

LIQUIDACIÓN TOTAL DE LOS APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COL COMISIONISTA	EXT	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VAP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
92	CC [redacted]	[redacted]	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO																			230301 - PORVENIR	14	$ 600.000	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 126.000	CCFC55 - CAJACOPI EPS S.A.S	16	$ 600.000	$ 32.000	$ 0	$ 32.000	14-11 - ARL SURA	16	$ 600.000		$ 55.700	16	$ 600.000	CCF16 - COMFACESAR	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[redacted]	CC [redacted]	[redacted]	DEPEND		$ 1.500.000	[redacted]																			231001 - COLFONDOS	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS023 - SALUD TOTAL	30	$ 1.500.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000		104.400	30	$ 1.500.000	CCF16 - COMFACESAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[redacted]	CC [redacted]	[redacted]	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO																			230301 - PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017 - FAMISANA	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15 - COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[redacted]	[redacted]	[redacted]	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO																			230301 - PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037 - SANITAS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15 - COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[redacted]	CC [redacted]	[redacted]	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO																			230301 - PORVENIR	14	$ 550.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 88.000	EPS037 - NUEVA EPS	14	$ 550.000	$ 22.000	$ 0	$ 22.000	14-11 - ARL SURA	14	$ 550.000		$ 38.300	14	$ 550.000	CCF15 - COMFACESAR	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[redacted]	CC [redacted]	[redacted]	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO																			230301 - PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CCFC55 - CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15 - COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[redacted]	[redacted]	[redacted]	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO																			230301 - PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CCFC55 - NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15 - COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 7.133.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901583987
NOMBRE O RAZON SOCIAL			CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CRA 11 # 15-86	TELEFONO	4322429
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	A-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		78979754 26	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES [redacted]	2023
DIAS DE MORA					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/10/04	NUMERO AUTORIZACIÓN		200291540

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	10	$ 1 761 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 761 800	$ 0	$ 1 761 800
25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 208 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208 000	$ 0	$ 208 000
051001	051001-COLFONDOS	4	$ 1 113 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 113 800	$ 0	$ 1 113 800
230201	230201-PROTECCIÓN	3	$ 803 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803 200	$ 0	$ 803 200
SUBTOTALES										$ 3 886 800	$ 0	$ 3 886 800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 256 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256 800	$ 0	$ 0	$ 256 800
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 46 400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 46 400
CCFC55	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 184 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184 800	$ 0	$ 0	$ 184 800
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 46 400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 213 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213 800	$ 0	$ 0	$ 213 800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139 200	$ 0	$ 0	$ 139 200
SUBTOTALES													$ 931 800	$ 0		$ 931 800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD ATP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD ATP VALOR	INCAPACIDAD ATP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	18		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 804 300	$ 1 804 300	$ 0	$ 0	$ 1 804 300
SUBTOTALES								$ 1 804 300	$ 0	$ 0	$ 1 804 300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	18	$ 931 800	$ 0	$ 931 800
SUBTOTALES			$ 931 800	$ 0	$ 931 800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXT	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INF	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DIAS	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	1065242877	[redacted]	DEPEND		$ 1 460 000	FIJO		SI															230201-PROTECCIÓN	$ 1 460 000	$ 732 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 732 000	PS002-SALUD TOTAL EPS	30	$ 1 460 000		$ 0	$ 58 000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 460 000		101 000	$ 1 460 000	CCF15-COMFACESAR	$ 58 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CC 1003284429	[redacted]	DEPEND		$ 1 280 000	FIJO		SI															051001-COLFONDOS	$ 1 280 000	$ 301 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301 600	PS005-SANITAS S.A	30	$ 1 280 000		$ 0	$ 50 400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 280 000		89 700	$ 1 280 000	CCF15-COMFACESAR	$ 50 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CC 1003385684	[redacted]	DEPEND		$ 1 160 000	FIJO		SI															230201-PROTECCIÓN	$ 1 160 000	$ 185 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185 600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1 160 000		$ 0	$ 46 400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 160 000		80 600	$ 1 160 000	CCF15-COMFACESAR	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CC 1083805375	[redacted]	DEPEND		$ 1 800 000	FIJO		SI															230301-PORVENIR	$ 850 000	$ 136 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136 000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S.	30	$ 850 000		$ 0	$ 34 000	14-11 - ARL SURA	30	$ 850 000		59 200	$ 850 000	CCF15-COMFACESAR	$ 34 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	[redacted]	[redacted]	DEPEND		$ 2 000 000	FIJO		SI															051001-COLFONDOS	$ 2 000 000	$ 320 000	$ 0	$ 0	$ 67	$ 0	Normal	$ 320 000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2 000 000		$ 0	$ 80 000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2 000 000		139 200	$ 2 000 000	CCF15-COMFACESAR	$ 80 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CC 9065601490	[redacted]	DEPEND		$ 1 800 000	FIJO		SI															230301-PORVENIR	$ 1 800 000	$ 288 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288 000	EPS002-SALUD TOTAL EPS	30	$ 1 800 000		$ 0	$ 72 000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 800 000		125 300	$ 1 800 000	CCF15-COMFACESAR	$ 72 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CC 1065821082	[redacted]	DEPEND		$ 1 800 000	FIJO		SI															230301-PORVENIR	$ 1 800 000	$ 288 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288 000	EPS002-SALUD TOTAL EPS	30	$ 1 800 000		$ 0	$ 72 000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 800 000		125 300	$ 1 800 000	CCF15-COMFACESAR	$ 72 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CC 1065834781	[redacted]	DEPEND		$ 1 300 000	FIJO		SI															25-14 COLPENSIONES	$ 1 300 000	$ 208 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208 000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S.	30	$ 1 300 000		$ 0	$ 52 000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 300 000		80 600	$ 1 300 000	CCF15-COMFACESAR	$ 52 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CC 1065889813	[redacted]	DEPEND		$ 1 160 000	FIJO		SI															230301-PORVENIR	$ 1 160 000	$ 185 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185 600	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1 160 000		$ 0	$ 46 400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1 160 000		80 600	$ 1 160 000	CCF15-COMFACESAR	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CC 1065913790	[redacted]	DEPEND		$ 1 990 000	FIJO		SI															230301-PORVENIR	$ 570 000	$ 91 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91 300	EPS002-SALUD TOTAL EPS	9	$ 570 000		$ 0	$ 22 800	14-11 - ARL SURA	9	$ 570 000		39 700	$ 570 000	CCF15-COMFACESAR	$ 22 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CC 1065953483	[redacted]	DEPEND		$ 2 200 000	FIJO		SI															231001-COLFONDOS	$ 2 200 000	$ 352 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352 000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2 200 000		$ 0	$ 88 000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2 200 000		153 300	$ 2 200 000	CCF15-COMFACESAR	$ 88 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	9016830[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022	
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CRA 14 # 15-86	TELÉFONO	4327420
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO	Otras actividades especializadas para la construc	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

NÚMERO PLANILLA		7897975426	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN		200291540

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901882867
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCION	CRA 11 # 15-66	TELÉFONO	4322420
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		78978754 26	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD		2023
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/10/04	NUMERO AUTORIZACION		200291549

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	10	$ 1 781 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 1 781 600
PS 14	PS 14 COLPENSIONES		$ 208 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208 000	$ 0	$ 208 000
231001	231001-COLFONDOS		$ 1 113 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 113 800	$ 0	$ 1 113 800
230301	230301- PROTECCION	3		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 603 200
SUBTOTALES											$ 0	$ 3 906 600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 256 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256 800	$ 0	$ 0	$ 256 800
SSC24	SSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 46 400
EPS017	EPS017-SANITANSAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 46 400
CCFC65	CCFC65-CAJACOPI EPS S.A.S	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 184 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184 400	$ 0	$ 0	$ 184 400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 46 400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212 800	$ 0	$ 0	$ 212 800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148 400	$ 0	$ 0	$ 148 400
SUBTOTALES													$ 921 600	$ 0	$ 0	$ 921 600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA			$ 0					$ 1 [illegible]	$ 0	$ 0	$ 1 [illegible]
SUBTOTALES									$ 1 [illegible]	$ 0	$ 0	$ 1 [illegible]

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	10	$ 921 600	$ 0	$ 921 600
SUBTOTALES			$ 921 600	$ 0	$ 921 600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | |

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 07/11/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022** con **NIT 901.683.967-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	257100070107
Saldo a la fecha	$464,067.94 Pesos
Fecha de apertura	01/01/0001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DOCUMENTOS CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR PARA PRESENTAR CUENTA DE COBRO POR ANTICIPO CONTRATO 011-SOP DE 2023

GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S

INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN EXPLORACIONES DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS

FOR-EO-16
VERSION 1
FECHA: 01-10-2021

RESULTADOS CILINDROS COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR
SOLICITANTE: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
CODIGO CLIENTE: G029

HOJA No. 1 DE 1
FECHA: 21/09/2023
RESISTENCIA ESPECIFICADA: 3000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	RESIST.	RESIST.	ASENTAMIENTO	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
		DIAS	PSI	(KG/CM2)	UNIDAD:			
19-ago	16-sep	28	4275	299	NO REPORTA	ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN FASE 1 VIGA -AM6 VIGA AM - DIAG2/ZAPATAS EJE 6 (DEL EJE AL EJE G) ZD6,ZE6,ZG6	Cono	
23-ago	20-sep	28	3887	272		ZAPATA DE MURO DE CONTENCION MURO TIPO 4	Cono	
25-ago	22-sep	28	4375	306		MODULOS Y PEDESTALES COMERCIALES (T4C,T4B,T6A,T4A 3 ELEMENTOS) / PEDESTALES EJE A (DEL EJE 2 AL 6)	Cono	
4-sep	18-sep	14	4264	298		MODULOS LOCALES COMERCIALES MODULO T1B,T6A,T6B,T9B(SUPERIOR) 2T4A	Cono	
7-sep	14-sep	7	3148	220		PEDESTALES EJE 6 FASE 2 (DEL EJE A AL EJE N) EJE G´ (DEL EJE 3´ AL EJE 4´)	Cono	
7-sep	21-sep	14	3742	262			Lado	
13-sep	20-sep	7	3086	216		MODULOS LOCALES COMERCIALES MODULO T4A, T9B,T3B	Lado	

NOTA 1 : LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS , ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.
NOTA 2: De acuerdo con el articulo C.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

Sede operativa: Diagonal 20B # 18B - 63 Local #2 Tel: 3173310685 - Valledupar
E-mail: administrativo@geoexplolab.com; gerencia@geoexplolab.com

RESULTADOS CILINDROS COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR
SOLICITANTE: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
CODIGO CLIENTE: G029

HOJA No. 1 DE 1
FECHA: 28/09/2023
RESISTENCIA ESPECIFICADA: 3000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	RESIST.	RESIST.	ASENTAMIENTO	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
		DIAS	PSI	(KG/CM2)	UNIDAD:			
29-ago	26-sep	28	3740	262	NO REPORTA	ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN FASE 2 VG - AM-DIG2 (UN TRAMO) VG - AM - O (UN TRAMO) VG-AM-N (UN TRAMO)/ ZAPATAS EJE 6 (DEL EJE O AL M): ZO6,ZN6,ZM6	Cono	
13-sep	27-sep	14	3560	249		MODULOS LOCALES COMERCIALES MODULO T4A, T9B,T3B	Cono	

NOTA 1 : LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS , ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.
NOTA 2: De acuerdo con el articulo C.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S

INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN EXPLORACIONES DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS

FOR-EO-16
VERSION 1
FECHA: 01-10-2021

RESULTADOS CILINDROS COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR
SOLICITANTE: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
CODIGO CLIENTE: G029

HOJA No. 1 DE 1
FECHA: 10/10/2023
RESISTENCIA ESPECIFICADA: 3000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	RESIST.	RESIST.	ASENTAMIENTO	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
		DIAS	PSI	(KG/CM2)	UNIDAD:			
26-sep	10-oct	14	2119	148	NO REPORTA	MURO DE CONTENCIÓN / ZAPATA DE MURO T4 ZONA CUARTOS TECNICOS	Cono	
28-sep	5-oct	7	2744	192		MURO DE CONTENCIÓN / VASTAGO DE MURO T4	Cono	

NOTA 1 : LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS , ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.
NOTA 2: De acuerdo con el articulo C.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 dias a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

Sede operativa: Diagonal 20B # 18B - 63 Local #2 Tel: 3173310685 - Valledupar
E-mail: administrativo@geoexplolab.com; gerencia@geoexplolab.com

GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S

INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN EXPLORACIONES DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS

FOR-EO-16
VERSION 1
FECHA: 01-10-2021

RESULTADOS CILINDROS COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA. CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR
SOLICITANTE: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
CODIGO CLIENTE: G029

HOJA No. 1 DE 1
FECHA: 24/10/2023
RESISTENCIA ESPECIFICADA: 3000 Y 4000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESIST. PSI	RESIST. (KG/CM2)	ASENTAMIENTO UNIDAD:	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
11-oct	18-oct	7	2502	102	NO REPORTA	MURO T4 - MURO DE CONTENCIÓN	Cono	F´C= 3000PSI
13-sep	11-oct	28	4126	289		MODULOS LOCALES COMERCIALES MODULO T4A, T9B,T3B	Cono	
21-sep	5-oct	14	3489	244		CUARTOS TECNICOS	Cono	
21-sep	19-oct	28	4002	280			Cono	
22-sep	20-oct	28	3552	249		MODULOS LOCALES COMERCIALES MODULO T4A	Cono	
26-sep	24-oct	28	3285	164		ZAPATA DE MURO T4 ZONA CUARTOS TECNICOS	Cono	
4-oct	11-oct	7	2853	200		ZAPATA DE MURO T2 Y T4 MURO DE CONTENCIÓN	Cono	
4-oct	18-oct	14	3143	220			Cono	
6-oct	13-oct	7	3248	227		LOSA DE FONDO DEL TANQUE SUBTERRANEO	Cono	F´C = 4000PSI PRIMERA TOMA
6-oct	20-oct	14	3428	240			Cono	
6-oct	13-oct	7	3199	224		LOSA DE FONDO DEL TANQUE SUBTERRANEO	Cono	F´C = 4000PSI SEGUNDA TOMA
6-oct	20-oct	14	3374	236			Cono	

NOTA 1 : LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS , ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.
NOTA 2: De acuerdo con el artículo C.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

Sede operativa: Diagonal 20B # 18B - 63 Local #2 Tel: 3173310685 - Valledupar
E-mail: administrativo@geoexplolab.com; gerencia@geoexplolab.com

GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS S.A.S

INGENIERIA ESPECIALIZADA EN EXPLORACIONES DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS

FOR-EO-09
VERSION 4
FEB 20 DEL 2014

DENSIDAD EN TERRENO

Obra :	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR
Solicitante:	CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
Cod.Cliente:	G029
Material:	RELLENO — Fecha del ensayo: 28/08/2023 — HOJA 1/1

Abscisas	1 MODULO T4A				
Peso frasco y arena inicial	6052				
Peso frasco y arena restante	2060				
Peso arena total usada	3992				
Constante del cono	1650				
Peso arena en el hueco	2342				
Densidad de la arena	1,42				
Volumen del hueco	1649				
Peso material extraido húmedo	3657				
% Humedad	6,5%				
Peso material extraído seco	3434				
Densidad del material Gms./cm^3	2,08				
Densidad. max. Laboratorio grs./cm^3	2,08				
% De compactación terreno	100,1%				
% De compactación especificada	95,0				

OBSERVACIONES:

INGENIERO JEFE DE LABORATORIO

FERNANDO LOPEZ FERREIRA

LABORATORISTA

Sede operativa: Diagonal 20B No. 18B-63 Local # 2 Tel. 3173310685 - Valledupar
E-mail: administrativo@geoexplolab.com; gerencia@geoexplolab.com

DENSIDAD EN TERRENO

Obra :	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR			
Solicitante:	CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022			
Cod.Cliente:	G029			
Material:	SUBBASE GRANUALR	Fecha del ensayo:	26/09/2023	HOJA 1/1

Abscisas	1 PAVIMENTO	2 PAVIMENTO			
Peso frasco y arena inicial	6019	6008			
Peso frasco y arena restante	2333	2468			
Peso arena total usada	3686	3540			
Constante del cono	1650	1650			
Peso arena en el hueco	2036	1890			
Densidad de la arena	1,42	1,42			
Volumen del hueco	1434	1331			
Peso material extraído húmedo	3080	2871			
% Humedad	5,5%	5,7%			
Peso material extraído seco	2919	2716			
Densidad del material Gms./cm^3	2,04	2,04			
Densidad. max. Laboratorio grs./cm^3	2,14	2,14			
% De compactación terreno	95,1%	95,4%			
% De compactación especificada	95,0	95,0			

OBSERVACIONES:

INGENIERO JEFE DE LABORATORIO

FERNANDO LOPEZ FERREIRA
LABORATORISTA

DENSIDAD EN TERRENO

Obra :	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR
Solicitante:	CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
Cod.Cliente:	G029
Material:	DE SITIO — Fecha del ensayo: 17/10/2023 — HOJA 1/1

Abscisas	1 ZONA VIA PARQUEADERO	2 ZONA VIA PARQUEADERO			
Peso frasco y arena inicial	5861	5831			
Peso frasco y arena restante	1841	1671			
Peso arena total usada	4020	4160			
Constante del cono	1650	1650			
Peso arena en el hueco	2370	2510			
Densidad de la arena	1,42	1,42			
Volumen del hueco	1669	1768			
Peso material extraído húmedo	3698	3501			
% Humedad	6,2%	6,1%			
Peso material extraído seco	3482	3300			
Densidad del material Gms./cm^3	2,09	1,87			
Densidad. max. Laboratorio grs./cm^3	2,11	2,11			
% De compactación terreno	98,9%	96,6%			
% De compactación especificada	95,0	95,0			

OBSERVACIONES:

INGENIERO JEFE DE LABORATORIO

FERNANDO LOPEZ FERREIRA
LABORATORISTA

RUT CONSORCIO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14896971796

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 3 9 6 7	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CR 11 15 66

42. Correo electrónico: licitaciones@bypconstrucciones.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 5 7 7 1 1 5 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 2 1 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 7	1	4	4	2	1	6	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 4

61. Fecha: 2023 - 02 - 17 / 11 : 03: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MENESES ESCORCIA DIANA MARIA
985. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 17-02-2023 11:03:46AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14896971796

(415)7707212489984(8020) 000001489697179 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 3 9 6 7	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho publico de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
[illegible] jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 2 0 5	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 1 2 0 5	
77. No. Matricula mercantil		
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 2 0 5	
81. Hasta	2 0 2 4 1 2 0 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 2 1 7		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razon social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CONTROLADA DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14896971796

(415)7707212489984(8020) 000001489697179 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 3 9 6 7	5	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 2 4 0 0 6 3 2 5	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUAMBIENTE S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2022 12 05	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 4 1 9 8 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SERKANN S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2022 12 05	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 8 1 9 5 5	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: B&P CONSTRUCCIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 5	2022 12 05	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA NO AUTENTICADO
