INFORME TECNICO No. 1

Periodo 12 de julio a 31 de julio de 2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2023-215

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SIENAX DB

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO VT BOYACÁ

CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ-
2023

ELABORACIÓN

NÚMERO DE REVISIÓN: 002			**ÁREA DE INFORME**	**FIRMA**
RESPONSABLES POR REVISIÓN Y ELABORACIÓN	ING. EDILSON BAREÑO	DIRECTOR DE OBRA	ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTO Y FINANCIERO, TÉCNICO, CALIDAD.	
	ING ALBERTO SANTOS	RESIDENTE DE OBRA		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
2.1 Objetivo general 4
2.2 Objetivos específicos 4
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
4. LOCALIZACIÓN 6
4.1 Localización general 6
4.2 Localización especifica 7
5. PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 8
5.1 Seguridad social y parafiscales 8
5.2 Pólizas 8
5.3 Actas suscritas en el contrato 9
5.3.1 Acta de inicio 9
5.4 Presupuesto 9
5.4.1 Ítems contractuales 10
5.4.2 Precios no previstos 11
6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 12
7. PROGMAMACIÓN DE OBRA 12
8. estado financiero 12
9. CONCLUSIONES 13
ANEXOS 14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información general del proyecto 5
Tabla 2. Personal contractual Consorcio SIENAX DB 8
Tabla 3 Seguridad social personal administrativo consorcio Sienax db 8
Tabla 4. Pólizas y seguros contrato de obra pública 661 de 2022 9
Tabla 5. Presupuesto inicial 10
Tabla 6. Ítems contractuales 11

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprendido entre el Periodo 12 de agosto a 11 de septiembre de 2023, presenta un compilado de las actividades correspondientes al contrato No. 2023-215 celebrado entre el la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá como contratante y el Consorcio Sienax DB como contratista, cuyo objeto es: " MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ-BOYACÁ".

El proyecto surge de la necesidad de mejorar la calidad en el servicio de transporte y comunicaciones entre veredas de distintas zonas rurales del municipio de Chiquinquirá.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Dar a conocer las actividades técnicas desarrolladas correspondiente al contrato de obra No. 2023-215 del periodo en mención.

2.2 Objetivos específicos

- Presentar los avances técnicos y administrativos durante el periodo del presente informe
- Recopilar y analizar la información que hace parte del presente informe, con el fin de ser avalada y aprobada por la interventoría.
- Identificar y evaluar las situaciones presentadas en la ejecución del Proyecto durante el periodo del presente informe.
- Realizar el seguimiento en obra para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	CONSORCIO SIENAX – DB
NIT	901.717.323-0
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY YOHANY CHIMBÍ ANTONIO
CONTRATO DE OBRA NO.	2023-215 DEL 02 DE JUNIO DE 2023
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA – BOYACA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
CUANTÍA	CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.717.071.558,55)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
INTERVENTORIA	CONSORCIO VT BOYACÁ
NIT	901.663.557-3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANTONIO ROA MEJIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1664 DE 2022
OBJETO	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUINQUIRÁ Y MONGUA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”
SUPERVISION	LAURA YELITZA ECHEVARRIA RUSSI
FECHA DE INICIACION DEL	13 DE JULIO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	12 DE NOVIEMBRE DE 2023

Tabla 1 Información general del proyecto

4. LOCALIZACIÓN

4.1 Localización general

El Municipio de Chiquinquirá se encuentra ubicado en la provincia de Occidente en el departamento de Boyacá, en el valle del río Suárez. La altitud de la cabecera municipal oscila entre los 2000 a 3200 m.s.n.m., la ciudad está situada a 5º37'03" de latitud norte y a 73º48'59" de longitud oeste meridiano de Bogotá.

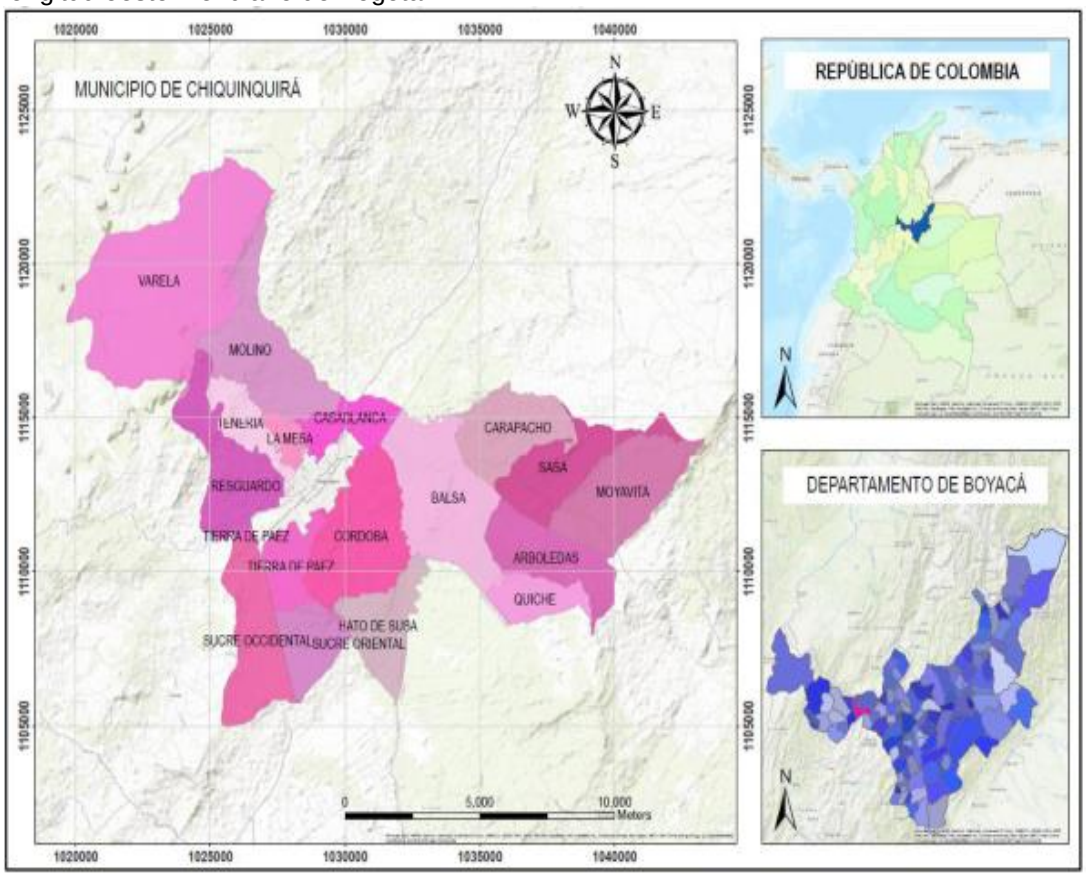


Ilustración 1Localización Municipio de Chiquinquirá.
Fuente: Anexo técnico.

El municipio limita por el norte con Sabaya; por el sur, con San Miguel de Serna, Simijaca y Caldas; por el oriente con Tinjacá y Simijaca; y por el occidente con Caldas y Briceño.

4.2 Localización especifica

El área de estudio donde se realizará el mejoramiento de la vía mediante pavimentación con placa huella con sus respectivas obras de drenaje vial, se localizan en la zona rural del municipio, como se detallará a continuación. En la siguiente figura se aprecia la localización de los tramos viales objeto de estudio del Municipio de Chiquinquirá, Boyacá., la cual permitirá identificar de forma general el área de influencia y las características de la misma.

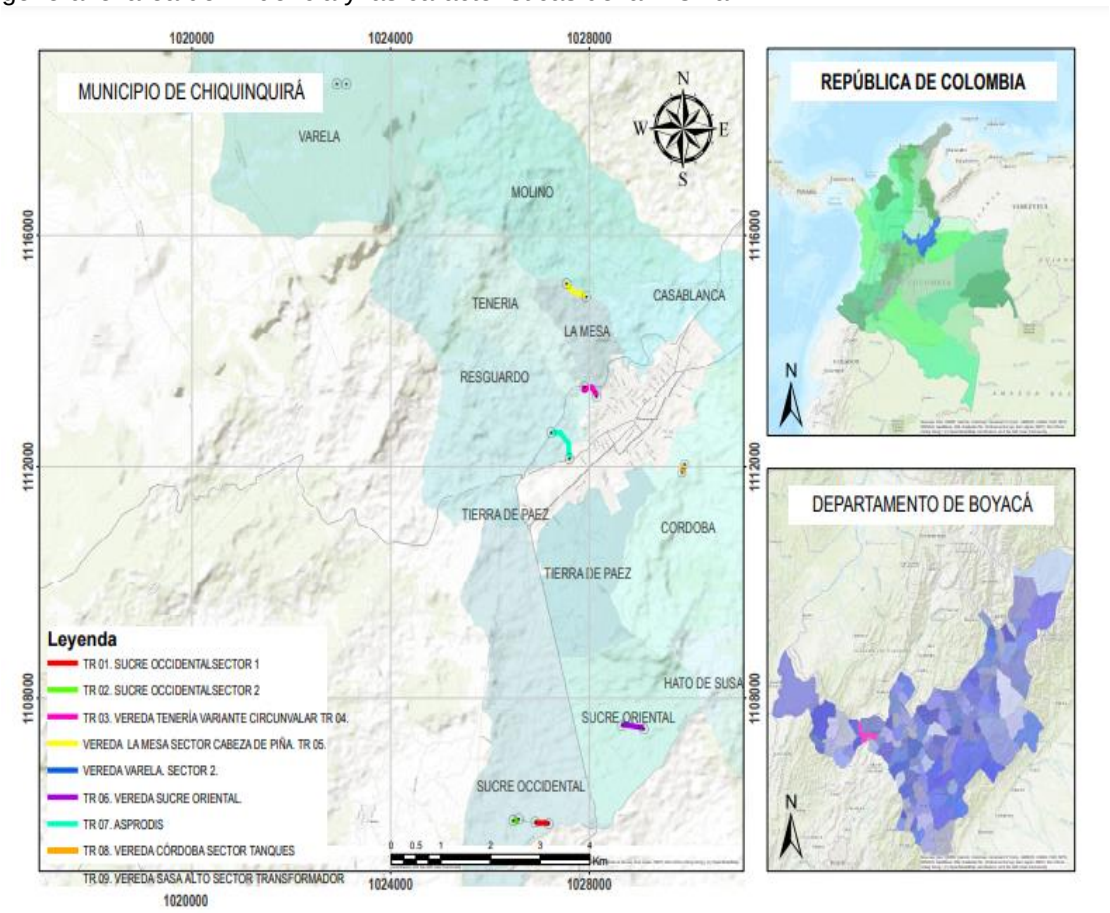


Ilustración 2 Ubicación de los tramos a intervenir.

Fuente: Anexo técnico.

5. PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO

Dando cumplimiento con el Anexo Técnico del presente contrato, de manera inicial se presentó la documentación respectiva del personal que forma parte del Consorcio Sienax DB. A continuación, se presenta una tabla en la que se relaciona el personal contractual presentado y que se encuentra laborando actualmente en el proyecto.

PERSONAL ADMINISTRATIVO	CANT	NOMBRE	DEDICACIÓN
Director De Obra	**1**	Edilson Ernesto Barreño Moreno	50%
Residente De Obra	1	Alberto Santos Acosta	100%
Residente SST	1	Yenny Yissel Jurado Fonseca	100%
Residente Social	1	María Bernarda Galé Herrera	100%

Tabla 2. Personal contractual Consorcio SIENAX DB

5.1 Seguridad social y parafiscales

A continuación, se presenta una relación de la seguridad social del personal del Consorcio SIENAX DB, en el anexo correspondiente se presentan planillas de seguridad social y la certificación de parafiscales correspondiente al presente informe.

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONAL CONSORCIO SIENAX DB				
CARGO	**PROFESIONALES**	**CONTRATO**		
		ARL	**EPS**	**AFP**
Director De Obra	Edilson Ernesto Barreño Moreno	✓	✓	✓
Residente De Obra	Alberto Santos Acosta	✓	✓	✓
Residente SST	Yenny Yissel Jurado Fonseca	✓	✓	✓
Residente Social	María Bernarda Galé Herrera	✓	✓	✓

Tabla 3 Seguridad social personal administrativo consorcio Sienax db

5.2 Pólizas

El contrato de obra No. 661-2022, a través de seguros mundial se encuentra cubierto por las pólizas (Ver anexo – Pólizas de garantías):

PÓLIZA	NO. PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	600-47-994999969189	2/06/2023	2/08/2024	$ 471.707.155,90
Responsabilidad Civil	600-74-994999919850	2/06/2023	2/04/2024	$ 464.000.000,00

Donde en cuyas pólizas cubren los siguientes amparos:

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO			
Amparo	***Vigencia Desde***	***Vigencia Hasta***	***Suma Asegurada***
Cumplimiento del Contrato	22/06/2023	22/08/2024	$ 471.707.155,90
Pago de salarios, Prestaciones sociales	22/06/2023	22/04/2027	$ 943.414.311,80
Estabilidad	02/06/2023	02/06/2028	$ 1.415.121.467,70
Calidad de la obra	02/06/2023	02/06/2028	$10.281.600,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL			
Amparo	***Vigencia Desde***	***Vigencia Hasta***	***Suma Asegurada***
Amparo básico – predios, labores y operaciones	2/06/2023	2/04/2024	$ 464.000.000,00

Tabla 4. Pólizas y seguros contrato de obra pública 661 de 2022

5.3 Actas suscritas en el contrato

5.3.1 Acta de inicio

El 12 de julio de 2023 se llevó a cabo la firma del acta de inicio para contrato de obra pública No. 2023-215, con una duración inicial de cuatro (4) meses

5.4 Presupuesto

A continuación, se presenta el presupuesto inicial presentado en el Formulario 1 - Oferta Económica, licitación LP-CHIQ-004-2022correspondiente al contrato 2023-215

SUBTOTAL OBRAS + AIU	$4.625.321.113,86
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$12.477.989,55
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIEMNTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUTURA VIAL = (1)	$28.800.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA	$5.472.000,00

ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL = (2)	
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL = (1) + (2) = (B)	$34.272.000,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19%) = C	$45.000.000,00
VALOR TOTAL DE OBRAS =(A) +(B) + (C)	$4.717.071.558,55

Tabla 5. Presupuesto inicial

5.4.1 Ítems contractuales

A continuación, se presenta los ítems contractuales, según la oferta económica planteada inicialmente.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.
		GENERAL	PARTICULAR		
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y SEÑALIZACIÓN					
1	600.1.1	00-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	m3
2	610.3	10-22		Rellenos para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3
3	320.3	20-22		Subbase Granular Clase C	m3
4	630.4.1	30-22		Concreto clase 21 MPa para placa huella	m3
5	640.1	40-22		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg
6	630.7	30-22		Concreto clase 14 Mpa (60% concreto + 40% Piedra para placa huella (Piedra pegada)	m3
7	710.1	10-22		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	nida

ALCANTARILLAS VIALES L = 6m D = 36"					
8	201.7	00-22		Demolición de estructuras	m3
9	600.1.1	00-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	m3
10	610.3	10-22		Rellenos para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3
11	630.4.1	30-22		Concreto clase 21 MPa	m3
12	630.6.1	30-22		Concreto clase 14 MPa	m3
13	661.3	61-22		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diámetro interior	m
SUBDRÉN TIPO FILTRO CON TUBERÍA PERFORADA D = 4"					
14	600.1.1	00-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	m3
15	663.1P	663		Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m
16	673.1.2	73-22		Geotextil Tipo 2500 no tejido	m2
17	673.2	73-22		Material granular drenante	m3
18	673.3	73-22		Material de Cobertura Tipo Sub - Base CBR=20%	m3

Tabla 6. Ítems contractuales

5.4.2 Precios no previstos

Durante la etapa de avance de actualización de estudios y diseños, se han identificado ítems que no estaban contemplados en la oferta inicial, por lo tanto, se irán organizando a medida del avance de los mismos.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades (se aclara que el orden de enumeración no tiene que ver con el orden de importancia):

a) Comités técnicos.

b) Visitas técnicas

c) Actividades realizadas entorno a la obra

- Levantamiento topográfico de verificación
- Tomas de muestras para estudios geotécnicos
- Visitas hidráulicas.
- Verificación de estudios de transito

7. PROGMAMACIÓN DE OBRA

La programacion de obra para el presente proyecto contemplaba la ejecucion de las actividades de obras en cuatro (4) meses. (ver anexo)

8. ESTADO FINANCIERO

Hasta la fecha el **CONSORCIO SIENAX DB** no ha generado facturas.

9. CONCLUSIONES

- Durante el periodo en mención no se realizan actividades a nivel constrictivo.
- Se verifica que todo el equipo mínimo este contratado con todas las prestaciones sociales de ley.
- Se inician actividades de actualización de estudios y diseños

ANEXOS

- Anexo No. 1 BITACORA DE OBRA
- Anexo No. 2 POLIZAS
- Anexo No. 3 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
- Anexo No. 4 PROGRAMACIÓN DE OBRA
- Anexo No. 5 ACTAS DE COMITÉ

ANEXOS

Anexo No.1 BITACORA DE OBRA

Anexo No. 2 POLIZAS

Anexo No. 3 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Anexo No. 4 PROGRAMACION DE OBRA

Anexo No. 5 ACTAS DE SEGUIMIENTO
