

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

MYS CONSTRUCTORA

ELABORO: **T.S. MARGARITA ROMERO VARGAS**	**REVISO:** **ARQ. CARLOS MEDINA**	**APROBO:** **T.S. CAROLINA TRIVIÑO**
Firma	**Firma**	**Firma**
CARGO: Residente Social Contratista	**CARGO** Director de obra	**CARGO:** Residente Social Interventoría

BOGOTA D.C. DICIEMBRE 01 DE 2019

Versión 01

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 5
3. RESPONSABLES DEL PROYECTO 6
3.1. ÁREA SOCIAL 6
4. OBJETIVO GENERAL 7
4.1. Objetivos Específicos 7
5. CRONOGRAMA ÁREA SOCIAL 8
6. UBICACIÓN DEL PROYECTO 9
7. FASE ETAPA DE OBRA INFORMACIÓN MENSUAL 11
8. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 12
8.1. Objetivo General 12
8.2. Objetivos Específicos 12
8.3. Actividades Desarrolladas 12
9. PROGRAMA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTCIPACIÓN CIUDADANA 13
9.1. Objetivo General 13
9.2. Metodología 13
9.3. Actividad Desarrolladas 14
10. PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO 15
10.1. Objetivo General 16
10.2. Metodología 16
11. OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES-ACTAS DE VECINDAD 23
11.1. Objetivo General 23
11.2. Metodología 23
12. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 24
12.1. Objetivo General 24
12.2. Metodología 24

13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 26
13.1. Objetivo General 26
13.2. Metodología 26
14. CONCLUSIONES 27
15. ANEXOS 28

Tablas

Tabla 01 Características Generales del Proyecto

Tabal 02 Responsables del Proyecto

Tabla 03 Área Social

Tabla 04 Cronograma de Actividades

Tabla 05 Comité de Participación Ciudadana

Tabla 06 Resumen de la solicitud ciudadana

Tabla 07 Anexos

Gráficos

Grafico 01 Programas del P.G.S.

Grafico 02 Resumen de Reuniones sociales

Grafico 03 Porcentaje de contratación de MONC

Imágenes

Imagen 01 Ubicación de la obra

1. INTRODUCCIÓN

La elaboración del presente informe pretende evidenciar las actividades desarrolladas en el periodo de 09 de noviembre al 08 de diciembre de 2019 en la etapa de ejecución de obra del contrato CO1.PCCNTR.699128 CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1

En este informe se representa la trazabilidad de las actividades desarrolladas en el área social, las cuales tuvieron como fundamento los programas de: Información, divulgación, organización social y participación ciudadana, atención al ciudadano, y sostenibilidad. Cada una de las actividades que se describirán a continuación fueron previamente revisadas y avaladas por la Interventoría del área social, las cuales a su vez cumplieron con los protocolos establecidos en el Plan de Gestión Social, que direcciona el contrato en mención.

Cada una de las acciones que se programaron y llevaron a cabo, fueron con el objetivo de mitigar los posibles impactos que pueda generar el contrato CO1.PCCNTR.699128, a la comunidad aferente a la obra en construcción.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Objeto del Contrato	Contratista: MYS CONSTRUCTORA "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"
Número del Contrato Contratista	CO1.PCCNTR.699128
Objeto De Contrato de La Interventoría	Interventoría: Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE PUENTE ARANDA, BOSA Y SUBA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.
Numero de Contrato	Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.695946
Beneficio del Proyecto	Generación de empleo, mejoramiento del entorno inmediato a la construcción, progreso de la calidad de vida de los niños y niñas en ciclo vital de primera infancia y sus familias.
Ubicación del Proyecto	Zona VII de Porvenir sector CPF 760, de la UPZ 86, Lote ubicado en la Calle 55 sur No. 103 – 98, localidad de Bosa.

Tabla 01.

3. RESPONSABLES DEL PROYECTO

Supervisión del Contrato SECRETARIA DE EDUCACION	UBICACIÓN AV. El Dorado No. 66-63
Firma Interventora Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura	UBICACIÓN Dirección: Calle 159 No 54-69, Torre 1ofic.302
Firma Contratista MYS CONSTRUCTORA	UBICACIÓN Carrera 12 No. 13-24 Neiva Huila

Tabla 02.

3.1. ÁREA SOCIAL

Supervisión	Sociólogo Felipe Correal
Interventoría	Trabajadora Social Carolina Triviño
Contratista	Trabajadora Social Margarita Romero Vargas

Tabla 03.

4. OBJETIVO GENERAL

Presentar de forma clara y detallada las actividades sociales que se desarrollaron durante el periodo comprendido del 09 de noviembre al 08 de diciembre de 2019, en el contrato CO1.PCCNTR.699128.

4.1. Objetivos Específicos

- ✓ Informar a través de piezas comunicativas las actividades ejecutadas desde el programa de divulgación de la información, que se desarrollaron con la comunidad aferente al contrato CO1.PCCNTR.699128.
- ✓ Formalizar la convocatoria para el desarrollo del sexto comité de participación ciudadana del contrato No. CO1.PCCNTR.699128.
- ✓ Relacionar la ejecución del sexto comité de participación ciudadana que fue efectuada el día 28 de noviembre de 2019, con la comunidad el comité que voluntariamente se inscribió en la reunión de inicio y avance de obra.
- ✓ Implementar estrategias que permitan la instauración y atención de los Puntos Satélites y el PAC.
- ✓ Relacionar la contratación de MONC-sector para el periodo que comprende el presente informe.
- ✓ Efectuar el seguimiento y cierre de la solicitud de ciudadana de la señora Diana Tovar
- ✓ Suministrar a través de informes y demás documentos la información requerida por la interventoría del área Social, frente a la solicitud ciudadana que se recepciona para este periodo.

5. CRONOGRAMA ÁREA SOCIAL

Fecha	Descripción de la Actividad
12-1419-21-26-28 de noviembre de 2019	Atención al PAC
19-26 de noviembre de 2019	Seguimiento a la solitud ciudadana Sra. Diana Tovar
26-27 de noviembre de 2019	Convocatoria sexto comité de participación ciudadana
28 de noviembre de 2019	Ejecución del sexto comité de participación ciudadana
09 de noviembre al 09 de diciembre	Reporte de contratación MONCL

Tabla 04.

6. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Bosa [2]UPZ 86 SITIO DE OBRA CLL. 55 SUR No. 103-96



Imagen 01

Fotografía Panorámica sitio de obra

Localidad de Bosa Ciudadela Porvenir Adoptado.

"El Plan Parcial Ciudadela El Porvenir, ubicado en la Localidad de Bosa, fue adoptado a través del Decreto 395 del 16 de septiembre de 2002. Este plan parcial presenta las siguientes modificaciones.

Primera Modificación de Ciudadela El Porvenir 2006: Fue adoptado a través del Decreto 366 del 12 de septiembre de 2006, por el cual se modifica el Decreto Distrital 395 de 2002

Segunda Modificación de Ciudadela El Porvenir 2007: Fue adoptado a través del Decreto 604 del 28 de diciembre de 2007, por el cual se modifica el Decreto Distrital 366 de 2006.

Tercera Modificación de Ciudadela El Porvenir 2014: Fue adoptado a través del Decreto del 355 del 28 de agosto de 2014, por el cual se modifica el Decreto Distrital 604 de 2007.

Cuarta Modificación de Ciudadela El Porvenir 2017: Fue adoptado a través del Decreto del 406 de 2017, por el cual se modifica el Decreto Distrital 355 de 2014"

Citado por el estudio de insuficiencia Educativa de Bogotá para el 2019. SED-octubre de 2018 "*Al comparar la oferta frente a la demanda efectiva se observan las siguientes UPZ con déficits estimados superiores a 2.000 cupos: Suba, El Rincón, Tibabuyes, Patio Bonito,* ***Bosa Occidental, Bosa Central*** *y Tintal Sur. UPZ con déficits estimados superiores a 1.000 cupos como: Ismael Perdomo, Bolivia, Gran Britalia, San Francisco, Diana Turbay, Ciudad Jardín, Calandaima, Jerusalén, Apogeo y el Porvenir. En el mapa se observa que las localidades de Suba, Engativá, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar son las que concentran la mayor cantidad de UPZ deficitarias.*

Este indicador da cuenta de los cupos disponibles dentro de cada una de las UPZ, una vez establecida la matrícula. En su análisis se observan las siguientes UPZ en las cuales se concentran cupos superiores a 2.000: Lucero, Kennedy Central, Los Libertadores, Comuneros, Quiroga, 20 de Julio, y Las Ferias. Los cupos disponibles que se presentan en algunas zonas se deben a la falta de demanda o interés que tiene la población que reside en esa zona por estudiar en colegios distritales".

[2]https://www.google.com/maps/place/UPZ+86+EVENTOS/@4.6433165,74.2521048,12.38z/data=!4m12!1m61s0x8e3f9df1498af7f1¡:0xcc0cef17c0d27661!2sUPZ+86

7. FASE ETAPA DE OBRA INFORMACIÓN MENSUAL

Esquema de los programas contemplados para la etapa de obra del CO1.PCCNTR.699128-Modulos de Primera Infancia.

A través de ejecución de actividades o programas sociales en los anexos técnicos del contrato firmados entre el Contratista MYS y la Secretaria de Educación, frente al componente social atendiendo oportunamente las necesidades de la Población Área de Influencia Directa-AID y Área de Influencia Indirecta-AII. En el presente informe se relacionarán las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 09 de noviembre al 08 de diciembre de 2019. A través de la ejecución de los programas sociales que contempla el P.G. S. se busca hacer partícipe a la comunidad aferente al proyecto, así como responder con las solicitudes realizadas por la interventoría y la supervisión del contrato.



Gráfico 01

8. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

8.1. Objetivo General

Brindar información clara frente al contrato de obra CO1.PCCNTR.699128 a la comunidad, a través de las reuniones de inicio, avance y finalización, planteadas en el presente programa, posibilitando a la comunidad estar informados de los avances de las obras constructivas.

8.2. Objetivos Específicos

Divulgar piezas comunicativas, con el fin de socializar las actividades que involucran a la comunidad aferente al proyecto.

8.3. Actividades Desarrolladas

Información a la comunidad:

Para el presente periodo no se ejecuta ninguna actividad referente a este programa, dado que a la fecha se han ejecutado las reuniones de inicio y avance, según la programación técnica del contrato.

Resumen de las Reuniones proyectadas con la comunidad




Gráfico 02

Divulgación de la información:

Para este periodo se programa el sexto comité de participación ciudadana, para el cual se realiza convocatoria a través de vía telefónica y se crea un grupo de WhatsApp, con el fin de invitar a que el comité inscrito participe de este encuentro.

En el proceso de convocatoria se contacta a cada uno de los miembros inscritos, al comité donde cinco de ellos confirman su participación, otros dos ya no viven en la localidad, tres más informan que por otros compromisos no pueden asistir y el resto participantes o no responden el teléfono, está fuera de servicio o responden que numero equivocado.

Previamente a este ejercicio se envía a la interventoría la pieza comunicativa a divulgar, para revisión y la aprobación del mismo. Esta pieza comunicativa es avalada por la interventoría, del área social.

Productos a entregar

Volante de invitación a la reunión de avance de obra
Planillas convocatorias y registros de llamadas (Ver anexo 01).

9. PROGRAMA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTCIPACIÓN CIUDADANA

9.1. Objetivo General

Conformar el Comité de participación Ciudadana para efectuar el control social del contrato CO1.PCCNTR.699128 según lineamientos de la Ley 850-2003.

9.2. Metodología

Se llevaran a cabo reuniones mensuales, con grupo de comité de participación ciudadana que se postuló en la reunión de inicio el día 08 de febrero de 2019 y se

complementó con la inscripción de cuatro personas más en la reunión de avance el día 17 de octubre de 2019, con el fin que obtengan información del contrato CO1.PCCNTR.699128 y de esta manera puedan ser multiplicadores de la información suministrada en estos encuentros con la comunidad directa e indirecta del proyecto según sea el caso.

9.3. Actividad Desarrolladas

Para este periodo se ejecutó el sexto comité de Participación Ciudadana, el día 28 de noviembre de 2019, realizando la invitación de los siguientes miembros del comité de participación ciudadana:

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOMBRES Y APELLIDOS	No. TELEFONICOS
Diana Carolina Villamil	3046738602
Sonia Castro	3112967390
María Bertha Morales	3176827859
Jorge Pinto	3208236182
Lucero Campos	3105062424
María Libia Betancourt	3105901901
María Isabel Cárdenas	3214239572
German Acevedo	3112523436
Ana Elvia Pinzón	3143143637
María Mery Silva	3132129206
Martha Galindo	3202790096
Gloria Sánchez	3212428616
Mónica Pedroza	3204303168
Judy Yate	3219060536
Sandra Buitrago	3933904

Tabla 05.

Las cuatro últimas personas relacionadas en la anterior tabla se vincularon al comité de participación ciudadana, este ejercicio se efectuó el día 17 de octubre en la reunión de avance de obra.

Desarrollo del Comité de participación ciudadana No. 6

El comité de participación ciudadana No.06 se programa para el día 28 de noviembre de 2019 a las 10:00 a.m. en las instalaciones del punto de atención ciudadana ubicado en el salón comunal de Bicentenario II, en la dirección calle 55 sur No. 113-49 segundo piso, siendo las 9:50 a.m. se reúnen la supervisión del contrato Felipe correal del área social, la interventoría Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura con la participación de Carolina Triviño profesional social, del área técnica Cristian Muñoz y desde el contratista el residente de obra el arquitecto Luis Alcides Prieto y la residente social Margarita Romero Vargas, se dispone el espacio para el comité, se prepara cada uno de los componentes a socializar apoyados por la presentación preparada para dicho encuentro, presentación previamente revisada y aprobada por la interventoría y la supervisión del contrato.

Siendo las 11:00 a.m. los ya mencionados proceden a levantar el acta, dado que ningún miembro del comité se presentó.

Productos a entregar

Acta de Reunión, planilla de asistencia y registro fotográfico.

Presentación del comité (Ver anexo 02).

10. PROGRAMA ATENCIÓN AL CIUDADANO

10.1. Objetivo General

Brindar información a la comunidad AID-AII interesada en la construcción del Módulo de Primera Infancia del contrato CO1.PCCNTR.699128 en forma oportuna, clara y veraz.

10.2. Metodología

- ✓ Este periodo se atendió el Punto PAC móvil, el cual funcionará durante toda la etapa de obra; contará con su respectiva línea telefónica, (3183484944-3125763703) correo electrónico (atencioncomunidad.porvenir@gmail.com) para la atención a los ciudadanos.
- ✓ El contratista MYS Constructora, a su vez apertura el PAC, en el Salón Social de Bicentenario II, el cual fue atendido los días martes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. para la ubicación de la información se instaló en el sitio de obra un pendón con la información del PAC- Horarios, Dirección de la oficina de atención al ciudadano Correo electrónico y línea telefónica
- ✓ Se ubicaron 3 puntos Satélites los cuales cuentan con un aviso que contiene la Información del PAC- Horarios, Dirección de la oficina de atención al ciudadano Correo electrónico y línea telefónica.

- ✓ Los puntos satélites se ubicaron en los siguientes conjuntos residenciales:

  -Calle 54c sur No. 100-24 Torres del Porvenir

  -Calle 54f sur No. 103-50 Emmerital

  -Cra. 100 No. 56f – 15 sur Torres del Porvenir V.

Productos a entregar

Para verificación de los mismos se anexa registro fotográfico de la instalación de los Puntos Satélites (Anexo 03)

En este periodo el Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018 realizó el seguimiento y cierre a la solicitud de la ciudadana la señora Diana Tovar ubicada en la dirección calle 55 # 102-08 casa 14.

Resumen del proceso

No. de la solicitud	Fechas de recepción	Descripción de la situación	Estado
02	13/10/2019	De manera verbal la ciudadana Diana Tovar, requiere una visita a su predio, por presuntas afectaciones en el baldosín de las áreas de la cocina. (pared y baño del segundo nivel) Por tanto, el área social quien es donde se recepciona la solicitud, procede a remitir al área técnica y revisar acta de vecindad realizada al inicio de las obras constructivas. (acta de vecindad No. 33).	Seguimiento
Primera visita de atención a la solicitud			
No. de la solicitud	Fechas de atención	Descripción de la situación	Estado
		Se visita el predio de la señora Diana Tovar, desde el área técnica y social del contratista e interventoría, con el objetivo de verificar, la solicitud que la	

02	15/10/2019	ciudadana realizando y comparar con el acta de vecindad que se ejecutado en el inicio de obra. Acciones ejecutadas: 1. se compara el acta de vecindad inicial con el estado actual del predio 2. Se evidencia que el acta de vecindad registra tanto escrito como en el registro fotográfico, algunas fisúrales generales en la vivienda 3. El Arq. Residente de obra, Luis Prieto explica a la ciudadana desde lo técnico por que no es factible que estas fisuras que se están presentando en su vivienda no son consecuencia de la obra, mas sin embargo la ciudadana expresa que ella piensa que si se debe a las obras adelantadas en el colegio en construcción 4. Por indicaciones de la dirección de obra se informa a la Sra., Diana que el registro fotográfico y fílmico que se está tomado en su vivienda será analizado por el especialista estructural, para poder dar un concepto técnico de lo que está ocurriendo en su casa.	Seguimiento

		5. Levantamiento de formato de atención al ciudadano. Se programa próxima visita para el día 22 de octubre de 2019	
Segunda Visita			
No. de la solicitud	Fechas de atención	Descripción de la situación	Estado
02	22/10/2019	Se visita el predio desde el área social del Contratista, se informa a la ciudadana que el caso ya se trasladó al especialista y que se está esperando el concepto que el mismo emita. En esta visita de seguimiento la señora Dian informa que evidencio que en los cuartos del segundo nivel los pisos están presentando fisuras Desde el área social se levanta registro fotográfico y fílmico para ser remitidos a la dirección de obra y a su vez esta área, se encargue de realizar el procedimiento con el especialista. No se deja una fecha estipulada para esta respuesta, dado que entra a revisión las dos áreas de las habitaciones, presuntamente afectadas.	Seguimiento

Tercera visita			
No. de la solicitud	Fechas de atención	Descripción de la situación	Estado
02	19/11/2019	Se visita a la señora Diana al predio con el fin de realizar entrega formal del concepto técnico que se da desde el contratista MYS, a la solicitud que la ciudadana realizó desde el pasado 13 de octubre del año en curso. En esta visita se da por cerrado la solicitud presentada por la ciudadana, la cual recibe la respuesta y solicita que se haga entrega del registro fotográfico tomado en la visita del acta de inicio. Por tanto, queda como compromiso la entrega de este material.	Cerrado
Cuarta visita			
02	26/11/2019	La profesional social del contratista realizo la entrega de un CD con el registro fotográfico solicitado por la señora Diana Tovar	Cerrado

Tabla 06

Desde la interventoría el día 24 de octubre se emite el oficio No. cym-bp-595946-187 con asunto: Solicitud respuesta solicitud ciudadana.

Este oficio lo responde el área técnica desde la dirección del proyecto el día 25 de octubre de 2019 con el oficio NO. CONS.OBRA 292-10-19, respondiendo que la situación presentada está siendo revisada por los especialistas de geotecnia y estructural, todo con el fin de poder tener una respuesta precisa a la situación que se está presentando en la vivienda de la peticionaria.

Conclusión:

El concepto que emitió por el especialista de geotecnia y estructural fue que las presuntas afectaciones que presenta la vivienda de la señora Diana no son ocasionadas por el desarrollo de la obra, desde la toma del registro fotográfico del acta de vecindad la vivienda ha presentado fisuras en algunas áreas de la casa, por tanto, lo que la ciudadana expresa frente a las áreas de la vivienda afectadas se debe a otros factores ajenos a la construcción del colegio.

Por la solicitud de la señora Diana Tovar se cierra, no obstante, el contratista seguirá presto a responder cualquier solicitud que se pueda presentar en caso ya mencionado.

Productos a entregar

Se anexa evidencias del seguimiento de la solicitud de la ciudadana Diana Tovar (Ver anexo 04).

11. OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES-ACTAS DE VECINDAD

11.1. Objetivo General

Ejecución de Actas de Vecindad, según determinación técnica a los predios y/o áreas comunes que posiblemente pueden verse afectados, por las obras constructivas al contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.

11.2. Metodología

Procedimiento actividad levantamiento actas de vecindad

La actividad levantamiento actas de vecindad se realizó con el objetivo de determinar el estado actual de los predios, vías, espacio público, etc., de la zona a intervenir y de influencia directa del Contrato CO1.PCCNTR.699128 antes del inicio de las obras.

En su ejecución se realizó descripción técnica apoyada en registros fotográficos de cada zona a involucrar. Esta labor estuvo a cargo de los profesionales del área técnica y social del contratista.

Para este periodo no se lleva a cabo ninguna actividad relacionada con este proceso, dado que la demanda del contrato no lo requirió.

12. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

12.1. Objetivo General

Realizar el proceso de vinculación del 30% de personal Mano de Obra No Calificada (MONC) con el propósito de brindar oportunidades laborales incluyentes a personas en condición de vulnerabilidad brindando oportunidad de trabajo y así contribuir a mejorar sus ingresos económicos y calidad de vida de los habitantes del sector.

12.2. Metodología

Determinar los mecanismos de convocatoria para la contratación de personal de acuerdo a las necesidades de la obra, los lineamientos de contratación de mano de no calificado local, estas contrataciones las determinara el área técnica los cuales irán vinculadas a las necesidades de la misma obra.

En la reunión de inicio el día 08 de febrero de 2019 a la población asistente a esta reunión, la Constructora MYS les informo que a través de la dinámica de la obra del contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018, se inició la contratación de trabajadores del sector, para desarrollar labores como: Paleteros, ayudantes de obra, personal de servicios de generales, entre otros que clasifican en MONC, es de aclarar que dicha contratación se realizara dependiendo las necesidades y programación de obra a medida que el contrato este avanzando.

PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL SECTOR



Gráfico 03

Conclusión: El contratista MYS Constructora, para el periodo de noviembre-diciembre de 2019 contrató seis (06) trabajadores que desarrollan labores de mano de obra no calificada, de los cuales dos (2) trabajadores pertenecen a la localidad de Bosa

Se anexan las certificaciones, de los trabajadores legalizando la residencia de los mismos.

Para un cumplimiento del 33% respecto del 30% exigido por la entidad.

Productos a entregar

Base de datos de la relación de MONC

Certificaciones de MONC de los trabajadores del sector. (Ver anexo 05)

13. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

13.1. Objetivo General

Generar procesos de pertenencia en el ciudadano a través de su vinculación con el proceso de diseño y construcción para disfrute, de la comunidad en el acatamiento de normas de convivencia y paz, aceptación de la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias en el contexto; utilización y apropiación de lo público como un bien común que se cuida y protege.

13.2. Metodología

- ✓ Se realizará un taller pedagógico con los ciudadanos interesados en la construcción de los módulos de primera infancia , cuando la obra esté del 60% al 80% de la ejecución, implementado temas orientados a la apropiación, buen uso, mantenimiento y cuidado de la obra en mención, para el desarrollo de este taller pedagógico el contratista tendrá en cuenta el protocolo de convocatoria a la comunidad interesada en la ejecución de la obra, con previa aprobación por parte de la interventoría y supervisión del contrato de la pieza comunicativa a divulgar para la invitación de dicha actividad, de igual manera se entregara con tres (3) días de anticipación el material a utilizar para el taller.

14. CONCLUSIONES

1. El Contratista MYS Constructora desde el área social cumple en este periodo con la ejecución del sexto comité de participación ciudadana del contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018, bajo lineamientos del P.G.S. e indicaciones de la Interventoría.

2. Se instauro y atendió el punto de atencional a la Comunidad, para este periodo se cerró la solicitud ciudadana de la Sra. Diana Tovar.

3. Se efectúa con el protocolo designado el programa de divulgación de la información, proyectando una pieza comunicativa, para invitar al comité de participación ciudadana al sexto encuentro.

4. Se contrata para el periodo de noviembre-diciembre de 2019 MONCL de la localidad de Bosa alcanzado un 33% de contratación, con el objetivo de dar cumplimiento a los estipulado en los pliegos referente al programa de generación de empleo.

15. ANEXOS

Descripción de Anexo	No. De Anexo
Evidencias del proceso de divulgación de la información, frente al sexto comité de participación ciudadana. (Volante, planillas de entrega).	01
Evidencias de la ejecución de la reunión del sexto comité de participación ciudadana. (Acta de reunión, planilla de asistencia, registro fotográfico y presentación de la reunión).	02
Registro fotográfico de atención PAC y puntos satélites de información	03
Seguimiento y cierre de la solicitud ciudadana	04
Certificaciones de residencias y base de datos de la contratación de MONC	05

Tabla 07.

ANEXO 01 EVIDENCIAS DEL PROCESO DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN, FRENTE A LA REUNIÓN SEXTO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (VOLANTE, PLANILLA DE REGISTRO DE LLAMADAS).

ANEXO 02 EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN DEL SEXTO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (ACTA DE REUNIÓN, PLANILLA DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN).

ANEXO 03 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATENCIÓN PAC Y PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN

ANEXO 04 SEGUIMIENTO Y CIERRE A LA SOLICITUD CIUDADANA

ANEXO 05 CERTIFICACIONES DE RESIDENCIAS Y BASE DE DATOS DE LA CONTRATACIÓN DE MONC

Comunicado No. 10

Fecha: 26/11/2019
Sector: Porvenir VII
Contrato: No. CO1.PCCNTR.699128 de 2018.
Contratista: MYS CONSTRUCTORA

INVITACIÓN SEXTO COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y la Firma MYS CONSTRUCTORA, los invitan quinto comité de participación ciudadana del Contrato No. CO1.PCCNTR.699128 de 2018. la "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1"

Para la Secretaría de Educación, el Contratista MYS CONSTRUCTORA; y la Interventoría Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura, es de vital importancia su presencia en esta reunión.
El objetivo del encuentro es informar los avances de la obra desde cada uno de los componentes: Técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo.

- **Lugar: Conjunto Residencial Bicentenario etapa 2**
- **Dirección: Calle 55 sur No. 113-49**
- **Fecha: Jueves 28 Noviembre de 2019**
- **Hora: 10:00 a.m.**

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Atención a la comunidad :
T.S. Margarita Romero
Teléfono Móvil: 3183484944
Correo electrónico:
atencioncomunidad.porvenir@gmail.com

Scanned by CamScanner

MyS Constructora

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RAP63
Versión 0
Fecha Emisión 24-Feb-17

Tema de la Reunión:	6° comite de Participación Ciudadana.			**Proceso:**	Convocatoria comite Participación Ciudadana
Área Responsable:	Social.	**Fecha:**	26-27-28-Nov.	**Lugar:**	Salón comunal Bicentenario II
Contratista responsable:	Margarita Romero / MyS constructora.			**Hora:**	10:00 am - 1:00 pm.

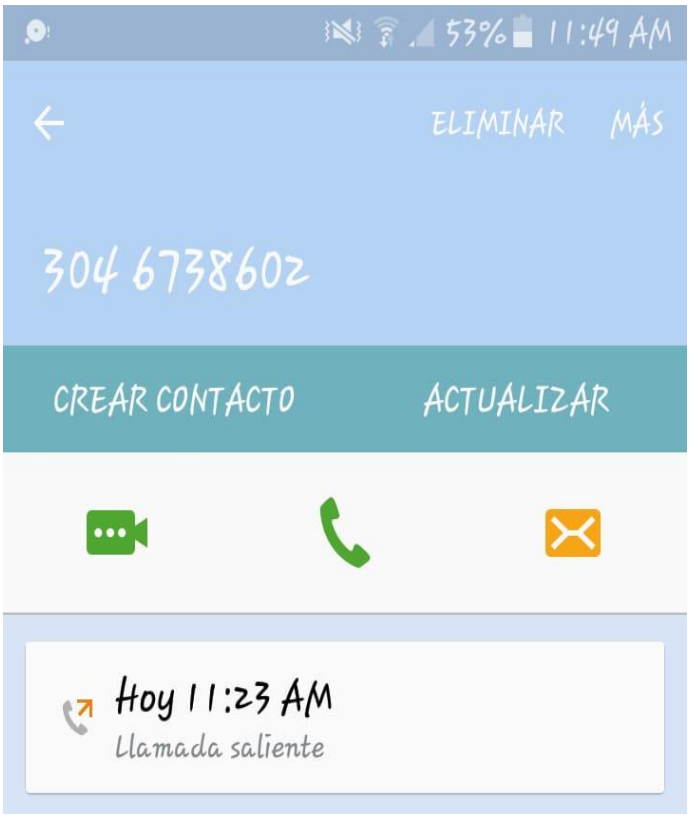
No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diana Carolina Villamil	Veedora	Comunidad	3044673866	2. No responde	
2	Judy Yate	Veedora	comunidad.	3219060538	Apagado.	
3	Sandra Buitrago	Veedora	comunidad.	3933904	Numero equivocado.	
4	Monica Pedroza	Veedora	Comunidad.	3204303168	No equivocado.	
5	Gloria Sanchez.	Veedora	comunidad.	3212428616	Tel apagado	
6	Martha Galindo	Veedora	comunidad.	3202790096	Asiste.	
7	Maria Mery Silva	Veedora	comunidad.	3132129806	No asiste.	
8	Ana Elvia Pinzon	Veedora	Comunidad.	5143143659	No responde.	
9	Germán Acevedo	Veedor	comunidad	3112523436	Se fue del sector	
10	Maña Isabel Cardenas	Veedora	comunidad.	3214235572	Apagado	
11	Jorge Pinto	Veedor	Comunidad	3208236182	No puede asistir tiene OFTO Comp.	
12	Maña Bertha Monte	Veedora	comunidad	3176827859	Tel apagado.	
13	Sonia Castro	Veedora	Comunidad	3112967390	No puede asistir.	

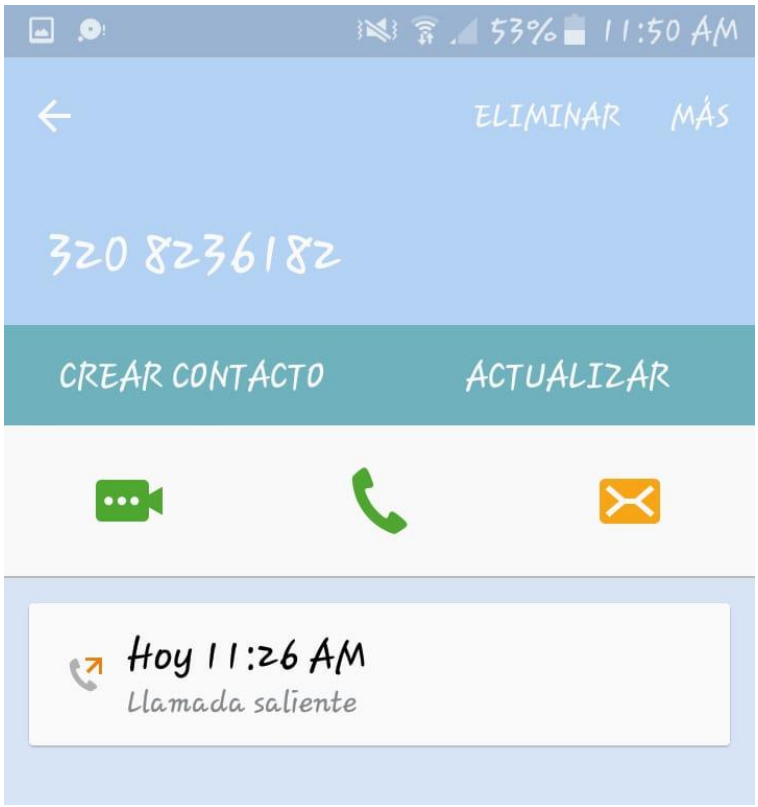
Firma Residente Social – Contratista

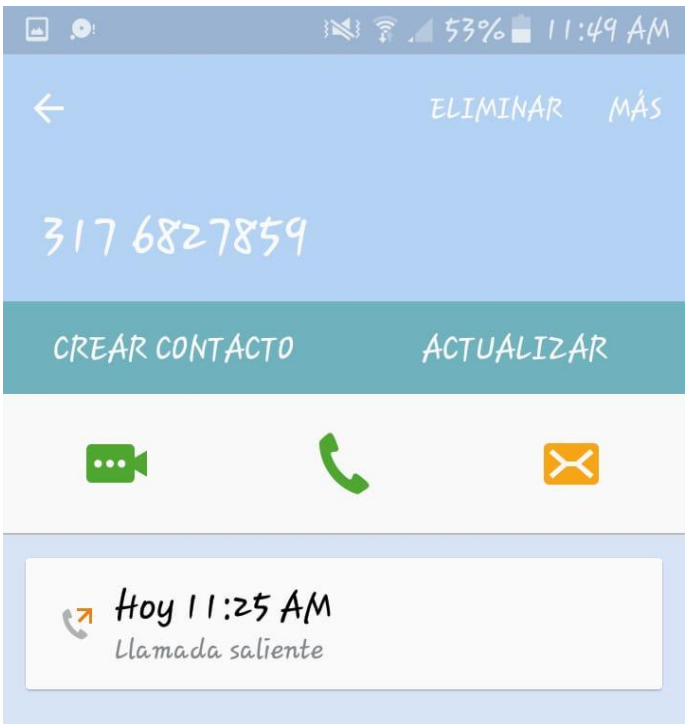
Firma Residente Social - Interventoría

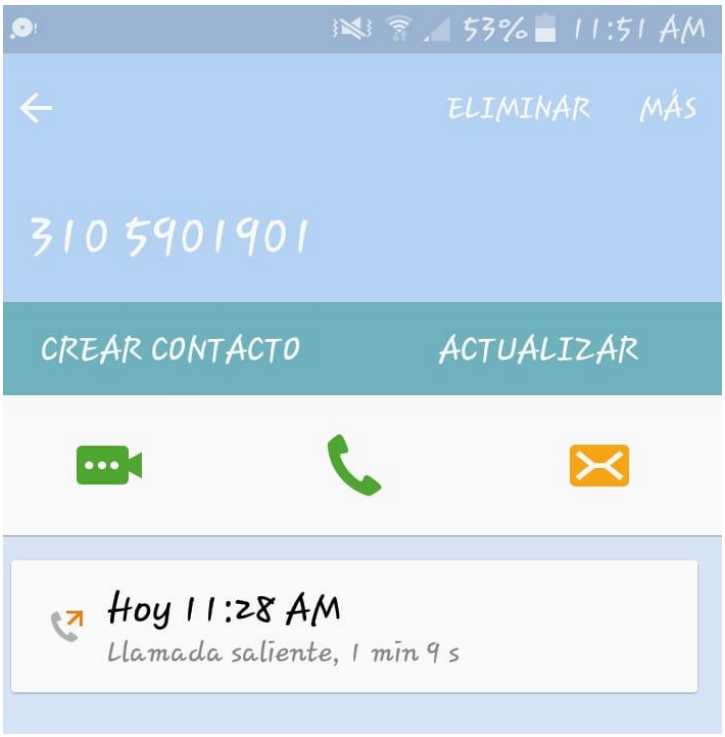
Scanned by CamScanner

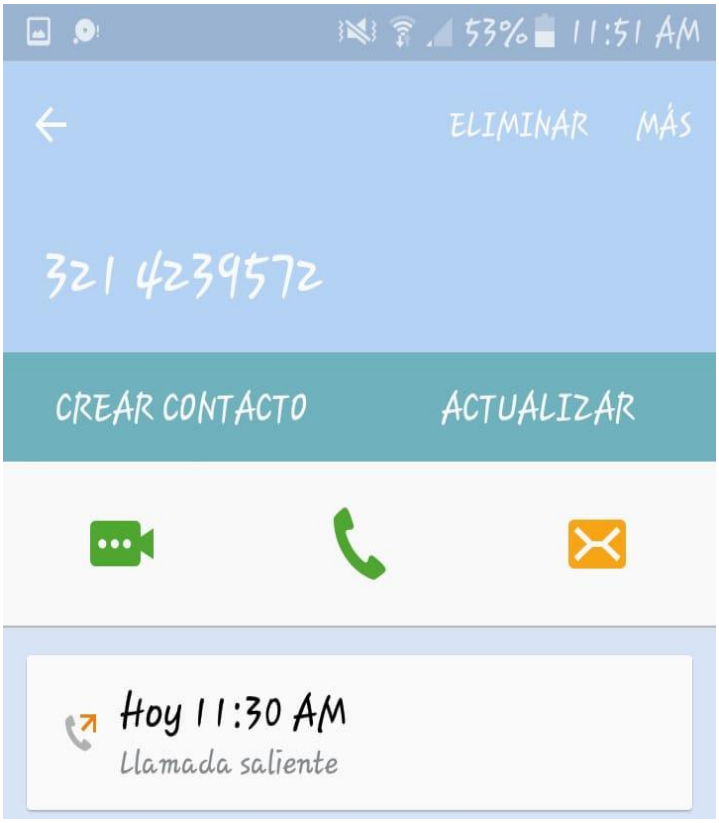
Registro de llamadas al sexto comité de participación Ciudadana

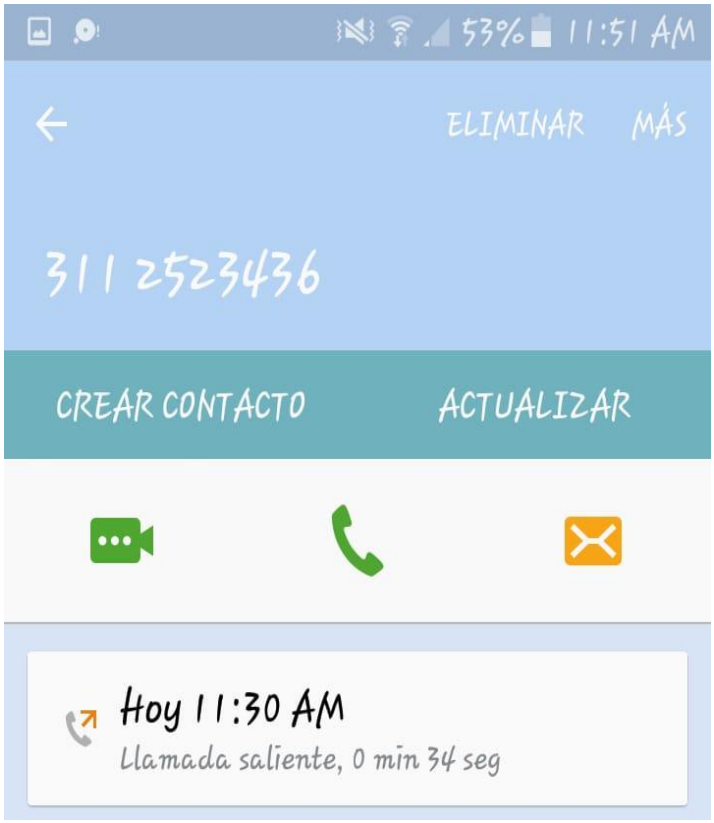


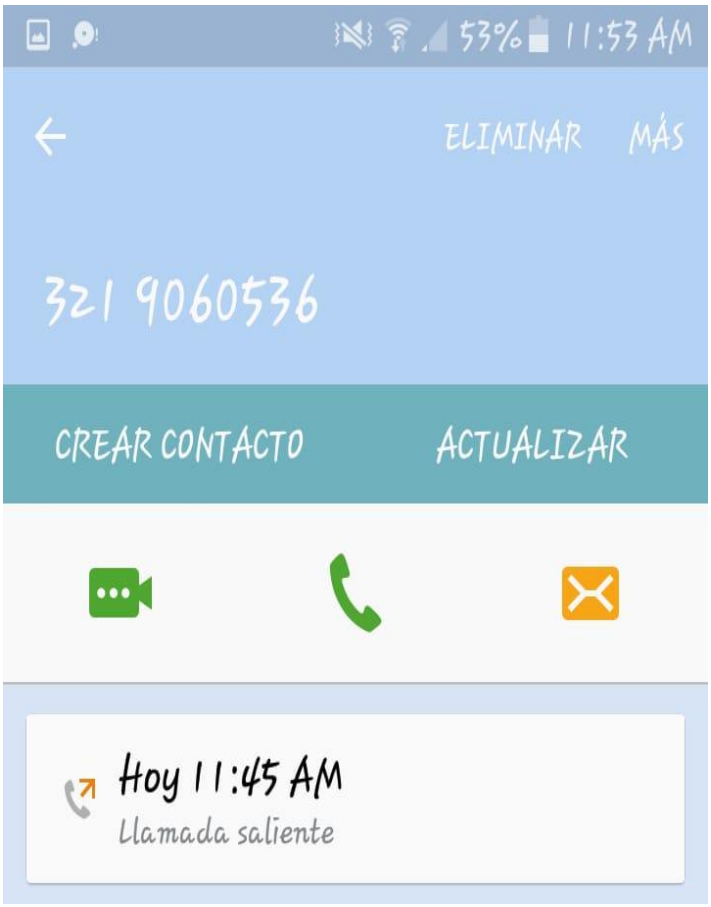


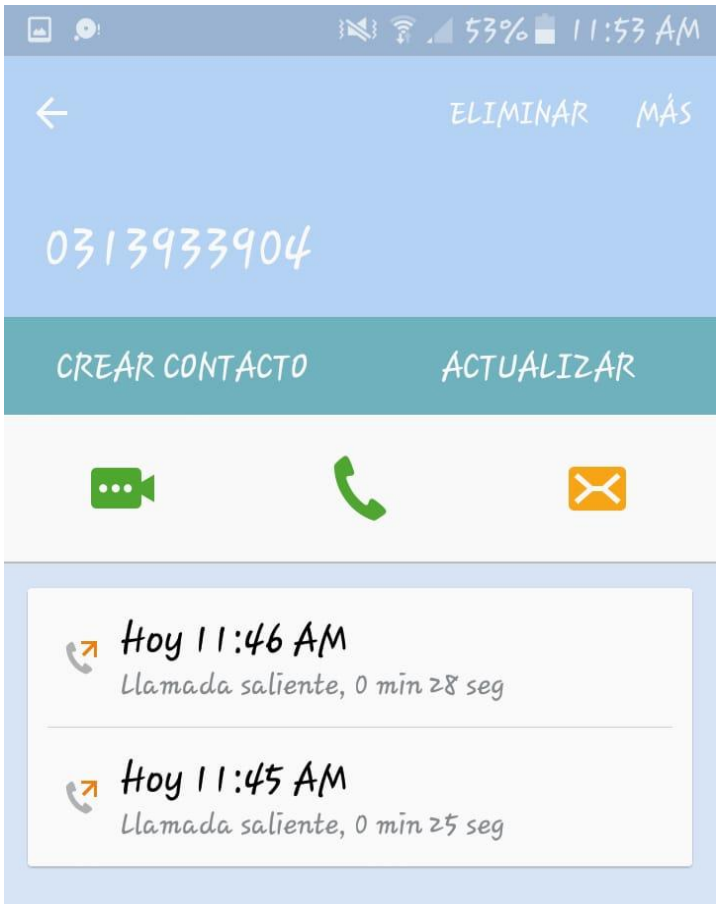


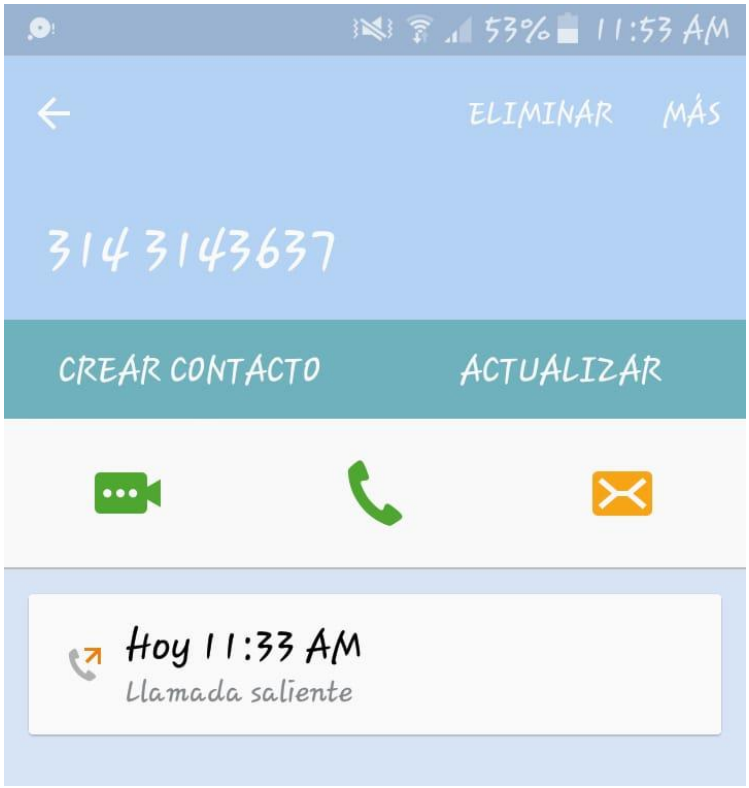


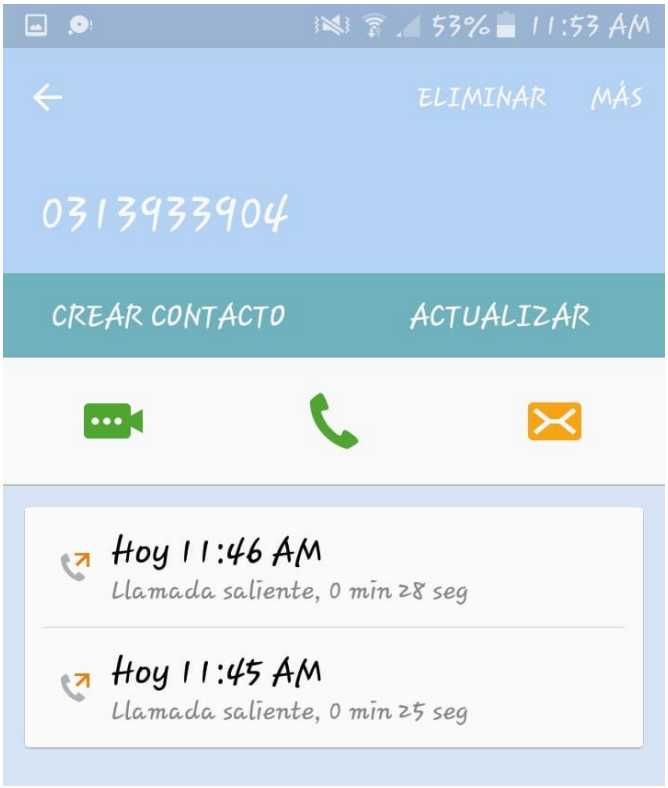

53% 11:51 AM
ELIMINAR
MÁS
321 4239572
CREAR CONTACTO
ACTUALIZAR
Hoy 11:30 AM
Llamada saliente

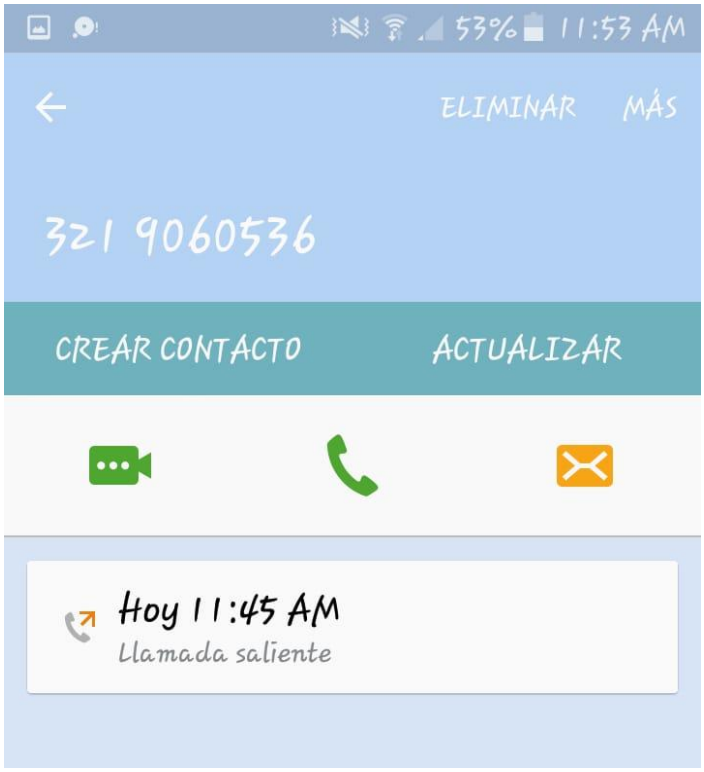

53% 11:51 AM
ELIMINAR
MÁS
311 2523436
CREAR CONTACTO
ACTUALIZAR
Hoy 11:30 AM
Llamada saliente, 0 min 34 seg

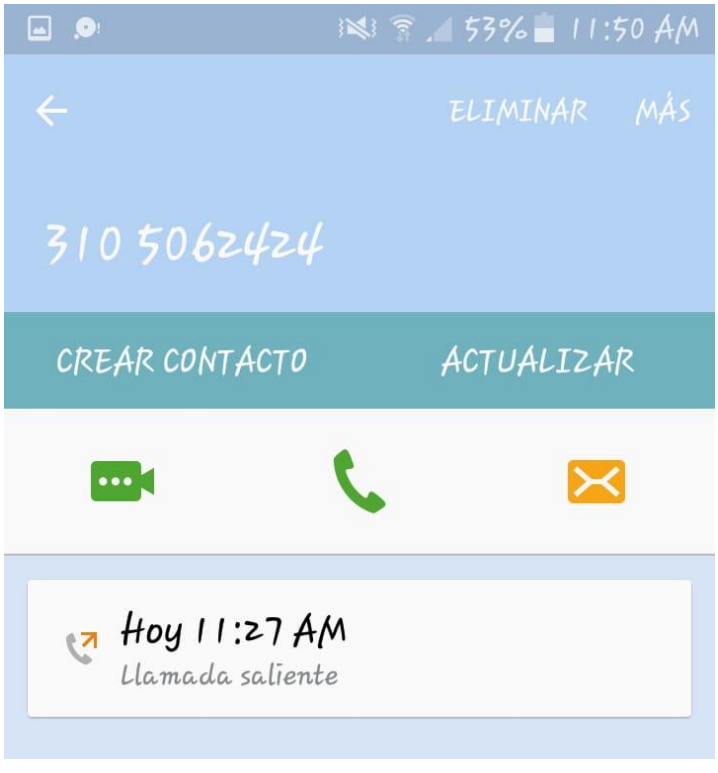

53% 11:53 AM
ELIMINAR
MÁS
321 9060536
CREAR CONTACTO
ACTUALIZAR
Hoy 11:45 AM
Llamada saliente

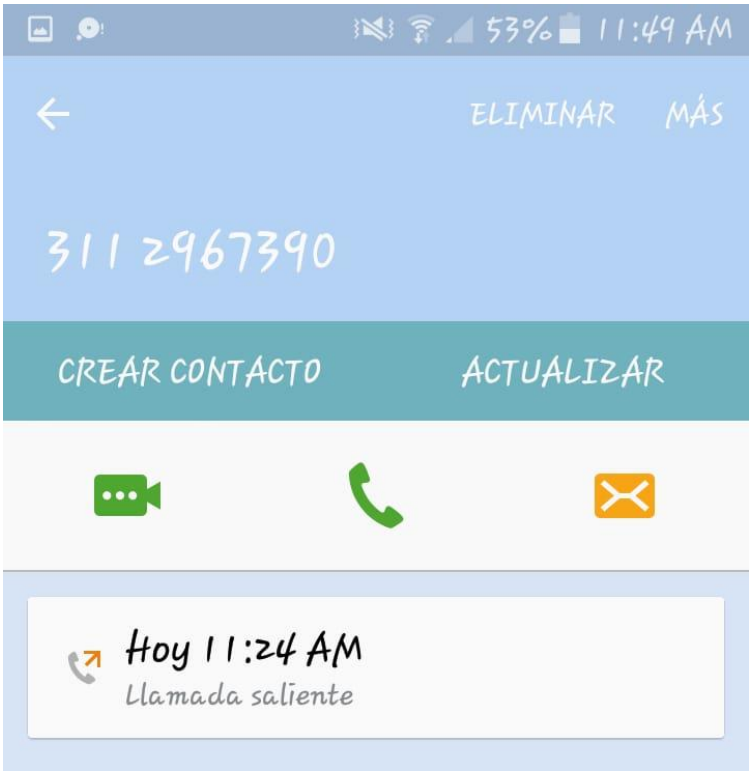

53% 11:53 AM
ELIMINAR
MÁS
0313933904
CREAR CONTACTO
ACTUALIZAR
Hoy 11:46 AM
Llamada saliente, 0 min 28 seg
Hoy 11:45 AM
Llamada saliente, 0 min 25 seg


53% 11:53 AM
ELIMINAR
MÁS
3143143637
CREAR CONTACTO
ACTUALIZAR
Hoy 11:33 AM
Llamada saliente


53% 11:53 AM
ELIMINAR
MÁS
0313933904
CREAR CONTACTO
ACTUALIZAR
Hoy 11:46 AM
Llamada saliente, 0 min 28 seg
Hoy 11:45 AM
Llamada saliente, 0 min 25 seg


53% 11:53 AM
ELIMINAR
MÁS
321 9060536
CREAR CONTACTO
ACTUALIZAR
Hoy 11:45 AM
Llamada saliente


53% 11:50 AM
ELIMINAR
MÁS
310 5062424
CREAR CONTACTO
ACTUALIZAR
Hoy 11:27 AM
Llamada saliente


53% 11:49 AM
ELIMINAR
MÁS
311 2967390
CREAR CONTACTO
ACTUALIZAR
Hoy 11:24 AM
Llamada saliente


Movistar
39% 8:37 p.m.
Bosa comité de partici...
Jorge, Xss, Xssss, Xx, Xxxxx, Xxxx...
Añadiste a Xx
Añadiste a Xxxx
Añadiste a Jorge Pinto Bosa
Buenas tardes para todos y todas
Les he estado llamando para invitarlos al sexto comité de participación ciudadana, pero algunos no me contestan
Igual están cordialmente invitados
Anexo el volante de invitación
Es importante contar con su participación
12:42 p. m.
INVITACION 6 COMITE DE P...
1 diapositiva • PPTX
12:43 p. m.
HOY
Xxxx salió del grupo
Escribe un mensaje

MYS

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RAP62
Versión 0
Fecha Emisión
24-Feb-2017

ACTA DE REUNIÓN

Inicio		**Fin**		**Lugar**	
Proyecto	CONTRATO CO1.PCCNTR.699128 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1				**Contrato No.**
Asistentes	Adjunto Listado de Asistencia	**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	28/11/2019.	**Elaborado por**	Margarita Romero	**Próxima Reunión**	Por Programar

El día de hoy se presenta, la supervisión de la secretaría de educación, felipe correal, de la interventoría del área social carolina. triviño del área tecnica cristian muñoz y de la constructora M45 el Arq Residente luis Prieto y la residente social Margarita Romero, con el objetivo de efectuar el 6° comite de participación ciudadana, reunion que fue convocada entre los dias 26 y 27 de noviembre de 2019, para la cual con firma 5 participantes del comite, representantes de la comunidad, siendo 10:50 am no se presenta ningun miembro del comite, por tanto se programara el siguiente comite de participacion ciudadana para el mes de diciembre El proceso de convocatoria se soportara en el informe mensual que corresponde al periodo.

Firma de residente Socjal de Contratista

Firma de residente Social de Interventoría

Scanned by CamScanner

MyS Constructora

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RAP63
Versión 0
Fecha Emisión 24-Feb-17

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Tema de la Reunión:	Sexto comité de Participación Ciudadana			**Proceso:**	Social
Área Responsable:	Social.	**Fecha:**	28/11/2019	**Lugar:**	Salón comunal Bicentenario II
Contratista responsable:	Margarita Romero · MyS Constructora			**Hora:**	10:00am.

No.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Felipe Correal Diaz	P.Social	SED-DCGE	3177981829	[illegible]	
2	Carolina Triviño	Prof. Social	Interventoria	3166315720	ktrimar93@gmail.com	
3	Cristian Camilo Munoz	Residente	Interventoria	3166998183	cvnperveirbosa@gmail.com	
4	Luis A. Prieto	Residente	Cont. MyS	3207709168	[illegible]	
5	Margarita Romero	Prof. Social	Contratista MyS	3183484744	atencionciudadanaperalvera.gmail.com	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Firma Residente Social – Contratista

Firma Residente Social - Interventoría

Scanned by CamScanner

MS	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1". **No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.** FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.699128 de 2018**	CARLOS VERGARA HUGUETI Ingeniería & Arquitectura

DATOS GENERALES	
Fecha de Recepción 15/10/2019.	Nombre del ciudadano Diana Yineth Tovar
Dirección Cll 55 sur # 102 A-08 casa F 14.	Teléfono 3134161119. / 4680358.

TIPOLOGIA		
Petición	Queja	Reclamo
Solicitud X.	Otra	Cual

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

La ciudadana solicita de manera Verbal se realice una visita a su predio, dado que expresa que se han presentado algunos fracasos en las áreas de cocina y baño. Por lo cual se presenta las áreas técnica y social de interventoría y contratista el día de hoy para realizar la respectiva inspección y seguimiento al acta de vecindad de inicio; Por lo cual se detiene realizar un video de las zonas afectadas, en pared de cocina y pared de ducha de baño del Piso #2. Desde la dirección de obra del contrato se entregará respuesta por escrito el día 22/10/2019.

Diana Yineth Tovar.
52748426 Bta

SEGUIMIENTO FECHA	TRAMITE	ESTADO
22/10/2019	Remisión de respuesta área	Abierto.
	técnica.	

Firma Residente social Contratista

C.C. 52825606.

Firma Residente social Interventoría

C.C 1015438973.

Scanned by CamScanner

M S	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1". **No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.** FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.699128 de 2018**	CARLOS VERGARA MORENO Ingenieros & Arquitectos

DATOS GENERALES	
Fecha de Recepción 22/10/2019.	Nombre del ciudadano Diana Tovar.
Dirección Cll 55 # 102-08 - Casa 14.	Teléfono 313 416 11 19.

TIPOLOGIA		
Petición	Queja	Reclamo
Solicitud X	Otra	Cual

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

El día de hoy el área social del contratista M45 visita el predio de la Sra Diana con el fin de informar que el proceso de solicitud fue remitido a la dirección del proyecto y a su vez, esta situación la estudiara el especialista técnico (contractual). Para determinar que esta pasando en la vivienda, específicamente en las areas de la cocina y baño del segundo nivel. Es importante resaltar que este día la ciudadana informa que el piso de la habitación #2 del segundo nivel tambien esta afectado, Por tanto se procede a realizar registro fotografico y se envia al director de obra para que junto con las fotografias tomadas el día de baño y cocina se realice un comparativo con el acta de vecindad de inicio y se pueda dar una respuesta a la Propietaria de la vivienda. Diana Yineth Tovar E. cc 52748426

SEGUIMIENTO FECHA	TRAMITE	ESTADO
31/10/2019.	Caso por Presuntas afectaciones en Seguimiento y estudio desde el area tecnica.	Abierta.

Firma Residente social Contratista

C.C. 52827506.

Firma Residente social Interventoria

C.C

Scanned by CamScanner

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

Bogotá, 24 de octubre de 2019 Cód.- CVN-BP-669046-187

Señores:
MYS CONSTRUCTORA.
Atn. Ing. CESAR RAUL GONZALES ERAZO
Representante Legal
Cra. 12 Nº 13 – 24 Barrio Santa Librada
Neiva Huila

Ref.: CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.669128 cuyo objeto es EJECUCUION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1.

ASUNTO: solicitud respuesta petición ciudadana

De acuerdo con las obligaciones contractuales solicitamos a ustedes de carácter urgente dar respuesta a la solicitud ciudadana instaurada por la peticionaria Diana Rodríguez la cual fue recibida de manera verbal el dia 15 de octubre de 2019 en el punto de atención a la comunidad puesto que el tiempo de estimado de respuesta efectiva no debe superar los 8 dias, se recuerda que la respuesta proyectada deberá ser enviada a revisión y aprobación por parte de la interventoria.

Cordialmente,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
Representante Legal

Oct. 24/2019
2:40 PM

Copia: Secretaria de Educacion
Elaboro
Revisó
Aprobó
Folios

Oficina Principal
Dirección: Carrera 9 No. 628-08. Montería – Córdoba
Telefax: (4) 7894734, Celular: 310 654 1925
E – mail: cordobacvn@gmail.com

Oficina Bogotá
Dirección: Carrera 56 No. 153-15 Interior 1 Apto 302. Bta.
Teléfono: (1) 3007441, Celular 3024238789 - 3173740811
E-mail: cvnbogota18@gmail.com

Scanned by CamScanner

CONS. OBRA 292-10-19

Bogotá D.C. octubre 25 de 2019

Señores,
CVN INGENIERÍA & ARQUITECTURA
Ing. CARLOS VERGARA NEGRETE
Representante Legal - Interventoría
Calle 159 No 54-69, Torre 1 ofic. 506. Bogotá D.C.
Tel. 300 74 41- (317) 374 0811
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.669128 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1

Asunto: RESPUESTA OFICIO CVN-BP-695946-187 SOLICITUD RESPUESTA PETICIÓN CIUDADANA

Cordial Saludo.

En respuesta a su solicitud me permito informar que el día 17 de octubre de 2019, se realizó la visita a la vivienda de la señora **Diana Rodríguez**, atendiendo a el requerimiento realizado por ella, en el punto de atención ciudadana el día 15 de octubre de 2019, dos (2) días después de su conocimiento, esta visita se realizó conjuntamente con la interventoría y las trabajadoras sociales.

En la visita realizada el día 17 de octubre, se tomo un registro fotográfico de las **"supuestas afectaciones"** a la vivienda de la señora Diana Rodríguez, con el fin de corroborarlo con lo registrado en el acta de vecindad y registro fotográfico inicial. El día 22 de octubre de 2019, la T.S Margarita Romero, complemento este registro fotográfico.

Esta visita fue de inspección visual y no implica aceptación, dado que el siguiente paso a seguir es enviar al Asesor y Especialista en Geotecnia y Estructura, esta información para que el pueda determinar si estas afectaciones corresponden o son imputables a el proceso constructivo de la obra o si bien, corresponden a una subsidencia del terreno donde se ubica la vivienda.

Cabe aclarar que este tipo de solicitudes de carácter técnico por su gran complejidad, no tienen el mismo tiempo de respuesta que se le puede dar a un requerimiento y/o una consulta de tipo social.

Atentamente,

Arq. CARLOS ALBERTO MEDINA LEÓN
DIRECTOR DE OBRA JARDIN PORVENIR
Cel. (321) 469 2680

Anexos: Relacionados en el oficio.

Scanned by CamScanner

DATOS GENERALES	
Fecha de Recepción 19-11-2019.	Nombre del ciudadano Diana Tovar.
Dirección Cll 55 No 102-08-casa 14.	Teléfono 3 13 4 16 11 19.

TIPOLOGIA		
Petición	Queja	Reclamo
Solicitud X.	Otra	Cual

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

A la presente se adjunta respuesta tecnica que es remitida por los especialistas Ing Luis German Bolla Baquero y el Arquitecto Carlos Medina Director de obra, el documento contiene en resumen el seguimiento a la solicitud presentada de manera verbal por la ciudadana Diana Tovar.
Este Documento contiene la respuesta tecnica frente a la reclamación por fisuras en la vivienda desde el area social el dia de hoy se entrega en domicilio dicha respuesta.
En conotacion de ello firman las Partes involucradas "Ciudadana, Interventoria y contratista" Diana Tovar.

SEGUIMIENTO FECHA	TRAMITE	ESTADO
19-11-2019.	Respuesta a solicitud acada-	Cerrado.
	dana.	
/	El dia de hoy la Sra Diana	/
	solicita los registros foto	
	graficos del acta de inicio.	

Firma Residente social Contratista

C.C. 52827506.

Firma Residente social Interventoría

C.C 1015438073.

Scanned by CamScanner

DISEÑADAS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y CIUDAD BOLIVAR, EN LA MODALIDAD MODULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ESTIPULADAS POR LA SED - GRUPO 1

No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.

FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO
ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.699128 de 2018**

CARLOS VERGARA RODRIGUEZ
Ingeniero Residente

DATOS GENERALES	
Fecha de Recepción 26/11/2019.	Nombre del ciudadano Diana Tovar
Dirección Cl 55 No 102-08 casa 14	Teléfono 3134161119

TIPOLOGIA		
Petición	Queja	Reclamo
Solicitud X.	Otra	Cual

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Se realiza entrega de CD a la Ciudadana Diana Tovar, el cual contiene registro fotográfico de la Acta de Veandad de inicio. Que se registro antes de iniciar la Obra constructiva del colegio.

Diana Tovar C

SEGUIMIENTO FECHA	TRAMITE	ESTADO
\	\	Cerrado

Firma Residente social Contratista

c.c. 52827506.

Firma Residente social Interventoría

c.c

Scanned by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

Radicado No. 20195730028741
Fecha: 25/02/2019

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

Que el(la) señor(a) JOHN FERNANDO PAEZ CASTRO, identificado (a) con el(la) CÉDULA DE CIUDADANIA No. 79971196, tiene(n) su domicilio en la CARRERA 102 C # 57 - 73 SUR , en Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 25 del mes de febrero del año 2019, a solicitud del interesado (a), para Trámites Legales distinto de los Titulos Valores.

Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS. En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distinto de los Titulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de Junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley antitrámites Decreto-Ley 19 de 2012.
Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'.

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL DE BOSA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 20195730028741

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 25/02/2019 02:32 PM

Scanned by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

Radicado No. 20195730028771
Fecha: 25/02/2019

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

Que el(la) señor(a) PABLO EDUARDO LOMBANA , identificado (a) con el(la) CÉDULA DE CIUDADANIA No. 79727979, tiene(n) su domicilio en la CALLE 55 SUR # 103 - 49 BQ 2 CA 17, en Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 25 del mes de febrero del año 2019, a solicitud del interesado (a), para Trámites Legales distinto de los Titulos Valores.

Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS. En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o trámite de documentos, distinto de los Titulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de Junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley antitrámites Decreto-Ley 19 de 2012.
Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'.

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
ALCALDE LOCAL DE BOSA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 20195730028771

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 25/02/2019 02:40 PM

Scanned by CamScanner
