MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 3023 DE 2023

ACTA No. 2 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 7**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, NIT. 830.508.271-2. R/L ANDERSON DEVIA MENESES. CC. No. 1.124.854.287 DE MOCOA**

MOCOA, NOVIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 18
5.1. Correspondencia Enviada 18
5.2. Correspondencia Recibida 19
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19
7. ANEXOS 19

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 24+0500 (Río Caquetá) y el PR 55+0600 (Puerto Bello – Río El Fragua) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, con una longitud de 32.52Km; y el Ramal Rio Tambor – Puente Huitota, intersección PR47+0200, con longitud de 3.5Km. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Cauca. Se aclara que el tramo se encuentra truncado porque no existe puente sobre el río Caquetá.

2.2. Estado actual de la vía

En el desarrollo del mes de octubre se realizaron trabajos de bacheo en afirmado manualmente, conformación de cunetas y zanjas de descoles, por lo cual se disminuye el deterioro de la superficie de rodadura, sin embargo, es necesario la intervención continua para la adecuada operatividad de la vía.

De igual forma, se llevaron a cabo las actividades de limpieza de obras de drenaje, puentes, control de material vegetal y recolección de basuras para el cumplimiento de indicadores y el mantenimiento del tramo vial.

En referencia a las estructuras que presentan daños, se tiene: puente Guascayaco, Puente Tambor y Puente Congor, los cuales se intervienen en la ejecución del contrato de obra No.985 de 2022.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3023 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 24+0500 (Rio Caquetá) - PR 55+0600 (Puerto Bello). / Ramal Rio Tambor - Puente Huitota - intersección PR 47+0200, vía 6501. Lote 7).
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof. NIT. 830.508.271-2
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Anderson Devia Meneses. C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	25 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$208.938.177,00 M/Cte. incluido IVA
Adiciones:	Sin tramite de adiciones a la fecha.
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $208.938.177
	Valor Básico: $205.390.522
	Valor IVA: $ 3.547.655
Modificación No.2 de 2023	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $208.584.013
	Valor Básico: $205.042.372
	Valor IVA: $ 3.541.641
Prórrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311-292 56 22
Domicilio Contratista:	Vereda Miraflor, Municipio de Piamonte, Departamento del Cauca

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del Invías, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Limpieza manual de cunetas en tierra.

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
10/10/2023	29+700	30+100		X	800	7	SECO
24/10/2023	49+000	49+060		X	120	13	SECO
	51+000	51+020		X	40	13	SECO
	53+500	53+550		X	100	13	SECO
30/10/2023	24+500	24+800		X	600	10	SECO

Registro fotográfico 10/10/2023.





Registro fotográfico 24/10/2023.









Registro fotográfico 30/10/2023.





- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
10/10/2023	26+600	29+950	1.977	6	SECO
21/10/2023	29+900	30+120	119	8	SECO
	48+000	48+150	74	5	SECO
24/10/2023	53+470	53+490	9	13	SECO
	54+200	54+220	10	13	SECO

Registro fotográfico 10/10/2023.





Registro fotográfico 21/10/2023.





Registro fotográfico 24/10/2023.



- Rocería y desmonte manual.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER			
2/10/2023	46+050	47+800	1.750	4,20	4,10	14.525,00	11	SECO
3/10/2023	33+560	34+600	1.040	3,20	4,00	7.488,00	11	SECO
4/10/2023	34+600	36+100	1.500	4,30	3,90	12.300,00	9	SECO
5/10/2023	24+500	25+900	1.400	2,50	3,20	7.980,00	13	SECO
6/10/2023	25+900	26+950	1.050	3,20	3,50	7.035,00	13	SECO
7/10/2023	26+950	28+000	1.050	3,70	2,90	6.930,00	13	SECO
9/10/2023	28+000	29+600	1.600	2,70	1,90	7.360,00	13	LLUVIA
11/10/2023	36+000	37+500	1.500	2,00	2,50	6.750,00	13	SECO
12/10/2023	37+500	38+800	1.300	3,10	2,90	7.800,00	13	SECO
13/10/2023	38+800	40+300	1.500	3,30	2,70	9.000,00	13	SECO

14/10/2023	40+300	41+050	750	3,00	2,50	4.125,00	13	LLUVIA
17/10/2023	43+000	46+000	3.000	2,30	2,50	14.400,00	13	SECO
18/10/2023	42+000	43+000	1.000	2,20	2,50	4.700,00	13	LLUVIA
19/10/2023	41+000	42+000	1.000	3,50	2,20	5.700,00	9	SECO
23/10/2023 (Intersección Puente Huitota)	47+200	50+500	3.300	4,00	4,00	26.400,00	13	SECO

Registro fotográfico 02/10/2023





Registro fotográfico 03/10/2023





Registro fotográfico 04/10/2023





Registro fotográfico 05/10/2023





Registro fotográfico 06/10/2023





Registro fotográfico 07/10/2023





Registro fotográfico 09/10/2023





Registro fotográfico 11/10/2023





Registro fotográfico 12/10/2023





Registro fotográfico 13/10/2023





Registro fotográfico 14/10/2023





Registro fotográfico 17/10/2023





Registro fotográfico 18/10/2023





Registro fotográfico 19/10/2023





Registro fotográfico 23/10/2023





- Limpieza de puentes y pontones.

FECHA	ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
2/10/2023	RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA	PUENTE HUITOTA	45,00	2	SECO
3/10/2023				2	SECO

Registro fotográfico 02/10/2023





Registro fotográfico 03/10/2023





- Limpieza obras de arte (alcantarillas).

FECHA	PR		LONG (ML)	CANT (UND)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
25/10/2023	41+500	49+000	N/A	10	9	SECO
26/10/2023	34+600	41+500	N/A	15	13	SECO
31/10/2023	24+500	34+600	N/A	20	6	SECO

Registro fotográfico 25/10/2023





Registro fotográfico 26/10/2023






Registro fotográfico 31/10/2023





Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

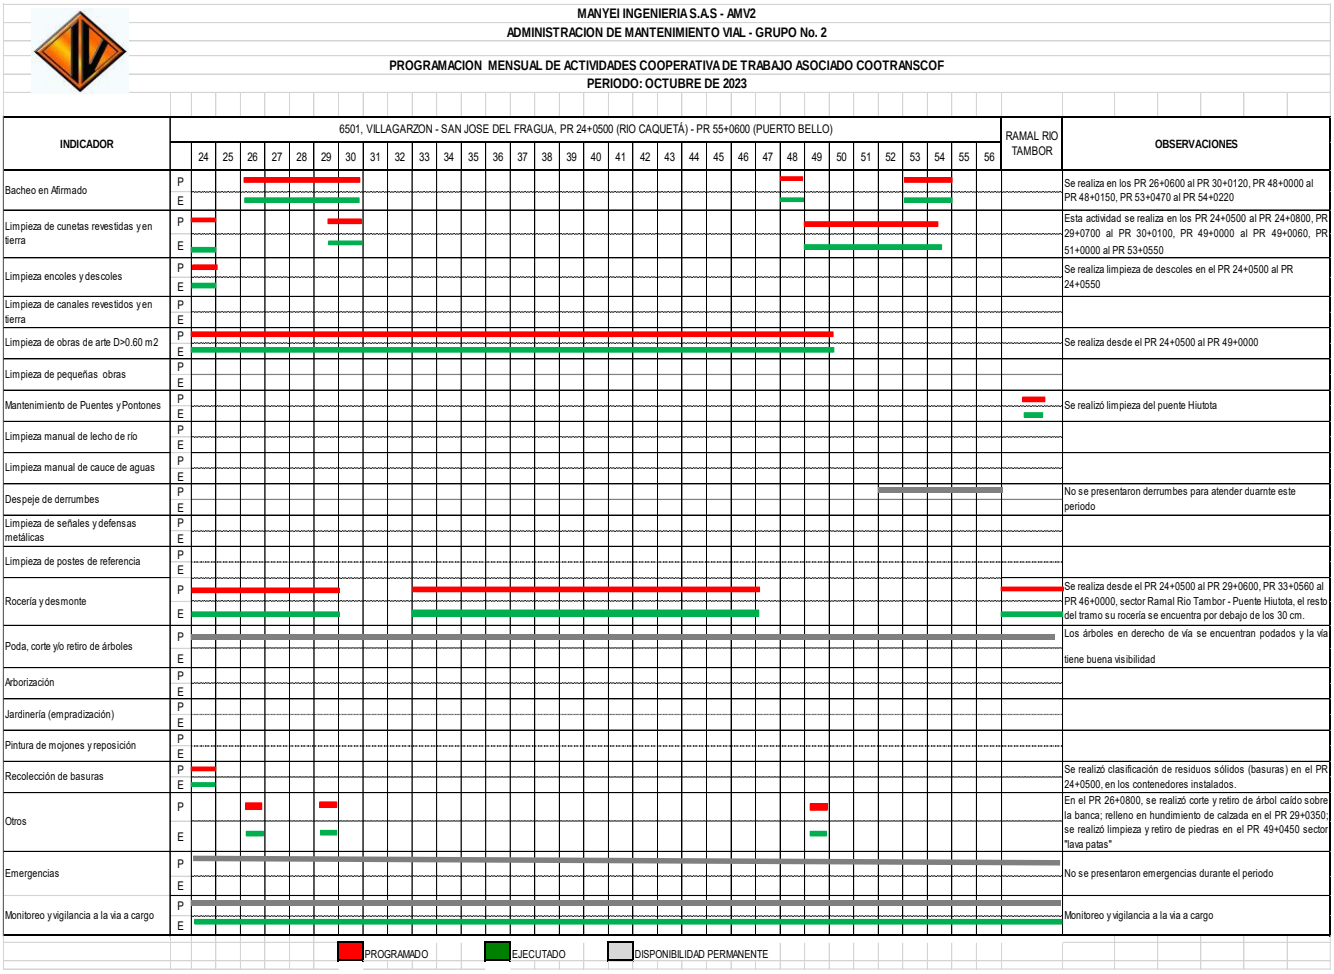

MANYEI INGENIERIA S.A.S - AMV2
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2
PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF
PERIODO: OCTUBRE DE 2023

INDICADOR		6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO)																																RAMAL RIO TAMBOR	OBSERVACIONES
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
Bacheo en Afirmado	P																																			Se realiza en los PR 26+0600 al PR 30+0120, PR 48+0000 al PR 48+0150, PR 53+0470 al PR 54+0220
	E																																		
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																																			Esta actividad se realiza en los PR 24+0500 al PR 24+0800, PR 29+0700 al PR 30+0100, PR 49+0000 al PR 49+0060, PR 51+0000 al PR 53+0550
	E																																		
Limpieza encoles y descoles	P																																			Se realiza limpieza de descoles en el PR 24+0500 al PR 24+0550
	E																																		
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																																			
	E																																		
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																																			Se realiza desde el PR 24+0500 al PR 49+0000
	E																																		
Limpieza de pequeñas obras	P																																			
	E																																		
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																																			Se realizó limpieza del puente Hiutota
	E																																		
Limpieza manual de lecho de río	P																																			
	E																																		
Limpieza manual de cauce de aguas	P																																			
	E																																		
Despeje de derrumbes	P																																			No se presentaron derrumbes para atender duarnte este periodo
	E																																		
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																																			
	E																																		
Limpieza de postes de referencia	P																																			
	E																																		
Rocería y desmonte	P																																			Se realiza desde el PR 24+0500 al PR 29+0600, PR 33+0560 al PR 46+0000, sector Ramal Rio Tambor - Puente Hiutota, el resto del tramo su rocería se encuentra por debajo de los 30 cm.
	E																																		
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																																			Los árboles en derecho de vía se encuentran podados y la vía tiene buena visibilidad
	E																																		
Arborización	P																																			
	E																																		
Jardinería (empradización)	P																																			
	E																																		
Pintura de mojones y reposición	P																																			
	E																																		
Recolección de basuras	P																																			Se realizó clasificación de residuos sólidos (basuras) en el PR 24+0500, en los contenedores instalados.
	E																																		
Otros	P																																			En el PR 26+0800, se realizó corte y retiro de árbol caído sobre la banca; relleno en hundimiento de calzada en el PR 29+0350; se realizó limpieza y retiro de piedras en el PR 49+0450 sector "lava patas"
	E																																		
Emergencias	P																																			No se presentaron emergencias durante el periodo
	E																																		
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																																			Monitoreo y vigilancia a la via a cargo
	E																																		

PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD PERMANENTE

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicionales:	Sin trámite a la fecha
Valor Contractual Final:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 17 de enero de 2024
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
21/10/2023	CTO 2585-2023-034	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Atn. Sra. Maira Leonela Burbano Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales Contratistas Servicio de Mantenimiento Rutinario	Solicitud requisitos elementos trabajos en altura.
21/10/2023	CTO 2585-2023-036	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Atn. Sra. Maira Leonela Burbano Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales Contratistas Servicio de Mantenimiento Rutinario	Solicitud de documentación SST
20/10/2023	CTO 2585-2023- 037	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO	Reiteración uniformes cooperativas de mantenimiento rutinario.

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
		Atn. Sra. Maira Leonela Burbano Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales Contratistas Servicio de Mantenimiento Rutinario	

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
25/10/2023		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF R/l Anderson Devia Meneses.	Respuesta solicitud documentación SST.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por la cooperativa de trabajadores asociados Cootranscof en coordinación con la Administración de mantenimiento vial Grupo 2, se llevaron a cabo de acuerdo a la programación para el periodo y de acuerdo al manual de mantenimiento de carretera del Instituto, logrando el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 06 de noviembre de 2023.

MANYEI INGENIERIA SAS



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 2971 DE 2023

ACTA No. 2 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ). LOTE 6.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A. NIT. 846.001.066-1. R/L SERVIO TULIO DAVID INZANDARÁ. CC. No. 18.102.124 DE VILLAGARZÓN**

MOCOA, NOVIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 22
5.1. Correspondencia Enviada 22
5.2. Correspondencia Recibida 23
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24
7. ANEXOS 24

1. INTRODUCCIÓN

En el presente se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón del Putumayo C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023. En el mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento Corazón del Putumayo C.T.A. tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 2+0750 (EL PORVENIR) y el PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo.

2.2. Estado actual de la vía

En el desarrollo del presente periodo con el objetivo de disminuir los deterioros de la superficie de rodadura se realizó actividad de bacheo manualmente en sitios críticos con presencia de baches continuos, de igual forma se llevó a cabo conformación manual de cunetas, por lo cual se mantiene las condiciones de transitabilidad, sin embargo, es necesario la intervención de mantenimiento periódico con conformación de calzada y adición de material en sitios, tales como: PR16+0500 – PR16+0700, PR19+0000 – PR19+0200, PR22+0500-PR22+0700, entre otros, para mantener la adecuada operatividad en el tramo vial.

Las condiciones actuales de la vía en cuanto superficie de rodadura es regular, ya que se presentan baches, perdida de agregado, y perdida de pendientes; por lo cual es necesario la intervención con maquinaria y suministro de afirmado para recuperar las características de la carretera.

El contrato de mejoramiento y mantenimiento No.985 de 2022, que se ejecuta en la vía 6501 por el consorcio Vías Colombia, en el presente periodo no realizaron actividades, por lo cual continúan deterioros tales como: erosiones, ondulaciones, depresiones, y demás irregularidades que representan incomodidad a los vehículos que transitan.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	2971 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicios de mantenimiento rutinario.
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección Territorial Putumayo. Sectores 6501, Villagarzón - San José del Fragua, PR 2+0750 (El Porvenir) - PR 24+0000 (Río Caquetá). Lote 6.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado de Mantenimiento y Conservación de Vías Corazón del Putumayo C.T.A. NIT. 846.001.066-1.
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Servio Tulio David Inzandará. C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales.
Orden de inicio:	25 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$126.814.310 M/Cte. incluido IVA
Adiciones:	Sin tramite de adiciones a la fecha.
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.
Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $126.814.310
	Valor Básico: $124.661.073
	Valor IVA: $ 2.153.237
Modificación No.2 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $126.599.351
	Valor Básico: $124.449.764
	Valor IVA: $ 2.149.587

Prórrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	320-451 06 44
Domicilio Contratista:	Sector urbano, Municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón del Putumayo correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
02/10/2023	18+300	18+400	550	8	SOL
02/10/2023	18+450	18+600	342	8	SOL
03/10/2023	18+600	19+000	1.960	8	SOL
04/10/2023	19+000	19+650	3.640	8	SOL
05/10/2023	19+650	20+500	4.675	8	SOL
06/10/2023	2+700	3+151	2.700	8	SOL
07/10/2023	3+151	3+350	1.200	8	SOL
09/10/2023	3+350	3+550	1.160	8	LLUVIA
10/10/2023	12+900	13+200	1.800	5	LLUVIA
11/10/2023	12+650	12+900	1.425	5	SOL
12/10/2023	12+400	12+650	1.425	5	SOL
13/10/2023	11+850	12+400	2.970	4	SOL

17/10/2023	11+350	11+850	2.450	8	SOL
18/10/2023	10+700	11+350	3.250	8	SOL
19/10/2023	10+050	10+700	3.250	8	SOL
20/10/2023	9+500	10+050	2.860	8	SOL
23/10/2023	9+250	9+500	1.300	8	SOL

Registro fotográfico 02/10/2023





Registro fotográfico 03/10/2023





Registro fotográfico 04/10/2023





Registro fotográfico 05/10/2023





Registro fotográfico 06/10/2023





Registro fotográfico 07/10/2023





Registro fotográfico 09/10/2023





Registro fotográfico 10/10/2023





Registro fotográfico 11/10/2023





Registro fotográfico 12/10/2023





Registro fotográfico 13/10/2023





Registro fotográfico 17/10/2023





Registro fotográfico 18/10/2023





Registro fotográfico 19/10/2023





Registro fotográfico 20/10/2023





Registro fotográfico 23/10/2023





- Limpieza manual de cunetas en tierra.

FECHA	PR		LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
2/10/2023	18+300	18+400	200	8	SOL
	18+450	18+600	300	8	SOL
3/10/2023	18+600	19+000	800	8	SOL
4/10/2023	19+000	19+650	1.300	8	SOL
5/10/2023	19+650	20+500	1.700	8	SOL
9/10/2023	3+350	3+550	400	4	LLUVIA
10/10/2023	12+900	13+200	600	5	LLUVIA

11/10/2023	12+650	12+900	500	5	SOL
12/10/2023	12+400	12+650	500	5	SOL
13/10/2023	11+850	12+400	1.100	4	SOL
17/10/2023	11+350	11+850	1.000	8	SOL
18/10/2023	10+700	11+350	1.300	8	SOL
20/10/2023	9+500	10+050	1.100	8	SOL
23/10/2023	9+250	9+500	500	8	SOL

Registro fotográfico 02/10/2023





Registro fotográfico 03/10/2023





Registro fotográfico 04/10/2023





Registro fotográfico 05/10/2023





Registro fotográfico 09/10/2023





Registro fotográfico 10/10/2023





Registro fotográfico 11/10/2023





Registro fotográfico 12/10/2023





Registro fotográfico 13/10/2023





Registro fotográfico 17/10/2023





Registro fotográfico 18/10/2023





Registro fotográfico 20/10/2023





Registro fotográfico 23/10/2023





- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
10/10/2023	23+100	24+000	900	3870	3	LLUVIA
11/10/2023	22+200	23+100	900	3600	3	SECO
12/10/2023	21+800	22+200	400	1200	3	SECO
13/10/2023	20+600	21+800	1.200	4920	4	SECO
24/10/2023	19+000	20+600	1.600	6880	8	SECO
25/10/2023	17+000	19+000	2.000	8400	8	SECO

26/10/2023	15+000	17+000	2.000	7400	8	LLUVIA
28/10/2023	13+800	15+000	1.200	4200	8	SECO
30/10/2023	12+400	13+800	1.400	5320	8	SECO
31/10/2023	11+400	12+400	1.000	3300	8	LLUVIA

Registro fotográfico 10/10/2023





Registro fotográfico 11/10/2023





Registro fotográfico 12/10/2023





Registro fotográfico 13/10/2023





Registro fotográfico 24/10/2023





Registro fotográfico 25/10/2023





Registro fotográfico 26/10/2023





Registro fotográfico 28/10/2023





Registro fotográfico 30/10/2023





Registro fotográfico 31/10/2023





Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

MANYEI INGENIERIA SAS - AMV 2

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2

OGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.

PERIODO: 1 al 31 octubre de 2023

INDICADOR		PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ)																						OBSERVACIONES
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Bacheo en Afirmado	P																							Se realizó en los sitios más críticos PR2+0750 al PR3+0550 y del PR9+0250 al PR20+0500
	E																							
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																							Se realizó en los puntos de mayor prioridad PR3+0350 al PR3+0550, PR9+0250 al PR13+0200 y PR18+0300 al PR19+0650
	E																							
Limpieza encoles y descoles	P																							
	E																							
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																							
	E																							
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																							
	E																							
Limpieza de pequeñas obras	P																							
	E																							
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																							
	E																							
Limpieza manual de cauce de aguas (lecho de río)	P																							
	E																							
Despeje de derrumbes	P																							No se presentaron derrumbes durante el periodo
	E																							
Limpieza de calzada	P																							
	E																							
Rocería y desmonte	P																							Se realizó desde el PR11+0400 al PR24+000
	E																							
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																							PR17+0050
	E																							
Arborización	P																							
	E																							
Limpieza de postes de referencia	P																							
	E																							
Pintura de mojones y reposición	P																							
	E																							
Recoleccion de basuras	P																							Desde el PR 2+0750 al PR7+0000
	E																							
Otros	P																							PR10+0100, PR14+0700, PR17+0100, PR19+0500-PR19+0550 corte y retiro de árbol caídos sobre de la calzada; PR16+0600 Arreglo de calzada;
	E																							
Emergencias	P																							
	E																							
Vigilancia y monitoreo	P																							INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VÍA A CARGO EN HORAS DE LA MAÑANA, MEDIO DÍA Y TARDE
	E																							

PROGRAMADO EJECUTADO PERMANENTE

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicionales:	Sin trámite a la fecha
Valor Contractual Final:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 17 de enero de 2024
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
10/10/2023	CTO 2585-2023-025	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A Atn. Sr. Servio Tulio David Inzandará Representante Legal Contratista Mantenimiento Rutinario	Incumplimiento presentación acta mensual No. 01 Septiembre de 2023.

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
10/10/2023	CTO 2585-2023 - 025	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A	Llamado de atención incumplimiento acta parcial n°1.
21/10/2023	CTO 2585-2023-034	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Atn. Sra. Maira Leonela Burbano Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales Contratistas Servicio de Mantenimiento Rutinario	Solicitud requisitos elementos trabajos en altura.
21/10/2023	CTO 2585-2023-036	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Atn. Sra. Maira Leonela Burbano Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales Contratistas Servicio de Mantenimiento Rutinario	Solicitud de documentación SST
20/10/2023	CTO 2585-2023-037	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Atn. Sra. Maira Leonela Burbano Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales Contratistas Servicio de Mantenimiento Rutinario	Reiteración uniformes cooperativas de mantenimiento rutinario.
26/10/2023	CTO 2585-2023-041	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A Atn. Sr. Servio Tulio David Inzandará Representante Legal	Observaciones de SST Recorrido 13 de octubre 2023.

5.2. Correspondencia Recibida:

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
22/10/2023		PROFESIONAL SST COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A	Respuesta solicitud documentos SST.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por la cooperativa de trabajadores asociados en coordinación con la Administración de mantenimiento vial Grupo 2, se llevaron a cabo de acuerdo a la programación para el periodo y según lo establecido en el manual de mantenimiento de carretera del Instituto, logrando el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 06 de noviembre de 2023.

MANYEI INGENIERIA SAS



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 3002 DE 2023

ACTA No. 2 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA) /4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA. LOTE 5.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA. NIT. 800.102.361-4. R/L MAIRA LEONELA BURBANO CHICANGANA. CC. No. 1.064.676.650 DE SOTARÁ - CAUCA**

MOCOA, NOVIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 20
5.1. Correspondencia Enviada 20
5.2. Correspondencia Recibida 20
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21
7. ANEXOS 21

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía durante el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023. En el mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía tiene a cargo los sectores comprendidos entre el PR 60+0300 (Ye Urcusique) y el PR 77+1000 (Mocoa) de la Carretera 4502 Santana – Mocoa; el sector entre el PR 0+0000 y el PR 1+0600 (paso nacional por Mocoa) de la Carretera 4503 Mocoa – Pitalito; y la vía Perimetral a Mocoa, con longitud total a atender de 21.83Km.

2.2. Estado de la vía

La carretera 4502, Santa Ana – Mocoa, sector La Ye de Urcusique - El Pepino – Mocoa, se encuentra en buen estado en general como resultado de las actividades de mantenimiento rutinario, sin embargo, cuenta con sitios críticos que requieren atención por perdida parcial de banca, inestabilidad de taludes o daños en puentes, tales como: PR61+0400 y PR65+0300 (instabilidad talud), PR70+0020 y PR70+0242 (perdida parcial de banca), y entre puentes se requiere el mantenimiento de la superficie de rodadura del puente Rumiyaco 1 localizado en el PR74+0150. De igual forma es necesario demarcación de señalización horizontal e instalación de señales verticales para complementar la existente o en tramos de alta accidentalidad.

La carretera 4503, Mocoa – Pitalito, sector Paso Nacional por Mocoa, la superficie de rodadura consiste en estructura de pavimento en concreto rígido el cual presenta alto desgaste por alcanzar su vida útil, presentando deterioros tipo fisuras, grietas, baches, pulimento, cabezas duras, perdida de sello en juntas, parcheo, descascaramiento, entre otros, los cuales requieren atención por medio de intervención de actividades de mantenimiento periódico, rehabilitación o reconstrucción.

Para el mantenimiento periódico del tramo vial, el instituto Nacional de Vías suscribió el contrato de obra No.3821-2023 que tiene por objeto “Mantenimiento del paso nacional por el municipio de Mocoa, PR0+0000 – PR1+0600, Departamento Putumayo”; el cual no inicia actividades de intervención de la capa de rodadura, quedando pendiente las obras de reparación en el pavimento.

En la carretera Perimetral de Mocoa, el tramo vial cuenta con longitud 2.3Km en pavimento de concreto rígido, en general buen estado, con presencia de fisuras puntuales y algunas losas fracturadas.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3002 DE 2023
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario.
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección Territorial Putumayo. sectores 4502, Santa Ana - Mocoa, Ye Urcusique - Mocoa, PR 60+0300 - PR 77+1000 (Mocoa) /4503, Mocoa - Pitalito, Paso nacional por Mocoa, PR 0+0000 - PR 1+0600/carretera perimetral de Mocoa. lote 5.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía. NIT. 800.102.361-4
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Maira Leonela Burbano Chicangana. C.C. No. 1.064.676.650 de Sotará – Cauca.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales.
Orden de inicio:	27 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$112.576.454 M/Cte. incluido IVA
Adiciones:	Sin tramite de adiciones a la fecha.
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023.

Modificación No.1 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $112.576.454
	Valor Básico: $110.664.968
	Valor IVA: $ 1.911.486
Modificación No.2 de 2023:	Modificación Clausula Cuarta: Apropiación Presupuestal:
	Valor total: $112.385.630
	Valor Básico: $110.477.384
	Valor IVA: $ 1.908.246
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Interventor:	MANYEI Ingeniería SAS - Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 2.
Supervisor de Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	312-658 13 50
Domicilio Contratista:	Vereda San José del Pepino, Mocoa, Departamento del Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado


Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en carretera en afirmado en la vía 4502: Santa Ana – Mocoa.

FECHA	PR		AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
17/10/2023	67+700	67+730	20	6	SECO
23/10/2023	63+700	64+500	512	7	SECO
25/10/2023	64+500	66+000	960	7	SECO
26/10/2023	66+000	67+700	1.105	7	SECO
31/10/2023	61+000	63+700	1.512	7	SECO

Registro fotográfico 17/10/2023



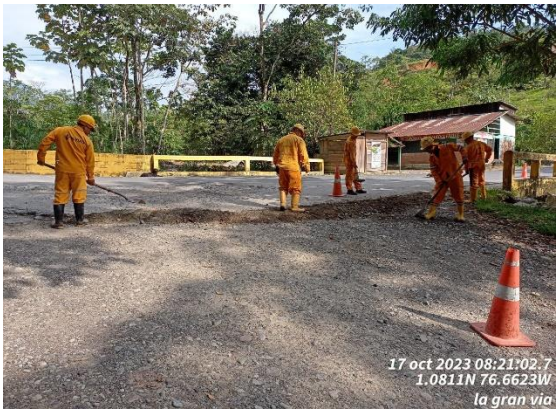

Registro fotográfico 23/10/2023





Registro fotográfico 25/10/2023





Registro fotográfico 26/10/2023





Registro fotográfico 31/10/2023





- Limpieza manual de cunetas en revestidas y en tierra en la vía 4502.

FECHA	PR		LONGITUD TOTAL	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	(ML)		
9/10/2023	70+000	71+000	2.000,00	7	SECO
11/10/2023	72+500	74+000	3.000,00	7	SECO
21/10/2023	74+000	74+100	200,00	6	SECO
	67+000	67+200	400,00	6	SECO
24/10/2023	67+100	67+120	40,00	7	SECO
25/10/2023	64+400	64+450	100,00	7	SECO
	65+100	65+150	100,00	7	SECO

26/10/2023	67+500	67+700	400,00	7	SECO
31/10/2023	68+000	68+400	800,00	7	SECO

Registro fotográfico 09/10/2023





Registro fotográfico 11/10/2023





Registro fotográfico 21/10/2023





Registro fotográfico 24/10/2023





Registro fotográfico 25/10/2023





Registro fotográfico 26/10/2023





Registro fotográfico 31/10/2023





- Rocería en la vía 4502.

FECHA	PR		AREA	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	(M2)		
6/10/2023	67+700	69+000	4.550,00	7	SECO
7/10/2023	69+000	70+000	3.300,00	7	SECO
9/10/2023	70+000	71+000	1.900,00	7	SECO
11/10/2023	72+500	74+000	5.550,00	7	SECO
12/10/2023	74+000	76+000	6.400,00	7	SECO
13/10/2023	76+000	78+000	4.400,00	7	SECO

Registro fotográfico 06/10/2023





Registro fotográfico 07/10/2023





Registro fotográfico 09/10/2023





Registro fotográfico 11/10/2023





Registro fotográfico 12/10/2023





Registro fotográfico 13/10/2023





- Limpieza de señales en la via 4502.

FECHA	PR		TIPO DE SEÑAL		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	VERTICAL	DEFENSA METÁLICA Y DCH			
5/10/2023	60+300	77+000	X		156	7	SECO

Registro fotográfico 05/10/2023





- Limpieza de calzadas en la via 4502.

FECHA	PR		LONG (ML)	ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
23/10/2023	67+100	67+120	20,00	90	7	SECO
24/10/2023	67+100	67+120	20,00	90	7	SECO

Registro fotográfico 23/10/2023





Registro fotográfico 24/10/2023





- Limpieza manual de cunetas revestidas y en tierra en la via 4503.

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
18/10/2023	0+0000	1+600	X		1.600	7	SECO

Registro fotográfico 18/10/2023





Roceria en la via 4503.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	AREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL				
18/10/2023	0+	1+600	1600,00	2.800,00	7	SECO

Registro fotográfico 18/10/2023





- Limpieza de la calzada en la via 4503.

FECHA	PR		LONG (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
17/10/2023	0+400	0+420	20,00	7	SECO
	0+120	0+125	5,00	7	SECO

Registro fotográfico 17/10/2023





- Limpieza manual de cunetas revestidas y en tierra en la via Perimetral – Mocoa.

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA			
3/10/2023	1+000	1+500	X		500	7	SECO
4/10/2023	1+500	2+500	X		1.000	7	SECO

Registro fotográfico 04/10/2023






- Rocería en la via Perimetral – Mocoa.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL			
2/10/2023	0+	1+000	1000,00	7	SECO
3/10/2023	1+000	1+500	500,00	7	SECO
4/10/2023	1+500	2+500	1000,00	7	SECO

Registro fotográfico 02/10/2023



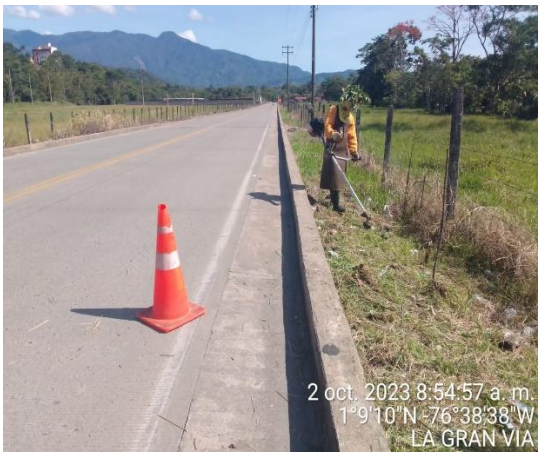

Registro fotográfico 03/10/2023





Registro fotográfico 04/10/2023





- Limpieza de señales en la via Perimetral – Mocoa.

FECHA	PR		TIPO DE SEÑAL		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA
	INICIAL	FINAL	VERTICAL	DEFENSA METÁLICA			
19/10/2023	0+0000	1+300	X		18	7	SECO
20/10/2023	1+0300	2+500	X	X	21	7	SECO

Registro fotográfico 19/10/2023





Registro fotográfico 20/10/2023





Cuadro de actividades programadas y ejecutadas:

MANYEI INGENIERIA SAS - AMV 2

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO No. 2

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA

PERIODO: 1 al 31 de octubre de 2023

INDICADOR		4502, SANTA ANA - MOCOA (PR 60+0300 - PR 77+1000)																	4503			PERIMETRAL MOCOA	OBSERVACIONES
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	0	1	2	
Bacheo Carreteras Pavimentadas	P																						
	E																						
Parcheo Carreteras Pavimentadas	P																						Se realizó en el PR68+0000, PR70+0200, PR73+0300, PR74+0300 vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+0400, PR0+0120, PR1+0500 y PR1+0600 vía 4503 Mocoa - Pitalito
	E																						
Bacheo en Afirmado	P																						Se realizó desde el PR 61+0000 al PR 67+0730, vía 4502 Santa Ana - Mocoa
	E																						
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																						Se realizó esta actividad en los sitios más críticos entre los PR64+0500, PR65+0100 al PR65+0150, PR67+0000 al PR67+0700, PR68+0000 al PR68+0400, PR70+0000 al PR71+0000, PR72+0500 al PR76+0000 en la vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+0000 al PR1+0600 vía 4503 Mocoa - Pitalito; PR1+0000 al PR2+0500 Carretera Perimetral Mocoa
	E																						
Limpieza encoles y descoles	P																						Se realizó limpieza de alcantarilla en el PR0+0300 carretera Perimetral Mocoa
	E																						
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																						
	E																						
Limpieza de obras	P																						Se realizó limpieza de alcantarilla en el PR0+0300 carretera Perimetral Mocoa
	E																						
Limpieza de pequeñas obras	P																						
	E																						
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																						
	E																						
Limpieza manual de cauce de aguas (Lecho de rio)	P																						
	E																						
Despeje de derrumbes	P																						No se presentaron derrumbes
	E																						
Limpieza de calzada	P																						Se realiza limpieza de calzada desde el PR67+0100 al PR67+0120 vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR 0+0120 al PR0+0125 y PR0+0400 al PR0+0420 vía 4503 Mocoa - Pltalito
	E																						
Rocería y desmonte	P																						Se realizó desde el PR67+0700 al PR77+1000 vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+0000 al PR1+0600 vía 4503 Mocoa - Pitalito; PR0+0000 al PR2+0500 Carretera Perimetral Mocoa
	E																						
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																						Se realizó desde el PR67+0700 al PR69+0000 vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+0000 al PR2+0500 carretera Perimetral Mocoa
	E																						
Recolección de Basuras	P																						Se realizó en los PR67+0500 y PR68+0900, PR73+0000 al PR77+1000 vía 4502 Santa Ana - Mocoa
	E																						
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																						Se realiza desde el PR60+0300 al PR77+000 vía 4502 Santa Ana - Mocoa; PR0+000 al PR2+0500 carretera Perimetral Mocoa
	E																						
Pintura de resaltos (reductores de velocidad)	P																						
	E																						
Emergencias	P																						No se presentaron emergencias en el tramo a cargo
	E																						
Otros																							Se realizó señalización PR70+0000 al PR70+0020
Inspección y vigilancia	P																						INSPECCIÓN DE LAS VÍAS A CARGO 4502 Y 4503, Y CARRETERA PERIMETRAL MOCOA SE REALIZA EN JORNADA MAÑANA Y TARDE
	E																						

PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD PERMANENTE

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2585 DE 2023
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-013-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 7".
Contratista:	MANYEI INGENIERIA SAS, NIT 900065778 – 5
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Janini Johana Ortega Ochoa. C.C. No.55.227.016 de Barranquilla – Atlántico.
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	18 de septiembre de 2023
Valor Contractual Inicial:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Adicionales:	Sin trámite a la fecha
Valor Contractual Final:	$375.843.799 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 17 de enero de 2024
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	315 612 9970
Domicilio Interventor:	Calle 3 #11-7, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
05/10/2023	CTO 2585-2023-021	**Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía.** Ath. Sr Maira Burbano.	Respuesta solicitud remplazo personal.
21/10/2023	CTO 2585-2023-034	**COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO** Atn. Sra. Maira Leonela Burbano Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales Contratistas Servicio de Mantenimiento Rutinario	Solicitud requisitos elementos trabajos en altura.
21/10/2023	CTO 2585-2023-036	**COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO** Atn. Sra. Maira Leonela Burbano	Solicitud de documentación SST

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
		Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales Contratistas Servicio de Mantenimiento Rutinario	
20/10/2023	CTO 2585-2023-037	**COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO** Atn. Sra. Maira Leonela Burbano Atn. Sr. Servio Tulio David I Atn. Sr. Anderson Devia Meneses Representantes Legales Contratistas Servicio de Mantenimiento Rutinario	Reiteración uniformes cooperativas de mantenimiento rutinario.
26/10/2023	CTO 2585-2023-042	**Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía.** Ath. Sr Maira Burbano.	Observaciones recorrido vía.

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
23/10/2023		**Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía.** Ath. Sr Maira Burbano.	Información remplazo colaborador.
23/10/2023		**Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía.** Ath. Sr Maira Burbano.	Respuesta solicitud documentos SST.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por la cooperativa de trabajadores asociados en coordinación con la Administración de mantenimiento vial Grupo 2, se llevaron a cabo de acuerdo a la programación para el periodo y de acuerdo al manual de mantenimiento de carretera del Instituto, logrando el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato.

7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 06 de noviembre de 2023.

MANYEI INGENIERIA SAS



WILLIAM DARIO VALENCIA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2
