

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece
1		**1**	**INICIO DE OBRA**	**83 días**	**mar 29/08/23**	**sáb 9/12/23**	
2		**1.1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**83 días**	**mar 29/08/23**	**sáb 9/12/23**	
3		1.1.1	RELLENO GRAVILLA FINA 1/2	4 días	mar 29/08/23	vie 1/09/23	
4		1.1.2	DESMONTES DE PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	6 días	mar 29/08/23	mar 5/09/23	
5		1.1.3	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PARALES RETIRO Y DISPOSCION FINAL CON CERTIFICACION INFR	23 días	mar 29/08/23	mar 26/09/23	
6		1.1.4	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	1 día	mar 29/08/23	mar 29/08/23	
7		1.1.5	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M	83 días	mar 29/08/23	sáb 9/12/23	
8		1.1.6	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA Y/O DRYWALL E <25 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSCION FINAL	35 días	mar 29/08/23	mié 11/10/23	
9		1.1.7	EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD 1 A 2M	51 días	mar 29/08/23	mar 31/10/23	
10		1.1.8	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	8 días	mar 29/08/23	jue 7/09/23	
11		1.1.9	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	11,5 días	mar 29/08/23	mar 12/09/23	
12		1.1.10	ASEO DE OBRA	1 día	mar 29/08/23	mar 29/08/23	
13		**2**	**MAMPOSTERÍA**	**41 días**	**mar 26/09/23**	**jue 16/11/23**	
14		2.1	MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO	41 días	mar 26/09/23	jue 16/11/23	5
15		**3**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**81 días**	**mar 29/08/23**	**jue 7/12/23**	
16		3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS Y VIGAS EN CONCRETO DE 3000PSI	25 días	mar 26/09/23	jue 26/10/23	14CC
17		3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA MUROS DE 4000PSI	15 días	mar 29/08/23	vie 15/09/23	

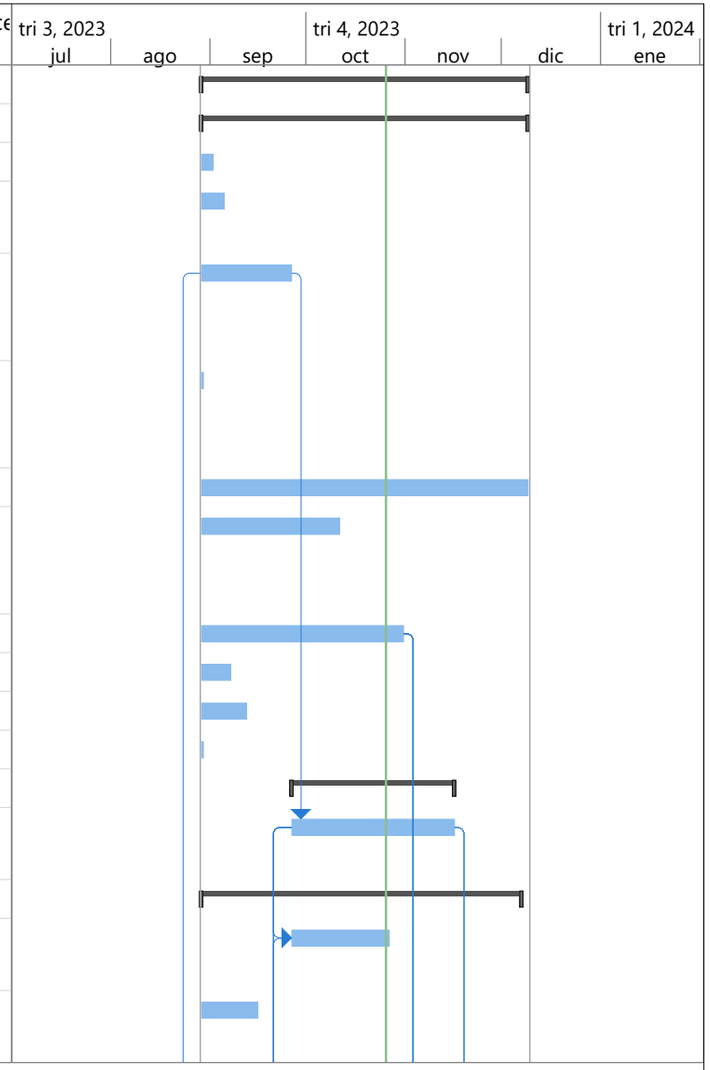

Proyecto: Programación V2 Cúc
Fecha: jue 26/10/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece
18		3.3	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	2,5 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23	
19		3.4	ACERO CORRUGADO FIGURADO	58 días	mar 26/09/23	jue 7/12/23	14CC
20		**4**	**CIELORRASOS**	**1 día**	**mar 29/08/23**	**mar 29/08/23**	
21		4.1	CIELORRASO FIBRA MINERAL 60CMX60CM	1 día	mar 29/08/23	mar 29/08/23	
22		**5**	**RED SANITARIA**	**17 días**	**mar 29/08/23**	**mar 19/09/23**	
23		5.1	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	17 días	mar 29/08/23	mar 19/09/23	
24		5.2	RED SANITARIA COLECTORA 6"	14 días	mar 29/08/23	jue 14/09/23	
25		**6**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**17 días**	**jue 16/11/23**	**jue 7/12/23**	
26		6.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 INCUYE MARCO EN ANGULO DE 2" INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO	17 días	jue 16/11/23	jue 7/12/23	14
27		**7**	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**	**71 días**	**mar 29/08/23**	**vie 24/11/23**	
28		7.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	7 días	jue 16/11/23	vie 24/11/23	14
29		7.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	7 días	mar 29/08/23	mié 6/09/23	
30		**8**	**ANÁLISIS URBANISMO**	**61 días**	**mar 29/08/23**	**lun 13/11/23**	
31		8.1	ANCLAJES EN VARILLA DE 1/2 L= 0.7 M PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA. (INCLUYE EPOXICO).	7 días	mar 26/09/23	mié 4/10/23	14CC
32		8.2	LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y REPLANTEO	11 días	mar 29/08/23	lun 11/09/23	
33		8.3	CONCRETO SARDINELES 0.40M	17 días	mar 29/08/23	mar 19/09/23	
34		8.4	CONCRETO ANDENES 0.10M	23 días	mar 29/08/23	mar 26/09/23	
35		8.5	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	14 días	mar 29/08/23	jue 14/09/23	
36		8.6	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12	6 días	mar 31/10/23	mar 7/11/23	9
37		8.7	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14	10 días	mar 31/10/23	lun 13/11/23	9
38		8.8	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO	3 días	mar 31/10/23	vie 3/11/23	9

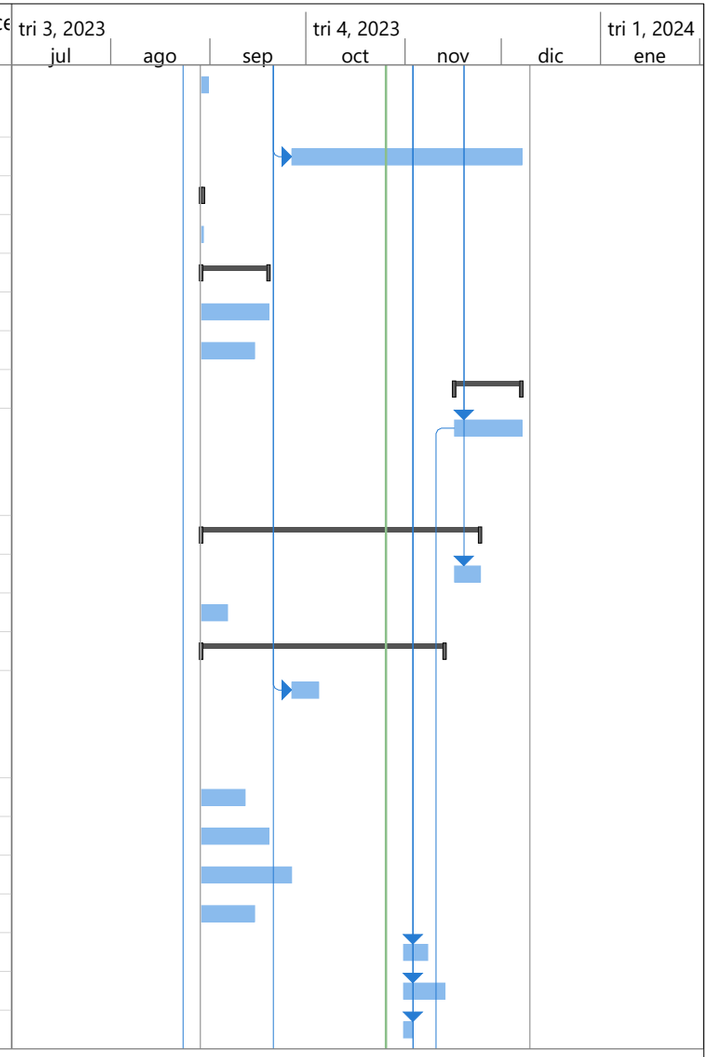

Proyecto: Programación V2 Cúc
Fecha: jue 26/10/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece
39		**9**	**RED HIDRÁULICA**	**6 días**	**mar 29/08/23**	**mar 5/09/23**	
40		9.1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS EXISTENTES EN PVC DE HASTA 14" INCLUYE SONDEO DE TUBERIA, CORTE DE TUBERIA Y REINSTALACION CON ACCESORIOS INCLUUE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION	6 días	mar 29/08/23	mar 5/09/23	
41		**10**	**CERRAMIENTOS URBANISMO**	**81 días**	**mar 29/08/23**	**jue 7/12/23**	
42		10.1	MANTENIMIENTO DE PORTON METALICO INCLUYE DESMONTE, REALIZAR CAMBIOS DE PIEZAS METALICAS, SOLDADURA, CAMBIO DE RODACHINES, ENGRASE, ANTICORROSIVO, PINTURA DOS CARAS E INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.	10 días	mar 29/08/23	sáb 9/09/23	
43		10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES METALICOS EN TUBERIA CIRCULAR DE 2" Y 3 " INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE ANGULOS DE 1/2", RODACHINES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIMILAR AL EXISTENTE.	14 días	mar 29/08/23	jue 14/09/23	
44		10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA ELECTRICA 6 HILOS INCLUYE POSTES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	17 días	jue 16/11/23	jue 7/12/23	26CC
45		**11**	**ACTIVIDADES NP**	**61 días**	**mar 29/08/23**	**lun 13/11/23**	
46		11.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE HASTA 18"	10 días	mar 31/10/23	lun 13/11/23	9
47		11.2	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA PVC DE HASTA 18", INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	10 días	mar 31/10/23	lun 13/11/23	9

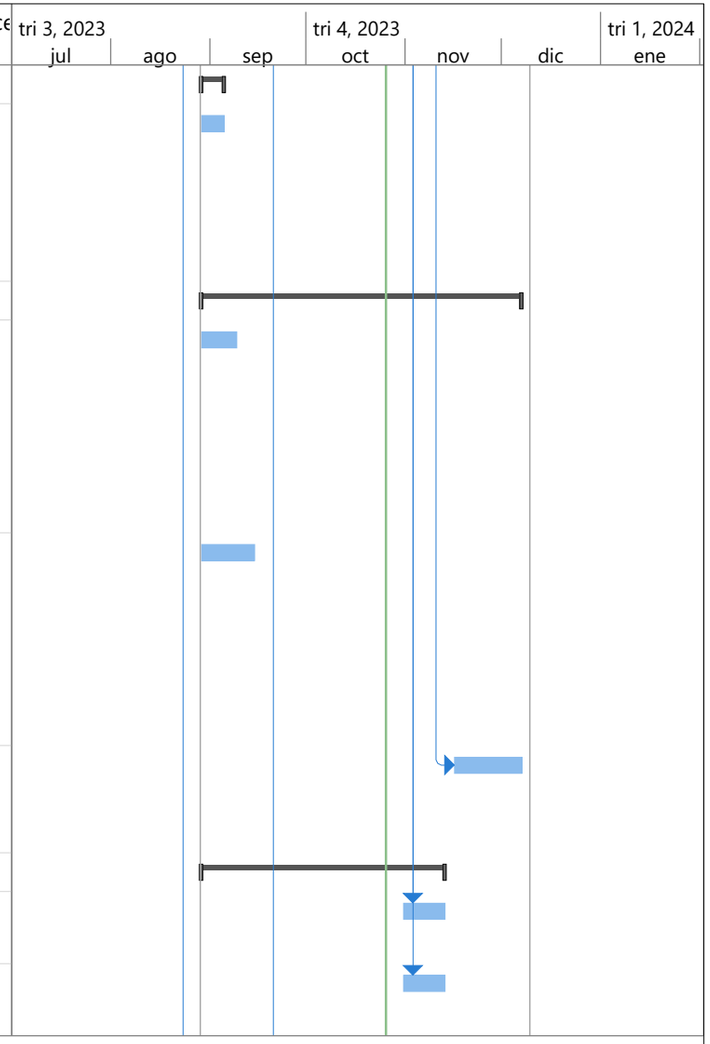

Proyecto: Programación V2 Cúc
Fecha: jue 26/10/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece
48		11.3	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CERCA ELECTRICA 6 HILOS INCLUYE POSTES Y ACCESORIOS	10 días	mar 29/08/23	sáb 9/09/23	5CC
49		11.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERAMICO EXTERIOR, INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL.	2 días	mar 29/08/23	mié 30/08/23	
50		11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA EXTERIOR DE 25 X 25 CMS	2 días	mar 29/08/23	mié 30/08/23	
51		11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO POST GALVANIZADO 2" CAL 16 2 Mts DE ALTURA PARA CERRAMIENTO EN MALLA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO.	13 días	mar 26/09/23	jue 12/10/23	16CC
52		11.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA EXTERIOR DE 35X35 CMS	1 día	mar 29/08/23	mar 29/08/23	

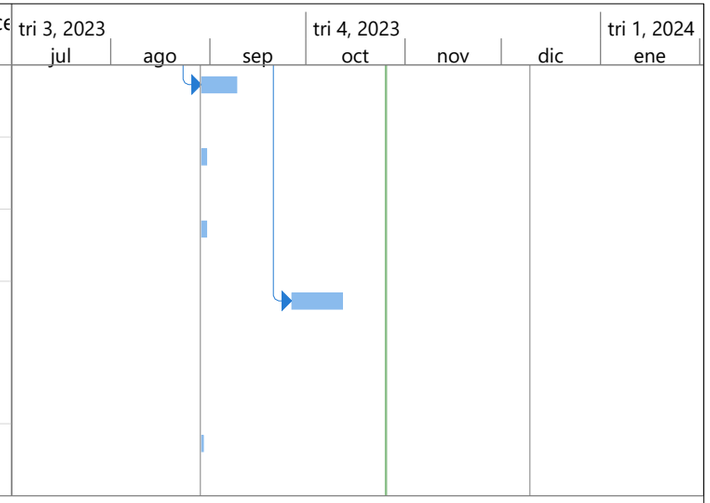

Proyecto: Programación V2 Cúc
Fecha: jue 26/10/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
