ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.5393516	IDC21 S.A.S.	NOVIEMBRE 21 2023	1

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COMPLEJO DEL SENA EN LA CALLE 30 DE LA REGIONAL ATLANTICO	INTERVENTOR: JHONATAN DAVILA ESTRADA - POCI S.A.S.
		SUPERVISOR: EDUARDO DE JESUS GOMEZ PEÑA

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
3 MESES	31/10/2023	31/12/2023	$ 59.240.360	$ 179.516.244

Localización de la obra	Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
COMPLEJO DEL SENA EN LA CALLE 30 DE LA REGIONAL ATLANTICO	31/12/2023	$465.303	$ 1.410.008

Valor inicial del contrato	$ 179.516.244,00	Valor anticipo	-
Valor adición			
Valor total	$ 179.516.244,00		

PRESUPUESTO CONTRATADO			CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO - ZONA MURO - CANCHA DEPORTIVA	ML	125,59	$ 3.460	$ 434.541	94,56	$ 3.460	$ 327.178	94,56	$ 3.460	$ 327.178	94,56	$ 3.460	327.178
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION PREVENTIVA E INFORMATIVA PARA LAS ZONAS A INTERVENIR	GL	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	1.000.000
1,3	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE - ZONA CANCHA - INCLUYE: MALLAS Y TUBERIA HG	M2	301,42	$ 4.650	$ 1.401.587	301,42	$ 4.650	$ 1.401.587	301,42	$ 4.650	$ 1.401.587	301,42	$ 4.650	1.401.587
1,4	RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA GENERAL	VIAJES	12,00	$ 280.000	$ 3.360.000	18,00	$ 280.000	$ 5.040.003	18,00	$ 280.000	$ 5.040.003	18,00	$ 280.000	5.040.003
2,1	EXCAVACION MANUAL LINEAL DE 30X30 PARA VIGA DE CIMIENTOS - MURO - INCLUYE: CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION	ML	125,68	$ 15.890	$ 1.997.043	94,56	$ 15.890	$ 1.502.546	94,56	$ 15.890	$ 1.502.546	94,56	$ 15.890	1.502.546
2,2	EXCAVACION MANUAL DE 0,4X0,4X0,8 PARA ZAPATAS DE MURO - INCLUYE: CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION	M3	5,63	$ 47.720	$ 268.759	-	$ 47.720	$ -	-	$ 47.720	$ -		$ 47.720	
3,1	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2000 PSI CON ESPESOR DE 5 CMS PARA ZONA MURO (ZAPATAS Y VIGA CIMIENTO)	M2	91,20	$ 38.984	$ 3.555.331	63,37	$ 38.984	$ 2.470.406	63,37	$ 38.984	$ 2.470.406	63,37	$ 38.984	2.470.406
3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,4x0,4x0.6 INCLUYE DOBLE PARRILLA EN AMBOS SENTIDO - 3 VARILLAS DE D= 1/2", A CADA 0.20 MTS (ZONA MURO)	UND	43,87	$ 79.980	$ 3.508.452	-	$ 79.980	$ -	-	$ 79.980	$ -		$ 79.980	
3,3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 MTS - (ZONA MURO)	ML	125,60	$ 108.050	$ 13.571.018	94,56	$ 108.050	$ 10.217.146	94,56	$ 108.050	$ 10.217.146	94,56	$ 108.050	10.217.146
3,4	COLUMNAS ENTRE MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,20 X O,20 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 MTS Y JUNTA DE DILATACION VERTICAL - (ZONA MURO)	ML	149,60	$ 119.640	$ 17.898.143	-	$ 119.640	$ -	-	$ 119.640	$ -		$ 119.640	
3,5	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.15 METROS Y JUNTA DE DILATACION LONGITUDINAL - (ZONA MURO)	ML	125,60	$ 119.640	$ 15.026.783	94,56	$ 119.640	$ 11.313.157	-	$ 119.640	$ -		$ 119.640	
4,1	LEVANTE DE MURO RAYADO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 20X20X40 - H= 2.4 MTS - ZONA MURO - MORTERO DE PEGA 1:4	M2	301,44	$ 89.290	$ 26.915.546	251,15	$ 89.290	$ 22.425.152	-	$ 89.290	$ -		$ 89.290	
4,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE COLUMNAS Y VIGAS, A DOS MANOS - COLOR GRIS BASALTO	ML	588,00	$ 13.990	$ 8.226.080	266,12	$ 13.990	$ 3.722.978	-	$ 13.990	$ -		$ 13.990	
5,1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTES EN TUBERIA HG DE 2" Y UNA H= 4,5 MTS MAS 1,5 DE EMPOTRAMIENTO EN LA COLUMNA DEL MURO PARA SOPORTE DE MALLA NYLON - INCLUYE: GUAYAS, ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, ACCESORIOS, TRASLAPO Y AROS DE SUJECION	UND	43,87	$ 279.890	$ 12.277.860	35,00	$ 279.890	$ 9.795.236	-	$ 279.890	$ -		$ 279.890	
5,2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MALLAS DE SEGURIDAD TIPO NYLON MATERIAL MONOFILAMENTO CON FILTRO UV PARA PROTECCION DE SALIDA DE BALON	M2	661,70	$ 58.910	$ 38.980.721	425,52	$ 58.910	$ 25.067.357	-	$ 58.910	$ -		$ 58.910	
AD-01	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO DE 0,40 X 0,30 X 0,40.- INCLUYE: 6 VARILLAS DE 1/2" DE L= 1,2 Y 4E DE 3/8"	UND				35,00	$ 204.586	$ 7.160.526	34,00	$ 204.586	$ 6.955.940	34,00	$ 204.586	6.955.940
AD-02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DEL SITIO	M3				31,85	$ 37.590	$ 1.197.238	22,77	$ 37.590	$ 855.852	22,77	$ 37.590	855.852

AD-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE PARA BLOQUE ABUJARDADO A LA VISTA	M2					251,15	$	16.826	$	4.225.939		$	16.826	$ -		$	16.826	
AD-04	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO DE 15X20X40. ZONA MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE.	M2					35,00	$	13.307	$	465.761	35,00	$	13.307	$	465.761	35,00	$	13.307	465.761
AD-05	DESMONTE DE TUBERIA PVC DE 1/2" AP EXISTENTE - ZONA MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE - INCLUYE: EXCAVACION	ML					189,12	$	8.207	$	1.552.197	189,12	$	8.207	$	1.552.197	189,12	$	8.207	1.552.197
AD-06	EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA DE 1x1x1 PARA ZAPATAS DE MURO - INCLUYE: BOMBA PARA SACAR AGUAS LLUVIAS, CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION	M3					35,00	$	70.052	$	2.451.830	35,00	$	70.052	$	2.451.830	35,00	$	70.052	2.451.830
AD-07	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 1x1x0,3 - INCLUYE DOBLE PARRILLA EN AMBOS SENTIDO - 7 VARILLAS DE D= 1/2", A CADA 0.15 MTS (ZONA MURO)	UND					35,00	$	411.259	$	14.394.056	35,00	$	411.259	$	14.394.056	35,00	$	411.259	14.394.056
AD-08	COLUMNAS ENTRE MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,25 X O,20 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 MTS Y JUNTA DE DILATACION VERTICAL - (ZONA MURO)	ML					112,00	$	199.526	$	22.346.857		$	199.526	$ -			$	199.526	
AD-09	DEMOLICION DE CIMIENTO DE MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE	ML					35,00	$	9.849	$	344.714	35,00	$	9.849	$	344.714	35,00	$	9.849	344.714

COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				**148.421.864**			**148.421.864**				**48.979.214**							**48.979.214**
ADMINISTRACION			15,00%	22.263.280		15,00%	22.263.280			15,00%	7.346.882					15,00%		7.346.882
UTILIDAD			5,00%	7.421.093		5,00%	7.421.093			5,00%	2.448.961					5,00%		2.448.961
TOTAL A.U.				**29.684.373**			**29.684.373**				**9.795.843**							**9.795.843**
IVA (%) SOBRE UTILIDAD			19,00%	**1.410.008**		19,00%	**1.410.008**			19,00%	**465.303**					19,00%		**465.303**
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				**179.516.244**			**179.516.244**				**59.240.360**							**59.240.360**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**179.516.244**
V/R ADICIONES:	-
V/R ACTUAL CONTRATO:	**179.516.244**

V/R ANTICIPO:	-
% ANTICIPO :	-

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA	21-nov.-23	**$ 59.240.360**	33%	-	-	**$ 59.240.360**	**$ 120.275.884**	**33%**
TOTAL			**$ 59.240.360**	**33%**	**$ -**	**$ -**	**$ 59.240.360**	**$ 120.275.884**	

Acta parcial de obra N°1

Presento:

GERMAN IGNACIO LUNA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NELSON POLO JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

DIEGO CAMILO MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

JHONATAN DAVILA ESTRADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Visto Bueno:

EDUARDO DE JESUS GOMEZ PEÑA
SUPERVISOR SENA

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.

Ingeniería • Diseño • Construcción

INFORME DE AVANCE DE OBRA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA.

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COMPLEJO DEL SENA EN LA CALLE 30 DE LA REGIONAL ATLANTICO

IDC 21 S.A.S.

Noviembre 2023

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.5393516
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CONTRATISTA	IDC 21 S.A.S. NIT NO. 900.483.739-0
SUPERVISOR	EDUARDO DE JESUS GOMEZ PEÑA
INTERVENTORIA	JHONATAN DAVILA ESTRADA - PROYECTOS OBRAS CIVILES E INGENIERÍA - POCI S.A.S.
OBJETO	ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COMPLEJO DEL SENA EN LA CALLE 30 DE LA REGIONAL ATLÁNTICO.
VALOR INICIAL	$ 179.516.244.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/10/2023
FECHA ACTA DE INICIO	31/10/2023
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2023
GARANTIAS	**Poliza de Responsabilidad Civil N° 0929948−5**
	Amparo: Básico responsabilidad civil, R.C. Contratistas y Subcontratistas, R.C.Cruzada, R.C. Patronal, R.C.Vehiculos propios y no propios.
	Vigencia: desde 04/09/2023 - hasta 30/04/2024.
	Suma Asegurado: $332.000.000,00
	Poliza de Cumplimiento Entidad Estatal N° 3742887–0
	Amparo: Cumplimiento del Contrato. Vigencia: desde 20/09/2023 - hasta 30/04/2024. Suma Asegurado: $ 53.854.873,00
	Amparo: Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Vigencia: desde 20/09/2023 - hasta 31/12/2026. Suma Asegurado: $ 8.975.812,00
	Amparo: Estabilidad y Calidad de la obra. Vigencia: desde 20/09/2023- hasta 30/12/2028. Suma Asegurado: $ 89.758.122,00
	Amparo: Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Vigencia: 20/09/2023- hasta 30/04/2024. Suma Asegurado: $ 35.903.249,00
	Amparo: Calidad del Servicio. Vigencia: 20/09/2023- hasta 30/04/2024. Suma Asegurado: $ 35.903.249,00

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PRESUPUESTO OBRAS CIVILES					
ÍTEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL ÍTEM
1	PRELIMINARES				$ 6.196.128
1,1	Localizacion, Trazado y Replanteo - Zona Muro - Cancha Deportiva	ML	125,6	$ 3.460	$ 434.538,32
1,2	Suministro e Instalacion de Señalizacion Preventiva e Informativa para la Zonas a Intervenir	GL	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
1,3	Desmonte de Cerramiento Existente - Zona Cancha - Incluye: Mallas y Tuberia HG	M2	301	$ 4.650	$ 1.401.587
1,4	Retiro de Material y Limpieza General	Viajes	12	$ 280.000	$ 3.360.003
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 2.265.802
2,1	Excavacion Manual Lineal de 30x30 para Viga de Cimientos - Muro - Incluye: Cargue y Retiro del Material de Excavacion	ML	125,68	$ 15.890	$ 1.997.043
2,2	Excavacion Manual de 0,4x0,4x0,8 para Zapatas del Muro - Incluye: Cargue y Retiro del Material de Excavacion	M3	5,632	$ 47.720	$ 268.759
3	ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS				$ 53.559.728
3,1	Solado de Limpieza en Concreto de 2000 psi con espesor de 5 cms para Zona Muro (Zapatas y Viga Cimiento)	M2	91	$ 38.984	$ 3.555.331
3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,4x0,4x0.6 INCLUYE DOBLE PARRILLA EN AMBOS SENTIDO - 3 VARILLAS DE D= 1/2", A CADA 0.20 MTS (ZONA MURO)	UND	43,87	$ 79.980	$ 3.508.452
3,3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 MTS - (ZONA MURO)	ML	125,6	$ 108.050	$ 13.571.018
3,4	COLUMNAS ENTRE MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,20 X O,20 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 MTS Y JUNTA DE DILATACION VERTICAL - (ZONA MURO)	ML	149,6	$ 119.640	$ 17.898.143
3,5	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.15 METROS Y JUNTA DE DILATACION LONGITUDINAL - (ZONA MURO)	ML	125,6	$ 119.640	$ 15.026.783
4	MAMPOSTERIA - PAÑETES Y ACABADOS				$ 35.141.626
4,1	Levante de Muro Rayado en Bloque Abuzardado de 20x20x40 - H= 2.4 mts - Zona Muro - Mortero de Pega 1:4	M2	301,44	$ 89.290	$ 26.915.546
4,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE COLUMNAS Y VIGAS, A DOS MANOS - COLOR GRIS BASALTO	ML	588	$ 13.990	$ 8.226.080

5	ESTRUCTURA PARA MALLA CERRAMIENTO				$ 51.258.581
5,1	Suministro y Montaje de Postes en Tuberia HG de 2" y una H= 4,5 mts mas 1,5 de empotramiento en la Columna del Muro para Soporte de Malla Nylon - Incluye: Guayas, Elementos para su correcta Instalacion, Accesorios, Traslapo y Aros de Sujecion	UND	43,867	$ 279.890	$ 12.277.860
5,2	Suministro y Montaje de Mallas de Seguridad tipo Nylon Material Monofilamento con Filtro UV para Proteccion de Salida de Balon	M2	661,7	$ 58.910	$ 38.980.721
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 148.421.864
				Administración 15%	$ 22.263.280
				Utilidad 5%	$ 7.421.093
				IVA sobre Utilidad 19%	$ 1.410.008
				COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 179.516.244

Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente:
Nombre del Representante Legal:

NIT: 900483739-0
C. C. N° 72227301

FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: German Ignacio Luna Soto

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

GIL-F-064
V-1

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.5393516	IDC21 S.A.S.	NOVIEMBRE 21 2023	1

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COMPLEJO DEL SENA EN LA CALLE 30 DE LA REGIONAL ATLANTICO
INTERVENTOR: JHONATAN DAVILA ESTRADA - POCI S.A.S.	
SUPERVISOR: EDUARDO DE JESUS GOMEZ PEÑA	

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
3 MESES	31/10/2023	31/12/2023	$ 59.240.360	$ 179.516.244

Localización de la obra	Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
COMPLEJO DEL SENA EN LA CALLE 30 DE LA REGIONAL ATLANTICO	31/12/2023	$465.303	$ 1.410.008

Valor inicial del contrato	$ 179.516.244,00	Valor anticipo	-
Valor adición			
Valor total	$ 179.516.244,00		

PRESUPUESTO CONTRATADO			CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO - ZONA MURO - CANCHA DEPORTIVA	ML	125,59	$ 3.460	$ 434.541	94,56	$ 3.460	$ 327.178	94,56	$ 3.460	$ 327.178	94,56	$ 3.460	327.178
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION PREVENTIVA E INFORMATIVA PARA LAS ZONAS A INTERVENIR	GL	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	1.000.000
1,3	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE - ZONA CANCHA - INCLUYE: MALLAS Y TUBERIA HG	M2	301,42	$ 4.650	$ 1.401.587	301,42	$ 4.650	$ 1.401.587	301,42	$ 4.650	$ 1.401.587	301,42	$ 4.650	1.401.587
1,4	RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA GENERAL	VIAJES	12,00	$ 280.000	$ 3.360.000	18,00	$ 280.000	$ 5.040.003	18,00	$ 280.000	$ 5.040.003	18,00	$ 280.000	5.040.003
2,1	EXCAVACION MANUAL LINEAL DE 30X30 PARA VIGA DE CIMIENTOS - MURO - INCLUYE: CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION	ML	125,68	$ 15.890	$ 1.997.043	94,56	$ 15.890	$ 1.502.546	94,56	$ 15.890	$ 1.502.546	94,56	$ 15.890	1.502.546
2,2	EXCAVACION MANUAL DE 0,4X0,4X0,8 PARA ZAPATAS DE MURO - INCLUYE: CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION	M3	5,63	$ 47.720	$ 268.759	-	$ 47.720	$ -	-	$ 47.720	$ -		$ 47.720	
3,1	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2000 PSI CON ESPESOR DE 5 CMS PARA ZONA MURO (ZAPATAS Y VIGA CIMIENTO)	M2	91,20	$ 38.984	$ 3.555.331	63,37	$ 38.984	$ 2.470.406	63,37	$ 38.984	$ 2.470.406	63,37	$ 38.984	2.470.406
3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,4x0,4x0.6 INCLUYE DOBLE PARRILLA EN AMBOS SENTIDO - 3 VARILLAS DE D= 1/2", A CADA 0.20 MTS (ZONA MURO)	UND	43,87	$ 79.980	$ 3.508.452	-	$ 79.980	$ -	-	$ 79.980	$ -		$ 79.980	
3,3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 MTS - (ZONA MURO)	ML	125,60	$ 108.050	$ 13.571.018	94,56	$ 108.050	$ 10.217.146	94,56	$ 108.050	$ 10.217.146	94,56	$ 108.050	10.217.146
3,4	COLUMNAS ENTRE MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,20 X O,20 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 MTS Y JUNTA DE DILATACION VERTICAL - (ZONA MURO)	ML	149,60	$ 119.640	$ 17.898.143	-	$ 119.640	$ -	-	$ 119.640	$ -		$ 119.640	
3,5	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.15 METROS Y JUNTA DE DILATACION LONGITUDINAL - (ZONA MURO)	ML	125,60	$ 119.640	$ 15.026.783	94,56	$ 119.640	$ 11.313.157	-	$ 119.640	$ -		$ 119.640	
4,1	LEVANTE DE MURO RAYADO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 20X20X40 - H= 2.4 MTS - ZONA MURO - MORTERO DE PEGA 1:4	M2	301,44	$ 89.290	$ 26.915.546	251,15	$ 89.290	$ 22.425.152	-	$ 89.290	$ -		$ 89.290	
4,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE COLUMNAS Y VIGAS, A DOS MANOS - COLOR GRIS BASALTO	ML	588,00	$ 13.990	$ 8.226.080	266,12	$ 13.990	$ 3.722.978	-	$ 13.990	$ -		$ 13.990	
5,1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTES EN TUBERIA HG DE 2" Y UNA H= 4,5 MTS MAS 1,5 DE EMPOTRAMIENTO EN LA COLUMNA DEL MURO PARA SOPORTE DE MALLA NYLON - INCLUYE: GUAYAS, ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, ACCESORIOS, TRASLAPO Y AROS DE SUJECION	UND	43,87	$ 279.890	$ 12.277.860	35,00	$ 279.890	$ 9.795.236	-	$ 279.890	$ -		$ 279.890	
5,2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MALLAS DE SEGURIDAD TIPO NYLON MATERIAL MONOFILAMENTO CON FILTRO UV PARA PROTECCION DE SALIDA DE BALON	M2	661,70	$ 58.910	$ 38.980.721	425,52	$ 58.910	$ 25.067.357	-	$ 58.910	$ -		$ 58.910	
AD-01	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO DE 0,40 X 0,30 X 0,40.- INCLUYE: 6 VARILLAS DE 1/2" DE L= 1,2 Y 4E DE 3/8"	UND				35,00	$ 204.586	$ 7.160.526	34,00	$ 204.586	$ 6.955.940	34,00	$ 204.586	6.955.940
AD-02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DEL SITIO	M3				31,85	$ 37.590	$ 1.197.238	22,77	$ 37.590	$ 855.852	22,77	$ 37.590	855.852

ACTA MODIFICATIVA 1

IDC21

AD-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE PARA BLOQUE ABUJARDADO A LA VISTA	M2					251,15	$	16.826	$	4.225.939		$	16.826	$	-		$	16.826	
AD-04	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO DE 15X20X40. ZONA MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE.	M2					35,00	$	13.307	$	465.761	35,00	$	13.307	$	465.761	35,00	$	13.307	465.761
AD-05	DESMONTE DE TUBERIA PVC DE 1/2" AP EXISTENTE - ZONA MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE - INCLUYE: EXCAVACION	ML					189,12	$	8.207	$	1.552.197	189,12	$	8.207	$	1.552.197	189,12	$	8.207	1.552.197
AD-06	EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA DE 1x1x1 PARA ZAPATAS DE MURO - INCLUYE: BOMBA PARA SACAR AGUAS LLUVIAS, CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACION	M3					35,00	$	70.052	$	2.451.830	35,00	$	70.052	$	2.451.830	35,00	$	70.052	2.451.830
AD-07	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 1x1x0,3 - INCLUYE DOBLE PARRILLA EN AMBOS SENTIDO - 7 VARILLAS DE D= 1/2", A CADA 0.15 MTS (ZONA MURO)	UND					35,00	$	411.259	$	14.394.056	35,00	$	411.259	$	14.394.056	35,00	$	411.259	14.394.056
AD-08	COLUMNAS ENTRE MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 X 0,20 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 MTS Y JUNTA DE DILATACION VERTICAL - (ZONA MURO)	ML					112,00	$	199.526	$	22.346.857		$	199.526	$	-		$	199.526	
AD-09	DEMOLICION DE CIMIENTO DE MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE	ML					35,00	$	9.849	$	344.714	35,00	$	9.849	$	344.714	35,00	$	9.849	344.714

COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				148.421.864			148.421.864			48.979.214				48.979.214
ADMINISTRACION			15,00%	22.263.280		15,00%	22.263.280		15,00%	7.346.882		15,00%		7.346.882
UTILIDAD			5,00%	7.421.093		5,00%	7.421.093		5,00%	2.448.961		5,00%		2.448.961
TOTAL A.U.				29.684.373			29.684.373			9.795.843				9.795.843
IVA (%) SOBRE UTILIDAD			19,00%	1.410.008		19,00%	1.410.008		19,00%	465.303		19,00%		465.303
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				179.516.244			179.516.244			59.240.360				59.240.360

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	179.516.244	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:	-		
V/R ACTUAL CONTRATO:	179.516.244	% ANTICIPO :	-

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA	21-nov.-23	$ 59.240.360	33%	-	-	$ 59.240.360	$ 120.275.884	33%
TOTAL			$ 59.240.360	33%	$ -	$ -	$ 59.240.360	$ 120.275.884	

Acta parcial de obra N°1

Presento:

GERMAN IGNACIO LUNA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NELSON POLO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

DIEGO CAMILO MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

JHONATAN DAVILA ESTRADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Visto Bueno:

EDUARDO DE JESUS GOMEZ PEÑA
SUPERVISOR SENA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

1. PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO - ZONA MURO - CANCHA DEPORTIVA.

Se realizó el proceso de replantear cada una de las áreas involucradas en la construcción teniendo en cuenta los planos arquitectónicos y las principales determinantes construcuctivas y estructurales. La unidad de medida es por M2.

1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION PREVENTIVA E INFORMATIVA PARA LAS ZONAS A INTERVENIR.

En la ejecucion de este Item, se contempló toda la señalización y elementos de visibilidad en las zonas de obras. La unidad de medida es por GL.

1.3 DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE - ZONA CANCHA - INCLUYE: MALLAS Y TUBERIA HG.

Consistió en el desmonte del cerramiento existente en malla y tubería HG retirándolo totalmente desde su soporte, con el cuidado de no deteriorar la malla y los postes para su posible reutilización, se hizo entrega de la malla retirada al supervisor de la entidad contratante. La unidad de medida es por M2.

1.4 RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA GENERAL.

Se ejecutó la actividad y se contempló el cargue, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano. La unidad de medida es por VIAJE.

2. EXCAVACION Y RELLENOS

2.1 EXCAVACION MANUAL LINEAL DE 30X30 PARA VIGA DE CIMIENTOS - MURO - INCLUYE: CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN.

Se ejecucutaron los trabajos necesarios para la excavación a mano de vigas de cimentación. Las excavaciones se realizaron de conformidad con las dimensiones indicadas en los planos y en los sitios determinados para el proyecto. La unidad de medida es por M3.

3. ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS

3.1 SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2000 PSI CON ESPESOR DE 5 CMS PARA ZONA MURO (ZAPATAS Y VIGA CIMIENTO).

Se ejecutó el suministro, y colocación de concreto de limpieza de 2000. Se aplicó al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo

de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5.0cm. La unidad de medida es por M2.

3.3 VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 MTS - (ZONA MURO).

Se realizó la construcción de las vigas de cimentación de 0.3 x 0.3 mt con los detalles consignados en los planos. Se vació dentro de la excavación previamente realizada, teniendo especial cuidado de no derrumbar las paredes de la excavación para no contaminar el concreto. La unidad de medida es por ML.

AD. ADICIONALES

AD-01 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO DE 0,40 X 0,30 X 0,40.- INCLUYE : 6 VARILLAS DE 1/2" DE L= 1,2 Y 4E DE 3/8".

Se ejecutó la construcción de los pedestales de 0.4 x 0.4 x 0.4 mt con los detalles estructurales aprobados durante la ejecucion de la obra. Se construyeron con conreto de 3000 psi producido en obra. La unidad de medida es por UN.

AD-02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DEL SITIO.

Se ralizó la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación de material del sitio para el relleno de zanjas y de excavaciones de estructuras.Se verificó que el relleno estuviera ibres de basuras, materia orgánica, raíces, terrones y piedras de diámetro mayor a 0.10 m y que tuviera la humedad adecuada para permitir su disposición, conformación y compactación.La unidad de medida es por M3.

AD-04 DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO DE 15X20X40. ZONA MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE.

Consistió en la demolición manual de muros de la construcción existente. El desarrollo de estas tareas contempló el trasiego de escombros hasta punto de acopio del material según se determino con la interventoría y supervisión.La unidad de medida es por M2.

AD-05 DESMONTE DE TUBERIA PVC DE 1/2" AP EXISTENTE - ZONA MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE - INCLUYE: EXCAVACIÓN.

Se realizó el desmonte de tubería PVC de ½" en la zona de muro existente para ejecutar las excavaciones necesarias para la cimentación. La unidad de medida es por ML.

AD-06 EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA DE 1x1x1 PARA ZAPATAS DE MURO INCLUYE: BOMBA PARA SACAR AGUAS LLUVIAS, CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN.

Se realizó el desmonte de tubería PVC de ½” en la zona de muro existente para ejecutar las excavaciones necesarias para la cimentación. La unidad de medida es por ML.

AD-07 ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 1x1x0,3 - INCLUYE DOBLE PARRILLA EN AMBOS SENTIDO - 7 VARILLAS DE D= 1/2", A CADA 0.15 MTS (ZONA MURO).

Se ejecucutaron los trabajos necesarios para la excavación a mano de zapatas. Las excavaciones se realizaron de conformidad con las dimensiones indicadas en los planos y en los sitios determinados de cada uno de los elementos del proyecto. La unidad de medida es por M3.

AD-09 DEMOLICION DE CIMIENTO DE MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE.

Consistió en la demolición manual de cimiento de muros de la construcción existente. El desarrollo de estas tareas contempló el translado de escombros hasta punto de acopio del material.La unidad de medida es por M2.

ANEXO FOTOGRAFICO
































1.40
LEVEL 00










RESIDUOS
ESPECIALES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900483739	0	IDC 21 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IDC21 PROVISIONAL	CL 72 55 71	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3316060	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	278591574	9458943877	Y	2023/11/10	2023/11/15	BANCO DAVIVIENDA	5	$16,570,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	3844622	ABAD EUCLIDES	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS048	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
2	CC	1007119011	ACOSTA LUIS	X																	230301	1	$38,667	$6,200	EPS048	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
3	CC	72334897	AMARANTO RUBEN	X																	230201	19	$734,667	$117,600	EPS048	19	$734,667	$91,900		0	$0	$0	14-4	19	$734,667	$51,200	0	$0	$0	No	$260,700
4	CC	1192808905	ANILLO PEDRO	X	X																230301	5	$193,334	$31,000	EPS048	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-4	5	$193,334	$13,500	0	$0	$0	No	$68,700
5	CC	1140900096	AVILA SILVIA		X																230201	23	$920,000	$147,200	EPS005	23	$920,000	$115,000		0	$0	$0	14-4	23	$920,000	$64,100	0	$0	$0	No	$326,300
6	CC	72176174	BARRIOS EDGARDO	X																	231001	4	$154,667	$24,800	ESSC07	4	$154,667	$19,400		0	$0	$0	14-4	4	$154,667	$10,800	0	$0	$0	No	$55,000
7	CC	1001944223	BENAVIDEZ LUIS	X																	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$38,700		0	$0	$0	14-4	8	$309,334	$21,600	0	$0	$0	No	$109,800
8	CC	1052951746	BOBADILLA LUIS	X																	230301	8	$309,334	$49,500	EPS048	8	$309,334	$38,700		0	$0	$0	14-4	8	$309,334	$21,600	0	$0	$0	No	$109,800
9	CC	12635205	BOLIVAR ROBERTO	X																	230301	19	$734,667	$117,600	CCFC55	19	$734,667	$91,900		0	$0	$0	14-4	19	$734,667	$51,200	0	$0	$0	No	$260,700
10	PT	5479469	BRICEÑO JOSE	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
11	CC	8739044	CARRILLO NAYID	X	X																231001	1	$38,667	$6,200	EPS048	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
12	CC	12620591	CASTRO WILFRIDO		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
13	CC	72285010	COLON FABIAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
14	CC	1129505937	DIAZ JANSEL	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS048	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
15	CC	1129505418	ELIAS DANIEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
16	CC	1044633255	FERIA MANUEL	X	X																230301	5	$193,334	$31,000	ESSC07	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-4	5	$193,334	$13,500	0	$0	$0	No	$68,700
17	CC	1047216991	GERONIMO FRANCISCO	X																	230301	19	$734,667	$117,600	EPS048	19	$734,667	$91,900		0	$0	$0	14-4	19	$734,667	$51,200	0	$0	$0	No	$260,700
18	CC	1007172207	GIL JHON	X																	230301	8	$309,334	$49,500	EPS048	8	$309,334	$38,700		0	$0	$0	14-4	8	$309,334	$21,600	0	$0	$0	No	$109,800
19	CC	1143252164	GONZALEZ DANIEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
20	CC	72180882	GONZALEZ VICTOR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
21	CC	72166543	GRAZZIANI HELVER																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
22	CC	1048209149	GUERRERO CANDIDO	X																	230301	26	$1,005,334	$160,900	EPS002	26	$1,005,334	$125,700		0	$0	$0	14-4	26	$1,005,334	$70,000	0	$0	$0	No	$356,600
23	CC	85450256	HINCAPIE GABRIEL	X	X																231001	12	$464,000	$74,300	EPS048	12	$464,000	$58,000		0	$0	$0	14-4	12	$464,000	$32,300	0	$0	$0	No	$164,600
24	CC	17955050	JIMENEZ DUGLAS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
25	CC	1193562921	LEIVA JESUS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
26	CC	1047050406	LIÑAN JOSE	X	X																230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
27	CC	1044603169	LOPEZ ALEXANDER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
28	CC	1101877122	LOPEZ KEN	X																	230301	8	$309,334	$49,500	CCFC55	8	$309,334	$38,700		0	$0	$0	14-4	8	$309,334	$21,600	0	$0	$0	No	$109,800
29	CC	1101878799	LOPEZ LUIS	X																	231001	4	$154,667	$24,800	ESSC07	4	$154,667	$19,400		0	$0	$0	14-4	4	$154,667	$10,800	0	$0	$0	No	$55,000
30	CC	1045727070	MACHADO KEIN	X																	230301	6	$232,000	$37,200	ESSC07	6	$232,000	$29,000		0	$0	$0	14-4	6	$232,000	$16,200	0	$0	$0	No	$82,400
31	CC	1043148782	MAESTRE BLADIMIRO		X																230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
32	CC	1129497898	MARCHAN ISAAC	X	X																231001	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
33	CC	1045750358	MARQUEZ CESAR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
34	CC	1048291990	MARTINEZ JOHN	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
35	CC	1045675101	MARTINEZ LUIS	X																	230301	5	$193,334	$31,000	ESSC07	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-4	5	$193,334	$13,500	0	$0	$0	No	$68,700

SEGURIDAD SOCIAL

IDC21

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
36	CC	1045728555	MARTINEZ LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
37	CC	1044211734	MATTOS ANDRES	X	X																230301	6	$232,000	$37,200	EPS048	6	$232,000	$29,000		0	$0	$0	14-4	6	$232,000	$16,200	0	$0	$0	No	$82,400
38	CC	1045717225	MEDINA HEIDIS		X																230301	17	$657,334	$105,200	ESSC07	17	$657,334	$82,200		0	$0	$0	14-4	17	$657,334	$45,800	0	$0	$0	No	$233,200
39	CC	1046699713	MERCADO JULIAN	X																	230301	5	$193,334	$31,000	ESSC24	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-4	5	$193,334	$13,500	0	$0	$0	No	$68,700
40	CC	8644086	MERCADO LISANDRO	X																	25-14	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$33,900		0	$0	$0	14-4	7	$270,667	$18,900	0	$0	$0	No	$96,200
41	PT	4867983	MOLINA CARLOS	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS048	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
42	CC	1143121838	MORENO JAVIER	X																	230301	8	$309,334	$49,500	ESSC07	8	$309,334	$38,700		0	$0	$0	14-4	8	$309,334	$21,600	0	$0	$0	No	$109,800
43	CC	7937189	MORENO LUIS	X																	230301	19	$734,667	$117,600	EPS048	19	$734,667	$91,900		0	$0	$0	14-4	19	$734,667	$51,200	0	$0	$0	No	$260,700
44	PT	5475456	MOSQUERA RICARDO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
45	CC	72251893	NAVARRO EDGAR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
46	CC	72208592	OLIVERA BORIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
47	CC	72198723	ORTIZ JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
48	CC	1140880346	OSPINO DAVID		X																230201	27	$1,080,000	$172,800	EPS005	27	$1,080,000	$135,000		0	$0	$0	14-4	27	$1,080,000	$75,200	0	$0	$0	No	$383,000
49	CC	8738807	OSPINO ISMAEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
50	CC	8777118	PABON CHESEDIN	X	X																231001	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
51	CC	8766686	PACHECO FIDEL																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
52	CC	1047229024	PALACIO EFRAIN	X																	230301	6	$232,000	$37,200	EPS048	6	$232,000	$29,000		0	$0	$0	14-4	6	$232,000	$16,200	0	$0	$0	No	$82,400
53	CC	1140901304	PARADA MARLON																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
54	CC	1042622083	PEÑATE EMMANUEL	X	X																230301	4	$154,667	$24,800	EPS048	4	$154,667	$19,400		0	$0	$0	14-4	4	$154,667	$10,800	0	$0	$0	No	$55,000
55	CC	8682112	PENENREY WALBERTO	X																		0	$0	$0	ESSC07	17	$657,334	$82,200		0	$0	$0	14-4	17	$657,334	$45,800	0	$0	$0	No	$128,000
56	CC	72199790	POLO JORGE		X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
57	PT	5133934	QUINTERO DONNY	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
58	CC	8792498	RAMIREZ JORGE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
59	CC	1007399816	RIVERO CAMILO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
60	CC	3730685	ROCHA MISAEL		X																230301	11	$425,334	$68,100	EPS005	11	$425,334	$53,200		0	$0	$0	14-4	11	$425,334	$29,700	0	$0	$0	No	$151,000
61	PT	5926652	RODRIGUEZ LUIS	X																	230301	17	$657,334	$105,200	ESSC07	17	$657,334	$82,200		0	$0	$0	14-4	17	$657,334	$45,800	0	$0	$0	No	$233,200
62	PT	5473218	ROJO BENJAMIN	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
63	CC	1044612931	ROVIRA JHONATAN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
64	CC	1193412032	RUA JESUS	X																	230301	5	$193,334	$31,000	ESSC24	5	$193,334	$24,200		0	$0	$0	14-4	5	$193,334	$13,500	0	$0	$0	No	$68,700
65	CC	1193601542	RUIZ DAYVER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
66	CC	72072098	RUIZ FREDDY	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
67	CC	8189488	RUIZ RODRIGO	X	X																25-14	1	$38,667	$6,200	ESSC24	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
68	CC	1052949212	SAMPAYO BRAYAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
69	CC	1044603237	SANTANA LUIS	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS048	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
70	CC	8742678	SOTO ALBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
71	CC	1129508969	TRIANA SAMUEL	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
72	CC	1045759197	URDANETA OMEIRO	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
73	CC	1045728373	URIANA DIEGO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
74	CC	1047214131	VALENCIA WILSON	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900		0	$0	$0	14-4	1	$38,667	$2,700	0	$0	$0	No	$13,800
75	CC	1083028377	VARGAS JEFFRI		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0	No	$411,400
76	CC	1143143182	VARGAS LUIS	X																	230301	6	$232,000	$37,200	ESSC07	6	$232,000	$29,000		0	$0	$0	14-4	6	$232,000	$16,200	0	$0	$0	No	$82,400
77	CC	72262939	VASQUEZ HOLMES	X																	230301	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$38,700		0	$0	$0	14-4	8	$309,334	$21,600	0	$0	$0	No	$109,800
78	CC	1002035954	VASQUEZ LUIS	X	X																230301	17	$657,334	$105,200	EPS048	17	$657,334	$82,200		0	$0	$0	14-4	17	$657,334	$45,800	0	$0	$0	No	$233,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900483739	0	IDC 21 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IDC21 PROVISIONAL	CL 72 55 71	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3316060	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	278591574	9458943877	Y	2023/11/10	2023/11/15	BANCO DAVIVIENDA	5	$16,570,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				80	$7,343,600	$36,600	$0	$7,380,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$513,700	$2,600	$0	$516,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$235,200	$1,200	$0	$236,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	59	$5,173,400	$25,700	$0	$5,199,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,421,300	$7,100	$0	$1,428,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$3,324,000	$16,500	$0	$3,340,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	82	$3,324,000	$16,500	$0	$3,340,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				81	$5,820,500	$29,500	$0	$5,850,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	7	$609,200	$3,100	$0	$612,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$343,300	$1,800	$0	$345,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	20	$938,500	$4,700	$0	$943,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$290,000	$1,500	$0	$291,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$800	$0	$145,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	21	$1,465,100	$7,300	$0	$1,472,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$183,700	$1,000	$0	$184,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$493,300	$2,500	$0	$495,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$899,300	$4,500	$0	$903,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$453,100	$2,300	$0	$455,400
TOTAL				82	$16,488,100	$82,600	$0	$16,570,700

IDC21

BITACORA

Miercoles 1 de Nov /23
Se realizaron trabajos de campo, trazado y medidas del largo del muro en campo, se trazan columnas y espacios de los muros
Personal en Obra: Residente de obra, Maestro, Inspector de Obra.

Llega de IDC 21:
14 Valdes
3 Pinpinas
1 pizon
1 Barra grande
1 pala punta redonda
1 pico
1 Macho
1 Plastico
1 Estiva de Madera
"Andamios"
4 Horizontales de 2M
4 Verticales de 3M
2 Diagonales de 3M
4 Niveladores de
4 Horizontales de 3M

EDGARDO IBARRA

Jueves 2 de Nov /23

Revisión del Area de trabajo

Se realizaron labores de excavaciones para zapatas 1,3

Se Armo Andamio en el eje de la columna #2 para cortar malla y tuberia, a la espera de Herramientas de corte, como pulidora y discos, se evidencio tuberia de Agua potable y Drenaje de cancha en excavacion #3 de la zapata de 1:30 pm a 2:30pm se hizo cese de actividades por lluvias

Se continua la excavacion de la zapata #3

Personal en obra: Maestro, 2 Auxiliares de obra, Inspector de obra.

- Ingresa al sena:

4 Verticales de 3m
8 Horizontales de 2m
8 Horizontales de 3m
2 Diagonales de 2.80m
2 Diagonales de 3.50m
2 plataformas de 3m
2 Arneses
2 Eslingas en Y
Nota: Trajeron una linea de Vida, el gancho o Seguro esta duro, no habre y la linea esta luvida

ERÉANDO IBARRA

Viernes 3 NOV /23

Revisión del Area de trabajo se encontraron — excavaciones con Agua, Se procedio a la evacuacion del agua en la excavación de la zapata #3 para terminar a su nivel, se procedio a trabajar para hacer excavación de la zapata #5, se le trasladó el tema de la tubería de Agua potable al encargado de parte del Sena Eduardo Gonzales y Autoriza cortar la tubería y colocarle un tapón para poder Realizar las actividades ya que por ese mismo sitio van las columnas y Vigas cimiento

Se trabajo y Se comenzo excavación de zapatas #7

Personal en Obra: Maestro, 2 Auxiliares de obra e Inspector de Obra

Ingresa a la Obra
2 palas cuadradas
1 pata cabra
1 tubo para doblar Hierro
1 caja de Herramientas

EDGARDO IBARRA

Eduardo Gómez

NOV. 16/23
3:00 PM.

Sabado Nov 4 /23

Desmonte de Cerramiento en mallas en muro existente tramos de la columna #3 Hasta la columna # 9, traslado de materiales por 2 trabajadores de la empresa

Personal en Obra : 4 Auxiliares de Obra y Maestro de Obra, Inspector de Obra

Ingresa a la obra
1 Viaje de Arena
1 Viaje de gravason
1 Carretilla
2 palas 1 cuadrada y 1 Redonda
1 Cuerda Amarilla
1 saranda
Varios tubos Ap presión
1 niple de 6" para contraincendio
1 Mona pequeña
1 Martillo cabo de Hierro
1 Manguera para nivelar

EDGARDO IBARRA

Domingo 5 Nov. /23
No Se laboro Dia de Descanso

Lunes 6 Nov /23 festivo
Revisión del Area de trabajo;
Se procedio hacer lo respectivo para realizar labores de desmonte de mallas de cerramiento en muro existente desde la columna #9 Hasta la columna #25
Personal en Obra Auxiliar de Obra, Maestro de Obra, Inspector de Obra

EDGARDO IBARRA

Martes 7 NOV /23
Revisión del Area de trabajo, corte y desmonte de tubería de cerramiento de muro existente, traslado de mallas y tuberia al Acopio dentro de la cancha, terminación de excavación de zapata #7 y zapata #2, traslado de materiales "Arena y piedra" del punto de Acopio, Parqueadero Colombo Aleman a la cancha de futbol
Personal en Obra: Maestro de obra, 3 Auxiliares de Obra
Inspector de Obra civil

EDGARDO IBARRA

Miercoles 8 Nov /23
Revisión de Area y trabajos; excavaciones con Agua por lluvias y filtración del terreno, se procedio a sacar Agua para terminar excavaciones #2 y comenzamos excavaciones en #4 y 6 para asi poder fundir Soladas de 2000 psi Desde zapata 1 a la 7. traslado de materiales de punto de Acopio a la concha para poder empezar trabajos de fundidas
fundidas de soladas # # #

Personal en Obra: Maestro de Obra; 4 Auxiliares de obra
Inspector de Obra civil.

EDGARDO IBARRA

Jueves 9 Nov /23
Revisión de Area, Retiro de Agua de los pozos de las zapatas para fundir soladas: zapata # 7, 5, 6, 8
Excavaciones de zapatas # 9, 10, 11, 12, 13.
traslado de Materiales
Soladas de zapatas de (1x1x0.05) Excavaciones (1x1x1.05)
Personal en Obra:
Maestro de obra, 4 Auxiliares de Obra
Supervisor O Residente de Obra

EDGARDO IBARRA

Viernes 10 Nov /23
Revisión de Area, trazado y colocación de niveles de zapata #10 a la 15, Excavación de zapatas de la #12 a la 16, traslado de Materiales y soldado de zapatas #9 a la 12.
Personal en Obra:
Maestro de Obra
4 Auxiliares de Obra
2 mas en campamento para figuración de Acero =
1 oficial de obra, 1 Auxiliar de Obra
Residente de obra

EDGARDO IBARRA

Sabado 11 Nov. /23
Revisión de Area de trabajo
Secada de Agua de las zapatas a intervenir
Excavación de zapatas #15, 16, 17
traslado de materiales en Obra desde punto de acopio a sitio de trabajo
Demolición de vigas de cimiento zapatas #2 y 3
Personal en obra: Maestro de Obra
4 Auxiliares de obra
Residente de obra
En campamento, para figuración de Acero: 1 Oficial de obra
1 Auxiliar de obra

EDGARDO IBARRA

Domingo 12 Nov festivo y lunes 13 de Nov festivo trabajo el oficial y el Auxiliar en el campamento en figuración de Acero para adelantar Acero y trasladarlo al SENA.

EDGARDO IBARRA

Martes 14 Nov /23
Revisión de Area de trabajo
Zapatas con Agua, Achicar Agua
Excavación de zapatas #17, 18, 19
Demolición viga cimiento #4, 5, 6, 7
traslado de materiales del punto de Acopio a lugar de trabajo
Personal en obra
Maestro de Obra
4 Auxiliares de obra
Residente de obra
En campamento: 1 oficial y 1 Auxiliar para la figuración del Acero para la obra

EDGARDO IBARRA

Miercoles 15 Nov /23
Revisión de Area de trabajo
Achicar zapatas con motobomba zapatas #1, 8, 9, 10, 11
Demolición de viga de cimiento en las zapatas #1, 8, 9, 11
Excavaciones de zapatas #19, 20, 21 Empezadas

traslado de materiales
Elaboración de paneles en concreto para separación de parrilla de las zapatas
Elaboración de Solado de zapatas #

Personal en Obra
Maestro en obra
4 Auxiliares de Obra
SST en obra
Residente de Obra
Campamento: 1 Oficial y 1 Auxiliar para figuración de Acero para la obra SCAP


EDGARDO IBARRA

16 NOV / 2023. Jueves
REVISIÓN DE AREA DE TRABAJO, SOLADOS DE ZAPATAS # 16, 14, 15, 17, 18, EXCAVACIONES DE ZAPATAS # 19, 20, 21 TRASCIEGO DE MATERIALES, ARENA, SE RECIBIO EL DCERO FIGURADO DE ZAPATAS. 2 COLOMNA, 2 PEDESTALES.
590 ESTRIBOS DE CIMIENTO 20X20., 130 ESTRIBOS DE PEDESTAL 20x30, 420 ESTRIBOS COLUMNAS 15X10
PERSONAL EN OBRA, MAESTROS, 4 AUXILIARES, SST, INSPECTOR DE OBRAS.

EDGARDO IBARRA

17/NOV 2023. Viernes

REVISIÓN DE AREA, COLOCACIÓN DE ZAPATAS PARA FUNDIR ZAPATA # 1 4 8, SE APLOMAN LAS COLUMNAS O PEDESTAL TENIENDO EN CUENTA EL DESPLOME DE LOS MUROS EXISTENTES DESDE LA COLUMNA 1 DEL PUNTO MAS ALTO O FINAL DE LA COLUMNA UN DESPLOME DEL MURO DE 0,12 CM AL EJE DE LA COLUMNA 8, 0,8 1/2 CM

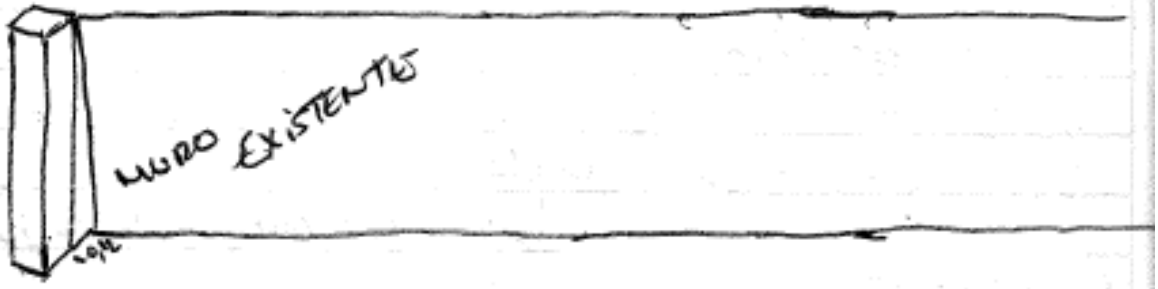

SE FUNDIRA A PLOMO COLUMNAS Y SE HARAN LAS CORRECIONES Y COBROS CORRESPONDIENTES PARA LAS CORRECIONES CORESPONDIENTES. SE REVISA LOS TERMINOS CON INTERVENTOR JHONATAN DAVILA. POR PARTE DEL SENA, EL DIRECTOR DE OBRA NELSÓN POLO e INSPECTOR EDGARDO IBARRA.

EDGARDO IBARRA.
Jhonatan Davila

18/NOV/2023 SABADO.

REVISIÓN DE AREA, ELABORACIÓN DE CONCRETO PARA SOLADO DE ZAPATAS # 21, 22, 23, EXCAVACIÓN DE ZAPATAS 24, 25, LIMPIEZA DE MONTES A LO LARGO X 2.MT X 94.56.ML TRASIEGO DE MATERIALES ACERO 90 VARILLAS DE PEDESTALES, 5 COLUMNAS 30 VARILLAS 3.0 ML PARA COLUMNETAS, EL TALADRO DEMOLEDOR, SE ARMARON 8 PEDESTALES Y SE ARMARON 2 ZAPATAS CON PEDESTALES PARA FUNDIR HOY ZAPATAS # 2 Y 4. TRAZADO PARA NIVELES DE MUROS EL COLUMNAS 15, 21, 27.

PERSONAL EN OBRAS.

* MAESTRO DE OBRA.
* OFICIAL DE OBRA
* 5 AUXILIARES DE OBRA
* S S,T
* RESIDENTE DE OBRA
* DIRECTOR DE OBRA.

EDGARDO IBARRA.
