Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S
ALCALDIA DE MONTERIA

VERSIÓN	1
CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 24 de abril de 2023	SEMANA No.	22	DEL	17/04/2023	AL	23/04/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S				CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIONES AP S.A.S			
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022			CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".			OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS			REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022			*FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023			*FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023		
MODIFICATORIO N° 1	N/A			PRORROGA No. 1	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023		
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	6.00			PLAZO ACTUALIZADO:	6.00		
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	142.00	EQUIVALE AL	78.9%	PLAZO TRANSCURRIDO:	142.00	EQUIVALE AL	78.9%
VALOR INICIAL :	$ 696,192,460.00			VALOR INICIAL :	$ 9,691,701,283.00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00			VALOR ADICION(ES):	$ 0.00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 696,192,460.00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 9,691,701,283.00		
ANTICIPO 0%	$ 0.00			ANTICIPO 30%	$ 2,907,510,384.90		

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	0.00%	$ 0.00	
VALOR POR PAGAR:		$ 696,192,460.00	

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	%	VALOR	FECHA
		$ -	
TOTAL:	0.00%		$ 0.00
VALOR POR PAGAR:			$ 9,691,701,283.00

SUPERVISOR:	ING. MONICA SEVERICHE NUNEZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato, hasta la presente semana el contratista de obras ha entregado 17 ordenes de operaciones, de las cuales las primeras siete (1-7) ordenes fueron rechazadas por error en el concepto de pago y se remitieron nuevamente respetando el consecutivo correspondiente (8-14); de las cuales fueron rechazadas las n°11,12 y 13, remitiendose nuevamente respetando este orden logrando ser las N°15, 16 y 17 respectivamente, las cueles furon aprobacdas por esta interventoria por medio de comunicado.


3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS


3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

INDICADORES

Fecha de inicio	22-sep-2022	Días Programados	181
Suspension N°01	29-dic-2022		
Reinicio N°01	10-mar-2023		
Fecha de entrega	22-mar-2023	Días Transcurridos	142
Valor Planeado	$ 1,738,691,210	Iluvia del Día	2
Valor Ejecutado	$ 1,216,308,511	Iluvia Acumulado	46
% Semana Programado	8.31%	% Acumulado Programado	17.94%
% Semana Ejecutado	0.94%	% Acumulado Ejecutado	12.55%
% Atraso	-7.37%	% Adelanto	-5.39%
Horas bloqueos del Día	#N/D	Horas arqueología del Día	#N/D
Horas bloqueos Acumulado	0	Horas arqueología Acumulado	0

Los siguientes indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramacion ajustada con la fecha de Reinicio N°01 del contrato en referencia.

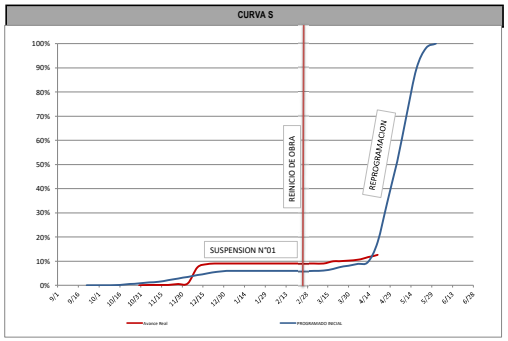

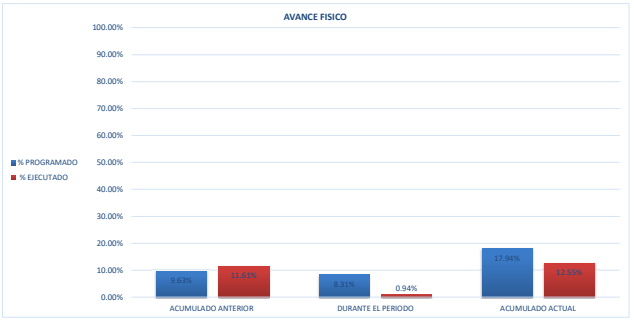

1141340881

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades , instalacion de rieles, armado de acero de refuerzo y fundidas de losa de concreto de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 12.55% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $1.216.308.511 Vs un porcentaje acumulado programado del 17.94% correspondiente a $ 1.738.691.210 reflejando un atraso del 5.39%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITE No	LUGAR

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 24 de abril de 2023	SEMANA No.	22	DEL	17/04/2023	AL	23/04/2023

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades , instalacion de rieles, armado de acero de refuerzo y fundidas de losa de concreto de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 12.55% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $1.216.308.511 Vs un porcentaje acumulado programado del 17.94% correspondiente a $ 1.738.691.210 reflejando un atraso del 5.39%, de acuerdo a la reprogramacion entregada ajustada con la fecha de reinico N°01 del contrato en referencia.

• El contratista de obras en la presente semana realizo actividades instalacion de rieles para fundida de placa huella, excavacion manual para vigas riostra, fundida de placa de concreto y findida de piedra pegada.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoría realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia fundida de placas de concretos entre abcisas K2+340



Se evidencia fundida de placas de concretos entre abcisas K2+340



Se evidencia relleno con material de sub base en abcisa k2+230



Se evidencia excavacion con maquina en abcisa k2+800



Se evidencia desencofrado de placas y viga riostra entre abcisa k2+390



Se evidencia instalacion de rieles para fundida de losa de concreto y viga riostra

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 2220215136 4 COR
