Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 26 de diciembre de 2022	SEMANA No.	14	DEL	12/12/2022	AL	25/12/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S				CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIONES AP S.A.S			
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022			CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".			OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ			REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	N/A		
MODIFICATORIO Nº 1	N/A			PRORROGA No. 1	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/03/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	22/03/2023		
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	6.00			PLAZO ACTUALIZADO:	6.00		
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	94.00	EQUIVALE AL	52.2%	PLAZO TRANSCURRIDO:	94.00	EQUIVALE AL	52.2%
VALOR INICIAL :	$ 696,192,460.00			VALOR INICIAL :	$ 9,691,701,283.00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00			VALOR ADICION(ES):	$ 0.00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 696,192,460.00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 9,691,701,283.00		
ANTICIPO 0%	$ 0.00			ANTICIPO 30%	$ 2,907,510,384.90		

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	**0.00%**	**$ 0.00**	
VALOR POR PAGAR:		$ 696,192,460.00	

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
		$ -	
TOTAL:	**0.00%**	**$ 0.00**	
VALOR POR PAGAR:		$ 9,691,701,283.00	

SUPERVISOR:	ING. MONICA SEVERICHE NUÑEZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato, hasta la presente semana el contratista de obras ha entregado 17 ordenes de orperaciones, de las cuales las primeras siete (1-7) ordenes fueron rechazadas por error en el concepto de pago y se remitieron nuevamente respetando el consecutivo correspondiente (8-14); de las cuales fueron rechazadas las n°11,12 y 13, remitiendose nuevamente respetando este orden logrando ser las N°15, 16 y 17 respectivamente, las cueles furon aprobacdas por esta interventoria por medio de comunicado.

3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS


3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)


INDICADORES

Fecha de inicio	22-sep-2022	**Días Programados**	181
Fecha de entrega	22-mar-2023	**Días Transcurridos**	94
Valor Planeado	$ 3,176,557,099	**Horas lluvia del Día**	0
Valor Ejecutado	$ 843,178,012	**Horas lluvia Acumulado**	44.5
% Semana Programado	5.45%	**% Acumulado Programado**	32.78%
% Semana Ejecutado	1.24%	**% Acumulado Ejecutado**	8.70%
% Atraso	**-4.21%**	**% Atraso**	**-24.08%**
Horas bloqueos del Día	0	**Horas arqueología del Día**	0
Horas bloqueos Acumulado	0	**Horas arqueología Acumulado**	0

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

CURVA S

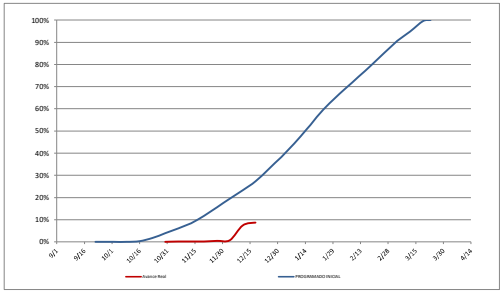

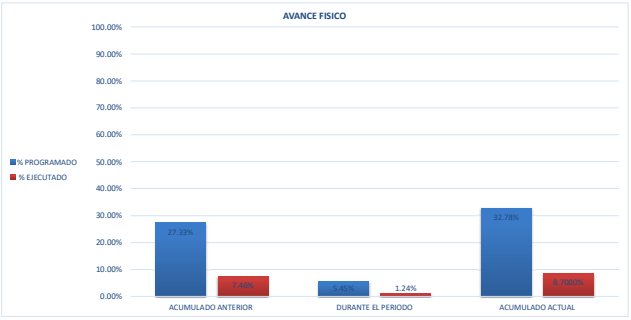

1141340881

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de excavaciones, relleno con material de terraplen, sub base y demolicion de cunetas existentes y retiro de material sobrante de excavacion, entre las abcisas K1+120 hasta K2+720, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 8.70% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 843.178.012 Vs un porcentaje acumulado programado del 32.78% correspondiente a $ 3,176,557,099.00 reflejando un atraso del 24.08%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITÉ No	LUGAR

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 26 de diciembre de 2022	SEMANA No.	14	DEL	12/12/2022	AL	25/12/2022

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de excavaciones, relleno con material de terraplen, sub base y demolicion de cunetas existentes y retiro de material sobrante de excavacion, entre las abcisas K1+120 hasta K2+720, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 8.70% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 843.178.012 Vs un porcentaje acumulado programado del 32.78% correspondiente a $ 3,176,557,099.00 reflejando un atraso del 24.08%. La interventoría solicita al contratista realizar las actividades de acuerdo a lo programado hasta la fecha lo más pronto posible y así superar el atraso presentado a la fecha.

• El contratista de obras en la presente semana realizo actividades de excavacion, relleno con material de terraplen y sub base en el tramo n2, sin embargo los rendimientos no son suficientes para contrarestar los atrasos que se vienen presentando. de acuerdo al cronogramad de obras entregado.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoría realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

• En la presente semana, se realizo chequeo de niveles de relleno de material de terraplen entre las abcisas K1+120 hastas k2+720.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



se realizo reunion informativa con la comunidad con el acompañamiento profesional social



Se evidencia excavación con maquinaria en material comun.



Se evidencia retiro de material comun proveniente de excavaciones.



Se evidencia cargue y retiro de material proveniente de excavación.



se evidencia retiro de material sobrante de excavacion



se evidencia retiro de material sobrante de excavacion

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 22202151364 COR

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	miércoles, 28 de diciembre de 2022	SEMANA No.	15	DEL	26/12/2022	AL	28/12/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S				CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIONES AP S.A.S			
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022			CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".			OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ			REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	N/A		
MODIFICATORIO Nº 1	N/A			PRORROGA No. 1	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/03/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	22/03/2023		
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	6.00			PLAZO ACTUALIZADO:	6.00		
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	97.00	EQUIVALE AL	53.9%	PLAZO TRANSCURRIDO:	97.00	EQUIVALE AL	53.9%
VALOR INICIAL :	$ 696,192,460.00			VALOR INICIAL :	$ 9,691,701,283.00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00			VALOR ADICION(ES):	$ 0.00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 696,192,460.00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 9,691,701,283.00		
ANTICIPO 0%	$ 0.00			ANTICIPO 30%	$ 2,907,510,384.90		

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	0.00%	$ 0.00	
VALOR POR PAGAR:		$ 696,192,460.00	

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
		$ -	
TOTAL:	0.00%	$ 0.00	
VALOR POR PAGAR:		$ 9,691,701,283.00	

SUPERVISOR:	ING. MONICA SEVERICHE NUÑEZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato, hasta la presente semana el contratista de obras ha entregado 17 ordenes de orperaciones, de las cuales las primeras siete (1-7) ordenes fueron rechazadas por error en el concepto de pago y se remitieron nuevamente respetando el consecutivo correspondiente (8-14); de las cuales fueron rechazadas las n°11,12 y 13, remitiendose nuevamente respetando este orden logrando ser las N°15, 16 y 17 respectivamente, las cueles furon aprobacdas por esta interventoria por medio de comunicado.

3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS


3.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)


INDICADORES

Fecha de inicio	22-sep-2022	Días Programados	181
Fecha de entrega	22-mar-2023	Días Transcurridos	98
Valor Planeado	$ 3,484,166,612	Horas lluvia del Día	0
Valor Ejecutado	$ 875,160,626	Horas lluvia Acumulado	44.5
% Semana Programado	3.17%	% Acumulado Programado	35.95%
% Semana Ejecutado	0.33%	% Acumulado Ejecutado	9.03%
% Atraso	-2.84%	% Atraso	-26.92%
Horas bloqueos del Día	#N/D	Horas arqueología del Día	#N/D
Horas bloqueos Acumulado	0	Horas arqueología Acumulado	0

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

CURVA S

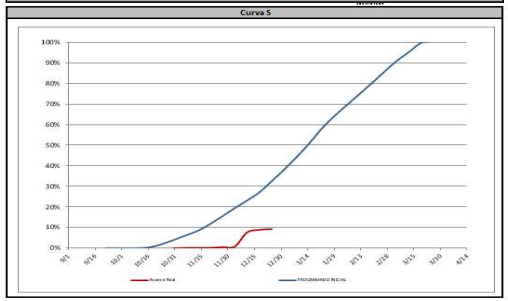

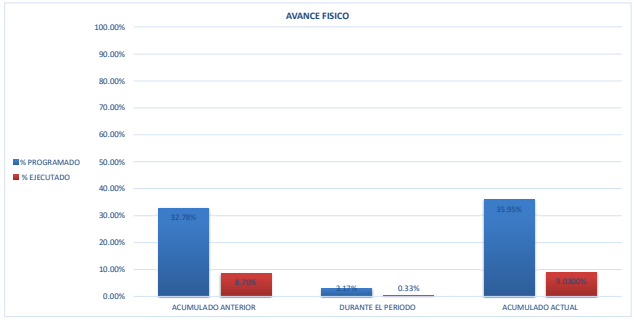

1141340881

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de excavaciones, relleno con material de terraplen, sub base y retiro de material sobrante de excavacion, entre las abcisas K1+120 hasta K2+720, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 9.03% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 875.160.626 Vs un porcentaje acumulado programado del 35.95% correspondiente a $ 3,484.166.612.00 reflejando un atraso del 26.92%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITÉ No	LUGAR

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	miércoles, 28 de diciembre de 2022	SEMANA No.	15	DEL	26/12/2022	AL	28/12/2022

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de excavaciones, relleno con material de terraplen, sub base y retiro de material sobrante de excavacion, entre las abcisas K1+120 hasta K2+720, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 9.03% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 875.160.626 Vs un porcentaje acumulado programado del 35.95% correspondiente a $ 3,484.166.612.00 reflejando un atraso del 26.92%. La interventoría solicita al contratista realizar las actividades de acuerdo a lo programado hasta la fecha lo más pronto posible y así superar el atraso presentado a la fecha.

• El contratista de obras en la presente semana realizo actividades de excavacion, relleno con material de terraplen y sub base en el tramo n2, sin embargo los rendimientos no son suficientes para contrarestar los atrasos que se vienen presentando. de acuerdo al cronogramad de obras entregado.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoría realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

• En la presente semana, se realizo chequeo de niveles de relleno de material de terraplen entre las abcisas K1+120 hastas k2+720.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



se evidencia excavacion con maquina en material comun.



Se evidencia excavación con maquinaria en material comun.



Se evidencia retiro de material comun proveniente de excavaciones.



Se evidencia cargue y retiro de material proveniente de excavación.



se evidencia retiro de material sobrante de excavacion



se evidencia retiro de material sobrante de excavacion

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 22202151364 COR

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S
ALCALDIA DE MONTERIA

VERSIÓN	1
CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 13 de marzo de 2023	SEMANA No.	16	DEL	10/03/2023	AL	12/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S				CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIONES AP S.A.S			
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022			CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".			OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS			REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022			*FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023			*FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023		
MODIFICATORIO Nº 1	N/A			PRORROGA No. 1	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023		
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	6.00			PLAZO ACTUALIZADO:	6.00		
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	100.00	EQUIVALE AL	55.6%	PLAZO TRANSCURRIDO:	100.00	EQUIVALE AL	55.6%
VALOR INICIAL :	$ 696,192,460.00			VALOR INICIAL :	$ 9,691,701,283.00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00			VALOR ADICION(ES):	$ 0.00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 696,192,460.00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 9,691,701,283.00		
ANTICIPO 0%	$ 0.00			ANTICIPO 30%	$ 2,907,510,384.90		

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	**0.00%**	**$ 0.00**	
VALOR POR PAGAR:		$ 696,192,460.00	

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	%	VALOR	FECHA
		$ -	
TOTAL:	**0.00%**		**$ 0.00**
VALOR POR PAGAR:			$ 9,691,701,283.00

SUPERVISOR:	ING. MONICA SEVERICHE NUNEZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato, hasta la presente semana el contratista de obras ha entregado 17 ordenes de operaciones, de las cuales las primeras siete (1-7) ordenes fueron rechazadas por error en el concepto de pago y se remitieron nuevamente respetando el consecutivo correspondiente (8-14); de las cuales fueron rechazadas las n°11,12 y 13, remitiendose nuevamente respetando este orden logrando ser las N°15, 16 y 17 respectivamente, las cueles furon aprobacdas por esta interventoria por medio de comunicado.

3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS


3.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

INDICADORES


Fecha de inicio	22-sep-2022	Días Programados	181
Suspension N°01	29-dic-2022		
Reinicio N°01	10-mar-2023		
Fecha de entrega	22-mar-2023	Días Transcurridos	100
Valor Planeado	$ 586,358,466	Horas lluvia del Día	3
Valor Ejecutado	$ 875,160,626	Horas lluvia Acumulado	47
% Semana Programado	0.12%	% Acumulado Programado	6.05%
% Semana Ejecutado	0.00%	% Acumulado Ejecutado	9.03%
% Atraso	-0.12%	% Atraso	2.98%
Horas bloqueos del Día	0	Horas arqueología del Día	0
Horas bloqueos Acumulado	0	Horas arqueología Acumulado	0

Los siguientes indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramacion ajustada con la fecha de Reinicio N°01 del contrato en referencia.

CURVA S

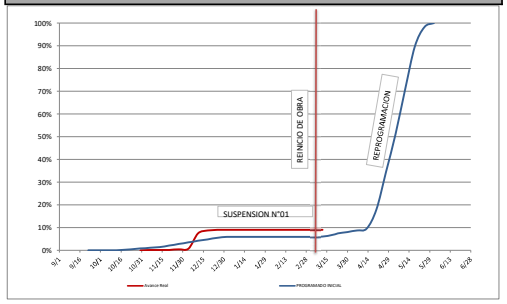

AVANCE FISICO

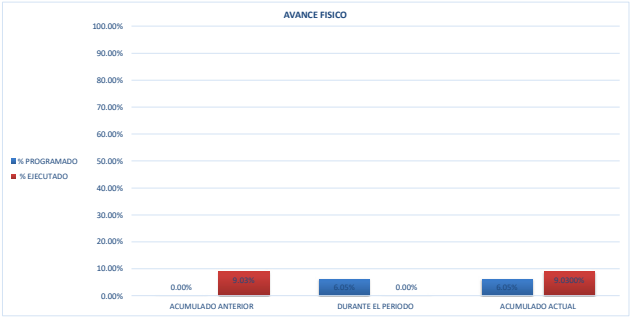

1141340881

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de excavaciones, relleno con material de terraplen, sub base y retiro de material sobrante de excavacion, entre las abcisas K1+120 hasta K2+720, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 9.03% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 875.160.626 Vs un porcentaje acumulado programado del 6.05% correspondiente a $ 586,358,466.00 reflejando un adelanto del 2.98%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITE No	LUGAR

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 13 de marzo de 2023	SEMANA No.	16	DEL	10/03/2023	AL	12/03/2023

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de descargue de maquinaria, instalacion de rieles, chequeo de niveles, sencibilizacion ala comunidad del reinicio de obra, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 9.03% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 875.160.626 Vs un porcentaje acumulado programado del 6.05% correspondiente a $ 586,358,466.00 reflejando un adelanto del 2.98%, de acuerdo a la reprogramacion entregada ajustada con la fecha de reinico N°01 del contrato en referencia.

• El contratista de obras en la presente semana realizo actividades de excavacion, relleno con material de terraplen y sub base en el tramo n2.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoría realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

• En la presente semana, se realizo chequeo de niveles de relleno de material de terraplen entre las abcisas K1+120 hastas k2+720.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia estado actual de la placa huella, luegi del reinicio de las obras



Se evidencia descargue de maquinaria para las actividades en sitio de obra.



Se evidencia Armado de acero de refuerzo y volqueta para retiro del material



Se evidencia instalacion de rieles para fundida de los de concreto y piedras pegadas



se evidencia reinicio de las actividades en sitio de obra



se evidencia descargue de material de terraplaen y sub base.

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 2220215136 4 COR

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S
ALCALDIA DE MONTERIA

VERSIÓN	1
CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 20 de marzo de 2023	SEMANA No.	17	DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S				CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIONES AP S.A.S			
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022			CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".			OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS			REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022			*FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023			*FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023		
MODIFICATORIO Nº 1	N/A			PRORROGA No. 1	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023		
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	6.00			PLAZO ACTUALIZADO:	6.00		
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	107.00	EQUIVALE AL	59.5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	107.00	EQUIVALE AL	59.5%
VALOR INICIAL :	$ 696,192,460.00			VALOR INICIAL :	$ 9,691,701,283.00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00			VALOR ADICION(ES):	$ 0.00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 696,192,460.00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 9,691,701,283.00		
ANTICIPO 0%	$ 0.00			ANTICIPO 30%	$ 2,907,510,384.90		

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	0.00%	$ 0.00	
VALOR POR PAGAR:		$ 696,192,460.00	

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	%	VALOR	FECHA
		$ -	
TOTAL:	0.00%	$ 0.00	
VALOR POR PAGAR:		$ 9,691,701,283.00	

SUPERVISOR:	ING. MONICA SEVERICHE NUNEZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato, hasta la presente semana el contratista de obras ha entregado 17 ordenes de operaciones, de las cuales las primeras siete (1-7) ordenes fueron rechazadas por error en el concepto de pago y se remitieron nuevamente respetando el consecutivo correspondiente (8-14); de las cuales fueron rechazadas las n°11,12 y 13, remitiendose nuevamente respetando este orden logrando ser las N°15, 16 y 17 respectivamente, las cueles furon aprobacdas por esta interventoria por medio de comunicado.


3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS


3.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

INDICADORES

Fecha de inicio	22-sep-2022	Días Programados	181
Suspension N°01	29-dic-2022		
Reinicio N°01	10-mar-2023		
Fecha de entrega	22-mar-2023	Días Transcurridos	107
Valor Planeado	$ 653,220,667	Horas lluvia del Día	3
Valor Ejecutado	$ 964,324,278	Horas lluvia Acumulado	47
% Semana Programado	0.69%	% Acumulado Programado	6.74%
% Semana Ejecutado	0.92%	% Acumulado Ejecutado	9.95%
% Atraso	0.23%	% Atraso	3.21%
Horas bloqueos del Día	0	Horas arqueología del Día	0
Horas bloqueos Acumulado	0	Horas arqueología Acumulado	0

Los siguientes indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramacion ajustada con la fecha de Reinicio N°01 del contrato en referencia.

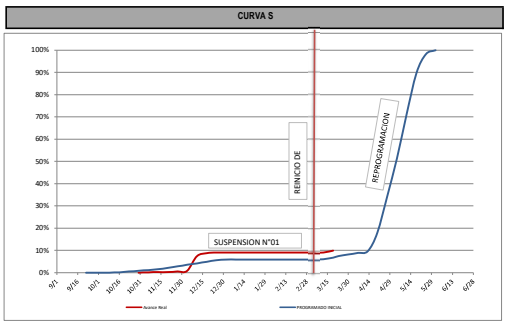

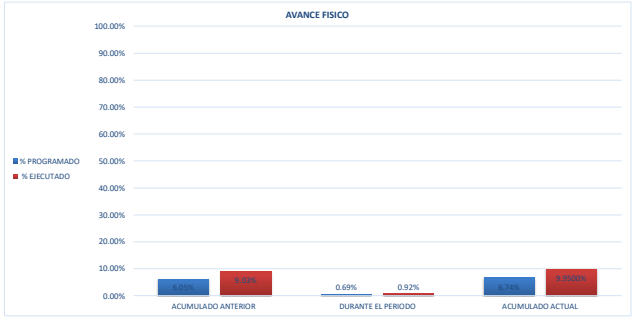

1141340881

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de relleno con material de sub base, relleno con material de terraplen, inatalacion de rieles y fundidas de losa de concreto de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 9.95% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 964.324.278 Vs un porcentaje acumulado programado del 6.74% correspondiente a $ 653.220.667 reflejando un adelanto del 3.21%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITE No	LUGAR

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 20 de marzo de 2023	SEMANA No.	17	DEL	13/03/2023	AL	19/03/2023

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de relleno con material de sub base, relleno con material de terraplen, inatalacion de rieles y fundidas de losa de concreto de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 9.95% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 964.324.278 Vs un porcentaje acumulado programado del 6.74% correspondiente a $ 653.220.667 reflejando un adelanto del 3.21%, de acuerdo a la reprogramacion entregada ajustada con la fecha de reinico N°01 del contrato en referencia.

• El contratista de obras en la presente semana realizo actividades de excavacion, relleno con material de terraplen y sub base en el tramo 1 y2.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoría realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

• En la presente semana, se realizo chequeo de niveles de relleno de material de terraplen entre las abcisas K1+120 hastas k2+720.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia relleno con material de sub base en tramo N°02



se evidencia relleno con material de sub base en tramo N°02 de la placa huella.



Se evidencia fundida de placas de concreto de placa huella entre abcisas K2+600 hasta K2+720



Se evidencia fundida de placas de concreto de placa huella entre abcisas K2+600 hasta K2+720



Se evidencia reunion informativa a la comunidad de la obra



Se evidencia chequeo del asentamiento del concreto de las fundidas realizadas en obra.

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 2220215136 4 COR

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S
ALCALDIA DE MONTERIA

VERSIÓN	1
CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 27 de marzo de 2023	SEMANA No.	18	DEL	20/03/2023	AL	26/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S				CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIONES AP S.A.S			
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022			CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".			OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS			REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022			*FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023			*FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023		
MODIFICATORIO Nº 1	N/A			PRORROGA No. 1	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023		
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	6.00			PLAZO ACTUALIZADO:	6.00		
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	114.00	EQUIVALE AL	63.4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	114.00	EQUIVALE AL	63.4%
VALOR INICIAL :	$ 696,192,460.00			VALOR INICIAL :	$ 9,691,701,283.00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00			VALOR ADICION(ES):	$ 0.00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 696,192,460.00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 9,691,701,283.00		
ANTICIPO 0%	$ 0.00			ANTICIPO 30%	$ 2,907,510,384.90		

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	0.00%	$ 0.00	
VALOR POR PAGAR:		$ 696,192,460.00	

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	%	VALOR	FECHA
		$ -	
TOTAL:	0.00%	$ 0.00	
VALOR POR PAGAR:			$ 9,691,701,283.00

SUPERVISOR:	ING. MONICA SEVERICHE NUNEZ
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato, hasta la presente semana el contratista de obras ha entregado 17 ordenes de operaciones, de las cuales las primeras siete (1-7) ordenes fueron rechazadas por error en el concepto de pago y se remitieron nuevamente respetando el consecutivo correspondiente (8-14); de las cuales fueron rechazadas las n°11,12 y 13, remitiendose nuevamente respetando este orden logrando ser las N°15, 16 y 17 respectivamente, las cueles furon aprobacdas por esta interventoria por medio de comunicado.


3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS


3.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

INDICADORES

Fecha de inicio	22-sep-2022	Días Programados	181
Suspension N°01	29-dic-2022		
Reinicio N°01	10-mar-2023		
Fecha de entrega	22-mar-2023	Días Transcurridos	114
Valor Planeado	$ 721,062,576	Horas lluvia del Día	6
Valor Ejecutado	$ 970,139,299	Horas lluvia Acumulado	50
% Semana Programado	0.70%	% Acumulado Programado	7.44%
% Semana Ejecutado	0.06%	% Acumulado Ejecutado	10.01%
% Atraso	-0.64%	% Adelanto	2.57%
Horas bloqueos del Día	#N/D	Horas arqueología del Día	#N/D
Horas bloqueos Acumulado	0	Horas arqueología Acumulado	0

Los siguientes indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramacion ajustada con la fecha de Reinicio N°01 del contrato en referencia.

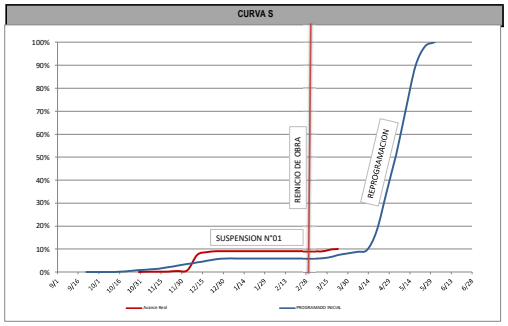

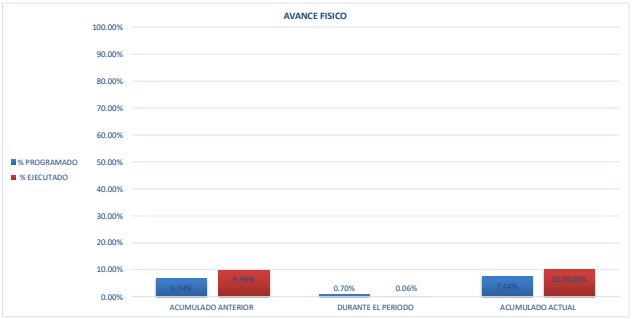

1141340881

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de relleno con material de sub base, relleno con material de terraplen, inatalacion de rieles y fundidas de losa de concreto de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 10.01% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 970.139.299 Vs un porcentaje acumulado programado del 7.44% correspondiente a $ 721.062.576 reflejando un adelanto del 2.57%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITE No	LUGAR

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 27 de marzo de 2023	SEMANA No.	18	DEL	20/03/2023	AL	26/03/2023

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de relleno con material de sub base, relleno con material de terraplen, inatalacion de rieles y fundidas de losa de concreto de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 10.01% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 970.139.299 Vs un porcentaje acumulado programado del 7.44% correspondiente a $ 721.062.576 reflejando un adelanto del 2.57%, de acuerdo a la reprogramacion entregada ajustada con la fecha de reinico N°01 del contrato en referencia.

• El contratista de obras en la presente semana realizo actividades de excavacion, relleno con material de terraplen y sub base en el tramo 1 y2.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoría realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

• En la presente semana, se realizo chequeo de niveles de relleno de material de terraplen entre las abcisas K1+120 hastas k2+720.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia Intalacion de rieles y armado de acero de refuerzo.



Se evidencia relleno con material de sub base en tramo N°02



Se evidencia fundida de berma cuneta en tramo N°02



Se evidencia chequeo de niveles de relleno de sub base



Se evidencia chequeo del asentamiento del concreto de las fundidas realizadas en obra.



se evidencia instalacion de rieles para fundida de bermas cunetas

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 2220215136 4 COR

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 3 de abril de 2023	SEMANA No.	19	DEL	27/03/2023	AL	2/04/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S				CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIONES AP S.A.S			
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022			CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".			OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS			REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022			*FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023			*FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023		
MODIFICATORIO Nº 1	N/A			PRORROGA No. 1	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023		
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	6.00			PLAZO ACTUALIZADO:	6.00		
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	121.00	EQUIVALE AL	67.3%	PLAZO TRANSCURRIDO:	121.00	EQUIVALE AL	67.3%
VALOR INICIAL :	$ 696,192,460.00			VALOR INICIAL :	$ 9,691,701,283.00		
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00			VALOR ADICION(ES):	$ 0.00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 696,192,460.00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 9,691,701,283.00		
ANTICIPO 0%	$ 0.00			ANTICIPO 30%	$ 2,907,510,384.90		

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	0.00%	$ 0.00	
VALOR POR PAGAR:		$ 696,192,460.00	

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	%	VALOR	FECHA
		$ -	
TOTAL:	0.00%	$ 0.00	
VALOR POR PAGAR:			$ 9,691,701,283.00

SUPERVISOR:	ING. MONICA SEVERICHE NUNEZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato, hasta la presente semana el contratista de obras ha entregado 17 ordenes de operaciones, de las cuales las primeras siete (1-7) ordenes fueron rechazadas por error en el concepto de pago y se remitieron nuevamente respetando el consecutivo correspondiente (8-14); de las cuales fueron rechazadas las n°11,12 y 13, remitiendose nuevamente respetando este orden logrando ser las N°15, 16 y 17 respectivamente, las cueles furon aprobacdas por esta interventoria por medio de comunicado.


3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS


3.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

INDICADORES

Fecha de inicio	22-sep-2022	Días Programados	181
Suspension N°01	29-dic-2022		
Reinicio N°01	10-mar-2023		
Fecha de entrega	22-mar-2023	Días Transcurridos	121
Valor Planeado	$ 787,935,314	Horas lluvia del Día	0
Valor Ejecutado	$ 990,491,871	Horas lluvia Acumulado	44
% Semana Programado	0.69%	% Acumulado Programado	8.13%
% Semana Ejecutado	0.21%	% Acumulado Ejecutado	10.22%
% Atraso	-0.48%	% Adelanto	2.09%
Horas bloqueos del Día	#N/D	Horas arqueología del Día	#N/D
Horas bloqueos Acumulado	0	Horas arqueología Acumulado	0

Los siguientes indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramacion ajustada con la fecha de Reinicio N°01 del contrato en referencia.

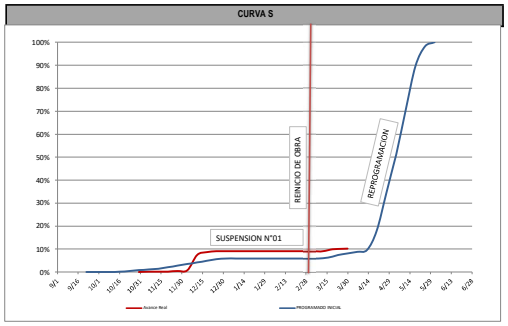

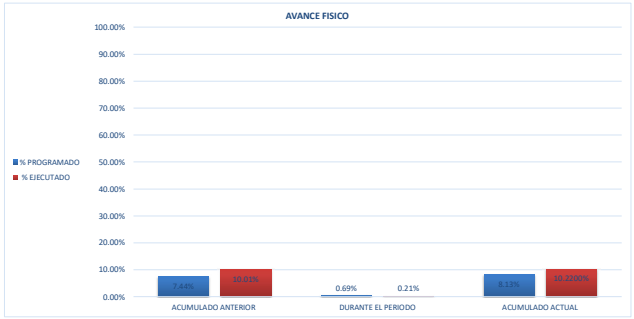

1141340881

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de relleno con material de sub base, relleno con material de terraplen, inatalacion de rieles y fundidas de losa de concreto de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 10.22% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 990.491.871 Vs un porcentaje acumulado programado del 8.13% correspondiente a $ 787.935.314 reflejando un adelanto del 2.09%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITE No	LUGAR

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 3 de abril de 2023	SEMANA No.	19	DEL	27/03/2023	AL	2/04/2023

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de relleno con material de sub base, relleno con material de terraplen, inatalacion de rieles y fundidas de losa de concreto de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 10.22% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $ 990.491.871 Vs un porcentaje acumulado programado del 8.13% correspondiente a $ 787.935.314 reflejando un adelanto del 2.09% , de acuerdo a la reprogramacion entregada ajustada con la fecha de reinico N°01 del contrato en referencia.

• El contratista de obras en la presente semana realizo actividades de excavacion, relleno con material de terraplen y sub base en el tramo 1 y 2 y Fundida de placa huella.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoría realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia relleno y nivelacion con sub base granular en tramo N°02.



Se evidencia compactación de la sub base granular en tramo N°02.



Se evidencia fundida de piedra pegada del carril izquierdo en tramo N°02.



Se evidencia chequeo de niveles de relleno de sub base



Se evidencia chequeo del asentamiento del concreto de las fundidas realizadas en obra.



Se evidencia colocación del acero de refuerzo para vigas en tramo N°02.

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 2220215136 4 COR
