DATOS DEL INFORME				
No. DE INFORME:	**3**			
TIPO DE INFORME:	**PARCIAL**	**(__x__)**	**FINAL**	**(____)**
FECHA DE ELABORACIÓN:	Noviembre de 2023			
PERIODO DEL INFORME	Desde 02/12/2022 Hasta 30/06/2023			

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	GN2683-2022
TIPO DE CONTRATO:	Contratación de Mínima Cuantía
NOMBRE CONTRATISTA:	SOLUCIONES PARA EL AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD SAS BIC ESP
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 900.400.097-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	JOHNNY WALTER TOVAR TRUJILLO
OBJETO DEL CONTRATO:	*"*RECEPCIONAR Y TRANSFORMAR 44 TONELADAS DE PLÁSTICO, RECOLECTADAS EN LA CAMPAÑA DESPLASTIFICATE, E INSTALAR LOS ECOPARQUES Y ENTREGA DE ECOBANCAS ELABORADOS EN MATERIAL RECICLABLE PARA SER ENTREGADOS A INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, MUNICIPIOS Y/O PERSONAS QUE CUMPLAN CON LAS CANTIDADES ACORDADAS*".*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	18 de noviembre del 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	02 de diciembre de 2022
FECHA MODIFICATORIO No. 1	13 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de mayo de 2023
FECHA MODIFICATORIO No. 2	30 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de junio de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACUERDO AL REINICIO:	N/A

PRÓRROGAS:	**SI (_x__)**	**NO (__)**
MODIFICACIONES	**SI (___)**	**NO (_x_)**

NO.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN
	13 de diciembre de 2022	**PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. GN2683-2022 hasta el 31 de mayo de 2023. La anterior prórroga se celebra en

1		concordancia con la autorización emitida por la Asamblea Departamental mediante Ordenanza 031 de 2022.
2	**30 de mayo de 2023**	**PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. GN2683- 2022 hasta el 30 de junio de 2023, de conformidad con la solicitud adelantada por la supervisión del contrato.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOHANNA STHEFANNY LAGOS RIASCOS
CARGO:	Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($83.290.000) M/CTE.

ADICIONES: **SI (__x_)** **NO (____)**

ADICIÓN No. 1:	**ADICIÓN:** Adicionar al valor del contrato la suma de: **UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.698.333).**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 84.988.333).

FORMA DE PAGO INICIAL:	El Departamento de Nariño, cancelará al Contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: **1. Anticipo:** El Departamento entregará al contratista a título de anticipo el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. El valor correspondiente al anticipo será amortizado en el mismo porcentaje de cada pago, cabe resaltar que el anticipo no

	constituye condición previa para la iniciación de la ejecución del contrato. El anticipo en ningún caso se considera pago y estará sujeto a la concepción de los requisitos que EL DEPARTAMENTO requiera al momento de la suscripción del contrato. **2. Pagos parciales**: Correspondientes al 100% del valor del contrato, los cuales se cancelarán mediante actas.

1.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**No. CDP/ CDR**	**FECHA**	**CUENTA**	**VALOR**	**VALOR A APROPIAR**
	2022060081	21/06/2022	2.3.2.02.02.009 - 32-3202-0900- 3202001-2021003520209- 97990-16-1.2.1.0.00	$85.000.000	$83.290.000
	2022120060	05/12/2022	2.3.2.02.02.009 -32-3202-0900-3202001-2021003520209- 97990-16-1.2.1.0.00	1.710.000	$1.698.333
	TOTAL				**$84.988.333**
	RDC No.	**FECHA**	**CUENTA**	**VALOR RDC**	
	2022110537	18/11/2022	2.3.2.02.02.009 -32-3202-0900-3202001-2021003520209- 97990-16-1.2.1.0.00	$83.290.000,00	
	2022120740	30/12/2022	2.3.2.02.02.009 -32- 3202-0900-3202001-2021003520209- 97990-16-1.2.1.0.00	$1.698.333	

1.2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Valor Total del Contrato		$ 83.290.000
Valor adicionado modificatorio No 1		$ 1.698.333

Valor pagado anticipo (30%)	$25.496.499,90	
Valor neto pagado acta parcial 1 (amortizado el 100% del anticipo)	$35.695.099,86	
Saldo pendiente por pagar acta parcial 2	$ 18.417.400,24	
Valor saldo a favor del DEPARTAMENTO	$ 5.379.333	
Sumas iguales	$84.988.333	$84.988.333

2. INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

INFORMACIÓN TECNICA

El Departamento de Nariño, en uso de sus facultades legales y contractuales, inició el proceso de Invitación Publica de Mínima Cuantía No. IMC 064- 2022. Como resultado de la gestión y el trámite de esta modalidad contractual, se celebró el contrato 2683 – 2022 con SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO S.A.S BIC, mismo, que fue suscrito el día dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022), y que cuenta con acta de inicio de fecha dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022). El objeto del contrato es “RECEPCIONAR Y TRANSFORMAR 44 TONELADAS DE PLÁSTICO, RECOLECTADAS EN LA CAMPAÑA DESPLASTIFICATE, E INSTALAR LOS ECOPARQUES Y ENTREGA DE ECOBANCAS ELABORADOS EN MATERIAL RECICLABLE PARA SER ENTREGADOS A INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, MUNICIPIOS Y/O PERSONAS QUE CUMPLAN CON LAS CANTIDADES ACORDADAS”.

Por su parte, SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO S.A.S, inició labores de recolección y transformación del material plástico reciclado y, ha informado a la supervisión del contrato, sobre los eco parques y eco bancas que deben ser entregados a los beneficiarios de la campaña DESPLASTIFICATE.

Debe recalcarse que, durante la ejecución del contrato, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha estado al tanto de la entrega de informes bimensuales por parte del contratista, en el que se han relacionado las actividades adelantadas y se ha logrado constatar lo siguiente:

- En primera instancia el contratista realizó la actividad que contempla los recorridos realizados en el municipio de Pasto para la recolección a domicilio de los residuos plásticos, durante las fechas indicadas, por ello, ha realizado las siguientes rutas de recolección:

Tabla 1. Recolección de residuos en el municipio de Pasto

No.	Fecha	Municipio	Recorrido
1.	1 de diciembre de 2022	Pasto	Barrio la Rosa
2.	1 de diciembre de 2022	Pasto	Catambuco
3.	6 de diciembre de 2022	Pasto	Pedagógico- Torres de Mariluz -Los dos puentes - Parque Infantil
4.	17 de diciembre de 2022	Pasto	La Carolina - Santa Mónica – Nuevo Horizonte - Corazón de Jesús

5.	26 de diciembre de 2022	Pasto	Capusigra - Zaguán del Lago - Anganoy - Unicentro - San Ignacio - Avenida Colombia - La Aurora
6.	21 de enero de 2023	Pasto	Pedagógico- Torres de Mariluz -Los dos puentes - Parque Infantil
7.	31 de enero de 2023	Pasto	Pedagógico- Torres de Mariluz -Los dos puentes - Parque Infantil
8.	8 de febrero de 2023	Pasto	Tamasagra - Potrerillo
9.	9 de febrero de 2023	Pasto	Villas del Norte-
10.	10 de febrero de 2023	Pasto	La Carolina - Santa Mónica – Nuevo Horizonte - Corazón de Jesús
11.	21 de febrero de 2023	Pasto	Pedagógico- Torres de Mariluz -Los dos puentes - Parque Infantil
12.	2 de marzo de 2023	Pasto	Centro Carrera 23 - Potrerillo
13.	2 de marzo de 2023	Pasto	Capusigra - Zaguán del Lago - Anganoy - Unicentro - San Ignacio - Avenida Colombia - La Aurora
14.	4 de marzo de 2023	Pasto	La Carolina - Santa Mónica – Nuevo Horizonte - Corazón de Jesús
15.	8 de marzo de 2023	Pasto	Pedagógico- Torres de Mariluz -Los dos puentes - Parque Infantil
16.	18 de marzo de 2023	Pasto	Las Lunas
17.	22 de marzo de 2023	Pasto	Corazón de Jesús
18.	3 de abril de 2023	Pasto	Nueva Aranda- San Diego- La Carolina - Santa Mónica - Nuevo Horizonte -
19.	3 de abril de 2023	Pasto	Potrerillo – San Juan Bosco – Las Lunas
20.	12 de abril de 2023	Pasto	San Ignacio - Potrerillo
21.	14 de abril de 2023	Pasto	Potrerillo - Tamasagra
22.	22 de abril de 2023	Pasto	San Ignacio - Potrerillo
23.	8 de mayo de 2023	Pasto	Potrerillo – San Juan Bosco – Las Lunas
24.	8 de mayo de 2023	Pasto	Capusigra - San Ignacio – Carrera 23 - Avenida Colombia
25.	17 de mayo de 2023	Pasto	Potrerillo - Tamasagra
26.	20 de mayo de 2023	Pasto	Nueva Aranda- San Diego- La Carolina - Santa Mónica - Nuevo Horizonte -
27.	23 de mayo de 2023	Pasto	Potrerillo – Carrera 21A – Carrera 23 -
28.	6 de junio de 2023	Pasto	Potrerillo - Tamasagra
29.	15 de junio de 2023	Pasto	Potrerillo - Carrera 23
30.	28 de junio de 2023	Pasto	Potrerillo - Tamasagra

- En cuanto a la actividad relacionada con la recepción de 44 toneladas de plástico reciclado, durante el mes de diciembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, se ha logrado la recepción de 44.000 Kg de material plástico reciclado aportados por los beneficiarios de la campaña desplastificate, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2. recepción de plástico.

Municipio	Kilogramos
Ancuya	801.2
Córdoba	1707.1
Cumbal	74.2
El Charco	1000
Guachucal	2244.7
Guaitarilla	806.3
Imúes	3227.8
Iscuandé	1000
La Cruz	312.5
La Florida	1140.1
La Unión	1425.8
Linares	2620
Llorente	332
Mallama	3053.8
Mosquera	450
Pasto	10796.14
Ricaurte	625.2
San Bernardo	1165.7
Taminango	3548.96
Tumaco	6676.5
Túquerres	992
TOTAL	**44000**

- En cuanto a la actividad relacionada con transformar 40 toneladas de plástico recepcionado en 10 eco parques pre ensamblados, de conformidad a las especificaciones establecidas, se ha ejecutado al 100% esta actividad, teniendo como resultado diez (10) eco parques pre ensamblados listos para la instalación.

Imagen No. 1: transformación de plástico en ecoparques.





- Transformar 4 toneladas de plástico recepcionado en ocho (08) ecobancas, de conformidad a las especificaciones establecidas, a la fecha del presente informe se ha ejecutado al 100% esta actividad, teniendo como resultado las ecobancas elaboradas con plástico reciclado.

Imagen No. 2: Transformación de plástico en ecobancas.



Con base a lo anterior, desde la supervisión se realizó una visita de inspección y verificación de los productos entregados por parte del contratista, a partir de ello, se verificó que tanto las ecobancas como los ecoparques cumplen con las especificaciones técnicas (medidas y cantidad) establecidas en el contrato.

Imagen No. 3: Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ecoparques.





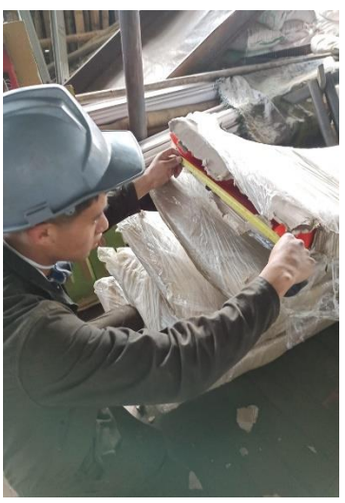


Imagen No. 4: Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ecobancas





- En cuanto a la actividad de elaborar manual de uso para entregar a los beneficiarios de productos elaborados en material reciclable, se encuentra ejecutada al 100% con el diseño e impresión de los manuales en tamaño media carta (largo 21.5 cm, ancho 14 cm), con portada y contraportada impresas en opalina de 180 grs y seis (06) páginas internas. Para ello, el contratista realizó la entrega de 18 manuales que contienen lo siguiente:

- Ventajas de la transformación del plástico
- Vida útil del producto (Ecoparque, Ecobancas)
- El material en que fue trabajado (Ecoparque, Ecobancas).
- Mantenimiento preventivo de madera plástica.
- Beneficios de la transformación y reutilización del plástico.

Imagen No. 5: manuales de uso.



Dichos manuales fueron entregados a los beneficiarios de la campaña desplastificate, de conformidad a lo establecido en el contrato GN2683-2022.

- Para la actividad relacionada con la instalación de ecoparques de acuerdo a las especificaciones técnicas se cumplió de manera parcial con esta obligación, pues, únicamente fueron instalados los ecoparques en los municipios que se mencionan a continuación:

Tabla No. 3: ecoparques instalados.

MUNCIPIO	CANTIDAD
Ancuya (vereda Macas Cruz)	1
Pasto	2
Taminango (Remolino)	1
Guachucal	1
Mallama	1

Imagen No. 6: Instalación de ecoparques.



Para comprobar el cumplimiento de esta actividad, la supervisión realizó visitas a los municipios a los cuales se les realizó la entrega de los ecoparques (participantes de la campaña desplastificate), con la finalidad de verificar la instalación de los mismos. Respecto a ello, fue posible evidenciar que el contratista realizó una adecuada instalación de estos productos en los lugares que se mencionan en la tabla 3, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Imagen No. 7: Verificación de la instalación de ecoparques.







Cabe señalar que, el contrato contemplaba la instalación de cuatro (04) ecoparques en la subregión de Sanquianga, sin embargo, por parte del contratista no fue posible realizar la instalación en los Municipios que abarca la subregión antes descrita, dado que, se presentaron diferentes situaciones como el difícil acceso a esta zona, temas logísticos, además, por inconvenientes de orden público permitieron que no se cumpla a cabalidad con la instalación de los mismos en los municipios que se mencionan a continuación:

Tabla No. 4: ecoparques no instalados, subregión Sanquianga.

MUNCIPIO	CANTIDAD
Santa Barbara	1
La Tola	1
Mosquera	1
El Charco	1

Por lo anterior, se da a conocer que el valor no ejecutado por concepto de instalación de estos ecoparques corresponde a $5.379.333,00, el cual se considera un saldo a favor del departamento de Nariño.

Cabe resaltar que, dichos ecoparques fueron entregados a los municipios de Santa Barbara, La Tola y Mosquera. Sin embargo, al municipio del Charco no fue posible realizar la entrega, dado que, no cumplió con la meta de recolección del material plástico, la cual corresponde a 4 toneladas, pues este es un requisito para adquirir un ecoparque, en el marco de la campaña desplastificate. Por lo anterior, dicho ecoparque fue entregado en el municipio de Pasto.

Adicionalmente, por parte de la Secretaria de Ambiente se brindará las directrices o instrucciones necesarias para la instalación de los ecoparques a los municipios anteriormente mencionados, con la finalidad de que realicen esta actividad en el menor tiempo posible.

- Respecto a la obligación de realizar la entrega de las ecobancas a los municipios beneficiarios de Pasto, Ricaurte y Guaitarilla en la bodega ubicada en la ciudad de Pasto, donde cada beneficiario deberá recogerlas; el contratista realizó la entrega correspondiente al Departamento de Nariño, y de esta manera, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible efectuó la entrega a los beneficiarios de dichos municipios.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Se encuentra legalizado el modificatorio No. 2 de adición en tiempo hasta el 30 de junio de 2023 al presente contrato de mínima cuantía.

Mediante correo electrónico el contratista radicó el informe final de actividades de ejecución del contrato 2683-2022, para el desembolso final. Se cuenta con actas de entrega de los productos (10 ecoparques, 8 ecobancas y 18 manuales) y con las actas de instalación (6 ecoparques) remitidas por parte del contratista a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así mismo, se cuenta con las actas de entrega y recibo a satisfacción por cada producto entregado a los beneficiarios de la campaña desplastificate que hacen parte de los municipios establecidos en el contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El Departamento ha realizado al contratista los pagos que se describen a continuación:

Orden de Pago Fiduciaria y/o Comprobantes de Egreso			
Fecha	**Nro. De orden de pago**	**Valor**	**Detalle**
17/04/2023	2023002450	25,496,499.90	ANTICIPO DEL 30% CONTRATO GN2683-2022
13/10/2023	2023011421	35,695,099.86	PAGO PARCIAL DE 72% CONTRATO GN2683-2022

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizó el desembolso del anticipo, correspondiente al 30% del valor total del contrato, es decir, VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($25.496.499,90), con orden de egreso No 2023002450.

Con el cumplimiento de las actividades, la supervisión del contrato de mínima cuantía realizó el primer desembolso parcial del 72%, por un valor de $ 61.191.599,76, con una

amortización del 100% con un valor de $ 25,496,499.90 y valor neto de $ 35,695,099.86, orden de egreso No 2023011421.

En la ejecución del contrato, por la no instalación de cuatro (04) ecoparques en los municipios de Santa Barbara, La Tola, Mosquera y El Charco (subregión Sanquianga), queda un saldo a favor del Departamento de Nariño por un valor de $ 5.379.333,00, correspondiente al 6.33%.

Se encuentra pendiente realizar un desembolso final del 21.67% de ejecución por un valor de $ 18.417.400,24.

RECOMENDACIONES

Mediante correo electrónico el contratista SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, entregó los soportes e informes bimensuales y final los cuales contemplan la parte técnica y financiera de la ejecución del contrato de mínima cuantía GN 2683-2023.

Por lo anterior, una vez revisada la información por parte de la supervisión se establece que el contratista a la fecha del presente informe realizó 30 recorridos en la ciudad de Pasto, para recoger los residuos plásticos que recolectan las personas articuladas a la campaña Desplastificate y logró recepcionar en bodega 44 toneladas de plástico reciclado entregado por los participantes de dicha campaña, de las cuales se han transformado 44 toneladas de la siguiente forma:

- Se han transformado 40 toneladas de plástico recepcionado en 10 ecoparques, pre ensamblados, de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas.
- Se han transformado 4 toneladas de plástico recepcionado en 8 ecobancas, de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas.

Por lo tanto, el contratista ha cumplido con un avance en la ejecución del 93.67%. Así las cosas, la supervisión ve procedente adelantar el trámite del pago final de los recursos aportados por el Departamento por un valor de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 18.417.400,24), lo anterior, de conformidad a lo establecido en la cláusula - FORMA DE PAGO del anexo contractual del contrato de mínima cuantía GN2683-2022

NOTA: El informe de ejecución de actividades del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en el expediente contractual correspondiente.

2.2. GARANTÍAS

SE EXIGEN GARANTÍAS **SI (__X__)** **NO (____)**

EMISIÓN ORIGINAL – ANEXO 0

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
N. DE PÓLIZA	41-44-101262475		
AMPAROS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$16.658.000,00	17/11/2022	30/06/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$24.987.000,00	17/11/2022	30/06/2023

Calidad del servicio	$16.658.000,00	17/11/2022	30/06/2023

ACTA DE INICIO – ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
N. DE PÓLIZA	41-44-101262475		
AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$16.658.000,00	02/12/2022	15/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$24.987.000,00	02/12/2022	15/07/2023
Calidad del servicio	$16.658.000,00	02/12/2022	15/07/2023

MODIFICATORIO 1 – ANEXO 3

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
N. DE PÓLIZA	41-44-101262475		
AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$16.997.666,60	02/12/2022	30/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$25.496.499,90	02/12/2022	30/11/2023
Calidad del servicio	$16.997.666,60	02/12/2022	30/11/2023

MODIFICATORIO 2 – ANEXO 4

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
N. DE PÓLIZA	41-44-101262475		
AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$16.997.666,60	02/12/2022	30/12/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$25.496.499,90	02/12/2022	30/12/2023
Calidad del servicio	$16.997.666,60	02/12/2022	30/12/2023

2.3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El contrato actualmente se encuentra EN EJECUCIÓN con un porcentaje de AVANCE del 93.67%.

2.4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.5. SANCIONES: NINGUNA

2.6. ANEXOS

Para efectos de demostrar una adecuada ejecución de los recursos públicos comprometidos en cada contrato y convenio, y teniendo en cuenta que la contratación adelantada por la Gobernación de Nariño, es objeto de auditoría fiscal por parte de la Contraloría Departamental de Nariño; es indispensable que en cada informe parcial de supervisión se relacione e incluya los anexos, soportes o material probatorio que den cuenta de la ejecución del objeto contractual, tales como:

- ✓ Informe de actividades del contratista.
- ✓ Actas de entrega de los productos (10 ecoparques, 8 ecobancas y 18 manuales) remitidas por parte del contratista a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- ✓ Actas de instalación de los productos (6 ecoparques)
- ✓ Actas de entrega y recibo a satisfacción por cada producto entregado a los beneficiarios de la campaña desplastificate que hacen parte de los municipios establecidos en el contrato.

2.7. CONSTANCIAS

Como supervisor de este contrato certifico que:

a) He cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.
b) Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, información que se puede constatar en la planilla.
c) Los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista ya se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.
d) Los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital, los cuales ya fueron remitidos al expediente contractual.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 17 días del mes de noviembre de 2023**.**

Firma del Supervisora
JOHANNA LAGOS RIASCOS
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde

Proyectó: **Rosa Cañal**
Profesional Universitario SADS

Hoover Moncayo
Contratista SADS

Revisó: **Manuela Burbano**
Abogada SADS

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 1

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	05 de junio de 2023	**HORA DE ENTREGA**	4:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Para constancia se firma en Pasto a los 05 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 2

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	05 de junio de 2023	HORA DE ENTREGA	4:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Pasto a los 05 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Toyar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 3

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	05 de junio de 2023	**HORA DE ENTREGA**	4:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Para constancia se firma en Pasto a los 05 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 4

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	05 de junio de 2023	**HORA DE ENTREGA**	4:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Para constancia se firma en Pasto a los 05 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 5

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	05 de junio de 2023	**HORA DE ENTREGA**	4:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Pasto a los 05 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 6

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	05 de junio de 2023	**HORA DE ENTREGA**	4:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Pasto a los 05 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 7

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	05 de junio de 2023	**HORA DE ENTREGA**	4:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Para constancia se firma en Pasto a los 05 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 8

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	05 de junio de 2023	**HORA DE ENTREGA**	4:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Pasto a los 05 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 9

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 5 Eco bancas de 120 cm de largo x 40 cm de ancho y 47 cm de alto.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	05 de junio de 2023	HORA DE ENTREGA	4:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Pasto a los 05 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 10

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	• 20 de junio 2023	HORA DE ENTREGA	3:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Pasto, a los 20 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Johanna Sthefanny Lagos Riascos
subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 11

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	• 20 de junio 2023	**HORA DE ENTREGA**	3:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Para constancia se firma en Pasto, a los 20 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Johanna Sthefanny Lagos Riascos
subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE ENTREGA No. 12

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A ENTREGAR	• 3 Eco bancas de 120 cm de largo x 40 cm de ancho y 47 cm de alto. • 18 manuales de sensibilización y uso adecuado del producto.		
LUGAR DE ENTREGA	• Soluciones Ambientales de Nariño SAS BIC		
FECHA DE ENTREGA	20 de junio de 2023	**HORA DE ENTREGA**	3:00 pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la entrega a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Pasto, a los 20 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Johanna Sthefanny Lagos Riascos
subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE INSTALACIÓN No. 1

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A INSTALAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE INSTALACIÓN	• En consideración a que el transporte del eco parque infantil en madera plástica, fue realizado por el contratante, el ecoparque fue instalado en el lugar dispuesto por el contratante.		
FECHA DE INSTALACIÓN	9 Junio 2023	HORA DE INSTALACIÓN	8 AM.

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la instalación a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Para constancia se firma en Pasto, a los 9 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Perez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE INSTALACIÓN No. 2

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A INSTALAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE INSTALACIÓN	• En consideración a que el transporte del eco parque infantil en madera plástica, fue realizado por el contratante, el ecoparque fue instalado en el lugar dispuesto por el contratante.		
FECHA DE INSTALACIÓN	10 Junio 2023	**HORA DE INSTALACIÓN**	8 A.M.

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la instalación a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Pasto, a los 10 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE INSTALACIÓN No. 3

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A INSTALAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE INSTALACIÓN	• En consideración a que el transporte del eco parque infantil en madera plástica, fue realizado por el contratante, el ecoparque fue instalado en el lugar dispuesto por el contratante.		
FECHA DE INSTALACIÓN	13 Junio 2023	**HORA DE INSTALACIÓN**	8 Am.

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la instalación a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Pasto, a los 13 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Perez Hurtado
Subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE INSTALACIÓN No. 4

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A INSTALAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE INSTALACIÓN	• En consideración a que el transporte del eco parque infantil en madera plástica, fue realizado por el contratante, el ecoparque fue instalado en el lugar dispuesto por el contratante.		
FECHA DE INSTALACIÓN	• 14 de junio 2023	**HORA DE INSTALACIÓN**	8am

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la instalación a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Para constancia se firma en Pasto, a los 14 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE INSTALACIÓN No. 5

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A INSTALAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE INSTALACIÓN	• En consideración a que el transporte del eco parque infantil en madera plástica, fue realizado por el contratante, el ecoparque fue instalado en el lugar dispuesto por el contratante.		
FECHA DE INSTALACIÓN	• 15 de junio 2023	HORA DE INSTALACIÓN	8am

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la instalación a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Para constancia se firma en Pasto, a los 15 días del mes de junio del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC
NIT. 900400097-5

ACTA DE INSTALACIÓN No. 6

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		
CONTRATISTA	SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC		
NIT	900400097-5		
CONTRATO	GN2683-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	Recepcionar y transformar 44 toneladas de plástico, recolectadas en la campaña desplastificate, e instalar los ecoparques y entrega de ecobancas elaborados en material reciclable para ser entregados a instituciones, organizaciones, municipios y/o personas que cumplan con las cantidades acordadas.		
PRODUCTOS EN MADERA PLÁSTICA A INSTALAR	• 1 Eco parque infantil en madera plástica que cuente con los siguientes elementos: 2 torres con techo, 1 deslizadero, 1 juego de columpios, 1 mataculin, 1 pasamanos, 1 puente colgante, 1 red araña, 1 estructura con argollas y trapecio.		
LUGAR DE INSTALACIÓN	• En consideración a que el transporte del eco parque infantil en madera plástica, fue realizado por el contratante, el ecoparque fue instalado en el lugar dispuesto por el contratante.		
FECHA DE INSTALACIÓN	• 15 de junio 2023	HORA DE INSTALACIÓN	2 Pm

SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, actuando por medio de su representante legal, por medio del presente documento, deja constancia de la instalación a satisfacción de los productos mencionados anteriormente conforme a las especificaciones relacionadas en el contrato GN2683-2022.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Para constancia se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del año 2023.

Quien entrega

Johnny Tovar Trujillo
C.C. No. 1.085.244.016
Representante Legal
Soluciones Ambientales de Nariño SAS

Quien Recibe

Leidi Johana Pérez Hurtado
subsecretaria de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde
Supervisora del contrato
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner
