En consecuencia, es preciso indicar que la firma BERMORI GRANADA VALENCIA presentó los siguientes materiales pétreos, no pétreos y metálicos que han ingresado al proyecto:

- Aditivo liquido impermeabilizante
- Paredes Corona – Jaya Blanco
- Porcelanato
- Soldadura Hot Pro
- Cemento hidráulico
- Teja termo acústica
- Gasolina
- Superboard
- Pegantes Ecopega

Aunado a lo precitado, es importante indicar que, a la fecha de emisión del presente informe, el contratista no ha presentado la cuantificación y volúmenes de los materiales de obra ingresados al proyecto durante el mes de abril de 2023.

Cabe mencionar que las fichas técnicas de los materiales de obra mencionados anteriormente se encuentran adjuntos en el Informe Mensual Ambiental de la firma contratista.

13. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES

Para el manejo de los residuos sólidos convencionales, el contratista cuenta con puntos ecológicos los cuales pueden ser usados por los trabajadores siempre y cuando se haga la gestión de disposición final por parte de la organización. El operador encargado de la recolección de residuos en la zona es Promoambiental Distrito S.A.S. ESP.

Adicionalmente, se destinaron áreas específicas dentro de la obra en donde se adecuan los residuos de demolición y construcción generados a lo largo de la ejecución de las actividades. Este acopio es de carácter temporal, durará el tiempo en que por parte de la gestión administrativa se contacte con los gestores adecuados para su disposición.

14. MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES

Por otro lado, durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023 la firma BERMORI GRANADA VALENCIA dentro de sus actividades constructivas no genero residuos reciclables.

15. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

La firma BERMORI GRANADA VALENCIA tiene como responsabilidad realizar el reporte de los RCD's generados dentro del proyecto "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ SGC (Grupo o lote No. 1 Estación B-02 Central)", así mismo deberá presentar los vales de las cantidades de viajes de escombros que se realizaran durante el periodo de ejecución del presente contrato, los certificados de disposición final de los residuos y las licencias ambientales de los sitios de disposición final autorizados.

Por ende, en cumplimiento con la Resolución 01115 de 2012, la Resolución 0932 de 2015 y sus normas complementarias; el contratista deberá definir a esta interventoría el sitio de disposición final que tendrán los RCD generados en obra, la cual emitirá las certificaciones bajo el número de PIN Ambiental 21918 aprobado por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Cabe mencionar que debido a que ya se cuenta con la asignación del PIN Ambiental de obra, se realizara el seguimiento mes a mes por parte de la firma Gordillo y Asociados SAS, donde el contratista debe presentar la siguiente documentación;


- Seguimiento al Anexo técnico No. 2 Guía de RCD – SDA
- Informe IN SITU – Anexo técnico No. 3.
- Anexo técnico No. 4 Estimación de costos del Plan de Gestión de RCD
- Indicadores
- Seguimiento Vehicular
- Seguimiento a Gestores RCD

Por consiguiente, el pasado 13 de abril del año en curso, se realizó el cargue al aplicativo web del PIN Ambiental los reportes de los periodos correspondientes a enero y febrero de 2023, donde el aplicativo arrojo el Radicado No. 2023ER76531 como se puede evidenciar en la siguiente imagen:

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA



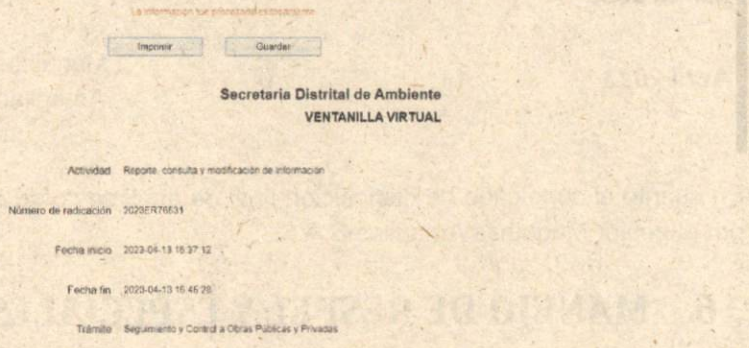

En consecuencia, es preciso indicar que durante el transcurso del mes de mayo de 2023 se realizarán las actualizaciones en el aplicativo web PIN Ambiental de los reportes de Residuos de Construcción y Demolición – RCD para los meses de marzo y abril del año en curso.

Finalmente, teniendo en cuenta los reportes mensuales en cuestión de disposición de residuos de construcción y demolición reportados por el contratista, se cuenta con los siguientes acumulados:

Mes Evaluado	Volumen de RCD (m3)	Volumen Total Exc. (m3)	Lugar de disposición final de Excavación y Demolición	Volumen Material Aprovechado (m3)	Lugar de disposición final del Aprovechamiento
Noviembre 2022	0	0	-	0	-
Diciembre 2022	0	0	-	0	-
Enero 2023	14	0	Cemex Colombia	0	-
Febrero 2023	7	0	Cemex Colombia	0	-

Marzo 2023	0	0	-	0	-
Abril 2023	14	0	Maquinas Amarillas	0	-

En cuanto al certificado de disposición final de abril, se contó con el Radicado CERT-756-2023 emitido por el gestor Maquinas Amarillas S.A.S.

16. MANEJO DE RESPEL Y ESPECIALES

En aras de velar por la integridad física y armonía del medio ambiente el contratista debe garantizar que los residuos peligrosos - RESPEL y Especiales generados por las actividades realizadas en el proyecto, tengan un manejo integral desde su generación hasta el final de su vida útil, con el fin de que este tipo de residuos sean almacenados, transportados y dispuestos tal y como lo estipula la normatividad legal vigente, conllevando así la correcta entrega a sitio de disposición autorizado por la entidad competente de la región para su respectivo tratamiento final.

Por consiguiente, en sitio se cuenta con acopios de disposición provisional tanto de residuos peligrosos como de residuos especiales, los cuales a la fecha se han generado tejas de asbesto cemento, donde se encuentran debidamente delimitadas y señalizadas.

Es preciso indicar que, como gestión de la firma contratista se contó con los servicios del gestor Distribuidores Ambientales D3A quienes se encuentran inscritos en la Secretaría Distrital de Ambiente y autorizados mediante Licencia Ambiental N° 20217000362.

Teniendo en cuenta lo manifestado, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023, la firma BERMORI GRANADA VALENCIA realizó el retiro y disposición final de residuos peligrosos y/o especiales, como se relacionan a continuación:

Fecha	Tipo de residuo recolectado	Cantidad Kg	Destino	Manifiesto de Carga
05/04/2023	Residuos contaminados con cemento	71,40	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	D3A8719

	Manto asfaltico	865,40	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	D3A8719
	Panel yeso	98	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	D3A8719
22/04/2023	Retal de teja de asbesto cemento	883	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	D3A8784
	Residuos contaminados con cemento	252		D3A8784
25/04/2023	Retal de teja de asbesto cemento	2018	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	D3A8797
	Retal drywall	10		D3A8797
	Residuos contaminados con cemento	38		D3A8797

Cabe mencionar que, a la fecha de emisión del presente informe, aún se está a la espera de la presentación de los certificados de disposición final radicado por parte del gestor.

17. MANEJO EFICIENTE DE AGUA

Dentro de las actividades constructivas del Proyecto "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ SGC (Grupo o lote No. 1 Estación B-02 Central)", se realizó la verificación y

seguimiento por parte de interventoría a la protección de sumideros y cárcamos aledaños a las actividades constructivas, donde por medio de malla azul se debe efectuar el mantenimiento de los mismos, con el fin de evitar la colmatación y posible contaminación de las redes de alcantarillado.

Adicionalmente, en cuanto al mantenimiento de unidades sanitarias, las mismas se encuentran conectadas a las redes de alcantarillado de la Central de Bomberos, por ende, se realizan jornadas de aseo y mantenimiento dos (02) veces por semana durante el transcurso del mes.

18. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Para el manejo adecuado y seguro de sustancias químicas se debe tener conocimiento previo de la naturaleza del producto a utilizar, ya que una vez definidas las medidas de protección que utilizará el operario para su correcta manipulación, se enfatizará en las recomendaciones y normas que se promueven durante el proyecto.

Como responsabilidad de la firma BERMORI GRANADA VALENCIA se debe establecer durante la ejecución del contrato actividades básicas para garantizar el cumplimiento en lo que se refiere al manejo seguro de sustancias químicas y sustancias peligrosas, las cuales entre ellas se contemplaran capacitaciones al personal, el uso de las hojas de seguridad de las sustancias químicas, el etiquetado de sustancias y preparados peligroso, donde cada envase deberá contar con este, indicando la denominación química, el símbolo e indicaciones de peligrosidad.

Por lo anterior, es preciso manifestar que, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023 el contratista informó que realizó el rotulado de sustancias químicas y su acopio de los siguientes elementos:

- Aditivo liquido impermeabilizante
- Paredes Corona – Jaya Blanco
- Porcelanato
- Soldadura Hot Pro
- Cemento hidráulico
- Teja termo acústica
- Gasolina
- Superboard
- Pegantes Ecopega

Adicionalmente, es importante indicar que las fichas técnicas de las sustancias relacionadas se pueden evidenciar en los anexos del Informe Mensual Ambiental No. 005 del Contratista, los cuales fueron revisadas y avaladas previamente por esta interventoría.

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

19. MANEJO DE ACOPIOS

Es preciso manifestar que para la ejecución de las actividades del Contrato de Obra No. AECOB-CONTRATO-568-2022 la firma BERMORI GRANADA VALENCIA, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado, debe implementar medidas que garanticen la no generación de material particulado producto del acopio de los materiales pétreos. Asimismo, instalar la señalización y demarcación pertinente.

Por lo anterior, se informa que para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023 se contaron con los siguientes acopios:

- Acopio de residuos de construcción y demolición
- Acopio de materiales pétreos
- Acopio de residuos especiales
- Acopio de materiales tipo acero

Finalmente, a pesar de contar con los espacios para la adecuación de los acopios de RCD, se recomendó al contratista mejorar la recolección, identificación y señalización de los residuos generados producto de las demoliciones.

20. MANEJO DE CAMPAMENTOS DE OBRA

Es preciso manifestar que para la ejecución de las actividades del Contrato de Obra No. AECOB-CONTRATO-568-2022 la firma BERMORI GRANADA VALENCIA, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado, implemento las siguientes medidas para el uso de este espacio:

- Señalización y demarcación de extintores.
- Rutas de evacuación, Salidas de Emergencia y puntos de Encuentro.
- Señalización de almacenamiento de sustancias peligrosas y combustibles.
- Señalización de Botiquín y áreas de primeros auxilios.
- Acceso a lugares restringidos.

21. MANEJO DE ORDEN Y ASEO EN OBRA

Con el fin de establecer las pautas para mantener los espacios intervenidos en condiciones óptimas, los responsables profesionales de obra deben asignar una cuadrilla de aseo (recoger herramientas, residuos sólidos, elementos de construcción y entre otros) e implementar sus funciones al finalizar cada jornada.

En consecuencia, para el mes de abril de 2023 se generó desde interventoría el comunicado INTER-BMBCEN-AMB-013, el cual hizo relación a las condiciones de orden y aseo que se evidenciaron en sitio, donde se debía subsanar los siguientes hallazgos:

- A pesar de que la señalización indica que el espacio está asignado para el acopio de escombro y RESPEL, se pudo evidenciar que en sitio los elementos se encuentran mezclados, los cuales no es claro si pertenecen a materiales de obra o residuos no pétreos y metálicos.

- Es perentorio que se realicen jornadas de orden y aseo, puesto que los espacios se evidencian con materiales de obra y residuos mezclados, asimismo no se exterioriza ninguna señalización ni delimitación de las áreas.

- Se debe realizar el mantenimiento de los cárcamos y sumideros del proyecto.

- Se debe realizar la adecuación, acopio, protección y señalización del material metálico en obra.

22. CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

A lo largo del desarrollo de las actividades, la firma BERMORI GRANADA VALENCIA debe realizar capacitaciones y/o charlas de seguridad, las cuales se enfocarán en la información básica de la clasificación de residuos y la necesidad del acopio de estos mientras se realiza la gestión con los gestores autorizados, así como el orden y aseo en obra que es clave para la debida ejecución de las obras y finalmente, la identificación de los riesgos ambientales que se puedan materializar en el proyecto.

En consecuencia, a la fecha de emisión del presente informe el contratista de obra no ha presentado los registros de las capacitaciones bridadas durante el mes de abril de 2023.

23. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y UAE

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023 no se recibieron visitas por parte de los delegados de la Secretaría Distrital de Ambiente ni de los profesionales ambientales de las diferentes entidades ambientales competentes.

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

- Durante el periodo evaluado, no se realizó aprovechamiento *in situ* por parte de la firma BERMORI GRANADA VALENCIA.

- Durante el mes de abril de 2023, se realizó por parte del contratista disposiciones finales de residuos de especiales y peligrosos mediante el gestor Distribuidores Ambientales D3A quienes se encuentran inscritos en la Secretaría Distrital de Ambiente y autorizados mediante Licencia Ambiental N° 20217000362.

- Es preciso indicar que, a pesar de que a la fecha se cuenta con los manifiestos de carga de los residuos peligrosos y especiales retirados durante el mes de abril de 2023, aún se está a la espera de la emisión de los certificados de disposición final presentados por el gestor D3 Ambiental.

- Durante el periodo evaluado se realizó la disposición final de los residuos de demolición y/o construcción por medio del gestor Maquinas Amarillas S.A.S., quienes retiraron una cantidad de 14 m^3.

- A la fecha de emisión del presente documento, se está a la espera de los reportes de disposición de residuos para los meses correspondientes a marzo y abril de 2023, donde una vez se realice la revisión y aprobación de dicha documentación por parte de interventoría, posteriormente se remitirá hacía la Entidad Contratante y para efectuar la actualización ante el aplicativo web PIN Ambiental de la SDA.

25. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO – GESTIÓN AMBIENTAL	
	
Nota: Cerramiento y protección de plantaciones (materas)	**Nota:** Jornada de separación y clasificación de residuos
	
Nota: Retiro de residuos peligrosos – Teja asbesto cemento	**Nota:** Retiro de residuos de peligrosos – Teja asbesto cemento

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA



Nota: Acopio y protección de materiales de obra



Nota: Acopio y protección de materiales de obra



Nota: Cuarto de manipulación de residuos peligrosos



Nota: Cuarto de manipulación de residuos peligrosos

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA



Nota: Ingreso de kit anti derrames



Nota: Socialización y manejo de sustancias químicas



Nota: Acopio de residuos no pétreos



Nota: Acopio y protección de materiales de obra

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Item	***Descripción***	***Observación***
9.1	*Administrativa*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.2	*Técnica*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.3	*Financiera*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.4	*Legal*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.5	*Ambiental*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.6	*Seguridad Y Salud*	*Cumpliendo A Cabalidad*

5. ENTREGA DE ANEXOS	
Item	***Descripción***
10.1	*Registro fotográfico antes y después de las intervenciones.*
10.2	*Bitácoras sedes en ejecución .*
10.3	*Informes Semanales*
10.4	*Actas Comité.*
10.5	*Correspondencia Enviada*
10.6	*Anexos Capacitaciones*
10.7	*Certificaciones*
10.8	*Anexos Varios*

FIRMAS	
Firma	
Nombre	*ING. OSCAR G. GORDILLO GUERRERO*
Cargo	*REPRESENTANTE LEGAL GORDILLO & ASOCIADOS SAS*
Dependencia	*INTERVENTORIA*

INFORMES SEMANALES

Dirección: Cra. 11 No .147-76 Oficina. 301 telefax 1-8034165 gordillogog@hotmail.com Bogotá D.C

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

INFORME SEMANAL #20

Semana Número: 20 Del: 3 de abril de 2023 Al: 9 de abril de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 140

ENTIDAD CONTRATANTE: CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA SEDE: ESTACION CENTRAL B-2 SUPERVISOR: DRA AMALIN ARIZA MAHUAD

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C - SGC" (GRUPO O LOTE NO.01 ESTACION B-2 CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8,50%	54,80%
Valor básico de la Obra	$ 68.000.000,00	$ 438.400.000,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	16,60%	50,72%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	132.800.000,00	405.760.000,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BERMORI GRANADA VALENCIA
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-568-2021
Valor Inicial:	$800.000.000,00
Valor Actualizado:	$800.000.000,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-586-2021
Valor Inicial:	$105.499.683,00
Valor Actualizado:	$126.599.619,60
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



AVANCE


*LUNES 3, SE REALIZA REUNION CON LA SUPERVISION, EL COMANDANTE DE ESTACION, INTERVENTORIA CONTRATISTA Y BOMBEROS PARA REVISAR LA DISPOSICION Y ESPACIOS DE LAS COMODAS DE ALOJAMIENTO 1, COMO RESULTADO SE DEFINEN 9 ESPACIOS DE DIFERENTES DIMENSIONES EN ALOJAMIENTO DE BOMBEROS Y 7 EN ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS.

*MARTES 4, SE DEFINE UBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS(TOMAS E INTERRUPTORES) EN CONJUNTO CON SARGENTO JEFE DE TURNO, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, INICIA INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA POR CIELORASO Y MUROS DIVISORIOS. AVANZAN ACTIVIDADES DE ESTUCO EN MUROS EN EL BAÑO DE ALOJAMIENTO 2. INICIA MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA MURO DE LINDERO.

*MIERCOLES 5, CONTINUA INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, INICIA TENDIDO DE CABLEADO EN ALOJAMIENTO 1, CONTINUA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL MURO DE LINDERO, SIGUE ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN ALOJAMIENTO 2. SE REALIZA COMITE CON LA INTERVENTORIA, SUPERVISION Y CONTRATISTA. SE REALIZA ASEO Y LIMPIEZA DEL ENCHAPE DEL PISO DE LA ZONA DE COMEDOR.

*JUEVES 6, CONTINUA INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS EN ALOJAMIENTO 1, SIGUE ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. SABADO 8, CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS DE SUPERBOARD EN ALOJAMIENTO 1, CONTINUA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA.

IMAGENES AVANCE

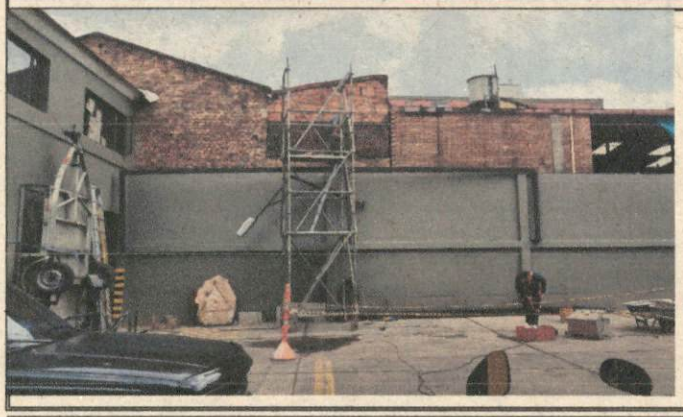



MONTAJE ESTRUCTURA DE MURO DE LINDERO

OBSERVACIONES

Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

IMAGENES AVANCE





*ENCHAPE DE PISO DE COMEDOR





*MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN ALOJAMIENTO 2





*MONTAJE DE MUROS DIVISORIOS EN SUPERBOARD ALOJAMIENTO 1

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

030

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

INFORME SEMANAL #21

Semana Número:	21	Del:	10 de abril de 2023	Al:	16 de abril de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	147		
ENTIDAD CONTRATANTE	CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA	SEDE: ESTACION CENTRAL B-2		SUPERVISOR	DRA AMALIN ARIZA MAHUAD

OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C - SGC" (GRUPO O LOTE NO.01 ESTACION B-2 CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	16,50%	70,80%
Valor básico de la Obra	$ 132.000.000,00	$ 566.400.000,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	13,20%	63,92%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	105.600.000,00	511.360.000,00


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BERMORI GRANADA VALENCIA
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-568-2021
Valor Inicial:	$800.000.000,00
Valor Actualizado:	$800.000.000,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-586-2021
Valor Inicial:	$105.499.683,00
Valor Actualizado:	$126.599.619,60
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

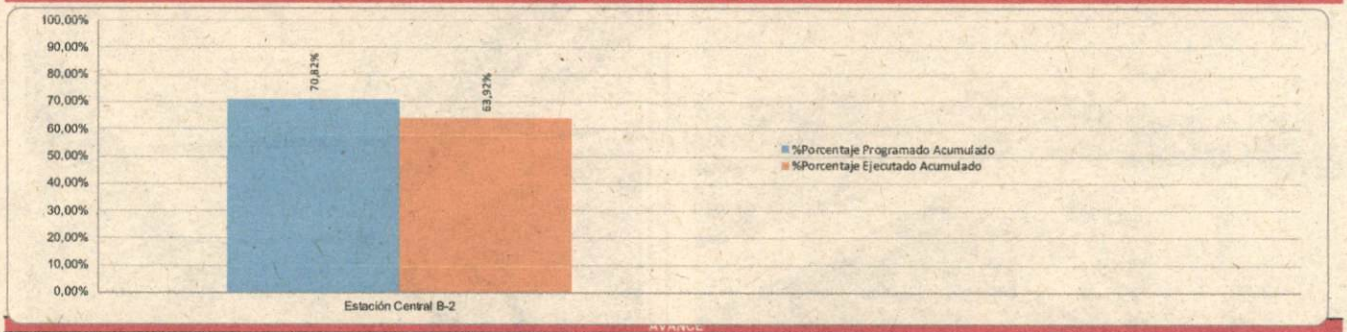

AVANCE

*LUNES 10, SIGUE EL MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA EN LA ZONA DE ESCALERAS Y TANQUE ELEVADO, CONTINUA ARMADO DE MUROS DIVISORIOS EN ALOJAMIENTO 1. MARTES 11, CONTINUA EL MONTAJE Y SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN ZONA DE ESCALERAS, SIGUE LA INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO, INICIA INSTALACION DE DIVISIONES DE DUCHA EN BAÑO DE ALOJAMIENTO 2.

*MIERCOLES 12, CONTINUA INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MUROS DIVISORIOS DE COMODAS EN ALOJAMIENTO 1, AVANZA ACTIVDAD DE MONTAJE Y SOLDADURA DE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA SOBRE EL AREA DE ESCALERAS, SIGUE INSTALACION DE DIVISIONES DE DUCHA Y DETALLADO DE MUROS EN BAÑO DE ALOJAMIENTO 2.

*JUEVES 13, SE RETIRA PRIMER TRAMO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO EN BODEGA DE "USAR" , INCIA MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. EL MURO DE CERRAMIENTO DE LA CUBIERTA UBICADO SOBRE LA CARRERA 20 NO PRESENTABA ANCLAJES NI IBUENA PEGA EN LAS ULTIMAS 3 HILADAS POR LO QUE SE PRESENTABA INESTABILIDAD Y RIESGO DE DESPLOME, RAZON POR LA CUAL SE DEMOLIERON.

*VIERNES 14, CONTINUAN TRABAJOS EN BAÑO DE ALOJAMIENTO 2, MONTAJE DE MUROS DIVISORIOS EN ALOJAMIENTO 1 E INSTALACION DE TEJA EN ALOJAMIENTO 2. INICA INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MURO DE LINDERO. SIGUE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN CUBIERTA DE "USAR". SABADO 15, CONTINUAN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL DIA ANTERIOR.

IMAGENES AVANCE





MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN ALOJAMIENTOS

OBSERVACIONES


Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

IMAGENES AVANCE

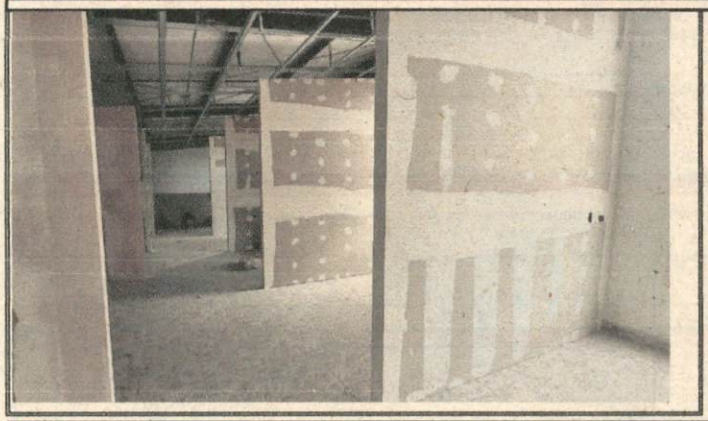




INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO





DESMONTE DE TEJA EN BODEGA "USAR" E INICIO DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA



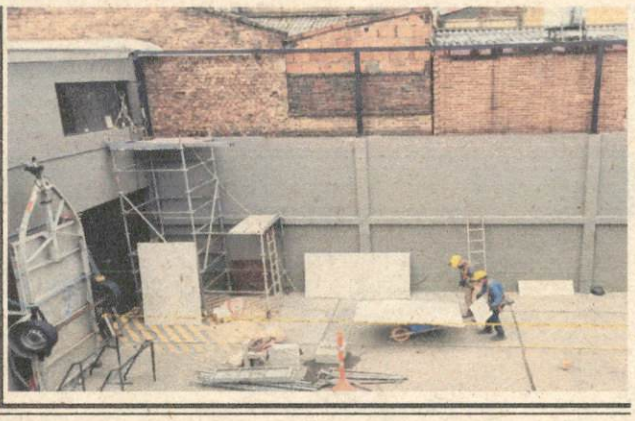

MONTAJE DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MURO DE LINDERO

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

INFORME SEMANAL #22

Semana Número: 22 Del: 17 de abril de 2023 Al: 23 de abril de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 154

ENTIDAD CONTRATANTE CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA SEDE: ESTACION CENTRAL B-2 SUPERVISOR DRA AMALIN ARIZA MAHUAD

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C - SGC" (GRUPO O LOTE NO.01 ESTACION B-2 CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	11,20%	81,50%
Valor básico de la Obra	$ 89.600.000,00	$ 652.000.000,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,60%	69,32%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	44.800.000,00	554.560.000,00


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BERMORI GRANADA VALENCIA
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-568-2021
Valor Inicial:	$800.000.000,00
Valor Actualizado:	$800.000.000,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-586-2021
Valor Inicial:	$105.499.683,00
Valor Actualizado:	$126.599.619,60
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

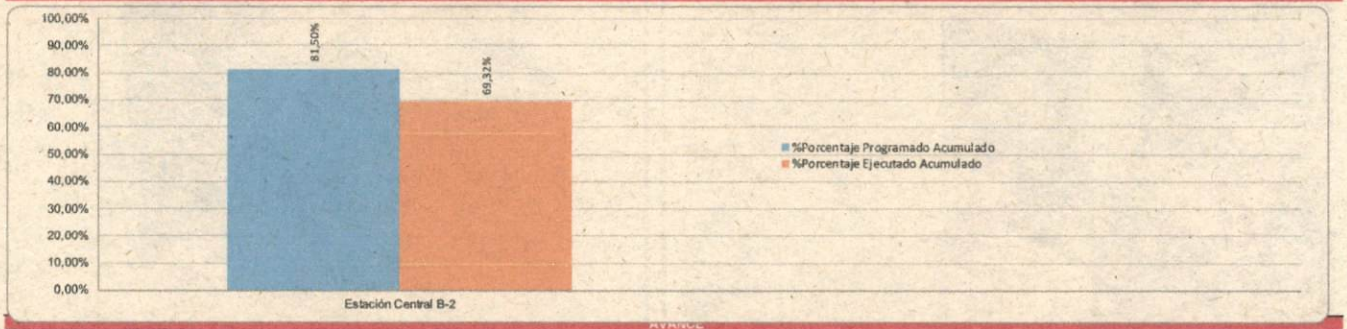

AVANCE

*LUNES 17, AVANZA LA INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MURO DE LINDERO, SIGUE ESTUCADO DE MUROS DIVISORIOS EN ALOJAMIENTO 1, CONTINUA EL MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN "USAR". SE ENTREGA ZONA DE COMEDOR CON EL ECHAPE DE PISO SEGÚN ESPECIFICACIONES, SE LEVANTA ACTA DE ENTREGA.

*MARTES 18, INICIA EL MONTAJE DE CIELORASO EN ALOJAMIENTO 1, CONTINUAN ACTIVIDADES DE ESTUCADO EN MUROS DIVISORIOS E INSTALACION DE LAMINAS EN MURO DE LINDERO.
*MIERCOLES 19, CONTINUA ACTIVIDAD DE MONTAJE DE CIELORASO EN ALOJAMIENTO 1, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y ESTUCADO DE MUROS. FINALIZA INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MURO DE LINDERO.

*JUEVES 20, INICIA ACTIVIDAD DE SELLADO DE JUNTAS DE LAMINAS EN MURO DE LINDERO, INICIA MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA CIELORASO EN ALOJAMIENTO 2, INICIA DEMOLICION DE MURO EN COCINA PARA PUERTA DE NUEVA BODEGA, CONTINUA MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN "USAR".

*VIERNES 21, INICIA MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO 2, SE INSTALA TUBERIA ELECTRICA Y CABLEADO EN ALOJAMIENTO 2, SIGUE DEMOLICION DE MURO DE COCINA SOBRE EL PATIO PARA PUERTA DE LA NUEVA BODEGA, SIMULATANEAMENTE SE LEVANTA MURO DIVISORIO ENTRE COCINA Y NUEVA BODEGA. SABADO 22, CONTINUA MASILLADO Y ESTUCADO DE MURO DE LINDERO, SIGUE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN "USAR".

IMAGENES AVANCE





INSTALACION DE LAMINAS PARA MURO DE LINDERO

OBSERVACIONES


Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

IMAGENES AVANCE

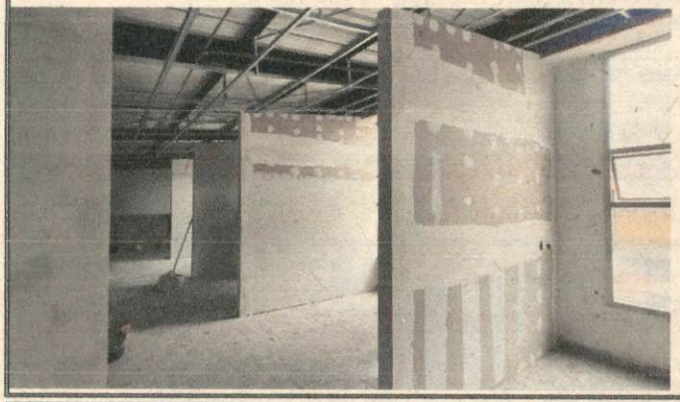



INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO





INTERVENCION EN AREA DE COICNA - DEMOLICION DE MURO PARA PUERTA DE BODEGA





MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN BODEGA DE "USAR"

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

INFORME SEMANAL #23

Semana Número:	23	Del:	24 de abril de 2023	Al:	30 de abril de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		Días	161		
ENTIDAD CONTRATANTE	CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA	SEDE: ESTACION CENTRAL B-2		SUPERVISOR	DRA AMALIN ARIZA MAHUAD

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C - SGC" (GRUPO O LOTE NO.01 ESTACION B-2 CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,80%	89,10%
Valor básico de la Obra	$ 62.400.000,00	$ 712.800.000,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,10%	70,42%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	8.800.000,00	563.360.000,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BERMORI GRANADA VALENCIA
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-568-2021
Valor Inicial:	$800.000.000,00
Valor Actualizado:	$800.000.000,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-586-2021
Valor Inicial:	$105.499.683,00
Valor Actualizado:	$126.599.619,60
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



AVANCE

*LUNES 24, SE DESMONTAN LAS PUERTAS DE MADERA DE LAS OFICINAS Y SE REALIZA PAÑETE DE VANOS, LLEGAN A OBRA LAS PUERTAS METALICAS, AVANZA LA INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS EN ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS. SE INSTALAN 3 PUERTAS METALICAS Y SE DA PRIMERA MANO DE PINTURA.


*MARTES 25, SE RETIRA UN VIAJE DE TEJA DE ASBESTOCEMENTO RETIRADA DE LA BODEGA DE "USAR", AVANZA INSTALACION DE MURO DE LINDERO, SIGUE DEMOLICION DE MURO DE COCINA PARA EL VANO DE PUERTA DE BODEGA Y LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO DE BODEGA CON LA COCINA. SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES DESDE LAS 2:30PM. *MIERCOLES 26, SIGUEN TRABAJOS DE SOLDADURA EN CUBIERTA DE "USAR", SIGUE INSTALACION DE MURO DE LINDERO Y MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO 2.

*JUEVES 27, SE INSTALA LA SEGUNDA PUERTA DE DE LA DIVISION DE VIDRIO EN EL COMEDOR. SIGUEN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MUROS EN ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO DE LINDERO Y PAÑETE EN MUROS DE BODEGA.

*VIERNES 28, CONTINUA MONTAJE DE MALLA DE SEGURIDAD EN CUBIERTA DE BODEGA "USAR", INICIA INSTALACION DE CIELORASO EN PVC EN ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS, SIGUE ESTUCO Y PUINTURA DE MUROS DIVISORIOS EN EL MISMO ALOJAMIENTO. *SABADO 29, SIGUE PINTURA DE MURO DE LINDERO, MONTAJE DE CUBIERTA EN BODEGA "USAR" , APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA EN MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS E INSTALACION DE CIELORASO.

IMAGENES AVANCE



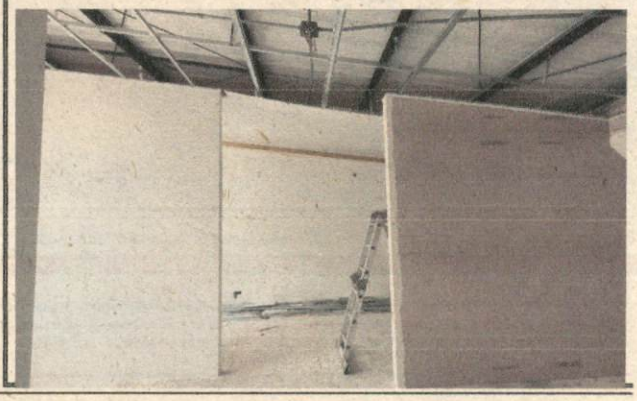

**** INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS Y CIELORASO EN PVC. - APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS***

OBSERVACIONES


Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.


CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

IMAGENES AVANCE

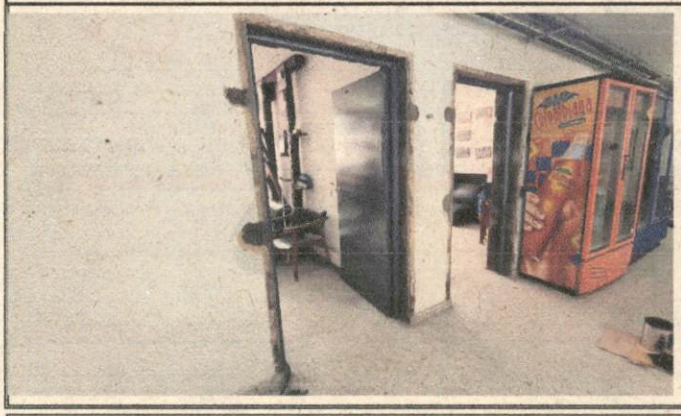

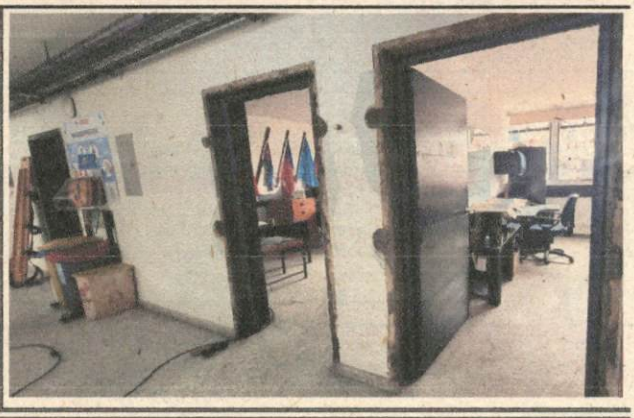

*INSTALACION DE PUERTAS METALICAS EN OFICINAS





*APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA EN MURO DE LINDERO





*INSTALACION DIVISION DE VIDRIO EN COMEDOR - MONTAJE MALLA DE SEGURIDAD EN BODEGA "USAR"

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES

Dirección: Cra. 11 No .147-76 Oficina. 301 telefax 1-8034165 gordillogog@hotmail.com Bogotá D.C

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC


REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES


Informe No.	*5*	*Período al que corresponde*	***Desde***	*01/abril/2022*	***Hasta***	*30/abril/2022*

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- *Demolición y cambio de piso de área de comedor, cambio de división de vidrio.*
- *Instalación de muros divisorios, instalación eléctrica y cielo raso pvc en alojamiento de bomberos.*
- *Cambio de cubierta e instalación de estructura para cielo raso, cielo raso y muros divisorios en alojamiento de maquinistas.*
- *Montaje de muro de lindero en superboard.*
- *Montaje de estructura metálica e instalación de teja en bodega "USAR"*
- *Cambio de enchapes, estucado y pintura en duchas alojamiento de maquinistas.*
- *Demolición muro para puerta en nueva bodega zona de comedor, construcción de muro divisorio entre cocina y nueva bodega.*

AREA DE COMEDOR

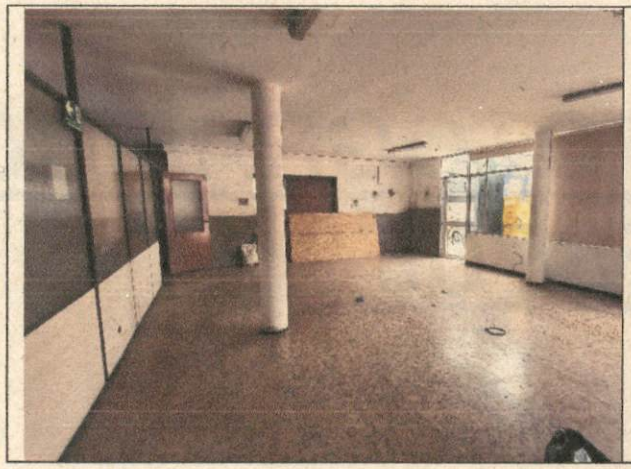

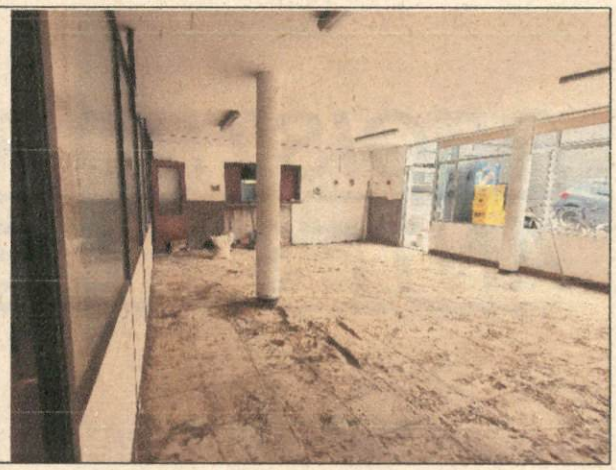





	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES

ALOJAMIENTO DE BOMBEROS *(Instalación de muros divisorios, instalación eléctrica y cielo raso pvc)*



	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES

ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS

(Cambio de cubierta e instalación de estructura para cielo raso, red eléctrica y muros divisorios)









	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES

INSTALACION DE MURO DE LINDERO










PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA


PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES

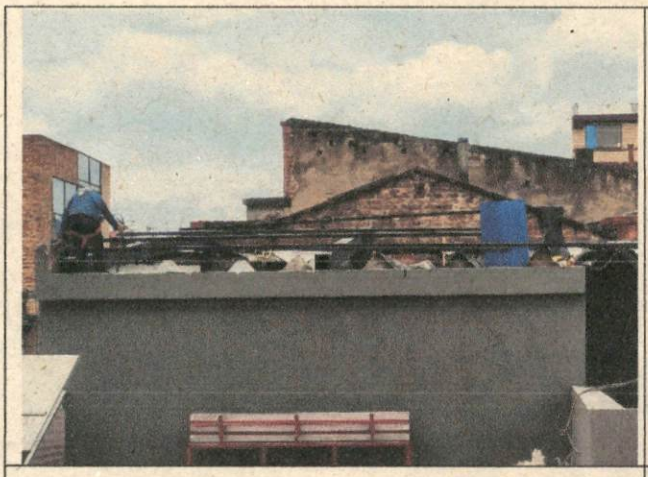






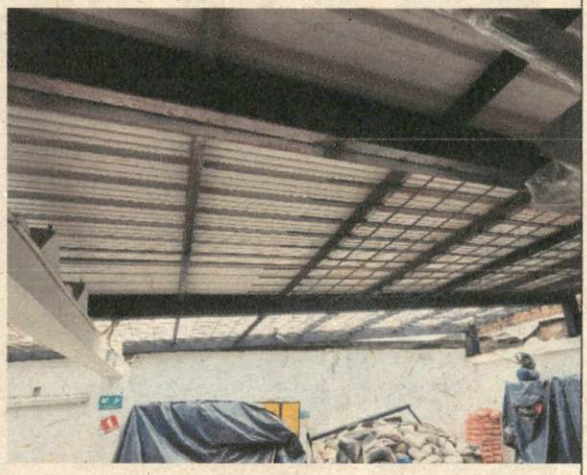

MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE TEJA EN BODEGA "USAR"

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES

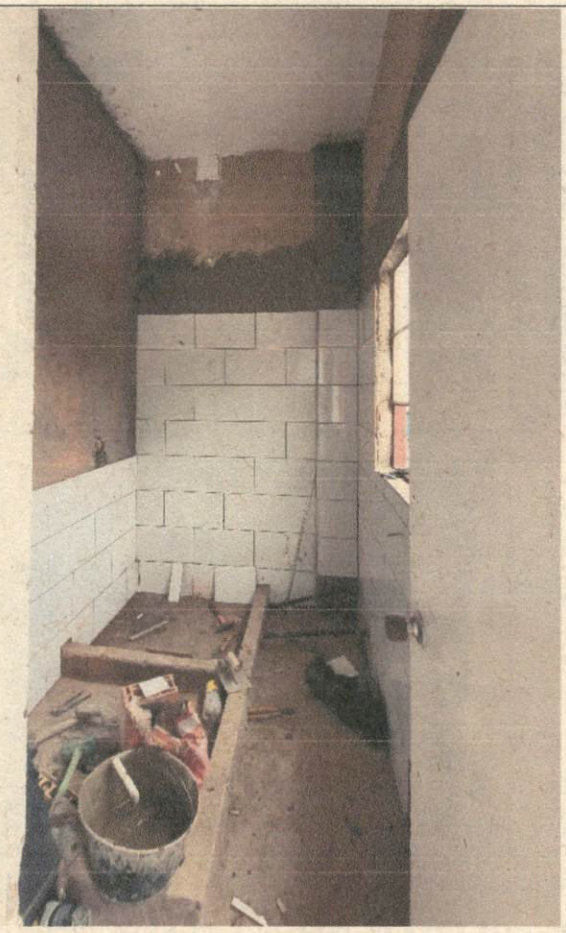



DUCHAS ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES



DEMOLICION MURO PARA PUERTA EN NUEVA BODEGA ZONA DE COMEDOR, CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO ENTRE COCINA Y NUEVA BODEGA.

ACTAS COMITÉ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 4 de 2023 **Hora:** 3:30 pm

Lugar: Estacion Central B-2

Tema: Puntos electricos en comedas alojamiento 1


Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
JUAN CARRILLO	B-2	30200	Jcarrillo@[illegible]	
[illegible]	Graneal	3148943720	[illegible]	
Daniel López	Graneal	3136014424	"	
Fabian Diaz	Interventoria	3007172837	fabiancdiaz@gmail.com	

Desarrollo de la reunión:

Se reunen ing. electrico del contratista, residente de obra, residente de interventoria y el jefe de turno de la estacion para definir la ubicacion de las tomas e interruptores de las comodas del alojamiento de bomberos.

se definio dejar interruptor y toma a 1.10 de altura sobre el muro divisorio en el que estaran dispuestas las comodas. (se anexa plano)

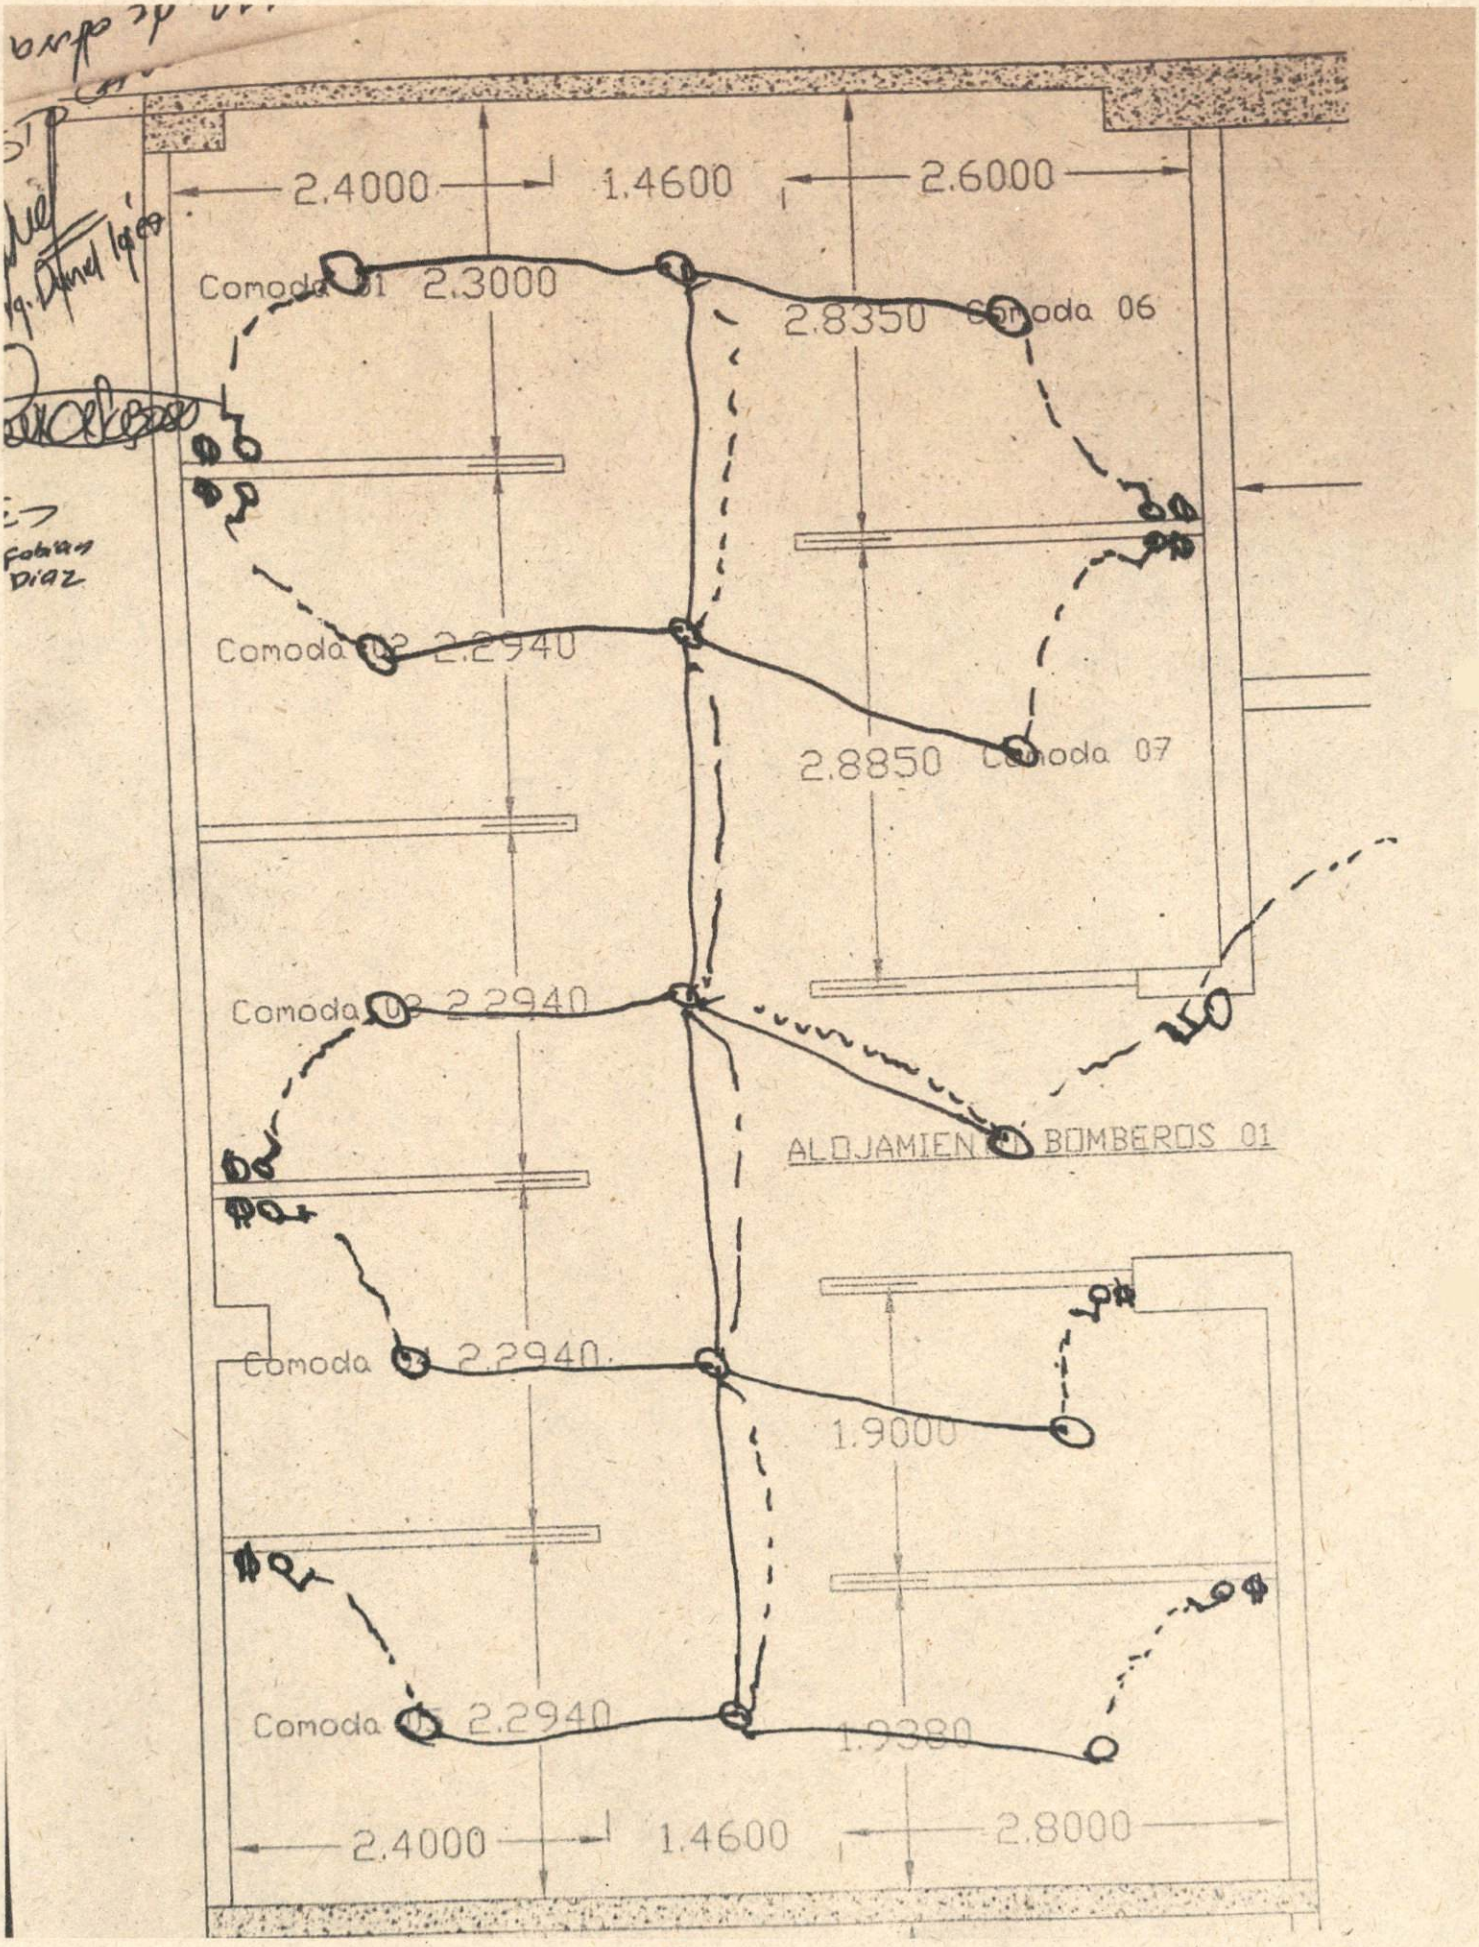
2.4000
1.4600
2.6000
Comoda 01 2.3000
2.8350
Comoda 06
Comoda 02 2.2940
2.8850
Comoda 07
Comoda 03 2.2940
ALOJAMIEN BOMBEROS 01
Comoda 04 2.2940
1.9000
Comoda 05 2.2940
1.9380
2.4000
1.4600
2.8000

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 5 / 2023 **Hora:** 11:00 a.m.

Lugar:

Tema: Comite de Obra

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Fabian Diaz	Interv.	3007172837	fabianediaz@gmail.com	
Daniel Lopez	Granval	3136614484	b2.obrabomberos1@gmail.com	
Jaider Sarabia	Granval	3148943120	b2.obrabomberos1contratista@gmail.com	

Desarrollo de la reunión:

Avance programado: 50.92%

Avance ejecutado: 47.69%

Se realiza comite en linea con la supervision, la interventoria y el contratista

El piso de comedor aun no se ha entregado porque aun no se ha desmanchado.

Se recuerda al contratista el compromiso de entrega del muro de lindero el dia 6 de abril segun acta de comite del dia 22 de marzo.

Se solicita al contratista cuantificar las actividades de instalacion de las 2 lamparas del patio y de la malla bajo teja en USAR. el miercoles 5.

La supervision solicita realizar verificacion de la documentacion enviada al comando para evitar observaciones y reprocesos. Tambien recomienda entregar la documentacion a la mano el dia miercoles 5 de abril.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 12 de 2023 **Hora:** 10:00 a.m.

Lugar: Estacion central B-2

Tema: Comite de obra

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
[illegible]	Interventoria	3178877296	arglaragordillo@gmail.com	
Leidy Diaz	UAECOB	40301	ljdiaz@bomberosbogota.gov.co	
Daniel lopez	Granual	3136614484	bzoiachambericontratista@gmail.com	
[illegible]	Interventoria	3103356876	[illegible]@hotmail.com	
[illegible]	Interventoria	3163356799	[illegible]	

Desarrollo de la reunión:

Se realiza recorrido de obra en conjunto con la supervision, interventoria y contratista revisando cada uno de los frentes de obra.


Se recuerda al contratista que la fecha de entrega del muro de lindero era el 6 de abril y a la fecha no se estan realizando trabajos en el mismo (hasta la fecha esta la estructura metalica).
El baño de segundo piso en alojamiento 2 se debe entregar el dia viernes 14 de abril. Al igual que el piso de comedor ascado y desmanchado.

A dia de hoy la prorroga del contrato se encuentra en tramite en la entidad pero aún no esta aprobada

El contratista se compromete a entregar el alojamiento terminado con divisiones, cielorasos y aparatos electricos instalados el viernes 21 de abril.

La interventoria solicita al contratista realizar una revision previa al combio de teja en bodega de USAR de niveles existentes y comporarlos con los de planos, revisar los actividades complementarias que se deriven tales como: encoroses, demoliciones, aumento de altura de muros, etc.

Se escoge color para las puertas de paso metalicas: Gris Brillante (507)

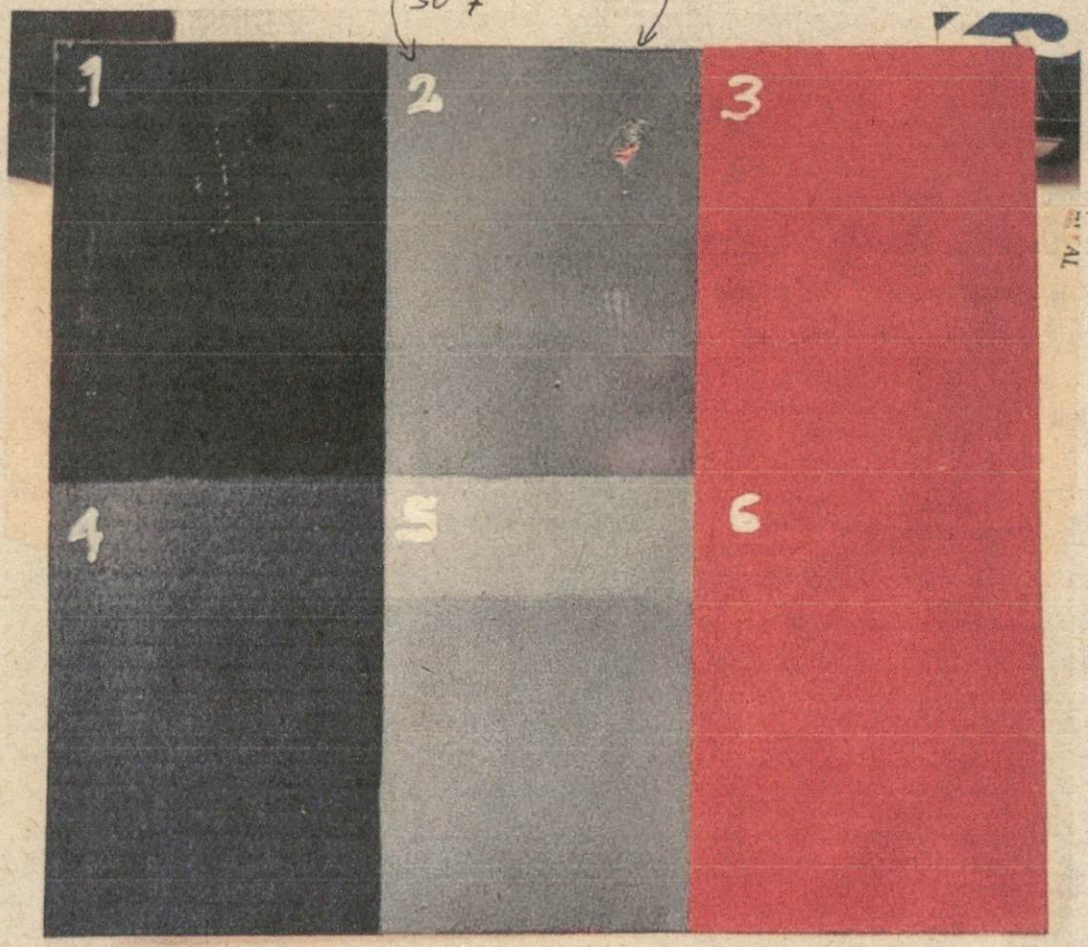
Gris Brillante
507
1
2
3
4
5
6

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 17 de 2023 **Hora:** 10:30 am.

Lugar: Estacion Central B-2

Tema: Entrega enchape zona de comedor

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Mary Cuevas	B-2	3017866822	hcuevas@bomberosbogotaguca	
David Lopez L.	Granual	3136614484	b2.obrabomberos.contratista@gmail.com	
Fabian Diaz	Interventoria	3003133837	fabianediaz@gmail.com	

Desarrollo de la reunión:

En reunion con el contratista, la interventoria y jefe de turno por parte de bomberos se realiza entrega de la zona de comedor con el enchape de piso color gris de trafico 5 segun especificaciones contractuales.

Se entrega y se recibe a satisfaccion por los arriba firmantes.

Calle 20 No. 68 A – 06 Edificio Comando Código Postal: 110931 PBX: 3822500
Linea de emergencia 123
www.bomberosbogota.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 19 de 2023 **Hora:** 2:00 PM

Lugar: Comando

Tema: Comite de Obra

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Laura Garcia	Tabernilla	3125812826		
MADELEINE MASQUERA	Interventoría	3103356826		
Leidy Diaz	UAECOB	40301	ljdiaz@bomberosbogota.gov.co	
Edward López	Granual	3136614474	bz.obracomercio.contratista@gmail.com	
Yessika Sarabia	Granual	3148943120	bz.obradecuerpo.contratista@gmail.com	
Henry Chaux	Tuterritorio	3163367179	mchaux1@gmail.com	
Fabian Diaz	Interv.	3007112827	fabianedraz@gmail.com	

Desarrollo de la reunión:

Se realiza reunion conjunta con la supervision, interventoria y contratista de obra

Avance de obra: programada: 79.86%.

Ejecutada: 65.01%

Contratista se compromete a entregar el muro de lindero con el acabado al 100% el sabado 22 de abril

El baño de alojamiento 2 sera entregado el viernes 21 de abril

Alojamiento 1 con muros divisorios y ciclorasor instalado se entregara el viernes 21 de abril

Alojamiento 2 sera entregado terminado el 2 de mayo.

El desmonte de teja del baño de segundo piso iniciara el lunes 24 de abril.

La division de vidrio de la zona del comedor se entregara el miercoles 26 de abril.

Para el 26 de abril se solicita entregar balance final de obra por parte del contratista.

Interventoria solicita al contratista entregar corte de obra a mas tardar el 26 de abril.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 26/2023 **Hora:** 2:00 pm

Lugar: Estacion central B-2

Tema: Comite de obra

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Jady Díaz	UAECOB	40301	ljdiaz@bomberosbogotá.gov.co	
[illegible]	Inter.	8039161		
[illegible]	Inter.	3163367999	Interventoria@gmail.com	
Daniel Lopez	Granval	3136614484	02obrabomberos1contratista@gmail.com	
[illegible]	INT	3103356826	[illegible]	
Wilbert	Granval	3152015337	Wilfrans7@hotmail.com	
Fabian Diaz	Interventoria	3002139937	fabianediaz@hotmail.com	

Desarrollo de la reunión:

Se realiza recorrido de obra en conjunto con la supervision, contratista e interventoria verificando el avance de cada uno de los frentes de trabajo.

Interventoria solicita al contratista presentar el flujo de caja actualizado lo antes posible.

El contratista entregara el alojamiento 2 (maquinistas) el dia 2 de mayo

Por inconveniente logistico la instalacion total de la division de vidrio del comedor se aplaza para el dia 27 de abril.

El desmonte de teja del baño de segundo piso se aplaza debido a que no se ha terminado la pintura de muros ~~de~~ de alojamientos por parte de la entidad, lo que no permite trasladar a los bomberos a este espacio.

El dia 05-05 se entregara la cuenta de cobro a la entidad.

BITACORA

Arq Daniel Lopez

Clima: Soleado - fin de actividades: 06:00 pm

Sabado 1 de abril 2023.

Director de Obra ( ) Residente ( ) Profesional de apoyo ( )
SST ( ) opiciales ( ) ayudantes
Interventoria: Residente (1) Inspector (1)

- Para la actividad de instalacion de superboard la interventoria solicita que se deje la separacion del piso (1cm min.) segun ficha tecnica para evitar la capilaridad de la lamina ante cualquier liquido que posiblemente se pueda regar en el piso.
También se solicita revisar la separacion de las laminas para garantizar el adecuado sellado de juntas. asi como tambien el uso de tornilleria correcta.

- A la fecha no se han corregido ni atendido las observaciones realizadas el martes 28 de marzo

- Se continua con instalación de estructura de cubierta en alojamiento 02 y reposición de cubierta upvc.
- Se realiza movimiento de tubería hidraulica la cual bajo por cubierta existente en alojamiento 02.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 05:00 p.m.

Arq. Daniel lópez.
Arq. Fabian Diaz

Domingo 02 abril de 2023.
Residente de obra (1) SST (1) Oficiales (3) Ayudantes (3).
Interventoria:

- Se programa el movimiento de tubería hidraulica la cual afectara la instalación de estructura y cubierta en el alojamiento de bomberos 02.
- Se continua con actividades de soldadura de correas en alojamiento de bomberos 01 y 02.
- Se realiza jornada de aseo en alojamientos.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 01:00 p.m. Arq. Daniel Lopez.

Lunes 03 de abril de 2023.
Director de obra (1) Residente (1) Ambiental (1). SST (1) Oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoria: (2) Residente (1) Inspector (1).

- Se realiza comité en compañía de la Supervisora de obra, apoyo a la Supervisión, interventoría, contratista y bombero para definir el diseño y áreas de los espacios de alojamiento.
- Se continua con actividad de desmonte de madera de soporte de cubierta sobre escaleras de acceso a alojamientos.
- Se Continua con la instalación de estructura de cubierta sobre alojamiento 02.
- Se realizo la demolición de pañete sobre fachada principal.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 05:00 p.m. Arq. Fabian Diaz. Arq. David López.

Martes 4 de abril 2023
Director de obra (1) Residente (1) Profesional de apoyo (1)
SST (1) oficiales (3) ayudantes (5)
Interventoria: Residente (1) Inspector (1)

- Se solicita al contratista entregar el area de comedor con el piso aseado y desmanchado ya que el enchape de esta area fue terminado el miercoles 29 de marzo.

- Se solicita corregir la alineacion de la teja en ambas puntas (en el voladizo y sobre la canal) ya que si las tejas son de la misma medida no se deberia presentar este inconveniente, lo cual demuestra instalacion indebida y no ha sido corregido a pesar de reiterados observaciones de forma verbal.

Arq. Fabian Diaz. Arq. Daniel López.

Miercole: 05 de marzo 2023
Residente (1) Director de obra (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (2) Ayudantes (7)
Interventoria Residente (1) inspector de obra.
. Se continua con la instalacion de estructura metalica sobre muro de culata de la estacion de bomberos.
. Se continua con instalacion de red electrica sobre alojamiento de bomberos 01.
. Se inicia el desmonte de cielo raso sobre escalera.
. Se continua con la instalacion de muros en estructura livianas en alojamiento de bomberos 01.
. Se realiza desmonte de lamparas que se encontraban sobre culata del muro de estacion.
. Supervision y Ing. Luis Fonseca Solicita instalacion de reja en Bodega Usar.
Clima: Soleado.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel Steveen Lopez Lozano.
Ing. Fabian Diaz

Jueves 06 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente de obra (1) SST (1) Ambiental (1).
Oficiales (4) Ayudantes (3).
Interventoria(-) Residente (1) inspector de obra
. Se continua actividades de instalacion de estructura de cubierta sobre alojamiento 02.
. Se continua actividad de instalacion de enchape en baño de alojamiento 02.
. Se continua con instalaciones de redes electricas.
. Se continua con instalacion de placas en muros divisorios de alojamiento
. Se envia balance incluyendo la reja solicitada por la Supervision.
Clima: lluvias ligeras 09:00 a.m - 11:30 a.m.
Fin de actividades: 05:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez.

Viernes 07 de abril 2023.
. No se desarrollan actividades. (Viernes santo).

Sábado 08 de abril 2023.

Director de Obra (1) Residente de obra (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (3) Ayudantes (2)
Interventoria: Residente (1) Ayudante (1).

- Se continua instalacion de estructera de cubierta sobre alojamiento de bomberos 02.
- Se continua instalacion de red electrica sobre alojamiento de bomberos 01.
- Se continua con la instalacion de teja upvc. sobre alojamiento de bomberos 02 y escaleras.
- Se continua con la instalacion de muros livianos en alojamiento de bomberos 01.

Arq. Daniel Lopez

Arq. Fabian Diaz

Clima: Soleado
Fin de actividades: 05:00 p.m.

Domingo 09 de abril 2023.

Residente de obra (1) SST (1) Oficiales ( ) Ayudantes ( ).
Interventoria: Residente (3) inspector (2).

- Se continua instalacion de estructura de cubierta y reparacion de teja upvc sobre alojamiento de bomberos 02.
- Se continua con instalacion de placas en muros divisorios de alojamiento 01. de bomberos.
- Se inician actividades de retiro de placas.

Arq. Daniel Lopez

Clima: Nublado lluvias 09:00 a.m - 09:00 a.m.
Fin de actividades: 01:00 p.m.

Lunes 10 de abril de 2023.
Residente de Obra (1) Director de obra (1) SST (1) Ambiental (1) Oficiales (4).
Ayudantes (4).
Interventoria. Residente (1) inspector. (1).

- Se continua instalacion de estructura de cubierta sobre alojamiento de bomberos 02.
- Se continua instalacion de estructura metalica de cubierta sobre escaleras de alojamiento.

- Continua actividad de instalacion de placas y empastado de muros en alojamiento de bomberos 01.
- Se inicia armado de estructura que compone la cubierta de bodega USAR.
- Se continuan actividades de instalaciones electricas sobre alojamiento de bomberos 01.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez
Arq. Fabian Diaz

Martes 11 de abril de 2023.
Director de Obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) Ayudantes (5) Oficiales (3).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).

- Se continua actividad de instalacion de estructura de cubierta upvc sobre alojamiento 02 y vacio de escaleras.
- Se continua instalacion de estructura de cubierta.
- Se continua instalacion de de red electrica sobre alojamiento de bomberos 01.
- Se continua con armado de estructura para cubierta de bodega usar.
- Se continua con actividad de instalacion de placas y empastados de muro sobre alojamiento de bomberos 02.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez
Arq. Fabian Diaz

Miercoles 12 de abril de 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) Oficiales (6) Ayudante (4).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1)

- Se continua instalacion de teja upvc sobre escaleras de alojamiento
- Se continua ejecucion de accesorios sobre muros divisorios en alojamiento de bomberos 01.
- Se continua con actividades de instalacion de puntos y cableado de red electrica en alojamiento de bomberos 01.

- Se inicia desmonte de cubierta en canaleta 90 sobre bodega de USAR.
- Se realiza demolición de muro de culata el cual se encontraba con un nivel avanzado de deterioro y presentaba grietas, esto fue intervenido despues de enviar registro fotografico a interventoria.
- Se elige color de puertas por parte de la supervisión y la interventoria.
- Se realiza comité de obra (ver acta de comité).

Clima: Se presentan lluvias ligeras entre las 07:30 a.m y las 10:40 a.m.
Fin de actividades: 09:30 p.m.

Arq. Daniel Lopez. Arq. Fabian Diaz

Jueves 13 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) oficiales (6).
Ayudantes (6)
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).

- Se continua actividad de desmonte de teja en bodega USAR.
- Se continua con actividad de acabado en muros divisorios de alojamiento de bomberos 01.
- Se continua con instalación de teja upvc sobre escaleras de alojamiento.
- Se inicia montaje de estructura de cubierta sobre bodega USAR.
- Se termina actividad de instalación de puntos electricos sobre alojamiento de bomberos 01.

Arq. Daniel Lopez.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Viernes 14 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente de obra (1) SST (1) Ambiental (1) oficial (7).
Ayudantes (5)
Interventoria: Residente (1) inspector. (1).

- Se inicia instalación de muro de culata en estructura divisoria
- Continua actividad de instalación de estructura de cubierta sobre bodega usar.
- Continua actividad de acabado de muro sobre alojamiento de bomberos 01.

- Se terminan actividades de instalación de cobierta sobre escalera de alojamiento y escaleras.
- Se entrega pito de comedor a interventoría, se espera al teniente Rumpo.

Clima: Soleado
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez
Arq. Fabian Diaz

Sábado 15 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Oficiales (4) Ayudantes (3).
Interventoría: Residente (1) inspector (1).

- Se continua actividad de instalación de muro liviano contra cuarto de estación de bomberos.
- Continua actividad de acabados de muros divisorios en alojamiento 01.
- Se realiza jornada de aseo
- Se inicia con la instalación de cielo raso en PVC sobre alojamiento de bomberos 01.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 05:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez.

Domingo 16 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente de obra (1) SST (1) Oficiales (3).
Ayudantes (2).
Interventoría: Residente (1) inspector. (1):

- Se continua con instalación de muro divisorio contra cuarto de estación de bomberos.
- Se continuan con actividad de acabados de muros divisorios.
- Se continua con instalación de cielo raso en PVC. sobre alojamiento de bomberos 01.

Clima: lluvias fuertes 10:30 → 01:00 p.m.
Fin de actividades: 01:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez.

Lunes 17 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) Oficiales (6).
Ayudantes (6)
• Se continua instalación de muro de lindero.
• Continua actividades de acabados de muros divisorios en alojamiento de bomberos 01.
• Continua el montaje de estructura de cubierta en bodega USAR.
• Se entrega zona de comedor con piso enchapado según especificaciones, se levanta acta de entrega firmada por el contratista, interventoria y jefe de turno Sgto. Cuevas.

Clima: lluvia 01:00 p.m → 06:00 p.m
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Fabian Diaz

Martes 18 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) Oficiales (6)
Ayudantes (3)
Interventoría (1) Residente → inspector (1).
• Continua instalación de cielo raso sobre alojamiento de bomberos 01.
• Continua instalación de muros en superboard sobre muro de culata de estación de bomberos.
• Continua actividad de acabado de muros sobre alojamiento de bomberos 01.
• Continua actividad de instalación de estructura de cubierta sobre bodega USAR.

Clima: lluvia · 03:00 p.m → 05:30 p.m.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Fabian Diaz

Miercoles 19 de abril 2023
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) Oficiales (7).
Ayudantes (3).
Interventoría: Residente (1) inspector (1).

- Continua instalación de ciclo raso PVC en alojamiento de bomberos 01
- Continua actividad de mampostado de muros de división sobre alojamiento de Bomberos 01.
- Continua montaje de estructura de cubierta sobre bodega USAR.
- continua instalación de muro divisorio sobre celata.
- Se realiza comité (ver acta de comité).
- Clima: lluvias fuertes 01:00 p.m → 05:30 p.m.

Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel López

Arq. Fabian Diaz

Jueves 20 de abril 2023.

- Inicia actividad de acabado sobre muro de culata
- inicia actividad de estructurado de cielo raso sobre alojamiento de bomberos 02.
- Continua actividad de instalación de estructura metalica sobre bodega USAR.
- inicia actividad de instalación de aparatos electricos sobre alojamiento de bomberos 01.

Clima: Soleado

Arq. Daniel López

Fin de actividades: 06:00 p.m.

Viernes 21 de abril 2023.

Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1).
Oficiales (2) Ayudante (3).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1)

- Continua actividad de acabado en muro divisorio de culata
- inician actividades electricas sobre alojamiento de bomberos 02.
- Continuan actividades sobre cubierta de bodega USAR

Clima: lluvia ligera: 04:30 → 06:00 p.m

Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Fabian Diaz

049

61

Sabado 22. de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (4) Ayudantes (6).
Interventoría: Residente (1) Inspector (1)
- Se inicia la instalación de vidrio templado.
- Continua actividades de instalación de Muros divisorios en alojamiento de bomberos 02.
- continua Montaje de estructura en bodega UAAP.

Clima: lluvia ligera 02:00 p.m → 04:00 p.m.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel López
Arq. Fabian Diaz

Lunes 24 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1).
Oficiales (3) Ayudantes (2).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).
- Continua instalación de muro en vidrio templado sobre comedor de estación
- Continua instalación de estructura sobre bodega UAAP
- Continua instalación de muros divisorios en alojamiento 02.
- Se inicia desmonte de puertas de oficinas 01 y 02 → Bodega UAAP.

Clima: lluvias ligeras 07: a.m → 09:00 a.m.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Fabian Diaz
Arq. Daniel López

Martes 25 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).
- Continua instalación de estructura Bodega UAAP.
- Continua instalación de Muros divisorios alojamiento 02.
- Continua instalación de vidrio divisorio de comedor de la estación.
- Continua pañetado de Puertas.

Clima: lluvias ligeras 03:00 p.m → 06:00 p.m.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Fabian Diaz
Arq. Daniel López.

Miercoles · 26 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).

- Se presentan lluvias no se pueden iniciar actividades en muro de culata de escalera y cubierta bodega Oiar.
- continua demolicción de puerta para bodega de cocina.
- Continua instalación de muro divisorio de bodega cocina.
- Se realiza comité de obra.

clima: lluvias 07:00 a.m → 11:00 a.m. Arq. Fabian Arias
fin de actividades 06100 p.m. Arq. Daniel López

Jueves 27 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (4) Ayudantes (4).

- Se continua instalación de vidrio divisorio de comedor.
- Continuan actividades sobre muro de culata
- continuan actividades de instalación de placas en alojamiento de Bomberos 02.
- Continua pañete en bodega de cocina.
- Continua instalación de cubierta bodega OJAR.

Clima: lluvias ligeras 09:00 am → 9:30 a.m.
Fin de actividades 06:00 p.m. Arq. Fabian A.
Arq. Daniel López

Viernes 28 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).

- Se continuan actividades de reposición de pañete en muro divisorio de bodega de comedor.

- Se realiza desmonte de puerta de alojamiento de bomberos.
- continua instalación de vidrio divisorio de comedor.
- continua instalación de cielo raso en alojamiento de bomberos 02.
- continua empastado de muros divisorios en alojamiento de bomberos 02.
- continua instalación de estructura metalica de cubierta sobre bodega USAR.
- Se continuan actividades de pintura de muro divisorio de cocina.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel López. Arq. Fabian D. Diaz

Sábado 29 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Residente ambiental (1) Oficiales (4) Ayudantes (4) Profesional de apoyo (1)
Interventoría: Residente (1) Inspector (1).

- Se continuan actividades de instalación de cielo raso en alojamiento de bomberos 02.
- Se continuan con acabados de muros divisorios en alojamiento de bomberos 02
- Se continua con reposición de cuñete en bodega de cocina.
- Se realiza actividad de retiro en puerta de alojamiento de bombero y puerta de bodega de cocina.
- Se continuan actividades de instalación de estructura de cubierta en bodega USAR.
- Se realiza recorrido en compañía del Te. Luis Pangueva por el alojamiento de bomberos 01, el cual no fue recibido debido a que se evidencia- que los muros estucados y pintados por parte de la cuadrilla de UEACOB presentan cuarteamiento en la superficie intervenida.
- Se instalan vidrios en alojamiento de bomberos 01 y 02.

Clima: Soleado
Fin de actividades: 05:00 p.m.

Arq. Daniel Stevens López. Arq. Fabian D. Diaz

Domingo 30 de abril de 2023.
Director de obra (1) Residente (1) profesional de apoyo (1) Residente ambiental (1) SST (1) Oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoría: Residente (1) Inspector (1).
- Se continuan actividades de instalación de cielo raso en puc sobre alojamiento de bomberos 02.
- Se continua actividades de aplicación de estucos en muros divisorios de alojamiento 02.
- Se continua con reposición de pañete sobre puertas de bodega de cocina.
- Se realiza jornada de aseo.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 01:00 p.m.

Arq Fabio Díaz
Arq. Daniel López

Lunes 01 de mayo 2023.
Director de obra (1) Residente (1) profesional apoyo (1) Ambiental (1) SST (1) oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoría: Residente (1) Inspector (1)
- Se continuan actividades de acabados en muros divisorios de alojamiento de bomberos 02.
- Se continua instalación de cielo raso en puc.
- Se continua instalación de estructura de cubierta sobre alojamiento bodega USAR - continua instalación de cubierta UPVC.
- Se continua reposición de pañete en muro divisorio de bodega cocina.

clima: Soleado.
Fin de actividades: 01:00 p.m.

Arq. Daniel López.

Martes 02 de mayo 2023.
Director de obra (1) Residente (1) Profesional apoyo (1) Ambiental (1) SST (1) oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoría: Residente (1) inspector (1)
- Se continua instalaciones electrical sobre alojamiento de bomberos 02.
- Se continua con actividades de acabados sobre muros exteriores.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Bogotá, 27 de abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-113

Ingeniero
BERMORI GRANADA VALENCIA
Representante Legal
GRANVAL INGENIERIA
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Incumplimiento Cronograma De Actividades

Apreciado Ingeniero:

De la manera más atenta con relación al contrato de la referencia, esta interventoría se permite dejar constancia del incumplimiento de los compromisos pactados con la supervisión de la Entidad y la interventoría en los últimos comités celebrados, si es cierto se ha identificado una serie de factores imputables a su firma como lo es la falta de personal en algunos frentes que lo están demandando y otros no imputables como el factor climático en las actividades de cubierta y pintura de exteriores y los retrasos en los inicios de actividades finales ocasionados por las demoras en la entrega de espacios por parte los contratistas de la Unidad, al día de hoy no se ha recibido ningún pronunciamiento oficial de su parte o por el contrario solicitud de prorroga o suspensión del contrato, lo que da a entender a la Entidad y a esta interventoría que el tiempo restante del contrato que finaliza el 22 de Mayo de 2023 es tiempo suficiente para desarrollar las actividades restantes y es de su completa responsabilidad acogerse a dicho tiempo restante.

De igual forma y como se ha manifestado en los comités esta interventoría únicamente tramitara solicitudes de prorroga o suspensión del contrato hasta el día viernes 28 de abril de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 27 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-112

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Remision Precios Unitarios No Previstos Contrato De Obra

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de REF: CONTRATO No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Nos permitimos realizar la remision de los siguientes precios unitarios no previstos revisados y avalados por esta interventoria:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
Np 015	Resposición Lampara Led 2x18W Hermetica incluye retiro de la existente	UND	$154.027,00
Np 016	Suministro e instalacion de panel LED redonde de inscrustar de 18w, incluye retiro del existente	UND	$72.954,00
Np 017	Reposición panel LED de incrustar de 60x60, incluye retiro del existente	UND	$153.303,00
Np 018	Suministro e instalacion de lampara de emergencia	UND	$146.172,00
Np 019	suministro e instalacion de salidad de iluminacion, toma corrientes, interruptores e iluminacion de emergencia en tubo conduit PVC SCH 40, incluye cable THHN 2X12+12, incluye cajas terminales, curva pegante y elementos de fijacion.	PTO	$171.282,00
Np 020	Suministro e instalacion de automatico de 1x20	UND	$32.051,00
Np 021	Sministro e instalacion de luminaria LED tipo postte de 50W, incluye desmonte del existente	UND	$692.601,00

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 27 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-111

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Cambio Profesional Ambiental Contrato De Obra

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de REF: CONTRATO No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Nos permitimos realizar la remision de la hoja de vida revisada y aprobada por esta interventoria del personal que encuentra desempeñando el cargo de Profesional Ambiental Contrato De Obra de la Ing. Mary Luz Morales desde el dia 22 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 27 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-110

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Cambio Profesional En Seguridad Y Salud En El Trabajo Contrato De Obra

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de REF: CONTRATO No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Nos permitimos realizar la remision de la hoja de vida revisada y aprobada por esta interventoria del personal que encuentra desempeñando el cargo de Profesional En Seguridad Y Salud En El Trabajo Contrato De Obra del Ing. Nestor Ivan Solano Garcia desde el dia 22 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 27 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-109

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Cambio Tecnologo Contrato De Obra

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de REF: CONTRATO No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Nos permitimos realizar la remision de la hoja de vida revisada y aprobada por esta interventoria para el Tecnologo De Obra del Arq. Jose Duvan Castrillon quien desempeña el cargo desde el dia 25 de abirl de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 27 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-108

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Retrasos En La Ejecución De Actividades Contrato De Obra

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de REF: CONTRATO No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Nos permitimos manifestar nuestra preopacion por los retrasos presentados en la entrega de las actividades que se encuentran realizando sus contratistas en cuanto a resanes, estucos y pinturas, retrasos que han visto afectado la entrega del alojamiento A, el cual ya se encuentra al 100% terminado por el contratista de obra al cual realizamos interventoria, lo que ha implicado retrasos en el inicio de desmonte de cubierta del ala B del proyecto ya que en esos alojamientos que estan interviniendo ustedes directamente ya debian estar mudeandose los bomberos que se encuentran en el aula multiple liberando espacio para trasladar los alojamientos que faltan por intervenir, ya que no hay mas espacios dentro de la estacion que puedan ser habilitados como alojamiento para sargentos y tenientes.


De igual forma al no poder iniciar el ala B, tampoco se ha podido iniciar las actividades en el baño del primer piso del bloque de suboficiales ya que no se puede tener en simultanea deshabilitados los dos baños, actividad que tambien genera retrasos.

Como es de su conocimiento el contrato tiene nueva fecha de vencimiento 22 de mayo, quedan alrededor de 3 semanas, y todo tiempo perdido es ruta critica y no se observa avance en la ejecucion de sus actividades ya que el personal no cuenta con material ni

ha asistido de forma continua y regular a realizar dichas actividades, de continuar esos retrasos el contratista se vera en la obligacion de solicitar una nueva prorroga de tiempo para poder culminar las actividades.

Quedamos atentos a sus indicaciones, para saber como es prudente proceder.

Cordialmente,



Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 24 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-107

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Remision Informe Mensual No.04 De Interventoria

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia remito el siguiente informe mensual:

2. Informe Mensual No.04 (01 de Marzo de 2023 al 31 de Marzo de 2023)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 24 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-106

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Remision Informe Mensual No.03 De Interventoria

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia remito el siguiente informe mensual:

3. Informe Mensual No.03 (01 de Febrero de 2023 al 28 de Febrero de 2023)

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

056

Bogotá, 28 de Febrero de 2023

EL SUSCRTIO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA
GORDILLO Y ASOCIADOSAS SAS
NIT. 900.581.578-1

CERTIFICA

El ingeniero LUIS ANGEL ESPITIA LOPEZ, identficado con cedula No.78.716.085 de Monteria-Cordoba, quien obra en representacion de la empresa INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SERINGTEC SAS, idenficada con NIT 900.335.275-1, presta los servicios como aASESOR ESPECIALISTA EN ESTRCUTRAS, por medio de contrato por obra o labor desde el dia 23 de noviembre de 2022 hasta la fecha con una dedicacion del 50%.

Para el CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 09 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-105

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Solicitud Prorroga Y Adición Contrato De Interventoria

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia, nos permitimos solicitar se prorrogue el contrato en 30 días calendario para poder realizar el acompañamiento al contratista de obra y culminar a satisfacción las actividades contractuales.

Adicionalmente se solicita adicionar el contrato de interventoría en $21.099.936,6 (Se anexa presupuesto discriminado).

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 09 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-103

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Solicitud Prorroga De Contrato De Obra

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia, nos permitimos remitir la solicitud de prórroga de contrato por 30 días, solicitud remitida mediante oficio del día 02 de abril de 2023, donde se exponen los motivos por los cuales se requiere prorrogar el contrato.

Esta interventoría después de revisados los argumentos expuestos en dicho informe, transmite la solicitud del contratista de obra a la Entidad y recomienda su aprobación, para poder culminar las actividades contractuales y llevar el proyecto a satisfacción.

Esta solicitud del contratista de obra no incurre en ningún sobrecosto económico para la Entidad.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 05 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-102

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Remisión Relacion Cambios De Personal Profesional Interventoria

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia remito la relación de los cambios de personal profesional del equipo de trabajo:

1. Ing. Luis Angel Espitia Lopez

   Director De Interventoría
   - 23-Nov-2023 al 26-Ene-2023 (mediante oficio Bogotá, 19 de Octubre de 2022/ INTER-BMB2-ADM-014).

   Asesor Especializado En Estructuras
   - 26-Ene-2023 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 26 de Enero de 2023/ INTER-BMB2-ADM-072).

2. Arq. Laura Patricia Gordillo Machado

   Residente De Interventoría
   - 23-Nov-2023 al 26-Ene-2023 (mediante oficio Bogotá, 19 de Octubre de 2022/ INTER-BMB2-ADM-014).

   Director De Interventoria
   - 26-Ene-2023 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 26 de Enero de 2023/ INTER-BMB2-ADM-072).

3. Arq. Fabian Eduardo Diaz Ruiz

Residente De Interventoría
- 16-Ene-2023 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 16 de Enero de 2023/ INTER-BMB2-ADM-065).

4. Mercy Charyl Gonzalez

   Profesional Sst (Seguridad Y Salud En El Trabajo)
   - 28-Nov-2022 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 28 de Noviembre de 2022/ INTER-BMB2-ADM-054).

5. Ing. Lindy Mayury Rubiano Moyano

   Profesional Ambiental De Interventoría
   - 23-Nov-2022 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 23 de Noviembre de 2022/ INTER-BMB2-ADM-066).

6. Tec. Luis Evelio Cardozo Fonseca

   Inspector De Interventoría
   - 23-Nov-2022 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 23 de Noviembre de 2022/ INTER-BMB2-ADM-053).

Cordialmente,



Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 03 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-101

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Remisión Relacion Cambios De Personal Profesional Interventoria

Mediante el presente documento, en relación al contrato de interventoría de la referencia remito la relación de los cambios de personal profesional del equipo de trabajo:

7. Ing. Luis Angel Espitia Lopez

   Director De Interventoría
   - 23-Nov-2023 al 26-Ene-2023 (mediante oficio Bogotá, 19 de Octubre de 2022/ INTER-BMB2-ADM-014).

   Asesor Especializado En Estructuras
   - 26-Ene-2023 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 26 de Enero de 2023/ INTER-BMB2-ADM-072).

8. Arq. Laura Patricia Gordillo Machado

   Residente De Interventoría
   - 23-Nov-2023 al 26-Ene-2023 (mediante oficio Bogotá, 19 de Octubre de 2022/ INTER-BMB2-ADM-014).

   Director De Interventoria
   - 26-Ene-2023 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 26 de Enero de 2023/ INTER-BMB2-ADM-072).

9. Arq. Fabian Eduardo Diaz Ruiz

   Residente De Interventoría
   - 16-Ene-2023 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 16 de Enero de 2023/ INTER-BMB2-ADM-065).

10. Mercy Charyl Gonzalez

    Profesional Sst (Seguridad Y Salud En El Trabajo)
    - 28-Nov-2022 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 28 de Noviembre de 2022/ INTER-BMB2-ADM-054).

11. Ing. Lindy Mayury Rubiano Moyano

    Profesional Ambiental De Interventoría
    - 23-Nov-2022 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 23 de Noviembre de 2022/ INTER-BMB2-ADM-066).

12. Tec. Luis Evelio Cardozo Fonseca

    Inspector De Interventoría
    - 23-Nov-2022 a actualidad (mediante oficio Bogotá, 23 de Noviembre de 2022/ INTER-BMB2-ADM-053).

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 03 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-100

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Remisión Informe Mensual De Obra No. 0 Contrato 568-2022

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia remito el Informe Mensual De Obra No,0 con todos sus anexos correspondientes el cual se encuentra revisado y aprobado por esta interventoria para su información y fines pertinentes.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE
Ing. Bermori Granada Valencia – Rep. Legal Contratista De Obra

Bogotá, 03 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-099

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Remisión Corte Parcial De Obra No. 0 Contrato 568-2022

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de la referencia remito el corte parcial de obra No,0 con todos sus anexos correspondientes el cual se encuentra revisado y aprobado por esta interventoria para su información y fines pertinentes.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE
Ing. Bermori Granada Valencia – Rep. Legal Contratista De Obra

11-12

CERTIFICACIONES

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Consultoría E Interventoría de Obras Civiles.

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", interventoria encargada del CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Certifica el contratista propenda por que los materiales de embalaje y/o implementos utilizados en el proceso constructivo sean catalogados como de baja carga contaminante, sin que ello implique perdida de la calidad de los productos, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", interventoria encargada del CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Certifica que el contratista implemente que uno los materiales de construcción sean sostenibles, donde la materia prima sea de una fuente abundante y renovable, que los productos sean de larga duración, no contaminantes, de producción justa y consuman poca energía en su ciclo de vida. Es importante que se conozca el análisis del ciclo de vida (ACV) de los productos de construcción de acuerdo a la norma ISO 14040, lo cual se demostrara mediante la presentación de la ficha técnica ambiental del producto como soporte de cumplimiento. en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", interventoria encargada del CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Certifica la no afectacion de ningun individuo arboreo en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", interventoria encargada del CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Certifica la implementacion de un programa de calidad a las obras ejecutadas, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,



Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", interventoria encargada del CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Certifica que el contratista ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo, que se ha delegado personal profesional comptente y adionalmente ha dispuesto todos los recursos de personal, equipos, implementos al igual que el contratista de interventoria. Durante el periodo de la presente certificacion no se ha solitado el remplazo de ningun empleado o trabajador ya que no se ha presentado la necesidad, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", interventoria encargada del CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Certifica que se ha velado por proteger las propiedades de terceros durante la ejecucion de la obra y a la presente no se ha presentado ningun evento ni reclamación, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", interventoria encargada del CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Certifica que se ha mantenido una actitud conciliadora entre las partes que intervienen en los contratos de relación, coordinando los eventos como comites semanales y reuniones extraordinarias que tengan lugar la correcta revisión completa y exhaustiva de los documentos técnicos existentes para las intervenciones, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC..

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", interventoria encargada del CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Certifico la correcta revisión completa y exhaustiva de los documentos técnicos existentes para las intervenciones, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC..

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Consultoría E Interventoría de Obras Civiles.

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Certificación Cumplimiento Recursos De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", interventoria encargada del CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Certifico la correcta administración de recursos de obra en cuanto al personal, equipos necesarios e implementos necesarios para el normal desarrollo de las labores de la interventoria del contrato de referencia, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC..

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Certificación No Actos De Corrupcion De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", certifico la no presentacion de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o la norma que lo sustituya o derogue.que el contratista de obra ejecute su objeto contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, técnico, administrativa y demás aspectos relacionados. en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Certificación Cumplimiento Objeto Contractual Contratista De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", certifico que el contratista de obra ejecute su objeto contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, técnico, administrativa y demás aspectos relacionados en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC..

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Certificación Implementación del Sistema De Gestion en Seguridad Y Salud En El Trabajo Contratista De Interventoria

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", certifico correcta verificacion de la Implementación del Sistema De Gestion en Seguridad Y Salud En El Trabajo Contratista De Interventoria, en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019. Adicionalmente se certifica la entrega de todos los EPP (elementos de protección personal obligatorios incluidos los de Bioseguridad en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Consultoría E Interventoría de Obras Civiles.

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Certificación Verificacion del Sistema De Gestion en Seguridad Y Salud En El Trabajo Contratista De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", certifico correcta verificacion de la implementacion de control según los riesgos identificados en la Matriz De Peligros presentada la firma contratista, como lo señala la Resolución 2400 de 1979, la Ley 9a de 1979, la Resolución 1016 de 1989 y la Resolución 2413 de 1979, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Certificación Cumplimiento Dotación Contrato De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", certifico el cumplimiento de la entrega de la dotación adecuada y completa al personal de obra acorde a la labor desempeñada, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC..

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Consultoría E Interventoría de Obras Civiles.

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Protocolo Bioseguridad Contrato Interventoria

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de remitir la certificacion expedida por la ARL POSITIVA a la firma GORDILLO Y ASOCIADOS SAS, el dia 04 de septiembre de 2020 dando visto bueno al protocolo de seguridad que implementa la empresa en sus diferentes contratos y que se ha aplicado en el presente en cumplimiento a las recomendaciones estimuladas en cumplimiento a la legislacion vigente de la emergencia sanitaria RESOLUCION 666 y 682 de 2020. en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Certificacion Seguimiento Impacto Auditivo Contrato De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", grarantizo que se ha velado por generar el menor impacto auditivo en las actividades ejecutadas y que hasta el momento no se ha presentado ninguna novedad al prespecto. en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Aprovechamiento Granulo De Caucho

Respetados Señores:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de remitir la certificacion relacionada con la viabilizacion del aprovechamiento de granulo de caucho en las actividadades del proyecto en zonas y/o áreas del proyecto que así lo ameriten como (pisos de gimnasios, topes de zonas de parqueo, mobiliarios etc.) la cual no fue posible ya que no se esta desarrollando ninguna actividad que lo permita, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Certificacion Retiro De Escombros Contrato De Obra

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", Certifico que no se realizan los retiros de escombro cumpliendo con toda la normativa legal establecida bajo el PIN ambiental asignado al contrato en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Certificacion No Uso Parque Automotor Contrato De Interventoria

Respetados Señores:

Yo, **Oscar Gregorio Gordillo Guerrero**, identificado con cedula de ciudadania No. 19.297.455 de Bogotá, en representacion legal de la firma interventora **Gordillo & Asociados Sas**, con NIT No. 900.581.578-1, responsable del contrato **UAECOB-586-2022**, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2", Certifico el no uso de parque automotor del contrato de interventoria, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Uso Del Papel

Respetados Señores:

La presentación de los informes físicos, que han realizado de acuerdo con los criterios ambientales Numeral 24.2 (El contratista, para la presentación de informes físicos deberá dar un adecuado uso al recurso del papel, donde se garantice su ciclo sostenible. En todo caso, este deberá ser fabricado con papel reciclado, de alto rendimiento que cuente con procesos de recuperación, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. Adicionalmente, debe estar libre de cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF. Para lo cual, se certifica que la Empresa GORDILLO & ASOCIADOS SAS con numero de NIT 900.581.578- 1, cumple con este criterio ambiental, así mismo se ha mitigado el uso de papel y se ha reemplazado por envío de la información por correos electrónicos. en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Certificacion De No Generación Residuos Peligrosos

Respetados Señores:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de remitir la certificacion de la no generacion de residuos peligrosos y/o especiales tales como tintas, tóner, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEES, disolventes, grasas, pinturas y pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que tengan contacto con los mencionado), garantizando el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, a la fecha de corte de la presente certificación del en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC..

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 01 de Mayo de 2023

Señores
UAE Cuerpo Oficial De Bomberos
Atte: Doctora AMALIN ARIZA MAHUAD
Departamento Infraestructura UAECOB
Supervisor De Contrato

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Certificacion De No Requerimiento De Plan De Manejo De Transito Contrato De Obra

Respetados Señores:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de remitir la certificacion del no uno de plan de manejo de transito del contrato de referencia, ya que por las obras a desarrollar no se identifica su necesidad ya que no se afectara directamente la movilización de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas). De igual forma se brindara un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar a medida que lo ameriten las actividades a desarrollar, en el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 y el 30 de abril de 2023 en Bogotá DC.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS
