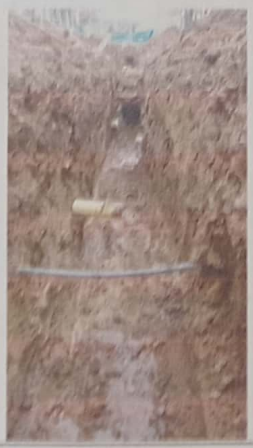
	cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados, debidamente revisados y aprobados por la supervisión, (según el caso) y el presupuesto disponible. A cada una de las actas se le descontará las retenciones y deducciones de ley. b). Un último Pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del balance final del contrato, que será cancelado al contratista previo a la entrega y recibo final a satisfacción de las actividades del objeto contratado. A este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.
Plazo Inicial del contrato	(60) SESENTA DIAS
Fecha de inicio:	16 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de terminación inicial	14 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reinicio:	N/A
Fecha de terminación final:	14 DE OCTUBRE DE 2023
Modificación No.	N/A
Supervisor por parte del Departamento	Arq. MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ

2. DATOS FINANCIEROS		
No. y Valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No 2085	$ 209.656. 318.oo
No. y valor Registro Presupuestal	No 7053	$ 195´983. 080.oo
Adición (Modificatorio No. _____ de 20_____	N/A	
Valor Total del Contrato		$195´983. 080.oo


3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA:

Powered by CamScanner

4. REGISTRO FOTOGRAFICO *(si aplica)*

		
Localización y replanteo	Señalización preventiva	Pasos peatonales
		
Lleno compactado incluye suministro de material de prestamo de cantera y/o río	Excavación 0-2 mts	Excavación 2-4 mts

Powered by CamScanner

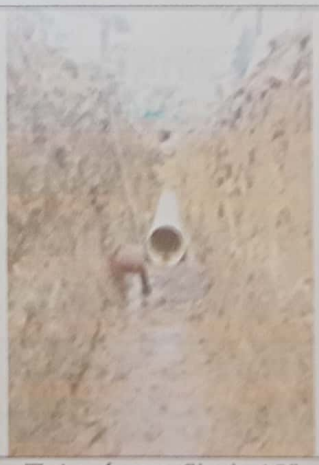		
Losa tapa 1,6*1,6*0.2m en concreto (incluye tapa en HF)	Lleno con material de prestamo	Cama en triturado
		
Suministro, conformación y compactación Sub Base granular	Tubería perfilada 6"	Tubería perfilada12"

Powered by CamScanner



Tubería perfilada 16"



Silla yee



Cajas de inspección

5. RESUMEN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO			
OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 11 ENTRE CARRERA 11 Y 12 ENTRE CAMARAS 685 Y 569 CIRCASIA-QUINDIO			
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNID	EJECUTADO
1	PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN		
1,1	Localización y replanteo	Ml	0
1,2	Señalización preventiva con tela PP	Ml	0
1,3	Pasos peatonales provisionales	Un	0
1,4	Manejo de aguas	Ml	0
2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2,1	Excavación en material común a mano entre 0-2 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	49
2,2	Excavación en material común a mano entre 2-4 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	0
2,3	Lleno compactado con material de sitio	M3	0

Powered by CamScanner

2,4	Lleno compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	M3	7
2,5	Cama para cimentación con material triturado	M3	5
2,6	Entibado Tipo B	M2	0
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALCANTARILLADO**		
3,1	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=6"	Ml	33
3,2	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=12"	Ml	0
3,3	Suministro e instalación Kit Silla Yee 12" x6"	Un	5
4	**OBRAS EN CONCRETO**		
4,1	Caja de Inspección 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto)	Un	4
4,2	Imprimación asfalto con emulsión asfáltica	M2	0
4,3	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 E=0,07m	M3	0
5	**PAVIMENTOS Y REPOSICIONES**		
5,1	Suministro, conformación y compactación Sub Base granular	M3	17
6	**OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**		
6,1	Cargue y retiro de material sobrante	M3	0
6,2	Inspección interna de la red de alcantarillado con equipo CCT	ML	38

Powered by CamScanner

OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO			
OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO ALTO DE LA TAZA ENTRE MANZANA A Y BARRIO OBRERO CIRCASIA-QUINDIO			
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNID	EJECUTADO
1	PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN		
1,1	Localización y replanteo	Ml	0
1,2	Señalización preventiva con tela PP	Ml	0
1,3	Pasos peatonales provisionales	Un	0
1,4	Manejo de aguas	Ml	0
2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2,1	Excavación en material común a mano entre 0-2 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	22
2,2	Excavación en material común a mano entre 2-4 m (Incluye retiro tubería existente)	M3	0
2,3	Lleno compactado con material de sitio	M3	0
2,4	Lleno compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	M3	32
2,5	Cama para cimentación con material triturado	M3	0
2,6	Entibado Tipo B	M2	0
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALCANTARILLADO		
3,1	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=6"	Ml	27
3,2	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=12"	Ml	3

Powered by CamScanner

3,3	Suministro e instalación Tubería Perfilada D=16"	ML	0
3,4	Suministro e instalación Kit Silla Yee 16" x6"	Un	1
4	**OBRAS EN CONCRETO**		
4,1	Cuerpo cámara D=1,2m en concreto de 21MPa (incluye peldaños)	Ml	2.7
4,2	Caja de Inspección 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto)	Un	1
4,3	Losa tapa 1,6*1,6*0.2m en concreto (incluye tapa en HF)	Un	1
4,4	Construcción base y cañuela	Un	1
4,5	Brazo de caída en tubería de diámetro 12" incluye accesorios y concreto	Un	3
4,6	Empalme cámaras existentes	Un	0
5	**PAVIMENTOS Y REPOSICIONES**		
5,1	Suministro, conformación y compactación Sub Base granular	M3	43
6	**OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**		
6,1	Cargue y retiro de material sobrante	M3	56
6,2	Inspección interna de la red de alcantarillado con equipo CCT	M	104

Powered by CamScanner

6. BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR INICIAL	$195´983. 080.oo	$0	$195´983. 080.oo
ADICION No	$0	$0	$0
ACTA No 01	$195´983. 080.oo	$154.323.257.oo	$41.659.823.oo
ACTA FINAL	$195´983. 080.oo	$41.648.551.oo	$11.272.oo
TOTAL	$195´983. 080.oo	$195.971.808.oo	$11.272.oo

PERIODO DE INFORME: 13 DE SEPTIEMBRE – 13 DE OCTUBRE

Valor a pagar presente acta: **CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($41.648. 551.oo),** que corresponde al 21,22568467 del valor total del contrato de obra.

7. APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **(profesional a cargo)**, en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado **MIRIAM GARCIA CRIALES con** tarjeta profesional No. 10118-T donde certifica que **ROBERT ALFARO GARCIA con C.C. 7.557.466**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo. **(si aplica)**

VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATISTA:

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Robert Alfaro García	145.000	185.600	6.100	9456969406 9458194080	09 10

Powered by CamScanner

INGRESO BASE DE COTIZACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN PROPUESTA.

Nombre(s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
Robert Alfaro García	145.000	185.600	6.100	9456969406 9458194080	09 10
María del Rosario Sabogal Ramírez	46.400	185.600	80.800	9457985860	09

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0560136960006387	ROBERT ALFARO GARCIA

Nota: para el pago de cuentas con recursos nacionales, la forma de pago no puede efectuarse mediante cheque.

Para constancia, se firma en el Municipio de Armenia Departamento del Quindío, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).

Arq. MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ
Departamento del Quindío
Supervisor / Interventor

Ing. JORGE ANDRES BONILLA SEPULVEDA
Departamento del Quindío
Apoyo a la Supervisión

HECTOR DAVID GUZMAN WALTEROS
VoBo. Secretario Despacho

Elaboró:

Powered by CamScanner
