Al contestar por favor cite estos datos
Radicado No: **20234000096931**
Tunja, **17-05-2023**

Pedro Alejandro Rodríguez Ávila
Secretario de Infraestructura
Alcaldía Mayor de Tunja
infraestructura@tunja.gov.co
atencionalciudadano@tunja.gov.co
Tunja/Boyacá/Colombia

William Ricardo Hernández Sanabria
Gerente General
Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios

Asunto: Solicitud apoyo inspección red de alcantarillado pluvial, urbanización Torres del Parque.

Cordial saludo, Ingeniero Rodríguez:

En atención al oficio 1.10.1-2-3 661 radicado el 2 de mayo de 2023 bajo el número interno 20232210015872 la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., se permite presentar informe de las actividades llevadas a cabo para atender las solicitudes, relacionadas con la verificación del estado de las redes pluviales de la Urbanización Torres del Parque:



Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P
NIT.820.000.671-7
Carrera 3 este N°11-20 Tunja - Colombia
Telefono. (+57-8) 7 440 088 Ext.142 –fax (+57-8) 7 440 088 Ext. 110
www.veolia.com.co/tunja-yopal

1. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10072, ubicada en la urbanización Torres del Parque, orden de trabajo 2023-2683, ejecutada el 6 de mayo de 2023, se realiza lavado con agua a presión a la tubería para posterior inspección con cámara.






Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P
NIT.820.000.671-7
Carrera 3 este N°11-20 Tunja - Colombia
Telefono. (+57-8) 7 440 088 Ext.142 –fax (+57-8) 7 440 088 Ext. 110
www.proactiva.com.co/tunja

2. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10073, ubicada en la urbanización Torres del Parque, orden de trabajo 2023-2684, ejecutada el 6 de mayo de 2023, se realiza lavado con agua a presión a la tubería para posterior inspección con cámara.

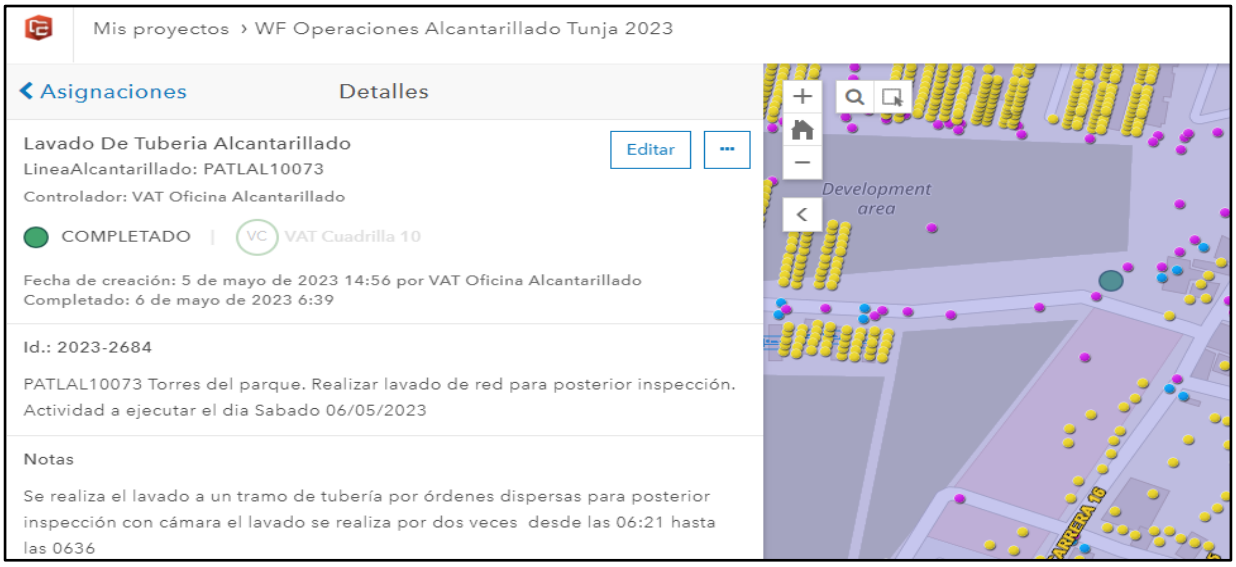



Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P
NIT.820.000.671-7
Carrera 3 este N°11-20 Tunja - Colombia
Telefono. (+57-8) 7 440 088 Ext.142 –fax (+57-8) 7 440 088 Ext. 110
www.proactiva.com.co/tunja

3. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10074, ubicada en la urbanización Torres del Parque, orden de trabajo 2023-2685, ejecutada el 6 de mayo de 2023, se realiza lavado con agua a presión a la tubería para posterior inspección con cámara.







Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios

4. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10075, ubicada en la urbanización Torres del Parque, orden de trabajo 2023-2686, ejecutada el 6 de mayo de 2023, se realiza lavado con agua a presión a la tubería para posterior inspección con cámara.







Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios


5. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10068, orden de trabajo 2023-2687, ejecutada el 8 de mayo de 2023, se realiza inspección con cámara en tubería de 10" (250 mm) PVC en sentido occidente-oriente para verificar estado estructural y operativo, longitud 34.8 metros, a 2.5 metros se encuentra rotura de tubería a las 12 horas, tubería en general en buenas condiciones físicas y operativas.





Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios

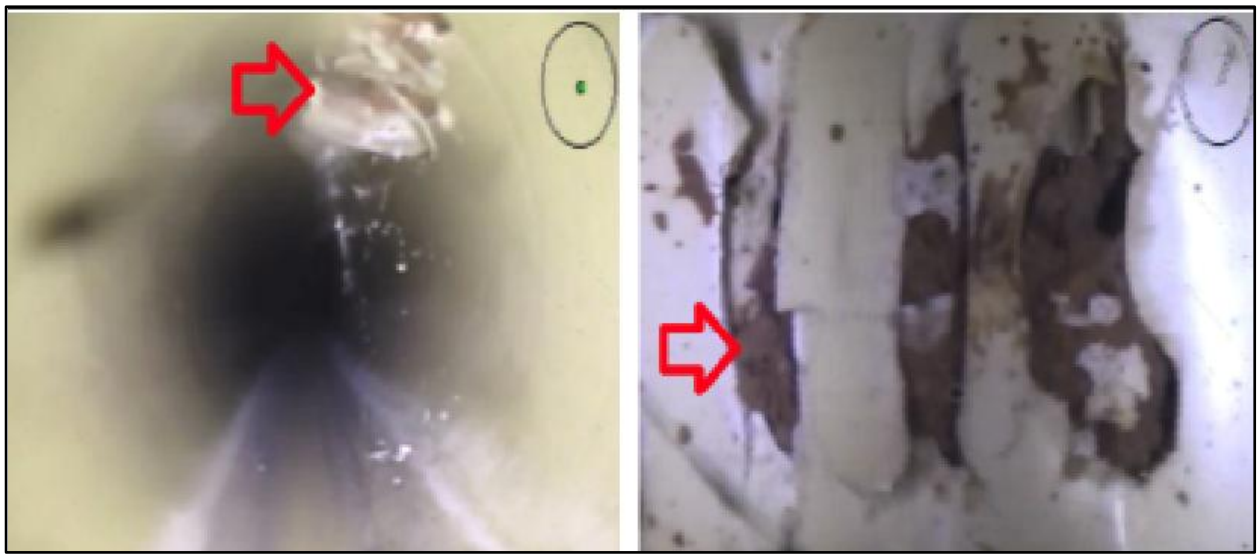

6. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10069, orden de trabajo 2023-2688, ejecutada el 8 de mayo de 2023, se realiza inspección con cámara en tubería de 12" (315 mm) PVC en sentido occidente-oriente para verificar estado estructural y operativo, longitud 41 metros, tubería en buenas condiciones físicas y operativas.




Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P
NIT.820.000.671-7
Carrera 3 este N°11-20 Tunja - Colombia
Telefono. (+57-8) 7 440 088 Ext.142 –fax (+57-8) 7 440 088 Ext. 110
www.proactiva.com.co/tunja

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios



7. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10070, orden de trabajo 2023-2689, ejecutada el 8 de mayo de 2023, se realiza inspección con cámara en tubería de 12" (315 mm) PVC en sentido occidente-oriente para verificar estado estructural y operativo, longitud 35.5 metros, tubería en buenas condiciones físicas y operativas.

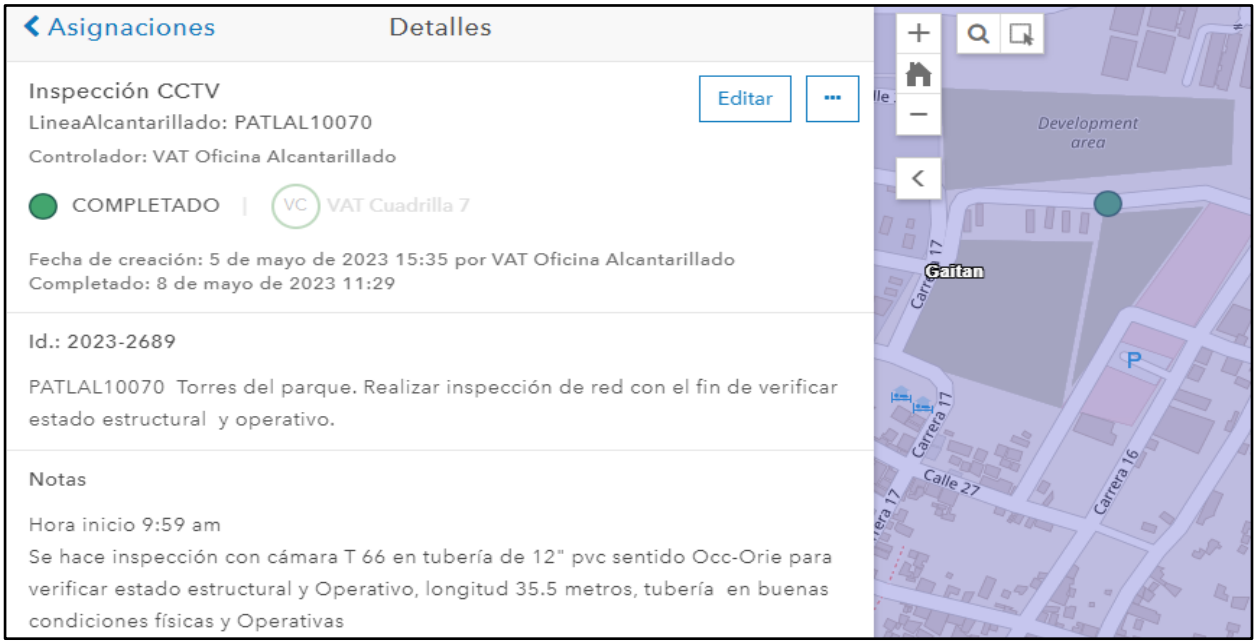

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios



8. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10071, orden de trabajo 2023-2690, ejecutada el 8 de mayo de 2023, se realiza inspección con cámara en tubería de 12" (315 mm) PVC en sentido occidente-oriente para verificar estado estructural y operativo, longitud 41.5 metros, tubería en buenas condiciones físicas y operativas.



Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P
NIT.820.000.671-7
Carrera 3 este N°11-20 Tunja - Colombia
Telefono. (+57-8) 7 440 088 Ext.142 –fax (+57-8) 7 440 088 Ext. 110
www.proactiva.com.co/tunja

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios






9. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10072, orden de trabajo 2023-2691, ejecutada el 8 de mayo de 2023, se realiza inspección con cámara en tubería de 12" (315 mm) PVC en sentido oriente-occidente para verificar estado estructural y operativo, longitud 24.7 metros, tubería en buenas condiciones físicas y operativas.



Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P
NIT.820.000.671-7
Carrera 3 este N°11-20 Tunja - Colombia
Telefono. (+57-8) 7 440 088 Ext.142 –fax (+57-8) 7 440 088 Ext. 110
www.proactiva.com.co/tunja

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios

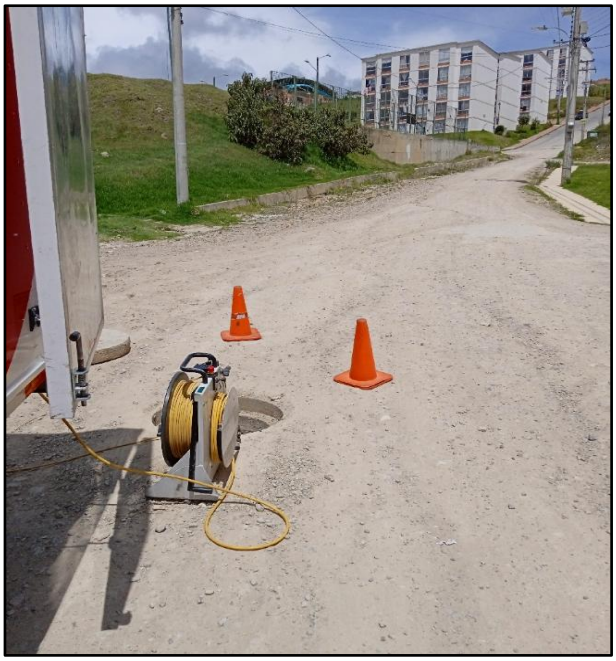



10. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10073, orden de trabajo 2023-2692, ejecutada el 10 de mayo de 2023, se realiza inspección con cámara en tubería de 16" (400 mm) PVC en sentido oriente-occidente para verificar estado estructural y operativo, longitud 20 metros, tubería en buenas condiciones físicas y operativas.



Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P
NIT.820.000.671-7
Carrera 3 este N°11-20 Tunja - Colombia
Telefono. (+57-8) 7 440 088 Ext.142 –fax (+57-8) 7 440 088 Ext. 110
www.proactiva.com.co/tunja

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios



11. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10074, orden de trabajo 2023-2693, ejecutada el 10 de mayo de 2023, se realiza inspección con cámara en tubería de 16" (400 mm) PVC en sentido sur-norte para verificar estado estructural y operativo, longitud 41 metros, tubería en buenas condiciones físicas y operativas.



Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P
NIT.820.000.671-7
Carrera 3 este N°11-20 Tunja - Colombia
Telefono. (+57-8) 7 440 088 Ext.142 –fax (+57-8) 7 440 088 Ext. 110
www.proactiva.com.co/tunja

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios



12. Red de alcantarillado pluvial PATLAL10075, orden de trabajo 2023-2694, ejecutada el 10 de mayo de 2023, se realiza inspección con cámara en tubería de 16" (400 mm) PVC en sentido sur-norte para verificar estado estructural y operativo, longitud 41.5 metros, tubería en buenas condiciones físicas y operativas.





De acuerdo a lo anterior, damos por atendida su solicitud y manifestamos el compromiso constante de la empresa en identificar y resolver los inconvenientes presentados con los servicios prestados.

Cordialmente,

Proyectó: G. Bernal /
Elaboró: Ángela G. /
Aprobó: Johana B./ W. Hernández

Copia: Gerencia de Planeación y Construcciones.

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P
NIT.820.000.671-7
Carrera 3 este N°11-20 Tunja - Colombia
Telefono. (+57-8) 7 440 088 Ext.142 –fax (+57-8) 7 440 088 Ext. 110
www.proactiva.com.co/tunja

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios
