CONTRATO DE OBRA 999 – 2022

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 1-2022.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA No.6

FEBRERO 2023

GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A

Grupo Empresarial Pinzón Muñoz S.A.S
Calle 12ª No. 68c- 03
TEL: (1) 7430070

TITULO DEL DOCUMENTO	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA No. 6**

REVISIÓN	**NOMBRE**	**FIRMA**
RESPONSABLE ELABORACIÓN. TÉCNICO	José Dionisio Cárdenas Bolivar	
RESPONSABLE ELABORACIÓN- SOCIAL	Shirley Karina Sáchica Cuadros	
RESPONSABLE ELABORACIÓN- SST	Gloria Esperanza Arboleda Arias	
RESPONSABLE APROBACIÓN	Edgar Roa Castillo	

TABLA DE CONTENIDO

INDICE DE TABLAS 4
INDICE DE ILUSTRACIONES 4
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 6
3. CONTRATO DE OBRA 8
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8
3.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES 8
3.1.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE POLIZAS 8
3.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS 9
3.1.4. PERSONAL APROBADO DE OBRA 9
3.2. AVANCE DE OBRA 10
3.3. RESUMÉN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 10
3.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS (validaciones): 10
3.3.2. CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN 11
3.3.3. APERTURAS 14
3.3.4. ENTREGAS 16
4. CIERRE DE CORTE NO. 3 20
5. CORRESPONDENCIA ENVIADA ..... 21.
6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 21
7. PROGRAMACIÓN (PROJECT) 22
8. SUPERVISONES TÉCNICAS 23
9. CONCLUSIONES 24

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos del contrato de obra 8
Tabla 2. Documentos legales del contrato de obra 9
Tabla 3. Personal contrato de obra 10
Tabla 4. Avances de obra 10
Tabla 5. Aperturas de las viviendas 14
Tabla 6. Entregas de las viviendas 16
Tabla 7. Cierre de corte No. 3.....20

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización proyecto 6
Ilustración 2. Localización proyecto ADICION Y PRORROGA NO. 1.....7
Registro fotográfico……8

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En cumplimiento al Plan de Desarrollo, que busca mejorar la calidad de vida de las familias bogotanas más vulnerables y con el proyecto MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD, la Secretaría Distrital del Hábitat busca superar las deficiencias que impactan la calidad de vida de los ciudadanos en la localidad de Usme.

GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S (GePM), celebró el contrato No.999 DE 2022 bajo el proceso de licitación pública No. SDHT-LP-013-2022 cuyoobjeto corresponde a CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1– 2022 Y ADICION Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. 999 DE 2022.

De esta manera, en el presente informe se relaciona el consolidado de los respectivos avances en lo que se refiere a las etapas 1 de validación, 2 de ejecución y 3 de entrega en el componente técnico. A continuación, se describen los avances del proyecto durante todo el periodo evaluado del 1 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Se encuentra ubicado en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 59 nombrada como Alfonzo López en la localidad 5 Usme, esta UPZ limita al norte, con la UPZ Gran Yomasa; por el oriente y por el sur, con la UPZ Ciudad Usme; y por el occidente, con la UPZ Comuneros.

Mas específicamente el proyecto se realizará en los barrios de Nuevo Portal, Nuevo Porvenir y El Triángulo, localizados en el área urbana de la localidad con alto uso residencial en su mayoría viviendas unifamiliares desarrolladas por auto construcción en estratos 1 y 2.

Las viviendas que pertenecen a la adición y prorroga No. 1 son un total de 84 viviendas ubicadas en los barrios de Nuevo Portal, Nuevo Porvenir, El Refugio, Portal El Divino y 6 viviendas ubicadas en el barrio de Compostela III de la Localidad de Usme.

Ilustración 1. Localización proyecto.

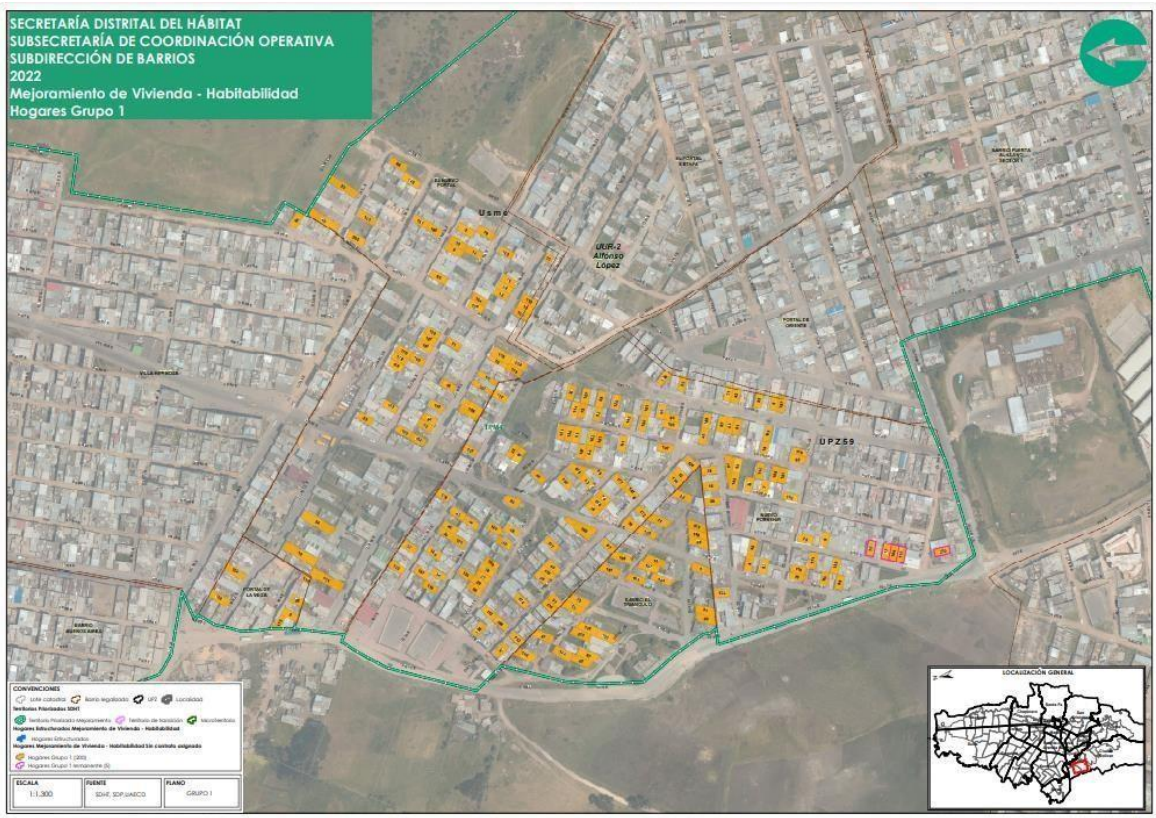


Ilustración 2. Localización proyecto ADICION Y PRORROGA NO. 1.



3. CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES

En la tabla 1 se presentan los datos generales del contrato de obra No. 999 de 2022].

Tabla 1. Datos del contrato de obra

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	999 de 2022
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 – 2022.
PLAZO INICIAL	SEIS (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR	$3.600.000.000,00 M/CTE
VALOR ADICION	$1.602.000.000,00 M/CTE
VALOR TOTAL	$5.202.000.000,00 M/CTE
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S
NIT	900.372.215-7
ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

3.1.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE POLIZAS

Los documentos de carácter legal que se han suscrito a la fecha se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Documentos legales del contrato de obra

AMPAROS	PORCENTAJE	VIGENCIA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100% del valor del anticipo.	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.
CUMPLIMIENTO	20% del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	10% del valor del contrato	Duración del contrato y tres (3) años más
CALIDAD DEL SERVICIO	Equivalente al 20% del valor total del contrato	Con una vigencia contada a partir de la finalización del plazo del contrato y seis (6) meses más.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20% del valor del contrato.	Esta garantía debe estar vigente por DOS (2) años contados a partir del acta de entrega y del recibo a satisfacción de la obra.

3.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS

Modificar la **CLAUSULA 4 VALOR del Contrato de Obra No. 999 de 2022**, adicionando la suma de MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($1.602.000.000), el cual se encuentra respaldado en el CDP No. 2203 del 25 de noviembre de 2022, expedido por el responsable del presupuesto de la entidad.

En consecuencia, el valor total del contrato, incluido la presente adición, quedará por lasuma de CINCO MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.202.000.000)., el cual incluye cualquier clase de gravamen, impuesto, tasa, contribución o tributo en general que se cause o se llegare a causar y que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del contrato.

3.1.4. PERSONAL APROBADO DE OBRA

A continuación, se relaciona en la tabla 3 el personal contractual del contratista aprobado por la interventoría.

Tabla 3. Personal contrato de obra

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PORCENTAJE EN OBRA MARZO DEL 2022
JOSÉ DIONISIO CÁRDENAS BOLÍVAR	DIRECTOR DE OBRA	100%
SHIRLEY KARINA SACHICA CUADROS	COORDINADORA SOCIAL	100%
JUAN SEBASTIAN GONZALEZ ORTIZ	RESIDENTE 1	100%
GINA PAOLA GONZALEZ ESPINOSA	RESIDENTE 2	100%
DANIELA SANCHEZ MOLINA	RESIDENTE 3	100%
SEIDY YURANI SÁNCHEZ AGUAS	RESIDENTE 4	100%
YENY ELIZABETH SANGUINO ROMERO	PROFESIONAL SOCIAL 1	100%
LAURA MARCELA DIMATÉ GONZÁLEZ	PROFESIONAL SOCIAL 2	100%
JULY ASTRID ESPITIA LOPEZ	PROFESIONAL SOCIAL 3	100%
MARYELENA NIVIAYO CAICEDO	PROFESIONAL SOCIAL 4	100%
ANGY LORENA OROZCO MONTILLA	PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISO	100%
GLORIA ESPERANZA ARBOLEDA ARIAS	PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISO	100%

3.2. AVANCE DE OBRA

Tabla 4. Avances de obra

Caracterizaciones	285
Aperturas	210
Entregas	174

.

3.3. RESUMÉN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

3.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS (validaciones):

Durante el periodo se realizaron 50 validaciones, 44 aperturas de obra y 57 entregas en compañía del componente social y SST, para un total de 285 viviendas validadas, 210 aperturas y 174 entregadas hasta la fecha.

3.3.2. CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN

Para el presente periodo, se adelantaron 50 validaciones que se realizaron de la siguiente manera, descritas a continuación:

Tabla 5. Validación de las viviendas

Nº	VIVIENDA	DIRECCIÓN	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA VALIDACIÓN
1	MV_02771	CL 110 SUR 8D 34 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	HERMENEGILDO SAUL PEDRAZA MORENO	01/02/2023
2	MVAL_03478	KR 9B ESTE 107 84 SUR	EL REFUGIO I Y II	CRISTINA IBAÑEZ VASQUEZ	01/02/2023
3	MVAL_03514	KR 9C ESTE 107 92 SUR	EL REFUGIO I Y II	CLARA INES SANTANA MARTINEZ	01/02/2023
4	MVAL_03487	KR 9B ESTE 107 28 SUR	EL REFUGIO I Y II	ROBERTO CUERVO	01/02/2023
5	MVAL_03505	KR 9C ESTE 107 75 SUR	EL REFUGIO I Y II	ANA SIERRA	01/02/2023
6	MVAL_03509	KR 9C ESTE 107 93 SUR	EL REFUGIO I Y II	LUIS EDUARDO CESPEDES PEDRAZA	01/02/2023
7	MVAL_03508	KR 9C ESTE 107 87 SUR	EL REFUGIO I Y II	ANA SILVIA TORRES BECERRA	01/02/2023
8	MV_01435	KR 7 BIS A ESTE 102 37 SUR	NUEVO PORVENIR	NELLY FANDIÑO DIAZ	02/02/2023
9	MVAL_03616	KR 10 ESTE 107 60 SUR	EL REFUGIO I Y II	MARIANA ROCIO QUEMBA RUIZ	03/02/2023
10	MVAL_03697	CL 108 SUR 9C 28 ESTE MJ	EL REFUGIO I Y II	YADIRA SANCHEZ	03/02/2023
11	MVAL_03778	KR 9B ESTE 108 18 SUR	EL REFUGIO I Y II	DILSA YASMIN BERNAL MAHECHA	03/02/2023
12	MVAL_03788	KR 9A ESTE 108 42 SUR	EL REFUGIO I Y II	OVIDIO PRIETO YATE	03/02/2023
13	MV_00364	DG 98 BIS SUR 7C 46 ESTE	EL NUEVO PORTAL	LUZ MIRYAN ARGUELLO	03/02/2023
14	MVAL_03418	KR 9A ESTE 107 42 SUR	EL REFUGIO I Y II	MARIA ISABEL DIAZ HERNANDEZ	03/02/2023
15	MV_02780	CL 109 SUR 8F 23 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	WILLIAM ALDANA BARBOSA	07/02/2023
16	MV_02852	CL 110 SUR 9-49 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	GUILLERMO MORA ARDILA	07/02/2023

17	MV_02788	CL 110 SUR 9-56 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	NURI ANDREA QUINCHE MORA	07/02/2023
18	MV_02756	CL 111 SUR 10-03 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	DEIBY ALEXANDER RODRIGUEZ	07/02/2023
19	MV-02757	CL 111 SUR 10-25 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	GUILLERMO LEON SORIA	07/02/2023
20	MV-02752	CL 111 SUR 10-20 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	EVIDALIA RUIZ	07/02/2023
21	MV_02758	CL 111A SUR 10-31 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	NOHORA INES SERRANO CRIALES	07/02/2023
22	MV_01514	KR 7 ESTE 104 58 SUR	NUEVO PORVENIR	ANA JULIA GUTIERREZ DURAN	09/02/2023
23	MV-02712	CL 109 SUR 8F 14 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	MANUEL FAURICIO RUBIANO LOPEZ	09/02/2023
24	MV_02765	CL 110 SUR 8D 64 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	NELLY VELASQUEZ RAMIREZ	09/02/2023
25	MV_02797	KR 9 ESTE 109 04 SUR	EL PORTAL DEL DIVINO	MARY BEL PEDRAZA CASTELLANOS	09/02/2023
26	MV_02784	KR 9 ESTE 109 05 SUR	EL PORTAL DEL DIVINO	JUAN JESUS SILVIO CHICAIZA	09/02/2023
27	MV_02795	KR 9 ESTE 109 16 SUR	EL PORTAL DEL DIVINO	NANCY VALBUENA CHICANGANA	09/02/2023
28	MVAL_03737	KR 10A ESTE 108 18 SUR	EL REFUGIO I Y II	SALOMON VARGAS CASTRO	14/02/2023
29	MVAL_03751	KR 10A ESTE 108 23 SUR	EL REFUGIO I Y II	BERTHA SILVIA MORA BARAJAS	14/02/2023
30	MVAL_03777	KR 9B ESTE 108 32 SUR	EL REFUGIO I Y II	CLAUDIA PATRICIA GAMA HERNANDEZ	14/02/2023
31	MVAL_03651	KR 10C ESTE 107 15 SUR	EL REFUGIO I Y II	CONCEPCION PRIETO BELTRAN DE CLAVIJO	14/02/2023
32	MVAL_03802	KR 9B ESTE 108 47 SUR	EL REFUGIO I Y II	ADRIANA FERNANDA LARA PRIETO	14/02/2023
33	MVAL_03652	KR 10C ESTE 107 21 SUR	EL REFUGIO I Y II	MAURICIO RIVERA GAMA	14/02/2023
34	MV_02742	CL 109 SUR 10 19 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	CRISTOBAL GALINDO RUBIO	14/02/2023
35	MV_02721	CL 109 SUR 9 82 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	LUIS HUMBERTO ANGEL MENDEZ	14/02/2023

36	MV_02718	CL 109 SUR 9 96 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	ANA MARISOL AGUIRRE MENDIETA	14/02/2023
37	MV_02826	CL 110 SUR 8D 09 ESTE MJ	EL PORTAL DEL DIVINO	JOSE MARTIN MARTINEZ VALIENTE	14/02/2023
38	MVAL_03756	KR 10 ESTE 108 33 SUR MJ 2	EL REFUGIO I Y II	JHON JAIRO GOMEZ BELTRAN	23-02-2023
39	MVAL_03513	CLL 107B SUR 9C 12 ESTE	EL REFUGIO I Y II	CESAR ENRIQUE MONROYLEON	23-02-2023
40	MV_00310	DG 98B SUR 6F 59 ESTE	EL REFUGIO I Y II	LUIS ALBERTO ALVARADO SANDOVAL	23-02-2023
41	MVAL_03763	KR 9C ESTE 108 20 SUR	EL REFUGIO I Y II	GONZALO CARDENAS AVILA	23-02-2023
42	MVAL_03530	CL 107 SUR 9C 17 ESTE	EL REFUGIO I Y II	BLANCA MYRIAM GALINDO PEREZ	24/02/2023
43	MVAL_03614	KR 10 ESTE 107 72 SUR	EL REFUGIO I Y II	YERSON SAMIR GARCIA GAITAN	24/02/2023
44	MVAL_03714	CL 107B SUR 9A 11 ESTE	EL REFUGIO I Y II	CARLOS ARTURO TELLEZ	24/02/2023
45	MVAL_03684	CL 108 SUR 10 10 ESTE	EL REFUGIO I Y II	JOSÉ DAVID SUAREZ PÉREZ	24/02/2023
46	MVAL_03628	KR 10A ESTE 107 35 SUR	EL REFUGIO I Y II	INGRID ALEJANDRA VERGARA NIÑO	24/02/2023
47	MV_02873	CL 111 A SUR 8C 40 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	DIOSELINA ARIAS SANCHEZ	28/02/2023
48	MVAL_02900	CL 111 A SUR 9 82 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	CARLOS ALBERTO GOMEZ BELTRA	28/02/2023
49	MV_02902	CL 111 A SUR 9 72 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	OSCAR ERNESTO BERNAL CORTES	28/02/2023
50	MV_02725	CL 109 SUR 9 62 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	CECILIO DUCUARA TAPIA	28/02/2023

3.3.3. APERTURAS

Para el presente periodo, se adelantaron 44 aperturas que se realizaron de la siguiente manera, descritas a continuación:

Tabla 5. Aperturas de las viviendas

N°	ID_DMV	DIRECCIÓN	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA INICIO DE OBRAS
1	MVAL_00005	DG 100 C SUR 6 F-36 ESTE	EL TRIANGULO	MARIA NOHEMA BURGOS ESPEJO	01/02/2023
2	MV_00071	DG 100C SUR 6 25 ESTE	EL TRIANGULO	LUIS ALFREDO GONZALEZ MORENO	01/02/2023
3	MVAL_00011	DG 100C SUR 6F 04 ESTE	EL TRIANGULO	LEIDY JOHANA VELASQUES ANGULO	01/02/2023
4	MV_00082	DG 100 C SUR 6 B 18 ESTE	EL TRIANGULO	DORA LIBIA MORENO GONZALEZ	02/02/2023
5	MVAL_00064	DG 100C SUR 6B-25 ESTE	EL TRIANGULO	ALBA MARIA REMISSIO	03/02/2023
6	MV_01368	KR 7A ESTE 100B 31 SUR	NUEVO PORVENIR	JOSE ABUNDIO GONZALEZ BUSTOS	03/02/2023
7	MV_01573	KR 7 ESTE 104 27 SUR	NUEVO PORVENIR	MARÍA DE JESÚS BARRERA ESPINOSA	03/02/2023
8	MV_01560	KR 6F ESTE 104 24 SUR	NUEVO PORVENIR	JULIO ROBERTO BALLEN BALLEN	03/02/2023
9	MV_01359	KR 7 BIS A ESTE 100B 12 SUR	NUEVO PORVENIR	GERARDO ESCARRAGA OLIVARES	03/02/2023
10	MV_00068	AAA0146ZLNX	EL TRIANGULO	JESUS ALFREDO VASQUEZ	06/02/2023
11	MV_00102	DG 100C SUR 6 16 ESTE	EL TRIANGULO	LUZ MIRYAM CABRA GALEANO	08/02/2023
12	MVAL_00085	DG 100 C SUR 6B 10 ESTE	EL TRIANGULO	MARIA LUISA CORTES TIBATA	10/02/2023
13	MV_00062	DG 100 C SUR 6B 19 ESTE	EL TRIANGULO	LUZ MARINA CASTILLO	10/02/2023
14	MV_14683	DG 100 D SUR 6B 12 ESTE	EL TRIANGULO	HERNANDO REMISSIO	10/02/2023
15	MV_00076	DG 100 C SUR 6-43 ESTE	EL TRIANGULO	HILDA RUBY MORENO	13/02/2023
16	MV_00075	DG 100 C SUR 6 37 ESTE	EL TRIANGULO	BLANCA CECILIA CHAPARRO	13/02/2023

17	MV_00060	DG 100 C SUR 6B 07 ESTE	EL TRIANGULO	HECTOR ALIRIO BOHORQUEZ	13/02/2023
18	MV_1427	CL 102 SUR 7 35 ESTE	NUEVO PORVENIR	CEBELINDA GARCIA CORONADO	14/02/2021
19	MV_1201	KR 7 BIS A ESTE 99 29 SUR	NUEVO PORVENIR	YINA MARCELA MIRANDA TORRES	14/02/2021
20	MV_1435	KR 7 BIS A ESTE 102 37 SUR	NUEVO PORVENIR	NELLY FANDIÑO DIAZ	14/02/2023
21	MV_01513	KR 7 ESTE 104 64 SUR	NUEVO PORVENIR	EDELMIRA PULIDO MORENO	14/02/2023
22	MV_00069	DG 100 D SUR 6-22 ESTE	EL TRIANGULO	MARIA CLEMENCIA CORTES GUEVARA	14/02/2023
23	MV_1589	CL 105 SUR 7 09 ESTE	NUEVO PORVENIR	JOSE DAVID AGUDELO CASTRO	15/02/2023
24	MV_01518	KR 7 ESTE 104 48 SUR	NUEVO PORVENIR	ROSA DELIA LOPEZZ TORRES	16/02/2023
25	MV_00066	DG 100 D SUR 6 40 ESTE	EL TRIANGULO	OSCAR AGUDELO ROA	16/02/2023
26	MV_1512	KR 7 ESTE 104-68 SUR	NUEVO PORVENIR	WILLIAN EDUARDO GONZALEZ	16/02/2023
27	MV_01271	KR 7 A ESTE 100 B 58 SUR	NUEVO PORVENIR	LUZ STELLA PEÑA VALENCIA	16/02/2023
28	MV_1374	KR 7 A ESTE 100 B 55 SUR	NUEVO PORVENIR	NORA ELIZABETH VACCA ARIAS	16/02/2023
29	MV_01266	KR 7 A ESTE 100 B 30 SUR	NUEVO PORVENIR	VICTOR MANUEL BAQUERO ROJAS	17/02/2023
30	MV_0026	CL 102 SUR 7 44 ESTE	NUEVO PORVENIR	ANA VERONICA SALCEDO MELO	21/02/2023
31	MV_01420	CL 104 SUR 7 36 ESTE	NUEVO PORVENIR	MARIA INES CORREA VALENCIA	21/02/2023
32	MV_0021	DG 100B SUR 7 07 ESTE	NUEVO PORVENIR	SHIRLEY VALENCIA COLLAZOS	21/02/2023
33	MV_01265	KR 7AESTE100B 26 SUR	NUEVO PORNENIR	MARIA JASMIN ROJAS ROJAS	21/02/2023
34	MV_01270	KR 7AESTE100B 52 SUR	NUEVO PORVENIR	ROSENDA MACIAS DE CARO	21/02/2023
35	MV_02875	CL 111A SUR 8C 18 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	LUIS CARLOS PERDOMO SILVA	21/02/2023

36	MV_01367	KR 7A ESTE 100B 27 SUR	NUEVO PORVENIR	SANDRA MILENA MERA QUICENO	21/02/2023
37	MV_00106	KR 6 ESTE 100B 04 SUR	NUEVO PORVENIR	DEMOFILO CRISTIANO FERNÁNDEZ	21/02/2023
38	MV_02848	CL 110 SUR 9 21 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	SILDANA SANCHEZ SAAVEDRA	23/02/2023
39	MV_02864	CL 111A SUR 8C 82 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	RAFAEL EDUARDO VEGA MENDOZA	23/02/2023
40	MV_1426	KR 7 BIS ESTE 102 08 SUR	NUEVO PORVENIR	MARIA EDILMA DUEÑAS PERALTA	24/02/2023
41	MV_01425	KR 7 BIS ESTE 102 18 SUR	NUEVO PORVENIR	HERNANDO CANIZALEZ LOPEZ	24/02/2023
42	MVAL_00364	DG 98 BIS SUR 7C 46 ESTE	EL NUEVO PORTAL	LUZ MIRYAM ARGUELLO	24/02/2023
43	MV_01268	KR 7AESTE100B 44 SUR	NUEVO PORNENIR	ANGELA PAOLA BERMUDEZ NOVOA	27/02/2023
44	MV_01175	DG 100 A SUR 6F 13 ESTE MJ	NUEVO PORVENIR	ROSA DELIZ CAVIDES CALDERON	28/02/20233

3.3.4. ENTREGAS

Para el presente periodo, se adelantaron 57 entregas que se realizaron de la siguiente manera, descritas a continuación:

Tabla 6. Entregas de las viviendas

Nº	**ID_DMV**	**DIRECCION**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA ENTREGA DE OBRAS**
1	MV_00001	CL 101 SUR 6F-09 ESTE	EL TRIANGULO	BLANCA CECILICA CONTRERAS	02/02/2023
2	MV_01196	DG 99 SUR 7 11 ESTE	NUEVO PORVENIR	MARINA MANRIQUE MARQUEZ	02/02/2023
3	MV_01430	KR 7 BIS A ESTE 102 23 SUR	NUEVO PORVENIR	MARIA RESURRECCIÓN DIAZ DE FANDIÑO	02/02/2023
4	MV_1433	KR 7 BIS A ESTE 102 31 SUR	NUEVO PORVENIR	KELLY YOHANA LOPEZ ROMERO	02/02/2023
5	MV_1234	KR 7 A ESTE 99 03 SUR	NUEVO PORVENIR	MARIA SACRAMENTO PUENTES	02/02/2023

6	MV_1343	CL 104 SUR 7 70 ESTE	NUEVO PORVENIR	YOLANDA RUIZ CARRILLO	03/02/2023
7	MV_01400	KR 7 ESTE 102-25 SUR	NUEVO PORVENIR	ARGENIS MOSQUERA ROBAYO	03/02/2023
8	MVAL_01563	KR 6 F ESTE 104-04 SUR	NUEVO PORVENIR	ANA LUCIA ARIAS SANTIBAÑEZ	03/02/2023
9	MV_01366	KR 7A ESTE 100B 21 SUR	NUEVO PORVENIR	JESÚS ANTONIO ROJAS	03/02/2023
10	MV_01570	KR 7 ESTE 104 13 SUR	NUEVO PORVENIR	SARA MEDINA VARGAS	03/02/2023
11	MV_01428	AAA0146ROMS	NUEVO PORVENIR	MARIA MAGDALENA HERNANDEZ DIAZ	06/02/2023
12	MV_00046	DG 101 SUR 6 A 41 ESTE	EL TRIANGULO	LUZ ASTRID CRUZ DUARTE	07/02/2023
13	MVAL_00091	DG 100C SUR 6A 04 ESTE	EL TRIANGULO	DIANA YANET SUESCA GOMEZ	07/02/2023
14	MVAL_01247	KR 7A ESTE 99 64 SUR	NUEVO PORVENIR	MARISOL PATIÑO	08/02/2023
15	MV_00004	CL 101 SUR 6F 21 ESTE	EL TRIANGULO	JORGE HERNANDO CABRA GALEANO	08/02/2023
16	MV_0025	DG 100B SUR 7 23 ESTE	NUEVO PORVENIR	MARIA HELENA REYES BEJARANO	09/02/2023
17	MV_00420	DG 98B SUR 7C 16 ESTE	EL NUEVO PORTAL	ALVARO ANTONIO URREGO ROMERO	09/02/2023
18	MV_1236	KR 7A ESTE 99 15 SUR	NUEVO PORVENIR	ROSALVINA URIBE	09/02/2023
19	MV_1141	DG 100B SUR 6 18 ESTE	NUEVO PORVENIR	HERNAN D O GONZÁLEZ MONCADA	09/02/2023
20	MV_0109	DG 100B SUR 6 19 ESTE	NUEVO PORVENIR	GEDUAR ORLANDO HORMAZA	10/02/2023
21	MV_0115	DG 100B SUR 6 47 ESTE	NUEVO PORVENIR	MARÍA ALCIRA PRIETO BUITRAGO	10/02/2023
22	MV_01530	KR 7 ESTE 104 06 SUR	NUEVO PORVENIR	WILBER CANO RAMOS	10/02/2023
23	MV_01526	KR 7 ESTE 104 20 SUR MJ	NUEVO PORVENIR	JUDID ZAMORA	10/02/2023
24	MV_00005	DG 100 C SUR 6F 36 ESTE	EL TRIANGULO	MARIA NOHEMA BURGOS ESPEJO	10/02/2023

25	MV_1213	DG 100B SUR 7 36 ESTE	NUEVO PORVENIR	HECTOR JULIO ALFONSO BOHORQUEZ	13/02/2023
26	MV_01557	KR 6F ESTE 104 32 SUR	NUEVO PORVENIR	DIEGO GIRALDO POSADA	13/02/2023
27	MV_1180	DG 100B SUR 7 16 ESTE	NUEVO PORVENIR	JOSE ANTONIO FLOREZ SUSA	14/02/2023
28	MV_1103	DG 99 SUR 6 67 ESTE	NUEVO PORVENIR	SOCORRO OJEDA MEJIA	14/02/2023
29	MV_1095	DG 99 SUR 6 33 ESTE	NUEVO PORVENIR	MARIA LIBIA BELTRAN QUINTERO	15/02/2023
30	MV_1359	KR 7 BIS A ESTE 100B 12 SUR	NUEVO PORVENIR	GERARDO ESCARRA GA OLIVARES	15/02/2023
31	MV_1136	DG 100B SUR 6 38 ESTE	NUEVO PORVENIR	OLGA PINEDA BUSTAMANTE	15/02/2023
32	MVAL_00011	DG 100 C SUR 6 F 04 ESTE	EL TRIANGULO	LEIDY JOHANNA VELASQUEZ ANGULO	15/02/2023
33	MV_00038	CL 101 SUR 6A 15 ESTE	EL TRIANGULO	ANA MERCEDES GOMEZ HERNANDEZ	15/02/2023
34	MV_01215	DG 100B SUR 7 32 ESTE	NUEVO PORVENIR	NANCY STELLA RODRIGUEZ GARCIA	16/02/2023
35	MV_01573	KR 7 ESTE 104 27 SUR	NUEVO PORVENIR	MARÍA DE JESÚS BARRERA ESPINOSA	16/02/2023
36	MV_01368	KR 7A ESTE 100B 31 SUR	NUEVO PORVENIR	JOSÉ ABUNDIO GONZÁLEZ BUSTOS	16/02/2023
37	MV_1032	DG 99 SUR 6 64 ESTE MJ	NUEVO PORVENIR	ARGENIS RODRIGUEZ	17/02/2023
38	MV_00002	CL 101 SUR 6F 15 ESTE	EL TRIANGULO	LUIS SENEN CASTAÑEDA	17/02/2023
39	MV_01566	CL 104 SUR 6F 09 ESTE	NUEVO PORVENIR	MARTHA CECILIA GIL BERNAL	18/02/2023
40	MV_00009	DG 100C SUR 6F-16ESTE	EL TRIANGULO	LUZ MARINA ALONSO HERNANDEZ	22/02/2023
41	MV_00098	DG 100C SUR 6 30 ESTE	EL TRIANGULO	MARCO FIDEL BARRERO NIÑO	22/02/2023
42	MV_00092	DG 100C SUR 6 54 ESTE	EL TRIANGULO	ORFELINA VARGAS QUINTERO	22/02/2023

43	MV_00069	DG 100 D SUR 6-22 ESTE	EL TRIANGULO	MARIA CLEMENCIA CORTES GUEVARA	23/02/2023
44	MV_00075	DG 100C SUR 6-37ESTE	EL TRIANGULO	BLANCA CECILIA CHAPARRO PATIÑO	23/02/2023
45	MV_00066	DG 100 DSUR 6 40 ESTE	EL TRIANGULO	OSCAR AGUDELO ROA	23/02/2023
46	MV_00102	DG 100C SUR 6 16 ESTE	EL TRIANGULO	LUZ MIRYAM CABRA GALEANO	23/02/2023
47	MV_1427	CL 102 SUR 7 35 ESTE	NUEVO PORVENIR	CEBELINDA GARCIA CORONADO	24/02/2023
48	MV_00076	CL 101 SUR 6F 15 ESTE	EL TRIANGULO	HILDA RUBY MORENO	24/02/2023
49	MV_14683	DG 100 DSUR 6B 12 ESTE	EL TRIANGULO	HERNANDO REMICIO	24/02/2023
50	MV_01513	KR 7 ESTE 104 64 SUR	NUEVO PORVENIR	EDELMIRA PULIDO MORENO	24/02/2023
51	MV_1589	CL 105 SUR 7 09 ESTE	NUEVO PORVENIR	JOSE DAVID AGUDELO CASTRO	24/02/2023
52	MV_1435	KR 7 BIS A ESTE 102 37 SUR	NUEVO PORVENIR	NELLY FANDIÑO DIAZ	24/02/2023
53	MV_00329	DG 98C SUR 6F 22 ESTE MJ	NUEVO PORVENIR	NELLY ESPERANZA LEGUIZAMON GUTIERREZ	24/02/2023
54	MV_00068	DG 100D SUR 6 26 ESTE	EL TRIANGULO	JESUS ALFREDO VASQUEZ	27/02/2023
55	MVAL_00085	DG 100C SUR 6B-10 ESTE	EL TRIANGULO	MARIA LUISA CORTES TIBATA	28/02/2023
56	MV_00071	DG 100C SUR 6 25 ESTE	EL TRIANGULO	LUIS ALFREDO GONZALEZ MORENO	28/02/2023
57	MV_01560	KR 6F ESTE 104 24 SUR	NUEVO PORVENIR	JULIO ROBERTO BALLEN BALLEN	28/02/2023

4. CIERRE DE CORTE NO. 4

Durante este mes se presentó el tercer corte, donde se presentaron un total de 41 viviendas correspondientes a:

Tabla 7. Cierre de corte No. 4

MV	BENEFICIARIO	COSTO DIRECTO	COSTO AIU	COSTO TOTAL
MVAL_01563	ANA LUCIA ARIAS SANTIBAÑEZ	$ 14.399.798,31	$ 3.599.949,58	$ 17.999.747,89
MV_1391	JOSE LISANDRO MENDIVELSO ROMERO	$ 14.399.903,00	$ 3.599.975,75	$ 17.999.878,75
MV_01400	ARGENIS MOSQUERA ROBAYO	$ 14.397.289,94	$ 3.599.322,49	$ 17.996.612,43
MV_00038	MARIA GEORGINA LEMUS DE CHAPARRO	$ 14.240.316,17	$ 3.560.079,04	$ 17.800.395,21
MV_00001	BLANCA CECILIA CONTRERAS DE GORDO	$ 14.398.451,74	$ 3.599.612,94	$ 17.998.064,68
MVAL_00005	MARIA NOHEMA BURGOS ESPEJO	$ 14.399.999,68	$ 3.599.999,92	$ 17.999.999,60
MVAL_00004	JORGE HERNANDO CABRA GALEANO	$ 14.370.269,83	$ 3.592.567,46	$ 17.962.837,29
MV_00046	LUZ ASTRID CRUZ DUARTE	$ 14.399.416,80	$ 3.599.854,20	$ 17.999.271,00
MV_01244	MARIA INES CABALLERO PUENTES	$ 14.400.000,00	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00
MV_01363	OMAR MAYUSA CATAÑEDA	$ 14.400.000,00	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00
MV_01366	JESUS ANTONIO ROJAS	$ 14.398.023,18	$ 3.599.505,80	$ 17.997.528,98
MVAL_01257	NELSON FACUNDO DIAZ TORRES	$ 14.399.797,63	$ 3.599.949,41	$ 17.999.747,04
MV_01570	SARA MEDINA VARGAS	$ 14.400.000,00	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00
MV_01557	DIEGO GIRALDO POSADA	$ 14.400.000,00	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00
MV_01247	MARISOL PATIÑO PINTO	$ 14.400.000,00	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00
MV_1141	HERNANDO GONZALEZ MONCADA	$ 14.400.000,00	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00
MV_1236	ROSALVINA URIBE	$ 14.400.000,00	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00
MV_0109	GEDUAR ORLANDO HORMAZA	$ 14.393.236,93	$ 3.598.309,23	$ 17.991.546,16
MV_01526	JUDID ZAMORA CALVERA	$ 14.400.000,00	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00
MV_00367	MARIA ELVIA PARRA	$ 14.375.154,39	$ 3.593.788,60	$ 17.968.942,99
MV_00158	MARIA HILDA CASTAÑO FERNANDEZ	$ 14.397.674,33	$ 3.599.418,58	$ 17.997.092,91
MV_1109	ANA MARIA ARIZA MARTIN	$ 14.370.325,92	$ 3.592.581,48	$ 17.962.907,40
MV_1020	BLANCA MARINA SILVA SORACA	$ 14.387.262,56	$ 3.596.815,64	$ 17.984.078,20
MV_01191	ROSA MARIA LESMES	$ 14.398.009,17	$ 3.599.502,29	$ 17.997.511,46
MV_01192	ALBA LUCIA SANTAMARIA MENDOZA	$ 14.399.998,57	$ 3.599.999,64	$ 17.999.998,21
MV_01196	MARINA MANRIQUE MARQUEZ	$ 14.374.775,96	$ 3.593.693,99	$ 17.968.469,95
MV_1200	SANDRA MILENA VARGAS CARRILLO	$ 14.399.270,96	$ 3.599.817,74	$ 17.999.088,70
MV_1343	YOLANDA RUIZ CARRILLO	$ 14.362.361,65	$ 3.590.590,41	$ 17.952.952,06
MV_1344	IRMA ADELA TORRES TIQUE	$ 14.383.785,75	$ 3.595.946,44	$ 17.979.732,19
MV_1433	KELLY YOHANA LOPEZ ROMERO	$ 14.387.757,88	$ 3.596.939,47	$ 17.984.697,35
MV_01430	MARIA RESURRECCIÓN DIAZ DE FANDIÑO	$ 14.399.208,68	$ 3.599.802,17	$ 17.999.010,85
MV_01428	MARIA MAGDALENA HERNANDEZ DIAZ	$ 14.349.850,29	$ 3.587.462,57	$ 17.937.312,86
MVAL_00091	DIANA YANET SUESCA GOMEZ	$ 14.211.472,24	$ 3.552.868,06	$ 17.764.340,30
MVAL_0149	TITO RAFAEL NUÑEZ CHAPARRO	$ 14.400.000,00	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00
MV_1220	MARTA ISABEL GARCIA	$ 14.357.466,58	$ 3.589.366,65	$ 17.946.833,23

MV_1234	MARIA SACRAMENTO PUENTES	$ 14.299.294,70	$ 3.574.823,68	$ 17.874.118,38
MV_01223	MARIA OTILIA CORTES	$ 14.400.000,00	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00
MV_1228	LUZ FABIOLA RAMIREZ MANRIQUE	$ 14.273.923,82	$ 3.568.480,96	$ 17.842.404,78
MV_1230	MARLENE PUERTA LOPEZ	$ 14.314.437,70	$ 3.578.609,43	$ 17.893.047,13
MV_0028	ELIZABETH ARBOLEDA PINZON	$ 14.389.009,38	$ 3.597.252,35	$ 17.986.261,73
MV_1423	DIANA CAROLINA RONCANCIO VALDES	$ 14.308.162,55	$ 3.577.040,64	$ 17.885.203,19

CANALES DE COMUNICACIÓN:

CONTRATISTA DE OBRA:
Correo electrónico: habitatgrupo1.lp0132022@gmail.com

INTERVENTORIA:
Correo electrónico: consorciointervivienda22@gmail.com

5. PROGRAMACIÓN (PROJECT)

Se presenta programación de obra con ADICION Y PRORROGA NO. 1 como Anexo No.

6.SUPERVISONES TÉCNICAS

Para asegurarse que los materiales utilizados en la obra sean de la calidad especificada, deben realizarse los ensayos correspondientes sobre muestras representativas de los materiales de la construcción. De acuerdo al artículo 19 de la ley 400 de 1997 siendo responsabilidad del constructor realizar y documentar los controles de calidad de los materiales que exige el Reglamento, para edificaciones que tengan menos de tres mil (3.000) metros cuadrados de área construida, independientemente de su uso.

En cuanto a los materiales utilizados en obra como el hierro utilizado únicamente en mesones y en algunas partes donde se deba construir placa, se remitirá la ficha técnica a interventoría, donde se demuestre el cumplimiento de la norma NTC 2289. En los trabajos e instalaciones del sistema hidráulico y sanitario, se ceñirán a las normas respectivas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá y al código colombiano de Fontanería NTC 1500.

El 05 de abril del 2022 por medio del oficio RUR-013-2022 se remitieron los respectivos certificados y fichas técnicas de calidad de los materiales a utilizar en la ejecución de las viviendas a la interventoría, para su revisión y aprobación correspondiente.

7.CONCLUSIONES

- Se realización 50 validaciones, 44 aperturas y 57 entregas en este periodo.
- Se caracterizaron varios tipos de problemáticas en algunas viviendas, para las cuales se plantea la solución acorde a la necesidad del beneficiario.
- Se evidencia en varias viviendas la necesidad del cambio de cubierta para mejorar las condiciones de habitabilidad, las cuales deben tener un manejo especial en las actividades de desmonte y disposición final del material de cubierta existente, principalmente asbesto cemento.
- Se prioriza el mejoramiento en baños, cocina, zona de ropas, este incluye para cada uno de estos sitios enchapes de pared y de piso con sus respectivos combos sanitarios. Para la parte de habitabilidad se tendrá en cuenta enchapes de piso, pañetes, estuco y pinturas, remates en cielo raso en PVC.
- Las áreas a intervenir deben quedar terminadas, empezando por baños, cocinas, zona de ropas, y continuando con el área de alcobas, de llegar a sobrar presupuesto se tendrán en cuentas las áreas faltantes.

8.REGISTRO FOTOGRAFICO.

	
Actividad: Validación Nelly Fandiño MV_01435 Fecha:02/02/2023	Actividad: Validación Adición Mariana Rocio Quemba MVAL_03616 Fecha:03/02/2023

	
Actividad: Validación Adición Ovidio Prieto Yate MVAL_03788 Fecha:03/02/2023	Actividad: Validación Adición Yadira SanchezMVAL_03697 Fecha:03/02/2023
	
Actividad: Validación MV_0278 Beneficiario: William Aldana Barbosa Fecha:07-02-2023	Actividad: Validación MV_02852 Beneficiaria: Guillermo Mora ArdilaFecha: 07/02//2023
	
Actividad: Validación MV_02757 Beneficiario: Guillermo León Soria NaglesFecha: 07/02/2023	Actividad: Validación MV_02752 Beneficiario: Evidalia Ruiz Fecha: 07/02/2023
	
Actividad: Validación MV_02797Beneficiario: Mary	Actividad: Apertura de obra

Bel Pedraza Fecha: 09/02/2023	Beneficiario: María de Jesús Barrera MV_01573 Fecha: 3 de febrero de 2023
	
Jesús Alfredo Vasquez MV_00068 Fecha: 06/02/2023	Actividad: Apertura Luz Mirin Cabra MV_00102 Fecha: 08/02/2023
	
Actividad: Apertura de obra MV_14683Beneficiario: Hernando Remeció Fecha:10/02/2023	Actividad: Apertura Rosa Delia Lopez Torres MV_01518 Fecha16/02/2023
	
Actividad: Apertura de Obra William Eduardo González MV_1512 Fecha: 16/02/2023	Actividad: Apertura de obra MV_01271Beneficiario: Luz Stella Peña Valencia Fecha: 16/02/2023

	
Actividad: Apertura Luis Carlos Perdomo MV_002875 Fecha 21/02/2023	Actividad: Apertura de obra MV_0026 Ana Veronica SalcedoFecha:21/02/2023
	
Actividad: Seguimiento de obra Beneficiario: Jesús Antonio Rojas MV_01366 Fecha: 1 de febrero de 2023	Actividad: Seguimiento de obra Beneficiario: Rosalbina Uribe Mv_1236 Fecha: 1 de febrero de 2023
	
Actividad: Seguimiento Marco Fidel Barrero Niño MV_00098 Fecha: 01/02/2023	Actividad: Seguimiento de obra MVAL_00040 Beneficiario: Ana Mercedes Gómez Fecha:01/02/2023

	
Actividad: Seguimiento de obra MV_00009 Beneficiario: Luz Marina Alonso Hernández Fecha:02/02/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_1180 José Antonio Flores Fecha:06/02/2023
	
Actividad: Seguimiento de obra MV_00004 Beneficiario: Jorge Hernando CabraFecha: 02/02/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_1180 José Antonio Flores Fecha:06/02/2023
	
Actividad: Seguimiento de obra MV_0025 María Helena Reyes Fecha:06/02/2023	Actividad: Seguimiento de Obra Beneficiario: Rosalbina Uribe Mv_1236Fecha: 06 de febrero de 2023

	
Actividad: Seguimiento de obra Beneficiario: José Abundio González MV_01368 Fecha: 06 de febrero de 2023	Actividad: Seguimiento de Obra Beneficiario: Marisol Patiño MV_01247 Fecha: 06 de febrero de 2023
	
Actividad: Seguimiento de obra Beneficiario: Olga Pineda Bustamante MV_1136 Fecha: 06 de febrero de 2023	Actividad: Seguimiento de obra Beneficiario: Geduar Orlando Hormaza Mv_0109 Fecha: 06 de febrero de 2023
	
Actividad: seguimiento de obra Beneficiario: Nancy Stella Rodríguez MV_01215 Fecha: 08 de febrero de 2023	Actividad: SSeguimiento de obra Beneficiario: María de Jesús Barrera MV_01573 Fecha: 9 de febrero de 2023



Actividad: Seguimiento de obra
Beneficiario: Wilber Cano Ramos MV_01530Fecha: 08 de febrero de 2023



Actividad: Seguimiento de obra
Beneficiario: Julio Roberto Ballen Ballen Mv_01560
Fecha: 9 de febrero de 2023



Actividad: Seguimiento
Orfelina Vargas MV_00092
Fecha:10/02/2023



Actividad: Seguimiento
Nelly Leguizamón MV_00329
Fecha:13/02/2023



Actividad: Seguimiento
Orfelina Vargas MV_00092
Fecha:13/02/2023



Actividad: Seguimiento de obra Beneficiario: Gerardo Escarraga MV_1359Fecha: 13 de febrero de 2023





Actividad: Seguimiento de obra MVAL-00011 Beneficiario: Leidy Johanna Velásquez Fecha:14/02/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV-14683 Beneficiario: Leidy Johanna Velásquez Fecha:14/02/2023
	
Actividad: Seguimiento de obra MVAL-00009 Beneficiario: Luz Marina Alonso Fecha:14/02/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV-00062 Beneficiario: Luz Marina Castillo Fecha:15/02/2023
	
Actividad: Seguimiento de obra MVAL-00085 Beneficiario: María Luisa Cortes Tibata Fecha:15/02/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_00075 Beneficiario: Blanca Cecilia Chaparro Fecha:15/02/2023
	
Actividad: Seguimiento de obra MV_1427 Cebelinda García Fecha:16/02/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_1201 Yina Marcela Miranda Fecha:16/02/2023
	

Actividad: Seguimiento de obra Beneficiario: Julio Roberto Ballen MV_01560 Fecha: 17 de febrero de 2023 KM	Actividad: Seguimiento de Obra MV_14683Beneficiario: Hernando Remicio Fecha: 20/02/2023
	
Actividad: Seguimiento de obra MV_00069 Beneficiario: María Clemencia Cortes Fecha: 20/02/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_00066Beneficiario: Oscar Agudelo Roa Fecha: 20/02/2023
	
Actividad: Seguimiento de obra MV_00075 Beneficiario: Blanca Cecilia Chaparro Patiño Fecha:20/02/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_01266 Beneficiario: Víctor Manuel Baquero Rojas Fecha: 21/02/2023
	
Actividad: Seguimiento de obra MV_01271 Beneficiario: Luz Stella Peña Valencia Fecha:21/02/2023	Actividad: Seguimiento Luis Alfredo Moreno MV_00071 Fecha; 22/02/2023

	
Actividad: Seguimiento Jesús Vasquez MV_00068 Fecha:22/02/2023	Actividad: Seguimiento Nelly Leguizamo MV_00329 Fecha:22/02/2023
	
Actividad: Seguimiento de obra MV_1201 Yina Marcela Miranda Fecha:22/02/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_1427 Cebelinda García Fecha:22/02/2023
	
Actividad: Seguimiento de obra MV_00064Beneficiario: Alba María Remisio Fecha: 23/02/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_00082 Beneficiario: Dora Libia Moreno González Fecha: 23/02/2023

	
Actividad: Entrega de obra MV_00001Beneficiario: Blanca Cecilia ContrerasFecha: 02-02-2023	Actividad: Entrega Marina Manrique Márquez MV_01196 Fecha:02/02/2023
	
Actividad: Entrega de obra Beneficiario: Hernando González Moncada MV_1141Fecha: 9 de febrero de 2023	Actividad: Entrega de obra Beneficiario: Rosalbina Uribe MV_1263Fecha: 9 de febrero de 2023
	
Actividad: Entrega de obra Beneficiario: Judid Zamora MV_01526Fecha: 10 de febrero de 2023	Actividad: Entrega de obra MV_00005Beneficiario: María Nohema Burgos Fecha:10/02/2023
	
Actividad: Entrega de mejoramiento de Vivienda	Actividad: Entrega de mejoramiento de

Beneficiario: Héctor Julio Alfonso Bohorquez MV_1213 Fecha: 13 de febrero de 2023	ViviendaBeneficiario: Diego Giraldo Posada MV_01557 Fecha: 13 de febrero de 2023
	
Actividad: Entrega de mejoramiento de Vivienda Beneficiario: Gerardo Escarraga MV_1359 Fecha: 15 de febrero de 2023	Actividad: Entrega de mejoramiento de ViviendaBeneficiario: Olga Pineda Bustamante MV_1136 Fecha: 15 de febrero de 2023
	
Actividad: Entrega de Mejoramiento de ObraAna Mercedes Gómez Hernández MV_0038Fecha: 15/02/2023	Actividad: Entrega de obra MV_00069 Beneficiario: María Clemencia Cortes GuevaraFecha: 23/02/2023
	
Actividad: Entrega de obra MV_00075Beneficiario: Blanca Cecilia Chaparro Fecha: 23/02/2023	Actividad: Entrega Luz Miriam Cabra MV_00102 Fecha:23/02/2023

	
Actividad: Entrega de obra MV_00076Beneficiario: Hilda Ruby Moreno Fecha: 24/02//2023	Actividad: Entrega José David Agudelo MV_01589 Fecha: 24/02/2023
	
Actividad: Entrega Jesús Alfredo Vasquez Fecha: 27/02/2023	Actividad: Entrega de obra MV_00085 Beneficiario: María Luisa Cortes TibataFecha: 28/02/2023
	
Actividad: Atención PQRS Beneficiario: Emeterio Herrera Suarez MV_01560 Fecha: 14 de febrero de 2023	Actividad: Entrega de Obra Beneficiario: Julio Roberto Ballen MV_01560 Fecha: 28/02/2023
