Municipio El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISION	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL
	CÓDIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	**12 de diciembre de 2023**
TIPO DE CONTRATO	**CONVENIO**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No. CONTRATO	180-CONV-117-2023
OBJETO	Aunar esfuerzos para ejecutar programas y procesos que amplíen las redes principales del sistema de acueducto, para mejorar la cobertura en la prestación del servicio en la vereda aguas claras del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
NOMBRE CONTRATISTA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO AGUAS CLARAS
FECHA DEL CONTRATO	13/09/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses
VALOR	$71.500.000,00
APORTE MUNICIPIO	$50.000.000,00
APORTE ACUEDUCTO	$21.500.000,00
FECHA INICIO	27/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2023
SUPERVISOR	Julián Esteban Pineda Quintero

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES)	3
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (MESES)	3
AVANCE PORCENTUAL	100,00%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$71.500.000,00
APORTE MUNICIPIO	$50.000.000,00
APORTE ACUEDUCTO	$21.500.000,00
VALOR CUENTA DE COBRO	$14.776.300,00
VALOR EJECUTADO	$50.000.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100,00%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Pago 1	1	Global	$35.223.700,00	$35.223.700,00	70,45%
Pago 2	1	Global	$14.776.300,00	$14.776.300,00	29,55%
TOTAL				$50.000.000,00	100,00%

GRAFICA

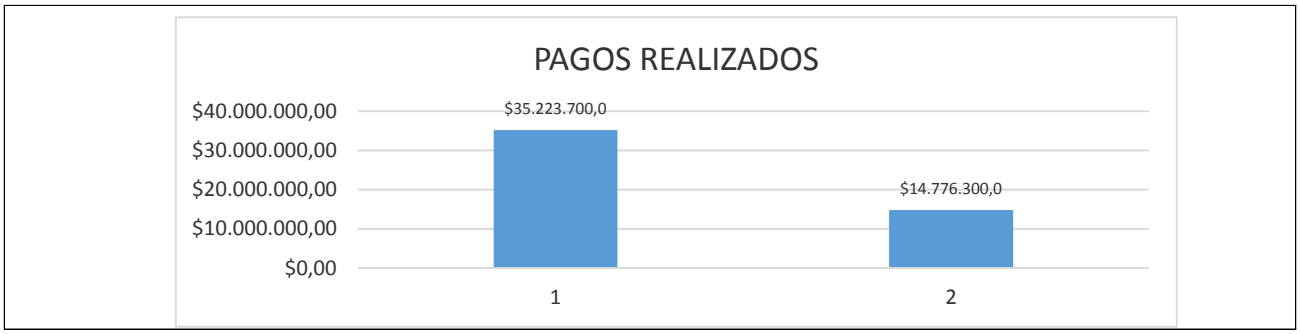

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Aseguradora Solidaria de Colombia	510-47-994000022439	19/09/2023	19/04/2024	$7.150.000,00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales mediante planialla de pago

REGISTRO FOTOGRAFICO

La evidencia fotografica reposa en el informe de actividades No. 2

OBSERVACIONES

La Asociación de Usuarios del Acueducto Aguas Claras, identificada con NIT 800.253.320-1, viene ejecutando el convenio de asociación No. 180-CONV-117-2023. Este informe se realiza de acuerdo al informe y acta de avance de obras No. 2 comprendido entre 4 y el 28 de noviembre de 2023 presentados por el contratista. El presente informe de supervisión se realiza con el fin de recomendar al ordenador del gasto aprobar el pago No. 2 del contrato en referencia.

Julián Pineda

FIRMA SUPERVISOR
