INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, MUNICIPIO DE ACACIAS
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Casco Urbano Municipio de Acacías Lote A Escuela Carabineros		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ACACIAS		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$13.986.033.119,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES	18/04/2023	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($12.575.546.216,00)		

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.410.386.903,00)
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N.A.

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Firma del convenio, incorporación de recursos al presupuesto, expedición de póliza por parte del Municipio	NO APLICA	29/12/2022	$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.100.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: La Previsora S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$1.398.603.312,00	07/08/2022	27/09/2024
	Calidad de servicio	N.A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 377 de 2023	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META	$ 12.575.546.216,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023, Nit 901699813-1, R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO C.C. No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta	

Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	24/MARZO/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 12.575.546.216,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**		
PÓLIZA No.	**CV-100032073 CV-100008254**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/MARZO/2023**		

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CV-100032073	Cumplimiento	$ 2.515.109.243,20	24/03/2023	24/09/2025
	Buen manejo del anticipo	$ 5.030.218.456,40	24/03/2023	24/09/2025
	Prestaciones sociales	$ 628.777.310,80	24/03/2023	24/03/2027
	Calidad del servicio	$ 1.257.554.621,60	24/03/2023	24/03/2027
	Estabilidad de la obra	$ 1.257.554.621,60	24/03/2023	24/03/2029
CV-100008254	Responsabilidad civil extra contractual	$ 628.777.310,00	24/03/2023	24/03/2024

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Estudios y Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: OCA-374-2023	Descripción del objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META		$1.410.386.903,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, Nit. 901696564-7 R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA, C.C. No. 1.094.921.302 expedida en Armenia		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

Fecha de terminación del contrato	24/MARZO/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$1.410.386.903,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**	
PÓLIZA No.	**CV-100031724 - CV-100008150**	
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/MARZO/2023**	

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CV-100031724	Cumplimiento	$ 282.077.380,60	24/03/2023	24/09/2024
	Prestaciones sociales	$ 70.519.345,15	24/03/2023	24/03/2027
	Calidad del servicio	$ 282.077.380,60	24/03/2023	24/09/2024
CV-100008150	Responsabilidad civil extra contractual	$ 232.000.000,00	24/03/2023	24/03/2024

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 31/08/2023	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE /2023:

- La secretaria de infraestructura se encuentra realizando la actualización del proyecto para la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal de los recursos adicionales, de acuerdo a la información presentada por el Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, como son el presupuesto detallado, análisis de precios unitarios, los cuales son soportados teniendo en cuenta la Resolución No. 392 de abril 21 del 2023 de la Alcaldía Municipal de Acacías, por medio de la cual se adoptan y actualizan los listados de precios de referencias para la contratación de obras civiles en el Municipio, establecidos por Resolución 100-37-088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. Así mismo, aquellos precios que no están contemplados dentro del listado se soportarán mediante estudio de mercado que a su vez se compone de 3 cotizaciones con precios del mercado.
-

- La ejecución de actividades contractuales para el periodo de tiempo comprendido entre el día 01 de octubre de 2023 y el día 31 de octubre de 2023, permiten evidenciar un avance del 100%, aproximadamente que representa un total ejecutado a la fecha de $662.923.252 del valor inicialmente contratado para la Etapa I – Estudios y Diseños.

- Los componentes y documentos por requerimientos a la consultoría del Contrato No. 377 de 2023, para viabilidad ante el convenio 1901-2022 Municipio de Acacias – Meta, se encuentran en espera al aval por parte del Ministerio del Interior, Dirección Administrativa y Financiera como Seguimiento de Proyectos de la Policía Nacional – DIRAF.

Avance del 100% por consultoría a los estudios y diseños, datos que se aprecian a las actividades iniciales que dentro de los entregables de consultoría se destacan en estatus de aprobado

FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONVENIO (ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA E INTERVENTORIA)	5.22%	5.22 %	94.78 %

COMPONENTE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
GIROS	$1.100.000.000,00
RENDIMIENTOS	$78.336,03
TOTAL	**$1.100.078.336,03**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Los contratos de obra e interventoria se encuentran adjudicados, y se firma acta de inicio el día 27 de abril de 2023.

La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, ha desarrollado un avance en el desarrollo del 100% para el proceso de consultoría

Las partes contractuales, se encuentran a la espera de que el proyecto sea verificado y aprobado por la Supervisión del Contrato y representantes del Ministerio del Interior, con el fin de iniciar las obras.

Se encuentran en página (Secop 2) los procesos contractuales derivados
Obra: OCA-LP-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015017&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Interventoría: OCA-CM-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

7. SUPERVISOR

MARGO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ Supervisor Convenio No. 1901 de 2022 Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacias	**VERÓNICA PATRICIA SÁNCHEZ MENESES** Elaboró - Apoyo a la supervisión Profesional especializado, Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacias

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META

INFORME FINANCIERO DE JULIO 2022 AL 31 OCTUBRE DE 2023

PROYECTO (S): **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACA**

CUENTA (CORRIENTE) No. 647-00178-3		DEL BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE
VALOR CONVENIO			**$ 13.986.033.119,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 13.986.033.119,00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO			$ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO			$ 0,00
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/12/2022	GIRO 1	$ 1.100.000.000,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.100.000.000,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-00178-3			**$ 1.100.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
374 de 2023	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	$ 1.410.386.903,00		$ 1.410.386.903,00
377 de 2023	CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023	$ 12.575.546.216,00		$ 12.575.546.216,00
TOTAL CONTRATADO				$ 13.985.933.119,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPART	VALOR DEL PAGO
374 de 2023	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias	2023002657	2023002882	13/09/2023	$ 397.813.951,00	$ 0,00	$ 0,00	328.441.951,00
377 de 2023	Estudios Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias.	2023002518	2023002731	6/09/2023	$ 662.923.252,00	$ 0,00	$ 0,00	543.985.252,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1.060.737.203,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 870.427.203,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2022	$ 904,11
31/01/2023	$ 9.342,47
28/02/2023	$ 8.438,36
31/03/2023	$ 9.342,77
30/04/2023	$ 9.041,40
31/05/2023	$ 9.342,78
30/06/2023	$ 9.041,40
31/07/2023	$ 9.343,09
31/08/2023	$ 9.343,09
30/09/2023	$ 3.705,96
31/10/2023	$ 490,60
TOTAL (3)	**$ 78.336,03**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 1.100.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 1.060.737.203,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 78.336,03
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 78.336,03
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	$ 39.341.133,03
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL)	$ 39.341.133,03

OBSERVACIONES

FIRMA

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorera Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco de Occidente

BO-20231107.240

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

SUCURSAL ACACÍAS

INFORMA

Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS**, identificado con NIT No. 892.001.457-3 es cuentahabiente en la Oficina Villavicencio Principal desde el día 27 de Julio de 2022 con la Cuenta Corriente No. **64700178-3** denominada *MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS META* la cual se encuentra inactiva y vigente.

Esta cuenta a generado los siguientes rendimientos financieros desde su apertura el 27 de Julio de 2022 hasta el 31 de octubre de 2023:

PERIODO		INTERESES LIQUIDADOS	
	2022	$	904,11
2023	ENERO	$	9.342,47
	FEBRERO	$	8.438,36
	MARZO	$	9.342,77
	ABRIL	$	9.041,40
	MAYO	$	9.342,78
	JUNIO	$	9.041,40
	JULIO	$	9.343,09
	AGOSTO	$	9.343,09
	SEPTIEMBRE	$	3.705,96
	OCTUBRE	$	490,60
TOTAL		**$**	**78.336,03**

Se expide en Acacías/Meta con destino a **MUNICIPIO DE ACACIAS** el día siete (07) del mes de noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,

YULIANA MARCELA VERGARA CASTAÑEDA
Gerente de Relación Banca de Gobierno
Oficina Acacías

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA CORRIENTE

MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIO
CR 14 # 13 - 40
ACACIAS - META

EMT083509

CUENTA No. 647-00178-3
FECHA DE CORTE: 31/10/2023

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	39,65%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	229,650,642.43
+ 31 CREDITOS	490.60
- 1 DEBITOS	190,310,000.00
SALDO ACTUAL	39,341,133.03
SALDO PROMEDIO	57,758,042.36

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 17 de noviembre de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2023. Si a partir del 17 de noviembre de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,705.35
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,768.27
04	PAGO TERCERO ACH	A736129	190,310,000.00	0.00	39,340,768.27
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	39,340,831.19
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,841.97
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,852.75
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,863.53
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,874.31
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,885.09
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,895.87
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,906.65
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,917.43
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,928.21
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,938.99
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,949.77
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,960.55
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,971.33
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,982.11
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,340,992.89
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,003.67
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,014.45
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,025.23
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,036.01
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,046.79
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,057.57
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,068.35
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,079.13
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,089.91
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,100.69
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,111.47
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,122.25
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10.78	39,341,133.03

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** ***ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.**
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles SAS NIT 860028580-2

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** **INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDIA DE Acacías CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR **Versión: 01**	ACACÍAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**24**	**MES: AGOSTO**		**FECHA DE INFORME**
CONTRATO No	377 de 2023	**OBJETO:**	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	**2 de OCTUBRE al 7 de OCTUBRE de 2023**
INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**		RESIDENTE DE INTERVENTORIA **ING. FERNANDO ALBERTO VILLARREAL URIBE**		RESIDENTE DE OBRA **ING. YUBER BETANCOURT CEPEDA**

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO





Localización geográfica del terreno a intervenir:
Fuente: Consorcio Interpolicia 2023





Localización geográfica del municipio en el país y departamento
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com



Caracteristicas del Predio.

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria sobre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

Desarrollo de Comités de Consultoría

No se han realizado comité de consultoría entre las partes integrales al contrato, Se espera pronunciamiento de la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON, a fin de dar continuidad a la ejecución contractual

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.


Información geográfica del predio

Latitud: 4,00° (Norte)
Longitud: -73,77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 950 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA


FECHA DEL CONTRATO:	**martes, 28 de marzo de 2023**				**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**		$ 12.575.546.216,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	**jueves, 27 de abril de 2023**				**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**				
PLAZO	**DOCE (12) MESES.**				**FECHA DE TERMINACION:**		**domingo, 24 de marzo de 2024**		
PRORROGA Nº 1:					**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.575.546.216,00				**VALOR DEL ANTICIPO:**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.**				**REPRESENTANTE LEGAL:**		**ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO.**		
PLAZO TRANSCURRIDO:	163	DIAS			**PLAZO RESTANTE:**		169	DIAS	
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	100,00%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%		
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 601.673.705,67	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ -	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 662.923.252,00		

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

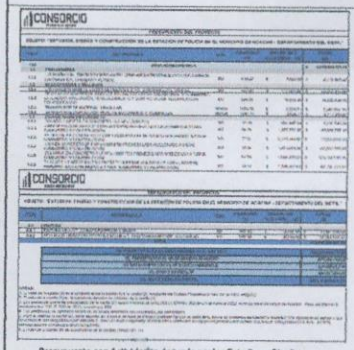

Presupuesto con Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policía - Acacías 2023

Definición de las actividades desarrolladas.
La Contratista realizó entrega de los componentes los cuales se encuentran en revisión por la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON y Ministerio del Interior

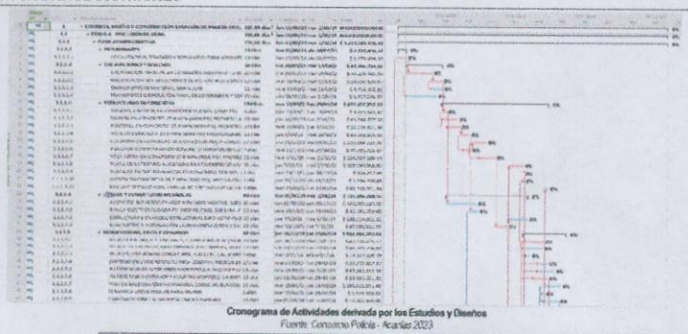

Cronograma de Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policía - Acacías 2023

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11
PROGRAMADO CONSULTORIA	6,40%	13,67%	20,75%	27,79%	34,79%	41,76%	48,69%	55,59%	62,46%	69,29%	76,09%
EJECUTADO CONSULTORIA	1,40%	13,67%	20,75%	27,79%	34,79%	41,76%	48,69%	55,59%	62,46%	69,29%	76,09%



Grafica del Avance de desarrollo por Consultoria del Contrato de Obra No. 377 de 2023
Objeto: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

MINISTERIO DEL INTERIOR

ALCALDÍA DE Acacías

De las Actividades de Consultoría al Proyecto:
El desarrollo de revisión de los componentes de consultoría se encuentra en manos del Municipio de Acacías, Miembros oficiales de la Dirección General de la Policía - DIPON, para la respectiva aprobación de los compromisos a desarrollar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

Versión: 01

INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

ALCALDÍA DE Acacías

ACACÍAS - META

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEMANA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	PROGRAM. ACUMULADO
2 OCT - 7 OCT	$ 0,00	100,00%	100,00%

FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACIÓN	AVANCE FINANCIERO PROGRAMACIÓN	PROYECCIÓN CONTRATO TOTAL
2 OCT - 7 OCT	$ 662.923.252,00	100,00%	$ 662.923.252,00

FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO Vs EJECUTADO		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR EVIDER TORO
2 OCT - 7 OCT	$ 662.923.252,00	0,00%	$ 662.923.252,00

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL PRINCIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				
	ESTUDIOS Y DISEÑOS			
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	$ -	$ 12.006.562,00	$ 12.006.562,00
2	ESTUDIO DE SUELOS	$ -	$ 34.001.960,00	$ 34.001.960,00
3	DISEÑO BIOCLIMATICO	$ -	$ 12.265.824,00	$ 12.265.824,00
4	DISEÑO ARQUITECTONICO	$ -	$ 217.940.481,00	$ 217.940.481,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ -	$ 174.350.247,00	$ 174.350.247,00
6	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	$ -	$ 45.665.252,00	$ 45.665.252,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS	$ -	$ 12.647.608,00	$ 12.647.608,00
8	DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	$ -	$ 30.264.410,00	$ 30.264.410,00
9	DISEÑO DE REDES ELECTRICAS	$ -	$ 81.547.696,00	$ 81.547.696,00
10	DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	$ -	$ 28.054.148,00	$ 28.054.148,00
11	PRESUPUESTO DE OBRA	$ -	$ 9.165.329,00	$ 9.165.329,00
12	CRONOGRAMA DE OBRA	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL	$ -	$ 662.923.252,00	$ 662.923.252,00
	AIU	$ -	$ 219.764.873,16	$ 219.764.873,16
	VALOR TOTAL	$ -	$ 882.687.325,16	$ 882.687.325,16

AVANCE TOTAL EJECUTADO	100,00%
AVANCE PROGRAMADO	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 0
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	UND		$ 12.006.562,00	$ -
ESTUDIO DE SUELOS	UND		$ 34.001.960,00	$ -
DISEÑO BIOCLIMÁTICO	UND		$ 12.265.824,00	$ -
DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND		$ 217.940.481,00	$ -
DISEÑO ESTRUCTURAL	UND		$ 174.350.247,00	$ -
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	UND		$ 45.665.252,00	$ -
DISEÑO DE RED DE GAS	UND		$ 12.647.608,00	$ -
DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND		$ 30.264.410,00	$ -
DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	UND		$ 81.547.696,00	$ -
DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	UND		$ 28.054.148,00	$ -
PRESUPUESTO DE OBRA	UND		$ 10.165.110,00	$ -
CRONOGRAMA DE OBRA				$ -
			AIU	$ 0
			TOTAL SEMANA 25	$ 0
				0,00%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		24-may-23	24-may-24	$ 608.702.310,00	PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-1000009254
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL		24-may-23	24-may-29	$ 10.638.214.621,60	PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-1000032073

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	META PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	1061 de 2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"		7-oct-2022	100,00%	$ 662.923.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 662.923.252,00	$ 0,00

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

El Ministerio del Interior, presenta nuevas observaciones encontradas al Componente Arquitectonico del proyecto estudios, diseño y construcción estación de policia en el Municipio de Acacias – departamento del Meta, en el cual hace presencia profesional; del Ministerio del Interior, Interventoria, Consultoria y miembros del cuerpo de funcionarios públicos del Municipio de Acacias.

- No existe coherencia en la nomenclatura de cortes, entre lo que figura en lo planos de planta y lo que finalmente se dispone en los planos de corte.
- En planos donde se citan cortes, y no se encuentran dichos cortes en el mismo plano, no se especifica en qué otro plano se puede localizar, lo que dificulta la comprensión entre los mismos.
- Se evidencia que no se nombran todos los elementos (puertas y ventanas) en los cortes.
- Se evidencia la ausencia de fachadas de algunos sectores del proyecto.
- No se observa método de acceso hacia las cubiertas.
- No se observan detalles del cerramiento perimetral, conforme a la caracterización propia a la tipología del proyecto

La revisión de planos de detalles, se establece que:

- Se registran vacíos en las referencias citadas, dado que a pesar de que existen señalamientos de detalles, no se muestran en el mismo plano la especificación de su referencia, ni tampoco señala en qué plano o lugar encontrarlas.
- Existen citaciones o referencias de caracterización de elementos del proyecto que no son especificadas dentro de los mismos planos. Se sugiere que las referencias se incluyan dentro de los mismos planos donde se mencionen, con la debida estructura de nomenclatura.
- Se observa que están siendo incluidos elementos moviliarios por fuera del alcance del presente proyecto. Se insta a que se realice una revisión exhausta sobre qué elementos están siendo concebidos.

DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, como fue dispuesto en la anterior reunión virtual, el consultor debe Plasmar físicamente como queda el diagrama Unifilar, teniendo en cuenta las observaiones emitidas por el profesional electrico.
Cumplir con los diagramas y simbolos que dicta las normas vigentes.
Verificar el calculo de regulacion de tensión.
Verificar conveniciones y agrupaciones.
Se debe relacionar el plano completo con la distribucion de los volumenes de equipos en zonas interiores.

OBSERVACIONES

El Contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, presenta subsanaciones a las observaciones remitidas por el Ministerio del Interior de los estudios y diseños presentados, teniendo en cuenta y en cumplimiento de lo indicado en el Anexo 24B – Entregables mínimos para Estudios y Diseños para instalaciones policiales aplicable para el proyecto en referencia es decir Estación Base Distrito Tipo A emitido por la Dirección Logística y Financiera y Dirección Administrativa de la Policía Nacional - DIRAF, dicha documentación se encuentra anexa y adjunta en debida forma mediante el siguiente link de descarga.

https://www.dropbox.com/scl/fo/56nnv9mckbzi2zez9yd66/h?rlkey=xl46gv9nf2qlso2egsxjra3ae&dl=0

Se espera revisión y aprobación de los componentes por parte del Ministerio del Interior, para dar continuidad al desarrollo de actividades del Contrato de obra No. 377 de 2023

Se manifiesta que la Escritura del predio, ya se encuentra aprobada como gestión del municipio mediante el convenio interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior

En conocimiento a la trazabilidad presentada, nos permitimos adjuntar un cronograma detallado de las actividades contractuales y procesos que han surgido efecto que, a su vez, han permitido que se extienda el plazo de ejecución de la Etapa II – Ejecución de Obra, prolongando el tiempo que presenta el Convenio Interadministrativo Nro. 1901 del 2022 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"

Elaborado por:

JUAN CAMILO POSADA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT.:901,696,564-7

MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ OSPINO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACÍAS

ALLISON ISABELLA UROLLO CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023
NIT.:901.699.313-1

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

Versión: 01

INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

ALCALDÍA DE Acacías

ACACÍAS - META

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**25**	**MES: AGOSTO**		
CONTRATO No	377 de 2023	OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	**FECHA DE INFORME**
INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**		RESIDENTE DE INTERVENTORIA: **ING. FERNANDO ALBERTO VILLARREAL URIBE**	RESIDENTE DE OBRA: **ING. YUBER BETANCOURT CEPEDA**	**8 de OCTUBRE al 14 de OCTUBRE de 2023**

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO





Localización geográfica del terreno a intervenir
Fuente: Consorcio Interpolicia 2023



Localización geográfica del municipio en el pais y departamento
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com



Caracteristicas del Predio.

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centrémoda sobre la carrera 47 con calle 35, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

Desarrollo de Comité de Consultoria

No se han realizado comité de consultoría entre las partes integrales al contrato, Se espera pronunciamiento de la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON, a fin de dar continuidad a la ejecución contractual

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.


Información geográfica del predio

Latitud 4.00° (Norte)
Longitud -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 550 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA


FECHA DEL CONTRATO:	martes, 28 de marzo de 2023			VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		$ 12.575.546.216,00	
FECHA DE INICIACIÓN:	jueves, 27 de abril de 2023			VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:			
PLAZO	DOCE (12) MESES.			FECHA DE TERMINACION:		domingo, 24 de marzo de 2024	
PRORROGA Nº 1:				NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.575.546.216,00			VALOR DEL ANTICIPO:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.			REPRESENTANTE LEGAL:		ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO.	
PLAZO TRANSCURRIDO:	170 DIAS			PLAZO RESTANTE:		182 DIAS	
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:	100,00%	PROGRAM. SEMANA	100,00%	PROGRAM. ACUMULADO	100,00%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:	$ 601.673.795,67	PROGRAM FINANC GEMANA	$ -	PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:	$ 662.923.252,00

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

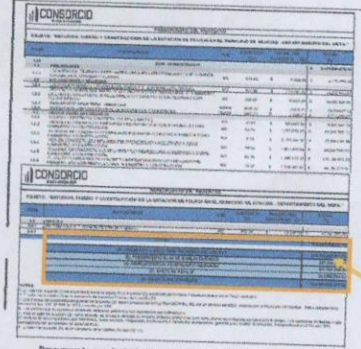


Presupuesto con Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policia - Acacias 2023

Definición de las actividades desarrolladas.
La Contratista realizó entrega de los componentes los cuales se encuentran en revisión por la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON y Ministerio del Interior.

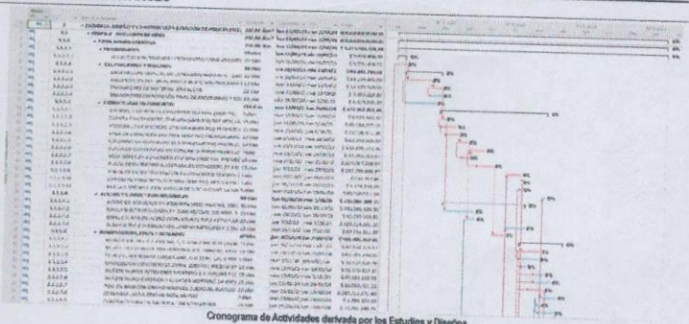

Cronograma de Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policia - Acacias, 2023



Monto presupuestal definitivo a los estudios y diseños



Grafica del Avance de desarrollo por Consultoria del Contrato de Obra No. 377 de 2023
Objeto: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"



Otras Actividades de Consultoria al Proyecto:
El desarrollo de revisión de los componentes de consultoría se encuentra en manos del Municipio de Acacías, Miembros oficiales de la Dirección General de la Policía - DIPON, para la respectiva aprobación de los compromisos a desarrollar.

VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

9 OCT - 14 OCT	$ 0,00	100,00%	100,00%
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEMANA:	AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACION	PROGRAM. ACUMULADO

9 OCT - 14 OCT	$ 662.923.252,00	100,00%	$ 662.923.252,00
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACION	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	PROGRAMADO CONTRATO TOTAL

9 OCT - 14 OCT	$ 662.923.252,00	0,00%	$ 662.923.252,00
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR (PERIODO SEMANA)

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** **INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDÍA DE Acacías ACACÍAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR			
Versión: 01			

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO INICIAL	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	$ -	$ -	$ 12.656.862,00	$ 12.656.862,00
2	ESTUDIO DE SUELOS	$ -	$ -	$ 34.007.365,00	$ 34.007.365,00
3	DISEÑO BIOCLIMATICO	$ -	$ -	$ 12.265.624,00	$ 12.265.624,00
4	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$ -	$ -	$ 217.942.401,00	$ 217.942.401,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ -	$ -	$ 179.356.247,00	$ 179.356.247,00
6	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ 45.685.252,00	$ 45.685.252,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS	$ -	$ -	$ 12.547.188,00	$ 12.547.188,00
8	DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	$ -	$ -	$ 30.254.410,00	$ 30.254.410,00
9	DISEÑO DE REDES ELECTRICAS	$ -	$ -	$ 81.547.698,00	$ 81.547.698,00
10	DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	$ -	$ -	$ 28.954.146,00	$ 28.954.146,00
11	PRESUPUESTO DE OBRA	$ -	$ -	$ 9.592.539,00	$ 9.592.539,00
12	CRONOGRAMA DE OBRA	$ -	$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 882.923.352,00	$ 882.923.352,00
			AIU	$ 210.764.673,16	$ 210.764.673,16
			VALOR TOTAL	$ 882.923.352,00	$ 882.923.352,00

AVANCE TOTAL EJECUTADO	**100,00%**
AVANCE PROGRAMADO	**100,00%**
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	**0,00%**

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO				$ 0
ESTUDIO DE SUELOS	UND		$ 12.656.862,00	$ -
DISEÑO BIOCLIMÁTICO	UND		$ 34.007.365,00	$ -
DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND		$ 12.265.624,00	$ -
DISEÑO ESTRUCTURAL	UND		$ 217.942.401,00	$ -
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	UND		$ 179.356.247,00	$ -
DISEÑO DE RED DE GAS	UND		$ 45.685.252,00	$ -
DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND		$ 12.547.188,00	$ -
DISEÑO DE REDES ELECTRICAS	UND		$ 30.254.410,00	$ -
DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	UND		$ 81.547.698,00	$ -
PRESUPUESTO DE OBRA	UND		$ 28.954.146,00	$ -
CRONOGRAMA DE OBRA	UND		$ 10.155.110,00	$ -
				$ -
			AJU	$ 0
			TOTAL SEMANA 26	**$ 0**
				0,00%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

CONCEPTO	VIGENTE	ACTA PARCIAL DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		24-may-23	24-may-24	$ 628.760.310,00	POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS No POLIZA CV-100000284
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL		24-may-23	24-may-26	$ 10.086.214.621,96	POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS No POLIZA CV-100003873

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	MES PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	1901 de 2022	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	14-oct-2023	100,00%	$ 882.923.352,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 882.923.352,00	$ 0,00

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

•Ministerio del Interior, convoca a reunión de comité presencial en el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta", las observaciones emitidas por el contratista en comparación al cumplimiento del anexo 24B de los estudios y diseños entregados por el Municipio de Acacias, no ha sido posible realizar el recibo a satisfacción, persistiendo ciertas incongruencias a las necesidades y requerimientos especificos del proyecto.

•Es de precisar que el Contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, ya tiene Aval por la Dirección Logistica y Financiera y Dirección Administrativa de la Policia Nacional - DIRAF, el cual se debe garantizar cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas de la policía nacional, la normativa vigente y la correcta ejecución de obra, lo anterior, es soportado bajo la Ley 80 de 1993, en el Aliculo 4, numeral 4, que establece la obligatoriedad que tienen las entidades estatales de realizar seguimiento y vigilar de forma ininterrumpida la ejecución de las obras.

Las observaciones emitidas por el Ministerio del Interior de los estudios y diseños presentados, son sustentadas por el contratista de consultoría a los requerimientos establecidos en el convenio interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior

OBSERVACIONES

•El Contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, presenta subsanaciones a las observaciones remitidas por el Ministerio del Interior de los estudios y diseños presentados, teniendo en cuenta y en cumplimiento de lo indicado en el Anexo 24B – Entregables minimos para Estudios y Diseños para instalaciones policiales aplicable para el proyecto en referencia es decir Estación Base Distrito Tipo A emitido por la Dirección Logistica y Financiera y Dirección Administrativa de la Policia Nacional - DIRAF, dicha documentación se encuentra anexa y adjunta en debida forma mediante el siguiente link de descarga.

https://www.dropbox.com/scl/fo/56nnv9mckbzi2zez9yd66/h?rlkey=xl46gv9nf2qlso2egsxjra3ae&dl=0

Se espera revisión y aprobación de los componentes por parte del Ministerio del Interior, para dar continuidad al desarrollo de actividades del Contrato de obra No. 377 de 2023

Se manifiesta que la Escritura del predio, ya se encuentra aprobada como gestión del municipio mediante el convenio interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior

En conocimiento a la trazabilidad presentada, nos permitimos adjuntar un cronograma detallado de las actividades contractuales y procesos que han surgido efecto que, a su vez, han permitido que se extienda el plazo de ejecución de la Etapa II – Ejecución de Obra, prolongando el tiempo que presenta el Convenio Interadministrativo Nro. 1901 del 2022 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** **INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDÍA DE Acacías	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR **Versión: 01**		ACACÍAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

Elaborado por:

JUAN CAMILO POSADA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT.:901.696.564-7

MARIO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACÍAS

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023
NIT.:901.899.813-1

ALCALDÍA DE Acacías

ESTUDIO DE TITULOS

FECHA DE ELABORACION:	20/06/2023
SOLICITANTE:	Despacho del Alcalde
DIRECCION:	Sin direccion
NOMBRE DEL PREDIO:	LOTE 5 EDIFICIO CABILDO
VEREDA:	No aplica
MUNICIPIO:	Acacias
DEPARTAMENTO:	Meta

MATRICULA INMOBILIARIA:	MATRIZ:	230-5v-0		
	SEGREGACION:			
	O OBJETO DE ESTUDIO:	230-21106		
	ANTIGUA:	S/n		
CEDULA CATASTRAL:	ANTERIOR:	500001 00 02 0 1 0 0 0 0 0 0		
	ACTUAL:	500001 00 00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0		
TITULO DE DOMINIO	Radic. 05-13	8/8/2023	Ministerio de Defensa Nacional	

TIPO DE INMUEBLE:	CASA	LOTE	APARTAMENTO	OTRO
INTRAESTRUCTURA		X		N/A

PROPIETARIO	PERSONA NATURAL	PERSONA JURIDICA	NOMBRE	IDENTIFICACION	%
		X	Municipio de Acacias	NIT 8600014857-5	100

AREA:		
CABIDA:	SEGÚN CERTIFICADO:	10.4752 S.DTO
	SEGÚN CATASTRO:	154 m2 (Area)
	SEGÚN PAZ Y SALVO:	10 Has 5000 M2
	SEGÚN DOCUMENTOS:	10.4752 S.DTO M2
COLINDANCIAS:		Fuente: Se toma de la Resolución No. 0280 del 06 de febrero de 2023 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional
LINDEROS:		Lote 5: Se encuentra ubicado actualmente en el predio urbano de ubicación de Acacías, departamento del Meta con un área de 10 Has 5.000 m2. Según el Plan Básico de Ordenamiento los datos plasmado 154 de 2011, no este predio no cobra el desarrollo de proyectos de Uso institucional Equipamiento de seguridad y defensa. Estos lotes son de propiedad del municipio de acacías cuentan con la ficha de anexo 14 de 1984 y se encuentra del paquete #14 de folio

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TECNICO Y SUPERVISION DE PROYECTOS

Fecha:	Bogotá D.C., 28 de agosto de 2023		
Hora de inicio:	08:30 horas	Hora de finalización:	12:05 horas
Lugar:	Carrera 59 26-21 CAN, segundo piso Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos		

ACTA No 1 - DIPRA-GUTEP – 2.28
QUE TRATA DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y VALIDACIÓN DE LA ETAPA DE ESQUEMA BÁSICO DEL PROYECTO ESTACIÓN BASE DISTRITO DE ACACIAS- META

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de integrantes del Comité de Diseño, de acuerdo con los art. 1 y 2 de la Resolución 0280 de 2011
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Revisión de los diseños
5. Observaciones

DESARROLLO

1. **Verificación de integrantes del comité de diseño, de acuerdo con los art. 1 y 2 de la Resolución 0280 de 2011**

En cumplimiento de la Resolución No. 0280 del 06/04/2011 *"Por la cual se crea el Comité de diseño para la revisión y aprobación de proyectos de infraestructura de la Policía Nacional"*, se convoca en presente comité con el fin de centrar la revisión y validación a nivel de esquema básico de los componentes de topografía, bioclimáticos y arquitectura del proyecto en mención, con la participación de los siguientes participantes:

- **Teniente Coronel EDWIN SANTIAGO PUENTES MATALLANA**
  Director de Infraestructura (E)
  Presidente del comité
- **Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
  Jefe Área Gestión de Proyectos
- **Teniente JENNIFER PEÑUELA GARCES**
  Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos
  Secretaria técnica comité

Grupo de profesionales Policía Nacional:

- **Teniente JENNIFER PEÑUELA GARCES**
  M.P. A1683201B-1121800533
- **Arquitecta JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO**
  M.P. A252020D5-52148756
- **SI. JOSE DAVID LANCHEROS BANTANA**
  M.P. 01-21726

Página 1 de 8

Aprobación: 30-04-2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TECNICO Y SUPERVISION DE PROYECTOS

Fecha:	Bogotá, 28 de Enero de 2020	Hora de finalización:	12:05 horas
Hora de inicio:	08:30 horas		
Lugar:	Carrera 59 26-21 CAN, segundo piso Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos		

ACTA – 1 – DIPRA – GUTEP – 28 SE
QUE TRATA DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y VALIDACIÓN DE LA ETAPA DE ESQUEMA BÁSICO DEL PROYECTO ESTACIÓN BASE DISTRITO DE ACACIAS- META

ASISTENTES

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
01	Ruth Esthefany Pacheco Medina	Ofic. profesional	ofic.profesional@dipra.gov.co	3138520454	
02	Isabella Urquijo Camacho	Gerente del proyecto	gerente.proyectos@consorciopolicia.gov.co	3108662334	
03	Jennifer Peñuela Garces	Grupo GUTEP	grupo.gutep@dipra.gov.co	3138520454	
04	Jhon Andrés Cortés Salcedo	Ofic. Ambiental	ofic.ambiental@consorciopolicia.gov.co	3108662334	
05	Juan Camilo Posada Ramírez	Interventoría	juan.posada@consorciopolicia.gov.co	3108662334	

INFORMACIÓN PÚBLICA

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfono: (+57) 601 5159000 Ext. 51000
www.policia.gov.co

ESTUDIO DE TITULOS Y AVAL POR PARTE DE LA DIRAF

MINISTERIO DEL INTERIOR

INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

ALCALDÍA DE Acacías — Camino de oportunidad

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

MINISTERIO DEL INTERIOR

Versión: 01

ACACÍAS - META

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**26**	**MES: AGOSTO**	
CONTRATO No	374 de 2023	**OBJETO:**	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"
FECHA DE INFORME			
16 de OCTUBRE al 21 de OCTUBRE de 2023			
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ING. FERNANDO ALBERTO VILLARREAL URIBE**	**RESIDENTE DE OBRA: ING. YUBER BETANCOURT CEPEDA**

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO





Localización geográfica del terreno a intervenir
Fuente: Consorcio Interpolicia 2023



Localización geografica del municipio en el pais y departamento
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com



Caracteristicas del Predio.

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenario sobre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

Desarrollo de Comités de Consultoría

No se han realizado comité de consultoría entre las partes integrales al contrato, Se espera pronunciamiento de la Dirección General de la Policía Nacional- DIPON, a fin de dar continuidad a la ejecución contractual

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.


Información geográfica del predio

Latitud 4.00° (Norte)
Longitud -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 550 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA


FECHA DEL CONTRATO:	**martes, 28 de marzo de 2023**			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**		$ 12.575.546.216,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	**jueves, 27 de abril de 2023**			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**				
PLAZO	**DOCE (12) MESES.**			**FECHA DE TERMINACION:**		**domingo, 24 de marzo de 2024**		
PRORROGA Nº 1:				**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.575.546.216,00			**VALOR DEL ANTICIPO:**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.**			**REPRESENTANTE LEGAL:**		**ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO.**		
PLAZO TRANSCURRIDO:	177 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**		165 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	100,00%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%	
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 631.673.795,67	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ -	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$	682.923.252,00

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

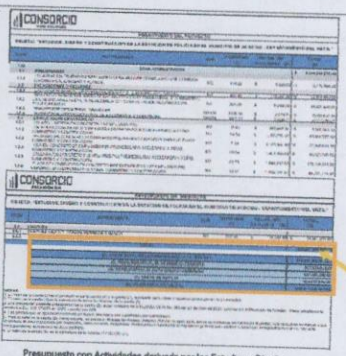


Presupuesto con Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente Consorcio Policía - Acacías 2023


Definición de las actividades desarrolladas.
La Contraloría realizó entrega de los componentes los cuales se encuentran en revisión por la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON y Ministerio del Interior.

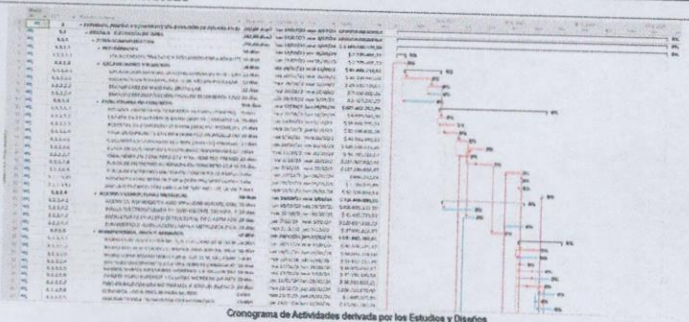

Cronograma de Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policía - Acacías 2023



Monto presupuestal definitivo a los estudios y diseños

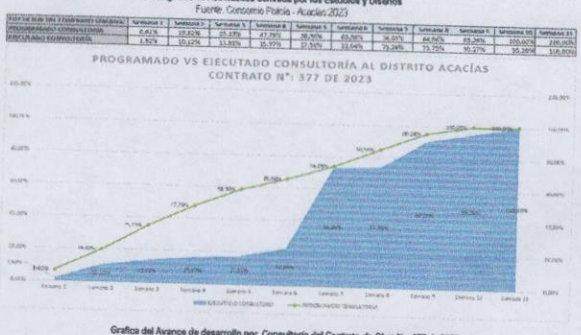

Grafica del Avance de desarrollo por Consultoria del Contrato de Obra No. 377 de 2023
Objeto: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

MINISTERIO DEL INTERIOR

ALCALDÍA DE Acacías — Camino de oportunidad

De las Actividades de Consultoría al Proyecto:
El desarrollo de revisión de los componentes de consultoría se encuentra en manos del Municipio de Acacías, Miembros oficiales de la Dirección General de la Policía - DIPON, para la respectiva aprobación de los compromisos a desarrollar

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** *CONSORCIO INTERPOLICIA 2023* **INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDÍA DE Acacías	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR		ACACIAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
Versión: 01			

VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

18 OCT - 21 OCT	$ 0,00	100,00%	100,00%
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEMANAL	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	PROGRAM. ACUMULADO

18 OCT - 21 OCT	$ 882.923.252,00	100,00%	$ 882.923.252,00
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO DESDE PROGRAMACIÓN	AVANCE FINANCIERO PROGRAMACIÓN	PROGRAMADO CONTRATO TOTAL

18 OCT - 21 OCT	$ 882.923.252,00	0,00%	$ 882.923.252,00
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO		SALDO PORDEJECUTAR POR EJECUTAR CONSTRUIDA

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO INICIAL	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO				
2	ESTUDIO DE SUELOS	$	-	$ 12.606.962,00	$ 12.606.962,00
3	DISEÑO BIOCLIMÁTICO	$	-	$ 34.007.903,00	$ 34.007.903,00
4	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$	-	$ 12.389.024,00	$ 12.389.024,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$	-	$ 217.942.461,00	$ 217.942.461,00
6	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	$	-	$ 179.939.247,00	$ 179.939.247,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS	$	-	$ 45.695.252,00	$ 45.695.252,00
8	DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	$	-	$ 12.547.656,00	$ 12.547.656,00
9	DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	$	-	$ 30.264.410,00	$ 30.264.410,00
10	DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	$	-	$ 91.547.656,00	$ 91.547.656,00
11	PRESUPUESTO DE OBRA	$	-	$ 28.064.140,00	$ 28.064.140,00
12	CRONOGRAMA DE OBRA	$	-	$ 9.560.329,00	$ 9.560.329,00
			-	$ -	$ -
AVANCE TOTAL EJECUTADO	100,00%	SUBTOTAL	$	- $ -	$ -
		A.I.U	$	- $ 882.923.252,00	$ 882.923.252,00
AVANCE PROGRAMADO	100,00%	VALOR TOTAL	$	- $ 218.764.673,16	$ 218.764.673,16
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%			- $ 661.807.925,16	$ 661.807.925,16

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 0
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	UND		$ 12.606.962,00	$ -
ESTUDIO DE SUELOS	UND		$ 34.007.903,00	$ -
DISEÑO BIOCLIMÁTICO	UND		$ 12.389.024,00	$ -
DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND		$ 217.333.938,00	$ -
DISEÑO ESTRUCTURAL	UND		$ 179.359.247,00	$ -
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	UND		$ 45.695.252,00	$ -
DISEÑO DE RED DE GAS	UND		$ 12.547.656,00	$ -
DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND		$ 30.264.410,00	$ -
DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	UND		$ 91.547.656,00	$ -
DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	UND		$ 28.064.140,00	$ -
PRESUPUESTO DE OBRA	UND		$ 10.185.110,00	$ -
CRONOGRAMA DE OBRA				$ -
				$ -
			AIU	$ 0
			TOTAL SEMANA 27	**$ 0**
				0,00%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

CONCEPTO	VIGENTE	ACTA PARCIAL DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		24-may-23	24-may-24	$ 458.782.910,00	PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100028254
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL		24-may-23	24-may-29	$ 10.689.214.821,49	PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100032873

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	1901 de 2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"		21-oct-2023	100,00%	$ 882.923.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 882.923.252,00	$ 0,00

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

El Ministerio del Interior, convoca a reunión de comité presencial , para esta oportunidad La Supervisión del Municipio realiza presencia junto al Consultor, definiendo las necesidades y requerimientos de mayor amplitud para el proyecto, en el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta", las observaciones emitidas por el contratista en comparación al cumplimiento del anexo 24B de los estudios y diseños entregados por el Municipio de Acacias, no ha sido posible realizar el recibo a satisfacción, persistiendo ciertas incongruencias a las necesidades y requerimientos específicos del proyecto.

Es de precisar que el Contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, ya tiene Aval por la Dirección Logistica y Financiera y Dirección Administrativa de la Policía Nacional - DIRAF, el cual se debe garantizar cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas de la policía nacional, la normativa vigente y la correcta ejecución de obra, lo anterior, es soportado bajo la Ley 80 de 1993, en el Aliculo 4, numeral 4, que establece la obligatoriedad que tienen las entidades estatales de realizar seguimiento y vigilar de forma ininterrumpida la ejecución de las obras.

Las observaciones emitidas por el Ministerio del Interior de los estudios y diseños presentados, son sustentadas por el contratista de consultoría a los requerimientos establecidos en el convenio interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior

Se define fecha de entrega definitiva antes del 31 de octubre de 2023, con el propósito de obtener aval por parte del Ministerio del Interior

OBSERVACIONES

El Contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, presenta subsanaciones a las observaciones remitidas por el Ministerio del Interior de los estudios y diseños presentados, teniendo en cuenta y en cumplimiento de lo indicado en el Anexo 24B – Entregables mínimos para Estudios y Diseños para instalaciones policiales aplicable para el proyecto en referencia es decir Estación Base Distrito Tipo A emitido por la Dirección Logistica y Financiera y Dirección Administrativa de la Policía Nacional - DIRAF, dicha documentación se encuentra anexa y adjunta en debida forma mediante el siguiente link de descarga.

https://www.dropbox.com/scl/fo/56nnv9mckbzi2zez9yd66/h?rlkey=xl46gv9nf2qlso2egsxjra3ae&dl=0

Se espera revisión y aprobación de los componentes por parte del Ministerio del Interior, para dar continuidad al desarrollo de actividades del Contrato de obra No. 377 de 2023

Se manifiesta que la Escritura del predio, ya se encuentra aprobada como gestión del municipio mediante el convenio interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior

En conocimiento a la trazabilidad presentada, nos permitimos adjuntar un cronograma detallado de las actividades contractuales y procesos que han surgido efecto que, a su vez, han permitido que se extienda el plazo de ejecución de la Etapa II – Ejecución de Obra, prolongando el tiempo que presenta el Convenio Interadministrativo Nro. 1901 del 2022 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** *CONSORCIO INTERPOLICIA 2023* **INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDÍA DE Acacías	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR		ACACIAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
Versión: 01			

Elaborado por:

JUAN CAMILO ROSADA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT.:901,696.564-7

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACIAS

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023
NIT.:901.699.813-1

CONSORCIO
POLICIA ACACIAS 2023

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META"

CODIGO	ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNIT. A.I.U (38%) (2)	TOTAL (3)
14050204 INSUMOS AIU + COT	8.4.7	CABLE ACERO 7X19 D= 3/8" (6.35MM) TIPO EIPS				
	8.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION CONCERTINA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE	MT	170.00	$ 171.492,67	$ 29.143.653,17
	8.5	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METALICAS**	MT	423.00	$ 80.696,98	$ 37.212.112,01
11050401	8.5.1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPa (4200KG/CM2, 60ksi) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y ANCLAJES	KG	51447,00	$ 11.120,43	$ 127.300.086,59
INSUMOS AIU + COT	8.5.2	CERCHA EN PERFIL RECTANGULAR DE 80x40x 2.0 MM INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN GENERAL	M2	599,31	$ 852.236,85	$ 305.901.770,97
		TOTAL				$ 499.592.118,63


COSTO DEL VALOR DE LA OBRA SIN IVA	$ 499.592.118,63
19% IVA SOBRE UTILIDADES DE OBRA	$ 19.000.000,00
5% PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD Y SALUD	$ 24.979.605,93
5% PRESUPUESTO PARA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 24.979.605,93
1% APORTE ESTAMPILLADO PROULTIMO Y ADULTO MAYOR	$ 4.995.921,19
5% COSTO CERTIFICACION POSTOS UNIFARMADOS	$ 24.979.605,93
1% COSTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD	$ 4.995.921,19
	$ 604.522.979,39

NOTAS:
El presente presupuesto fue elaborado con fecha a el día 31 de octubre del 2023.

Elaboró
ING. MARIA ANDREA REYES BACUERO
Directora de proyectos
CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023
NIT. 901.699.813-1

Revisó y Aprobó:
ING. JUAN CAMILO ROSADA VARELA
Representante Legal
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT. 901.696.564-7

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
Supervisor del Municipio
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

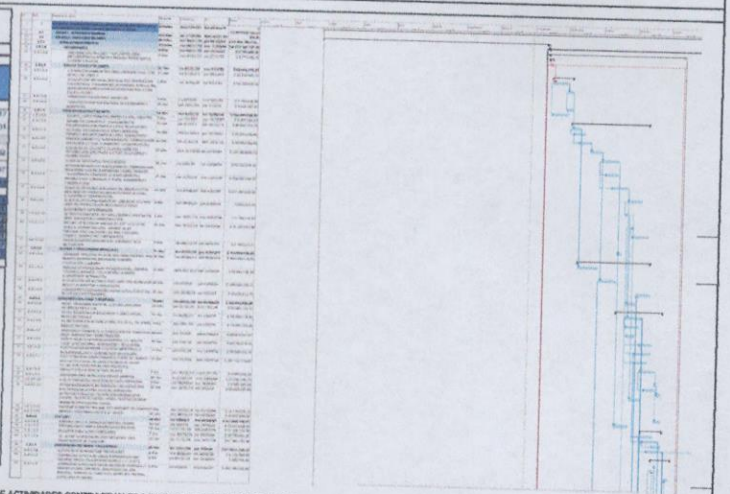

PRESUPUESTO ACTUALIZADO, APROBADO CON SU CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES AJUSTADO AL TIEMPO DE EJECUCIÓN

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** **INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDÍA DE Acacías ACACÍAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR			
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL				
INFORME SEMANAL No:	**27**	**MES: AGOSTO**		
CONTRATO No	374 de 2023	**OBJETO:**	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	**FECHA DE INFORME**
INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**		RESIDENTE DE INTERVENTORIA: **ING. FERNANDO ALBERTO VILLARREAL URIBE**	RESIDENTE DE OBRA: **ING. YUBER BETANCOURT CEPEDA**	**23 de OCTUBRE al 26 de OCTUBRE de 2023**

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO





Localización geográfica del lugar a intervenir
Fuente: Consorcio Interpolicia 2023



Localización geográfica del municipio en el país y departamento
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com



Caracteristicas del Predio.

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria sobre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

Desarrollo de Comités de Consultoría

No se han realizado comité de consultoría entre las partes integrales al contrato, Se espera pronunciamiento de la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON, a fin de dar continuidad a la ejecución contractual

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.


Información geográfica del predio

Latitud: 4.00° (Norte)
Longitud: -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 560 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA


FECHA DEL CONTRATO:	**martes, 28 de marzo de 2023**			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**		$ 12.575.646.216,00	
FECHA DE INICIACIÓN:	**jueves, 27 de abril de 2023**			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**			
PLAZO	**DOCE (12) MESES.**			**FECHA DE TERMINACION:**		**domingo, 24 de marzo de 2024**	
PRORROGA Nº 1:				**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.575.646.216,00			**VALOR DEL ANTICIPO:**			
CONTRATISTA:	**CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.**			**REPRESENTANTE LEGAL:**		**ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO.**	
PLAZO TRANSCURRIDO:	184 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**		148 DIAS	
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	100,00%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 601.673.796,67	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ -	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 932.929.392,00

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

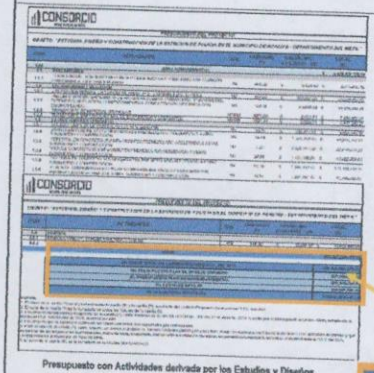


Presupuesto con Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policía - Acacías 2023


Definición de las actividades desarrolladas.
La Contratista realizó entrega de los componentes los cuales se encuentran en revisión por la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON y Ministerio del Interior

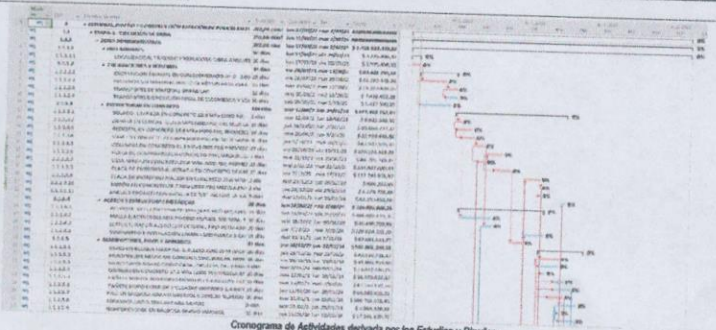

Cronograma de Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policía - Acacías 2023



Monto presupuestal definitivo a los estudios y diseños

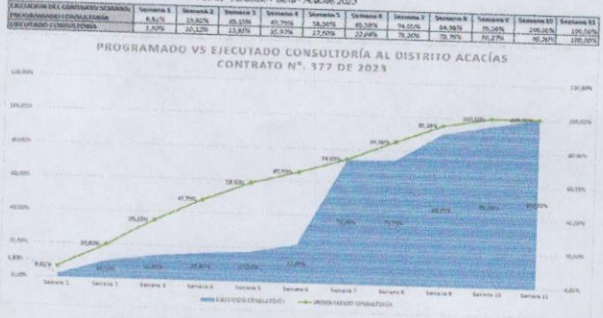

Grafica del Avance de desarrollo por Consultoria del Contrato de Obra No. 377 de 2023
Objeto: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

MINISTERIO DEL INTERIOR

ALCALDÍA DE Acacías Camino de oportunidades

De las Actividades de Consultoria al Proyecto:
El desarrollo de revisión de los componentes de consultoria se encuentra en manos del Municipio de Acacias, Miembros oficiales de la Dirección General de la Policia - DIPON, para la respectiva aprobación de los compromisos a desarrollar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

Versión: 01

INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

ALCALDÍA DE Acacías

ACACÍAS - META

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

23 OCT - 28 OCT	$ 0,00	100,00%	100,00%	23 OCT - 28 OCT	$ 682.923.252,00	100,00%	$ 682.923.252,00	23 OCT - 28 OCT	$ 682.923.252,00	0,00%	$ 682.923.252,00
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEMANA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	PROGRAMA ACUMULADO	FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACIÓN	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	PROGRAMADO CONTRATO INICIAL	FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONSULTORÍA

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO INICIAL	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO				
2	ESTUDIO DE SUELOS	$ -	$ -	$ 12.690.562,00	$ 12.690.562,00
3	DISEÑO BIOCLIMATICO	$ -	$ -	$ 34.007.983,00	$ 34.007.983,00
4	DISEÑO ARQUITECTONICO	$ -	$ -	$ 12.265.524,00	$ 12.265.524,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ -	$ -	$ 217.042.461,00	$ 217.042.461,00
6	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ 178.356.247,00	$ 178.356.247,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS	$ -	$ -	$ 45.685.252,00	$ 45.685.252,00
8	DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	$ -	$ -	$ 12.547.658,00	$ 12.547.658,00
9	DISEÑO DE REDES ELECTRICAS	$ -	$ -	$ 30.254.410,00	$ 30.254.410,00
10	DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	$ -	$ -	$ 61.547.590,00	$ 61.547.590,00
11	PRESUPUESTO DE OBRA	$ -	$ -	$ 28.054.148,00	$ 28.054.148,00
12	CRONOGRAMA DE OBRA	$ -	$ -	$ 9.923.339,00	$ 9.923.339,00
				$ -	$ -
	SUBTOTAL	$ -	$ -	$ 682.923.252,00	$ 682.923.252,00
	A I U	$ -	$ -	$ 219.764.673,16	$ 219.764.673,16
	VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ 901.687.925,16	$ 901.687.925,16

AVANCE TOTAL EJECUTADO	100,00%
AVANCE PROGRAMADO	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 0
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	UND		$ 12.690.562,00	$ -
ESTUDIO DE SUELOS	UND		$ 34.007.983,00	$ -
DISEÑO BIOCLIMÁTICO	UND		$ 12.265.524,00	$ -
DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND		$ 217.333.926,00	$ -
DISEÑO ESTRUCTURAL	UND		$ 178.356.247,00	$ -
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	UND		$ 45.685.252,00	$ -
DISEÑO DE RED DE GAS	UND		$ 12.547.658,00	$ -
DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND		$ 30.254.410,00	$ -
DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	UND		$ 61.547.590,00	$ -
DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	UND		$ 28.054.148,00	$ -
PRESUPUESTO DE OBRA	UND		$ 10.155.110,00	$ -
CRONOGRAMA DE OBRA				$ -
			AIU	$ 0
			TOTAL SEMANA 28	$ 0
				0,00%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

CONCEPTO	VIGENTE	ACTA PARCIAL DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		24-mar-23	24-mar-24	$ 826.782.310,00	PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100008264
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL		24-mar-23	24-mar-28	$ 10.099.214.821,60	PÓLIZA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No PÓLIZA CV-100032673

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	1001 de 2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"		25-ene-2023	100,00%	$ 682.923.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 682.923.252,00	$ 0,00

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

- La interventoria hace entrega al Municipio de Acacias – departamento del Meta, los estudios y diseños definitivos presentados por el Contratista Consultor, los cuales se entregan con Certificado de Aprobación.

- La Supervisión del Municipio de Acacias, radica los estudios y diseños ante el banco de proyectos para la actualización del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP.

- El Contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, presenta subsanaciones a las observaciones remitidas por el Ministerio del Interior de los estudios y diseños presentados, teniendo en cuenta y en cumplimiento de lo indicado en el Anexo 24B – Entregables minimos para Estudios y Diseños para instalaciones policiales aplicable para el proyecto en referencia es decir Estación Base Distrito Tipo A emitido por la Dirección Logistica y Financiera y Dirección Administrativa de la Policia Nacional - DIRAF, dicha documentación se encuentra anexa y adjunta en debida forma mediante el siguiente link de descarga.

https://www.dropbox.com/sd/fo/56nnv9mckbzi2zez9yd66/h?rlkey=x46gv9nf2qlso2egsxjra3ae&dl=0

Se requerirá de la entrega definitiva en versión física, bajo los 2 juegos en físico, los cuales fueron aprobados a satisfacción bajo autonomía y responsabilidad de la interventoria, se amerita que los mismos sean aprobados a través del supervisor del convenio los estudios y diseños para la construcción de la obra, El contratista entregará los 2 paquetes originales producto de la consultoría con destino al MUNICIPIO y al MINISTERIO, y a su vez deberá conservar copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de los estudios y diseños

OBSERVACIONES

El Contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, presenta subsanaciones a las observaciones remitidas por el Ministerio del Interior de los estudios y diseños presentados, teniendo en cuenta y en cumplimiento de lo indicado en el Anexo 24B – Entregables mínimos para Estudios y Diseños para instalaciones policiales aplicable para el proyecto en referencia es decir Estación Base Distrito Tipo A emitido por la Dirección Logística y Financiera y Dirección Administrativa de la Policía Nacional - DIRAF, dicha documentación se encuentra anexa y adjunta en debida forma mediante el siguiente link de descarga.

https://www.dropbox.com/scl/fo/56nnv9rnckbzi2zez9ycd/h?rlkey=xl46gv9nf2qlso2egsajra3ae&dl=0

Se espera revisión y aprobación de los componentes por parte del Ministerio del Interior, para dar continuidad al desarrollo de actividades del Contrato de obra No. 377 de 2023

Se manifiesta que la Escritura del predio, ya se encuentra aprobada como donación del municipio mediante el convenio interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior

En conocimiento a la trazabilidad presentada, nos permitimos adjuntar un cronograma detallado de las actividades contractuales y procesos que han surgido efecto que, a su vez, han permitido que se extienda el plazo de ejecución de la Etapa II – Ejecución de Obra, *prolongando el tiempo que presenta el Convenio Interadministrativo No. 1901 del 2022 cuyo objeto es:* "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO YCONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"

Elaborado por:

JUAN CAMILO POSADA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT.:901,696.564-7

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACIAS

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023
NIT.:901.699.813-1
